

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES ICA QUINDÍO, SECCIONAL RISARALDA, SECCIONAL CALDAS Y OFICINA LOCAL LA DORADA**	**97,25 días**	**lun 4/12/23**	**sáb 30/03/24**	**$ 1.474.408.987,37**
2		**INICIO DE OBRA**	0 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 0,00
3		**OFICINA LA DORADA**	**71,5 días**	**lun 4/12/23**	**jue 29/02/24**	**$ 219.064.283,17**
120		**OFICINA SECCIONAL MANIZALES**	**71 días**	**lun 4/12/23**	**jue 29/02/24**	**$ 254.502.801,71**
171		**OFICINA SECCIONAL RISARALDA-DOS QUEBRADAS**	**69 días**	**lun 4/12/23**	**mar 27/02/24**	**$ 330.911.824,98**
320		**OFICINA QUINDIO ARMENIA**	**97,25 días**	**lun 4/12/23**	**sáb 30/03/24**	**$ 659.233.716,01**
321	**1,00**	**PRELIMINARES BLOQUE PRINCIPAL**	**9 días**	**lun 4/12/23**	**jue 14/12/23**	**$ 3.089.635,51**
322	1,1	Desmonte de luminarias incrustadas al cieloraso, incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacen de los elementos reutilizables.(auditorio)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 306.189,00
323	1,2	Demolición de piso de cerámica área baño. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 310.138,40
324	1,3	Demolición de enchape en cerámica muros área baños. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 734.464,12
325	1,4	Desmonte Lavamanos incluye accesorios. Incluye retiro al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 88.701,60
326	1,5	Desmonte de puertas en aluminio paneles divisorios. Incluye retiro al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 84.276,40
327	1,6	Desmonte accesorios de baños .Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 41.522,00
328	1,7	Desmonte aparatos sanitarios incluye accesorios. Incluye retiro al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 126.952,80
329	1,8	Desmonte espejo baños. Incluye retiro al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23	$ 23.576,80
330	1,9	Desmonte orinales incluye accesorios. Incluye retiro al botadero autorizado.(Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 31.738,20
331	1,10	Desmonte de grifería. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables. (Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 132.548,00
332	1,11	Demolición de muro en mampostería . Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables. (Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 48.430,72
333	1,12	Desmonte de rejilla de piso. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables. (Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 14.580,80
334	1,13	Desmonte de afiches, pancartas, películas en muros y ventanas.(Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 66.677,00
335	1,14	Desmonte de puertas en madera, Incluye marcos de puertas. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.(Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 34.627,32
336	1,15	Demolición de poyo. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables. (Áreas baños administrativa)	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 19.211,40
337	1,16	Desmonte de puertas oficinas administrativas y cuartos eléctricos dim;1.00x2.20m. Incluye marcos y demás accesorios, incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 703.766,70
338	1,17	Desmonte de puertasaccesos principales y auditorios dim;2.60x2.20m. Incluye marcos y demás accesorios, incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	3 días	mié 6/12/23	mar 12/12/23	$ 270.387,00
339	1,18	Desmonte de ventanería área de recepción. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	3 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23	$ 51.847,25
340	**2,00**	**MUROS BLOQUE PRINCIPAL**	**5 días**	**jue 14/12/23**	**mié 20/12/23**	**$ 987.698,40**
341	2,1	Corte con pulidora para muros para la instalación de interruptor, redes hidráulicas, desgues. Incluye resane, pintura de muros (Baños administrativos)	2 días	jue 14/12/23	lun 18/12/23	$ 142.209,60
342	2,2	Construcción de muro en bloque No. 5 con e= 0.12 m; incluye pañete 1:4 liso sobre muro y espesor de 1.5, Incluye cintas de vanos y puertas, filos y dilataciones (Oficina de recepción)	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23	$ 617.370,00
343	2,3	Suministro e instalación de anclajes epoxicos para diámetro 3/8", incluye perforación d=1/2" profundidad 12 cms y refuerzo en varilla de 3/8" x 1 mt (Oficina de recepción)	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23	$ 228.118,80
344	**3,00**	**PISOS BLOQUE PRINCIPAL**	**6 días**	**jue 21/12/23**	**jue 28/12/23**	**$ 8.112.764,27**
345	3,1	Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:2 de 4 cms de espesor.Incluye afinado de poyo (Baños administrativos)	3 días	jue 21/12/23	mar 26/12/23	$ 871.260,00
346	3,2	Suministro, transporte e instalación de piso para baño Estilo Cemento Tenerife 60.3x60.3 Taupe tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso (Baños administrativos)	3 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	$ 4.872.787,92
347	3,3	Suministro, transporte e instalación de guarda escobas para baño Estilo Cemento Tenerife 60.3x60.3 Taupe tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso (Baño s administrativos)	3 días	mar 26/12/23	jue 28/12/23	$ 2.368.716,35
348	**4,00**	**ENCHAPE BLOQUE PRINCIPAL**	**3 días**	**jue 21/12/23**	**mar 26/12/23**	**$ 6.052.311,98**
349	4,1	Suministro, transporte e instalación de enchape para baño Estilo Cemento Tenerife 60.3x60.3 Taupe tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso (Baño administrativo)	3 días	jue 21/12/23	mar 26/12/23	$ 6.052.311,98
350	**5,00**	**CIELO RASO BLOQUE PRINCIPAL**	**3 días**	**jue 21/03/24**	**lun 25/03/24**	**$ 2.182.380,20**
351	5,1	Suministro e instalación tapas de inspección 60x60cm en cielo raso. Marco en Aluminio la tapa debe ser de superboard. Incluye perforación de cielo raso. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. (Oficina)	3 días	jue 21/03/24	lun 25/03/24	$ 2.182.380,20
352	**6,00**	**PUERTAS BLOQUE PRINCIPAL**	**3 días**	**mar 26/03/24**	**jue 28/03/24**	**$ 71.299.652,19**
353	6,1	Suministro e instalación de puerta en en lámina galvanizada cal 18, puerta lisa 2 hojas con persiana en la parte superior de la puerta.Medidas Ancho 1.00 x2.20m (Verificar Medidas). Puerta de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correct	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 4.346.210,31
354	6,2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de seguridad incoloro de 10mm de espesor. Medidas aprox: 1.00x2.30m (incluye herrajes, riel, chapa de seguridad y todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento en acero inoxidable. Inc	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 19.632.698,80
355	6,3	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de seguridad incoloro de 10mm de espesor. Medidas aprox: 2.75x2.30m (incluye herrajes, riel, chapa de seguridad y todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento en acero inoxidable. Inc	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 18.383.640,60
356	6,4	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de seguridad incoloro de 10mm de espesor. Medidas aprox: 2.85x2.30m (incluye herrajes, riel, chapa de seguridad y todos los accesorios para el correcto montaje y funcionamiento en acero inoxidable. Inc	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 6.587.430,20
357	6,5	Suministro e instalación de puerta en en lámina galvanizada cal 18, puerta lisa 1 hoja con persiana en la parte superior de la puerta.Medidas Ancho 1.00 x2.20m (Verificar Medidas). Puerta de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 1.874.835,82
358	6,6	Suministro e instalación de puerta en en lámina galvanizada cal 18, puerta lisa 1 hoja con persiana en la parte superior de la puerta.Medidas Ancho 1.00 x2.20m (Verificar Medidas). Puerta de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 1.874.835,82
359	6,7	Suministro e Instalación Divisiones sanitarias formadas por paneles en acero inoxidable con acabado satinado y con inyección en poliuretano de alta densidad para darles una resitencia adicional al panel. Espesor de panel de 12 mm, este espesor optimiza el	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 18.600.000,64
360	**7,00**	**APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES BLOQUE PRINCIPAL**	**8 días**	**vie 29/12/23**	**mié 10/01/24**	**$ 7.146.266,40**
361	7,1	Suministro, transporte e instalación Sanitario Montecarlo Advance Tecnología MaxiClean (Limpieza fácil y duradera) Sistema de accionamiento botón single tipo push Asiento cierre suave para mayor comodidad y protección Sistema de Taza Rimless (Sin Anillo)	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 3.723.584,80
362	7,2	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos CORONA San LORENZO para Incrustar Blanco y/o similar. medidas son de 19 1/4" x 16 3/8" (49 cm x 41.5 cm), mientras que el pozo es de 15 1/2" x 10 5/8" (39.5 cm x 27 cm) de longitud. Incluye todos los acces	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 1.374.750,00
363	7,3	Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Monocontrol Ganamax Basic Acabado superior, mayor espesor en el cromado.Manija ergonómica.Recubrimientos no tóxicos tipo Corona y/o similar.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 724.989,20
364	7,4	Suministro instalación de Rejilla Piso Vanguar 10X10 cm 11/2 -3P tipo grival y/o similar	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 100.588,80
365	7,5	Suministro e instalación de Dispensador de Jabón Líquido y Gel Institucional 1000ml tipo Familia y/o similar	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 243.383,40
366	7,6	Suministro e instalación de Dispensador de Papel Higiénico Acero Inoxidable tipo grival y/o similar	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 636.058,80
367	7,7	Suministro e instalación de Dispensador de Toalla de manos Doblada en Z Luxury tipo familia y/o similar	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 342.911,40
368	**8,00**	**MESONES BLOQUE PRINCIPAL**	**4 días**	**mar 26/12/23**	**vie 29/12/23**	**$ 3.708.228,16**
369	8,1	Suministro e Instalación Mesón en quarztone statuario extra blanco polar y/o similar 20mm de espesor y brillado,ancho:0.60m con faldón hacia la cara frontal, h=10cm, salpicadero 0.07m, para baños. Incluye soporte a pared con accesorios y perforación de la	4 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	$ 3.708.228,16
370	**9,00**	**ESPEJOS BLOQUE PRINCIPAL**	**3 días**	**vie 29/12/23**	**jue 4/01/24**	**$ 1.836.107,52**
371	9,1	Suministro e instalación de espejo flotado de 3 mm o similar h:1.50, ancho:1.60m , la dilatación de los laterales deberán tener un espacio libre de 20 mm , no deben presentar ningún tipo de ondulación o imperfección que distorsionen el reflejo.Con área li	3 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 1.836.107,52
372	**10,00**	**PAÑETE ESTUCO Y PINTURA BLOQUE PRINCIPAL**	**8 días**	**jue 21/12/23**	**mar 2/01/24**	**$ 87.363.074,51**
373	10,1	Suministro y Aplicación de pañete sobre interno y espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.(áreas administrativas y recepción)	3 días	jue 21/12/23	mar 26/12/23	$ 2.706.365,61
374	10,2	Suministro y Aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros de fachadas espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.Fachada	4 días	jue 21/12/23	mié 27/12/23	$ 4.704.316,50
375	10,3	Suministro y Aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros de fachadas espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.Fachada	4 días	jue 21/12/23	mié 27/12/23	$ 8.301.735,00
376	10,4	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 blanca a tres manos en cieloraso en áreas que se requiera de pasillos. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presenta en cieloraso con masilla, romeral y darles un acabado en pintura cieloraso tipo pintu	4 días	jue 21/12/23	mié 27/12/23	$ 5.979.215,71
377	10,5	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 blanca a tres manos muros de pasillo y área de recepción. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o similar incluye resanes, filo	4 días	jue 21/12/23	mié 27/12/23	$ 12.292.884,51
378	10,6	Suministro y aplicación de pintura tipo koraza blanca a tres manos muros para exteriores. Incluye imprimante. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o similar incluye res	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 6.109.434,63
379	10,7	Suministro y aplicación de pintura tipo koraza blanca a tres manos muros para exteriores. Incluye imprimante. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o similar incluye res	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 23.550.893,60
380	10,8	Suministro y aplicación de pintura tipo acrilica o koraza gris a tres manos para exteriores, aplicación para áreas como bordillos de cubiertas y ventanas. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 15.026.860,42
381	10,9	Suministro y aplicación de pintura tipo para baño blanca a tres manos muros y techo tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones.(Baños Área administrativa)	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 2.037.162,40
382	10,10	Suministro y aplicación de pintura tipo para cocina blanca a tres manos muros y techo tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones.(Cocina área administrativa)	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 2.455.508,25
383	10,11	Mantenimiento de pintura esmalte anticorrosiva para metal cerramiento en malla eslabonada aplicación. Se debe resanar los elementos de la malla por fisuras, color aluminio y/o institucional.Aplicación por compresor	4 días	mié 27/12/23	mar 2/01/24	$ 4.198.697,88
384	**11,00**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS BLOQUE PRINCIPAL**	**3 días**	**vie 29/12/23**	**mié 3/01/24**	**$ 310.389,30**
385	11,1	Regatas para redes hidráulica en muros y piso (Incluye Resane, mortero 1:3, estuco y pintura, tres manos)(Baño)	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 240.857,50
386	11,2	Cancelación Punto sanitario pvc de 2" o 3" (6 m). Incluye movimiento de punto desague al sitio del sanitario.(Baño)	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 42.751,80
387	11,3	Cancelación Punto hidráulico pvc de 1/2" (6 m). Incluye movimiento de punto hidraulico al sitio del lavamanos.(Baño)	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 26.780,00
388	**12,00**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS TABLERO PRINCIPAL**	**24 días**	**lun 4/12/23**	**jue 4/01/24**	**$ 139.359.785,50**
389	12,1	Suministro e instalación de tablero general de distribución, incluye gabinete metálico de 200 A, incluye gabinete metálico, protección de entrada, tres salidas, by-pass para regulador y espacio para reservas. Certificado de confirmodad de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 11.871.282,80
390	12,2	Suministro e instalación de regulador de tensión de 50 kVA, incluye cableado, terminales y demás elementos para su correcta instalación. Certificado de conformidad de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 11.871.282,80
391	12,3	Suministro e Instalación de tubería EMT de 2-1/2", incluye uniones, teminales, codos, banda naranja y demás elementos para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 10.507.770,00
392	12,4	Suministro e instalación de circuito trifásico F:3x2/0+N:1x2/0+T:1x6 AWG AL S8000 THHN, incluye terminales, marcación y demás elementos para su instalación. Incluye certificado de conformidad	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 9.062.690,00
393	12,5	Suminstro e instalación de caja de paso metálica de 20x20 cm con tapa, incluye elementos de fijación, marcación y demás elementos para su correcta instalación. Certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 145.277,60
394	12,6	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para transformador, incluye conductor en Cu 2 AWG o fleje, terminales, caja de inspección de 30x30 cm, electrodo de puesta a tierra de 5/8" 2,4 m, conexiones y demás elementos para su correcta instala	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 465.028,20
395	12,7	Suminstro e instalación de DPS de 80 kA 230 V 4 hilos T1-T2, incluye riel, cableado, conexiones y demás elementos para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 2.030.106,00

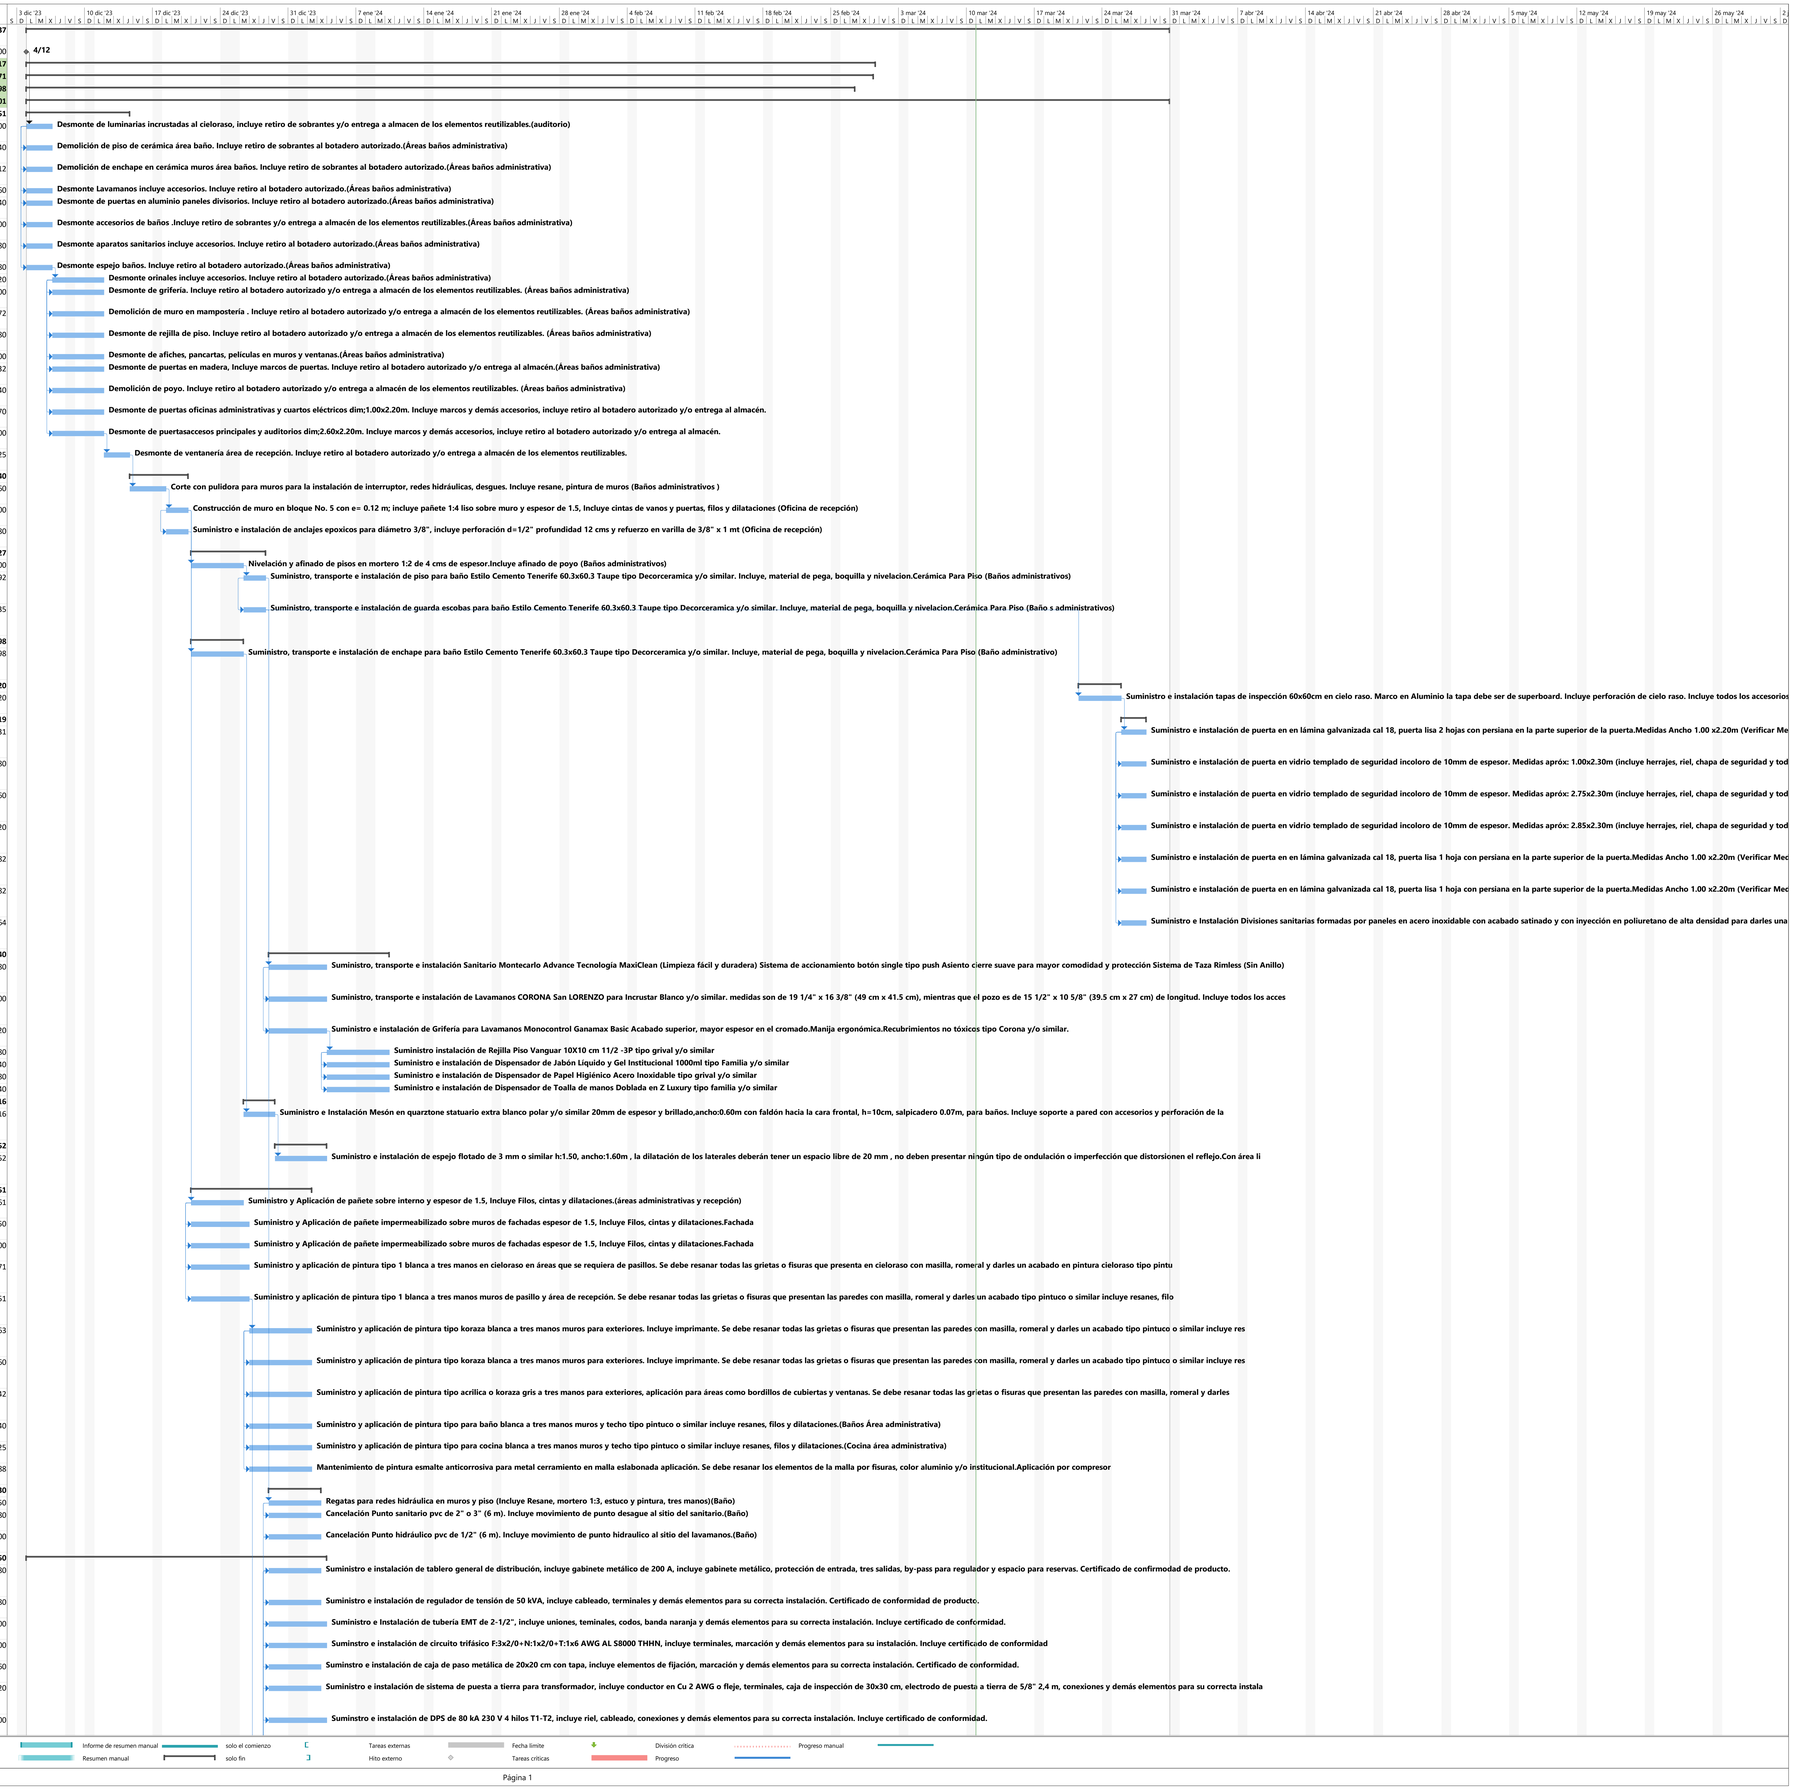

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
396		**Tableros de distribución cuarto rack**	0 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 0,00
397	12,8	Suministro e instalación de tablero trifásico metálico de 24 circuitos y espacio para totalizador, incluye marcación, elementos de sujeción, barrajes de tierra y neutro y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 800.670,00
398	12,9	Suministro e instalación de UPS de 10 kVA trifásica, tablero bypass, cableado de conexión de entrada y salida, proteciones y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. Certificado de conformidad de producto.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 28.641.444,00
399	12,10	Suministro e instalación de breaker industrial trifásico regulable Imax 160 A 50 kVA, incluye elementos de fijación y conexionado. Certificado de conformidad de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 1.133.148,90
400	12,11	Suministro e instalación de breaker industrial trifásico 40 A 50 kVA para totalizador tablero regulado, incluye elementos de fijación y conexionado. Certificado de conformidad de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 391.760,20
401	12,12	Suministro e instalación de breaker monofásico de 20 A 15 kA, enchufable, incluye conexionado y demás elementos para su correcta instalación. Certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 599.794,00
402	12,13	Suministro e instalación de circuito trifásico F:3x8+N:1x8+T:1x10 AWG Cu THHN-THWN, incluye terminales, marcación y demás elementos para su instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 622.128,00
403		**Adecuaciones eléctricas en las oficinas**	0 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 0,00
404	12,14	Suministro e instalación de ducto portacable de 20x6 cm con tapa, incluye accesorios según trazado en plano, conductor desnudo, riel soporte, tornillo sin/fin, adaptadores para salidas de tubería y demás accesorios para su correcta instalación. Certificado	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 7.769.060,00
405	12,15	Suministro e instalación de canaleta metálica de 12x5 cm con división, incluye troqueles para tomas normal, regulada y datos, tapa, elementos de anclaje y demás para su correcta instalación.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 13.907.660,00
406	12,16	Suministro e Instalación de tubería EMT de 3/4"", incluye uniones, teminales, codos, banda naranja y demás elementos para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 12.393.745,00
407	12,17	Suministro e instalación de luminaria de 60x60 cm LED de 40 W 6500 K 120 V, incluye elementos de sujeción, caja rawell 5800 y demás para su correcta instalación. Incluye certificado de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 6.682.312,00
408	12,18	Suministro e instalación de luminaria redonda de 24 W LED 6500 K 120 V, incluye elementos de sujeción, caja rawell 5800 y demás para su correcta instalación. Incluye certificado de producto	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 1.554.202,00
409	12,19	Suministro e instalación de tomacorriente doble de 15 A, elementos de fijación y demás para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 1.459.510,00
410	12,20	Suministro e instalación de tomacorriente naranja doble de 15 A, elementos de fijación y demás para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 1.362.036,00
411	12,21	Suministro e instalación de interruptor para iluminación sencillo, doble o triple incluye caja rawell 5800, elementos de fijación y demás para su correcta instalación. Incluye certificado de conformidad.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 952.458,00
412	12,22	Suministro e instalación de circuito monofásico (fase roja normal) F:1x12+N:1x12+T:1x12 AWG THHN-THWN, incluye terminales, marcación, código de colores y demás elementos para su correcta instalación. Incluye certificado de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 10.214.620,00
413	12,23	Suministro e instalación de circuito monofásico (fase azul regulado) F:1x12+N:1x12+T:1x12 AWG THHN-THWN, incluye terminales, marcación, código de colores y demás elementos para su correcta instalación. Incluye certificado de producto.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 4.921.800,00
414	**13,00**	**CUBIERTA BLOQUE PRINCIPAL**	**4 días**	**mié 3/01/24**	**mar 9/01/24**	**$ 5.862.844,00**
415	13,1	Desmonte de cubierta en policarbonato portería. Incluye retiro	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 236.145,00
416	13,2	Suministro e instalación de teja policarbonato de 6mm y/o similar con mejor calidad, garantía, resistencia y durabilidad. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.(Verficar dimensiones).	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 4.098.315,00
417	13,3	Mantenimiento de pintura esmalte anticorrosiva para metal color depende la estructura. Se debe resanar los elementos por fisuras.Aplicación por compresor	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 1.256.060,00
418	13,4	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal 26. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	4 días	mié 3/01/24	mar 9/01/24	$ 272.324,00
419	**14,00**	**BLOQUE PLANTA ELÉCTRICA Y TABLEROS**	**39 días**	**vie 29/12/23**	**jue 15/02/24**	**$ 34.813.059,32**
420	14,1	Desmonte de cubierta en asbesto cemento.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 184.760,68
421	14,2	Desmonte de canal. Incluye desmonte de accesorios y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 40.341,60
422	14,3	Desmonte de cerchas de cubierta. Incluye desmonte de accesorios y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 293.857,20
423	14,4	Desmonte de puertas, incluye marcos y todos los accesorios de la puerta en áreas tableros y planta eléctrica. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 43.360,20
424	14,5	Desmonte de puertas, incluye marcos y todos los accesorios de la puerta en áreas de basura y área eléctrica 2. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 73.504,60
425	14,6	Suministro e instalación Cubierta sandwich tipo kingRoof con aislante en polisocianuro pir safe clase I retardante al fuego espesor 18mm lamina externa en acero Ca. 16, lamina interna en foil vinil.Incluye todos los elementos, accesorios, tapas para su co	3 días	lun 12/02/24	jue 15/02/24	$ 5.533.585,20
426	14,7	Suministro e instalación de Tubería 90 x 50 x 2.5mm x 6m estructural HR50	3 días	mié 3/01/24	vie 5/01/24	$ 9.045.784,80
427	14,8	Suministro e instalación de Pintura con esmalte blanca en lámina para la estructura de la cubierta	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 470.901,60
428	14,9	Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm. Incluye anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.803.838,40
429	14,10	Suministro e instalación de Mortero autonivelante en muros perimetrales e internos para la instalación de cubierta.	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.066.665,60
430	14,11	Bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 3"	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 915.031,00
431	14,12	Flanche en lámina galvanizada Cal. 26, para muros laterales de fachada	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 272.324,00
432	14,13	Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:2 de 4 cms de espesor.Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado. (Planta eléctrica)	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 292.743,36
433	14,14	Suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada cal 18 tipo celosía 1 hoja.Medidas Ancho 1.00 x2.20m (Verificar Medidas). Puertas de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, cerradura de segur	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.960.055,63
434	14,15	Suministro e instalación de puerta en en lámina galvanizada cal 18, puerta lisa 1 hoja.Medidas Ancho 1.00 x2.20m (Verificar Medidas). Puertas de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, cerradura de se	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.960.055,63
435	14,16	Suministro y Aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros de fachadas espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.Fachada	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.771.036,80
436	14,17	Suministro y Aplicación de pañete sobre muro y espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones (área tableros, planta eléctrica)	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 373.308,00
437	14,18	Suministro y aplicación de pintura tipo koraza blanca a tres manos muros para exteriores y área de tableros. Incluye imprimante. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 5.005.091,52
438	14,19	Suministro y aplicación de pintura epóxica blanca a tres manos muros tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones. (área planta eléctrica)	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 1.853.737,60
439	14,20	Suministro y aplicación de pintura epóxica blanca para piso tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones. (área planta eléctrica)	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 633.519,90
440	14,21	Nivelación y afinado de anden y escaleras, mortero autonivelante e:5mm	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 975.312,00
441	14,22	Limpieza de andenes, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, y aplicación de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa con hidrolavadora, de trás de edificación. (Área cuartos e	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 180.622,00
442	14,23	Reinstalación de tapa de tablero, debe instalarse correctamentamente las puertas.	3 días	sáb 6/01/24	jue 11/01/24	$ 63.622,00
443	**15,00**	**BLOQUE ALMACÉN**	**97,25 días**	**lun 4/12/23**	**sáb 30/03/24**	**$ 196.251.432,27**
444	15,1	Desmonte de cubierta en asbesto cemento.Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 1.813.232,72
445	15,2	Desmonte de canal. Incluye desmonte de accesorios y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 151.281,00
446	15,3	Desmonte de cerchas de cubierta. Incluye desmonte de accesorios y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 1.469.286,00
447	15,4	Demolición de piso de cerámica área baño. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 32.423,56
448	15,5	Demolición de enchape en cerámica muros área baños. Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 52.159,64
449	15,6	Desmonte Lavamanos incluye accesorios. Incluye retiro al botadero autorizado.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 22.175,40
450	15,7	Desmonte accesorios de baños .Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 20.761,00
451	15,8	Desmonte aparatos sanitarios incluye accesorios. Incluye retiro al botadero autorizado.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 31.738,20
452	15,9	Desmonte espejo baños. Incluye retiro al botadero autorizado.	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 5.894,20
453	15,10	Desmonte de grifería. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables. (Baño, poceta oficina)	4 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 53.019,20
454	15,11	Desmonte de ventanería de fachada. Incluye desmonte de accesorios y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 368.856,15
455	15,12	Desmonte de puertas, incluye marcos y todos los accesorios de la puerta. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 151.760,70
456	15,13	Desmonte de puerta 1.80x2.20m archivo, incluye marcos y todos los accesorios de la puerta. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega al almacén.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 43.210,70
457	15,14	Desmonte de cortina	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 5.012,80
458	15,15	Demolición de mesón en granito. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 147.134,20
459	15,16	Demolición de enchape en cerámica oficina bloque almacén . Incluye retiro de sobrantes al botadero autorizado.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 76.829,74
460	15,17	Demolición de mampostería de mesón. Incluye guardaescobas y retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 90.807,60
461	15,18	Cancelación Punto desgue pvc de 2" o 3" (6 m).(poceta)	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 42.751,80
462	15,19	Cancelación Punto hidráulico pvc de 1/2" (6 m) lavaplatos.(poceta)	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 26.780,00
463	15,20	Demolición puertas de madera inferiores h: 0.5m.Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 30.217,53
464	15,21	Desmonte de luminarias.Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 244.951,20
465	15,22	Desmonte de tapete.Incluye retiro de sobrantes y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 111.852,00
466	15,23	Desmonte de rejilla de piso. Incluye retiro al botadero autorizado y/o entrega a almacén de los elementos reutilizables.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 7.290,40
467	15,24	Remoción de vegetación en área de anden y escaleras. Incluye retiro al botadero autorizado	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 643.890,00
468	15,25	Corte con pulidora para muros para la instalación de interruptor, redes hidráulicas, desgues, tomas.	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 237.016,00
469	15,26	Nivelación y afinado de pisos en mortero 1:2 de 4 cms de espesor.Incluye afinado de poyo (Baños y bodegas)	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 871.260,00
470	15,27	Suministro, transporte e instalación de piso y enchape de muros para baño Estilo Cemento Tenerife 60.3x60.3 Taupe tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso (Baños)	4 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	$ 1.778.954,32
471	15,28	Suministro, transporte e instalación de guarda escobas para baño Estilo Cemento Tenerife 60.3x60.3 Taupe tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso (Baños)	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 483.411,50
472	15,29	Suministro, transporte e instalación de piso para bodegas y resanes de oficina Estilo cerámica 50x50 deberá ser similar a la instalada tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 3.989.050,00
473	15,30	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas para bodegas y resanes de oficina Estilo cerámica 50x50 deberá ser similar a la instalada tipo Decorceramica y/o similar. Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Cerámica Para Piso	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 3.191.240,00
474	15,31	Suministro e instalación de techo continuo en superboard 6mm incluye la totalidad de los accesorios necesarios para su correcta instalación, incluye las perforaciones y resanes. (bodegas)	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 1.734.538,00
475	15,32	Suministro e instalación tapas de inspección 60x60cm en cielo raso. Marco en Aluminio la tapa debe ser de superboard. Incluye perforación de cielo raso. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. (1 por espacio)	4 días	mar 26/03/24	sáb 30/03/24	$ 1.388.787,40
476	15,33	Suministro e instalación de puerta en aluminio 1 hoja.Medidas Ancho 0.85 x2.20m (Verificar Medidas). Puertas de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye gato hidráulico, manija tipo pesado, marc	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 12.193.727,00
477	15,34	Suministro e instalación de puerta en aluminio 1 hoja.Medidas Ancho 1.80 x2.20m (Verificar Medidas). Puertas de 1 hoja .Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye gato hidráulico, manija tipo pesado, marc	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 2.986.061,00
478	15,35	Suministro, transporte e instalación Sanitario Montecarlo Advance Tecnología MaxiClean (Limpieza fácil y duradera) Sistema de accionamiento botón single tipo push Asiento cierre suave para mayor comodidad y protección Sistema de Taza Rimless (Sin Anillo)	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 930.896,20

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
479	15,36	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos CORONA San LORENZO para Incrustar Blanco y/o similar. medidas son de 19 1/4" x 16 3/8" (49 cm x 41.5 cm), mientras que el pozo es de 15 1/2" x 10 5/8" (39.5 cm x 27 cm) de longitud. Incluye todos los acces	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 343.687,50
480	15,37	Suministro e instalación de Grifería para Lavamanos Monocontrol Ganamax Basic Acabado superior, mayor espesor en el cromado.Manija ergonómica.Recubrimientos no tóxicos tipo Corona y/o similar.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 183.588,60
481	15,38	Suministro instalación de ducha sencilla solid cromo con mezclador y/o similar. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 218.086,70
482	15,39	Suministro instalación de Rejilla Piso Vanguar 10X10 cm 11/2 -3P tipo grival y/o similar	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 50.294,40
483	15,40	Suministro e instalación de Dispensador de Jabón Líquido y Gel Institucional 1000ml tipo Familia y/o similar	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 121.691,70
484	15,41	Suministro e instalación de Dispensador de Papel Higiénico Acero Inoxidable tipo grival y/o similar	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 159.014,70
485	15,42	Suministro e instalación de Dispensador de Toalla de manos Doblada en Z Luxury tipo familia y/o similar	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 171.455,70
486	15,43	Suministro e Instalación Mesón en quarztone statuario extra blanco polar y/o similar 20mm de espesor y brillado,ancho:0.60m con faldón hacia la cara frontal, h=10cm, salpicadero 0.07m, para baños. Incluye soporte a pared con accesorios y perforación de la	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 927.057,04
487	15,44	Suministro e instalación de espejo flotado de 3 mm o similar h:1.50, ancho:0.80m , la dilatación de los laterales deberán tener un espacio libre de 20 mm , no deben presentar ningún tipo de ondulación o imperfección que distorsionen el reflejo.Con área li	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 459.026,88
488	15,45	Suministro e instalación de ventanería marco en aluminio y vidrio 4mm. Ventana dividida a 2 cuerpos. Compuesto por 1 cuerpo fijo y el segundo corrediza. Incluye cerradura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 12.114.407,76
489	15,46	Suministro e instalación de malla antimosquitos. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 380.308,50
490	15,47	Reinstalación de cortina.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 17.218,50
491	15,48	Suministro y Aplicación de pañete impermeabilizado sobre muros de fachadas y oficina de entrepaños y espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.Fachada	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 2.767.245,00
492	15,49	Suministro y Aplicación de pañete sobre muro y espesor de 1.5, Incluye Filos, cintas y dilataciones.	4 días	mié 10/01/24	lun 15/01/24	$ 1.011.042,50
493	15,50	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 blanca a tres manos para cieloraso. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presenta en cieloraso con masilla, romeral y darles un acabado en pintura cieloraso tipo pintuco o similar incluye resanes, filos	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 2.212.078,70
494	15,51	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 blanca a tres manos muros. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones (área interna)	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 10.079.815,33
495	15,52	Suministro y aplicación de pintura tipo koraza blanca a tres manos muros para exteriores. Incluye imprimante. Se debe resanar todas las grietas o fisuras que presentan las paredes con masilla, romeral y darles un acabado tipo pintuco o similar incluye res	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 11.585.860,00
496	15,53	Suministro y aplicación de pintura tipo para baño blanca a tres manos muros y techo tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 909.447,50
497	15,54	Suministro y aplicación de pintura epóxica blanca a tres manos muros tipo pintuco o similar incluye resanes, filos y dilataciones.Oficina de entrepaños.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 368.641,00
498	15,55	Regatas para redes eléctricas en techo (Incluye Resane, mortero 1:3, estuco y pintura, tres manos)	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 1.380.424,50
499	15,56	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel LED de sobreponer o incrustar en techo, con montaje opcional para colgar con guayas, de uso interior, marco en aluminio anodizado, proyección uniforme de la luz, temperatura de color 6500 K (DL); acabado bl	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 1.702.118,60
500	15,57	Salida para iluminación. Incluye conexion con toma corriente doble y clavija, caja fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado en muros) y retiro de cableado existent	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 486.319,60
501	15,58	Reubicación Salida para toma corriente doble, con polo a tierra (Tomacorriente blanco, tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios de fijación,Ductos PVC (En	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 692.027,70
502	15,59	Suministro e instalación de pasacables para piso. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 427.085,10
503	15,60	Suministro e instalación Cubierta sandwich tipo kingRoof con aislante en polisocianuro pir safe clase I retardante al fuego espesor 18mm lamina externa en acero Ca. 16, lamina interna en foil vinil.Incluye todos los elementos, accesorios, tapas para su co	4 días	sáb 17/02/24	jue 22/02/24	$ 52.261.638,00
504	15,61	Suministro e instalación de Tubería 90 x 50 x 2.5mm x 6m estructural HR50	4 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	$ 43.344.385,50
505	15,62	Suministro e instalación de Pintura con esmalte blanca en lámina para la estructura de la cubierta	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 4.447.404,00
506	15,63	Suministro e instalación de Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm. Incluye anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 3.092.294,40
507	15,64	Suministro e instalación de Mortero autonivelante en muros perimetrales e internos para la instalación de cubierta.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 3.244.441,20
508	15,65	Bajante de aguas lluvias en tubería de PVC de 3"	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 2.287.577,50
509	15,66	Nivelación y afinado de anden y escaleras, mortero autonivelante e:5mm	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 2.925.936,00
510	15,67	Limpieza de andenes, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, y aplicación de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa con hidrolavadora, de trás de edificación.	4 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24	$ 451.555,00
511	**16,00**	**PARQUEADERO**	**77,38 días**	**mié 27/12/23**	**jue 28/03/24**	**$ 69.641.310,38**
512	16,1	Desmonte de cubierta parqueadero. Incluye retiro	3 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23	$ 551.005,00
513	16,2	Limpieza y descapote de terreno Dim:20.50x6.00m. Incluye remoción de material organico y vegetal. Incluye al botadero autorizado.	3 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23	$ 1.583.969,40
514	16,3	Excavación de tierra Dim:20.50x6.00mx0.20m, para construcción de placa maciza parqueadero. Incluye al botadero autorizado.	3 días	mié 27/12/23	vie 29/12/23	$ 1.182.876,24
515	16,4	Solado en concreto de 11.7Mpa para parqueadero.	3 días	vie 29/12/23	jue 4/01/24	$ 13.422.965,40
516	16,5	Base granular tipo invias	3 días	jue 4/01/24	mar 9/01/24	$ 7.254.247,26
517	16,6	Malla electrosoldada 8.5 mm 15x15 cm	3 días	mar 9/01/24	vie 12/01/24	$ 9.973.762,50
518	16,7	Placa maciza en concreto de 20.7 Mpa, e= 0.15 m	3 días	jue 21/03/24	lun 25/03/24	$ 23.161.515,00
519	16,8	Suministro e instalación de teja termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco en áreas afectadas de cubierta 1.07 x 5.90 Mts y/o similar con mejor calidad, garantía, resistencia y durabilidad. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.(Verficar	3 días	jue 21/03/24	lun 25/03/24	$ 8.584.212,00
520	16,9	Mantenimiento de pintura esmalte anticorrosiva para metal color verde institucional estructura de parqueadero. Se debe resanar los elementos por fisuras.Aplicación por compresor	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	$ 3.926.757,58
521	**17,00**	**CASINO**	**32 días**	**mié 17/01/24**	**jue 22/02/24**	**$ 11.368.203,60**
522	17,1	Desmonte de cubierta casino. Incluye retiro	8 días	mié 17/01/24	jue 25/01/24	$ 188.916,00
523	17,2	Limpieza y descapote de terreno. Incluye remoción de material organico y vegetal. Incluye al botadero autorizado.	8 días	mié 17/01/24	jue 25/01/24	$ 334.822,80
524	17,3	Nivelación y afinado de placa casino e: 20mm	8 días	jue 25/01/24	lun 5/02/24	$ 1.267.905,60
525	17,4	Suministro, transporte e instalación de piso tipo losetas en barro color terracota 30x30 . Incluye, material de pega, boquilla y nivelacion.Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	8 días	lun 5/02/24	mar 13/02/24	$ 4.493.743,80
526	17,5	Suministro e instalación de teja termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco en áreas afectadas de cubierta 1.07 x 5.90 Mts y/o similar con mejor calidad, garantía, resistencia y durabilidad. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación.(Verficar	8 días	vie 9/02/24	mar 20/02/24	$ 4.292.106,00
527	17,6	Suministro e instalación de caballete en teja termoacustica	8 días	mié 14/02/24	jue 22/02/24	$ 790.709,40
528	**18,00**	**VARIOS**	**5 días**	**vie 16/02/24**	**jue 22/02/24**	**$ 9.848.572,50**
529	18,1	Aseo general y limpieza de Áreas intervenidas.	5 días	vie 16/02/24	jue 22/02/24	$ 7.554.690,00
530	18,2	Cargue manual y retiro de escombros volqueta 7m3.Incluye certificado a la escombrera autorizada.Incluye certificados.	5 días	vie 16/02/24	jue 22/02/24	$ 2.293.882,50
531		IVA 19%	0 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 10.696.361,50
532		**FIN DE OBRA**	0 días	vie 29/12/23	vie 29/12/23	$ 0,00

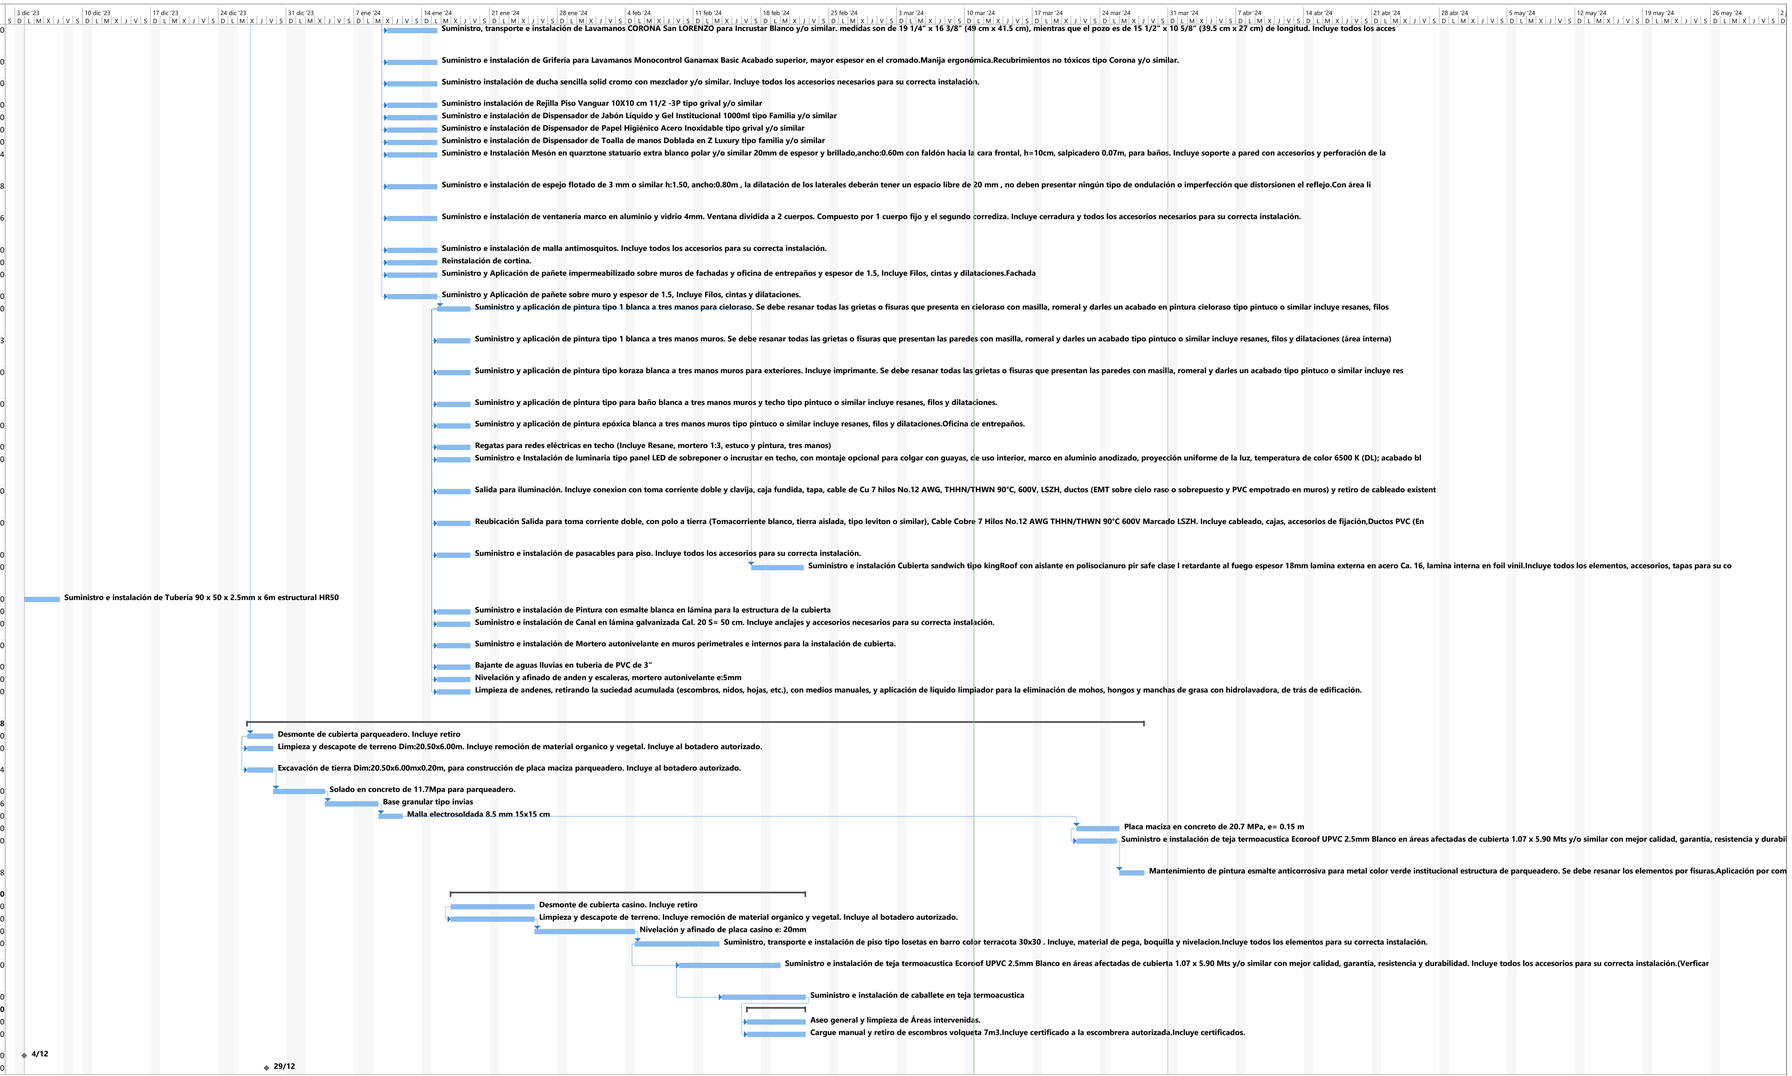

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

Proyecto: PROGRAMA IE Benjamín Herrera
Fecha: lun 11/03/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
