Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA RESOLUCIÓN 4272 DE 2022				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 1	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	1 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ALTURA DE LA ESTRUCTURA	8 M	**Especificación Material:**	ACERO GALVANZADO
Accesorios de instalación	N/A	**Estado de la superficie:**	GALVANIZADOEN CALIENTE
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	PLACA DE CONCRETO REFORZADA
Uso permitido	1 Usuario	**Lote-Serie**	NA

MANTENIMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



superficie sucia



Tornilleria deteriorada



Cambio de tornilleria y retorqueo



Lavado estructura



Superficie final



Superficie final

observaciones

1.	**ALCANCE**	1.Inspección, lavado y limpieza – Norma SSPC-SP – en todas las estructuras metálicas de vigas, escalera, plataformas y demás componentes que la constituyan. Consiste en: Eliminación de impurezas, preparación de superficie, cambio de tornillería, soldadura de refuerzo, galvanizado en frio en conexiones y pintar estructura.
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	LA ESTRUCTURA SE ENCONTRABA CON EL DETERIORO NORMAL DE UNA ESTRUCTURA EXPUESTA CONDICIONES CLIMATICAS, CON ALGUNA STRAZAS DE OXIDO Y RESIDUOS DE MATERAIL VEGETAL COMO MOHO
3.	**PROCEDIMIENTO APLICADO**	Limpieza bajo norma SPSC SP 2: Limpieza con herraminetas manuales: se Usó grata manual con cerdas de bronce, cepillo y paños en zonas donde la acumulación de moho requeria y en zonas donde la aparicon de oxidos menores era evidente, esto a un 40% de la estructura dado el nivel de conservacion del 60% restantes que no la hacian necesaria
		Limpieza bajo norma SPSC SP 1: Limpieza con solventes: Se utiliza emulcion jabonosa con jabon comercial liquido para remover en el 100% de la estructura residuos de grasa y del proceso SPSC SP 2
		Limpieza final con agua 100% a presion con hidrolavadora y cepillo, para quitar residuos de solucion jabonosa
		Verificacion de tornilleria y cambio de componentes oxidados, con retorqueo del 100% de la tornilleria de la estructura en niveles de entre 50 y 70 Knm conforme a especificaciones de pretension para cada uno de los diametros requeridos de perno
		Aplicación de primer Zink PRIMER Pintu Bleer con catalizador en 100% de la estructura eliminando trazas de oxidaxion que fueron removidas en los procesos de limpieza SPSC SP 1 y 2 y con menos de 0,5 cm2 de area
		Aplicación de esmalte epoxico al 100% de la estructura Epoxibler esmalte polimerico conforme a ficha técnica del producto con catalizador garantizando un cubrimiento al 100% de la estructura
		No se hace necesaria la aplicación de resoldeos en la estructura dado el nivel de conservacion que esta presenta y la no existencia de fallas en los cordones existentes

4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	DIC DE 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**SPSC SP 1 - SPSC 2 - RESOLUCIÓN 4272 2022 MINISTERIO DEL TRABAJO**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 28-12-2023

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	**PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA** **RESOLUCIÓN 4272 DE 2022**				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 1	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	1 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ALTURA DE LA ESTRUCTURA	8 M	**Especificación Material:**	ACERO GALVANZADO
Accesorios de instalación	N/A	**Estado de la superficie:**	GALVANIZADOEN CALIENTE
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	PLACA DE CONCRETO REFORZADA
Uso permitido	1 Usuario	**Lote-Serie**	NA

Pintura

REGISTRO FOTOGRÁFICO



superficie sucia



Tornilleria deteriorada



Cambio de tornilleria y retorqueo



Lavado estructura



Superficie final



Superficie final



Proceso de pintura




Proceso de pintura




Proceso de pintura



Proceso de pintura

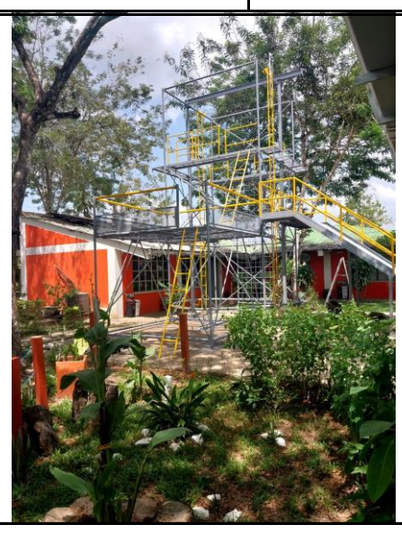

Proceso de pintura

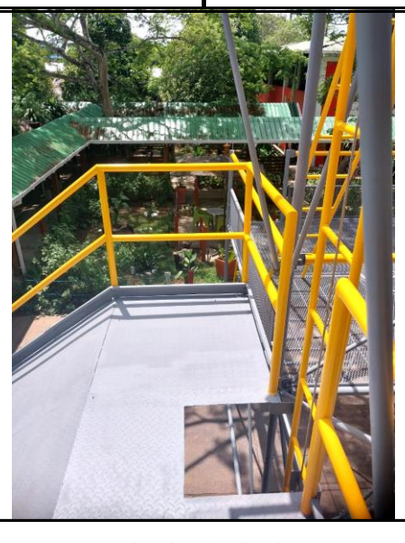

Acabado final



Acabado final



Acabado final

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN		
APROVADOR POR	CERTIFICADO POR  NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN **PERSONA CALIFICADA** **LIC. PROFESIONAL CN 230-68905** **FECHA: 28-12-2023**	**ESTADO: CONFORME**

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA RESOLUCIÓN 4272 DE 2022				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 2	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	2 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE



Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA


ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ALTURA DE LA ESTRUCTURA	8 M	**Especificación Material:**	ACERO GALVANZADO/ COBRE
Accesorios de instalación	SISTEMA POLO A TIERRA	**Estado de la superficie:**	GALVANIZADOEN CALIENTE
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	SUELO TRATADO PARA POLO A TIERRA
Uso permitido	NA	**Lote-Serie**	NA

PROTECCION ATMOSFERICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

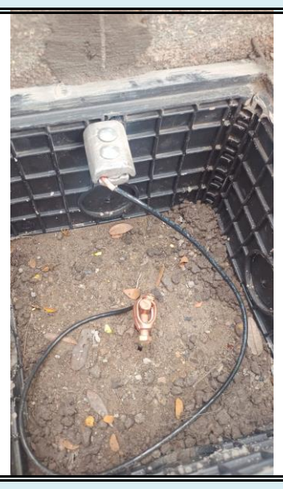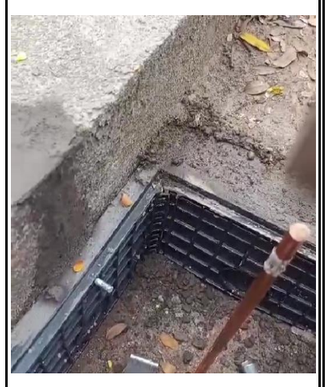observaciones

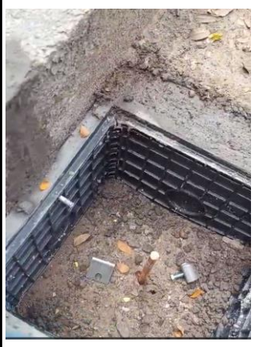1.	**PROCEDIMIENTO**	Adecuación del sistema de protección contra descargas atmosféricas. Consiste en: Punta captadora, conductores bajantes, conexión al sistema de puesta a tierra y caja de inspección.
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	LA ESTRUCTURA CARECIA DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ADMOSFERICAS, SE HACE INSTALACION DE SISTEMA FRANKLIM DE 5 PUNTAS, CABLE PARA POLO A TIERRA POLO A TIERRA EN VARILLA COPERWELD DE 2,5 M DE PROFUNDIDAD CON CAJA DE INSPECCION
	PROCEDIMIENTO	Preparacion de terreno para instalacion de caja de inspeccion y varilla coperweld de 5/8"x 2,5 m , consistente un aplicación de
		Intalación de cableado, accesorios, punta , varilla coperweld, caja de inspección y conexiones
		Medicion de conductivida, continuidad, resistencia (ver informe)
3.	**ACCESORIOS**	PUNTA FRANKLIM, CABLE No 4 en cobre, terminales, varilla coperweld de 2,5 m
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	dic-24
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**RESOLUCION 4272 DE 2021 / RETIE**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 29/06/2020

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA RESOLUCIÓN 4272 DE 2022				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 3	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	3 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE


Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ESTADO ESTRUCTURA	ESTRUCTURA PERNADA, PERNOS DE 3/8"A 1/2" ZINCADOS	**Especificación Material:**	TORNILLERIA GALVANIZADA
Accesorios de instalación	TORQUIMETRO	**Estado de la superficie:**	ZINCADO
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	NA
Uso permitido	NA	**Lote-Serie**	NA

MANTENIMIENTO TORNILLERIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

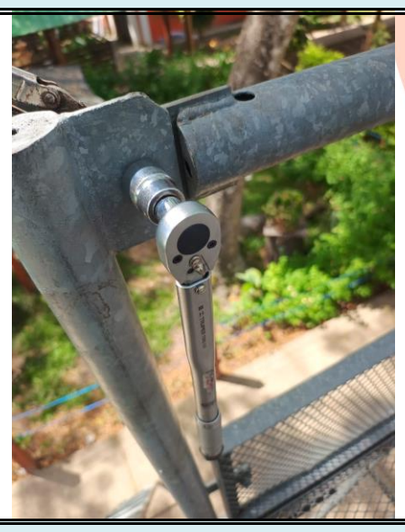



observaciones

1.	**PROCEDIMIENTO**	Verificación de estado de tornillería, abrazaderas y tuercas de la estructura de entrenamiento. Consiste en: Cambio de tornillería y piezas relacionadas.
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRABA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES ESTRUCTURALES, SE HACE RETORQUEO DEL 100% DE LOS TORNILLO S A 50 Nm y cambio del 100% de la tornilleria deteriorada
3.	**PROCEDIMIENTO APLICADO**	Validación visual de estado general de tornilleria
		Cambio de pernos oxidados 5% de componentes de la estructura
		Ajuste con llave y torquimetro al 100% de pernos de la estructura
		Validacion de ajuste de torque con uso de torquimetro a 50 a 70 KNm según diametro de perno
3.	**ACCESORIOS**	Llave inglesa, torquimetro
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	Dic de 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**RESOLUCIÓN 4272 2022 MINISTERIO DEL TRABAJO**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 29/06/2020

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA RESOLUCIÓN 4272 DE 2022				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 4	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	4 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE


Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA


ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ESTADO ESTRUCTURA	CARECE DE PLANO INLCINADO	**Especificación Material:**	ACERO ESTRUCTURAL
Accesorios de instalación	EQUIPOS OSLDADURA Y CORTE	**Estado de la superficie:**	PINTURA EPOXICA
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	PLACA CONCRETO REFORZDA
Uso permitido	4 PERSONAS	**Lote-Serie**	NA

PLANO INCLINADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

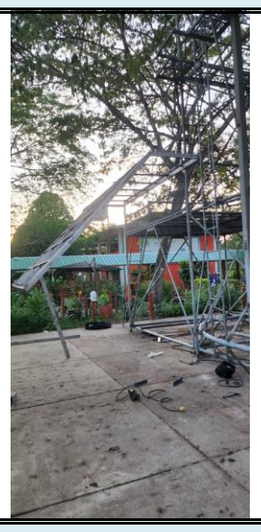
observaciones

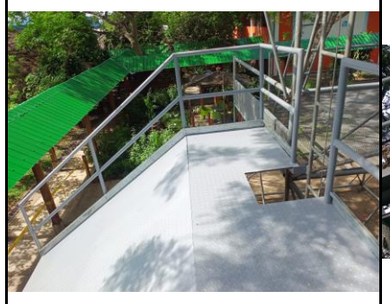1.	**PROCEDIMIENTO**	Suministro e instalación de plano inclinado. Consiste en: Bajo Resolución 4272 de 2021
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	Diseño, favibracion instalacion y suministro de 12 m2 de plano inclinado en lamina de alfajor, conforme Resolucion 4272 de 2021, material acero estructural en una inclinacion de 43 grados conforme a los pratametro de la resolucion. Con calapcidad portante maxima para 4 personas.Punts de anclaje, barandas y rodapies conforme a los sistemas de prevencion y proteccion contra caidas, acceso por escalera vertical a 1,5 m y 4,5 m
3.	**PROCEDIMIENTO APLICADO**	Diseño de plano inclinado según parametros de RES 4272 de 2021 12 m2 a 40 grados sobre la horizontal considerando espacio disponible
		Cortede materiales según planos de fabricación, apuntamiento para presentacion ante estructura existente, anclaje a piso con pernos 3/8 x 4" grado 2
		Resoldeo del 100% del plano inlcinado conforme especificaciones soldadura GMAW 6013 - 7018 cal 3/32 por persona competente en soldadura, cordones minimo de cateto 5 mm
		Limpieza SPSC SC 1 y 2 para quitra trazas de oxido y residuos de grasa asi como exesos de cascarilla de soldadura revestida
		Pintura en acabado epoxico base ancticorrosiva al 100% de la estructura. Primer Epoxico Bler y Catalizador primer epoxico Bler@, Epoxi bler@
3.	**ACCESORIOS**	Tuberia estructural de 40x 60 x 3 mm, TER 50x30x 2 mm, TER 1-1/2"x2,5 mm, Lamina alfajor en acero x 3 mm. Acabado en pitura industral epoxica. Equipo soldeo Lincoln 250. Primer Epoxico Bler y Catalizador primer epoxico Bler@, Epoxi bler@ aplicado con compresor y brocha
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	Dic de 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**SPSC 1 y 2 - AWS D1.1 - NTC 2071 - RESOLUCIÓN 4272 2022 MINISTERIO DEL TRABAJO**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

ESTADO: CONFORME

FECHA: 29/06/2020

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	**PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA** **RESOLUCIÓN 4272 DE 2022**				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 5	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	5 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	DIPALL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACIÓN LÍNEAS DE VIDA

Serie instalación	JGE 023	**Serie de fabricación**	210101/2303B091
Longitud efectiva de escalera	8 METROS	**Especificación Material:**	ACERO INOX 3/16"
Accesorios de instalación	Soprtes, tensor, absorvente, cable	**Estado de la superficie:**	inoxidable
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del cable**	INOX 5/16"
Uso permitido	1 Usuario	**Lote-Serie**	2303b091


LINEA DE VIDA VERTICAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO







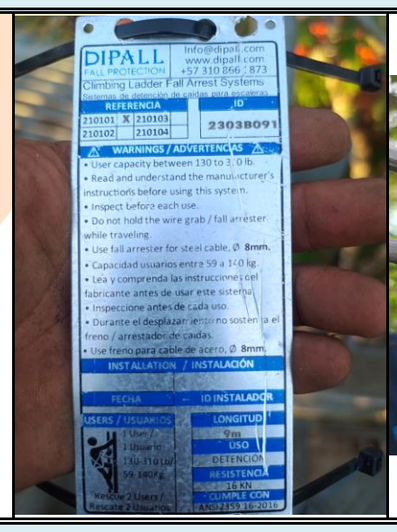



observaciones

1.	**PROCEDIMIENTO**	Suministro e instalación de línea de vida vertical. Consiste en: Bajo norma ANSI Z359.16.
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	Se hace instalacion de Linea de vida vertical ceetificada para escalera vertical de 8 m de altura. Punto de anclaje superior, mastil que sobresale 1 m conforme a instrucciones del fabricante (para mayir informacion consultar ficah tecnica del fabricante)
3.	**ACCESORIOS**	Tensor, Barra de anclaje superior, barra de anclaje infertor, absorvedor de choque, para mayir informacion consultar ficah tecnica del fabricante)
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	17 DE ABRIL DE 2023
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**Dic de 2024**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA RESOLUCIÓN 4272 DE 2022				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 6	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	6 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO


Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ESTADO ESTRUCTURA	CARECE DE RETICULA	**Especificación Material:**	ACERO ESTRUCTURAL
Accesorios de instalación	EQUIPOS OSLDADURA Y CORTE	**Estado de la superficie:**	PINTURA EPOXICA
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	PLACA CONCRETO REFORZDA/ ESTRUCTURA
Uso permitido	2 PERSONAS	**Lote-Serie**	NA

RETICULA DE GANCHEO

REGISTRO FOTOGRÁFICO





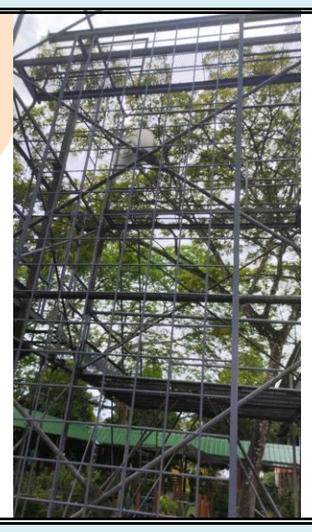


observaciones

1.	**PROCEDIMIENTO**	Suministro e instalación de retícula. Consiste en: Bajo Resolución 4272 de 2021
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	SE HACE DISEÑO FABRICACION, INSTALACION Y SUMINISTRO DE RETUCULA DE 2 M X 6 M EN VARILLA CORRUGADA, SEPARADA 20 CM DE LA ESTRUCTURA, PARA EJERCICIOS DE GANCHEO Y PUNTOS DE ANCLAJE EN PARTE SUPERIOR
3.	**ACCESORIOS**	TURBERIA ESTRUCTURAL, VARILLA CORRUGADA (Para mayor información ver memorias de calculo y planos)
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	DIC DE 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**RESOLUCIÓN 4272 2022 MINISTERIO DEL TRABAJO**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 29/06/2020

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	**PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA** **RESOLUCIÓN 4272 DE 2022**				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 7	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	7 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/RETIE	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ESTADO ESTRUCTURA	CARECE DE RETICULA	**Especificación Material:**	ACERO ESTRUCTURAL
Accesorios de instalación	EQUIPOS OSLDADURA Y CORTE	**Estado de la superficie:**	PINTURA EPOXICA
Fecha de instalación	22/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	PLACA CONCRETO REFORZDA/ ESTRUCTURA
Uso permitido	2 PERSONAS	**Lote-Serie**	NA


SEÑALIZACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO







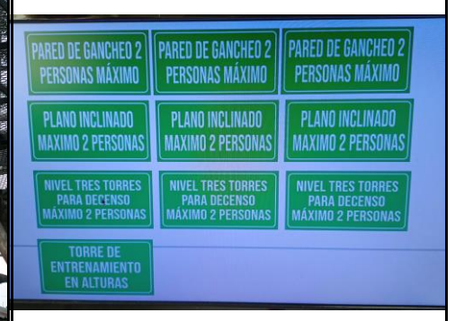





observaciones

1.	**PROCEDIMIENTO**	Suministro e instalación de retícula. Consiste en: Bajo Resolución 4272 de 2021
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	DISEÑO Y SUMINISTRO DE LETREROS INFORMATIVOSM, DE PREVENCION Y SEÑALIZACION
3.	**ACCESORIOS**	LETREROS ABRAZADERAS
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	DIC DE 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**RESOLUCIÓN 4272 2022 MINISTERIO DEL TRABAJO**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 29/06/2020

ESTADO: CONFORME

Jireh Grupo Empresarial Nuestro proveedor	**PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CETAR SENA PUERTO INIRIDA** **RESOLUCIÓN 4272 DE 2022**				
	Fecha de instalación:	jueves, 28 de diciembre de 2023		Pág.. No. 8	De: 8
	Reporte	JGE 023 IDENTIFICACIÓN PROYECTO	8 CONSECUTIVO	1 VERSIÓN	

INFORMACIÓN CLIENTE

Empresa Cliente:	SENA PERTO INIRIDA	**Proyecto:**	MANTENIMINETO CENTRO ENTRENAMINETO TSA
Fabricante	JIREH GRUPO EMPRESARIAL	**Ciudad / Dpto.:**	PUERTO INIRIDA GUANIA
Instalador	JIREH GE SAS	**Dirección:**	SENE PUERTO INIRIDA
Código/Normatividad aplicada :	Resolución 4272 de 2022/PRTECCION AMBIENTAL CDA	**Lugar de Instalación:**	SENA PUERTO INIRIDA

ESPECIFICACION DEL MANTENIMIENTO

Serie instalación	NA	**Serie de fabricación**	NA
ESTADO ESTRUCTURA	RAMAS OBSTRUZORAS	**Especificación Material:**	MADERA
Accesorios de instalación	EQUIPOS CORTE MADERA	**Estado de la superficie:**	MADERA
Fecha de instalación	28/12/2023	**Especificaciones del SUELO**	CORREDORES JARDINES SENA
Uso permitido	NA	**Lote-Serie**	NA

PODA

REGISTRO FOTOGRÁFICO








observaciones

1.	**PROCEDIMIENTO**	Mantenimiento preventivo del área perimetral torre de la estructura. Consiste en: Limpieza y control químico de maleza, adecuación de arboleda.
2.	**OBSERVACIONES GENERALES:**	PODA AUTORIXADA SEGÚN DISPOSICIONES AMBIENTALES DEL CDA PARA DISPOCION DE RSIDUOS ORGANCOS NO MADERABLES
3.	**ACCESORIOS**	CIERRA ELETRICA, TEJERA INDUSTRIAL, VEHICULO
4.	**FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN**	DIC DE 2024
5.	**CÓDIGO O NORMA DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN:**	**CODICO DE PROTECCION AMBIENTAL CDA**

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTROS CLIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

APROVADOR POR

CERTIFICADO POR

NELSON CAMILO ARIAS RINCÓN
PERSONA CALIFICADA
LIC. PROFESIONAL CN 230-68905

FECHA: 29/06/2020

ESTADO: CONFORME
