E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 601 2023. 2. AREA

3. CONTRATISTA LEVELS Cta. Acta parcial 3 - FASE 2

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA LUZ MARY CASTAÑO

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	
PAGO S.G.S.S.S	
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
1063 F2

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 06/03/24
HORA: 12:04
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

SUPERVISOR: WILLIAN CORTES

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CXP. 2023.		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Levels Sas

Soacha, Cundinamarca; miercoles 28 de febrero del 2024,

Arquitecta:
LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Atte.: Directora Interventoría Copia
Supervisión delegada
arqlilianaparracastellanos@gmail.com
subgerenciaad.esesoacha@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública No 601 de 2023, Celebrado entre la Empresa de Salud Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza y Levels S.A.S

Asunto: Entrega Documentos Acta Parcial de Obra 003 Fase 2

Respetados señores,

Dando cumplimiento a las actividades contratadas y demás requisitos, respetuosamente hacemos entrega de la documentación requerida para el trámite de pago Acta Parcial de Obra 003 Fase 2; a continuación, entregamos:

A. Cumplido No 1 – Fase 1 INTERVENTORIA
1. Cumplido No 2 – Fase 1 SUPERVISION CONTRATO

DOCUMENTOS ANEXOS:

ANEXOS

- FACTURA
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- INFORME PARCIAL 003 FASE 2
- ACTA DE MAYORES Y MENORES NO 3 FASE 2
- PACTACIÓN DE PRECIOS
- ACTA PARCIAL DE OBRA NO3 FASE 2
- MEMORIAS DE OBRA ACTA 3 FASE 2
- GARANTIAS DEL PROCESO
- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
- REGISTRO FOTOGRÁFICO

Agradeciendo su gestión y valiosa colaboración para la cancelación de las actividades ejecutadas,respetuosamente,

LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.
DIRECTOR DE PROYECTO

ARQUITECTO. LILIANA PARRA CASTELLANOS
INTERVENTORIA

Bogotá D.C, 28 Febrero del 2024.

OFICIO-INTERV-020-28-02-2024

SEÑORES.
E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
Atte. WILLIAM CORTES
Supervisor de contrato
Ciudad

Referencia. Contrato de Consultoría **No. 618-2023**, celebrado entre la empresa social del estado E.S.E municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza y Liliana Parra Castellanos.

Asunto. CUMPLIDO TECNICO, ADMNISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL

La suscrita **ARQ. LILIANA PARRA CASTELLANOS**, en calidad de directora de interventoría con cedula No. 52.226.390, en desarrollo del contrato vigente, cuyo objeto consiste en "**INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 601 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S.**", me permito certificar que:

El contratista **LEVELS S.A.S** con NIT 832.001.794-2, quien ejecuta el contrato de obra N° 601-2023, cuyo objeto consiste en **"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 Y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDADES VIGENTES"** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo que se **APRUEBA** el valor, las cantidades y valores ejecutados consignados en el **Corte de obra No.3 de la Fase 2** del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Enero de 2024 resultando un valor de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS -- ($ 187.653.069,71).**

Así mismo, certifico que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados en el corte No. 3 fueron medidos y verificados en su totalidad y se encuentran conforme con lo contratado. Sin embargo, dando cumpliendo con la CLAUSULA 8 del contrato N° 601-2023 FORMA DE PAGO: SE AUTORIZA el pago de **CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE Y TREINTA Y UN CENTAVOS -- ($ 160.061.273,31)** de acuerdo con la factura No.LEVE 113 del 26/02/24, resultando así el 90% del pago de la fase 2, el 10% restante por facturar será autorizado una vez sea entregada a satisfacción la liquidación documental del proyecto.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 28 de Febrero de 2024

Sin otro particular,



LILIANA PARRA CASTELLANOS
ARQUITECTO
DIRECTOR INTERVENTORIA

LEVELS SAS
NIT 901.380.377-9
MZ 2 CS 24 MADEIRA
Tel: (031) 3004937014
Girardot - Colombia
edwardmurcas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. LEVE 113

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
NIT	832.001.794-2	**Teléfono**	(031) 7293922
Dirección	CARRERA 2 No 12-38	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2024, 10:48
Expedición	26/02/2024, 10:48
Vencimiento	26/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 601-2023 - PAGO ACTA PARCIAL 003 FASE 2, CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.	1.00	123,124,056.39
2	ADMINISTRACIÓN (23,0%)	1.00	28,318,532.97
3	IMPREVISTOS (2,0%)	1.00	2,462,481.13
4	UTILIDAD (5,0%)	1.00	6,156,202.82

Total items: 4

Total Bruto	160,061,273.31
Total a Pagar	160,061,273.31

Valor en Letras:
Ciento sesenta millones sesenta y un mil doscientos setenta y tres pesos m/cte con treinta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 160,061,273.31

Observaciones:
PAGO DEL IVA DEL 19,0% SOBRE LA UTILIDAD DEL 5,0% EQUIVALENTE A $1.169.678,54

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061202760 aprobado en 20231204 prefijo LEVE desde el número 101 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2c1ce1939b5623a630b8ceac1e338cae7146fdd84999920a77431d06822392d8b0238bc15d385843233e42d2097d44f4

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 09/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LEVELS SAS** con **NIT 901.380.377-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 359670026947

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Levels Sas

INFORME PARCIAL DE OBRA No 003
FASE 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 601-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTRATANTE:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.794-2

CONTRATISTA DE OBRA:
LEVELS S.A.S
NIT. 901.380.377-9

SUPERVISION DELEGADO:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.794-2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOACHA
ENERO 2024

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

INFORME PARCIAL DE OBRA No 003

FASE 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No 601-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL JOSE SOACHA LUIS CESAR PEÑALOZA, FASES 1 Y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTRATANTE:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.724-2

CONTRATISTA DE OBRA:
LEVELS S.A.S
NIT. 901.380.377-9

SUPERVISION DELEGADO:
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT No. 832.002.724-2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SOACHA
ENERO 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION – LOCALIZACION
3. EQUIPO – HERRAMIENTA
4. MAQUINARIA
5. ACTIVIDADES CONTRATADAS FASE 2
6. RELACION DE PAGOS
7. AVANCES ACTIVIDADES
8. MANO DE OBRA
9. COMPONENTE AMBIENTAL
10. COMPONENTE SISOMA
11. RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

1. INTRODUCCION

La E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, en cabeza de su directora MARIA VICTORIA HERRERA ROA, buscando mejorar el inventario físico de la entidad, a su vez; comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del municipio y el desarrollo territorial, utilizando los mecanismos de contratación pública y demás instrumentos, consolido el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 601 DE 2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE; dándose inicio el día cinco (05) de octubre del 2023.

En el presente informe, se consignan las actividades de obra civil y control del proceso constructivo durante todo el periodo ejecutorio.

Levels Sas

2. DESCRIPCION – LOCALIZACION

Contrato de Obra Pública No 601-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE, dando inicio al mismo, el día cinco (05) de octubre del 2023.

CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023	
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE	
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CVS. $472.318.372,94	
CONTRATANTE	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA	
CONTRATISTA	LEVELS S.A.S R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON	
INTERVENTORIA	LILIANA PARRA CASTELLANOS	
FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DEL 2023	
FECHA TERMINACION PROYECTADA	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
OTRO SI	MODIFICATORIO No 1	
VALOR OTRO SI MODIFICATORIO No 1	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($88.270.800,00)	
PLAZO OTRO SI MODIFICATORIO No 1	UN (01) MES, HASTA 31 DE ENERO DEL 2024	
NUEVA FECHA TERMINACION	31 DE ENERO DEL 2024	
SUPERVISOR	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2	
RP	03-OCTUBRE DEL 2023 **APROBACION:** 04-OCTUBRE DEL 2023	
POLIZAS	**ASEGURADORA** SOLIDARIA DE COLOMBIA **No POLIZA** 560-47-994000169322 **AMPARO** PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS ANEXO No 1 N.A. **ASEGURADORA** SOLIDARIA DE COLOMBIA **No POLIZA** 560-74-994000031104 **AMPARO** POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO No 1 N.A.	

Nota: Información tomada del contrato de obra, acta de inicio y carpeta del proceso

LOCALIZACION



MUNICIPIO SOACHA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA



Georreferenciación:

4°33'59.92"N, 74°11'13.05"O
Centro de Salud Ciudadela Sucre
Departamento Cundinamarca

3. EQUIPO – HERRAMIENTA

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014



- MEZCLADORA DIÉSEL DE 1 BULTO
- BOGUE
- FORMALETA TIPO CAMILLA
- PULIDORA
- CIERRA ELÉCTRICA PORTÁTIL
- TALADRO DEMOLEDOR
- TALADRO ELECTRICO
- NIVEL LASER
- DECAMETRO
- HERRAMIENTA MENOR

4. MAQUINARIA

- VOLQUETA DIÉSEL DE 6 M3
- COMPACTADOR DIÉSEL TIPO RANA
- PLANTA ELECTRICA PORTATIL

Levels Sas

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS

FASE 2

No	No ICCU / CODIGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANT CONTRATADA
		GENERAL	PARTICULAR			
1				PRELIMINARES		
1,1	ICCU 1,12	ICCU		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	220,00
1,2	ICCU 6.15	ICCU		PAÑETE IMPERMEABILIZADO FACHADA 1:3, E=1.5 CM	M2	220,00
1,3	ICCU 18,23	ICCU		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS FACHADA	M2	200,00
1,4	APU	APU		MEDIA CAÑA EN CIELORASO EN POLIMERO SELLADO EXTRASOLIDO COLOR BLANCO	ML	235,00
1,5	ICCU 1.39	ICCU		DESMONTE VENTANAS	M2	35,90
1,6	APU	ICCU		PERFIL METALICO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA, INCLUYE PINTURA	ML	220,00
2				INSTALACIONES ELECTRICAS		
2,1	ICCU 12.15	ICCU		TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UNID	2,00
2,2	ICCU 12.9	ICCU		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNID	60,00
2,3	ICCU 12.17	ICCU		TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	500,00
2,4	APU	ICCU		CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENO #12	ML	1450,00
2,5	ICCU 12,4	ICCU		SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UNID	25,00
2,6	APU	APU		PANEL LED SOBRE PONER CIRCULAR 1800 LÚMENES LUZ FRÍA, INCLUYE CORTE CIELORASO	UNID	75,00
2,7	APU	APU		SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UNID	17,00
2,8	APU	APU		CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	912,04
3				INSTALACIONES SANITARIAS		
3,1	ICCU 11.1	ICCU		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UNID	6,00
3,2	ICCU 11.4	ICCU		BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	50,00
3,3	ICUU 11.20	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	50,00
3,4	ICCU 11,32	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	50,00
3,5	ICCU 11.35	ICCU		REGISTRO 1"	UND	3,00
3,6	APU	APU		ADECUACION TRAMPA DE GRASA	UND	1,00
3,7	ICCU 3,5	ICCU		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	3,00
3,8	ICCU 13,4	ICCU		ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	240,00
4				CARPINTERIA METALICA		
4,1	ICCU 10.4	ICCU		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 (VENTANERIA)	UND	4,00
4,2	ICCU 10.20	ICCU		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	60,00

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

6. RELACION DE PAGOS

Dadas las características y exigencias del contrato, no se contempló pago de anticipo o pago similar.

RELACION DE VALORES:

CONTRATO DE OBRA No. 601 -2023 – "FASE 2"		
Valor inicial:	$	187.646.840,09
Valor otrosi No.1:	$	88.270.800
Valor total:	**$**	**275.917.640,09**
Fecha de inicio:		04 de octubre 2023
Fecha de finalización inicial:		31 de Diciembre de 2023
Fecha de finalización otrosi No.1:		31 de Enero de 2024
Pagos realizados:	**$**	**88.264.570,30**
• Factura No. LEVE 92 (05 de octubre al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023)	$	37.269.525,90
• FACTURA LEVE N 110 (01 al 30 de diciembre 2023)	$	50.995.044,48
• APROBADO No.3 (31 de diciembre al 31 de enero 2024)	$	160.061.273,31
• Saldo a pagar por liquidación de contrato 10% (Por facturar)	**$**	**27.591.796,32**

Levels Sas

7. AVANCES ACTIVIDADES
8.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 601-2023

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO/ADELANTO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	5/10/2023	5/10/2023	0
2	PRELIMINARES	5/10/2023	5/10/2023	0
3	MAMPOSTERIA	21/10/2023	21/10/2023	0
4	ESTRUCTURA - CUBIERTA	6/01/2024	6/01/2024	0
5	PISOS	11/11/2023	11/11/2023	0
6	PAÑETES	1/12/2023	1/12/2023	0
7	PINTURAS	4/11/2023	4/11/2023	0
8	APARATOS SANITARIOS	31/01/2024	31/01/2024	0
9	CARPINTERIA DE ALUMINIO - ACERO Y METALICA (FE)	26/01/2024	26/01/2024	0
10	EQUIPOS	21/12/2023	21/12/2023	0
11	ESPEJOS, VIDRIOS Y CERRADURAS	26/12/2023	26/12/2023	0
16	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	31/01/2024	31/01/2024	0
Plazo del proyecto en días		119,00	119	


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 284.671.532,85	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 284.671.532,85	100,00%	

EQUIVALENTE CONTRATADO	100,00%	EQUIVALENTE EJECUTADO	100,00%

Nota: la anterior relación se proyecta en virtud para tramite del cobro Acta Final de la Fase 2, los valores relacionados son el resultado de las actividades de obra ejecutadas durante todo el periodo constructivo de la Fase 2 y establecen de manera informativa las cifras y rendimientos ejecutad


ANALISIS DE TIEMPO Y COSTOS

Curva S Tiempo

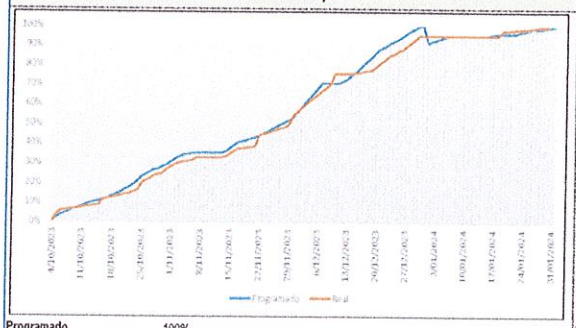

Programado	100%
Ejecutado	100%
Desviación	0%

Curva S Costos

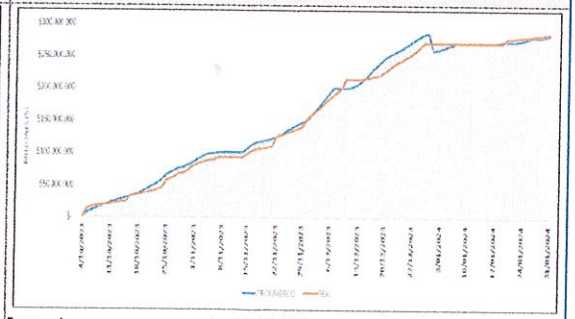

Programado	$ 284.671.532,85
Ejecutado	$ 284.671.532,85
Desviación	$ -

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

8. MANO DE OBRA

Dando cumplimiento a las exigencias presentadas por la parte contratante y buscando la armonía en todas las partes, el contratista de obra utilizo el siguiente personal

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO	11206929	DIRECTOR PROYECTO
2	GÓMEZ CAMACHO GIOVANNI GERMAN	79795890	COORDINADOR PROYECTO
3	GONZALEZ ERIKA VALENTINA	1010236968	RESIDENTE DE OBRA
4	OVALLE SALAZAR WILSON	79823635	MAESTRO DE OBRA
5	FAJARDO SUAREZ JHON FREDY	83226345	OFICIAL DE OBRA
6	VELASQUEZ BEJARANO JUAN BAUTISTA	3100189	OFICIAL DE OBRA
7	ROJAS GARAY EDWIN ARMANDO	79220973	OFICIAL DE OBRA
8	DANIEL ANTONIO APARICIO HOYOS	1032480660	ELECTRICO
9	DIEGO FERNANDO MENDEZ ARISTIZABAL	1012401352	ELECTRICO
10	EDISON VILLANUEVA VARON	93397537	ELECTRICO
11	JEISSON FABIAN MUÑOZ URREGO	1030683234	ELECTRICO
12	MACEDONIO LOPEZ ROJAS	79353706	ELECTRICO
13	HEBER URUEÑA SILVA	11317700	ELECTRICO
14	SEPULVEDA LUIS JOSE	4237752	PISOS
15	DEOGRACIAS MOSQUERA	91130653	PISOS
16	ANDRES FERNANDO YEPES LIZ	11206780	INSTALADOR DE VIDRIOS
17	OVALLE PINZON JOHAN CAMILO	1024536986	AYUDANTE DE OBRA

9. COMPONENTE AMBIENTAL

INTRODUCCION

Con el presente documento se presentan las actividades del Plan de Gestión Ambiental correspondientes a la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE; dándose inicio el día cinco (05) de octubre del 2023.

Las actividades reportadas en el presente informe corresponden a los siguientes componentes:

1. Jornadas de Orden y aseo en la obra y sectores aledaños

2. Aislamiento y delimitación de áreas de trabajo y exteriores

3. Componente de seguimiento y evaluación.

Durante el proceso que se lleva a cabo, se da a conocer información oportuna a la comunidad beneficiada y no beneficiada, lo cual permita mitigar de manera eficaz los impactos generados de la obra civil.

Levels Sas

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Contrato de Obra Pública No 601-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE, dando inicio al mismo, el día cinco (05) de octubre del 2023.

CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023			
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE			
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CVS. $472.318.372,94			
CONTRATANTE	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA			
CONTRATISTA	LEVELS S.A.S R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON			
INTERVENTORIA	LILIANA PARRA CASTELLANOS			
FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DEL 2023			
FECHA TERMINACION PROYECTADA	31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
OTRO SI	MODIFICATORIO No 1			
VALOR OTRO SI MODIFICATORIO No 1	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($88.270.800,00)			
PLAZO OTRO SI MODIFICATORIO No 1	UN (01) MES, HASTA 31 DE ENERO DEL 2024			
NUEVA FECHA TERMINACION	31 DE ENERO DEL 2024			
SUPERVISOR	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2			
RP	03-OCTUBRE DEL 2023			
POLIZAS	**APROBACION:** 04-OCTUBRE DEL 2023			
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-47-994000169322
	AMPARO	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS		
	ANEXO No 1		N.A.	
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-74-994000031104
	AMPARO	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	ANEXO No 1		N.A.	

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Acatando las directrices del PMA presentado y las políticas ambientales se realizaron las siguientes actividades en direccionamiento del buen desarrollo del contrato:

• Las jornadas de orden y aseo se hacen de manera periódica y diaria al finalizar la jornada laboral. Con el cumplimiento de dichas mejoras, se interviene los hallazgos previos, atendiendo a las recomendaciones técnicas con un balance positivo del 70%.


ENTREGABLES:

- Aislamiento y delimitación de áreas de trabajo y exteriores



Se despejo el área de peatonal y de ingreso a la obra

- Puntos de recepción del material de obra

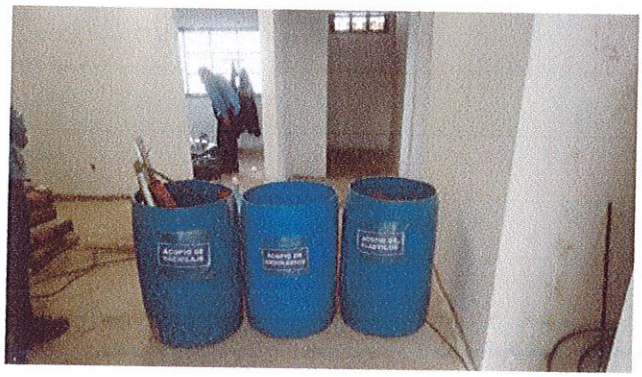



Levels Sas

10. COMPONENTE SISOMA

INFORME MENSUAL SG-SST

CONTRATO DE OBRA No 601 – 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S.

ENERO 2024

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
   - 2.1 Objetivo General
   - 2.2 Objetivos Específicos
3. Información del Contrato
4. Gestión de Recursos Humanos
   - 4.1 Relación del personal (Administrativo – Operativos)
   - 4.2 Horas hombre trabajadas.
   - 4.3 Incapacidades
5. Incidentes o accidentes de trabajo
6. Charlas de Seguridad
7. Entrega de EPP
8. Inspecciones varias
9. Inducciones
10. Orden y Aseo
11. Conclusiones

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

1. INTRODUCCION

La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. Esto incluye enfermedades, cualquier tipo de accidentes y todos los factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en sus respectivos trabajos.

Décadas atrás se comenzó a discutir sobre la importancia de la salud de los trabajadores que exponen su cuerpo de manera riesgosa a la hora de realizar sus trabajos. Es por esta razón que se creó la salud ocupacional con el fin de promover y mantener lo máximo que se pueda el bienestar tanto físico como mental de las personas que poseen un empleo.

La salud ocupacional, en sus orígenes, fue inventada con el fin de ayudar y proteger a aquellos que poseían más riesgos físicos cuando trabajaban, pero en la actualidad, incluye a trabajadores de cualquier profesión u oficio para que el trabajo se adapte al hombre, y el hombre al trabajo

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
2.2

Controlar, vigilar y apoyar de forma eficaz y oportuna todas las acciones de seguridad y salud en el trabajo de **LEVELS S.A.S Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**

2.3 Objetivos Específicos

- Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Debe establecer los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Utilizando la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia riesgos laborales.

Levels Sas

3. INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato de Obra Pública No 601-2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE, dando inicio al mismo, el día cinco (05) de octubre del 2023.

CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023			
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE			
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CVS. $472.318.372,94			
CONTRATANTE	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA			
CONTRATISTA	LEVELS S.A.S R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON			
INTERVENTORIA	LILIANA PARRA CASTELLANOS			
FECHA DE INICIO	05 DE OCTUBRE DEL 2023			
FECHA TERMINACION PROYECTADA	31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
OTRO SI	MODIFICATORIO No 1			
VALOR OTRO SI MODIFICATORIO No 1	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($88.270.800,00)			
PLAZO OTRO SI MODIFICATORIO No 1	UN (01) MES, HASTA 31 DE ENERO DEL 2024			
NUEVA FECHA TERMINACION	31 DE ENERO DEL 2024			
SUPERVISOR	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2			
RP	03-OCTUBRE DEL 2023			
POLIZAS	**APROBACION:** 04-OCTUBRE DEL 2023			
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-47-994000169322
	AMPARO	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS		
	ANEXO No 1		N.A.	
	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	**No POLIZA**	560-74-994000031104
	AMPARO	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	ANEXO No 1		N.A.	

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

4. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Relación del personal (Administrativo – Operativo)

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO	11206929	DIRECTOR PROYECTO
2	GÓMEZ CAMACHO GIOVANNI GERMAN	79795890	COORDINADOR PROYECTO
3	GONZALEZ ERIKA VALENTINA	1010236968	RESIDENTE DE OBRA
4	OVALLE SALAZAR WILSON	79823635	MAESTRO DE OBRA
5	FAJARDO SUAREZ JHON FREDY	83226345	OFICIAL DE OBRA
6	VELASQUEZ BEJARANO JUAN BAUTISTA	3100189	OFICIAL DE OBRA
7	ROJAS GARAY EDWIN ARMANDO	79220973	OFICIAL DE OBRA
8	DANIEL ANTONIO APARICIO HOYOS	1032480660	ELECTRICO
9	DIEGO FERNANDO MENDEZ ARISTIZABAL	1012401352	ELECTRICO
10	EDISON VILLANUEVA VARON	93397537	ELECTRICO
11	JEISSON FABIAN MUÑOZ URREGO	1030683234	ELECTRICO
12	MACEDONIO LOPEZ ROJAS	79353706	ELECTRICO
13	HEBER URUEÑA SILVA	11317700	ELECTRICO
14	SEPULVEDA LUIS JOSE	4237752	PISOS
15	DEOGRACIAS MOSQUERA	91130653	PISOS
16	ANDRES FERNANDO YEPES LIZ	11206780	INSTALADOR DE VIDRIOS
17	OVALLE PINZON JOHAN CAMILO	1024536986	AYUDANTE DE OBRA

4.2 Hora Hombres Trabajadas

| Levels Sas | REPORTE DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS | | |


4.3 Incapacidades

En el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2024 no tenemos incapacidades.

Indicadores de ausentismo

	AUSENTISMO		
NOMBRE CONTRATISTA: LEVELS S.A.S. REPONSABLE SST: RUTH JACQUELINE AGUILAR T		FECHA DE ELABORACION: Enero / 2024	
MOTIVO	FECHA	NOMBRE	DIAS DE INCAPACIDAD

AUSENTISMOS	
No ACCIDNETES	0
DIAS DE INCAPACIDAD	0
FALTA INJUSTICADA	0
PERMISOS	0



5. INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante este mes no se presentaron accidentes ni incidentes en el trabajo.

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

6. CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

CHARLAS REALIZADAS DENTRO DEL MES	
ORDEN Y ASEO	16/01/2024
ACOPIO DE MATERIALES	16/01/2024
IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO	16/01/2024



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8685
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 30.300-1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3D 463 48 H

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

WILSON OVALLE SALAZAR

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79823635
AFILIADO A LA ARL: COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT: 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

REALIZADO DESDE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 32 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8685
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 30.300-1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3D 463 48 H

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A

EDWIN ARMANDO ROJAS GARAY

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79220973
AFILIADO A LA ARL: COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT: 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021



PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SSTN° 8685
DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014 30.300-1
CELAC 18-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av. Calle 57 R sur 76 A 95
3D 463 48 H

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS
En cumplimiento de la Resolución 4272 del Ministerio de Trabajo

OTORGADO A

FRANCISCO VEGA PRADA

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1024460939
AFILIADO A LA ARL: COLPATRIA
RAZON SOCIAL: LEVELS SAS
NIT: 901380377-9
REPRESENTANTE LEGAL:SANDRA MARTINEZ CC: 1070594428
QUIEN CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (TRABAJADOR AUTORIZADO)

REALIZADO DESDE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 32 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EL (30) DE (11) DEL (2023)
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

ELIZABETH TARAZONA
ENTRENADORA
Licencia S.O Resolucion 9891 de 7 de Julio de 2021


7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal comprenden de todos los equipos, accesorios y vestimentas utilizados por los trabajadores o los usuarios que se encuentran expuestos a posibles lesiones durante la jornada laboral.

Los elementos de protección personal deben proporcionar el máximo confort y gran eficiencia para evitar que el usuario sufra un accidente. Los equipos no deben restringir los movimientos del trabajador, sino contribuir a la seguridad del individuo durante su actividad.

Es por eso que deben ser confeccionados de acuerdo a las normas de construcción nacionales e internacionales que verifican todos los procesos de elaboración, y determinan si fueron construidos con los materiales correctos. Es fundamental su uso correcto y permanente durante la actividad laboral en las instalaciones industrial

De esta manera el trabajador puede realizar su tarea libremente durante la exposición al riesgo. Disponemos de elementos de protección en alturas, auditiva, facial, craneana, ocular, respiratoria, y otros productos que proporcionan seguridad.

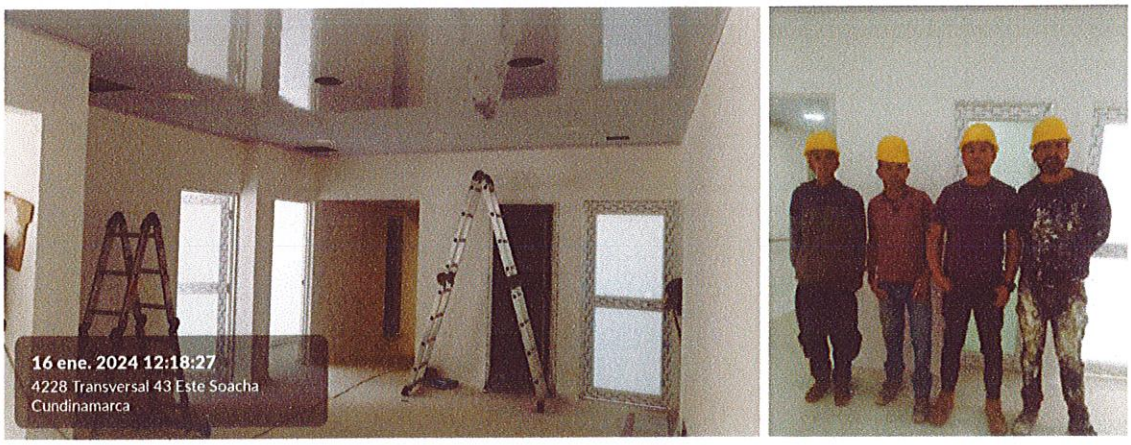

Uso de elementos y herramientas para seguridad industrial



8. INSPECCIONES VARIAS

Anexo 2

Las inspecciones de seguridad se pueden definir como el proceso administrativo que permite estudiar las condiciones físicas y las tareas que se ejecutan, con el fin de detectar posibles peligros que pueden causar accidentes por fallas técnicas o humanas.



Jornada de orden y aseo y acopio de materiales



9. INDUCCIONES

Anexo 3

Las inspecciones de seguridad se pueden definir como el proceso administrativo que permite estudiar las condiciones físicas y las tareas que se ejecutan, con el fin de detectar posibles peligros que pueden causar accidentes por fallas técnicas o humanas.

Se realizan inducciones al personal que ingresa a laborar en el Proyecto, donde se socializa los siguientes temas:

- Políticas
- Deberes de los trabajadores con el SG-SST Uso de EPP
- Reglamento de higiene y seguridad industrial Riesgos a los que está expuesto
- Números de emergencia Normas de seguridad Tareas criticas
- Horario de trabajo
- Deberes del personal administrativo Definiciones


10. ORDEN Y ASEO

El orden nos sirve de ayuda a la hora de disponer de más tiempo, ser más eficaces, rendirmás, conseguir los objetivos que nos proponemos, etc.

El orden, además de lo anterior, también nos puede aportar una cierta tranquilidad, confianza y seguridad.

Beneficios del orden y el aseo:

- Se disminuyen los riesgos de accidentalidad.
- Se optimiza el tiempo de producción (se reduce el tiempo invertido en labúsqueda de objetos).
- Se logra el mayor provecho del espacio.
- Se genera confianza en los clientes, proveedores y visitantes

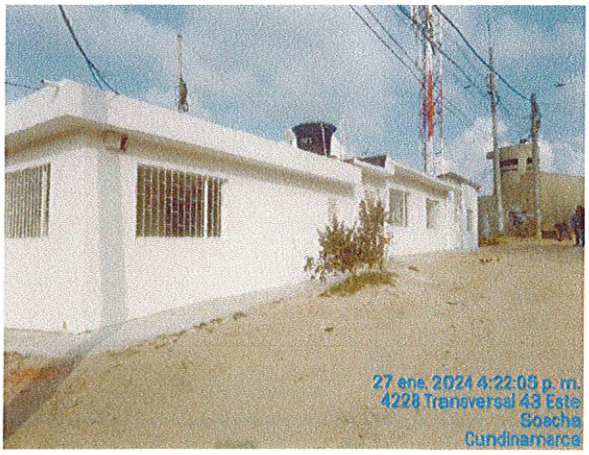

Jornada de orden y aseo - retiro de puntos de acopio de materiales externo

11. CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, en el presente informe se han evidenciado practicas implementadas, que buscan principalmente la gestión del riesgo, esto significa cómo actuar ante el mismo. Existen distintas acciones que se pueden tomar, pero es importante realizar siempre un análisis de riesgo para poder planificar la seguridad.

El riesgo se puede aceptar, prevenir, transferir o mitigar; dentro del área de seguridad y salud en el trabajo se pretende alcanzar y demostrar un sólido desempeño de las diferentesactividades ejecutadas en el periodo evaluado, lo que ha permitido alcanzar resultados satisfactorios, para el proyecto

RUTH JACQUELINE AGUILAR TABAREZ PROFESIONAL SST

ANEXOS

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre de la Actividad: Reglas básicas de Seguridad
Fecha Actividad: 3 Enero 2024
Horario Actividad: 8:00 am
Lugar: ESE Municipal Soacha
Facilitador: Beth J. Aguilar C.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Edwin Armando Rojas	79220973	oficial	Edwin A. Rojas
2	Wilson Quelle S	79823635	maestro obra	wilson Q.
3	Valentina Gonzalez	1010236968	Arquitecta	Valentina Gonzalez
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre de la Actividad: Uso Adecuado de EPP.
Fecha Actividad: 9 Enero 2024
Horario Actividad: 9:00 am
Lugar: ESE Municipio Soacha
Facilitador: Beth J. Aguilar C.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Valentina Gonzalez	1010236968	Arquitecta	Valentina Gonzalez
2	Edwin Armando Rojas	79220973	oficial	Edwin A Rojas
3	Wilson Quelle	79823635	maestro obra	Wilson Q.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre de la Actividad: Señalización Preventiva
Fecha Actividad: 17 Enero 2024
Tiempo Actividad:
Lugar:
Facilitador:

No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Wilson Ovalle	79813635	maestro obra	wilson O.
2	Valentina Gonzalez	1016236968	Arquitecta	Valentina Gonzalez
3	Edwin A Rojas	79220973	oficial	Edwin Rojas
4	Juan Bautista V	3100189	Ayudante	Juan Bautista
5	Jhon Freddy Fajardo	93226345	Ayudante	Jhon Fajardo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre de la Actividad: El Uso de la 3R Reutilizar/Reciclar/Reducir ESE Hospital Sabana
Fecha Actividad: 23 Enero 2024
Tiempo Actividad:
Lugar:
Facilitador: Beth J. Zuluaga T

No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan Bautista V	3100189	Ayudante	Juan Bautista
2	Wilson Ovalle	79823635	maestro	Wilson O.
3	Edwin A Rojas	79220973	oficial	Edwin Rojas
4	Valentina Gonzalez	1016236968	Arquitecta	Valentina Gonzalez
5	Jhon Freddy Fajardo	93226345	Ayudante	Jhon Fajardo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

Levels Sas

REGISTRO DE ASISTENCIA

Nombre de la Actividad: Planificar el trabajo antes de Ejecutarlo
Fecha Actividad: 29 Enero 2024
Horario Actividad:
Lugar: Esc Municipal Szacha
Facilitador: Ruth J. Aguilar

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Valentina Gonzalez	1062286 988	Arquitecta	Valentina Gonzalez
2	Wilson Ovalle	77823 635	Maestro	Wilson O
3	Edwin Armando Rojas	7922 0773	Oficial	Edwin Rojas
4	Juan Bautista V	1100189	Ayudante	Juan Bautista
5	Jhon Freddy Tafurdo	8326345	Ayudante	Jhon Futurdo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Powered by CamScanner

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

PROYECO	E.S.E Municipio Girardot	SERIE	Dcm 850B.
FECHA INSPECCION (SEMANAL)	15 al 20 enero /24	MODELO	
MARCA	Dewalt	ACTIVIDAD	Varios

DESCRIPCIÓN	DIAS DE INSPECCIONS													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO: B (BUENO) M (MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X				X				X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X				X				X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X				X				X		X			
Estado del mango	X				X				X		X			
Estado del cuerpo	X				X				X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X				X				X		X			
Estado general de la guía y la guarda	X				X				X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X				X				X		X			
Condiciones de orden y aseo	X				X				X		X			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SU USO

Nombre del Operador(es) Wilson O.	Nombre del Operador(es) Edwin Reyes
Nombre del Operador(es)	Nombre del Operador(es) Edwin Reyes
Nombre del Operador(es) Edwin Reyes	Nombre del Operador(es)
Nombre del Operador(es)	

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR(ES)

Lunes: Wilson O.	Martes	Miércoles: Edwin Reyes	Jueves
Viernes: Edwin Reyes	Sabado: Edwin Reyes	Domingo	

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO ___

PROYECO

FIRMA DEL INSPECTOR SST

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

PROYECO	CSE Hospital Facela	SERIE	Rm 850 B.
FECHA INSPECCION (SEMANAL)	22 al 27 Enero/2024	MODELO	
MARCA	Dewalt	ACTIVIDAD	Varios.

DESCRIPCIÓN	DIAS DE INSPECCIONS													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO: B (BUENO) M (MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			X				X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			X				X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X				X		X		X			
Estado del mango			X				X		X		X			
Estado del cuerpo			X				X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			X				X		X		X			
Estado general de la guia y la guarda			X				X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			X				X		X		X			
Condiciones de orden y aseo			X				X		X		X			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SU USO

Nombre del Operador(es)	Nombre del Operador(es) Edwin Rojas
Nombre del Operador(es) Edwin Rojas	Nombre del Operador(es) Edwin Rojas
Nombre del Operador(es)	Nombre del Operador(es)
Nombre del Operador(es) Edwin, Rojas	

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR(ES)

Lunes	Martes Edwin Rojas	Miercoles	Jueves Edwin Rojas
Viernes Edwin Rojas	Sabado Edwin Rojas	Domingo	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO___

PROYECO

FIRMA DEL INSPECTOR SST

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

Levels Sas

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS		
PROYECO	ESE Antonio Roa	SERIE	DCM 800 B.
FECHA INSPECCION (SEMANAL)	29 al 31 Enero/2024	MODELO	
MARCA	Dewalt	ACTIVIDAD	LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN	DIAS DE INSPECCIONS													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO: B (BUENO) M (MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X													
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X													
Estado del accesorio portadiscos	X													
Estado del mango	X													
Estado del cuerpo	X													
Estado accesorio RPM (6500 - 15000)	X													
Estado general de la guia y la guarda	X													
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc)	X													
Condiciones de orden y aseo	X													

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO SU USO

Nombre del Operador(es) Edwin Rojas	Nombre del Operador(es)
Nombre del Operador(es)	Nombre del Operador(es)
Nombre del Operador(es)	Nombre del Operador(es)
Nombre del Operador(es)	

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR(ES)

Lunes: Edwin Rojas	Martes	Miercoles	Jueves
Viernes	Sabado	Domingo	

FUERA DE SERVICIO SI____ NO____

PROYECO

FIRMA DEL INSPECTOR EST

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES

PROYECTO: CSE Mirtyra Socadio
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 16-Septiembre-2021
DILIGENCIADO POR: Raul Rojas

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Manuales					
Palas					
Segueta pequeña	X				
Segueta grande					
Martillos grandes (Mocas)					
Martillos	X				2
Cachiras					
Escalera de extension	X				1
Escalera tijera					
Machete					
Hachas					
Picos					
Barras					
Alicates de presion	X				2
Alicates universales	X				2
Pinza de corte					
Pinza de electricista					
Pinzas universales					
Destornillador de estria	X				2
Destornillador de pala	X				2
Destornillador estria perillero					
Pinza Volcanperimetrica					
Cata macho grande					
Cata macho pequeño					
Candil					
Llaves de tubo					
Llave expansiva					
Martillo sodo	X				1
Cinceles					
Cepillos de alambre					
Cinta	X				2
Cuerda	X				1
Cuña					

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO	ESTADO			RECOMENDACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DESCRIPCION DE LA FALLA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA: Raul Rojas Forero
CEDULA: 85139[illegible] Cadel

Powered by CamScanner

Levels Sas

12. RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES

- ✓ Las actividades de obra fueron ejecutadas normalmente, dando cumplimiento a las características de los ítems contratados.
- ✓ Las situaciones o inquietudes generadas durante la ejecución del proceso constructivo fueron solucionadas a satisfacción en coordinación de las partes vinculadas.
- ✓ Las modificaciones realizadas durante el proceso constructivo fueron analizadas y aprobadas en coordinación de las partes interesadas.
- ✓ Los procesos técnicos utilizados para la ejecución de las actividades aquí consignadas fueron aprobadas y coordinados con la normatividad vigente.
- ✓ Se procede a la entrega del informe final y se deja como evidencia en cumplimiento a las exigencias establecidas
- ✓ No se presentaron situaciones adversas o anómalas al proceso.

Por lo anterior se hace entrega del Informe Final de Obra Fase 2, soporte para trámite en cumplimiento de las exigencias establecidas, a su vez; se presentan las actividades de obra civil ejecutadas durante todo el periodo contractual, debidamente desarrolladas, terminadas y revisadas por las partes interesadas, dando cumplimiento total al objeto del contrato; basado en ello, se hace entrega de las obras y se procede a liquidar el contrato de Obra Pública No 601 del 2023.

Atentamente,

LEVELS S.A.S.
R.L SANDRA MILENA MARTINEZ RICON

Calle 19 No. 10 – 79, Oficina 203 - Girardot (Colombia)
SAS.Levels@gmail.com
Tel. 3004937014

| | | |

ITEM NO PREVISTOS

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		
		GENERAL	PARTICULAR						MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
NP				DEMOLICIONES				$ 44,254,942,65			$ 4,766,837,73	$ -			$ 49,024,780,38
NP 1	APU	APU		PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1,10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2,00 MTS	UNID	19,00	$ 1,139,800,00	$ 21,656,200,00	1,00	0,00	$ 1,139,800,00	$ -	20,00	$ 1,139,800,00	$ 22,796,000,00
NP 2	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AQUAJET PRO MARCA CORONA PARA PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA	UNID.	1,00	690.480,80	690.480,80	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	690.480,80	$ 690,480,80
NP 3	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS INSTITUCIONAL REF 003891001 CORONA PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	UNID.	1,00	701.524,80	701.524,80	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	701.524,80	$ 701,524,80
NP 4	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 40 CM D:1 1/4 PULG PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (BAÑO)	UNID.	1,00	211.966,60	211.966,60	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	211.966,60	$ 211,966,60
NP 5	APU	APU		SUMINISTRO E INSTALACION KIT DESAGUE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS (CANASTILLA, SIFON)	UNID.	18,00	81.700,85	1.307.213,60	2,00	0,00	$ 163.401,70	$ -	18,00	81.700,85	$ 1,470,615,30
NP 6	APU	APU		REGATA EN MURO DE MAPOSTERIA DIVISORIA	ML	55,90	6.895,50	385,458,45	153,55	0,00	$ 1,058,804,03	$ -	209,45	6.895,50	$ 1,444,262,48
NP 7	APU	APU		RETIRO DE SOBRANTES Y DESCARGUE EN ESCOMBRERA A UNA DISTANCIA DE 9 KM (INCLUYE CARGUE, SELECCIÓN SOLIDOS Y CERTIFICADO DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	65,99	102.200,00	6,744,178,00	23,56	0,00	$ 2,407,832,00	$ -	89,55	102,200,00	$ 9,152,010,00
NP 8	ICCU 11,27	ICCU		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85,40	11.028,00	941,791,20	0,00	0,00	$ -	$ -	85,40	11.028,00	$ 941,791,20
NP 9	ICCU 11,16	ICCU		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UNID.	34,00	85.887,00	2,920,158,00	0,00	0,00	$ -	$ -	34,00	85.887,00	$ 2,920,158,00
NP 10	ICCU 11,35	ICCU		REGISTRO 1"	UNID.	1,00	130.678,00	130,678,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	130.678,00	$ 130,678,00
NP 11	ICCU 11,36	ICCU		REGISTRO 1/2"	UNID.	20,00	73.377,00	1,467,540,00	0,00	0,00	$ -	$ -	20,00	73.377,00	$ 1,467,540,00
NP 12	ICCU 11,37	ICCU		REGISTRO 3/4"	UNID.	1,00	92.103,00	92,103,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	92.103,00	$ 92,103,00
NP 13	ICCU 14,37	ICCU		TAPA REGISTRO 20X20	UNID.	20,00	24.351,00	487,020,00	0,00	0,00	$ -	$ -	20,00	24.351,00	$ 487,020,00
NP 14	ICCU 11,12	ICCU		LLAVE MANGUERA	UNID.	1,00	46.376,00	46,376,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	46.376,00	$ 46,376,00
NP 15	ICCU 11,31	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	55,30	32.066,00	1,773,249,80	0,00	0,00	$ -	$ -	55,30	32.066,00	$ 1,773,249,80
NP 16	ICCU 11,33	ICCU		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	33,50	59.370,00	1,988,895,00	0,00	0,00	$ -	$ -	33,50	59.370,00	$ 1,988,895,00
NP 17	ICCU 11,19	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UNID.	19,00	90.377,00	1,717,163,00	0,00	0,00	$ -	$ -	19,00	90.377,00	$ 1,717,163,00
NP 18	ICCU 11,21	ICCU		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UNID.	4,00	116.304,00	465,216,00	0,00	0,00	$ -	$ -	4,00	116.304,00	$ 465,216,00
NP 19	ICCU 11,41	ICCU		REVENTILACION 2"	ML	23,20	22.747,00	527,730,40	0,00	0,00	$ -	$ -	23,20	22.747,00	$ 527,730,40
							SUBTOTAL OBRAS ITEM NO PREVISTOS	$ 44,254,942,65							$ 49,024,780,38

ACTIVIDADES - ADICION PRESUPUESTAL N° 1

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		
		GENERAL	PARTICULAR						MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
												$ 3,832,126,80			$ 118,990,893,31
NP 20	APU	ADICION		Patch Cord Cat 5A 10ft AMP	UNID.	39,00	45.857,00	1,790,623,00	0,00	9,00	$ -	$ 410,913,00	30,00	45.857,00	$ 1,369,710,00
NP 21	APU	ADICION		Patch Cord Cat 5A 5ft AMP	UNID.	39,00	39.194,00	1,528,566,00	0,00	39,00	$ -	$ 1,528,566,00	0,00	39.194,00	$ -
NP 22	APU	ADICION		Face Plate 2 Puertos AMP	UNID.	39,00	12.897,00	502,983,00	0,00	11,00	$ -	$ 141,867,00	28,00	12.897,00	$ 361,116,00
NP 23	APU	ADICION		Tapa Ciega AMP	UNID.	16,00	18.468,00	295,488,00	0,00	0,00	$ -	$ -	16,00	18.468,00	$ 295,488,00
NP 24	APU	ADICION		Cable UTP Categoria 6A	ML	0,00	8.395,00	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	8.395,00	$ -
NP 25	APU	ADICION		Jack Cat 6A AMP	UNID.	79,00	40.810,00	3,183,180,00	0,00	39,00	$ -	$ 1,550,780,00	40,00	40.810,00	$ 1,632,400,00
NP 26	APU	ADICION		Herraje angulado 24 puertos AMP 6A	UNID.	3,00	372.358,00	1,117,074,00	0,00	0,00	$ -	$ -	3,00	372.358,00	$ 1,117,074,00
NP 27	APU	ADICION		Servicio Certificacion Puntos de Red	UNID.	1,00	1,417,416,00	1,417,416,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	1,417,416,00	$ 1,417,416,00
				Rack - Gabinetes - Organizadores											
NP 29	APU	ADICION		Gabinete Cerrado Piso 120 cm Alto	UNID.	1,00	732.946,00	732,946,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	732.946,00	$ 732,946,00
NP 30	APU	ADICION		Bandeja Para Rack 35 Cm	UNID.	2,00	76.894,00	153,788,00	1,00	0,00	$ 76.894,00	$ -	3,00	76.894,00	$ 230,682,00
NP 31	APU	ADICION		Multitoma Horizontal 8 salidas dobles	UNID.	2,00	310.708,00	621,416,00	0,00	1,00	$ -	$ 310.708,00	1,00	310.708,00	$ 310,708,00
NP 32	APU	ADICION		Organizador Horizontal 2RU	UNID.	4,00	209.640,00	838,560,00	1,00	0,00	209.640,00	$ -	5,00	209.640,00	$ 1,048,200,00
NP 33	APU	ADICION		Suministro e instalacion UPS BIFASICA INTERACTIVA REF 12SF010K	UNID.	1,00	9.910.593,67	9,910,593,67	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	9.910.593,67	$ 9,910,593,67

				REDES ELECTRICAS															
				Salidas Electricas															
NP 34	APU	ADICION		Salida Toma Doble Polo a Tierra (RED REGULADO) PVC Completa Color Naranja	UNID.	16,00	$	153,118,00	$	2,449,888.00	6,00	0,00	$	918,708,00	$	-	22,00	$	153,118,00	$	3,368,596,00
				Acometidas - Cables - Alambres															
NP 35	APU	ADICION		Cable cobre THHN/THWN Preentorchado 3 X 12 600V AZUL, BLANCO, VERDE Cero Halogeno	ML	40,00	$	16,557,00	$	662,280,00	27,75	0,00	$	459,456,75	$	-	67,75	$	16,557,00	$	1,121,736,75
NP 36	APU	ADICION		Cable cobre THHN/THWN Preentorchado 3 X 12 600V ROJO, BLANCO VERDE Cero Halogeno	ML	120,00	$	16,557,00	$	1,986,840,00	0,50	0,00	$	8,278,50	$	-	120,50	$	16,557,00	$	1,995,118,50
NP 37	APU	ADICION		Cable Desnudo Cobre No. 8	ML	40,00	$	13,829,00	$	553,160,00	0,00	40,00	$	-	$	553,160,00	0,00	$	13,829,00	$	-
NP 38	APU	ADICION		Cable Encauchetado 4x8	ML	15,00	$	33,646,00	$	504,690,00	0,00	2,00	$	-	$	67,292,00	13,00	$	33,646,00	$	437,398,00
NP 39	APU	ADICION		Conectores de autodesforre - 3M - 10 AWG - 12 AWG	UNID.	100,00	$	2,168,00	$	216,800,00	200,00	0,00	$	433,600,00	$	-	300,00	$	2,168,00	$	650,400,00
				Protecciones - Conmutaderes															
NP 40	APU	ADICION		Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 24 Circuitos	UNID.	1,00	$	940,140,00	$	940,140,00	0,00	1,00	$	-	$	940,140,00	0,00	$	940,140,00	$	-
NP 41	APU	ADICION		Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos	UNID.	1,00	$	577,601,00	$	577,601,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	577,601,00	$	577,601,00
NP 42	APU	ADICION		TOTALIZADOR INDUSTRIAL INT DRX125 60A 3P 25KA 220V	UNID.	1,00	$	299,452,00	$	299,452,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	299,452,00	$	299,452,00
NP 43	APU	ADICION		TOTALIZADOR INDUSTRIAL INT DRX125 40A 3P 25KA 220V	UNID.	1,00	$	299,452,00	$	299,452,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	299,452,00	$	299,452,00
NP 44	APU	ADICION		Breaker Enchufable 1x20A 10KA Luminex	UNID.	13,00	$	20,886,00	$	268,918,00	5,00	0,00	$	103,430,00	$	-	18,00	$	20,886,00	$	372,348,00
NP 45	APU	ADICION		Breaker Enchufable 2x20A 10KA Luminex	UNID.	2,00	$	59,944,00	$	119,888,00	2,00	0,00	$	119,888,00	$	-	4,00	$	59,944,00	$	239,776,00
NP 46	APU	ADICION		Breaker Enchufable 3x30A 10KA Luminex	UNID.	2,00	$	138,618,00	$	277,236,00	0,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	138,618,00	$	-
NP 47	APU	ADICION		TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PLANTA 5KVA	UNID.	1,00	$	758,918,00	$	758,918,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	758,918,00	$	758,918,00
				Iluminacion															
NP 48	APU	ADICION		CABLE LSZH N° 12 COBRE AMARILLO	ML	400,00	$	5,175,00	$	2,070,000,00	300,00	0,00	$	1,552,500,00	$	-	700,00	$	5,175,00	$	3,622,500,00
NP 49	APU	ADICION		CABLE LSZH N° 12 COBRE BLANCO	ML	400,00	$	5,175,00	$	2,070,000,00	300,00	0,00	$	1,552,500,00	$	-	700,00	$	5,175,00	$	3,622,500,00
NP 50	APU	ADICION		CABLE LSZH N° 12 COBRE VERDE	ML	200,00	$	5,175,00	$	1,035,000,00	200,00	0,00	$	1,035,000,00	$	-	400,00	$	5,175,00	$	2,070,000,00
NP 51	APU	ADICION		CABLE N° 12 DESNUDO	ML	0,00	$	4,554,00	$	-	0,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	4,554,00	$	-
NP 52	APU	ADICION		Cable Encauchetado 2x16	ML	88,80	$	5,455,00	$	484,404,00	0,00	22,80	$	-	$	124,374,00	66,00	$	5,455,00	$	360,030,00
NP 53	APU	ADICION		LAMPARA DE EMERGENCIA EMERG R3 2W 2X100LM 180MIN	UNID.	4,00	$	68,108,00	$	272,432,00	3,00	0,00	$	204,324,00	$	-	7,00	$	68,108,00	$	476,756,00
NP 54	APU	ADICION		LAMPARA HERMETICA 2X32	UNID.	5,00	$	97,690,00	$	488,450,00	0,00	0,00	$	-	$	-	5,00	$	97,690,00	$	488,450,00
NP 55	APU	ADICION		PANEL LED 60X60 40W	UNID.	22,00	$	126,973,00	$	2,793,406,00	0,00	0,00	$	-	$	-	22,00	$	126,973,00	$	2,793,406,00
NP 56	APU	ADICION		PANEL LED 18W REDONDO	UNID.	32,00	$	20,679,00	$	661,728,00	0,00	0,00	$	-	$	-	32,00	$	20,679,00	$	661,728,00
NP 57	APU	ADICION		REFLECTOR 150W WALLPACK	UNID.	6,00	$	152,987,00	$	917,922,00	0,00	0,00	$	-	$	-	6,00	$	152,987,00	$	917,922,00
NP 58	APU	ADICION		TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS SI TOTALIZADOR	UNID.	1,00	$	245,022,00	$	245,022,00	0,00	1,00	$	-	$	245,022,00	0,00	$	245,022,00	$	-
				CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS															
				Cajas															
NP 59	APU	ADICION		Caja Paso Metalica 15*15 Intemperie	UNID.	4,00	$	32,182,00	$	128,728,00	0,00	4,00	$	-	$	128,728,00	0,00	$	32,182,00	$	-
NP 60	APU	ADICION		Caja PVC 5800	UNID.	30,00	$	4,301,00	$	129,030,00	0,00	0,00	$	-	$	-	30,00	$	4,301,00	$	129,030,00
NP 61	APU	ADICION		Caja PVC 2400 incluye suplemento y tapa	UNID.	156,00	$	3,305,00	$	515,580,00	1,00	0,00	$	3,305,00	$	-	157,00	$	3,305,00	$	518,885,00
				Canaleta															
NP 62	APU	ADICION		Ducto metalico cerrado cold rolled 20x5cm, incluye accesorios, elementos de fijacion y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	ML	30,00	$	199,681,00	$	5,990,430,00	0,00	0,00	$	-	$	-	30,00	$	199,681,00	$	5,990,430,00
NP 63	APU	ADICION		Bandeja portacable tipo malla electrozincada CF54x200	ML	30,00	$	58,807,00	$	1,764,210,00	0,00	0,00	$	-	$	-	30,00	$	58,807,00	$	1,764,210,00
NP 64	APU	ADICION		Placa Salida Cablofil Para Tuberia	UNID.	40,00	$	11,593,00	$	463,720,00	0,00	0,00	$	-	$	-	40,00	$	11,593,00	$	463,720,00
				Tuberia															
NP 65	APU	ADICION		Tubo Conduit SCH40 1 1/2"	ML	250,00	$	17,449,00	$	4,362,250,00	0,00	50,00	$	-	$	872,450,00	200,00	$	17,449,00	$	3,489,800,00
NP 66	APU	ADICION		Riel Estructural Ranurado 2x4"	ML	18,00	$	25,779,00	$	464,022,00	1,00	0,00	$	25,779,00	$	-	19,00	$	25,779,00	$	489,801,00
				OTROS GASTOS															
				Documentación - Marcación					$	-									
NP 67	APU	ADICION		Marcación en cinta adhesiva impresa	UNID.	210,00	$	1,893,00	$	397,530,00	0,00	100,00	$	-	$	189,300,00	110,00	$	1,893,00	$	208,230,00
				TRAMITE															
NP 68	APU	ADICION		Ajustes y validacion de diseños eléctricos y de voz y datos	UNID.	1,00	$	4,000,000,00	$	4,000,000,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	4,000,000,00	$	4,000,000,00
				ACOMETIDA Y RED EXTERIOR															
NP 69	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA CODENSA AE 305, INCLUYE BAJANTE EN 1-1/2 IMC, CAPACETEY TOTALIZADOR, NO INCLUYE MEDIDOR (MEDIDOR Y ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXION A SIMINISTRAR POR CODENSA)	UNID.	1,00	$	424,742,00	$	424,742,00	0,00	1,00	$	-	$	424,742,00	0,00	$	424,742,00	$	-
NP 70	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN CON 1 VARILLAS COPERWELD 5/8" X 2,44 MTS, 1 CAMARAS DE INSPECCIÓN 30X30 CM, 8 MTS DE CABLE COBRE 4 DESNUDO, 1 CONECTOR CABLE VARILLA Y1 CABLE-CABLE,	UNID.	1,00	$	584,881,00	$	584,881,00	0,00	0,00	$	-	$	-	1,00	$	584,881,00	$	584,881,00
NP 71	APU	ADICION		ACOMETIDA EN , 3#8+1#8+1#8T HFRLS, 1x 1/2"PVC DESDE MEDIDOR, HASTA TRANSFERENCIA, Y DE PLANTA HASTA TRANSFERENCIA. DE TRANSFERENCIA A TBLERO GENERAL	ML	15,00	$	84,766,00	$	1,271,520,00	3,00	0,00	$	254,304,00	$	-	18,00	$	84,766,00	$	1,525,824,00

				OBRA CIVIL														
NP 72	ICCU 4,22	ADICION		PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM (LINEAL)	ML	0,00	$	17,169,00	$	-	188,62	0,00	$	3,238,468,27	$	-	188,62	$	17,169,00	$	3,238,468,27
NP 73	6,15 ICCU	ADICION		PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	12,35	$	25,187,00	$	311,059,45	0,00	0,00	$	-	$	-	12,35	$	25,187,00	$	311,059,45
NP 74	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE LAMINA GALVANIZADA 0,30 MTS	ML	28,00	$	47,552,57	$	1,331,472,05	0,09	0,00	$	3,804,21	$	-	28,09	$	47,552,57	$	1,335,276,26
NP 75	APU	ADICION		IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO FOIL REFUERZO POLIETILENO 10 M2	M2	0,00	$	109,690,00	$	-	0,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	109,690,00	$	-
NP 76	APU	ADICION		MEDIACAÑA 10 CM EN MORTERO 1:3 IMPERMABILIZADO	ML	58,35	$	25,409,53	$	1,482,646,08	0,00	0,00	$	-	$	-	58,35	$	25,409,53	$	1,482,646,08
NP 77	APU	ADICION		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CANAL METÁLICA EXISTENTE	ML	92,55	$	21,732,56	$	2,011,348,43	0,14	0,00	$	3,042,56	$	-	92,69	$	21,732,56	$	2,014,390,99
NP 78	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS 1" EN ACERO	ML	12,00	$	208,333,33	$	2,500,000,00	0,00	3,80	$	-	$	791,666,67	8,20	$	208,333,33	$	1,708,333,33
NP 79	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION EXCLUSA TIPO VENTANA	UNID.	2,00	$	1,224,700,00	$	2,449,400,00	0,00	0,80	$	-	$	979,760,00	1,20	$	1,224,700,00	$	1,469,640,00
NP 80	ICCU 18,27	ADICION		PINTURA EPOXICA MEDICAÑA	ML		$	11,011,00	$	-	172,01	0,00	$	1,894,002,11	$	-	172,01	$	11,011,00	$	1,894,002,11
NP 81	ICCU 13,8	ADICION		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI - ACCESO PRINCIPAL	M2		$	87,453,00	$	-	1,00		$	87,453,00	$	-	1,00	$	87,453,00	$	87,453,00
NP 82	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA MURO/PUERTA ACERO INOXIDABLE PISO MEDIALUNA IRON	UND		$	26,204,55	$	-	17,00		$	445,477,35	$	-	17,00	$	26,204,55	$	445,477,35
NP 83	APU	ADICION		REGATA EN MURO DIVISORIO Y LOSA CONTRAPISO PARA INSTALACION MEDIACAÑA	ML		$	6,895,50			296,17		$	2,042,240,24	$	-	296,17	$	6,895,50	$	2,042,240,24
NP 84	APU	ADICION		SALIDA TOMA CORRIENTE DUPLEX (2P+T)	UND		$	124,226,07	$	-	47,00		$	5,838,625,13	$	-	47,00	$	124,226,07	$	5,838,625,13
NP 85	APU	ADICION		CABLE DESNUDO COBRE CALIBRE No. 10	ML		$	11,173,66	$	-	200,00		$	2,234,731,22	$	-	200,00	$	11,173,66	$	2,234,731,22
NP 86	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 36 CIRCUITOS	UND		$	1,046,699,47	$	-	1,00		$	1,046,699,47	$	-	1,00	$	1,046,699,47	$	1,046,699,47
NP 87	APU	ADICION		SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CIRCUITO NORMAL	UND		$	124,226,07	$	-	5,00		$	621,130,33	$	-	5,00	$	124,226,07	$	621,130,33
NP 88	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PVC 20 *20 - INTEMPERIE	UND		$	43,866,83	$	-	4,00		$	175,467,33	$	-	4,00	$	43,866,83	$	175,467,33
NP 89	APU	ADICION		JACK CATEGORIA 6 AMP	UND		$	37,618,00	$	-	10,00		$	376,180,00	$	-	10,00	$	37,618,00	$	376,180,00
NP 90	APU	ADICION		CABLE UTP CATEGORIA 6	ML		$	7,420,00	$	-	246,60		$	1,829,772,00	$	-	246,60	$	7,420,00	$	1,829,772,00
NP 91	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO	UND		$	453,954,65	$	-	1,00		$	453,954,65	$	-	1,00	$	453,954,65	$	453,954,65
NP 92	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL TRIPOLAR 3 X 63 A	UND		$	95,739,50	$	-	1,00		$	95,739,50	$	-	1,00	$	95,739,50	$	95,739,50
NP 93	APU	ADICION		PATCH CORD CAT 6A 3FT AMP	UND		$	38,138,08	$	-	39,00		$	1,487,385,12	$	-	39,00	$	38,138,08	$	1,487,385,12
NP 94	APU	ADICION		SUMINSTRO E INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND		$	95,997,71	$	-	6,00		$	575,986,28	$	-	6,00	$	95,997,71	$	575,986,28
NP 95	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SALIDA HDMI HASTA 20M	UND		$	223,211,00	$	-	3,00		$	669,633,00	$	-	3,00	$	223,211,00	$	669,633,00
NP 96	APU	ADICION		IMPERMEABILIZACION EMULSION ASFALTICA EN FRIO	M2		$	65,932,18	$	-	97,69		$	6,440,914,54	$	-	97,69	$	65,932,18	$	6,440,914,54
NP 97	APU	ADICION		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA (INCLUYE CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y BUJIA) PARA PLANTA ELECTRICA DE 5KVA	UND		$	1,085,720,68			1,00		$	1,085,720,68	$	-	1,00	$	1,085,720,68	$	1,085,720,68
NP 98	APU	ADICION		PINTURA KORAZA EXTERIOR 2 MANOS	M2		$	22,555,52	$	-	226,00		$	5,097,546,77	$	-	226,00	$	22,555,52	$	5,097,546,77
NP 99	APU	ADICION		CABLEADO PARA SONIDO OXIGENADO	ML		$	8,439	$	-	50,00		$	421,949,50	$	-	50,00	$	8,439,99	$	421,949,50
NP 100	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACIO CAJA METALICAS DE SEGURIDAD DE CAMARAS Y REFLECTORES	UND		$	179,802,22	$	-	8,00		$	1,438,417,77	$	-	8,00	$	179,802,22	$	1,438,417,77
NP 101	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACIOIN BARRA DISCAPACITADO ABATIBLE PMR EN ACERO INOXIDABLE	UND		$	839,268,27	$	-	1,00		$	839,268,27	$	-	1,00	$	839,268,27	$	839,268,27
NP 102	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACIOIN TIMBRE EMERGENCIA PARA BAÑO PMR	UND		$	68,515,20	$	-	1,00		$	68,515,20	$	-	1,00	$	68,515,20	$	68,515,20
NP 103	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA AUTOMATICA PARA TRANSFERENCIA DE PLANTA 5KVA	UND		$	7,961,934,55	$	-	1,00		$	7,961,934,55	$	-	1,00	$	7,961,934,55	$	7,961,934,55
NP 104	APU	ADICION		SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA ALTA PRESION PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA	UND		$	1,483,101,99	$	-	1,00		$	1,483,101,99	$	-	1,00	$	1,483,101,99	$	1,483,101,99
													$	-	$	-	0,00	$	-	$	-
													$	-	$	-	0,00	$	-	$	-
				SUBTOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES			$	73,618,829,68												$	118,996,893,31
				SUBTOTAL OBRAS			$	212,244,338,53												$	212,244,338,53
				ADMINISTRACION		23%	$	48,816,197,86												$	48,816,197,86
				IMPREVISTOS		2%	$	4,244,886,77												$	4,244,886,77
				UTILIDAD		5%	$	10,612,216,93												$	10,612,216,93
				VALOR TOTAL			$	275,917,640,09												$	275,917,640,09

Elaboro:

LEVELS S.A.S
R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:

LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 601-2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S**

ACTA No. 03 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS FASE 2

CONTRATO:	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE
VALOR CONTRATADO:	$ 275.917.640,09
CONTRATANTE:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA
CONTRATISTA:	LEVELS S.A.S NIT No 901.380.377-9 R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
INTERVENTORIA:	ARQ. LILIANA PARRA CASTELLANOS
FECHA DE INICIO:	05 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, HASTA 31 DE ENERO DEL 2024
FECHA TERMINACION PROYECTADA:	31 DE ENERO DEL 2024
SUPERVISOR:	WILLIAM CORTES

En Soacha, a los 17 días del mes de Enero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON** como Representante Legal de **LEVELS S.A.S** actuando como CONTRATISTA y la **ARQ LILIANA PARRA CASTELLANOS** actuando como director del contrato de interventoría, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	TIPO	DESCRIPCION			
NP 80	ICCU 18,27	PINTURA EPOXICA MEDICAÑA	ML	172,01	$ 11.011,00
NP 81	ICCU 13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI - ACCESO PRINCIPAL	M2	1	$ 87.453,00
NP 82	APU	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA MURO/PUERTA ACERO INOXIDABLE PISO MEDIALUNA IRON	UND	17	$ 26.204,55

NP 83	APU	REGATA EN MURO DIVISORIO Y LOSA CONTRAPISO PARA INSTALACION MEDIACAÑA	ML	296,17	$ 6.895,50
NP 84	APU	SALIDA TOMA CORRIENTE DUPLEX (2P+T)	UND	47	$ 124.226,07
NP 85	APU	CABLE DESNUDO COBRE CALIBRE No. 10	ML	200	$ 11.173,66
NP 86	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 36 CIRCUITOS	UND	1	$ 1.046.699,47
NP 87	APU	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CIRCUITO NORMAL	UND	5	$ 124.226,07
NP 88	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PVC 20 *20 - INTEMPERIE	UND	4	$ 43.866,83
NP 89	APU	JACK CATEGORIA 6 AMP	UND	10	$ 37.618,00
NP 90	APU	CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	246,6	$ 7.420,00
NP 91	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO	UND	1	$ 453.954,65
NP 92	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL TRIPOLAR 3 X 63 A	UND	1	$ 95.739,50
NP 93	APU	PATCH CORD CAT 6A 3FT AMP	UND	39	$ 38.138,08
NP 94	APU	SUMINSTRO E INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6	$ 95.997,71
NP 95	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SALIDA HDMI HASTA 20M	UND	3	$ 223.211,00
NP 96	APU	IMPERMEABILIZACIÓN EMULSION ASFALTICA EN FRIO	M2	97,69	$ 65.932,18
NP 97	APU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA (INCLUYE CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y BUJIA) PARA PLANTA ELECTRICA DE 5KVA	UND	1	$ 1.085.720,68
NP 98	APU	PINTURA KORAZA EXTERIOR 2 MANOS	M2	226	$ 22.555,52
NP 99	APU	CABLEADO PARA SONIDO OXIGENADO	ML	50	$ 8.439,00
NP 100	APU	SUMINISTRO E INSTALACIO CAJA METALICAS DE SEGURIDAD DE CAMARAS Y REFLECTORES	UND	8	$ 179.802,22
NP 101	APU	SUMINISTRO E INSTALACIOIN BARRA DISCAPACITADO ABATIBLE PMR EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 839.268,27

NP 102	APU	SUMINISTRO E INSTALACIOIN TIEMBRE EMERGENCIA PARA BAÑO PMR	UND	1	$ 68.515,20
NP 103	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA AUTOMATICA PARA TRANSFERENCIA DE PLANTA 5KVA	UND	1	$ 7.961.934,55
NP 104	APU	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA ALTA PRESION PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA	UND	1	$ 1.483.101,99

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la interventoría, en folios. (122)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON
Representante Legal
Contratista de obra

LILIANA PARRA CASTELLANOS
Director de Interventoría

V° B°
WILLIAM CORTES
E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza de Soacha

REF. MAESTRO


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

ITEM: NP 85	**CONTIENE:** EVIDENCIA / REGISTRO FOTOGRAFICO / DESCRIPCION DEL AREA / ESQUEMA	**UNIDAD DE MEDIDA:** ML

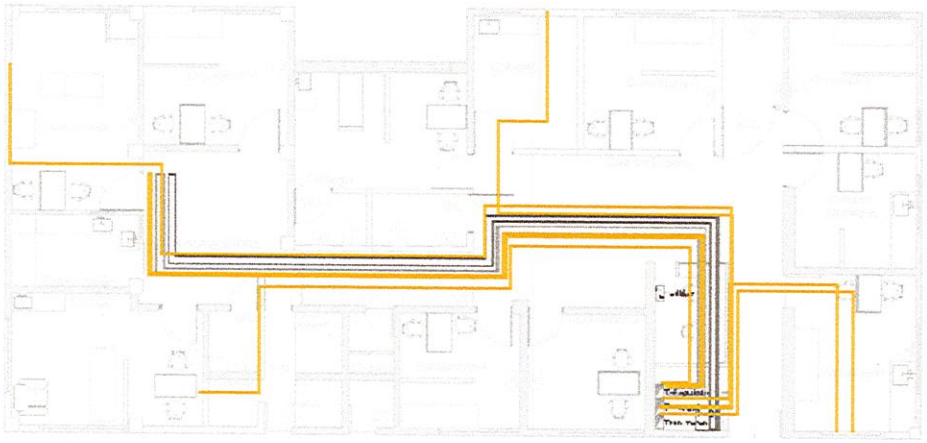

CABLE

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SOACHA


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	NP	ITEM NO PREVISTOS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP 85	ML	Cable Desnudo Cobre No. 10



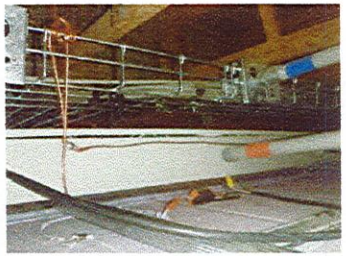



OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	A	B	H	No UNID	ML
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	CABLE					
	BANDEJA	30,00	0,00	0,00	1,00	30,00
	PUNTOS BIFÁSICO 1	34,00	0,00	0,00	1,00	18,00
	PUNTOS BIFÁSICO 2	34,00	0,00	0,00	1,00	18,00
	PUNTOS BIFÁSICO 3	34,00	0,00	0,00	1,00	32,00
	PUNTOS BIFÁSICO 4	34,00	0,00	0,00	1,00	45,00
	PUNTOS BIFÁSICO 5	34,00	0,00	0,00	1,00	57,00
					CANTIDAD EJECUTADA	200,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ML	**200,00**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA



CONTRATO DE OBRA No 601-2023 - ACTA PARCIAL 002 - FASE 2

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE

CONTRATANTE: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	**VALOR CONTRATO:**	$ 472.218.372,94	**VALOR CONTRATO:**	$ 472.218.372,94	**FECHA SUSPENSION 001:**
CONTRATISTA: LEVELS S.A.S - NIT 901.260.277-0	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**FECHA REINICIO 001:**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	R.L SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON	**PLAZO DE EJECUCION**	CUATRO (04) MESES	
MUNICIPIO SOACHA	**SUPERVISOR:** E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	**FECHA ACTA DE INICIO:**	1-oct-23	**CONTIENE:** ACTA PARCIAL 02 - FASE 2
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	**CONTRATO DE OBRA No.:** 601-2023	**FECHA TERMINACION PROYE**	31-ene-24	

ACTA PARCIAL 003 - FASE 2

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES / MENORES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 001			CANTIDADES ACTA PARCIAL 002			CANTIDADES ACTA PARCIAL 003			ACUMULADOS / SALDOS		
			UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1		**PRELIMINARES**				$ 11.244.870,26			$ 10.167.684,35			$ 1.087.286,00			$ -			$ 0,00
1.1	ICCU 1.12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	211,75	$ 9.843,00	$ 2.195.430,25	211,75	$ 9.843,00	$ 2.195.430,25	0,00	$ 9.843,00	$ -		$ 9.843,00	$ -	0,00	$ 9.843,00	$ -
1.2	ICCU 6.15	PANETE IMPERMEABILIZADO FACHADA 1:3, E=1,5 CM	M2	255,30	$ 24.559,00	$ 6.269.657,40	255,30	$ 24.559,00	$ 6.269.657,40	0,00	$ 24.559,00	$ -		$ 24.559,00	$ -	0,00	$ 24.559,00	$ -
1.3	ICCU 18.23	VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS FACHADA	M2	226,00	$ 9.622,00	$ 2.174.572,00	113,00	$ 9.622,00	$ 1.087.286,00	113,00	$ 9.622,00	$ 1.087.286,00		$ 9.622,00	$ -	0,00	$ 9.622,00	$ -
1.4	APU	MEDIA CAÑA EN CIELORASO EN POLIMERO SELLADO EXTRASOLIDO COLOR BLANCO	ML	0,00	$ 74.700,00	$ -	0,00	$ 74.700,00	$ -	0,00	$ 74.700,00	$ -		$ 74.700,00	$ -	0,00	$ 74.700,00	$ -
1.5	ICCU 1.38	DESMONTE VENTANAS	M2	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70	43,70	$ 15.911,00	$ 695.310,70	0,00	$ 15.911,00	$ -		$ 15.911,00	$ -	0,00	$ 15.911,00	$ 0,00
1.6	APU	PERFIL METALICO ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA INCLUYE PINTURA	ML	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -		$ 93.750,00	$ -	0,00	$ 93.750,00	$ -
2		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 13.196.679,45			$ -			$ 10.023.500,45			$ 3.133.179,00			$ -
2.1	ICCU 12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UNID	0,00	$ 667.479,00	$ -	0,00	$ 667.479,00	$ -	0,00	$ 667.479,00	$ -		$ 667.479,00	$ -	0,00	$ 667.479,00	$ -
2.2	ICCU 12.5	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNID	0,00	$ 67.460,00	$ -	0,00	$ 67.460,00	$ -	0,00	$ 67.460,00	$ -		$ 67.460,00	$ -	0,00	$ 67.460,00	$ -
2.3	ICCU 12.17	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"	ML	0,00	$ 5.748,00	$ -	0,00	$ 5.748,00	$ -	0,00	$ 5.748,00	$ -		$ 5.748,00	$ -	0,00	$ 5.748,00	$ -
2.4	APU	CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO #12	ML	0,00	$ 8.250,00	$ -	0,00	$ 8.250,00	$ -	0,00	$ 8.250,00	$ -		$ 8.250,00	$ -	0,00	$ 8.250,00	$ -
2.5	ICCU 12.4	SALIDA LAMPARA CONMUTABLE PVC COMPLETA	UNID	0,00	$ 91.675,00	$ -	0,00	$ 91.675,00	$ -	0,00	$ 91.675,00	$ -		$ 91.675,00	$ -	0,00	$ 91.675,00	$ -
2.6	APU	PANEL LED SOBRE PONER CIRCULAR 1860 LUMENES LUZ FRIA INCLUYE CORTE CIELORASO	UNID	0,00	$ 187.260,00	$ -	0,00	$ 187.260,00	$ -	0,00	$ 187.260,00	$ -		$ 187.260,00	$ -	0,00	$ 187.260,00	$ -
2.7	APU	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION)	UNID	0,00	$ 166.705,00	$ -	0,00	$ 166.705,00	$ -	0,00	$ 166.705,00	$ -		$ 166.705,00	$ -	0,00	$ 166.705,00	$ -
2.8	APU	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	713,10	$ 18.450,00	$ 13.155.679,45	0,00	$ 18.450,00	$ -	543,28	$ 18.450,00	$ 10.023.500,45	169,82	$ 18.450,00	$ 3.133.179,00	0,00	$ 18.450,00	$ -
3		**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 12.344.342,90			$ -			$ 8.084.342,90			$ 4.260.000,00			$ -
3.1	ICCU 11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" SM	UNID	0,00	$ 291.364,00	$ -	0,00	$ 291.364,00	$ -	0,00	$ 291.364,00	$ -		$ 291.364,00	$ -	0,00	$ 291.364,00	$ -
3.2	ICCU 11.4	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	0,00	$ 43.790,00	$ -	0,00	$ 43.790,00	$ -	0,00	$ 43.790,00	$ -		$ 43.790,00	$ -	0,00	$ 43.790,00	$ -
3.3	ICCU 11.29	SALIDA SANITARIA PVC/SP/PARAL 3"	UNID	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -		$ 109.545,00	$ -	0,00	$ 109.545,00	$ -
3.4	ICCU 11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.859,90	0,00	$ 43.902,00	$ -	72,95	$ 43.902,00	$ 3.202.859,90		$ 43.902,00	$ -	0,00	$ 43.902,00	$ -
3.5	ICCU 11.28	REGISTRO 1"	UNID	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -		$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -
3.6	APU	ADECUACION TRAMPA DE GRASA	UND	1,00	$ 8.520.000,00	$ 8.520.000,00	0,00	$ 8.520.000,00	$ -	0,50	$ 8.520.000,00	$ 4.260.000,00	0,50	$ 8.520.000,00	$ 4.260.000,00	0,00	$ 8.520.000,00	$ -
3.7	ICCU 11.5	CAJA DE INSPECCION DE GRESS	UND	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00	0,00	$ 310.846,00	$ -	2,00	$ 310.846,00	$ 621.692,00		$ 310.846,00	$ -	0,00	$ 310.846,00	$ -
3.8	ICCU 12.4	ALISTADO PISOS 1:3 E=8,04	M2	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -		$ 31.625,00	$ -	0,00	$ 31.625,00	$ -
4		**CARPINTERIA METALICA**				$ 7.476.672,15			$ -			$ 6.868.546,80			$ 608.122,36			$ -
4.1	ICCU 10.4	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0,8 (VENTANERIA)	UND	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -		$ 191.165,00	$ -	0,00	$ 191.165,00	$ -
4.2	ICCU 10.20	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	46,35	$ 161.309,00	$ 7.476.672,15	0,00	$ 161.309,00	$ -	42,30	$ 161.309,00	$ 6.868.546,80	3,35	$ 161.309,00	$ 608.122,36	0,00	$ 161.309,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 44.222.564,85			$ 10.167.684,35			$ 25.163.679,15			$ 7.991.302,36			$ 0,00

ITEM NO PREVISTOS

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES / MENORES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 001			CANTIDADES ACTA PARCIAL 002			CANTIDADES ACTA PARCIAL 003			ACUMULADOS / SALDOS		
			UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
NP		**DEMOLICIONES**				$ 49.024.780,38			$ 18.511.181,73			$ 13.063.279,15			$ 17.450.319,50			$ 0,00
NP 1	APU	PUERTA EN ALUMINIO TIPO INCLUYE VIDRIO 5 MM TRANSPARENTE MEDIDAS DE 0,60 HASTA 1,10 MTS, ALTURA PROMEDIO 2,00 MTS	UNID	20,00	$ 1.139.800,00	$ 22.796.000,00	0,00	$ 1.139.800,00	$ -	9,50	$ 1.139.800,00	$ 10.828.100,00	10,50	$ 1.139.800,00	$ 11.967.900,00	0,00	$ 1.139.800,00	$ -
NP 2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO AQUAJET PRO MARCA CORONA PARA PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA	UNID.	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80	0,00	$ 690.480,80	$ -	0,00	$ 690.480,80	$ -	1,00	$ 690.480,80	$ 690.480,80	0,00	$ 690.480,80	$ -
NP 3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS INSTITUCIONAL REF 003981001 CORONA PARA PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	UNID.	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80	0,00	$ 701.524,80	$ -	0,00	$ 701.524,80	$ -	1,00	$ 701.524,80	$ 701.524,80	0,00	$ 701.524,80	$ -
NP 4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 40 CM D 1 1/4 PULG PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA (BAÑO)	UNID.	1,00	$ 211.960,60	$ 211.960,60	0,00	$ 211.960,60	$ -	0,00	$ 211.960,60	$ -	1,00	$ 211.960,60	$ 211.960,60	0,00	$ 211.960,60	$ -
NP 5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DESAGUE LAVAPLATOS Y LAVAMANOS (CANASTILLA SIFON)	UNID.	18,00	$ 81.700,85	$ 1.470.615,30	0,00	$ 81.700,85	$ -	0,00	$ 81.700,85	$ -	18,00	$ 81.700,85	$ 1.470.615,30	0,00	$ 81.700,85	$ -
NP 6	APU	REGATA EN MURO DE MAMPOSTERIA DIVISORIA	ML	209,45	$ 6.895,50	$ 1.444.262,48	55,90	$ 6.895,50	$ 385.464,45	153,55	$ 6.895,50	$ 1.058.804,03		$ 6.895,50	$ -	0,00	$ 6.895,50	$ 0,00
NP 7	APU	RETIRO DE SOBRANTES Y DESCARGUE EN ESCOMBRERA A UNA DISTANCIA DE 9 KM (INCLUYE CARGUE, SELECCION SOLIDOS Y CERTIFICADO DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	89,55	$ 102.200,00	$ 9.152.010,00	65,99	$ 102.200,00	$ 6.744.178,00	0,00	$ 102.200,00	$ -	23,56	$ 102.200,00	$ 2.407.832,00	0,00	$ 102.200,00	$ -
NP 8	ICCU 11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	85,40	$ 11.029,00	$ 941.791,20	85,40	$ 11.029,00	$ 941.791,20	0,00	$ 11.029,00	$ -		$ 11.029,00	$ -	0,00	$ 11.029,00	$ -
NP 9	ICCU 11.16	PUNTO HIDRAULICO PVC/P/PARAL 1/2"	UNID.	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00	34,00	$ 85.887,00	$ 2.920.158,00	0,00	$ 85.887,00	$ -		$ 85.887,00	$ -	0,00	$ 85.887,00	$ -
NP 10	ICCU 11.35	REGISTRO 1	UNID.	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00	1,00	$ 130.678,00	$ 130.678,00	0,00	$ 130.678,00	$ -		$ 130.678,00	$ -	0,00	$ 130.678,00	$ -
NP 11	ICCU 11.26	REGISTRO 1/2"	UNID.	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00	20,00	$ 73.377,00	$ 1.467.540,00	0,00	$ 73.377,00	$ -		$ 73.377,00	$ -	0,00	$ 73.377,00	$ -
NP 12	ICCU 11.37	REGISTRO 3/4"	UNID.	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00	1,00	$ 92.103,00	$ 92.103,00	0,00	$ 92.103,00	$ -		$ 92.103,00	$ -	0,00	$ 92.103,00	$ -
NP 13	ICCU 14.27	TAPA REGISTRO 20X20	UNID.	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00	20,00	$ 24.351,00	$ 487.020,00	0,00	$ 24.351,00	$ -		$ 24.351,00	$ -	0,00	$ 24.351,00	$ -
NP 14	ICCU 11.12	LLAVE MANGUERA	UNID.	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00	1,00	$ 46.376,00	$ 46.376,00	0,00	$ 46.376,00	$ -		$ 46.376,00	$ -	0,00	$ 46.376,00	$ -
NP 15	ICCU 11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	55,30	$ 32.066,00	$ 1.773.249,80	16,61	$ 32.066,00	$ 532.564,66	36,69	$ 32.066,00	$ 1.176.375,12		$ 32.066,00	$ -	0,00	$ 32.066,00	$ -
NP 16	ICCU 11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00	33,50	$ 59.370,00	$ 1.988.895,00	0,00	$ 59.370,00	$ -		$ 59.370,00	$ -	0,00	$ 59.370,00	$ -
NP 17	ICCU 11.19	SALIDA SANITARIA PVC/SP/PARAL 2"	UNID.	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00	19,00	$ 90.377,00	$ 1.717.163,00	0,00	$ 90.377,00	$ -		$ 90.377,00	$ -	0,00	$ 90.377,00	$ -
NP 18	ICCU 11.21	SALIDA SANITARIA PVC/SP/PARAL 4"	UNID.	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00	4,00	$ 116.304,00	$ 465.216,00	0,00	$ 116.304,00	$ -		$ 116.304,00	$ -	0,00	$ 116.304,00	$ -
NP 19	ICCU 11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40	23,20	$ 22.747,00	$ 527.730,40	0,00	$ 22.747,00	$ -		$ 22.747,00	$ -	0,00	$ 22.747,00	$ -
		SUBTOTAL OBRAS ITEM NO PREVISTOS				$ 49.024.780,38			$ 18.511.181,73			$ 13.063.279,15			$ 17.450.319,50			$ 0,00

ACTIVIDADES - ADICION PRESUPUESTAL N° 1

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL 001			CANTIDADES ACTA PARCIAL 002			CANTIDADES ACTA PARCIAL 003			ACUMULADOS / SALDOS		
							CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
						$ 119,896,853.31			$ -			$ -			$ 119,896,853.31			$ -
NP 20	APU	Patch Cord Cat 6A 10ft AMP	UNID.	30.00	$ 45,657.00	$ 1,369,710.00							30.00	$ 45,657.00	$ 1,369,719.00	0.00	$ 45,657.00	$ -
NP 21	APU	Patch Cord Cat 6A 5ft AMP	UNID.	0.00	$ 39,194.00	$ -								$ 39,194.00	$ -	0.00	$ 39,194.00	$ -
NP 22	APU	Face Plate 2 Puertos AMP	UNID.	28.00	$ 12,897.00	$ 361,116.00							28.00	$ 12,897.00	$ 361,116.00	0.00	$ 12,897.00	$ -
NP 23	APU	Tapa Ciega AMP	UNID.	16.00	$ 18,468.00	$ 295,488.00							16.00	$ 18,468.00	$ 295,488.00	0.00	$ 18,468.00	$ -
NP 24	APU	Cable UTP Categoria 6A	ML	0.00	$ 8,295.00	$ -								$ 8,295.00	$ -	0.00	$ 8,295.00	$ -
NP 25	APU	Jack Cat 6A AMP	UNID.	40.00	$ 40,810.00	$ 1,632,400.00							40.00	$ 40,810.00	$ 1,632,400.00	0.00	$ 40,810.00	$ -
NP 26	APU	Hertaje angulado 24 puertos AMP NA	UNID.	3.00	$ 372,358.00	$ 1,117,074.00							3.00	$ 372,358.00	$ 1,117,074.00	0.00	$ 372,358.00	$ -
NP 27	APU	Servicio Certificacion Puntos de Red	UNID.	1.00	$ 1,417,416.00	$ 1,417,416.00							1.00	$ 1,417,416.00	$ 1,417,416.00	0.00	$ 1,417,416.00	$ -
		Rack - Gabinetes - Organizadores																
NP 28	APU	Gabinete Cerrado Piso 120 cm Alto	UNID.	1.00	$ 732,946.00	$ 732,946.00							1.00	$ 732,946.00	$ 732,946.00	0.00	$ 732,946.00	$ -
NP 30	APU	Bandeja Para Rack 25 Cm	UNID.	3.00	$ 76,894.00	$ 230,682.00							3.00	$ 76,894.00	$ 230,682.00	0.00	$ 76,894.00	$ -
NP 31	APU	Multitoma Horizontal 8 salidas dobles	UNID.	1.00	$ 310,706.00	$ 310,706.00							1.00	$ 310,706.00	$ 310,706.00	0.00	$ 310,706.00	$ -
NP 32	APU	Organizador Horizontal 2RU	UNID.	5.00	$ 209,640.00	$ 1,048,200.00							5.00	$ 209,640.00	$ 1,048,200.00	0.00	$ 209,640.00	$ -
NP 33	APU	Suministro e instalacion UPS BIFASICA INTERACTIVA REF 1.2SF010K	UNID.	1.00	$ 9,910,593.67	$ 9,910,593.67							1.00	$ 9,910,593.67	$ 9,910,593.67	0.00	$ 9,910,593.67	$ -
		REDES ELECTRICAS																
		Salidas Electricas																
NP 34	APU	Salida Toma Doble Polo a Tierra IPED REGULADO PVC Completa Color Naranja	UNID.	22.00	$ 153,118.00	$ 3,368,596.00							22.00	$ 153,118.00	$ 2,368,596.00	0.00	$ 153,118.00	$ -
		Acometidas - Cables - Alambres																
NP 35	APU	Cable cobre THHN/THWN Preentorchado 3 X 12 600V AZUL BLANCO VERDE Cero Halogeno	ML	67.75	$ 16,557.00	$ 1,121,736.75							67.75	$ 16,557.00	$ 1,121,736.75	0.00	$ 16,557.00	$ -
NP 36	APU	Cable cobre THHN/THWN Preentorchado 3 X 12 600V ROJO BLANCO VERDE Cero Halogeno	ML	120.50	$ 16,557.00	$ 1,995,118.50							120.50	$ 16,557.00	$ 1,995,118.50	0.00	$ 16,557.00	$ -
NP 37	APU	Cable Desnudo Cobre No. 8	ML	0.00	$ 13,829.00	$ -								$ 13,829.00	$ -	0.00	$ 13,829.00	$ -
NP 38	APU	Cable Encauchetado 4x6	ML	13.00	$ 33,646.00	$ 437,398.00							13.00	$ 33,646.00	$ 437,398.00	0.00	$ 33,646.00	$ -
NP 39	APU	Conectores de autoperforre - 3M - 10 AWG - 12 AWG	UNID.	300.00	$ 2,166.00	$ 650,400.00							300.00	$ 2,166.00	$ 650,400.00	0.00	$ 2,166.00	$ -
		Protecciones - Conmutadores																
NP 40	APU	Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 24 Circuitos	UNID.	0.00	$ 940,140.00	$ -								$ 940,140.00	$ -	0.00	$ 940,140.00	$ -
NP 41	APU	Tablero Trifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos	UNID.	1.00	$ 577,601.00	$ 577,601.00							1.00	$ 577,601.00	$ 577,601.00	0.00	$ 577,601.00	$ -
NP 42	APU	TOTALIZADOR INDUSTRIAL INT DRX125 60A 3P 25kA 220v	UNID.	1.00	$ 299,452.00	$ 299,452.00							1.00	$ 299,452.00	$ 299,452.00	0.00	$ 299,452.00	$ -
NP 43	APU	TOTALIZADOR INDUSTRIAL INT DRX125 40A 3P 25kA 220v	UNID.	1.00	$ 299,452.00	$ 299,452.00							1.00	$ 299,452.00	$ 299,452.00	0.00	$ 299,452.00	$ -
NP 44	APU	Breaker Enchufable 1x20A 10KA Luminex	UNID.	18.00	$ 20,686.00	$ 372,348.00							18.00	$ 20,686.00	$ 372,348.00	0.00	$ 20,686.00	$ -
NP 45	APU	Breaker Enchufable 2x20A 10KA Luminex	UNID.	4.00	$ 59,944.00	$ 239,776.00							4.00	$ 59,944.00	$ 239,776.00	0.00	$ 59,944.00	$ -
NP 46	APU	Breaker Enchufable 3x30A 10LA Luminex	UNID.	0.00	$ 139,618.00	$ -								$ 139,618.00	$ -	0.00	$ 139,618.00	$ -
NP 47	APU	TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PLANTA SKVA	UNID.	1.00	$ 758,918.00	$ 758,918.00							1.00	$ 758,918.00	$ 758,918.00	0.00	$ 758,918.00	$ -
		Iluminacion																
NP 48	APU	CABLE LSZH N° 12 COBRE AMARILLO	ML	700.00	$ 5,175.00	$ 3,622,500.00							700.00	$ 5,175.00	$ 3,622,500.00	0.00	$ 5,175.00	$ -
NP 49	APU	CABLE LSZH N° 12 COBRE BLANCO	ML	700.00	$ 5,175.00	$ 3,622,500.00							700.00	$ 5,175.00	$ 3,622,500.00	0.00	$ 5,175.00	$ -
NP 50	APU	CABLE LSZH N° 12 COBRE VERDE	ML	400.00	$ 5,175.00	$ 2,070,000.00							400.00	$ 5,175.00	$ 2,070,000.00	0.00	$ 5,175.00	$ -
NP 51	APU	CABLE N° 12 DESNUDO	ML	0.00	$ 4,554.00	$ -								$ 4,554.00	$ -	0.00	$ 4,554.00	$ -
NP 52	APU	Cable Encauchetado 2x16	ML	56.00	$ 5,465.00	$ 360,020.00							56.00	$ 5,465.00	$ 360,020.00	0.00	$ 5,465.00	$ -
NP 53	APU	LAMPARA DE EMERGENCIA EMERG R3_5W_2X100LM 180MIN	UNID.	7.00	$ 68,108.00	$ 476,756.00							7.00	$ 68,108.00	$ 476,756.00	0.00	$ 68,108.00	$ -
NP 54	APU	LAMPARA HERMETICA 2X32	UNID.	5.00	$ 97,690.00	$ 488,450.00							5.00	$ 97,690.00	$ 488,450.00	0.00	$ 97,690.00	$ -
NP 55	APU	PANEL LED 60X60 40W	UNID.	22.00	$ 126,973.00	$ 2,793,406.00							22.00	$ 126,973.00	$ 2,793,406.00	0.00	$ 126,973.00	$ -
NP 56	APU	PANEL LED 1e/W REDONDO	UNID.	32.00	$ 20,679.00	$ 661,728.00							32.00	$ 20,679.00	$ 661,728.00	0.00	$ 20,679.00	$ -
NP 57	APU	REFLECTOR 100W WALLPACK	UNID.	6.00	$ 152,987.00	$ 917,922.00							6.00	$ 152,987.00	$ 917,922.00	0.00	$ 152,987.00	$ -
NP 58	APU	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS EI TOTALIZADOR	UNID.	0.00	$ 245,022.00	$ -								$ 245,022.00	$ -	0.00	$ 245,022.00	$ -
		CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS																
		Cajas																
NP 59	APU	Caja Paso Metalica 15*15 Intempene	UNID.	0.00	$ 32,182.00	$ -								$ 32,182.00	$ -	0.00	$ 32,182.00	$ -
NP 60	APU	Caja PVC 5x80	UNID.	30.00	$ 4,301.00	$ 129,030.00							30.00	$ 4,301.00	$ 129,030.00	0.00	$ 4,301.00	$ -
NP 61	APU	Caja PVC 2400 incluye suplemento y tapa	UNID.	157.00	$ 3,305.00	$ 518,885.00							157.00	$ 3,305.00	$ 518,885.00	0.00	$ 3,305.00	$ -
		Canaleta																
NP 62	APU	Ducto metalico cerrado cold rolled 20x5cm incluye accesorios, elementos de fijacion y elementos necesarios para su correcta in	ML	30.00	$ 199,681.00	$ 5,990,430.00							30.00	$ 199,681.00	$ 5,990,430.00	0.00	$ 199,681.00	$ -
NP 63	APU	Bandeja portacable tipo malla electrozincada CF54x200	ML	30.00	$ 58,807.00	$ 1,764,210.00							30.00	$ 58,807.00	$ 1,764,210.00	0.00	$ 58,807.00	$ -
NP 64	APU	Placa Salida Cable/ll Para Tuberia	UNID.	40.00	$ 11,593.00	$ 463,720.00							40.00	$ 11,593.00	$ 463,720.00	0.00	$ 11,593.00	$ -
		Tuberia																
NP 65	APU	Tubo Conduit SCH40 1 1/2"	ML	200.00	$ 17,449.00	$ 3,489,800.00							200.00	$ 17,449.00	$ 3,489,800.00	0.00	$ 17,449.00	$ -
NP 66	APU	Riel Estructural Ranurado 2x4"	ML	19.00	$ 25,779.00	$ 489,801.00							19.00	$ 25,779.00	$ 489,801.00	0.00	$ 25,779.00	$ -

		OTROS GASTOS																							
		Documentacion - Marcacion																							
NP 67	APU	Marcacion en cinta adhesiva impresa	UNID.	110,00	$	1.893,00	$	208.230,00								110,00	$	1.893,00	$	208.230,00	0,00	$	1.893,00	$	-
		TRAMITE																							
NP 68	APU	Ajustes y validacion de diseños electricos y de voz y datos	UNID.	1,00	$	4.000.000,00	$	4.000.000,00								1,00	$	4.000.000,00	$	4.000.000,00	0,00	$	4.000.000,00	$	-
		ACOMETIDA Y RED EXTERIOR																							
NP 69	APU	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA MEDIDOR SEGUN NORMA CODENSA AE 335 INCLUYE BAJANTE EN 1-1/2	UNID.	0,00	$	424.742,00	$	-									$	424.742,00	$	-	0,00	$	424.742,00	$	-
NP 70	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA SUBESTACION CGN 1 VARILLAS COPERWELD 5/8" X 2,44 MTS 1	UNID.	1,00	$	564.881,00	$	564.881,00								1,00	$	564.881,00	$	564.881,00	0,00	$	564.881,00	$	-
NP 71	APU	ACOMETIDA EN 3#6+1#6+1#8T HFRLS 1x 1/2"PVC DESDE MEDIDOR HASTA TRANSFERENCIA Y DE PLANTA HAST	ML	18,00	$	84.799,00	$	1.525.824,00								18,00	$	84.799,00	$	1.525.824,00	0,00	$	84.799,00	$	-
		OBRA CIVIL																							
NP 72	ICCU 4.22	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 E=1,5 CM (LINEAL)	ML	166,62	$	17.169,00	$	2.861.026,78								166,62	$	17.169,00	$	2.861.026,78	0,00	$	17.169,00	$	-
NP 73	5.15 ICCU	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 E=1,5 CM	M2	12,25	$	25.187,00	$	308.540,75								12,25	$	25.187,00	$	308.540,75	0,00	$	25.187,00	$	-
NP 74	APU	SUMINISTRO E INSTALACION CASALETE LAMINA GALVANIZADA 0,20 MTS	ML	26,08	$	47.552,57	$	1.240.276,26								26,08	$	47.552,57	$	1.240.276,26	0,00	$	47.552,57	$	-
NP 75	APU	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO FOIL REFUERZO POLIETILENO 10 M2	M2	9,00	$	109.990,00	$	-									$	109.990,00	$	-	0,00	$	109.990,00	$	-
NP 76	APU	MEDIACAÑA 10 CM EN MORTERO 1:3 IMPERMABILIZADO	ML	58,35	$	25.409,53	$	1.482.646,09								58,35	$	25.409,53	$	1.482.646,09	0,00	$	25.409,53	$	-
NP 77	APU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CANAL METALICA EXISTENTE	ML	92,69	$	21.732,56	$	2.014.390,99								92,69	$	21.732,56	$	2.014.390,99	0,00	$	21.732,56	$	-
NP 78	APU	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS 1" EN ACERO	ML	8,20	$	208.333,33	$	1.708.333,33								8,20	$	208.333,33	$	1.708.333,33	0,00	$	208.333,33	$	-
NP 79	APU	SUMINISTRO E INSTALACION EXCLUSA TIPO VENTANA	UNID.	1,20	$	1.224.700,00	$	1.469.640,00								1,20	$	1.224.700,00	$	1.469.640,00	0,00	$	1.224.700,00	$	-
NP 80	ICCU 18.27	PINTURA EPOXICA MEDIACAÑA	ML	172,61	$	11.011,00	$	1.899.992,11								172,61	$	11.011,00	$	1.899.992,11	0,00	$	11.011,00	$	-
NP 81	ICCU 13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 3000 PSI - ACCESO PRINCIPAL	M2	1,00	$	87.453,00	$	87.453,00								1,00	$	87.453,00	$	87.453,00	0,00	$	87.453,00	$	-
NP 82	APU	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA MURO/PUERTA ACERO INOXIDABLE PISO MEDIALUNA 90CM	UND	17,00	$	26.204,55	$	445.477,35								17,00	$	26.204,55	$	445.477,35	0,00	$	26.204,55	$	-
NP 83	APU	REGATA EN MURO, DIVISORIO Y LOSA CONTRAPISO PARA INSTALACION MEDIACAÑA	ML	286,17	$	8.895,50	$	2.545.240,24								286,17	$	8.895,50	$	2.545.240,24	0,00	$	8.895,50	$	-
NP 84	APU	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE (3#8+T)	UND	47,00	$	124.226,97	$	5.838.625,13								47,00	$	124.226,97	$	5.838.625,13	0,00	$	124.226,97	$	-
NP 85	APU	CABLE DESNUDO COBRE CALIBRE No. 10	ML	200,00	$	11.173,66	$	2.234.731,22								200,00	$	11.173,66	$	2.234.731,22	0,00	$	11.173,66	$	-
NP 86	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 20 CIRCU	UND	1,00	$	1.046.699,47	$	1.046.699,47								1,00	$	1.046.699,47	$	1.046.699,47	0,00	$	1.046.699,47	$	-
NP 87	APU	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CIRCUITO NORMAL	UND	5,00	$	124.226,97	$	621.134,83								5,00	$	124.226,97	$	621.134,83	0,00	$	124.226,97	$	-
NP 88	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PVC 20 *20 - INTEMPERIE	UND	4,00	$	43.866,83	$	175.467,32								4,00	$	43.866,83	$	175.467,32	0,00	$	42.966,82	$	-
NP 89	APU	JACK CATEGORIA 6 AMP	UND	10,00	$	37.618,90	$	376.189,00								10,00	$	37.618,90	$	376.189,00	0,00	$	37.618,90	$	-
NP 90	APU	CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	246,60	$	7.420,00	$	1.829.772,00								246,60	$	7.420,00	$	1.829.772,00	0,00	$	7.420,00	$	-
NP 91	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO	UND	1,00	$	453.954,65	$	453.954,65								1,00	$	453.954,65	$	453.954,65	0,00	$	453.954,65	$	-
NP 92	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL TRIPOLAR 3 X 63 A	UND	1,00	$	95.739,50	$	95.739,50								1,00	$	95.739,50	$	95.739,50	0,00	$	95.739,50	$	-
NP 93	APU	PATCH CORD CAT 6A 3FT AMP	UND	39,00	$	39.136,08	$	1.467.385,12								39,00	$	39.136,08	$	1.467.385,12	0,00	$	39.136,08	$	-
NP 94	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6,00	$	95.997,71	$	575.986,26								6,00	$	95.997,71	$	575.986,26	0,00	$	95.997,71	$	-
NP 95	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SALIDA HDMI HASTA 20M	UND	2,00	$	223.211,00	$	669.633,00								2,00	$	223.211,00	$	669.633,00	0,00	$	223.211,00	$	-
NP 96	APU	IMPERMEABILIZACIÓN EMULSION ASFALTICA EN FRIO	ML	97,69	$	65.932,18	$	6.440.914,54								97,69	$	65.932,18	$	6.440.914,54	0,00	$	65.932,18	$	-
NP 97	APU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA (INCLUYE CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y HUMAT PARA PLANT	UND	1,00	$	1.085.720,68	$	1.085.720,68								1,00	$	1.085.720,68	$	1.085.720,68	0,00	$	1.085.720,68	$	-
NP 98	APU	PINTURA VIGRAZA EXTERIOR 2 MANOS	M2	226,00	$	22.555,52	$	5.097.546,77								226,00	$	22.555,52	$	5.097.546,77	0,00	$	22.555,52	$	-
NP 99	APU	CABLEADO PARA SONIDO OXIGENADO	ML	59,00	$	8.439,99	$	421.949,50								59,00	$	8.439,99	$	421.949,50	0,00	$	8.439,99	$	-
NP 100	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓ CAJA METALICAS DE SEGURIDAD DE CAMARAS Y REFLECTORES	UND	8,00	$	179.802,22	$	1.438.417,77								8,00	$	179.802,22	$	1.438.417,77	0,00	$	179.802,22	$	-
NP 101	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARRA DISCAPACITADO, ABATIBLE, EMP EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$	829.268,27	$	829.268,27								1,00	$	829.268,27	$	829.268,27	0,00	$	829.268,27	$	-
NP 102	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIMBRE EMERGENCIA PARA PAÑO PUS	UND	1,00	$	68.515,20	$	68.515,20								1,00	$	68.515,20	$	68.515,20	0,00	$	68.515,20	$	-
NP 103	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA AUTOMATICA PARA TRANSFERENCIA DE PLANTA ENVA	UND	1,00	$	7.061.934,55	$	7.061.934,55								1,00	$	7.061.934,55	$	7.061.934,55	0,00	$	7.061.934,55	$	-
NP 104	APU	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA ALTA PRESION PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA	UND	1,00	$	1.483.101,99	$	1.483.101,99								1,00	$	1.483.101,99	$	1.483.101,99	0,00	$	1.483.101,99	$	-
			SUBTOTAL OBRAS ITEM NO PREVISTOS		$	**119.996.893,31**	$	-			$	-			$	**119.996.893,31**				$	-
			SUBTOTAL OBRAS		$	**212.244.338,53**	$	**29.668.866,09**			$	**39.220.857,30**			$	**144.348.515,16**				$	**0,00**
			ADMINISTRACION	**23,00%**	$	**48.816.197,86**	$	**6.823.839,20**			$	**9.022.200,18**			$	**33.200.158,49**				$	**0,00**
			IMPREVISTOS	**2,00%**	$	**4.244.886,77**	$	**573.377,52**			$	**784.539,15**			$	**2.886.970,30**				$	**0,00**
			UTILIDAD	**5,00%**	$	**10.612.216,93**	$	**1.433.443,30**			$	**1.961.347,85**			$	**7.217.425,76**				$	**0,00**
			VALOR TOTAL		$	**275.917.640,09**	$	**37.299.525,80**			$	**50.988.944,48**			$	**187.653.069,70**				$	**0,00**

LEVELS S.A.S
R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo.

LILIANA PARRA CASTELLANOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 601-2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S**

ACTA No. 03 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS FASE 2

CONTRATO:	DE OBRA PÚBLICA No 601 - 2023
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE
VALOR CONTRATADO:	$ 275.917.640,09
CONTRATANTE:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA NIT No. 832.002.794-2 R.L. MARIA VICTORIA HERRERA ROA
CONTRATISTA:	LEVELS S.A.S NIT No 901.380.377-9 R.L. SANDRA MILENA MARTINEZ RICON
INTERVENTORIA:	ARQ. LILIANA PARRA CASTELLANOS
FECHA DE INICIO:	05 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, HASTA 31 DE ENERO DEL 2024
FECHA TERMINACION PROYECTADA:	31 DE ENERO DEL 2024
SUPERVISOR:	WILLIAM CORTES

En Soacha, a los 17 días del mes de Enero de 2024, se reunieron las siguientes personas: **SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON** como Representante Legal de **LEVELS S.A.S** actuando como CONTRATISTA y la **ARQ LILIANA PARRA CASTELLANOS** actuando como director del contrato de interventoría, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	TIPO	DESCRIPCION			
NP 80	ICCU 18,27	PINTURA EPOXICA MEDICAÑA	ML	172,01	$ 11.011,00
NP 81	ICCU 13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI - ACCESO PRINCIPAL	M2	1	$ 87.453,00
NP 82	APU	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA MURO/PUERTA ACERO INOXIDABLE PISO MEDIALUNA IRON	UND	17	$ 26.204,55

NP 83	APU	REGATA EN MURO DIVISORIO Y LOSA CONTRAPISO PARA INSTALACION MEDIACAÑA	ML	296,17	$ 6.895,50
NP 84	APU	SALIDA TOMA CORRIENTE DUPLEX (2P+T)	UND	47	$ 124.226,07
NP 85	APU	CABLE DESNUDO COBRE CALIBRE No. 10	ML	200	$ 11.173,66
NP 86	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 36 CIRCUITOS	UND	1	$ 1.046.699,47
NP 87	APU	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA CIRCUITO NORMAL	UND	5	$ 124.226,07
NP 88	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PVC 20 *20 - INTEMPERIE	UND	4	$ 43.866,83
NP 89	APU	JACK CATEGORIA 6 AMP	UND	10	$ 37.618,00
NP 90	APU	CABLE UTP CATEGORIA 6	ML	246,6	$ 7.420,00
NP 91	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO	UND	1	$ 453.954,65
NP 92	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL TRIPOLAR 3 X 63 A	UND	1	$ 95.739,50
NP 93	APU	PATCH CORD CAT 6A 3FT AMP	UND	39	$ 38.138,08
NP 94	APU	SUMINSTRO E INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6	$ 95.997,71
NP 95	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA SALIDA HDMI HASTA 20M	UND	3	$ 223.211,00
NP 96	APU	IMPERMEABILIZACIÓN EMULSION ASFALTICA EN FRIO	M2	97,69	$ 65.932,18
NP 97	APU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA (INCLUYE CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y BUJIA) PARA PLANTA ELECTRICA DE 5KVA	UND	1	$ 1.085.720,68
NP 98	APU	PINTURA KORAZA EXTERIOR 2 MANOS	M2	226	$ 22.555,52
NP 99	APU	CABLEADO PARA SONIDO OXIGENADO	ML	50	$ 8.439,00
NP 100	APU	SUMINISTRO E INSTALACIO CAJA METALICAS DE SEGURIDAD DE CAMARAS Y REFLECTORES	UND	8	$ 179.802,22
NP 101	APU	SUMINISTRO E INSTALACIOIN BARRA DISCAPACITADO ABATIBLE PMR EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 839.268,27

NP 102	APU	SUMINISTRO E INSTALACIOIN TIEMBRE EMERGENCIA PARA BAÑO PMR	UND	1	$ 68.515,20
NP 103	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA AUTOMATICA PARA TRANSFERENCIA DE PLANTA 5KVA	UND	1	$ 7.961.934,55
NP 104	APU	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA ALTA PRESION PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA	UND	1	$ 1.483.101,99

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la interventoría, en folios. (127)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

SANDRA MILENA MARTINEZ RINCON
Representante Legal
Contratista de obra

LILIANA PARRA CASTELLANOS
Director de Interventoría

V° B°
WILLIAM CORTES
E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza de Soacha

REF. INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO SOACHA


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, FASES 1 y 2, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN EXIGIDOS POR LAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CONTIENE : **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

ACTIVIDAD	1	PRELIMINARES
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2,8	ML	Cable UTP Categoria 6A

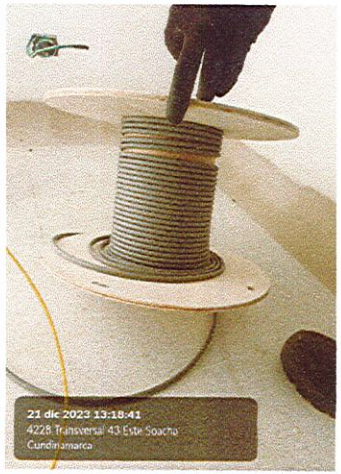

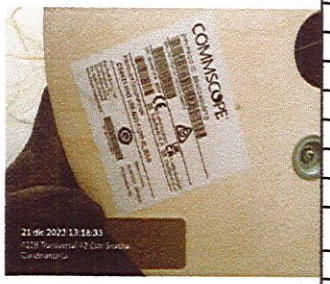

OBSERVACIONES

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACION		DIMENSIONES				CANTIDAD OBRA
PUNTO DE REFERENCIA	ABSCISA	LARGO			ML	ML
SEDE CIUDADELA SUCRE						
ACTIVIDAD						
	CABLE					
	PP2-VOZ-06	17,74	0,00	0,00	1,00	17,74
	PP2-VOZ-07	28,60	0,00	0,00	1,00	28,60
	PP2-VOZ-08	21,90	0,00	0,00	1,00	21,90
	PP2-VOZ-09	23,90	0,00	0,00	1,00	23,90
	PP2-VOZ-10	24,50	0,00	0,00	1,00	24,50
	PP2-VOZ-11	19,20	0,00	0,00	1,00	19,20
	PP2-VOZ-12	16,60	0,00	0,00	1,00	16,60
	PP2-VOZ-13	17,38	0,00	0,00	1,00	17,38
					CANTIDAD EJECUTADA	169,82
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ML	**169,82**

ELABORO ;

DIRECTOR PROYECTO LEVELS S.A.S
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ R.

APROBO;

RESIDENTE INTERVENTORIA
MARIO BELLO PARRA

