INFORME DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

1. CONTRATO No.027 del 10 de Octubre de 2019

CONTRATISTA: Obras Interventorías y Suministros S.A.S, representante legal NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ

OBJETO DEL CONTRATO: contratar obra civil consistente en adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura del palacio de justicia de plato - magdalena, según las cantidades, especificaciones y diseños anexos al presente estudio

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se constató que el contratista cumplió con la ejecución de las obras y sus especificaciones técnicas; se hizo necesario reducir las cantidades de obra inicialmente contratadas por cuanto no se hizo necesario desmontar algunos mesones y otros ítems no ejecutados. Se practicaron durante el desarrollo de los trabajos varias visitas al sitio de las obras para constatar la ejecución de las mismas, obteniéndose registro fotográfico de las mismas.

ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El contrato objeto de la supervisión fue contabilizado financiera y presupuestalmente como se muestra a continuación.

No.	Fecha de expedición	Rubro	Unidad Ejecutora	Valor CDP	VALOR A AFECTAR
17019	12-09-2019	C-2701-0800-28-0-2701019-02	U2	$68.441.772.oo	$38.515.478

Unidad 02 Registro presupuestal No. 18619 del 15/1/219


Se llevó a cabo el trámite y pago de la factura no. 48 con todos sus soportes necesarios
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $38.515.478, oo

VALOR DE LA REDUCCIÒN $5.138.368, oo

VALOR TOTAL FINAL $33.377.110, oo

Comenzó el día 25/10/2019 y terminó el día 13/11/2019

REGISTRO FOTOGRÀFICO

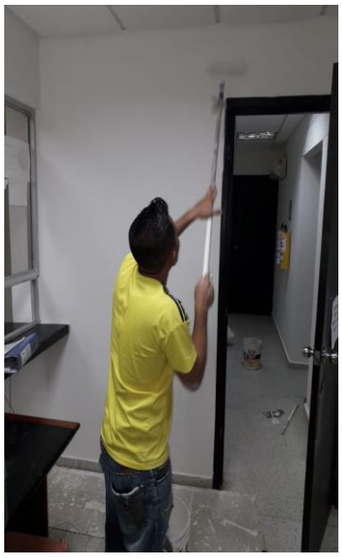





Santa Marta, D.T.C.H. 04 de Febrero de 2020

ORIGINAL FIRMADO

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Supervisor
