Alcaldía de Villeta	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 F.A: 04/01/2024 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	314-2023	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	11/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 07/12/2023	AL 11/03/2024	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16/04/2024

CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	**C.C.:**	11,433,481
CONTRATISTA:	X NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.:**	79.950.295
REP. LEGAL:	X N/A	**C.C.:**	N/A
SUPERVISOR:	X JUAN DAVID MURILLO LEAL	**CARGO**	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR:	X N/A	**NIT.:**	N/A
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido: **58%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	0	DIAS	25	**INICIA**	07/12/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	60		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	46		
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**0**	**DIAS**	**85**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**49**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**36**	**TERMINA**	16/04/2024

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas: **61%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.			✓			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE**	**Código: FO-GA-01** **Fecha: 21/07/2021** **F.A: 04/01/2024** **Versión:02** **Página: 1 de 1**

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:			
NINGUNA			
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** X	**NO**	
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES			
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** X	**NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018929	28/11/2023	30/04/2024	N/A	16/08/2024	06/03/2024
PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018929	28/11/2023	31/12/2026	N/A	16/04/2027	06/03/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	62-44-101018929	25/12/2023	25/12/2028	N/A	03/01/2029	06/03/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	ene-24	23/02/2024	$ 895,800
SALUD	feb-24	23/02/2024	$ 224,500
ARL	feb-24	23/02/2024	$ 335,600

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **61.02%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$ 323,410,139.00**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 323,410,139.00	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0.00	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**197,340,865.05**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$0.00
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	$	126,069,273.95
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**	**197,340,865.05**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	Nc	2023000860	FECHA:	28/11/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	Nc		FECHA:	
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	Nc		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	Nc		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	Nc		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS		No		38526048372	
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar El 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** ORDENADOR DEL GASTO	
CONTRATISTA:	**NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**JUAN DAVID MURILLO LEAL** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONTRATO DE OBRA No 314 DE 2023

OBJETO

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

INFORME PARCIAL DE OBRA N°1

CONTRATISTA: NELSON ARTURO ORTIZ AMÉZQUITA

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

FEBREO 2024

Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO 3
2. INTRODUCCION 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
4. LOCALIZACION 4
4.1 CANCHA MUNICIAPL 4
4.2 PARQUE SACUDETE 5
5. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONMICA 6
6. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 7
7. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA 7
8. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 8
9. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 9
10. SUSPENSION Y AMPLIACION CONTRACTUAL 9
11. INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PRORROGA 9
12. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 11
13. REGISTRO FOTOGRAFICO 12

1. DATOS E INFORMACION DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA
SUPERVISOR:	ING. JUAN DAVID MURILLO
CONTRATO No:	314 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
C.C. No:	79.950.295
CLASE	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 323.410.139)
PLAZO CONTRACTUAL:	25 DIAS
VALOR DEL ANTICIPO:	$0,00
FECHA INICIO:	07/12/2023
FECHA DE SUSPENSION N°1:	15/12/2023 (31 DIAS)
FECHA AMPLIACION N°1 A SUSPENSION N°1:	15/01/2024 (15 DIAS)
FECHA DE PRORROGA N°1:	16/02/2024 (60 DIAS)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16/04/2024

2. INTRODUCCION

El presente informe contiene la descripción de actividades en las diferentes áreas correspondientes a la etapa de ejecución del contrato No. 314 de 2023 suscrito entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA y NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA".

El plazo del contrato fue proyectado 25 días, iniciando el día 07 de diciembre del 2023 y con fecha de terminación el día 31 de diciembre del 2023.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La administración Municipal de Villeta, Cundinamarca, en aras de realizar el mejoramiento de los espacios públicos y deportivos de la población, ve la necesidad de realizar mantenimientos preventivos y necesarios a las estructuras de nuestros parqués y estadios más importantes, por lo que se debe mencionar que de acuerdo al trabajo de diagnóstico y la comunidad misma que usa estas áreas y en pro de la juventud, se han priorizado atacar estos establecimientos que tienen mayor inconvenientes para su uso.

Con sustento en lo anterior, cabe resaltar que actualmente es difícil el uso de las graderías y la ineficiencia del alcantarillado del estadio principal, por ende, es de mucha importancia su mantenimiento y de esta misma manera el del parque sacúdete, cada uno en sectores estratégicos en donde se ve una gran afectación, debido a que, el cerramiento de este mismo se encuentra caído, generando incertidumbre en las escuelas que usan estos espacios. A pesar del mantenimiento rutinario que se realiza a estas áreas del municipio, las condiciones de deterioro en algunas zonas hacen que se acelere el daño y persistan los problemas de seguridad.

4. LOCALIZACION

4.1 CANCHA MUNICIPAL

Uno de los espacios a intervenir, es la Cancha Municipal de Villeta, a continuación, se describe una de las localizaciones dispuestas en el proyecto de inversión, no obstante, en el momento de iniciar la ejecución

de los proyectos, la supervisión designada por el municipio, y el contratista procederán a realizar la respectiva visita al lugar, con el fin de determinar las zonas específicas a intervenir, de tal manera que su ubicación esta al costado derecho de la autopista principal que conduce de Villeta a Sasaima y al costado izquierdo del rio de Villeta, con las siguientes coordenadas 5° 0'22.72"N y 74°28'17.35"O, como se observa en la siguiente imagen:



4.2 PARQUE SACUDETE

El segundo espacio para intervenir es el parque sacúdete, debido a que se deben realizar los mantenimientos preventivos ya que son usados por toda la comunidad a su alrededor, en especial niños y jóvenes, de esta manera se evitara que haya algún accidente, este está ubicada al frente del conjunto Villa Crisly, al costado izquierdo del colegio Instituto Nacional de promoción Social y al costado derecho del patinódromo con las siguientes coordenadas 5° 1'4.19"N y 74°27'59.99"O, de la siguiente manera:



5. PRESUPUESTO OFICAL Y PROPUESTA ECONÓMICA

VALOR CONTRATADO	**$ 323.410.139,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**$ 197.340.865,05**

El contratista deberá Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de seguridad social. Suma que estará sujeta a los descuentos de retención en la fuente, impuestos y demás según las normas legales.

No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado el correspondiente contrato.

La factura o cuenta de cobro debe ser avalada por el supervisor designado, se harán constar en un acta firmada por las partes en la que se estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y valores totales reconocidos.

6. INFORMACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

SUPERVISION	**JUAN DAVID MURILLO**
	SECRETARIO DE PLANEACION

7. INFORMACION POLIZAS Y GARANTIAS DE OBRA

NOMBRE DEL AMPARO	**No. PÓLIZA**	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101018929	07/12/2023	16/08/2024	$64.682.027,80
PRESTACIONES SOCIALES	62-44-101018929	07/12/2023	16/04/2027	$32.341.013,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	62-44-101018929	03/01/2024	03/01/2029	$64.682.027,80

NOMBRE DEL AMPARO	**No. PÓLIZA**	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	62-40-101010835	07/12/2023	16/04/2024	$232.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	62-40-101010835	07/12/2023	16/04/2024	$232.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	62-40-101010835	07/12/2023	16/04/2024	$232.000.000

8. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Las cantidades de cada actividad a ejecutar se presentan de la siguiente manera sin incluir el AIU del 33%:

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	UN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	496	$ 6.309.120
2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	M2	150	$ 4.162.350
3	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	MI	437.5	$ 15.328.201
4	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	10.55	$ 2.024.133
5	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14	$ 174.622
6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.56	$ 2.265.453
7	MONTAJE Y DESMONTE MALLA ESLABONADA (INCLUYE ANTICORROSIVO PARA ANGULOS Y TUBO AN.)	M2	920	$ 73.994.680
8	RIEGO CAUCHO GRANULADO	M2	6300	$ 55.868.400
9	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	4.95	$ 3.990.660
10	ACERO FIGURADO 60000 PSI	UN	445.5	$ 3.273.088
11	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	18	$ 8.214.138
12	CONCRETO 3000 PSI	M3	36	$ 15.695.856
13	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	9.80	$ 7.856.238
14	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	4	$ 527.248
15	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	15	$ 806.400
16	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	10	$ 976.210
17	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	590	$ 11.491.430
18	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	15	$ 24.890.490
19	CERRAMIENTO MALLA NYLON PROTECCION RAYOS UV (INCLUYE GUAYAS Y TENSORES)	M2	130	$ 4.160.000

9. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO CORTE No. 1

VALOR DEL CONTRATO	$323.410.139
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 197.340.865,05
SALDO POR EJECUTAR	$ 126.069.274,30

10. SUSPENSION Y AMPLIACION CONTRACTUAL

Se genera la suspensión N° 1 del 15 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024 debido a los escases de algunos insumos como lo son el agua y los agregados finos o arena de rio, imposibilitando la normal ejecución de las actividades de mantenimiento, estos escases obedecen a la ausencia de precipitaciones en la región de Cundinamarca y Tolima, lugar donde se extraen ambos insumos.
Además de la alta cantidad de visitantes que tiene nuestro municipio para estas fechas dado que el turismo está en temporada alta para estos días, teniendo en cuenta que se celebran conciertos, torneos y demás en la cancha y a sus alrededores.

Por consiguiente, se genera la ampliación N°1 de la suspensión N°1 desde el 15 de enero del 2024 al 30 de enero del 2024 debido a las mismas condiciones por las que se presentarían retrasos en las actividades de obra como se sustentó en la primera suspensión ya que se presenta aun escases de algunos insumos como lo son el agua y los agregados finos o arena de rio, imposibilitando la normal ejecución de los respectivos mantenimientos, estos escases obedecen a la ausencia de precipitaciones en la región de Cundinamarca y Tolima.

11. INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PRORROGA

Se genera la inclusión de ítems no previstos y consecuentemente el modificatorio del contrato, ya que en conjunto con la supervisión técnica realizada por la Alcaldía Municipal de Villeta se realizo una visita con el supervisor encargado de Planeación, donde se determina el trazado de la tubería que conduciría al rio Villeta, las aguas lluvias que afectan el estadio


municipal y consecuentemente la piscina municipal, por ende, surge la necesidad de incluir actividades no previstas en el contrato inicial tanto para el manejo de aguas lluvias, como para el mantenimiento del estadio, con base en esto se describen las actividades a incluir, tomadas de la cartilla de precios del ICCU, de la siguiente manera:

ITEMS NO PPREVISTOS				
28	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$	783.971
43	COLUMNAS 3500 PSI	M3	$	1.089.421
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	$	1.162.806
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	78.885
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$	28.837
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	$	131.204
44	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	$	722.992
5,5	LAVADA DE FACHADAS - GRADERIAS	M2	$	8.873
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	$	136.345
4,41	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND	$	1.025.281
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	$	1.024.348
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	UND	$	890.326
NP1	LIMPIEZA CON GRATA, APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE DE MALLA ESLABONADA POR SUS DOS CARAS	M2	$	59.648,29
NP2	MANTENIMIENTO MALLA CERRAMIENTO LINEAL - INCLUYE INSTALACIÓN DE ANGULO, TEJIDO DE MALLA Y SOLDADURA	ML	$	33.253,27
NP3	MANTENIMIENTO MALLA CERRAMIENTO LINEAL - INCLUYE INSTALACION DE ANGULO, TEJIDO DE MALLA Y SOLDADURA	ML	$	38.430,37

Teniendo en cuenta los ítems no previstos mencionados anteriormente, es de importancia aclarar que con estas actividades se solicitó la prórroga N°1de 16 de febrero de 2024 al 16 de abril de 2024 al contrato para poder cumplir con el alcance contractual por un término de sesenta días (60) y así finalizar los compromisos pactados ya que el cronograma es afectado por los ítems no previsto, con base en esto, esta es aprobada formalmente bajo el oficio (OTRO SI MODIFICATORIO, PRORROGA N°1, AL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA Y NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA" en donde en la actualidad ya se están ejecutando varias actividades de las adicionadas.

12. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Los mantenimientos realizados a la fecha, como lo fue el manejo de las aguas lluvias del estadio, ha mejorado significativamente las condiciones de la cancha para su uso cuando se acumula gran cantidad de agua, además su desarrollo y crecimiento para las escuelas que lo utilizan diariamente.
- Actualmente, la obra cuenta con un avance del 61.02%. Se han cumplido todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizado materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes del sector.

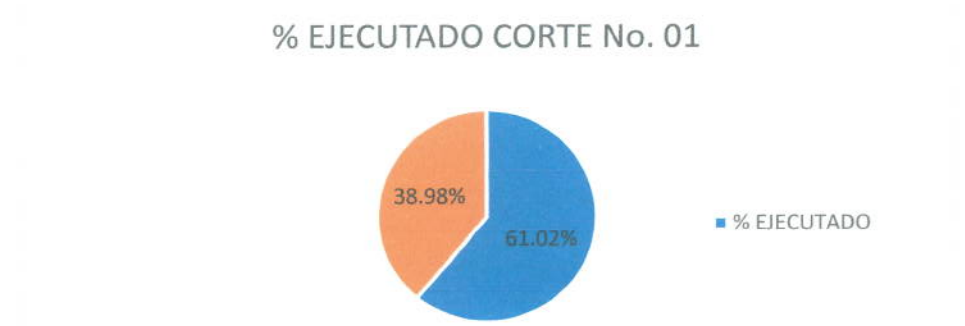

- El contrato se cumplirá dentro del plazo establecido teniendo en cuenta los avances a la fecha.
- Ha sido complicado el trabajo en la parte interna del estadio ya que se encuentra en funcionamiento por parte de las escuelas de formación. Estamos a la espera de un plan de contingencia para aplicar con los profesores de las escuelas de formación que permita avanzar con las labores de ejecución del contrato sin poner en peligro la integridad de los niños y niñas de las escuelas de formación.

Cordialmente;

Nelson Arturo Ortiz Amézquita
Contratista de obra.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO










Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com

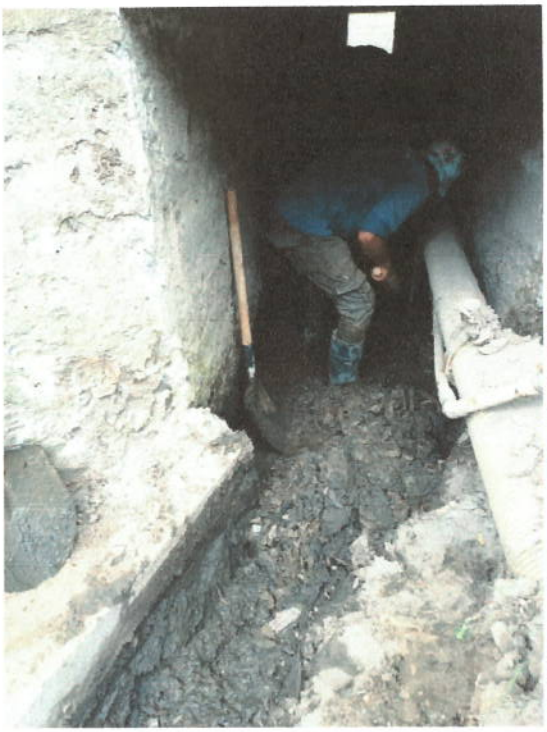








Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com

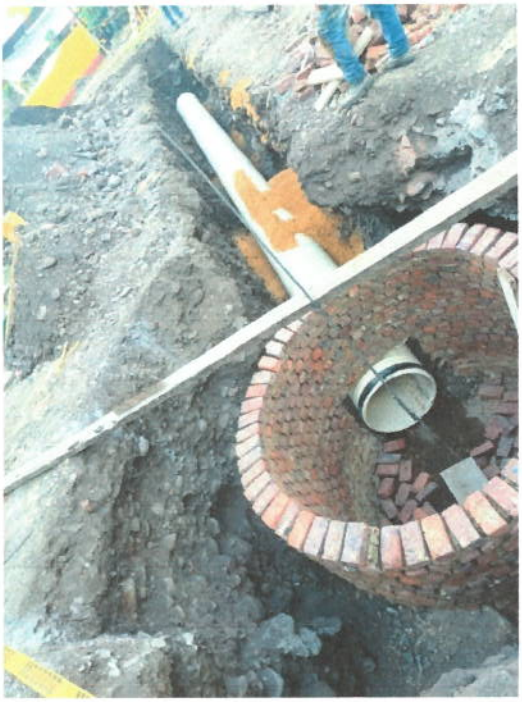







Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com









Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com









Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com








Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com













Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com













Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com









Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com











Calle 5 # 6-17 oficina 202, Centro Comercial Imperio, Villeta – Cundinamarca
Tel: 3134673418-8447766 E- mail: n_ortiz1979@hotmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL VILLETA - CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2023

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA:		NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA CC. 79.950.295
SUPERVISION:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

PLAZO:		25 dias
INICIO:		7-dic-23
SUSPENSION 1		15-dic-23
AMP. SUSPENS.		15-ene-24
REINICIO		31-ene-24
PRORROGA		16-feb-24
TERMINACION		16-abr-24

ASEGURADORA / POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-44-101018929				VALOR INICIAL	$ 323.410.139,00
CUMPLIMIENTO	07-12-2023 / 16-08-2024					
PRESTACIONES SOCIALES	07-12-2023 / 16-04-2027				PRESENTE ACTA	$ 197.340.865,05
ESTABILIDAD DE OBRA	03-01-2024 / 03-01-2029					
ASEGURADORA / POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT.	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-40-101010835				TOTAL EJECUTADO	$ 197.340.865,05
RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	07-12-2023 / 16-04-2024				PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 126.069.273,95

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312 2

CONTRATO DE OBRA 314 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES	BALANCE DE OBRA CONDICIONES ACTUALES		CORTE No. 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	VALOR TOTAL		Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	486,00	$ 12.720,00	$ 6.309.120			486,00	$ 6.309.120	100,20	586,20	$ 7.583.664,00	586,20	$ 7.583.664,00
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	M2	150,00	$ 27.749,00	$ 4.162.350			150,00	$ 4.162.350	(10,00)	140,00	$ 3.884.860,00	140,00	$ 3.884.860,00
6,3	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	437,50	$ 37.680,00	$ 16.485.000		(437,50)			13,00	13,00	$ 489.840,00	13,00	$ 489.840,00
1,1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	10,55	$ 191.861,00	$ 2.024.134		(10,55)			0,60	0,60	$ 115.116,60	0,60	$ 115.116,60
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0,15 m	M2	14,00	$ 12.473,00	$ 174.622		1,00	15,00	$ 187.095	9,00	24,00	$ 299.352,00	24,00	$ 299.352,00
2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88,56	$ 25.581,00	$ 2.265.453		5,19	93,75	$ 2.398.219	-	93,75	$ 2.398.218,75	93,75	$ 2.398.218,75
APU 1	MONTAJE Y DESMONTE MALLA ESLABONADA (INCLUYE ANTICORROSIVO PARA ANGULOS Y TUBO ANL)	M2	920,00	$ 80.429,00	$ 73.994.680		(820,00)	100,00	$ 8.042.900	-	100,00	$ 8.042.900,00	90,00	$ 7.238.610,00
APU 2	RIEGO CAUCHO GRANULADO	M2	6300,00	$ 8.868,00	$ 55.868.400		(6.300,00)			-		$ -		$ -
4,5	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	4,95	$ 806.194,00	$ 3.990.660		(4,55)	0,41	$ 326.509	2,98	3,38	$ 2.724.935,72	3,38	$ 2.724.935,72
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	445,50	$ 7.347,00	$ 3.273.089		342,06	787,56	$ 5.786.240	434,80	1222,36	$ 8.980.678,92	1222,36	$ 8.980.678,92
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	18,00	$ 456.341,00	$ 8.214.138		96,00	114,00	$ 52.022.874	(1,23)	112,77	$ 51.461.574,57	112,77	$ 51.461.574,57
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	36,00	$ 435.986,00	$ 15.695.856		(36,00)			-		$ -		$ -
3,19	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	9,80	$ 801.657,00	$ 7.856.239		(9,80)			-		$ -		$ -
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	4,00	$ 131.812,00	$ 527.248		(4,00)			-		$ -		$ -
4,33	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	15,00	$ 53.760,00	$ 806.400		(15,00)			-		$ -		$ -
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	10,00	$ 97.621,00	$ 976.210		5,00	15,00	$ 1.464.315	(1,05)	13,95	$ 1.361.812,95	13,95	$ 1.361.812,95
19,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	590,00	$ 19.477,00	$ 11.491.430		10,00	600,00	$ 11.686.200	-	600,00	$ 11.686.200,00		$ -
7,4	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	45,00	$ 553.122,00	$ 24.890.490		(5,00)	40,00	$ 22.124.880	(12,98)	27,02	$ 14.945.532,65		$ -
APU	CERRAMIENTO MALLA NYLON PROTECCION RAYOS UV (INCLUYE GUAYAS Y TENSORES)	M2	130,00	$ 32.000,00	$ 4.160.000			130,00	$ 4.160.000	-	130,00	$ 4.160.000,00		$ -

ALCALDIA MUNICIPAL VILLETA - CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2023

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA:		NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA CC. 79.959.295
SUPERVISION:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

PLAZO:		25 dias
INICIO:		7-dic-23
SUSPENSION 1		15-dic-23
AMP. SUSPENS.		15-ene-24
REINICIO		31-ene-24
PRORROGA		16-feb-24
TERMINACION		16-abr-24

ASEGURADORA / POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-44-101018929				VALOR INICIAL	$ 323.410.139,00
CUMPLIMIENTO	07-12-2023 / 16-08-2024					
PRESTACIONES SOCIALES	07-12-2023 / 16-04-2027				PRESENTE ACTA	$ 197.340.865,05
ESTABILIDAD DE OBRA	03-01-2024 / 03-01-2029					
ASEGURADORA / POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT.	SEGURO DEL ESTADO S.A. 62-40-101010835				TOTAL EJECUTADO	$ 197.340.865,05
RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	07-12-2023 / 16-04-2024				PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 126.069.273,95

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312-2

CONTRATO DE OBRA 314 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES	BALANCE DE OBRA CONDICIONES ACTUALES		CORTE No. 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	VALOR TOTAL	Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS												
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 783.971,00		3,24	3,24	$ 2.540.066	-	3,24	$ 2.540.066,04	3,24	$ 2.540.066,04
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3		$ 1.089.421,00		1,50	1,50	$ 1.634.132	(0,38)	1,13	$ 1.225.598,63	1,13	$ 1.225.598,63
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3		$ 1.162.806,00		6,73	6,73	$ 7.829.754	0,02	6,75	$ 7.848.940,50	6,75	$ 7.848.940,50
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		$ 78.885,00		295,38	295,38	$ 23.300.958	3,82	299,20	$ 23.602.108,01	299,20	$ 23.602.108,01
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 28.837,00		204,72	204,72	$ 5.903.496	23,53	228,25	$ 6.582.022,18	228,25	$ 6.582.022,18
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3		$ 131.204,00		83,69	83,69	$ 10.980.830	(6,56)	77,13	$ 10.120.378,55	77,13	$ 10.120.378,55
4,4	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3		$ 722.992,00		0,41	0,41	$ 292.812	1,12	1,52	$ 1.098.947,84	1,52	$ 1.098.947,84
5,5	LAVADA DE FACHADAS (GRADERIAS Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA)	M2		$ 8.873,00		600,00	600,00	$ 5.323.800	-	600,00	$ 5.323.800,00		$ -
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML		$ 135.345,00		50,00	50,00	$ 6.817.250	-	50,00	$ 6.817.250,00		$ -
4,41	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UND		$ 1.025.281,00		3,00	3,00	$ 3.075.843	-	3,00	$ 3.075.843,00	3,00	$ 3.075.843,00
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND		$ 1.024.348,00		3,00	3,00	$ 3.073.044	-	3,00	$ 3.073.044,00	3,00	$ 3.073.044,00
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1,5CM Y CAÑUELA)	UND		$ 890.326,00		3,00	3,00	$ 2.670.978	-	3,00	$ 2.670.978,00	3,00	$ 2.670.978,00

ALCALDIA MUNICIPAL VILLETA - CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2023

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA:		NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA CC. 79.950.295
SUPERVISION:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

PLAZO:		25 dias
INICIO:		7-dic-23
SUSPENSION 1		15-dic-23
AMP. SUSPENS.		15-ene-24
REINICIO		31-ene-24
PRORROGA		16-feb-24
TERMINACION		16-abr-24

ASEGURADORA / POLIZA CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-44-101018929			VALOR INICIAL	$ 323.410.139,35
CUMPLIMIENTO	07-12-2023 / 16-08-2024				
PRESTACIONES SOCIALES	07-12-2023 / 16-04-2027			PRESENTE ACTA	$ 197.340.865,05
ESTABILIDAD DE OBRA	03-01-2024 / 03-01-2029				
ASEGURADORA / POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT.	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 62-40-101010835			TOTAL EJECUTADO	$ 197.340.865,05
RESPONSABILIDAD CIVIL EXT.	07-12-2023 / 16-04-2024			PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 126.069.274,30

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312-2

CONTRATO DE OBRA 314 DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES	BALANCE DE OBRA CONDICIONES ACTUALES		CORTE No. 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	VALOR TOTAL	Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	Mayor / Menor	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP1	LIMPIEZA CON GRATA, APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE DE MALLA ESLABONADA POR SUS DOS CARAS	M2		$ 59.648,29		620,00	620,00	$ 36.981.940	-	620,00	$ 36.981.939,80		$ -
NP2	MANTENIMIENTO MALLA CERRAMIENTO LINEAL - INCLUYE INSTALACION DE ANGULO, TEJIDO DE MALLA Y SOLDADURA	ML		$ 33.253,27		400,00	400,00	$ 13.301.308	-	400,00	$ 13.301.308,00		$ -
NP3	MANTENIMIENTO MALLA CERRAMIENTO LINEAL - INCLUYE INSTALACION DE ANGULO, TEJIDO DE MALLA Y SOLDADURA	ML		$ 38.430,37		20,00	20,00	$ 768.607	-	20,00	$ 768.607,40		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 243.165.518**			**$ 243.165.518**			**$ 243.165.518,31**		**$ 148.376.590,26**
COSTOS INDIRECTO AIU 33%					**$ 80.244.621**			**$ 80.244.621**			**$ 80.244.621,04**		**$ 48.964.274,79**
ADMINISTRACIÓN (25%)					**$ 60.791.380**			**$ 60.791.380**			**$ 60.791.379,58**		**$ 37.094.147,57**
IMPREVISTOS (3%)					**$ 7.294.966**			**$ 7.294.966**			**$ 7.294.965,55**		**$ 4.451.297,71**
UTILIDAD (5%)					**$ 12.158.276**			**$ 12.158.276**			**$ 12.158.275,92**		**$ 7.418.829,51**
VALOR TOTAL					**$ 323.410.139**			**$ 323.410.139**			**$ 323.410.139,35**		**$ 197.340.865,05**

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CONTRATISTA

ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL
SUPERVISOR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT: 899999312-2	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	79.950.295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD







ACTIVIDAD:	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN**				
ITEM	1,41		**UNIDAD**	M2	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
INSTALACION RED DE 24" DESDE EL DESARENADOR EN EL BOX DE LA VIA PANAMERICANA HASTA EL DESCOLE AL RIO FRENTE A TRANSITO	1	198,73	3,00		596,20
				Subtotal	596,20
TRAZADO DE RED AGUAS LLUVIAS 24" VER PLANO TOPOGRAFICO				Vienen	
				pasan	596,20
				Total	596,20


Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

DEPARTAMENTO DE : CUNDINAMARCA

ANEXO B
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

MUNICIPIO DE : VILLETA
ZONA URBANA : POLIDEPORTIVO

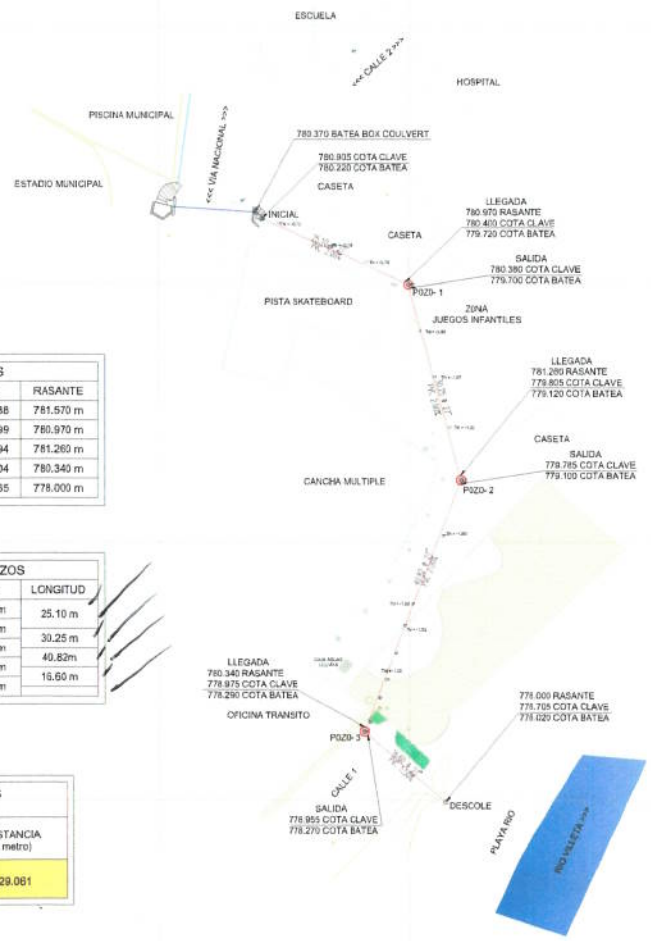

CUADRO DE COORDENADAS POZOS			
NOMBRE	NORTE	ESTE	RASANTE
PZ-ALL-INICIAL	1045410,161	956376.288	781.570 m
PZ-ALL-1-PROYECTADO	1045399,961	956399.899	780.970 m
PZ-ALL-2-PROYECTADO	1045369,648	956408.494	781.260 m
PZ-ALL-3-PROYECTADO	1045330,682	956392.604	780.340 m
DESCOLE	1045319,702	956405.865	778.000 m

CUADRO DE LONGITUDES Y COTAS POZOS			
NOMBRE	RASANTE	BATEA	LONGITUD
PZ-ALL-INICIAL	781.570 m	780.220 m	25.10 m
PZ-ALL-1-PROYECTADO	780.970 m	779.720 m	30.25 m
PZ-ALL-2-PROYECTADO	781.260 m	779.120 m	40.82m
PZ-ALL-3-PROYECTADO	780.340 m	778.290 m	16.60 m
DESCOLE	778.000 m	778.020 m	

LISTA DE PUNTOS DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS LOCALES				
NOMBRE	ESTE (metro)	NORTE (metro)	ELEVACION (metro)	DISTANCIA (metro)
DELTA - 1	956373.000	1045413.000	784.990	29.061
GPS - 1	956390.870	1045438.107	782.156	

CONVENCIONES

- LINDERO
- CERCA MALLA
- BORDE VIA
- SARDINEL
- CAJAS - MUROS
- POSTE ENERGIA
- ZONA DURA
- ARBOLES
- CONSTRUCCION
- PALMAS
- ZONA VERDE
- TERRAPLEN
- P. TOPOGRAFICO

Escala 1 : 400

LOCALIZACION
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA
SECTOR POLIDEPORTIVO



DATOS DEL PREDIO

MATRICULA INMOBILIARIA:
CEDULA CATASTRAL:
NOMBRE DE PROPIETARIO:
CEDULA DEL PROPIETARIO:
NOMBRE DEL PREDIO: SECTOR CANCHA MULTIPLE
AREA LEVANTAMIENTO:

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

DATUM MAGNA - SIRGAS
PROYECCION: TRANSVERSA DE MERCATOR
LATITUD: 4°00'00"N
LONGITUD: 73°00'00"W
FALSO NORTE: 1 000 000
FALSO ESTE: 1 000 000
ESCALA : 1:400

DATOS DEL TOPOGRAFO

NOMBRE COMPLETO: DAVID ORTEGA GARZON
MATRICULA PROFESIONAL: CPNT- 01-15781
CALCULÓ: DAVID ORTEGA GARZON
DIBUJÓ: WMV
FECHA DE LEVANTAMIENTO: 06 DIC 2023
FIRMA TOPOGRAFO:

CONTIENE

PLANTA: ZONA CANCHA MULTIPLE
PLANO: 1 de 2
REVISÓ:
APROBÓ:
FECHA:


ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT: 899999312-2	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

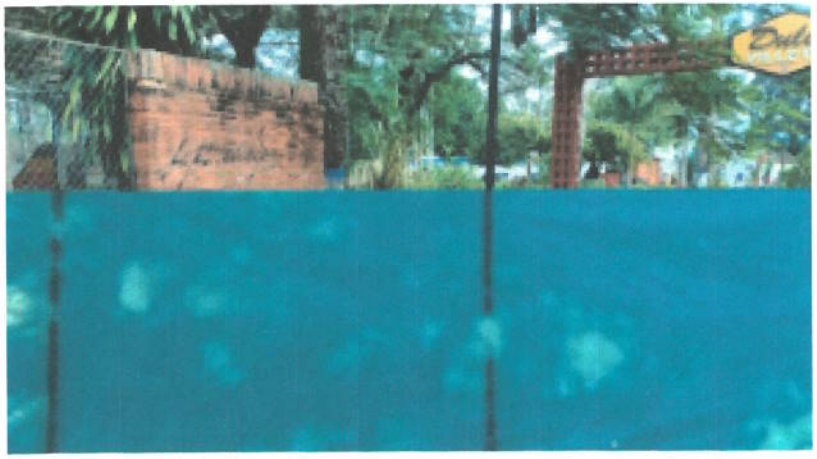

ACTIVIDAD:	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M				
ITEM	1.80		UNIDAD	M2	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS GRADERIA POSTERIOR COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO	1	60.00		0.8	48.00
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS EXCAVACION DE POZOS 1 2 Y 3	1	8.00		0.8	6.40
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS EXCAVACION TUBERIA DE DESARENADOR A POZO 1	1	25.00		0.8	20.00
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS EXCAVACION TUBERIA DE POZO 1 A POZO 2	1	30.00		0.8	24.00
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS EXCAVACION TUBERIA DE POZO 2 A POZO 3	1	40.00		0.8	32.00
CERRAMIENTO DE AISLAMIENTO Y SEGURIDAD TRABAJAOS EXCAVACION TUBERIA DE POZO 3 A DESCOLE	1	12.00		0.8	9.60
				Subtotal	140.00
TRAZADO DE TUBERÍA Y CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO COSTADO VÍA PRINCIPAL				Vienen	
				pasan	140.00
				Total	140.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312-2

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA


FECHA: 5-mar-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

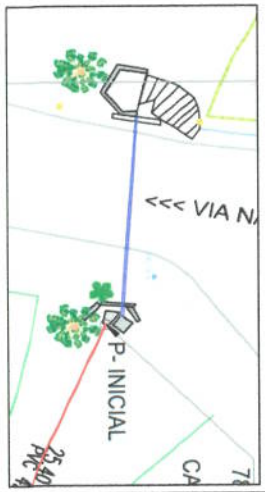

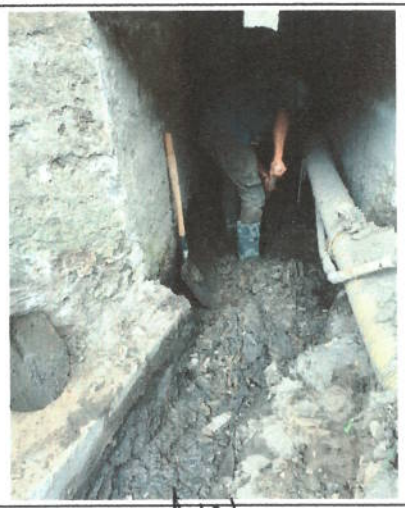

ACTIVIDAD:	**LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM**

ITEM	6.3		**UNIDAD**	ML	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
LIMPIEZA BOX COURVER VIA PANAMERICANA ENTRE ESTADIO Y COSTADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO	1	13.00			13.00
				Subtotal	13.00
				Vienen	
				pasan	13.00
				Total	13.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 899999312-2

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

ITEM 1.1 **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
DEMOLICION PLACA DESCOLE BOXCULVER	1	1.00	2.00	0.2	0.40
DEMOLICION VIGA CIMENTACION URBANISMO MALECON	1	5.00	0.20	0.2	0.20
				Subtotal	0.60
				Vienen	
				pasan	0.60
				Total	0.60

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m				
ITEM	1,15		UNIDAD	M2	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
INTERVENCION SENDERO PEATONAL MALECON PARA INSTALACION DE TUBERIA 24"	1	6.00	4.00		24.00
				Subtotal	24.00
SECCION DEL MALECON COSTADO OFICINA DE TRANSITO				Vienen	
				pasan	24.00
				Total	24.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: MONTAJE Y DESMONTE MALLA ESLABONADA (INCLUYE ANTICORROSIVO PARA ANGULOS Y TUBO AN.)

ITEM: APU 1 — UNIDAD: M2

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO PARTE POSTERIOR GRADERIAS COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL	1	45.00		2	90.00
				Subtotal	90.00
COSTADO ORIENTAL DE ESTADIO MUNICIPAL, PARTE POSTERIOR DE LAS GRADERIAS				Vienen	
				pasan	90.00
				Total	90.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT: 899999312-2	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.	

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79.950.295
SUPERVISION:	ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL		

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				
ITEM	2.9		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
ZAPATAS CERRAMIENTO POSTERIOR GRADERIAS COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL	5	2.5	2.5	3	93.75
				Subtotal	93.75
SECCION COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL				Vienen	
				pasan	93.75
				Total	93.75

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79.950.295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	79,950,295	**FECHA:**	5-mar-24
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			1 DE 1	

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	**CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)**				
ITEM	4.5		**UNIDAD**	M3	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
DESCOLE TUBERIA DE 24" SOBRE EL RIO VILLETA					
PAREDES	2	3.00	0.20	1	1.20
DESARENADOR ENTRE BOX CULVER Y TUBERIA DE 24"					
PARED LATERAL	2	2.00	0.20	2	1.60
PARED FRONTAL TUBERIA	1	1.60	0.20	2	0.64
DESCUENTO BOCA DE TUBERIA 24"	1				-0.38
PARED FRONTAL BOX	1	1.60	0.20	1	0.32
				Subtotal	3.38
				Vienen	
				pasan	3.38
				Total	3.38

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD







ACTIVIDAD:	ACERO FIGURADO 60000 PSI				
ITEM	4.22		UNIDAD	KG	
LOCALIZACION	ELEMENTOS	CANTIDAD	LONGITUD	PESO	TOTAL
ZAPATAS CERRAMIENTO GRADERIAS COSTADO ORIENTAL ESTADIO MUNICIPAL					
ACERO LONGITUDINAL DE ZAPATAS	5	12.00	1.5	1.00	90.00
ACERO TRANSVERSAL DE ZAPATAS	5	12.00	1.5	1.00	90.00
COLUMNAS CERRAMIENTO GRADERIAS COSTADO ORIENTAL ESTADIO MUNICIPAL					
FLEJES PEDESTAL GRADERIA DE COLICEO	5	20.00	1.2	0.56	67.20
ACERO LONG. PEDESTAL GRADERIA DEL COLICEO	5	6.00	3.6	1.00	108.00
VIGA GRADERIA COSTADO ORIENTAL ESTADIO MUNICIPAL					
ACERO LONGITUDINAL DE VIGA	1	6.00	50.00	1	300.00
FLEJES VIGA GRADERIA DE COLICEO	1	299.00	1.50	0.56	251.16
DESCOLE RED AGUAS LLUVIAS 24" AL RIO					
ELEMENTOS TRANSVERSALES	2	15.00	3	1.00	90.00
ELEMENTOS LONGITUDINALES	2	15.00	3.2	1.00	96.00
DESARENADOR BOX-RED AGUAS LLUVIAS 24"					
ELEMENTOS TRANSVERSALES	2	10.00	6	1.00	120.00
ELEMENTOS LONGITUDINALES	2	10.00	5	1.00	100.00
				Subtotal	1,222.36
				Vienen	
				pasan	1,222.36
				Total	1,222.36

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"				
ITEM	3.30		UNIDAD	ML	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
RED AGUAS LLUVIAS DESDE DESARENADOR A DESCOLE SOBRE EL RIO VILLETA					
DESARENADOR A POZO 1	1	25.10			25.10
POZO 1 A POZO 2	1	30.25			30.25
POZO 2 A POZO 3	1	40.82			40.82
POZO 3 A DESCOLE	1	16.60			16.60
				Subtotal	112.77
				Vienen	
				pasan	112.77
				Total	112.77

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	ADOQUÍN GRES PEATONAL				
ITEM	14.5		UNIDAD	M2	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
INTERVENCION SENDERO PEATONAL MALECON PARA INSTALACION DE TUBERIA 24"	1	4.65	3.00		13.95
				Subtotal	13.95
SECCION DEL MALECON COSTADO OFICINA DE TRANSITO				Vienen	
				pasan	13.95
				Total	13.95

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI				
ITEM	2.80		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
ZAPATAS CERRAMIENTO GRADERIAS COSTADO ORIENTAL ESTADIO	5	1.20	1.20	0.45	3.24
				Subtotal	3.24
SECCION DEL MALECON COSTADO OFICINA DE TRANSITO				Vienen	
				pasan	3.24
				Total	3.24

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	COLUMNAS 3500 PSI				
ITEM	4.30		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
COLUMNAS CERRAMIENTO GRADERIAS COSTADO ORIENTAL ESTADIO	5	0.30	0.30	2.5	1.13
				Subtotal	1.13
SECCION DEL MALECON COSTADO OFICINA DE TRANSITO				Vienen	
				pasan	1.13
				Total	1.13

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD







ACTIVIDAD:	VIGA AÉREA 3500 PSI				
ITEM	4.26		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
VIGA CERRAMIENTO POSTERIOR GRADERIAS COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO	1	45.00	0.30	0.5	6.75
				Subtotal	6.75
SECTOR GRADERIAS COSTADO ORIENTAL DEL ESTADIO				Vienen	
				pasan	6.75
				Total	6.75

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				
ITEM	16.50		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL
RED TUBERIA AGUAS LLUVIAS 24"					
DESARENADOR A POZO 1	1	25.10	1.20	1.30	39.16
POZO 1 A POZO 2	1	30.25	1.20	1.70	61.71
POZO 2 A POZO 3	1	40.82	1.20	2.10	102.87
POZO 3 A DESCOLE	1	16.60	1.20	2.80	55.78
POZOS					
DESARENADOR	1	2.20	2.20	2.00	9.68
POZO 1	1	2.20	2.20	1.35	6.53
POZO 2	1	2.20	2.20	2.05	9.92
POZO 3	1	2.20	2.20	2.80	13.55
				Subtotal	299.20
				Vienen	
				pasan	299.20
				Total	299.20

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

ITEM 16.70 UNIDAD M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL
RED TUBERIA AGUAS LLUVIAS 24"					
DESARENADOR A POZO 1	1	25.10	1.20	0.50	15.06
POZO 1 A POZO 2	1	30.25	1.20	0.90	32.67
POZO 2 A POZO 3	1	40.82	1.20	1.30	63.68
POZO 3 A DESCOLE	1	16.60	1.20	2.00	39.84
CERRAMIENTO GRADERIAS COSTADO ORIENTAL ESTADIO					
ZAPATAS	5	2.50	2.50	2.5	78.13
DESCUENTO COLUMNAS	5	0.30	0.30	2.5	-1.13
				Subtotal	228.25
				Vienen	
				pasan	228.25
				Total	228.25

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295


CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295	1 DE 1
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

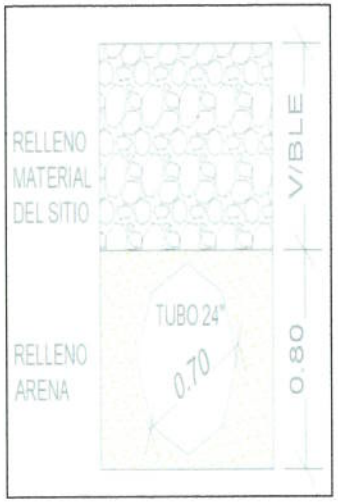



ACTIVIDAD:	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"				
ITEM	2.90		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
RED TUBERIA AGUAS LLUVIAS 24"					
DESARENADOR A POZO 1	1	25.10	1.20	0.57	17.17
POZO 1 A POZO 2	1	30.25	1.20	0.57	20.69
POZO 2 A POZO 3	1	40.82	1.20	0.57	27.92
POZO 3 A DESCOLE	1	16.60	1.20	0.57	11.35
				Subtotal	77.13
AREA DE RELLENO : 0.80 x 1.20 MTRS DESCUENTO AREA DE TUBERIA : 0.38 M2				Vienen	
				pasan	77.13
				Total	77.13

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	**NIT.**	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	**CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)**				
ITEM	4.40		**UNIDAD**	M3	
LOCALIZACION	**CANT ELEMT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
DESCOLE TUBERIA DE 24" SOBRE EL RIO VILLETA					
PLACA	1	3.00	1.20	0.2	0.72
DESARENADOR ENTRE BOX CULVER Y TUBERIA DE 24"					
PLACA DESARENADOR	1	2.00	2.00	0.2	0.80
				Subtotal	1.52
				Vienen	
				pasan	1.52
				Total	1.52

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)

ITEM: 4.41 — UNIDAD: UND

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
POZO 1	1				1.00
POZO 2	1				1.00
POZO 3	1				1.00
				Subtotal	3.00
				Vienen	
				pasan	3.00
				Total	3.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD:	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)				
ITEM	4.30		UNIDAD	UND	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
POZO 1	1				1.00
POZO 2	1				1.00
POZO 3	1				1.00
				Subtotal	3.00
				Vienen	
				pasan	3.00
				Total	3.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACUDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 5-mar-24

CONTRATISTA:	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA	NIT.	79,950,295
SUPERVISION:	JUAN DAVID MURILLO		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)

ITEM 4.50 UNIDAD UND

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
POZO 1	1				1.00
POZO 2	1				1.00
POSO 3	1				1.00
				Subtotal	3.00
				Vienen	
				pasan	3.00
				Total	3.00

Contratista:

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC. 79,950,295

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
NIT 79.950.295-9
CALLE 5 6 17 CC IMPERIO OF 202
Tel: (313) 4673418
Villeta - Colombia
n_ortiz1979@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NO 124

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 8444874 - Ext. 000
Dirección	PALACIO MUNICIPAL - CALLE 4 No. 5 - 61 / 5-57	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2024, 15:34
Expedición	07/03/2024, 15:38
Vencimiento	07/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MEJ. MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y SACUDETE VILLETA	1.00	197,340,865.05	MEJ. MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL Y SACUDETE VILLETA	197,340,865.05	197,340,865.05

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y siete millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Total Bruto	197,340,865.05
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	197,340,865.05

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 197,340,865.05

Observaciones:
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA 314-2023 MUNICIPIO DE VILLETA

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y PARQUE SACÚDETE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764066266630 aprobado en 20240226 prefijo NO desde el número 122 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: de86d4a70ba5321b12dea8a5825d895283fbc16438331474da0fcc5e5348d1904dcb9e0d7cbefde6a792c893d796a868

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

VILLETA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,

12/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA** con **Cédula de Ciudadanía** número **79950295**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550455000044202**
Fecha de apertura	**23/11/2011**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Certificado
Bancario

Jueves, 12 de octubre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA identificado(a) con CC 79950295, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38526048372	1998/04/08	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia
