

| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN** | **105 días** | **lun 27/11/23** | **dom 10/03/24** | | **$ 809.722.682,97** |
| 2 | | | **ACTIVIDADES DEL GASTO RUBRO 02-02-02-005-004-01 $88.329.268,00** | **95 días** | **lun 27/11/23** | **jue 29/02/24** | | **$ 82.050.710,97** |
| 3 | | **1** | **PRELIMINARES** | **55 días** | **lun 27/11/23** | **áb 20/01/2** | | **$ 65.667.039,66** |
| 4 | | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA | 6 días | lun 27/11/23 | sáb 2/12/23 | | $ 4.196.422,80 |
| 5 | | 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 4;14FF | $ 5.401.532,99 |
| 6 | | 1.3 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 5CC | $ 7.407.128,60 |
| 7 | | 1.4 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO PARA MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 6CC | $ 79.585,18 |
| 8 | | 1.5 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA SUPERIOR E INFERIOR PARA COLOCACIÓN DE ENCHAPE | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 6CC | $ 181.908,98 |
| 9 | | 1.6 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, VENTILADORES,ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS | 10 días | mar 5/12/23 | sáb 20/01/24 | | $ 4.033.262,99 |
| 10 | | 1.7 | DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA (TEJA ASBESTO CEMENTO) (INCLUYE DESMONTE DE ACCESORIOS DE CUBIERTA) | 4 días | dom 10/12/23 | mié 13/12/23 | | $ 17.779.832,55 |
| 11 | | 1.8 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS | 2 días | dom 3/12/23 | lun 4/12/23 | 6CC | $ 646.987,11 |
| 12 | | 1.9 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, | 6 días | dom 3/12/23 | vie 8/12/23 | 11CC | $ 12.205.326,99 |
| 13 | | 1.10 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE GUARDA ESCOBAS , INCLUYE RETIRO | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 12CC | $ 1.831.033,88 |
| 14 | | 1.11 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE INCLUYE PLASTICO FILM STRECH PARA EMPAQUE Y ENTREGA DE ELEMENTOS MEDIANTE ACTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | 2 días | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 | 4CC | $ 0,00 |
| 15 | | 1.12 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS) | 3 días | sáb 9/12/23 | lun 11/12/23 | 12 | $ 8.184.747,36 |
| 16 | | 1.13 | DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA ACCESO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | 3 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 5CC | $ 1.769.772,84 |
| 17 | | 1.14 | DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS | 2 días | dom 3/12/23 | lun 4/12/23 | 16CC | $ 1.949.497,39 |
| 18 | | | FIN PRELIMINARES | 0 días | mié 13/12/23 | mié 13/12/23 | 10;17 | $ 0,00 |
| 19 | | **6** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **78 días** | **mié 13/12/23** | **ié 28/02/2** | | **$ 10.432.999,18** |
| 20 | | **6.1** | **PRELIMINARES HIDROSANITARIAS** | **8 días** | **mié 13/12/23** | **ié 20/12/2** | | **$ 3.712.055,88** |
| 21 | | 6.1.1 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES | 4 días | mié 13/12/23 | sáb 16/12/23 | 12FC+4 días | $ 1.969.609,14 |
| 22 | | 6.1.2 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 3" A Ø 4" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES | 4 días | dom 17/12/23 | mié 20/12/23 | 21 | $ 1.742.446,74 |
| 23 | | **6,2** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | **1 día** | **sáb 17/02/24** | **áb 17/02/2** | | **$ 1.467.220,50** |
| 24 | | 6.2.5 | PRUEBA HIDRÁULICA | 1 día | sáb 17/02/24 | sáb 17/02/24 | C+40 c | $ 1.467.220,50 |

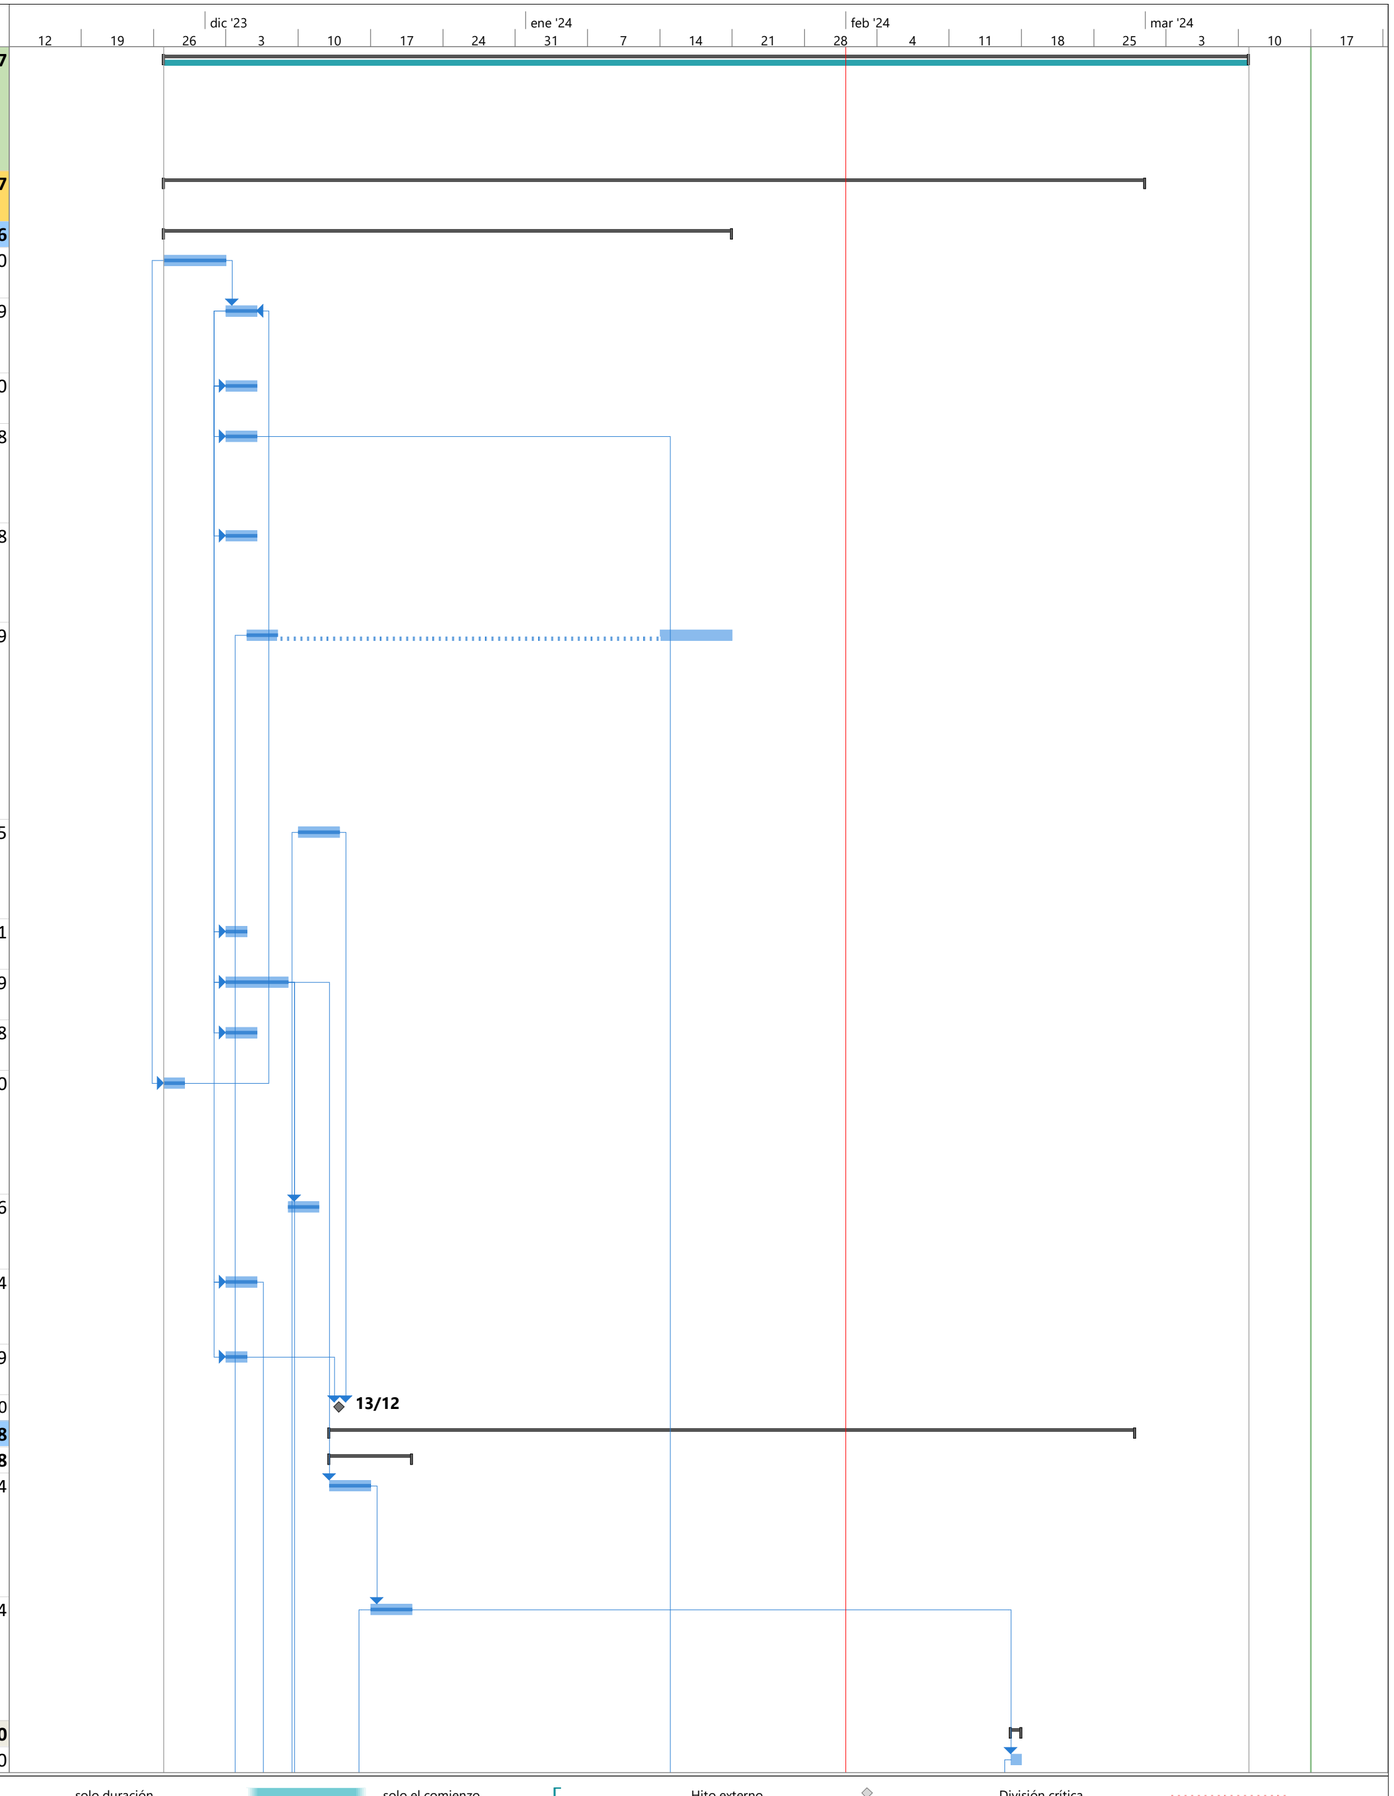


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | **6,3** | **INSTALACIÓNES SANITARIAS** | **1 día** | **mié 28/02/24** | **ié 28/02/2** | | **$ 1.471.988,08** |
| 26 | | 6.3.6 | PRUEBA SANITARIA | 1 día | mié 28/02/24 | ié 28/02/24 | 24CC | $ 1.471.988,08 |
| 27 | | **6,5** | **CAJAS DE INSPECCIÓN** | **5 días** | **vie 23/02/24** | **ar 27/02/2** | | **$ 3.781.734,72** |
| 28 | | 6.5.1 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION | 5 días | vie 23/02/24 | mar 27/02/24 | 26CC-5 días | $ 3.781.734,72 |
| 29 | | | FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0 días | mar 27/02/24 | ar 27/02/24 | 28 | $ 0,00 |
| 30 | | **7** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **6 días** | **dom 17/12/23** | **ie 22/12/23** | | **$ 2.698.787,03** |
| 31 | | **7.1** | **PRELIMINARES ELECTRICAS** | **6 días** | **dom 17/12/23** | **ie 22/12/23** | | **$ 2.698.787,03** |
| 32 | | 7.1.1 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES | 6 días | dom 17/12/23 | vie 22/12/23 | 22CC | $ 2.698.787,03 |
| 33 | | | FIN INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 días | vie 22/12/23 | vie 22/12/23 | 32 | $ 0,00 |
| 34 | | **24** | **ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS** | **83 días** | **sáb 9/12/23** | **ue 29/02/24** | | **$ 3.251.885,10** |
| 35 | | 24.1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | 83 días | sáb 9/12/23 | jue 29/02/24 | 12 | $ 3.251.885,10 |
| 36 | | | FIN ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 0 días | jue 29/02/24 | jue 29/02/24 | 35 | $ 0,00 |
| 37 | | | **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN RUBRO 02-01-01-001-001-07** | **97 días** | **mar 5/12/23** | **dom 10/03/24** | | **$ 655.252.558,94** |
| 38 | | **5** | **MAMPOSTERIA** | **1 día** | **dom 17/12/23** | **om 17/12/2** | | **$ 315.113,54** |
| 39 | | **5,1** | **MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL** | **1 día** | **dom 17/12/23** | **om 17/12/2** | | **$ 315.113,54** |
| 40 | | 5.1.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. | 1 día | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 32CC | $ 315.113,54 |
| 41 | | | FIN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL | 0 días | dom 17/12/23 | om 17/12/23 | 40 | $ 0,00 |
| 42 | | **6** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | **69 días** | **sáb 23/12/23** | **ue 29/02/24** | | **$ 26.904.353,12** |
| 43 | | **6,2** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | **22 días** | **sáb 23/12/23** | **áb 13/01/24** | | **$ 4.342.096,00** |
| 44 | | 6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 5 días | sáb 23/12/23 | mié 27/12/23 | 31 | $ 685.241,25 |
| 45 | | 6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 44FC-3 días | $ 2.802.485,60 |
| 46 | | 6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 45CC | $ 0,00 |
| 47 | | 6.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | 5 días | mar 9/01/24 | sáb 13/01/24 | 6CC+1 días | $ 854.369,15 |
| 48 | | **6,3** | **INSTALACIÓNES SANITARIAS** | **5 días** | **lun 25/12/23** | **ie 29/12/23** | | **$ 8.964.944,34** |
| 49 | | 6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 14FC-3 días | $ 2.485.334,01 |
| 50 | | 6.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 49CC | $ 2.697.964,11 |
| 51 | | 6.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 50CC | $ 1.768.505,45 |
| 52 | | 6.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 51CC | $ 778.430,26 |
| 53 | | 6.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA | 5 días | lun 25/12/23 | vie 29/12/23 | 52CC | $ 1.234.710,51 |
| 54 | | **6,4** | **AGUAS LLUVIAS** | **3 días** | **mar 27/02/24** | **ue 29/02/24** | | **$ 8.412.286,05** |
| 55 | | 6.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS. | 3 días | mar 27/02/24 | jue 29/02/24 | | $ 4.518.795,63 |

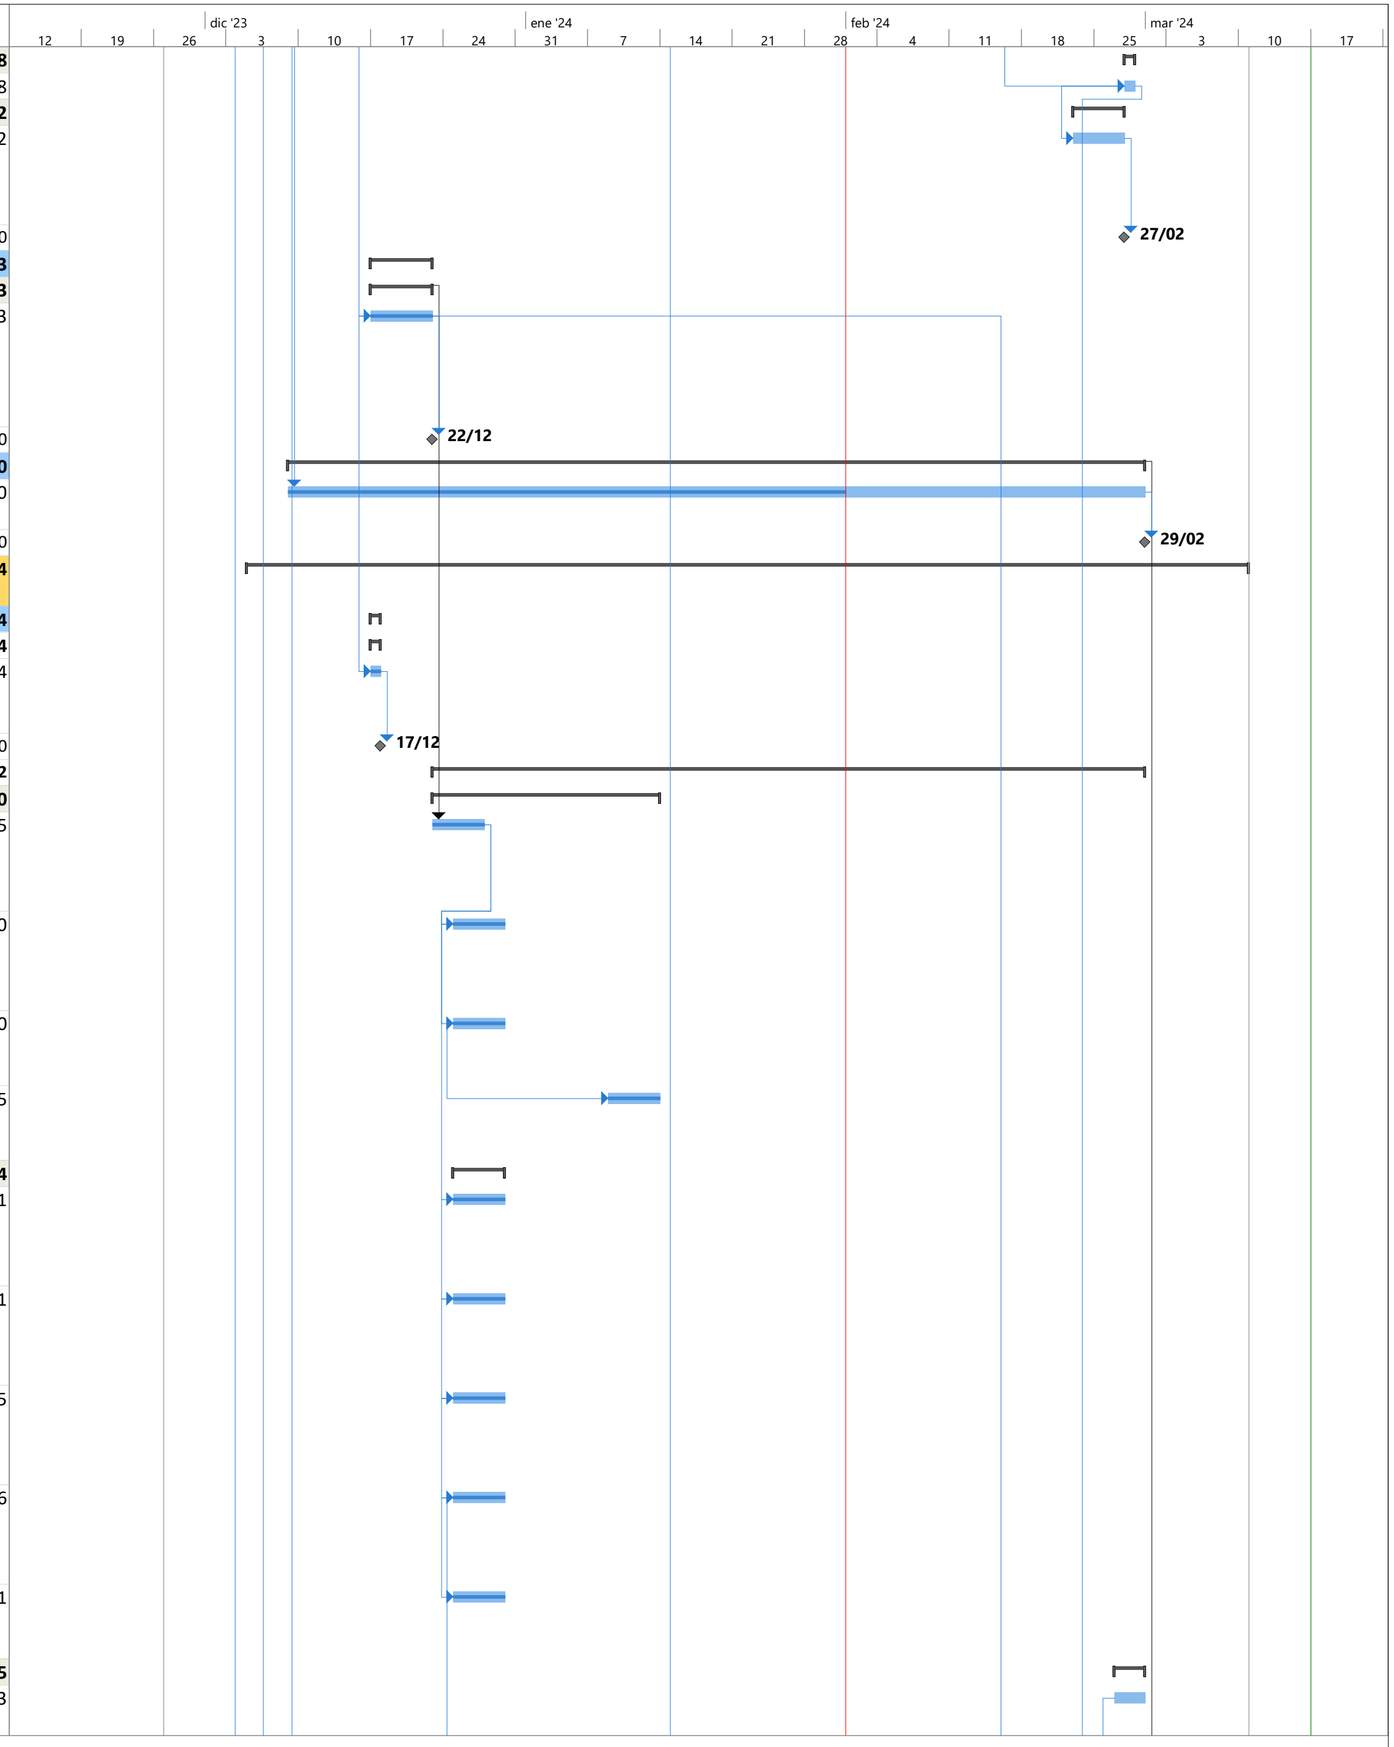


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica |
| División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso |
| Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | 6.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS. | 3 días | mar 27/02/24 | jue 29/02/24 | 55CC | $ 3.008.670,71 |
| 57 | | 6.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CANAL AMAZONA A BAJANTE 100 MM | 3 días | mar 27/02/24 | jue 29/02/24 | 56CC | $ 884.819,71 |
| 58 | | **6,5** | **CAJAS DE INSPENCCIÓN** | **5 días** | **dom 25/02/24** | **ue 29/02/24** | | **$ 5.185.026,73** |
| 59 | | 6.5.2 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. | 5 días | dom 25/02/24 | jue 29/02/24 | 26FC-4 días | $ 5.185.026,73 |
| 60 | | | FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0 días | jue 29/02/24 | jue 29/02/24 | 59;57 | $ 0,00 |
| 61 | | **7** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **ue 15/02/24** | | **$ 55.488.376,06** |
| 62 | | **7.2** | **INFRAESTRUCTURA** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **ue 15/02/24** | | **$ 3.436.833,85** |
| 63 | | 7.2.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE COAXIAL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 9CC | $ 3.436.833,85 |
| 64 | | 7.2.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO EN COBRE TIPO THHN/THWN – 2 TC SR 600V 90°C: 3 No. 8 AWGXCUXTHHN/THWN–2 TC SR FASES + 1 No. 8 AWGXCUXTHHN/THWN–2 TC SR NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 0,00 |
| 65 | | **7.3** | **BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **jue 15/02/24** | | **$ 11.943.300,54** |
| 66 | | 7.3.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PVC 1XØ3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 11.943.300,54 |
| 67 | | **7.4** | **TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **jue 15/02/24** | | **$ 4.827.994,63** |
| 68 | | 7.4.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 4.827.994,63 |
| 69 | | **7.5** | **ACOMETIDAS ELÉCTRICAS** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **jue 15/02/24** | | **$ 7.627.418,06** |
| 70 | | 7.5.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 7.627.418,06 |
| 71 | | **7,6** | **SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS** | **73 días** | **mar 5/12/23** | **jue 15/02/24** | | **$ 27.652.828,98** |

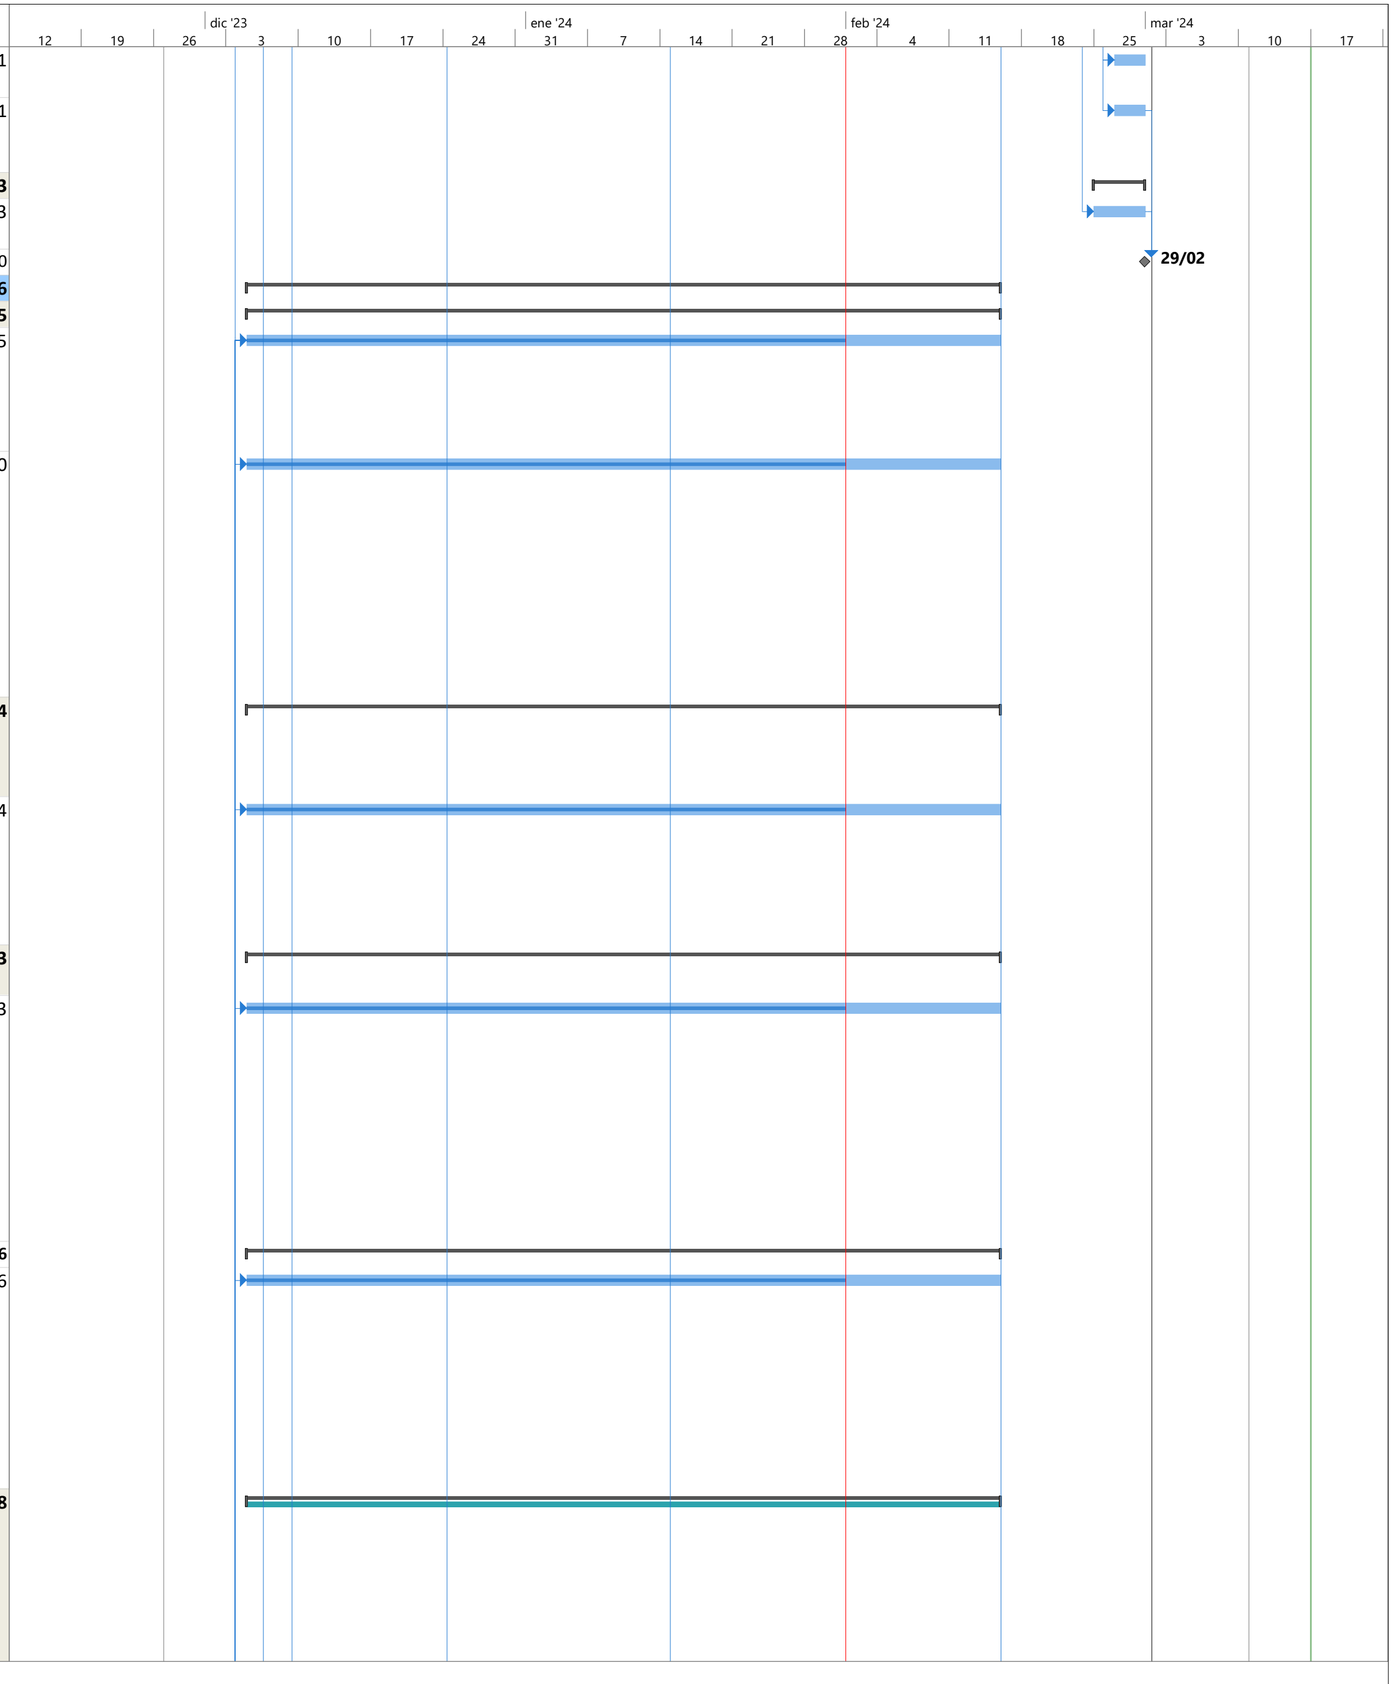


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea
Resumen
Hito inactivo
solo duración
solo el comienzo
Hito externo
División crítica
División
Resumen del proyecto
Resumen inactivo
Informe de resumen manual
solo fin
Fecha límite
Progreso
Hito
Tarea inactiva
Tarea manual
Resumen manual
Tareas externas
Tareas críticas
Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | 7.6.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 3.751.363,02 |
| 73 | | 7.6.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 872.202,25 |
| 74 | | 7.6.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT ,CAJAS | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 840.606,35 |
| 75 | | 7.6.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 2.654.702,05 |
| 76 | | 7.6.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 8.172.495,07 |
| 77 | | 7.6.6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 16A/220V(3Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT, Y TODOS LOS | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 0,00 |
| 78 | | 7.6.7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT, CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 5.321.592,39 |

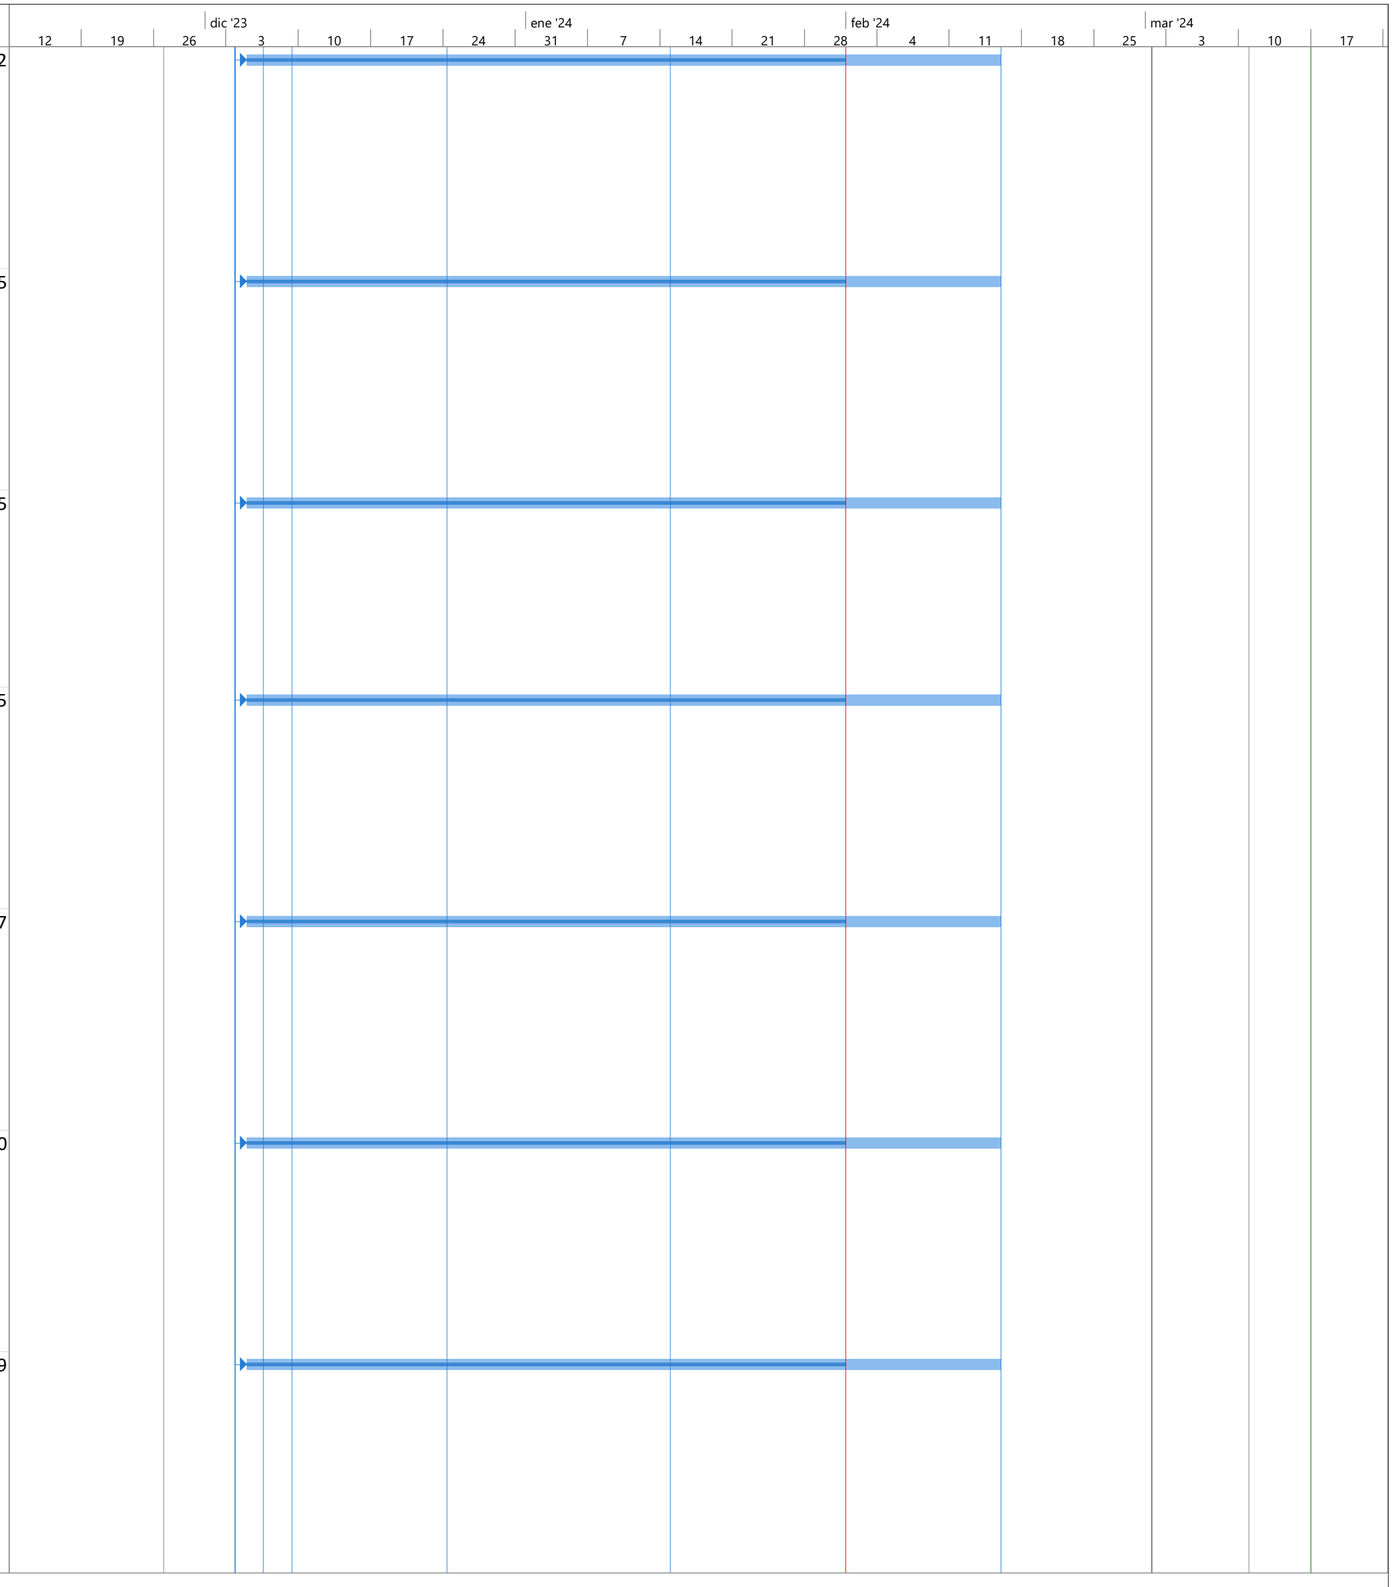


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | | 7.6.8 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT , CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 3.228.686,58 |
| 80 | | | 7.6.9 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA TV, INCLUYE TUBERIA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 2.051.090,08 |
| 81 | | | 7.6.10 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA TAPA CIEGA LAMINA GALVANIZADA ,INCLUYE TUBERIA PVC 3/4" CONDUIT , CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 63CC | $ 760.091,19 |
| 82 | | | | FIN INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 días | jue 15/02/24 | jue 15/02/24 | 81 | $ 0,00 |
| 83 | | | **10** | **PAÑETES** | **8 días** | **vie 16/02/24** | **ie 23/02/24** | | **$ 15.653.364,49** |
| 84 | | | 10.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y | 8 días | vie 16/02/24 | vie 23/02/24 | 32;82 | $ 6.407.057,98 |
| 85 | | | 10.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | 8 días | vie 16/02/24 | vie 23/02/24 | 84CC | $ 9.246.306,51 |
| 86 | | | | FIN PAÑETES | 0 días | vie 23/02/24 | vie 23/02/24 | 85 | $ 0,00 |
| 87 | | | **11** | **CIELO RASO** | **6 días** | **sáb 24/02/24** | **ue 29/02/24** | | **$ 70.235.303,94** |
| 88 | | | 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM +THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 días | sáb 24/02/24 | jue 29/02/24 | 86 | $ 67.010.015,58 |
| 89 | | | 11.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE CIELO RASO EN MADERA AREA TERRAZA, INCLUYE LIJADO, INMUNIZADO Y SELLADO DE LA MADERA, PARA SU POSTERIOR PINTURA PARA AMBIENTES CON ALTA SALINIDAD. | 6 días | sáb 24/02/24 | jue 29/02/24 | 88CC | $ 3.225.288,36 |
| 90 | | | | FIN CIELO RASO | 0 días | jue 29/02/24 | jue 29/02/24 | 89 | $ 0,00 |
| 91 | | | **12** | **ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO /PARED** | **40 días** | **mar 2/01/24** | **sáb 10/02/24** | | **$ 90.265.112,00** |
| 92 | ✓ | | 12.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.02 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | 10 días | mar 2/01/24 | jue 11/01/24 | 52CC+8 días | $ 13.612.539,68 |
| 93 | | | 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BAÑOS EN BALDOSA CERÁMICA DE 60x60 CM REF: CERÁMICA KAILANI MUTIC O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | 30 días | vie 12/01/24 | sáb 10/02/24 | 92 | $ 3.126.135,85 |
| 94 | | | 12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 51x51 CM REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | 30 días | vie 12/01/24 | sáb 10/02/24 | 93CC | $ 44.098.222,67 |

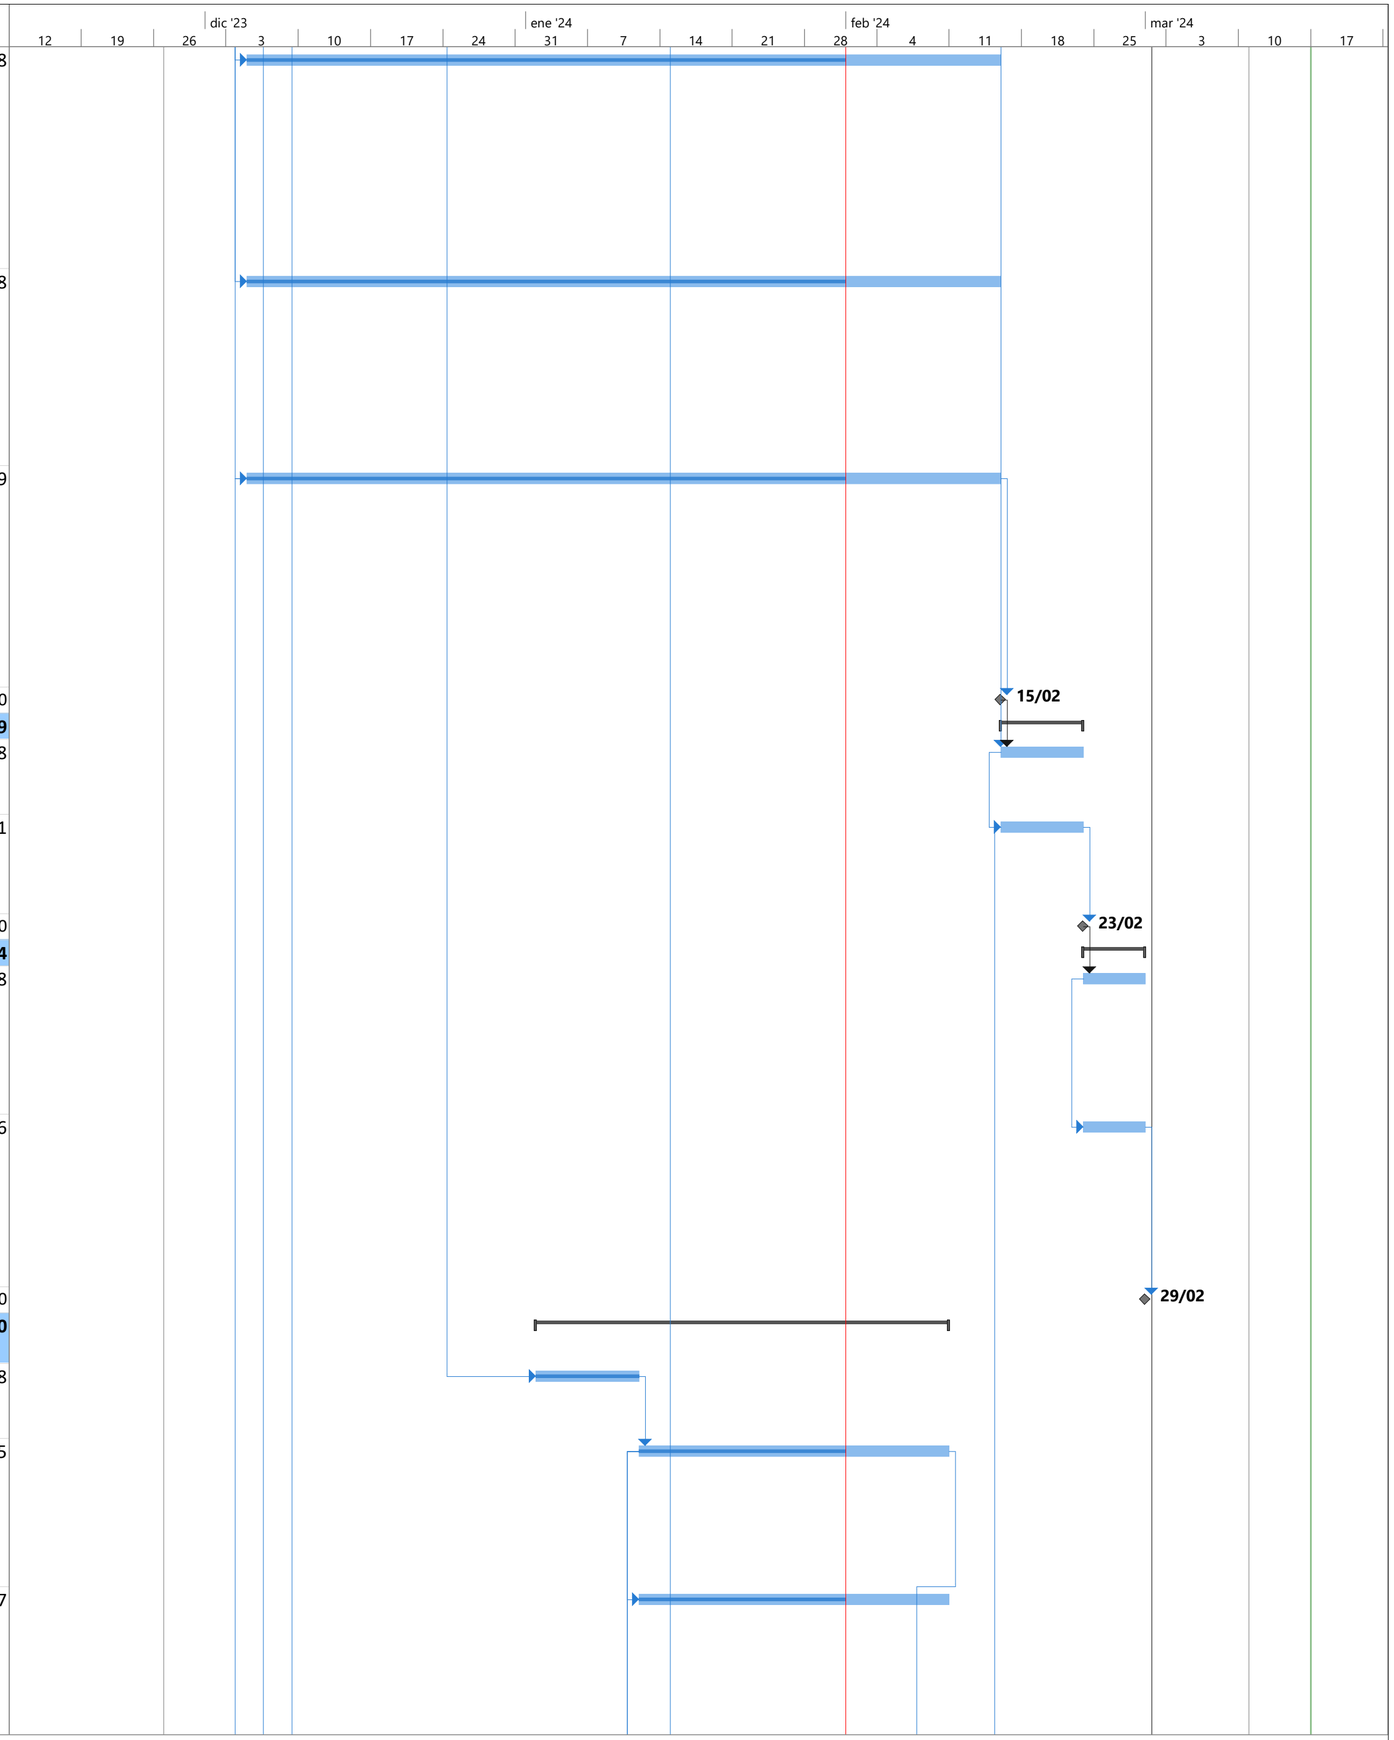


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | 12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR H= 10CM, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | 30 días | vie 12/01/24 | sáb 10/02/24 | 93CC | $ 8.607.251,91 |
| 96 | | 12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BELTRAN BLANCO 51x51 O SIMILAR (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO | 30 días | vie 12/01/24 | sáb 10/02/24 | 93CC | $ 18.811.547,32 |
| 97 | | 12.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN MOZAICO FILIPO 15X45 CM O SIMILAR DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. (EN MUROS DE LOS BAÑOS A INTERVENIR)., INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | 30 días | vie 12/01/24 | sáb 10/02/24 | 93CC | $ 2.009.414,57 |
| 98 | | | FIN ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO / PARED | 0 días | sáb 10/02/24 | sáb 10/02/24 | 97 | $ 0,00 |
| 99 | | **13** | **ACABADOS DE MUROS , ESTUCO / PINTURA** | **6 días** | **mar 5/03/24** | **dom 10/03/24** | | **$ 40.640.775,99** |
| 100 | | 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y | 6 días | mar 5/03/24 | dom 10/03/24 | 35CC+5 días | $ 20.996.849,25 |
| 101 | | 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | 6 días | mar 5/03/24 | dom 10/03/24 | 100CC | $ 19.643.926,74 |
| 102 | | | FIN ACABADO DE MUROS, ESTUCO / PINTURA | 0 días | dom 10/03/24 | dom 10/03/24 | 101 | $ 0,00 |
| 103 | | **14** | **CARPINTERIA EN MADERA** | **56 días** | **lun 15/01/24** | **om 10/03/2** | | **$ 27.844.907,57** |
| 104 | | 14.1 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYE REPOSICIÓN DE BISAGRAS Y TOPES EN MAL ESTADO, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA. | 56 días | lun 15/01/24 | dom 10/03/24 | 7FC+40 días | $ 14.138.083,47 |
| 105 | | 14.2 | MANTENIMIENTO DE MUEBLE EN MADERA DE COCINA, INCLUYE REPOSICIÓN DE HERRAJES,LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA. | 56 días | lun 15/01/24 | dom 10/03/24 | 104CC | $ 4.924.415,12 |
| 106 | | 14.3 | MANTENIMIENTO DE MUEBLE EN MADERA DE BAÑO, INCLUYE REPOSICIÓN DE HERRAJES,LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA. | 56 días | lun 15/01/24 | dom 10/03/24 | 105CC | $ 4.158.555,80 |
| 107 | | 14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS EN MAL ESTADO DE CLOSETS, INCLUYE INMUNIZACIÓN, SELLADO Y PINTURA DE LA MADERA | 56 días | lun 15/01/24 | dom 10/03/24 | 106CC | $ 4.623.853,18 |
| 108 | | | FIN CARPINTERIA EN MADERA | 0 días | dom 10/03/24 | lom 10/03/2 | 107 | $ 0,00 |
| 109 | | **15** | **CARPINTERIA METALICA** | **2 días** | **sáb 9/03/24** | **om 10/03/2** | | **$ 0,00** |
| 110 | | 15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ÁNGULO DE E=0.38MM PARA MESÓN DE ACERO EN COCINA (EXISTENTE), INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA | 2 días | sáb 9/03/24 | dom 10/03/24 | 05FC-7 días | $ 0,00 |
| 111 | | | FIN CARPINTERIA METALICA | 0 días | dom 10/03/24 | lom 10/03/2 | 110 | $ 0,00 |
| 112 | | **17** | **CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE** | **70 días** | **mié 6/12/23** | **ıar 13/02/2** | | **$ 116.279.309,99** |

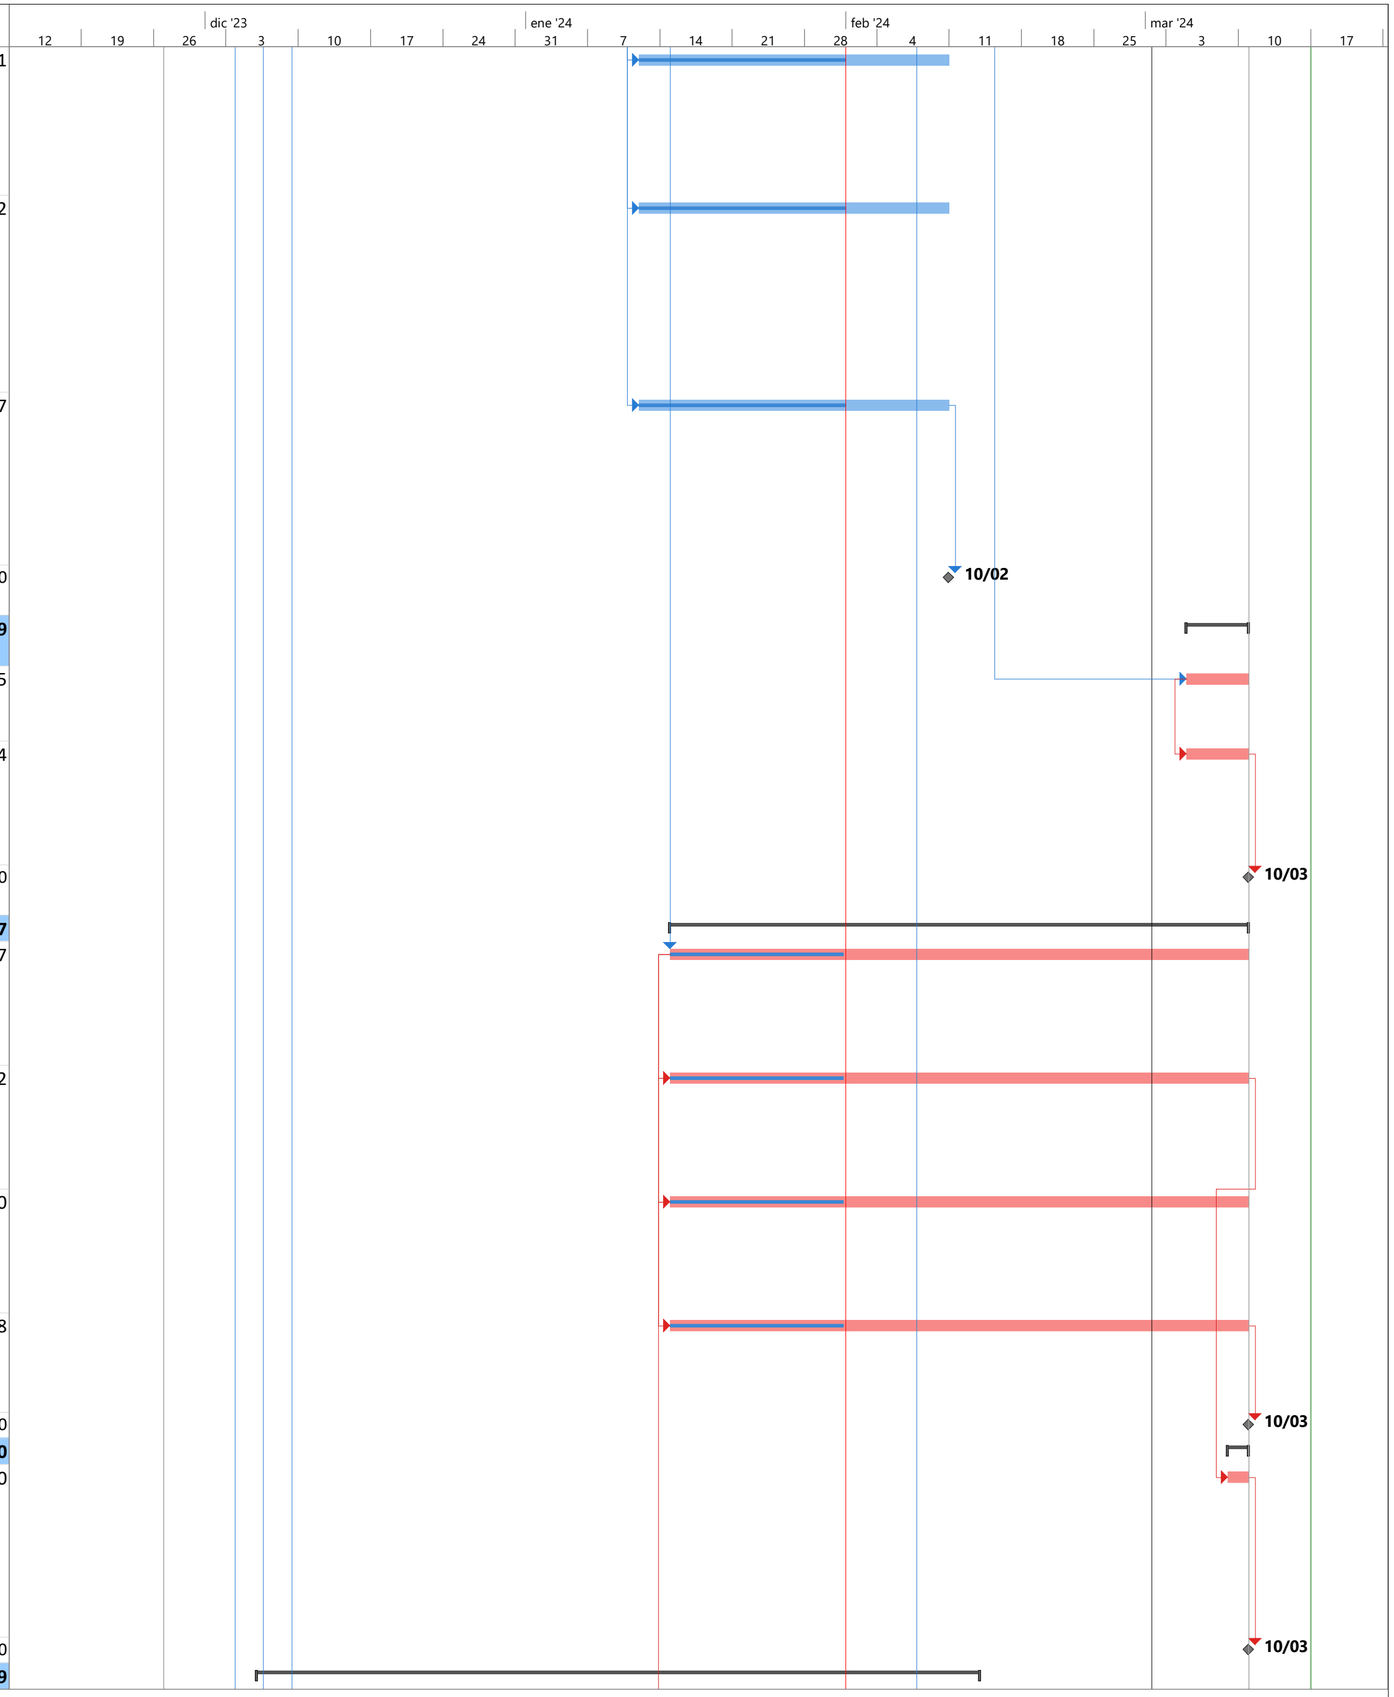


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE EN SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 70 días | mié 6/12/23 | mar 13/02/24 | 16 | $ 65.266.427,12 |
| 114 | | 17.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA CON DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRASPARENTE SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | 70 días | mié 6/12/23 | mar 13/02/24 | 113CC | $ 34.816.864,98 |
| 115 | | 17.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE FABRICADA EN TUBULARES CON PISA VIDRIO A PRECION CURVO Y CHAPA DE LUJO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 70 días | mié 6/12/23 | mar 13/02/24 | 114CC | $ 16.196.017,89 |
| 116 | | | FIN CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE | 0 días | mar 13/02/24 | mar 13/02/24 | 115 | $ 0,00 |
| 117 | | **18** | **CUBIERTAS** | **33 días** | **vie 19/01/24** | **mar 20/02/24** | | **$ 160.642.909,31** |
| 118 | | 18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA MONOCOMPONENTE, PARA RELLENO Y AISLAMIENTO PARA COBERTURA DE ORIFICIOS EN ONDULACIONES DE TEJAS PARA LA CUBIERTA, ACTIVIDAD NECESARIA PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS EN LA CUBIERTA | 25 días | sáb 27/01/24 | mar 20/02/24 | 0CC+4 días | $ 1.183.018,55 |
| 119 | | 18.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (PERFIL EN CUBIERTA) EXISTENTE, INCLUYE MASILLADO, LIJADO, RASPADO, PINTURA EPOXICA Y ESMALTE | 8 días | vie 19/01/24 | vie 26/01/24 | 18CC- días | $ 14.987.169,67 |
| 120 | | 18.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF UPVC CALIBRE 2,5MM COLOR AZUL O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMA HOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 25 días | sáb 27/01/24 | mar 20/02/24 | 118CC | $ 142.063.994,79 |
| 121 | | 18.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA (LISTON EN MADERA )PARA CUBIERTA AREA TERRAZA, INCLUYE LIJADO, INMUNIZADO Y SELLADO DE LA MADERA, PARA SU POSTERIOR PINTURA PARA AMBIENTES CON ALTA SALINIDAD. | 8 días | vie 19/01/24 | vie 26/01/24 | 119CC | $ 2.408.726,30 |
| 122 | | | FIN CUBIERTAS | 0 días | vie 26/01/24 | vie 26/01/24 | 121 | $ 0,00 |
| 123 | | **19** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** | **15 días** | **vie 9/02/24** | **vie 23/02/24** | | **$ 18.379.831,70** |
| 124 | | 19.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, INCLUYE SIFON DE DESAGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (NO INCLUYE GRIFERIA) | 5 días | vie 9/02/24 | mar 13/02/24 | 93FC-2 días;12 | $ 1.304.582,95 |
| 125 | | 19.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO, INCLUYE SIFON DE DESAGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (NO INCLUYE GRIFERIA) | 5 días | lun 19/02/24 | vie 23/02/24 | 127CC | $ 1.298.487,55 |

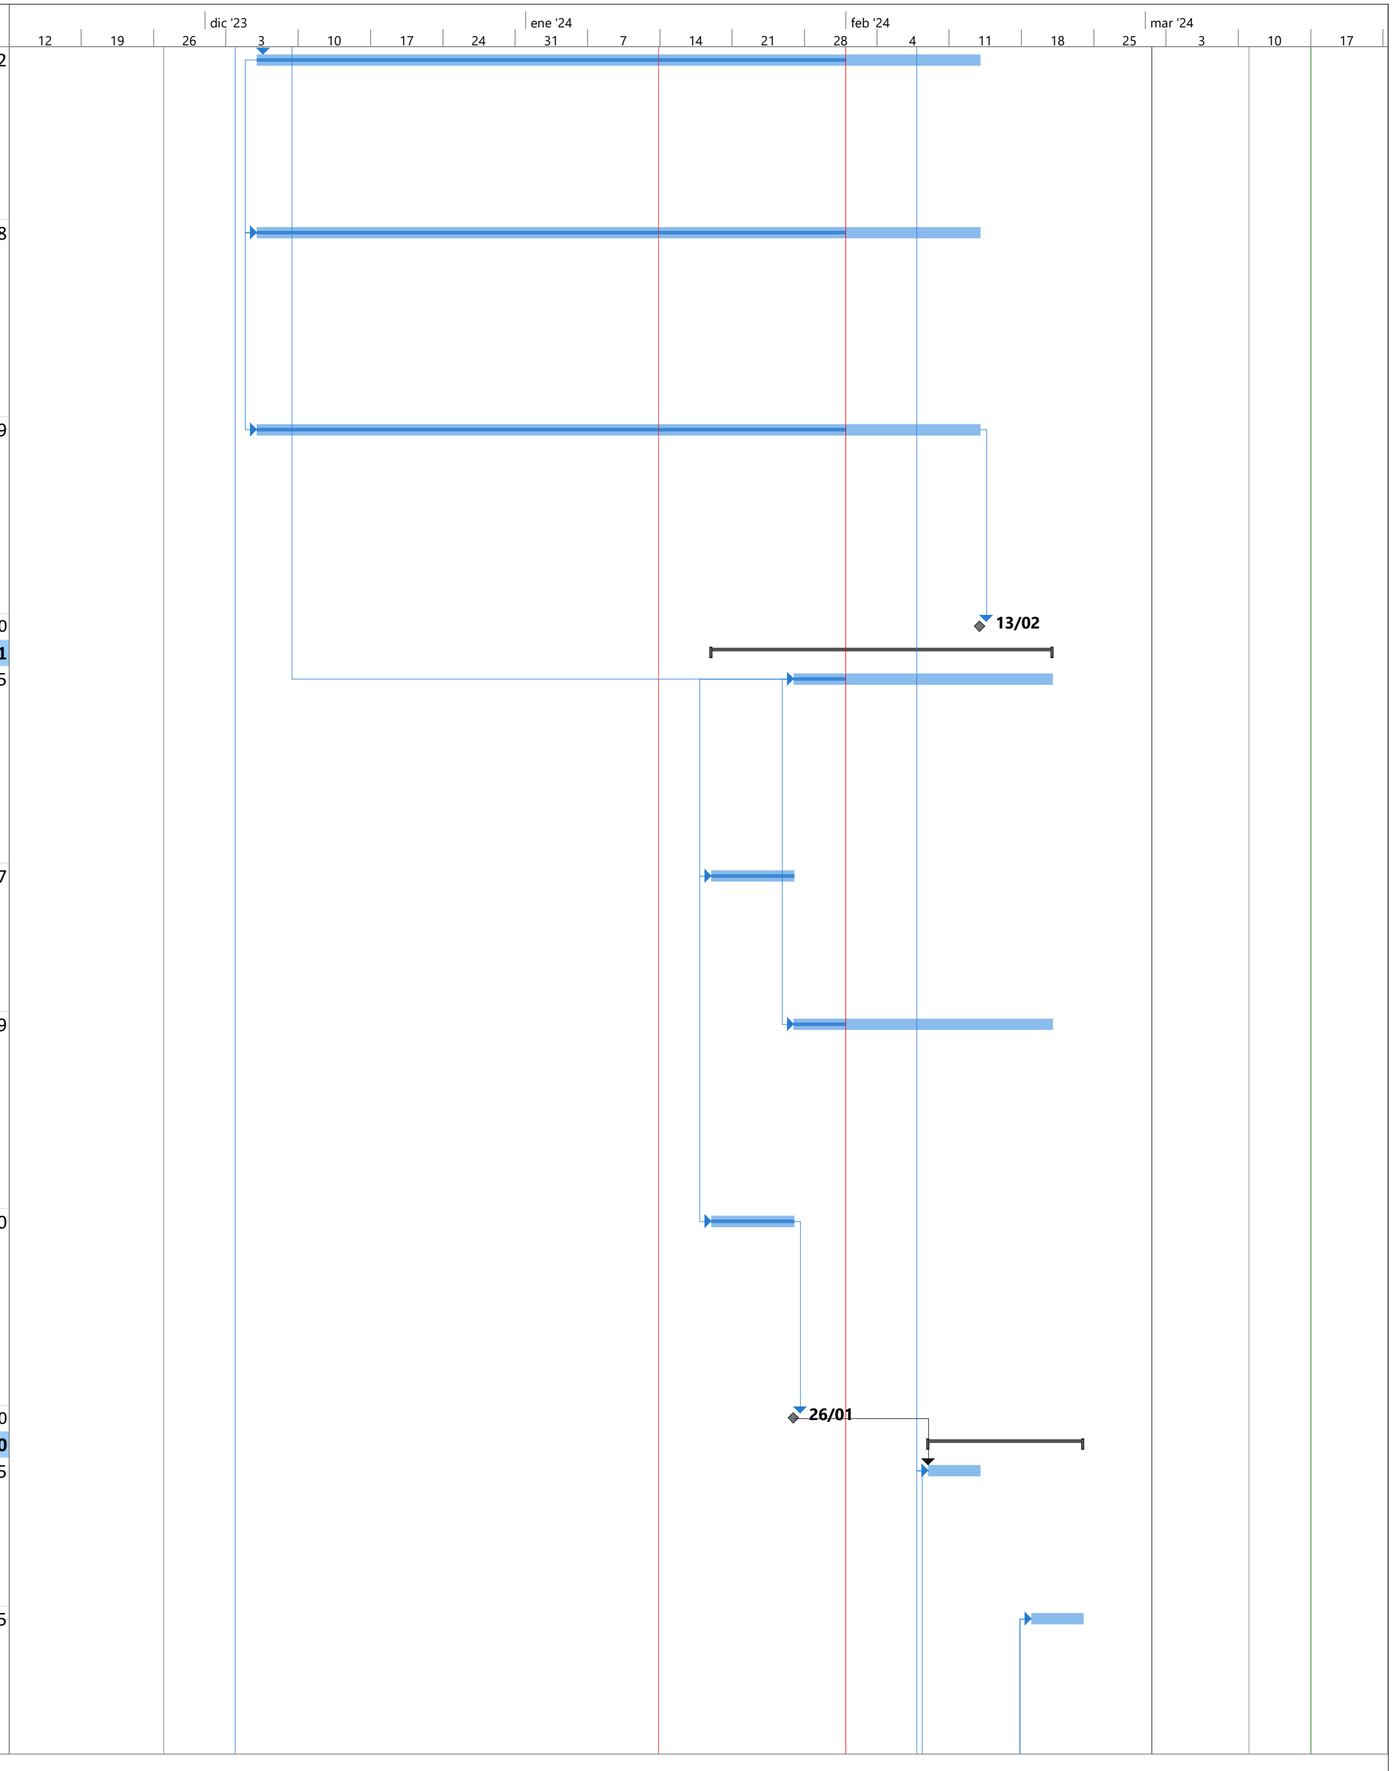


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | | 19.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, | 5 días | vie 9/02/24 | mar 13/02/24 | 124CC | $ 7.904.135,12 |
| 127 | | 19.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ACCESORIOS PARA BAÑO REF PALMA X 6 UND INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 5 días | lun 19/02/24 | vie 23/02/24 | 26CC+1 días | $ 2.573.868,47 |
| 128 | | 19.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | 5 días | lun 19/02/24 | vie 23/02/24 | 127CC | $ 2.012.018,10 |
| 129 | | 19.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA | 5 días | lun 19/02/24 | vie 23/02/24 | 128CC | $ 1.221.276,22 |
| 130 | | 19.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA | 5 días | lun 19/02/24 | vie 23/02/24 | 125CC | $ 2.065.463,29 |
| 131 | | | FIN APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIO | 0 días | vie 23/02/24 | vie 23/02/24 | 130 | $ 0,00 |
| 132 | | **20** | **VIDRIOS Y ESPEJOS** | **5 días** | **mié 14/02/24** | **om 18/02/2** | | **$ 30.507.677,54** |
| 133 | | 20.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO | 5 días | mié 14/02/24 | dom 18/02/24 | 24CC+ días | $ 30.507.677,54 |
| 134 | | | FIN VIDRIOS Y ESPEJOS | 0 días | dom 18/02/24 | lom 18/02/2 | 133 | $ 0,00 |
| 135 | | **21** | **CERRADURAS** | **3 días** | **lun 15/01/24** | **nié 17/01/2** | | **$ 2.095.523,69** |
| 136 | | 21.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO MADERA ALCOBA | 3 días | lun 15/01/24 | mié 17/01/24 | 104CC | $ 2.095.523,69 |
| 137 | | | FIN CERRADURAS | 0 días | mié 17/01/24 | nié 17/01/24 | 136 | $ 0,00 |
| 138 | | | FIN DE OBRA | 0 días | jue 29/02/24 | jue 29/02/24 | 137;34 | $ 0,00 |
| 139 | | **NP** | **ÍTEMS NO PREVISTOS** | **94 días** | **mar 5/12/23** | **jue 7/03/24** | | **$ 72.419.413,06** |
| 140 | | NP 1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE | 73 días | mar 5/12/23 | jue 15/02/24 | 81CC | $ 33.263.136,65 |
| 141 | | NP 2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN CAJA DE POLICARBONATO PARA TOTALIZADOR DE ACOMETIDA | 3 días | lun 26/02/24 | mié 28/02/24 | 10CC+8 días | $ 433.054,05 |
| 142 | | NP 3 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X63 (PROTECCIÓN DE ACOMETIDA), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 3 días | lun 26/02/24 | mié 28/02/24 | 141CC | $ 980.756,50 |
| 143 | | NP 4 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA TRENZA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 3 días | lun 26/02/24 | mié 28/02/24 | 142CC | $ 344.534,20 |
| 144 | | NP 5 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA EXISTENTE E= HASTA 12 CM | 3 días | dom 25/02/24 | mar 27/02/24 | 43FC-4 días | $ 1.367.720,75 |
| 145 | | NP 6 | CONCRETO DE 2500 PSI MEZCLADO EN OBRA, PARA REPOSICION DE PLACAS | 5 días | dom 25/02/24 | jue 29/02/24 | 144CC | $ 1.668.450,91 |
| 146 | | NP 7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE BASE GRANULAR TIPO B-200, PARA LLENO BAJO PLACAS | 5 días | dom 25/02/24 | jue 29/02/24 | 145CC | $ 654.056,94 |
| 147 | | NP 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS DE 500 LT PREFABRICADO, INCLUYE EXCAVACIONES, Y PLACA EN CONCRETO 2500 PSI E=10 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 12 días | dom 25/02/24 | jue 7/03/24 | 144CC | $ 5.865.468,68 |

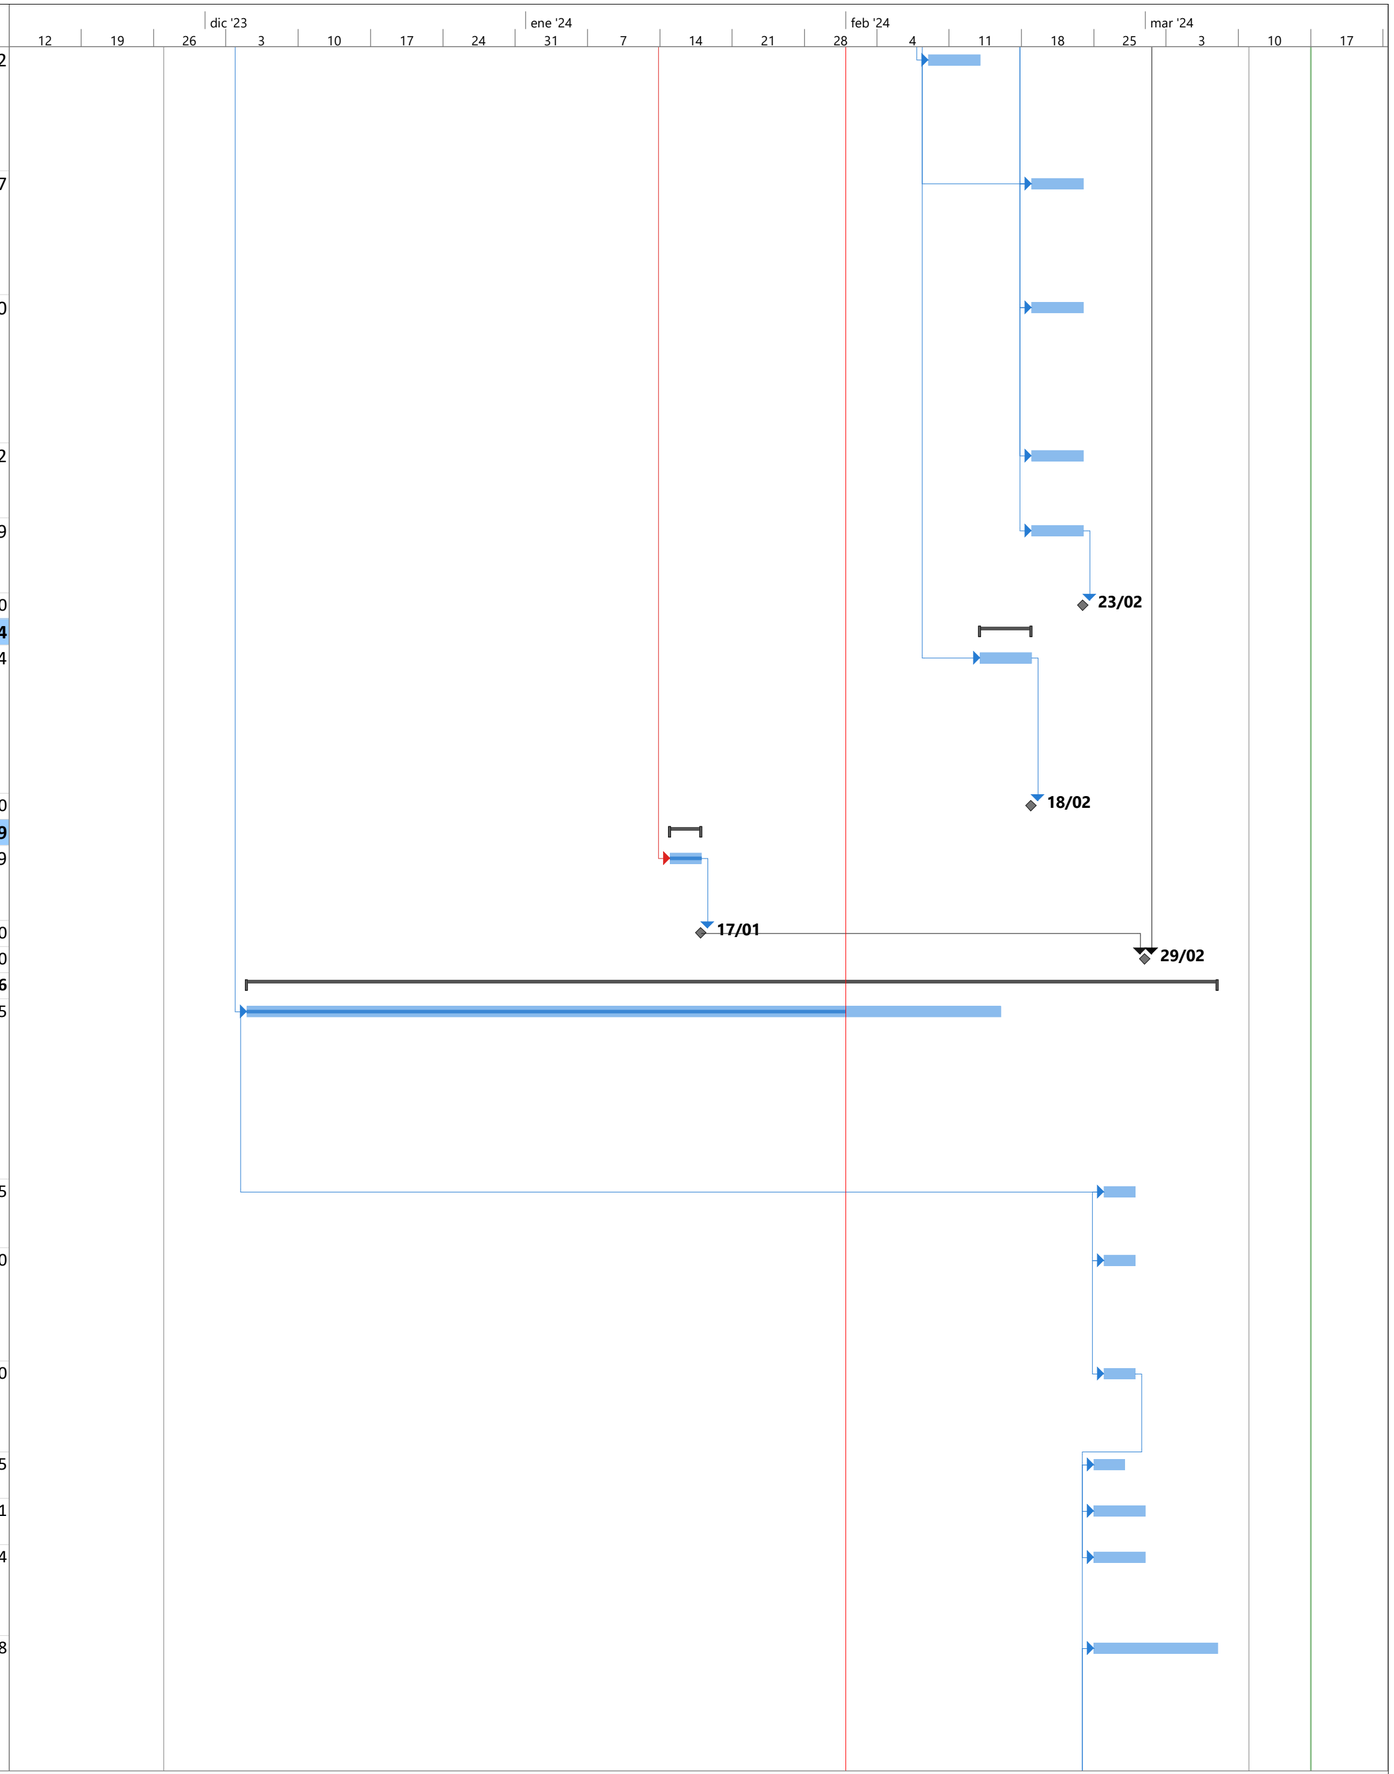


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica | |
| División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso | |
| Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual | |

| Id | Modo de tarea | Item | Nombre de tarea | Duración | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Predece | Asignacion Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | | NP 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 12 días | dom 25/02/24 | jue 7/03/24 | 147CC | $ 16.128.353,56 |
| 149 | | NP 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN L EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA,Y ELEMENTOS DE DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 12 días | dom 25/02/24 | jue 7/03/24 | 147CC | $ 11.713.880,82 |

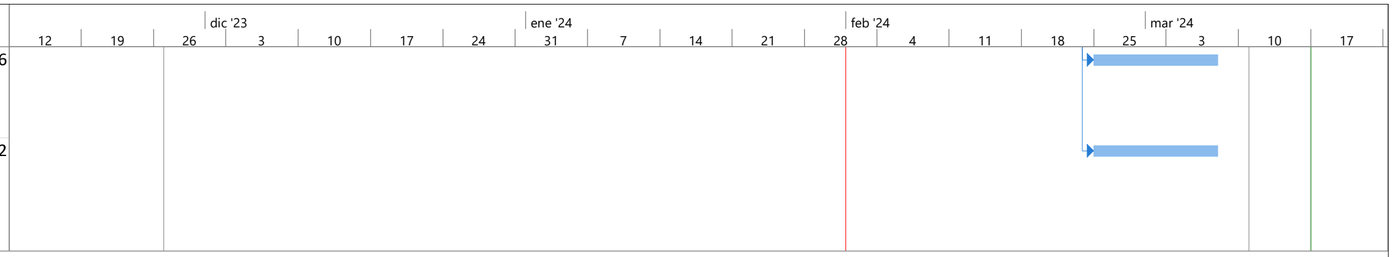


Proyecto: Fuerza A. Final
Fecha: dom 17/03/24

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica |
| División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso |
| Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual |
