BOGOTÁ

Secretaría Distrital del Hábitat

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1160 DE 2023
SOLIUN SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

INFORME MENSUAL No 2 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TOMO __1___ DE _____

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	LUIS ALBERTO MEDRANO B.	Residente de Interventoría	
APROBÓ	EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ	Directora de Interventoría	

FEBRERO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
- PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA 6
- PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE 7
- PARQUE URBANIZACIÓN LA CAMELIA 8
- PARQUE PATIO BONITO II SECTOR D 9
- PARQUE CHUNIZA I 10
3. CONTRATO DE OBRA 11
3.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.3. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS 12
3.4. ASPECTOS FINANCIEROS 13
3.4.1. DESEMBOLSO DE ANTICIPO 13
3.5. ASPECTOS TÉCNICOS 14
3.5.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 14
3.5.2. ASPECTOS DE OBRA 15
3.5.3. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 15
3.5.4. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS POR TERRITORIO 17
3.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 22
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
4.1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
4.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS 23
4.3. ASPECTOS FINANCIEROS 24
4.4. ASPECTOS TÉCNICOS 24
4.4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 24
4.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 26
5. CONTROL DE CALIDAD 26
5.1. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 26
5.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 27
5.2.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA 27
5.2.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA 27
6. CORRESPONDENCIA CRUZADA 28
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 29

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. PÓLIZAS CONTRACTUALES OBRA E INTERVENTORÍA
ANEXO 2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO
ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ANEXO 6. SOPORTES TOPOGRAFIA INTERVENTORÍA
ANEXO 7. CERTIFICADOS LABORATORIO INTERVENTORÍA
ANEXO 8. SOPORTES TOPOGRAFIA CONTRATISTA
ANEXO 9. CERTIFICADOS LABORATORIO CONTRATISTA
ANEXO 10. CORRESPONDENCIA

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 1160 de 2023 suscrito entre SOLIUN SAS y la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - SDHT, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra CONSORCIO ARQING HABITAT de acuerdo con el contrato No. 1164 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al segundo mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato, respectivamente.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e Interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En el proyecto se evidencia la incorporación de actividades de carácter urbano que generan y fortalecen las dinámicas existentes del sector a partir de la intervención puntual que beneficia de manera positiva la circulación peatonal y las áreas de permanencia mejorando la experiencia de los usuarios en cada uno de los territorios. Estas actividades de mantenimiento se enfocan primordialmente en la renovación de los espacios que se identifican con afectaciones negativas y que por ende no permitían un óptimo aprovechamiento de los mismos.

Se realiza la Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá y para este informe se presenta específicamente con el Contrato de interventoría No. 1160 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LAS INTERVENCIONES DE ACUPUNTURA URBANA PARA LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

Para la ejecución de estas actividades se encuentra asociado un contrato de Obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT"


2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá, donde posterior a un análisis de priorización y diagnostico asociado a un contrato de consultoría, se resuelve realizar la intervención mediante mantenimiento de 5 territorios distribuidos en 4 localidades. Se presenta cuadro general de localización de cada uno de los territorios

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO SEGÚN IDRD	RUPI	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja	01-035	293-8	Usaquén	KR 5 A 163 D 46
Parque Riveras de Occidente	08-006	1156-31	Kennedy	CL 34A SUR 91 05
Parque urbanización La Camelia	16-054	2244-18	Puente Aranda	KR 54 1B 30
Parque Patio Bonito II sector D	08-163	1219-10	Kennedy	KR 87 34 31 SUR
Parque Chuniza I	05-051	1660-51	Usme	CL 90 SUR - KR 8


- **Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja**

Con el fin de contextualizar la ubicación del territorio, es necesario precisar que, el Parque desarrollo Santa Cecilia Parte Baja se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. El barrio Santa Cecilia Parte Baja, se encuentra ubicado a la zona ubicada entre Ac 170 al norte y Ac 147 al sur, Limite Urbano al oriente y Autopista Norte al occidente. El Polígono de Intervención Prioritaria Parque Santa Cecilia Baja, se encuentra ubicado sobre la Carrera 5A con calle 163D. Respecto a la composición de este PIP, es reconocido como parque de escala vecinal, con código IDRD 01-035.

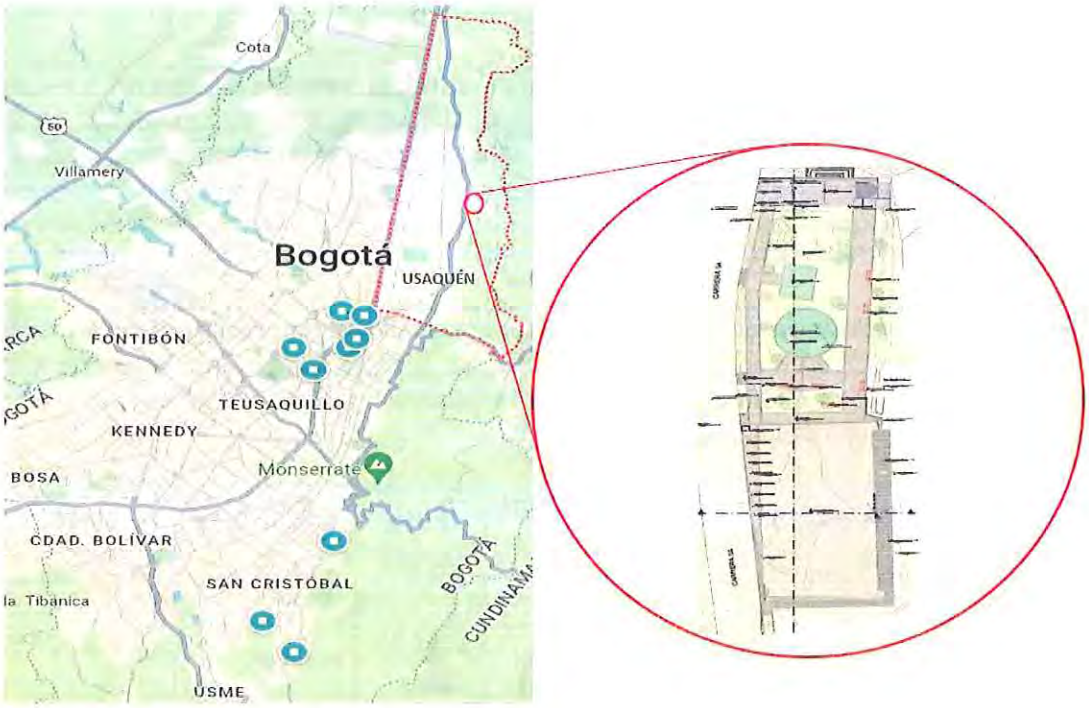

- **Parque Riveras de Occidente**


Con el fin de contextualizar la ubicación del territorio, es necesario precisar que, el Parque Riveras de Occidente se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.
El Polígono de Intervención Prioritaria Parques Riveras de occidente, se encuentra ubicado en el barrio con el mismo nombre, ubicado sobre la calle 34Asur y la carrera 91. Respecto a la composición de este PIP, es reconocido como parques de escala vecinal, con código IDRD 08-006.

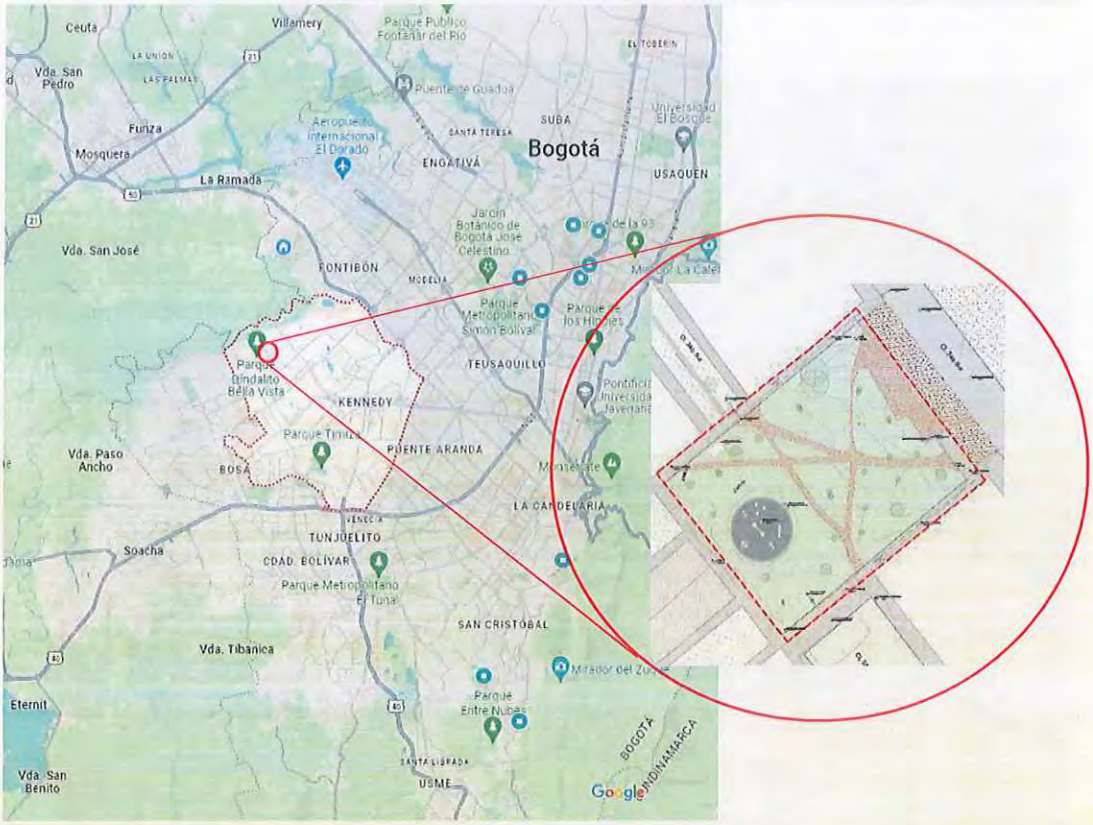

- **Parque urbanización La Camelia**


Con el fin de contextualizar la ubicación del territorio, es necesario precisar que, el Parque Urbanización La Camelia, se encuentra ubicado en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.

El Polígono de Intervención Prioritaria Parque Urbanización La Camelia, se encuentra ubicado en el barrio con el mismo nombre, ubicado sobre la carrera 54con calle 1B. Respecto a la composición de este PIP, es reconocido como parque de escala vecinal, con código IDRD 16-054

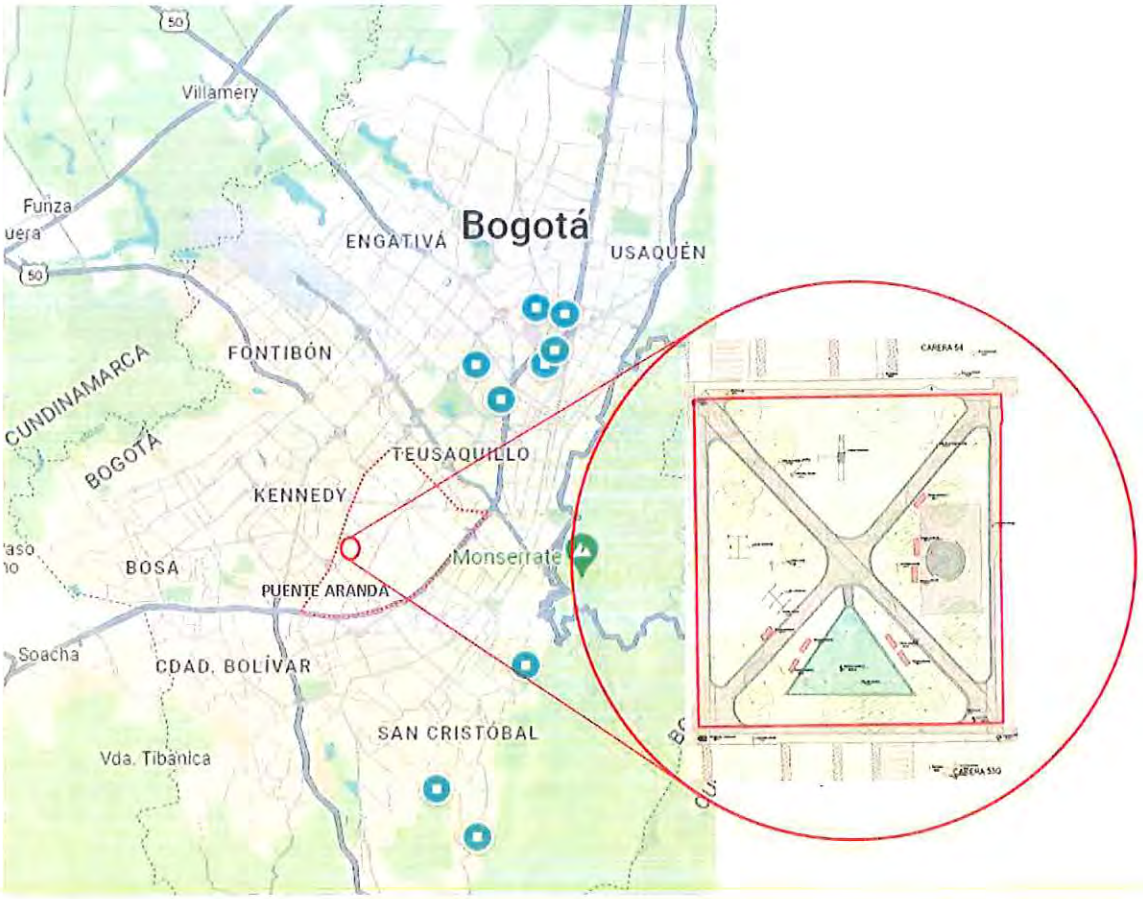


- **Parque Patio Bonito II sector D**

Con el fin de contextualizar la ubicación del territorio, es necesario precisar que, el Parque Patio Bonito II Sector D se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.
EL Polígono de Intervención Prioritaria Parques Patio Bonito II Sector D, se encuentra ubicado en el barrio con el mismo nombre, ubicado sobre la Carrera 87 con calle 34 sur. Respecto a la composición de este PIP, es reconocido como parque de escala de bolsillo, con código IDRD 08-163.

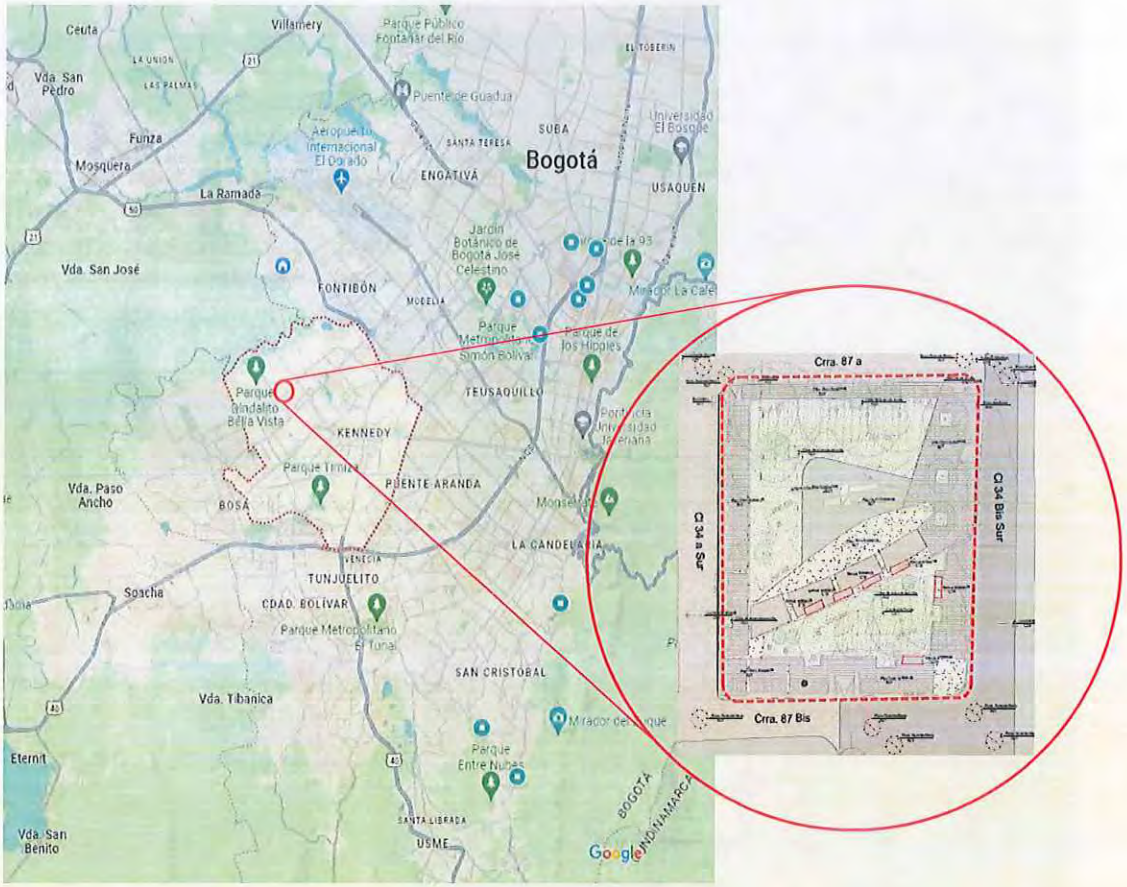

- **Parque Chuniza I**

Con el fin de contextualizar la ubicación del territorio, es necesario precisar que, el Parque Chuniza I se encuentra ubicado en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C.
El Polígono de Intervención Prioritaria Parque Chuniza I, se encuentra ubicado en el barrio con el mismo nombre, ubicado sobre la Calle 90 sur con carrera 3. Respecto a la composición de este PIP, es reconocido como parque de escala vecinal, con código IDRD 05-051.

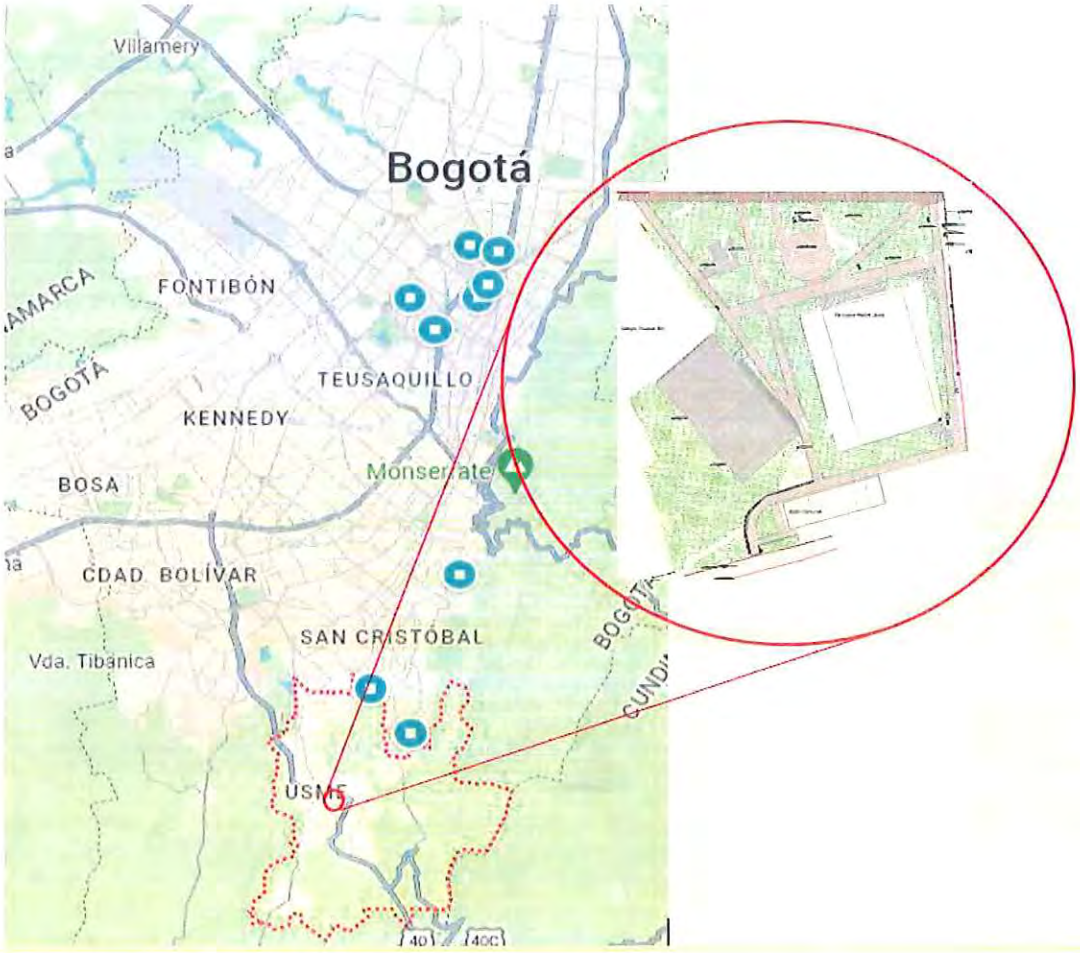

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	1164 DE 2023
Contratista de obra	CONSORCIO ARQING HABITAT
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."
Periodo de apropiación de los diseños	QUINCE (15) DÍAS
Periodo de ejecución de obra	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo total del contrato	CUATRO (4) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.528.960.329,00
Valor total del contrato	$ 2.528.960.329,00
Fecha Inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación del contrato:	19 de abril de 2024

3.2. Aspectos contractuales del contrato de obra

Dentro del tiempo estipulado de la ejecución del contrato y una vez suscrita el acta de inicio el contratista contará con 15 días para realizar todas las actividades pertinentes dirigidas o encaminadas a la apropiación de los estudios y diseños suministrados por la SDHT para la ejecución de las obras cómo pueden ser: las visitas necesarias a cada uno de los territorios priorizados, la revisión, análisis y observaciones de los estudios y diseños. Agotados estos 15 días el contratista iniciará automáticamente la ejecución de las obras de los territorios verificados.

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de las zonas a intervenir, en compañía de funcionarios de la Secretaría del Hábitat, representantes de la Interventoría SOLIUN SAS y representantes del Contratista Arqing Habitat donde se verifico el estado físico inicial de los territorios antes de la intervención.

Se inició con una etapa preliminar que consistió en la recopilación y estudio de toda la información, analizando los presupuestos, programaciones para los territorios a intervenir.
La Interventoría estuvo realizando acompañamiento a todo el desarrollo de esta primera etapa, además de lo mencionado anteriormente; se revisaron las hojas de vida que presentó el Contratista, se realizaron mesas de trabajo, comités de obra, revisión de pólizas y demás documentos inherentes a los Contratos para el buen desarrollo de las obras.

3.3. Aspectos legales y revisión de pólizas

Se revisa el estado actual de las pólizas del contrato de obra y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

CUADRO DE INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 14-44-101200075			
DESCRIPCIÓN EL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-12-2023	20-10-2024	$505,792,065.80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20-12-2023	20-10-2024	$758,688,098.70
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-12-2023	20-04-2027	$252,896,032.90
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO	20-04-2024	20-04-2027	$505,792,065.80

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 14-40-101061334			
DESCRIPCIÓN EL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20-12-2023	20-04-2024	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	20-12-2023	20-04-2024	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20-12-2023	20-04-2024	$348,000,000.00

Durante el trascurso del presente periodo, el Contrato de obra no presentan ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual, tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prorroga).

Se anexa copia de las garantías aprobadas a la fecha por la entidad mediante plataforma Secop 2, en el **(ANEXO 01).**

3.4. Aspectos financieros

CONTRATO No.:	1164 de 2023	
PLAZO INICIAL:	4 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de diciembre de 2023	
****FECHA DE SUSPENSIÓN:**		
****FECHA DE REINICIACIÓN:**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:		
PLAZO TRANSCURRIDO:	71 días	EQUIVALE AL 58%
VALOR INICIAL:	$ 2.528.960.329,00	
VALOR ADICION(ES):	$0	
ANTICIPO	$758.688.098,70	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.528.960.329,00	
VALOR PAGADO:	$0	
VALOR POR PAGAR:	$ 2.528.960.329,00	

3.4.1. Desembolso de anticipo

Durante el periodo del presente informe se realizan las siguientes aprobaciones por parte de la interventoría a ordenes de giro para desembolso de recursos correspondientes al anticipo.

No. ORDEN	VALOR	PORCENTAJE	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COBRO ENTIDAD BENEFICIARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
1	$ 14,894,835.00	3.27%	TRANSITO Y OBRAS SAS	58900001099	CAH1164-2023-070 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-084 el 26/02/2024
2	$ 21,123,780.00	4.64%	MIRIAM YANED FRANCO ZEA	62422807778	CAH1164-2023 072 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-092 el 01/03/2024
2	$ 9,635,963.00	2.12%	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	13321960531	CAH1164-2023 072 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-092 el 01/03/2024

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, al saldo equivalente de cada uno de estos, el valor aprobado total.

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
Pago de mano de obra no calificada del proyecto	$ 197,258,905.00	26.00%	$ -	0.00%	$ 197,258,905.00	100.00%
Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 37,934,405.00	5.00%	$ -	0.00%	$ 37,934,405.00	100.00%
Transporte de equipos o de materiales	$ 68,281,929.00	9.00%	$ -	0.00%	$ 68,281,929.00	100.00%
Compra de materiales y accesorios	$ 455,212,859.00	60.00%	$ 45,654,578.00	10.03%	$ 409,558,281.00	89.97%
TOTAL	**$ 758,688,098.00**	**100%**	**$ 45,654,578.00**	**6.02%**	**$ 713,033,520.00**	**93.98%**

En el (ANEXO 2) se remite copia de las ordenes de giro desembolsadas a la fecha.

3.5. ASPECTOS TÉCNICOS

3.5.1. Resumen de las actividades realizadas en el mes

- Asistencias a comité de seguimiento, el cual es citado periódicamente cada semana con el fin de presentar y evaluar el estado de los contratos y la ejecución de las obras.
- Trámite ante las alcaldías locales de cada uno de los territorios para informar del inicio de las obras y la instalación de vallas informativas de obra.
- Informe sobre el estado de los estudios y diseños.
- Tramites de ordenes de giro de la 1 a la 4 donde se atienden las observaciones realizadas por la interventoría
- Presentación de informes mensuales No.1 de cada uno de los componentes.
- Se remite a la interventoría plan de gestión del riesgo.
- Se presenta el plan de trabajo subsanado.
- Entrega de cronograma de obra por territorio
- Se realizan ajustes sobre el presupuesto teniendo en cuenta la priorización de actividades y ajuste en cantidades de obra.
- Asistencia a reuniones sociales de inicio.
- Levantamiento de actas de vecindad de los predios colindantes con las obras y del estado inicial del espacio público.
- Revisión de nueva versión de planos y de documentos aclaratorio por parte de la consultoría.

- Presentación de matriz de inspección y ensayos subsanada.

3.5.2. Aspectos de obra

En el transcurso del periodo del presente informe se da inicio de actividades de obra en los territorios de Patio Bonito, Riveras de occidente y La Camelia; en los territorios de Santa Cecilia y Chuniza, se realizan las reuniones sociales de inicio y el diligenciamiento de las actas de vecindad

- Definición de actividades necesarias para el buen desarrollo de las obras a ejecutar
- Definición de nuevos alcances y priorización de actividades en los territorios lo cual a implicado contemplan actividades adicionales y balance presupuestal
- Se entrega muestra del adoquín con acabado en color morado el cual es aprobado por la entidad contratante para su instalación.
- Se realizan modificaciones de PMT ante la SDM

3.5.3. Avance de las actividades de obra

Las actividades realizadas en cada uno de los territorios corresponden principalmente a actividades previas al inicio de obra y actividades preliminares de obra, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera en cada uno de los territorios.

SANTA CECILIA

- Se realiza reunión de participación ciudadana de inicio, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades a desarrollar mediante la propuesta de diseño para la intervención de este territorio.
- Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios cercanos a la zona de intervención, así mismo del estado inicial del espacio público y vías.

RIVERAS DE OCCIDENTE

- Se realiza reunión de participación ciudadana de inicio, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades a desarrollar mediante la propuesta de diseño para la intervención de este territorio.
- Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios cercanos a la zona de intervención, así mismo del estado inicial del espacio público y vías.
- Se realizan actividades preliminares de cerramiento de la zona de intervención y protección de individuos arbóreos, instalación de señalización para implementación de PMT, instalación de vallas informativas.

- Se ejecutan actividades de replanteo, demolición de andenes, demolición de bancas existentes, excavación manual en zonas peatonales y periódicamente retiro de escombros y material de excavación.

LA CAMELIA

- Se realiza reunión de participación ciudadana de inicio, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades a desarrollar mediante la propuesta de diseño para la intervención de este territorio.
- Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios cercanos a la zona de intervención, así mismo del estado inicial del espacio público y vías.
- Se realizan actividades preliminares de cerramiento de la zona de intervención y protección de individuos arbóreos, instalación de señalización para implementación de PMT, instalación de vallas informativas.

- Se ejecutan actividades de replanteo, demolición de andenes, demolición de bordillo en ladrillo, demolición de bancas existentes, excavación manual en zonas peatonales y periódicamente retiro de escombros y material de excavación.

PATIO BONITO



- Se realiza reunión de participación ciudadana de inicio, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades a desarrollar mediante la propuesta de diseño para la intervención de este territorio.
- Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios cercanos a la zona de intervención, así mismo del estado inicial del espacio público y vías.
- Se realizan actividades preliminares de cerramiento de la zona de intervención y protección de individuos arbóreos, instalación de señalización para implementación de PMT, instalación de vallas informativas.
- Se ejecutan actividades de replanteo, desmonte de adoquín, demolición de bordillos, demolición de bancas existentes, desmonte de baranda de cerramiento en juegos infantiles, desmonte y retiro de juego infantil, demolición de asfalto, excavación manual en zonas peatonales y periódicamente retiro de escombros y material de excavación.

CHUNIZA


- Se realiza reunión de participación ciudadana de inicio, con el fin de informar a la comunidad sobre las actividades a desarrollar mediante la propuesta de diseño para la intervención de este territorio.
- Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios cercanos a la zona de intervención, así mismo del estado inicial del espacio público y vías.

3.5.4. Diseños arquitectónicos por territorio

En el transcurso del desarrollo del contrato se han presentado cambios en los diseños propuestos inicialmente de acuerdo a factores, constructivos y de priorización de actividades en cada uno de los territorios, por tal motivo se relaciona a continuación los diseños iniciales y los últimos presentados por el consultor a la fecha de corte del presente informe, así mismo se muestra el estado inicial de cada uno de las zonas antes de la intervención.

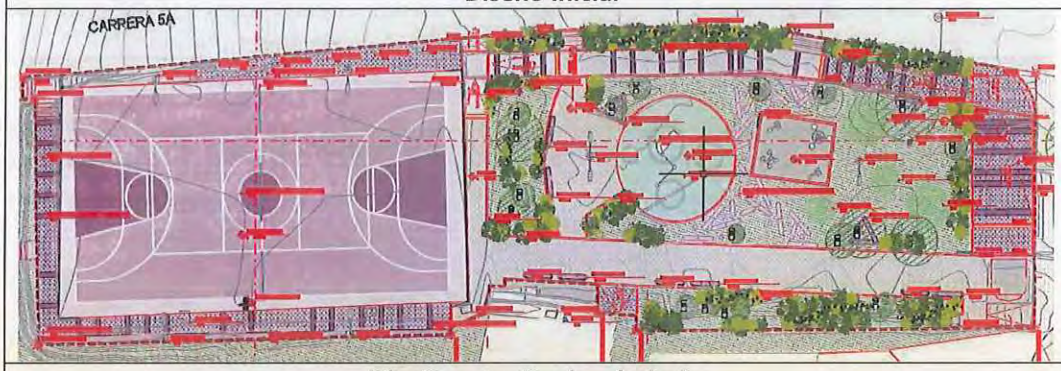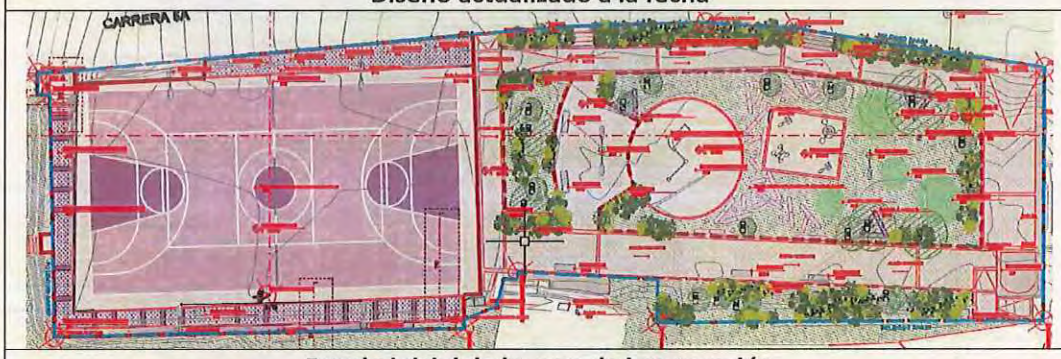PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA
Diseño inicial

Diseño actualizado a la fecha

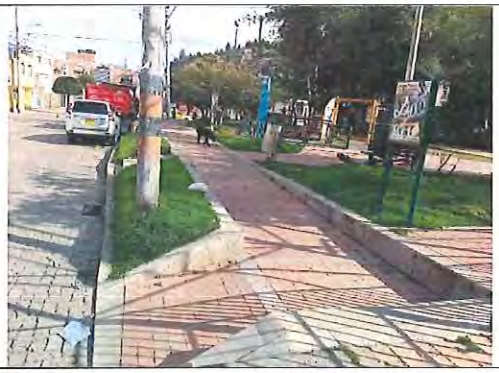Estado inicial de la zona de intervención







Las modificaciones principalmente evidenciadas corresponden a la definicion de nuevo alcance debido a la priorizacion de actividades por ejecutar.

PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE

Diseño inicial

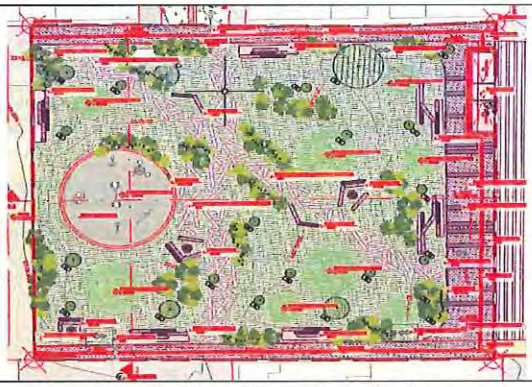

Diseño actualizado a la fecha

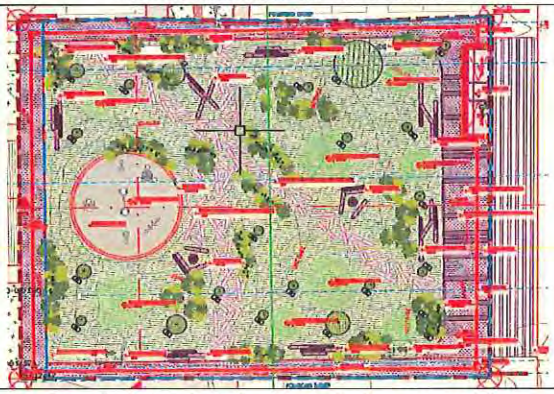

Estado inicial de la zona de intervención







Las modificaciones principalmente evidenciadas corresponden a cambios en el mobiliario propuesto y la inclucion para intervencion del anden frente al salon comunal.

PARQUE URBANIZACIÓN LA CAMELIA

Diseño inicial

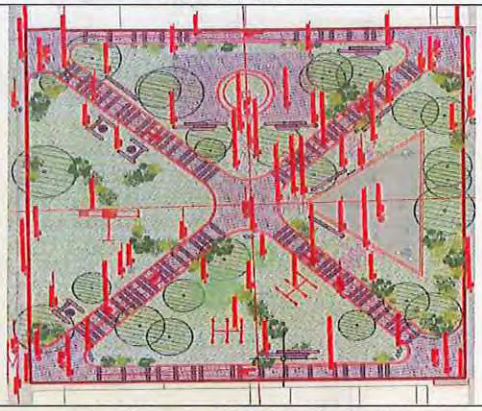

Diseño actualizado a la fecha

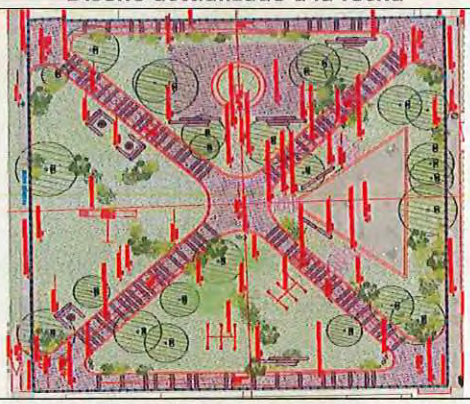

Estado inicial de la zona de intervención






Las modificaciones principalmente evidenciadas corresponden a cambios en el mobiliario propuesto.

PARQUE PATIO BONITO II SECTOR D

Diseño inicial

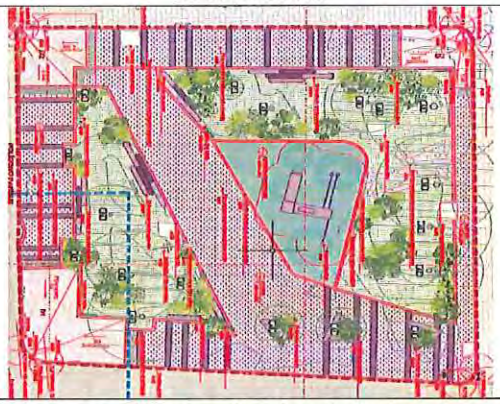

Diseño actualizado a la fecha





Estado inicial de la zona de intervención





Las modificaciones principalmente evidenciadas corresponden a cambios en el mobiliario propuesto y al material a utilizar para la conformacion de los senderos peatonales.

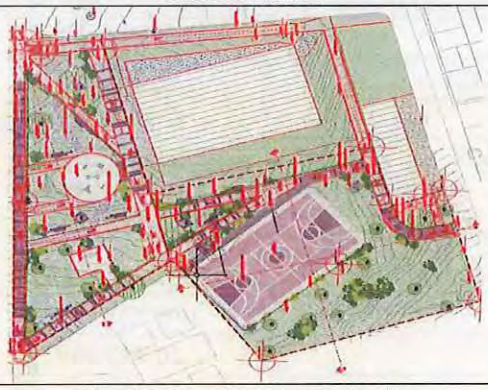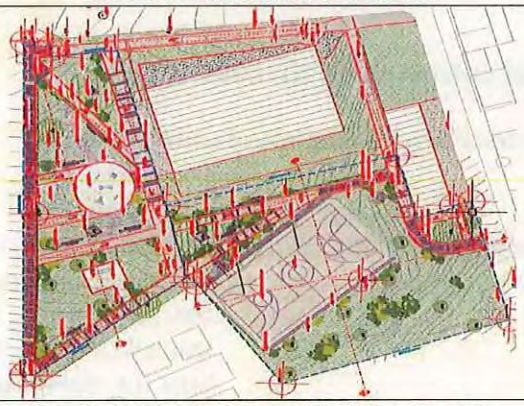PARQUE CHUNIZA I
Diseño inicial

Diseño actualizado a la fecha

Estado inicial de la zona de intervención





Las modificaciones principalmente evidenciadas corresponden a la definicion de nuevo alcance debido a la priorizacion de actividades por ejecutar.

3.6. Personal del contratista de obra

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1	NIDIA PABON	52.884.074	DIRECTORA
2	GUSTAVO PALACIOS	19.055.241	RESIDENTE
3	PAOLA LEON	53.026.061	SOCIAL
4	MILENA MONRROY	53.114.837	PROFESIONAL SST
5	CARLOS BOTON	80.724.186	PROFESIONAL EN GEOTECNIA
6	SANDRA VIVIANA SANTA MARIA	53.117.481	INGENIERA AMBIENTAL
7	JONATHAN CIFUENTES	1.014.261.904	INSPECTOR DE OBRA
8	DIEGO CORTES	1.022.355.450	TOPOGRAFO
9	NUBIA HORTUA	20.485.497	APOYO

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Aspectos contractuales del Contrato de Interventoría

No. de contrato	1160 DE 2023
Contratista de Interventoría	SOLIUN SAS
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS

	PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
Periodo de apropiación de los diseños	QUINCE (15) DÍAS
Periodo de ejecución de obra	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo de liquidación	QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Valor etapa de obra	$ 291.788.204,00
Valor total del contrato	$ 291.788.204,00
Fecha Inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación contrato:	04 de mayo de 2024

4.2. Aspectos legales y revisión de pólizas

Se revisa el estado actual de las pólizas del contrato de interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

CUADRO DE INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 11-44-101213783			
DESCRIPCIÓN EL AMPARO	VIGENCIA	PROGRAMA APROBADO	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-12-2023	05-01-2025	$58,375,640.80
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-12-2023	06-07-2027	$29,178,820.40
CALIDAD DEL SERVICIO	06-07-2024	06-07-2029	$58,357,640.80

PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.11-40-101058015			
DESCRIPCIÓN EL AMPARO	VIGENCIA	PROGRAMA APROBADO	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20-12-2023	06-07-2024	$232,000,000.00

Durante el trascurso del presente informe, el Contrato de Interventoría, no presentan ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual, tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prorroga).

Se anexa copia de las garantías aprobadas a la fecha por la entidad mediante plataforma Secop 2, en el **(ANEXO 01).**

4.3. ASPECTOS FINANCIEROS

CONTRATO No.:	1160 DE 2023	
PLAZO INICIAL:	4,5 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de diciembre de 2023	
****FECHA DE SUSPENSIÓN:**		
****FECHA DE REINICIACIÓN:**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 de mayo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:		
PLAZO TRANSCURRIDO:	71	52%
VALOR INICIAL :	$291.788.204,00	
VALOR ADICION 1:	$0	
VALOR ACTUALIZADO:	$291.788.204,00	
VALOR PAGADO:	$0	
VALOR POR PAGAR:	$291.788.204,00	

4.4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.4.1. Actividades desarrolladas por la Interventoría

- Asistencia a comités, reuniones y mesas de trabajo con asistencia de las partes involucradas con el fin de tratar temas de importancia correspondientes al buen desarrollo de los contratos y obras a ejecutar. Se relacionan las actas suscritas en el transcurso del periodo correspondiente al presente informe, las cuales se adjuntan en el (ANEXO 03).

ACTAS DE REUNION		
Numero	**Tema principal**	**Fecha**
1	Comité de seguimiento No. 03. Revisión estado del contrato	06/02/2024
2	Comité de seguimiento No. 04. Revisión estado del contrato	13/02/2024
3	Comité de seguimiento No. 05. Revisión estado del contrato	20/02/2024
4	Comité de seguimiento No. 06. Revisión estado del contrato	26/02/2024

- Revisión de la documentación concerniente a los estudios y diseños presentada por el consultor, documentos presentados posteriormente a las observaciones realizadas sobre los documentos iniciales.

- Se hace entrega de los informes mensuales por parte de cada uno de los componentes y con los ajustes solicitados por los profesionales de la SDHT.

- Se realiza revisión del documento del plan de gestión del riesgo del cual se emiten observaciones, posteriormente se revisa documento subsanado y se emite aprobación.

- Se realiza revisión del documento del plan de trabajo del cual se emiten observaciones, posteriormente se revisa documento subsanado y se emite aprobación.

- Se recibe documento con programación de obra por territorio al cual se le emiten observaciones, el documento se encuentra pendiente por subsanar.

- Se realiza revisión de los presupuestos presentados por el contratista, los cuales conllevan modificaciones de acuerdo a la priorización de actividades y cambios presentados durante el desarrollo del contrato.

- Asistencia a reunión de participación ciudadana para inicio de actividades de obra en los territorios.

- Acompañamiento en el levantamiento y diligenciamiento de las actas de vecindad de los predios que colindan con las zonas de intervención, de igual manera se registra el estado inicial del espacio público y vías.

- Se realiza revisión del documento de la matriz de inspección y ensayos del cual se emiten observaciones, posteriormente se revisa documento subsanado y se emite aprobación.

- Se realizan recorridos de obra en cada uno de los territorios por parte de los profesionales afín a cada componente, donde se realiza revisión del cumplimiento a lo pactado en los documentos técnicos, planos y diseños propios para la ejecución de las obras. Las recomendaciones, solicitudes y comentarios de los aspectos de obra se han registrado en bitácora e informado mediante oficio.

- Se da respuesta a comunicados y solicitudes emitidas por el contratista de obra y entidad contratante.

- Se realiza acompañamiento desde cada uno de los componentes al contratista en la gestión de trámites y revisión de documentación requerida en el desarrollo del contrato.

- Seguimiento y control de presupuesto y programación

- Se realizan informes semanales con el estado del proyecto y contratos de obra e interventoría asociados con información de cada uno de los componentes técnico, ambiental, social, SST. Estos informes son entregados a la SDHT. Se relacionan los informes entregados en el transcurso del periodo correspondiente al presente informe, los cuales se remiten en el (ANEXO 4).

RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 4	Del 29 de enero al 04 de febrero del 2024
Informe semanal No. 5	Del 05 al 11 de febrero del 2024
Informe semanal No. 6	Del 12 al 18 de febrero del 2024
Informe semanal No. 7	Del 19 al 25 de febrero del 2024

4.5. Personal de la interventoría

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	EDNA CONSTANZA CEPEDA	51870499	Directora
2	LUIS ALBERTO MEDRANO	19.331.658	Residente
3	MARIA DEL ROSARIO CARDENAS	35.478.754	Social
4	YINETH CRUZ	28.797.551	Profesional SST
5	SINDY NATALI ESPINOSA	1.024.481.967	Ingeniera Ambiental
6	NATALIA RAMIREZ	1.057.412.941	Apoyo Ambiental
7	JOAN SEBASTIAN RUEDA	1.098.730.430	Apoyo Técnico
8	JEISON DELGADO	1.018.459.148	Presupuesto y Programación
9	CLAUDIA VERGEL	51.857.351	Hidráulico
10	CAMILO ROMERO	79746.462	Geotecnia

5. CONTROL DE CALIDAD

Dado a que a la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra, esta interventoría ha realizado seguimiento a las actividades preliminares así:

5.1. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

El contratista para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Inspección y ensayo aprobado, debió presentar en este periodo las caracterizaciones de los materiales granulares provenientes de

cantera, a la fecha no se ha surtido la entrega de esta información completa, dando aprobación a los materiales provenientes de Reciclados Industriales quedando pendiente la caracterización de los materiales provenientes de la cantera Fanny Tequia, aclarando que si se llegare a presentar la necesidad de realizar ingreso a obra de materiales de otras canteras, estas deben cumplir con la aprobación de documentación ambiental y caracterizaciones de materiales que evidencien el cumplimiento de especificaciones.

Anexamos plan de inspección y ensayo aprobado por interventoría con las caracterizaciones iniciales aprobadas **anexo 5.**

5.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

5.2.1. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – INTERVENTORÍA

Desde inicio de la etapa de obra, esta interventoría cuanta con la disponibilidad de los equipos de topografía requeridos, se presentan los certificados de verificación vigentes incluidos en el **anexo 6.**

EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA VERIFICACIÓN
NIVEL AUTOMÁTICO	GANCE	1154266	DSZ3-32X	29-02-2024

Equipos de topografía Interventoría

Para el seguimiento de los materiales se realizarán contramuestras de los mismos, para esto contamos con la contratación de los servicios de laboratorio de **PSI Ingeniería y Laboratorio**, el cual es un laboratorio que cuenta con la acreditación de sus métodos de ensayos y calibración de sus equipos, incluimos el certificado de acreditación vigente ante ONAC en el **anexo 7.**

5.2.2. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO – CONTRATISTA

Se realizó la entrega de las certificaciones de verificación vigentes de los equipos de topografía a usar en el proyecto por parte del contratista, información que se describe en la siguiente tabla:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	N° CERTIFICADO
Estación total	CYGNUS	KS 102	HV2307	21-02-2024	11300

Equipos de topografía contratista

El contratista presenta el certificado vigente de los equipos de topografía lo cual incluimos en el **anexo 8**, los equipos del laboratorio contratado corresponden SUSECON LAB y LAB AIC SAS, lo cual incluimos en el **anexo 9.**

6. CORRESPONDENCIA CRUZADA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe en el (ANEXO 10) se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez ajustados los pormenores presentados durante el periodo correspondiente al presente informe, se insta al contratista a realizar con prontitud las actividades que preceden el inicio de las obras y el inicio de las mismas con el fin de dar cumplimiento a la programación vigente y los tiempos estipulados para la ejecución del contrato.

- Según el análisis realizado a la documentación para la ejecución de las obras, se evidencia que para lograr el adecuado desarrollo de las actividades con el alcance previsto se deben implementar actividades complementarias.

- Se recomienda que las actividades a ejecutar estén estructuradas desde los APU según las recomendaciones realizadas por los especialistas dentro de los informes.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

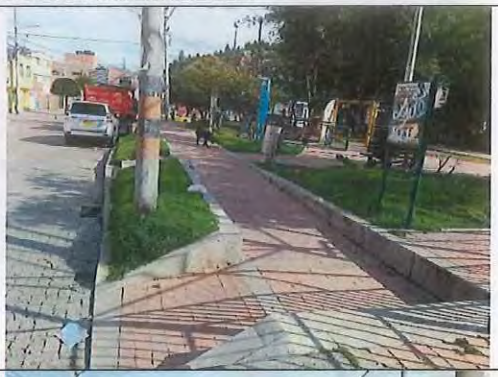PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA	
	
	
Estado inicial del parque	

PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE	
	





Actividades de obra realizadas

PARQUE URBANIZACIÓN LA CAMELIA









Actividades de obra realizadas

SOLIUN SAS	INFORME MENSUAL No.2 – COMPONENTE TÉCNICO		
	Fecha de emisión: 05/03/2024	PERIODO ENTRE EL 01 DE FEBRERO Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024	1
	Versión: 1		

PARQUE PATIO BONITO II SECTOR D









Actividades de obra realizadas

PARQUE CHUNIZA I









Estado inicial del parque

ANEXO 1. PÓLIZAS CONTRACTUALES OBRA E INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

ASEGURADOS: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO ARQING HABITAT NIT. 901.550.418-2.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101200075.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****290,794.00	$ *******3,000.00	$ ******55,820.00	$ **********349,615.00	$ ******348,000,000.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	07/12/2023	07/04/2024	$348,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2	
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia exito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****290,794.00	$ *******3,000.00	$ ******55,820.00	$ **********349,615.00	$ ******348,000,000.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002114944758(3900)000000349615(96)20241206

REFERENCIA PAGO:
1100211494475-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/12/2023	07/10/2024	$505,792,065.80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/12/2023	07/10/2024	$758,688,098.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/12/2023	07/04/2027	$252,896,032.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	07/04/2024	07/04/2027	$505,792,065.80

ACLARACIONES

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,834,428.00	$ ******20,000.00	$ ***1,302,341.00	$ *********8,156,770.00	$ ****2,023,168,263.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,834,428.00	$ ******20,000.00	$ ***1,302,341.00	$ *********8,156,770.00	$ ****2,023,168,263.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002114943221(3900)000008156770(96)20241206

REFERENCIA PAGO: 1100211494322-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANDRESMEJIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101200075, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2023

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

ASEGURADOS: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO ARQING HABITAT NIT. 901.550.418-2.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101200075.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DICIEMBRE 20 DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(290,794.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(55,820.00)	$ *********(349,615.00)	$ ****(348,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ARQING HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DICIEMBRE 20 DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANIAS.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(6,834,428.00)	$ ****(20,000.00)	$ *(1,302,341.00)	$ *******(8,156,770.00)	$ **(2,023,168,263.20)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	07	12	2023	00:00	07	04	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	20	12	2023	00:00	20	04	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

ASEGURADOS: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9 Y EL CONSORCIO ARQING HABITAT NIT. 901.550.418-2.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT. 899.999.061-9.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101200075.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DICIEMBRE 20 DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****290,794.00	$ *******3,000.00	$ ******55,820.00	$ **********349,615.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	20	12	2023	00:00	20	04	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2,000.00 SM	20/12/2023	20/04/2024	$348,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101061334	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	20	12	2023	00:00	20	04	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101061334

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	20	12	2023	00:00	20	04	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARQING HABITAT	NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, REFERENTE A CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	20/10/2024	$505,792,065.80	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/12/2023	20/10/2024	$758,688,098.70	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2023	20/04/2027	$252,896,032.90	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/04/2024	20/04/2027	$505,792,065.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA DICIEMBRE 20 DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,834,428.00	$ ******20,000.00	$ ***1,302,341.00	$ *********8,156,770.00	$ ****2,023,168,263.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200075	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2023	20	12	2023	00:00	20	04	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARQING HABITAT		NIT: 901.550.418-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OFC. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 52 NRO. 13 - 64		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200075

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101213783	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	06	12	2023	00:00	22	06	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 71 D NRO. 12 C - 60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2023	22/12/2024	$58,357,640.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2023	22/06/2027	$29,178,820.40
CALIDAD DEL SERVICIO	22/06/2024	22/06/2029	$58,357,640.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,004,231.00	$ ******20,000.00	$ *****194,603.00	$ *********1,218,834.00	$ ******145,894,102.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213783, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2023

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101058015	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	06	12	2023	00:00	22	06	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0	CR 71 D NRO. 12 C - 60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TERCEROS AFECTADOS	NIT: 0-0	.	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	.

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

.

NOTA 1. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y SOLIUN S.A.S IDENTIFICADO CON EL NIT 900.900.768.458-0 SON LOS ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

NOTA 2. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y LOS TERCEROS AFECTADOS SON LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/12/2023**	**22/06/2024**	**$232,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****379,463.00	$ *******3,000.00	$ ******72,667.00	$ **********455,130.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101058015

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101213783	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	06	12	2023	00:00	22	06	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0	CR 71 D NRO. 12 C - 60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1160 DE 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,004,231.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(194,603.00)	$ *******(1,218,834.00)	$ ****(145,894,102.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101213783	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	06	12	2023	00:00	22	06	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOLIUN S.A.S.		NIT: 900.768.458-0	
DIRECCIÓN: CR 71 D NRO. 12 C - 60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213783, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de ENERO de 2024

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101058015	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	06	12	2023	00:00	22	06	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 71 D NRO. 12 C - 60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
TERCEROS AFECTADOS	NIT: 0-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
.	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	.

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

.

NOTA 1. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y SOLIUN S.A.S IDENTIFICADO CON EL NIT 900.900.768.458-0 SON LOS ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

NOTA 2. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y LOS TERCEROS AFECTADOS SON LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1160 DE 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(379,463.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(72,667.00)	$ *********(455,130.00)	$ ****(232,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101058015

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101058015	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	06	12	2023	00:00	22	06	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SOLIUN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.768.458-0
DIRECCIÓN: CR 71 D NRO. 12 C - 60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 0-0
DIRECCIÓN: .	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	.

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101058015

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101213783	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	20	12	2023	00:00	06	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0	CR 71 D NRO. 12 C - 60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/12/2023	05/01/2025	$58,357,640.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/12/2023	06/07/2027	$29,178,820.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	06/07/2024	06/07/2029	$58,357,640.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1160 DE 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,004,231.00	$ ******20,000.00	$ *****194,603.00	$ **********1,218,834.00	$ ******145,894,102.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101213783	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	20	12	2023	00:00	06	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOLIUN S.A.S.		NIT: 900.768.458-0	
DIRECCIÓN: CR 71 D NRO. 12 C - 60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213783, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de ENERO de 2024

11-44-101213783

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101058015	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	20	12	2023	00:00	06	07	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SOLIUN S.A.S.	NIT: 900.768.458-0	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6634548

DIRECCIÓN: CR 71 D NRO. 12 C - 60

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TERCEROS AFECTADOS	NIT: 0-0	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	.

DIRECCIÓN: .

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1160-2023 CUYO OBJETO ES EL REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.

.

NOTA 1. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y SOLIUN S.A.S IDENTIFICADO CON EL NIT 900.900.768.458-0 SON LOS ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

NOTA 2. POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA SE ACLARA QUE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.061-9 Y LOS TERCEROS AFECTADOS SON LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/12/2023**	**06/07/2024**	**$232,000,000.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1160 DE 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****379,463.00	$ *******3,000.00	$ ******72,667.00	$ **********455,130.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101058015

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101058015	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	01	2024	20	12	2023	00:00	06	07	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOLIUN S.A.S.			NIT: 900.768.458-0
DIRECCIÓN: CR 71 D NRO. 12 C - 60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6634548

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
TERCEROS AFECTADOS			NIT: 0-0
DIRECCIÓN: .	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	.

BENEFICIARIO: 0 - TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101058015

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. 855 DE 2023
HABITAT – ACUPUNTURA URBANA

INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2024

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 1164 de 2023 desarrolladas durante el 01 al 31 de enero 2024 se describen a continuación:

1. CONTROL DEL ANTICIPO.

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, al saldo equivalente de cada uno de estos, el valor aprobado total.

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
Pago de mano de obra no calificada del proyecto	$ 197,258,905.00	26.00%	$ -	0.00%	$ 197,258,905.00	100.00%
Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 37,934,405.00	5.00%	$ -	0.00%	$ 37,934,405.00	100.00%
Transporte de equipos o de materiales	$ 68,281,929.00	9.00%	$ -	0.00%	$ 68,281,929.00	100.00%
Compra de materiales y accesorios	$ 455,212,859.00	60.00%	$ 45,654,578.00	10.03%	$ 409,558,281.00	89.97%
TOTAL	**$ 758,688,098.00**	**100%**	**$ 45,654,578.00**	**6.02%**	**$ 713,033,520.00**	**93.98%**

2. INFORME DE INVERSIÓN BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

Debido a que no se ha aprobado ninguna orden de operación a la fecha, se informa que no se ha hecho el uso de los recursos destinados para dichos fines.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ANTICIPO							
FLUJO DE INVERSION A CORTE:		Mes 1.0	SEGUIMIENTO A LA INVERSION				
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	($) CORTE FLUJO DE INVERSION	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) TOTAL APROBADO EN EL PERIODO	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1.1	Pago de mano de obra no calificada del proyecto	$ 78,903,562	$ -	$ -	$ 197,258,905	0.00%	No supero los rubros estipulados en el plan de inversión del anticipo aprobado
1.2	Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 15,173,762	$ -	$ -	$ 409,558,281	0.00%	Supero los rubros estipulados en el plan de inversión del anticipo
1.3	Transporte de equipos o de materiales	$ 27,312,772	$ -	$ -	$ 27,312,772	0.00%	Supero los rubros estipulados en el plan de inversión del anticipo
1.4	Compra de materiales y accesorios	$ 273,127,715	$ -	$ 45,654,578	$ 227,473,137	16.72%	Supero los rubros estipulados en el plan de inversión del anticipo
	TOTALES:	$ 394,517,811	$ -	$ 45,654,578	$ 861,603,095	11.57%	

3. ORDENES DE OPERACIÓN.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM
4	Compra de materiales y accesorios	$ 455,212,859.00	60.00%

No. ORDEN	VALOR	PORCENTAJE	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COBRO ENTIDAD BENEFICIARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
1	$ 14,894,835.00	3.27%	TRANSITO Y OBRAS SAS	58900001099	CAH1164-2023-070 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-084 el 26/02/2024
2	$ 21,123,780.00	4.64%	MIRIAM YANED FRANCO ZEA	62422807778	CAH1164-2023 072 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-092 el 01/03/2024

2	$ 9,635,963.00	2.12%	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	13321960531	CAH1164-2023 072 el 20/02/2024	SDHT-1160-2024-092 el 01/03/2024

SUBTOTAL	**$ 45,654,578.00**
SALDO	**$ 409,558,281.00**

El contratista desde el 01 al 29 de febrero tramita ante la interventoría (4) orden de operación de las cuales; dos se aprobaron y dos se encuentran en revisión.

4. REPROGRAMACION DEL FLUJO DE INVERSION.

No se tramitan reprogramaciones para el mes de febrero

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Mediante el oficio SDHT-1160-2024-083 se le solicito a la entidad generar recibo de pago de rendimientos financieros del mes de enero 2024 valor de $ 217,686.15.

Seguido de ello, la entidad solicito que los rendimientos financieros que se generen en su totalidad a la liquidación de la fiducia, y con el cierre de la misma se remita a la entidad el valor total para generar un solo recibo con código de barras para el pago

ORDEN N° 01

Bogotá, 05 de Febrero de 2024

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO CARLOS MAURICIO BOTON GÓMEZ Identificado con C.C. No. 80.724.186 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden No. 1 acorde con los siguientes datos:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.523.492-3	TRANSITO Y OBRAS SAS	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	FEV 3	$ 14.894.835	58900001099	AHORROS	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

CARLOS MAURICIO BOTON GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO ARQING HÁBITAT

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	318830-CONSORCIO ARQING HABITAT III				Cod. Negocio:	318830	Consecutivo Orden de Desembolso: 1
Fecha	02/02/2024	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 14.894.835,00	Periodo Contable (2024-01)	
				Patrimonio Autónomo	☑		

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.523.492-3	TRANSITO Y OBRAS SAS	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	FEV 3	$ 14.894.835	58900001099	AHORROS	BANCOLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. 1164 de 2023 celebrado entre 21/12/2023 y el 20/04/2024.
Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 05 de Febrero de 2024

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO CARLOS MAURICIO BOTÓN GÓMEZ Identificado con C.C. No. 80.724.186 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 1.

Cordialmente,

CARLOS MAURICIO BOTON GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO ARQING HÁBITAT

TRANSITO Y OBRAS SAS

TRANSIOBRAS S.A.S

TRANSITO Y OBRAS SAS

Nit 901523492

Factura Electrónica De Venta No

No. 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7660.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ARQING HABITAT
NIT	901550418 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 15ª # 124 – 60 OF 102	Bogota D.C.	6013106560

POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE SEÑALIZACION PARA PMTS DEL CONTRATO 1164 DE 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/02/2024	17/02/2024	TRANSITO Y OBRAS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS A 50M	11	Und.	285.050	19%	54.160	3.135.550
2	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	10	Und.	260.001	19%	49.400	2.600.010
3	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-24 - SENDERO PEATONAL	24	Und.	275.001	19%	52.250	6.600.024
4	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-24 - TRANSITE POR LA ACERA DEL FRENTE	2	Und.	286.000	19%	54.340	572.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**12.907.584**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.452.441**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.360.025**
RETEFUENTE	**322.690**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**142.500**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.894.835**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nota:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2024 10:00:36

CALLE 49 No. 71 17 Teléfono 3202906569 Bogota D.C.

Correo Electrónico Dpto.contabilidad@transiobras.com

302

Bogotá, 05 de febrero de 2024

Señores
Ciudad.

YO HILDA LEONO R VELANDIA MUÑOZ Identificada con C.C. No. 20.652.191 expedida en la ciudad de Guatavita (Cund), en mi condición de contador Público del CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que las retenciones relacionadas a continuación son las correctas para la FACTURA FE438.

TRANSIOBRAS

VALOR BASICO	$	12.907.584
IVA	$	2.452.441
VALOR TOTAL A FACTURAR	$	15.360.025
2,5000%	$	322.690
11,04/1000	$	142.500
VALOR TOTAL	$	14.894.836

Cordialmente

HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador Publico
CONSORCIO ARQING HABITAT

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSORCIO ARQING HÁBITAT Y TRANSITO Y OBRAS SAS

TIPO DE ORDEN/CONTRATO	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO No. 001-2024
FECHA	1 de febrero de 2024
CONTRATANTE	CONSORCIO ARQING HÁBITAT
NIT	901.550.418-2
CONTRATISTA	TRANSITO Y OBRAS SAS
C.C Y NIT	901.523.492-3
DIRECCION	CALLE 49 # 71-17
TELEFONO	3202906569
OBJETO	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN PARA PMTS DEL CONTRATO 1164 DE 2023 "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS A 50M	11	UND
2	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-01 - ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	10	UND
3	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-24 - SENDERO PEATONAL	24	UND
4	SUMINISTRO DE SEÑAL SIO-24 - TRANSITE POR LA ACERA DEL FRENTE	2	UND

VALOR	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($15,360,025.00)
IMPUESTOS Y RETENCIONES	EL CONTRATANTE APLICARA LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR EN EL MOMENTO DEL PAGO SEGÚN LAS TARIFAS Y MONTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y DISTRITAL
FORMA DE PAGO	Un pago por la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($15,360,025.00), el cual se efectuará una vez se haya realizado el perfeccionamiento y legalización del contrato y se haya aprobado por parte del Contratante y su trámite cuenta con la Fiducia (los tiempos de desembolso del giro dependerán de los tiempos de revisión y aprobación por parte de la interventoría y de la fiducia).
OBLIGACIONES CONTRATISTA	LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA EL PROYECTO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO, CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO PRINCIPAL. PONER A DISPOSICIÓN LOS EQUIPOS Y EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE TRABAJO DE ACUERDO CON SU PROPUESTA. LOS TRABAJOS A ENTREGAR CONSISTE EN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LO ESPECIFICADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARTILLA DE ANDENES, DE MOBILIARIO DE IDRD, IDU Y PLANEACIÓN DISTRITAL. ASÍ MISMO ASISITIRÁ A LAS REUNIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.
GARANTIAS	NO APLICA
DURACION DEL CONTRATO	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DEL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO, ESTE CONTRATO PODRÁ PRORROGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE SEAN PACTADOS A CONVENIENCIA ENTRE LAS PARTES, MANIFESTADO POR ESCRITO CON UNA ANTELACIÓN DE 15 DÍAS A LA FECHA DE SU EXPIRACIÓN.
MULTAS	NO APLICA
VARIOS	ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA NO EXISTE VINCULO LABORAL ALGUNO POR LO TANTO EL PERSONAL QUE UTILICE EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, Y ENTRE AQUELLOS Y EL CONTRATANTE NO EXISTE VINCULO LABORAL. EL PERSONAL DE OBRA DEBE ESTAR AFILIADO A SALUD, PENSION, ARL Y CAJA DE COMPENSACION.
FIRMA DE CONTRATISTA	**TRANSITO Y OBRAS SAS** 901.523.492-3
FIRMA CONTRATANTE	**CONSORCIO ARQING HÁBITAT** **901.550.418-2**

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº 10008131348

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO K
HIERROS BOGOTA BOSA LEON XIII	9007468290/40	OC 01032024	10849742/000040	NTC 1985 - 1020	1.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
106000553	ANG NTC 1985 2''x1/4'' 6m	1726018501	GR 50

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
	0,21	0,78	0,006	0,029	0,14	0,23	0,09	0,11	0,02	0,007	0,001
Rangos de referencia según norma											

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
106000553	ANG NTC 1985 2''x1/4'' 6m	1726018501	NA

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento
	364	509	22,5
Rangos de referencia según norma	mín 345,0 MPa	mín 450,0 MPa	mín 18,00%

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

	Lado	Espesor	D.I. A
	50,87	6,24	0,25
	49,61 - 51,99 mm	6,10 - 6,80 mm	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 04.01.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

Powered by CamScanner

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
Transito y Obras S.A.S	Cra 70C 52-28	PV/1380259

AGOFER
DITH Group

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

C-C-01-D01
Versión 4
01/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	**No. INTERNO**	32,580	**REPORTE DE PRODUCTO**	RPT3097	**FECHA DE PRODUCCIÓN**	2023-05-12
N.I.T.	800.216.499-1	**PLANTA**	Yumbo	**N° ORDEN DE PRODUCCIÓN**	PO2237	**UNIDADES PRODUCIDAS**	741.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN		CR 39 12 A-15					

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Lámina Galvanizada C/16 (1.45mm) 1.00m x 2.00m												
N°	**CALIDAD**	**N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA**	**PROPIEDADES QUÍMICAS (%)**										**RECUBRIMIENTO DE ZINC**	**PROPIEDADES MECÁNICAS**		
			C	**Si**	**Mn**	**P**	**S**	**Al**	**Cu**	**Ni**	**Cr**	**Mo**		**Fluencia (F/Y)**	**Tracción (F/T)**	**Elongación (%)**
1	ASTM A653	K3000730500	0.0450	0.0010	0.2400	0.0210	0.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Si	280.0	380.0	38.0

* Las cubiertas se fabrican bajo los parámetros de la NTC 4015.
* Las láminas se enderezan bajo los parámetros de las NTC 6 y 7.
* Las láminas colaborantes se fabrican bajo los parámetros de la NTC 5805.
* La perfilería se fabrica bajo los parámetros de la NTC 5685.
* Las tubería se fabrican bajo los parametros de las NTC 1560 (para tuberia cerramiento), NTC 1986 (para tuberia mecánica) y NTC 4526 (para tuberia estructural).

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	**Doblado**	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	**Espesor**	Conforme	**Radios**	NA
Dimensiones	Conforme	**Longitud**	Conforme	**Rectitud**	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **23/05/2023**

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN
HIERROS BOGOTA BOSA LEON XIII	9007468290/10	OC 01032024	10849742/000010	NTC 1985 - 1020

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415										
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V
106000504	ANG NTC 1985 1 1/2"x3/16" 6m	1726052601	GR 50	0,20	0,77	0,008	0,025	0,18	0,28	0,12	0,14	0,03	0,007	0,002
Rangos de referencia según norma														

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento				Lado	Espesor	Dif_A		
106000504	ANG NTC 1985 1 1/2"x3/16" 6m	1726052601	NA	363	508	22,4				38,59	4,74	0,16		
Rangos de referencia según norma				mín 345,0 MPa	mín 450,0 MPa	mín 18,00%				36,91 - 39,29 mm	4,51 - 5,02 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 04.01.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948767856

(415)7707212489984(8020) 000001494876785 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 3 4 9 2	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRANSITO Y OBRAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TRANSIOBRAS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 49 71 17

42. Correo electrónico gerencia.transiobras@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 9 0 6 5 6 9	3 1 8 2 2 8 5 9 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 9 1 4	4 2 1 0	2 0 2 1 0 9 1 4	7 1 1 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4 2	4 8	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 19 / 13 : 02: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARO DURAN DAYRON FABIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948767856

(415)7707212489984(8020) 000001494876785 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 3 4 9 2	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 9 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 3 2 4 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 9 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 9 2 2		-
2	8 0	2 0 2 1 0 9 2 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948767856

(415)7707212489984(8020) 000001494876785 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 2 3 4 9 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 6 9 5 5 4 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	DURAN	DAYRON	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 9 6 0 2 9 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REYES	SANCHEZ	LINA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

326

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TRANSITO Y OBRAS SAS
Sigla: TRANSIOBRAS SAS
Nit: 901.523.492-3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03432484
Fecha de matrícula: 22 de septiembre de 2021
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 2 de junio de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 74 B No. 49 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia.transiobras@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3202906569
Teléfono comercial 2: 3182285970
Teléfono comercial 3: 6636194

Dirección para notificación judicial: Cr 74 B No. 49 A 31
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia.transiobra@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3202906569
Teléfono para notificación 2: 3182285970
Teléfono para notificación 3: 6636194

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 21 de septiembre de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2021, con el No. 02746069 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada TRANSITO Y OBRAS SAS. Sigla(s): TRANSIOBRAS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

1. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones. 2. La prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 3. La realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 4. La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de. la edificación. 5. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales. 6. La promoción, constitución y asociación de empresas o sociedades que tengan por objeto la construcción de inmuebles o los negocios sobre propiedad raíz. 7. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, estando facultada la sociedad para reservar para sí, o para los accionistas las áreas que a bien tengan para arrendamiento o explotación comercial. 8. La ejecución de toda clase de negocios, además de la compraventa, relacionados con la comercialización de la propiedad raíz tales como: financiamiento,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

arrendamiento, fideicomiso, administración, usufructo, constitución y régimen de propiedad horizontal, etc. 9. La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado y en general, todo lo relacionado con servicios públicos. 10. Los montajes electromecánicos de centrales de generación de energía, hidráulica, térmica, a gas, etc. 11. Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo. 12. Los montajes electromecánicos para plantas o instalaciones industriales, comerciales o de infraestructura. 13. La construcción de obras e infraestructura para el sector del petróleo incluyendo la construcción de oleoductos, poliductos, gasoductos, plataformas para pozos, estación de bombeo, etc. 14. La construcción de estructuras para edificios, puentes e infraestructura en general en concreto o metálicas. 15. La enajenación de materiales de construcción nuevos y de sobrantes de obra. 16. La participación en sociedades civiles o comerciales, cuentas en participación y otras asociaciones, aun cuando su objeto social no tenga relación con el que aparece descrito en esta cláusula. 17. La adquisición a título oneroso de equipos, maquinaria, instalaciones, accesorios e implementos auxiliares empleados en la construcción de obras y edificios, con el propósito de usarlos en las obras que ejecute pudiendo también arrendarlos o celebrar con ellos cualquier tipo de transacción. 18. La sociedad podrá prestar servicios públicos domiciliarios, de tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC- y actividades complementarias o inherentes a los mismos, así como ser socio de empresas de servicios públicos privadas o mixtas y/o participar en cualquier tipo de asociación como uniones temporales o consorcios y en general asociarse con terceros para la creación o no de personas jurídicas nuevas o para participar en las ya existentes que tengan por objeto la prestación de los servicios o actividades enunciadas, incluida la participación en promesas de sociedades futuras. 19. La compra, construcción, administración y operación de activos inmobiliarios, tales como hoteles, mini depósitos, centros comerciales, centros de distribución, tiendas de conveniencia, oficinas y almacenes, así como la realización de cualquier otro acto jurídico relacionado con dichos activos inmobiliarios. 20. La enajenación a cualquier título de valores muebles, tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio social. 21. La adquisición, producción, transformación, distribución y, en general,

el comercio de materiales, accesorios, herramientas e implementos de naturaleza diversa empleados en la industria de la construcción. 22. Cualquier tipo de transacción comercial nacional o internacional. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: Adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía toda clase de bienes raíces, muebles, equipos e implementos para la ejecución de obras y construcciones para respaldar obligaciones propias o de terceros y celebrar contratos en virtud de los cuales la sociedad tome a su cargo, directamente o por conducto de contratistas, la planeación o ejecución de estudios de factibilidad, de mercadeo y de actividades accesorias a la construcción de obras de urbanización, parcelación en áreas urbanas, suburbanas o rurales; la administración y venta de lotes, parcelas y edificaciones; la asociación con terceros para el desarrollo y ejecución de programas de urbanización, parcelación o construcción; establecer talleres para la reparación, sostenimiento y construcción de equipos; producir materiales destinados a obras o construcciones, y explotar canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de materiales para construcción con destino a sus obras o a la venta de los mismos; contratar la ejecución de obras o trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de contratación; asociarse con terceros para la ejecución de obras o para la realización de proyectos específicos, bien sea bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales o cualquier otro tipo de asociación o participación; subcontratar obras o parte de ellas; hacer inversiones de fomento y desarrollo para el aprovechamiento de incentivos de carácter fiscal autorizados por la ley o transitoriamente como utilización fructífera de fondos o recursos no necesarios de inmediato para el desarrollo de los negocios sociales; celebrar operaciones de crédito por activa o por pasiva con toda clase de personas u otorgar garantías, emitir bonos, tomar dinero en mutuo o dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos para el desarrollo de la empresa, comprar para revender, licitar, constituir sociedades filiales o promoverlas, formar u organizar sociedades o vincularse a otras sociedades o empresas o en servicios, absorberlas y fusionarse con ellas. En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persigue la sociedad o que puedan favorecer o desarrollar sus negocios o que en forma directa se relacionen con el objeto social, así como todos aquellos que estén orientados, a cumplir las obligaciones o a ejercer los derechos que legal o convencionalmente

se deriven de la existencia y actividad de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración inmediata de la sociedad, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estará a cargo de un presidente designado por la Junta Directiva. El presidente de la sociedad tendrá un (1) suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El presidente es un mandatario con representación investido de funciones ejecutivas y administrativas, y como tal tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión operativa, económica y financiera, la responsabilidad de la gestión administrativa, la coordinación y la supervisión general de la sociedad, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y con sujeción a las disposiciones legales y a las órdenes e instrucciones de la junta directiva. Corresponde al presidente

además de las funciones generales antes indicadas: A. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. B. Convocar a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva de acuerdo con lo previsto en estos estatutos. C. Elaborar un informe escrito de gestión con el contenido de que da cuenta la ley y los estatutos, informe que, conjuntamente con los estados financieros de propósito general individuales y consolidados y demás documentos exigidos por la ley, serán presentados, en asocio de la junta directiva, a la asamblea general de accionistas. D. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. E. Presentar a la junta directiva el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos. F. Dirigir y vigilar la actividad de la sociedad en todos los casos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella se propone. G. Crear los empleos que juzgue necesarios para el buen servicio de la sociedad y determinar sus funciones. A su vez nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción corresponda a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva y fijarles la correspondiente remuneración. H. No obstante el nombramiento lo realice el presidente, los candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de la sociedad deben ser conocidos y evaluados por el comité de nombramientos y remuneraciones de la junta directiva, quien deberá emitir su opinión. I. Celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la junta directiva o por la asamblea de accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carácter preparatorio, accesorio o complementario, para la realización de los fines que persigue la sociedad y las que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. J. Promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o policivas en que la sociedad tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley, desistir de los mismos, constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarle facultades, revocar mandatos y sustituciones. K. Transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, novar obligaciones y créditos y dar o recibir bienes en pago. L. En caso de existir el propósito de aumentar el capital autorizado o disminuir el suscrito, debe elaborar un informe sobre los motivos de dicha propuesta y dejarlo a disposición de los accionistas durante el término de la convocatoria. M. Cumplir las demás funciones que le corresponde según estos estatutos o la ley.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 21 de septiembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2021 con el No. 02746069 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Dayron Fabian Caro Duran	C.C. No. 000001056955474

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Presidente	Lina Maria Reyes Sanchez	C.C. No. 000001049602900

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 7111, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.004.040.622
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 20 de diciembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de junio de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de enero de 2024 Hora: 13:09:17
Recibo No. AA24070702
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24070702E08FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.955.474**

CARO DURAN

APELLIDOS

DAYRON FABIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1989**

VENTAQUEMADA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-NOV-2007 VENTAQUEMADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00732876-M-1056955474-20150813 0045795349A 1 1233524948

331

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062029001

(415)7707212489984(8020) 001876406202900 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 2 3 4 9 2	3				

11. Razón social
TRANSITO Y OBRAS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 49 71 17

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-12-15 / 04:15:26 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CARO DURAN DAYRON FABIAN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1056955474 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TRANSITO Y OBRAS SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-12-15/16:15:26

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062029001

(415)7707212489984(8020) 001876406202900 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901523492	3				

11. Razón social
TRANSITO Y OBRAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TRANSITO Y OBRAS SAS CL 49 71 17	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	414	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ORDEN N°002

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	318830-CONSORCIO ARQING HABITAT III				**Cod. Negocio:**	318830	**Consecutivo Orden de Desembolso** 2
Fecha	20/02/2024	**N° Desembolsos**	2	**Vr. Total Desembolsos**	$ 30.759.743,00	**Periodo Contable (2024-02)**	
				Patrimonio Autónomo	☑		

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
33.676.447	MIRIAM YANED FRANCO ZEA	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	1267	$ 21.123.780	62422807778	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA
860.075.208-7	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	180693	$ 9.635.963	13321960531	CTA CTE	BANCOLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. 1164 de 2023 celebrado entre 21/12/2023 y el 20/04/2024. Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 28 de Febrero de 2024

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO CARLOS MAURICIO BOTON GÓMEZ Identificado con C.C. No. 80.724.186 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden No. 2 acorde con los siguientes datos:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
33.676.447	MIRIAM YANED FRANCO ZEA	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	1267	$ 21.123.780	62422807778	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA
860.075.208-7	COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	Compra de materiales y accesorios	FRA PROFORMA	180693	$ 9.635.963	13321960531	CTA CTE	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

CARLOS MAURICIO BOTON GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO ARQING HÁBITAT

MIRIAM YANED FRANCO ZEA

PREFABRICADOS
NIT.: 33 676 447-1

Actividad econimica 2395
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores
REGISTRO IDU 457-2017
Somos responsables de ICA en Soacha

FACTURA PROFORMA No-1267

Soacha: 19 DE FEBRERO DE 2024

Cliente: CONSORCIO ARQING HABITAT — Nit: 901,550,418-2

Atn: — TEL 6013106560

Direccion: CR 15 A 124 60 OF 102 — Ciudad: Bogotá

Obra: Bogotá

ORDEN DE COMPRA No ARZ-466

REF:	DESCRIPCION	MEDIDAS	UND	CAN	V/UND	TOTAL
A-10	SARDINEL	20*50*80	UND	188	37.000	6.956.000
A-81	BORDILLO	15*35*80	UND	440	25.400	11.176.000

SUB-TOTAL	18.132.000
IVA	3.445.080
RETE 2,5%	453.300
RETE 1%	
TOTAL	**21.123.780**

Cuenta Corriente Davivienda No.108960000249
Cuenta Ahorros Bancolombia No. 624 2280 7778

CONDICIONES COMERCIALES:

Material Con Iva**.
Disponibilidad: Entregas parciales inmediatas.
Forma de pago: Anticipado.
El material sera entregado en obra Bogota, incluye descargue a borde de planchon.
Validez de la oferta comercial: 15 dias.
Somos responsables de ICA en Soacha.

Cordialmente,

Miriam Franco
TEL: 4768677 -315 6136471
Gerente Comercial

Cliente



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874985308

(415)7707212489984(8020) 000001487498530 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 6 7 6 4 4 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 6 7 6 4 4 7	1 9 9 5 0 8 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Garagoa 2 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FRANCO	ZEA	MIRIAM	YANED

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ARKA PREFABRICADOS	ARKA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal: KM 5 VDA FUSUNGA FCA LOS LLANOS

42. Correo electrónico: arkaprefabricados@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 7 6 8 6 7 7	3 1 5 6 1 3 6 4 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 1 6 0 4 0 4	4 9 2 3	2 0 1 6 0 4 0 1	6 8 1 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 0 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2022 - 11 - 03 / 15 : 12: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZAMBRANO MONTERO YISELLA
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-10-2023 02:57:36PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874985308

(415)7707212489984(8020) 000001487498530 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 3 6 7 6 4 4 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 4 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 6 7 2 1 1 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874985308

(415)7707212489984(8020) 000001487498530 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 6 7 6 4 4 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 2 2 9 4 1		2 9 3 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BUSTOS	SIERRA	DANIEL	WILSON

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874985308

(415)7707212489984(8020) 000001487498530 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 3 6 7 6 4 4 7	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 2 3 9 5	
162. Nombre del establecimiento: ARKA PREFABRICADOS		
163. Departamento: Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio: Soacha 7 5 4	
165. Dirección: KM 5 VDA FUSUNGA FCA LOS LLANOS		
166. Número de matrícula mercantil: 2 6 7 2 1 2 1	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 4 0 5	
168. Teléfono: 4 7 6 8 6 7 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MIRIAM YANED FRANCO ZEA
C.C. : 33.676.447
N.I.T. : 33676447-1 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02672117 DEL 5 DE ABRIL DE 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 65 SUR 77M - 04 TORRE 2 APTO 202
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : MIFRAZE@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : KM 5 VRD FUSANGA - FCA LOS LLANOS
MUNICIPIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL: MIFRAZE@HOTMAIL.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2023
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$10,000,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 2395 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO. 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 6810 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO

ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : ARKA PREFABRICADOS
DIRECCION COMERCIAL : KM 5 VRDA FUSUNGA FCA LOS LLANOS
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 02672121 DE 5 DE ABRIL DE 2016
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

****

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $120,000,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 2395

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.676.447

FRANCO ZEA

APELLIDOS

MIRIAM YANED

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1977

SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

27-AGO-1995 GARAGOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00110221-F-0033876447-20081024 0004756579A 1 28609647

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060765814

(415)7707212489984(8020) 001876406076581 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
33676447	1	FRANCO	ZEA	MIRIAM	YANED

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
KM 5 VDA FUSUNGA FCA LOS LLANOS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Soacha

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-11-28 / 11:31:49 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres FRANCO ZEA MIRIAM YANED
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 33676447 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización FRANCO ZEA MIRIAM YANED

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-11-28/11:31:49

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764060765814

(415)7707212489984(8020) 001876406076581 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 3 6 7 6 4 4 7	1	FRANCO	ZEA	MIRIAM	YANED

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ARKA PREFABRICADOS KM 5 VDA FUSUNGA FCA LOS LLANOS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEMY	2,001	4,000	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

340

Certificación
Bancaria

Martes, 23 de enero de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MIRIAM YANED FRANCO ZEA identificado(a) con CC 33676447, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	62422807778	2014-04-03	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bogotá, 20 de febrero de 2024

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Ciudad.

YO HILDA LEONO R VELANDIA MUÑOZ Identificada con C.C. No. 20.652.191 expedida en la ciudad de Guatavita (Cund), en mi condición de contador Público del CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que las retenciones relacionadas a continuación son las correctas para la FACTURA PROFORMA FE1267.

ARKA - 1267


VALOR BASICO	**$**	**18.132.000**
IVA	**$**	**3.445.080**
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$**	**21.577.080**
2,5000%	**$**	**453.300**
ICA EN SOACHA	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**21.123.780**

Cordialmente

HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador Publico
CONSORCIO ARQING HABITAT

Arka
PREFABRICADOS
NIT.: 33 676 447-1

A-10 SARDINEL

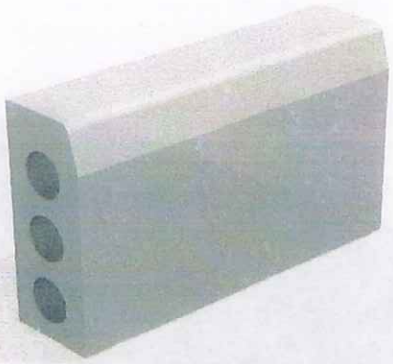

Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros respecto al nivel de la calzada vehicular, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4.

NORMA NTC: 4109

PESO APROX: 142 KG

DIMENSIONES NOMINALES

800*200*500mm

DIMENSIONES ESTANDAR

790*200*500mm

OFICINA: Calle 65 Sur No.77M-04 Torre 2 Of. 202 - Bosa Estación Tel.: 476 8677- Cel.: 318 879 8278
arkaprefabricados@outlook.com



Arka
PREFABRICADOS
NIT.: 33 676 447-1

A-81 BORDILLO



Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso, se instala sobre una capa de mortero de nivelación 1:4 con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:3

NORMA NTC: 4109

PESO APROX: 96.6 KG

DIMENSIONES NOMINALES

800*150*350mm

DIMENSIONES ESTANDAR

790*150*350mm



Arka
PREFABRICADOS
NIT.: 33 676 447-1

OFICINA: Calle 65 Sur No.77M-04 Torre 2 Of. 202 Bosa Estación - Bogotá Tel.: 476 8677 - Cel.: 318 879 8278
FABRICA: Km. 5 Vda. Fusunga Finca Los Llanos Soacha arkaprefabricados@outlook.com www.arkaprefabricados.com



Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

***COMPAÑÍA:** FRANCO ZEA MIRIAM YANED
***OBRA:** PLANTA ARKA PREFABRICADOS
***DIRIGIDO A:** MIRIAM YANED FRANCO ZEA
***DIRECCIÓN:** SOACHA

FECHA DE EMISIÓN: 2024-02-5
REFERENCIA: 9-22593
DIGITÓ: Aguevara
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 9-22593
PÁGINA 1 de 1



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
440808	3	No especificado	Concreto	Sardinel, bordillo, cañuela	2024-01-5	2024-01-31	2024-02-2	28	151	17908	24,5	688,3	391,9	38,4	156,9	5	
440808	3	No especificado	Concreto	Sardinel, bordillo, cañuela	2024-01-5	2024-01-31	2024-02-2	28	151	17908	24,5	693,5	394,9	38,7	158,1	5	
440808	3	No especificado	Concreto	Sardinel, bordillo, cañuela	2024-01-5	2024-01-31	2024-02-2	28	152	18146	24,5	699,2	392,9	38,5	157,3	5	

* La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Autorizado por:

DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO

CONSORCIO ARQING HÁBITAT

DIA	MES	AÑO
19	FEBRERO	2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 002 -2024 ANT
PEDIDO A: ARKA PREFABRICADOS
FACTURAR A NOMBRE DE: CONSORCIO ARQING HÁBITAT - CT 1164 DE 2023
NIT: 901.550.418-2
TELÉFONO: (601) 3106560 - 311-4489923

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A - 10 SARDINEL 20*50*80	188	UND	$ 37.000,00	$ 6.956.000
2	A - 81 BORDILLO 15*35*80	440	UND	$ 25.400,00	$ 11.176.000
3					$ -
4					$ -
5					$ -
				IVA	$ 3.445.080
				TOTAL	$ 21.577.080
				RETEFUENTE	$ 453.300
				TOTAL A PAGAR	$ 21.123.780

OBSERVACIONES:
Remitir cuenta de cobro y/o factura electrónica según aplique, resolución de facturación, a correo administrador@arqingco.com, acompañado del RUT actualizado y de la copia de la certificación bancaria para poder hacer giro.

PEDIDO POR:
Jully Torres

AUTORIZADO POR:
Ing. Nidia Pabón

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS

COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S
NIT 860.075.208-7
IVA RÉGIMEN COMÚN

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

LA SABANA®

SEÑORES:	CONSORCIO ARQING HABITAT	Fecha :	FEBRERO 12 / 2024
Attn:	ING NIDIA PABON		
Nit:	901.550.418	FACTURA PROFORMA : 180693	
Ciudad	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND. MEDIDA	VR. UNIT	VR. UNIT. CON DTO.	VR. TOTAL
0064964	GEOTEXTIL T250 / 2100 3.85X140M – CE	2490	M2	$ 3.252	$ 3.252	$ 8.097.448
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 8.097.448
					I.V.A. 19%	$ 1.538.515
					TOTAL	$ 9.635.963

CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PAGO : pago anticipado
TIEMPO DE ENTREGA : A CONVENIR

Empleado del departamento de ventas: VENDEDOR DIGITAL
CENTRO-BOGOTA 1

Página 1 / 1 Impreso por SAP Business One

Dirección CARRERA 24 10 38
BOGOTÁ
COLOMBIA

Autor ROJAS CRUZ, FLOR MARINA
Teléfono 2473740
Correo electrónico jefedecompras@orgcalypso.com

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S.
Sigla:	CALYPSO S.A.S.
Nit:	860.075.208-7
Domicilio principal:	Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00133457
Fecha de matrícula:	16 de abril de 1980
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	22 de marzo de 2023
Grupo NIIF:	Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 11 A No. 35 36
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	contab.dalase@orgcalypso.com
Teléfono comercial 1:	2417800
Teléfono comercial 2:	2473740
Teléfono comercial 3:	No reportó.
Página web:	WWW.TIENDASCALYPSO.COM

Dirección para notificación judicial:	Cl 11 A No. 35 36
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	contab.dalase@orgcalypso.com
Teléfono para notificación 1:	2417800
Teléfono para notificación 2:	2473740
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.0682, Notaría 4a Bogotá del 19 de febrero de 1.980, inscrita el 16 de abril de 1.980, bajo el No 83400, del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada: "ALMACEN CALYPSO BOGOTA LTDA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 3659 de la Notaría 5 de Bogotá D.C., del 28 de diciembre de 2004, y Escritura Pública adicional No. 227 del 02 de febrero de 2005, inscrita el 16 de febrero de 2005 bajo el número 977100 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió el nombre de: ALMACEN CALYPSO BOGOTA LTDA, por el de: COMERCIALIZADORA CALYPSO S A pudiendo usar la sigla CALYPSO S A.

Por Escritura Pública No. 3659 de la Notaría 5 de Bogotá D.C., del 28 de diciembre de 2004, y Escritura Pública adicional No. 227 del 02 de febrero de 2005, inscrita el 16 de febrero de 2005 bajo el número 977100 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Anónima bajo el nombre de: COMERCIALIZADORA CALYPSO SA pudiendo usar la sigla CALYPSO S A.

Por Escritura Pública No. 3659 de la Notaría 5 de Bogotá D.C., del 28 de diciembre de 2004, y Escritura Pública adicional No. 227 del 02 de febrero de 2005, inscrita el 16 de febrero de 2005 bajo el número 977100 del libro IX, la sociedad de la referencia absorbe mediante fusión a las sociedades CALYPSO IBAGUE LTDA, PLASTIQUINCE BUCARAMANGA LTDA, PLASTIDOCE BOGOTA LTDA y SURTIPLASTICOS LTDA la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 76 de Asamblea de Accionistas del 30 de abril de 2009, inscrita el 28 de mayo de 2009 bajo el número 01300648 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió el nombre de: COMERCIALIZADORA CALYPSO S A pudiendo usar la sigla CALYPSO S A., por el de:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S., pudiendo usar la sigla CALYPSO S.A.S.

Por Acta No. 76 de Asamblea de Accionistas del 30 de abril de 2009, inscrita el 28 de mayo de 2009 bajo el número 01300648 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S., pudiendo usar la sigla CALYPSO S.A.S.

Por Escritura Pública No. 2673 de la Notaría 14 de Bogotá D.C., del 07 de diciembre de 2011, inscrita el 15 de diciembre de 2011 bajo el número 01535225 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad CALYPSO CUCUTA LTDA la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Escritura Pública No. 2282 de la Notaría 14 de Bogotá D.C., del 13 de octubre de 2015, inscrita el 27 de octubre de 2015 bajo el número 02030831 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a las sociedades PLÁSTICOS DE LA SABANA S.A.S, CALYPSO PEREIRA S.A.S y RENOVA PQN S.A.S (absorbidas) las cuales se disuelven sin liquidarse.

Por Escritura Pública No. 5716 de la Notaría 73 de Bogotá D.C., del 26 de octubre de 2016, inscrita el 8 de noviembre de 2016 bajo el número 02155613 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad DALASE S.A.S la cual se disuelve sin liquidarse.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: Comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir toda clase de productos, procesados o no, terminados o sin terminar, materias primas, maquinaria y equipo; y en general, mercancías de todo orden que fuere necesario para el cabal cumplimiento del objeto social; 2. Promover y organizar establecimientos de comercio, depósitos y/o agencias en Colombia y/o en el exterior; mudar la forma y naturaleza de sus bienes; adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía; representar firmas industriales y/o comerciales, ya sean nacionales o extranjeras, explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal. Girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores. Participar en licitaciones públicas y privadas. Tomar dinero en mutuo con o sin interés o darlo en mutuo con o sin intereses, recibir y otorgar garantías, constituir hipotecas y aceptarlas, celebrar el contrato de seguro, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras. Realizar o prestar asesorías y en general celebrar todo acto o contrato que sean convenientes o necesarios para que facilite la realización de su objeto social; 3. La administración, dirección y gestoría de sociedades y/o personas jurídicas de cualquier naturaleza; 4. El desarrollo de actividades relacionadas con la ciencia contable, la prestación de servicios profesionales y técnicos en las áreas administrativas, financiera, legal, comercial y de mercadeo así como la reunión y/o coordinación de conceptos científicos de dos o más profesionales o técnicos en el ejercicio de profesiones liberales para prestar asesoría en los distintos sectores empresariales; y todos aquellos afines o conexos con las actividades propias de su objeto social, en especial los relacionadas con sus inversiones de carácter temporal y/o de largo plazo. Y en todo caso, la sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita. Parágrafo primero: En desarrollo de su objeto la sociedad podrá mudar la forma y naturaleza de sus bienes, constituir hipotecas y aceptarlas, celebrar contratos de arrendamiento, compraventa, usufructo y anticresis y adquirir toda clase de bienes destinados al desarrollo del objeto social, inclusive acciones y cuotas de otras sociedades de objeto social igual o similar y pignorarlos o venderlos (sic) de cualquier persona natural, jurídica como socia o accionista de otras sociedades comerciales que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias a las suyas o que se relacionen directamente con el objeto que la sociedad persigue.- presentarse como oferente en licitaciones y concursos

públicos y/o privados, ya sea de manera independiente o en consorcio o unión, aceptar prendas, dar y aceptar fianzas; tomar dinero en mutuo con o sin interés y darlo con interés y en general, desarrollar todos los actos conexos y/o complementarios al giro ordinario de sus negocios. Parágrafo segundo: La sociedad no podrá constituirse garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias o de las personas jurídicas con las que tenga calidad de matriz, filial o subsidiaria. La limitación al objeto social establecida en el presente parágrafo no será aplicable para los casos en que la sociedad deba servir como aval, garante o fiador en las operaciones de arrendamiento comercial y/o de vivienda realizadas por las sociedades miembro del grupo empresarial al cual pertenece la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $4.000.000.000,00
No. de acciones	: 40.000.000,00
Valor nominal	: $100,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $3.272.400.400,00
No. de acciones	: 32.724.004,00
Valor nominal	: $100,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $3.272.400.400,00
No. de acciones	: 32.724.004,00
Valor nominal	: $100,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la Ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Tendrá dos (2)

suplentes, quienes en su orden, lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y en toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Solicitar autorización a la Asamblea de Accionistas para la celebración de todo contrato en el que la sociedad actúe como garante de obligaciones de una sociedad que no pertenezca a su mismo grupo empresarial, independientemente de su monto. 3A Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad. No obstante, requerirá la previa autorización de la Asamblea de Accionistas para aquellos actos y contratos que excedan de Mil salarios mínimos legales mensuales Vigentes (1000 SMMLV) o de su equivalente en pesos colombianos, en la techa que se celebre el respectivo contrato. 4. Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con terceros. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a lo Asamblea de Accionistas. 6. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 7. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. 8. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea de accionistas de las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 9. ejercer las demás funciones que le delegue la ley y la asamblea general de accionistas 10. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, el balance de cada ejercicio, y los demás anexos e informes de que trata el Artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de Comercio, y cuando lo estime conveniente proponer a la Asamblea General de Accionistas reformas que juzgue adecuado introducir a los estatutos. 11. convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando lo solicite uno o varios accionistas que representen por lo menos la cuarta parte de las acciones suscritas; 12. Dar su voto consultivo cuando la Asamblea General de Accionistas lo pida o cuando lo determinen los estatutos. 13. Establecer y

reglamentar el funcionamiento de sucursales, agencias, establecimientos de comercio y oficinas en una o varias jurisdicciones dentro o fuera (SIC) donde se vaya a operar como usuario comercial y/o industrial y de zonas francas. Fijar en cada oportunidad las facultades y atribuciones de los administradores, según decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 14. designar funciones y remuneración de los cargos directivos creados por la Asamblea General de Accionistas 15. Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la empresa, y tomar las decisiones necesarias en orden o que lo sociedad cumpla sus fines y que no correspondan a la Asamblea o a otro órgano de la sociedad. Parágrafo: El Gerente regional será nombrado por el Gerente de la sociedad y tiene las siguientes facultades: A.) servir como administrador de la regional frente o la sociedad y las autoridades de gobierno, cumpliendo con las limitaciones a sus facultades establecidas en estos estatutos, B.) autorizar directamente compras cuya cuantía máxima no sea superior a cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 SMMLV). Para compras superiores a cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 SMMLV) e inferiores a ciento veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (120 SMMLV) deberá obtener la autorización escrita o por medio digital del jefe de compras de la sociedad, para compras de cualquier cuantía superior a la mencionada anteriormente, deberá obtener autorización escrita o por medio digital del gerente de la sociedad; C.) Podrá autorizar cupos de crédito hasta por una cuantía máxima equivalente a sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (60 SMMLV), para cualquier cuantía superior deberá obtener previamente la autorización escrita o por medio digital del gerente de la sociedad, D) contratar dentro de los limites y lineamiento que determine el Gerente de la sociedad, el personal necesario para el funcionamiento de la sucursal y/o establecimiento de comercio. Ninguna de las anteriores atribuciones los autorizan para colocar en prenda o hipoteca los bienes de la sociedad ni del establecimiento de comercio, E) El Gerente regional no tendrá facultades de representante legal de la sociedad, salvo para las actuaciones mencionadas en el presente Artículo y en todo caso cumpliendo con las limitaciones a sus facultades establecidas en estos estatutos.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 114 del 26 de marzo de 2020, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2020 con el No. 02575725 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Juan David Isaza Villa	C.C. No. 79469886

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Jaime Alberto Parra Rodriguez	C.C. No. 79755575
Segundo Suplente Del Gerente	Rafael Enrique Diaz Lopez	C.C. No. 79941791

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 114 del 26 de marzo de 2020, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2020 con el No. 02575726 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS	N.I.T. No. 900943048 4

Por Documento Privado del 16 de marzo de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022 con el No. 02804800 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Liseth Fernanda Ramirez Torres	C.C. No. 1013632531 T.P. No. 204207-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado del 1 de diciembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de diciembre de 2022 con el No. 02905405 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Paula Andrea Muñoz Rodriguez	C.C. No. 1012361245 T.P. No. 250288-T

PODERES

Por Escritura Pública No. 2839 de la Notaría 14 de Bogotá D.C., del 17 de diciembre de 2014, inscrita el 26 de febrero de 2015 bajo el No. 00030401 del libro V, compareció Juan David Isaza Villa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.469.886 de Bogotá D.C., en su calidad de representante legal, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Yhon Henry Mogollon Diaz identificado con cédula ciudadanía No. 79.996.607 de Bogotá D.C., para que represente a la sociedad en todas las diligencias y actuaciones de tipo tributario, cambiario y aduanero en las que participe la sociedad, tales como: 1) Firmar toda clase de declaraciones tributarias, ya sea en el nivel nacional, regional o local, presentarlas y/o corregirlas. 2) Atender y responder requerimientos de información o de funcionarios de impuestos. 3) Atender visitas de los funcionarios e impuestos 4) Firmar las respuestas a requerimientos de información especiales, pliegos de cargos y actos similares. 5) Representar a la sociedad en la interposición de recursos gubernativos o los relacionados con lo contencioso administrativo, ya sea firmando como representante delegado mediante este acto, o confiriendo poder a abogados para que cumplan tales diligencias. 6) Solicitar la devolución o compensación de saldos a favor y reclamar los recursos o todos correspondientes. 7) Solicitar la devolución de los pagos indebidos o en exceso; 8) Presentar medios magnéticos de información y en general, presentar todas las informaciones y pruebas que requieran las autoridades tributarias tanto nacionales como territoriales. 9) Firmar declaraciones de cambios y de importación o exportación. 10) Participar en diligencias cambiarias o aduaneras que requieran la intervención de un representante de la sociedad. 11) En general, hacer toda actuación diligente en la mira de representar los

intereses tributarios, aduaneros y cambiarios de la sociedad. Presente el señor Yhon Henry Mogollón Díaz, de la calidad e identificado como aparece anteriormente, manifestó: Que acepta el poder general que por medio de este instrumento se le confiere y que lo ejercitará oportunamente y con la mayor diligencia posible. Parágrafo: Los comparecientes hacen constar que han leído y verificado cuidadosamente, con los anexos sus nombres y apellidos completos, estados civiles, números de cédulas de ciudadanía, y demás datos en general de (sic) que todas las informaciones consignadas en el (sic) instrumento son correctas y en consecuencia, (sic) responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud de los mismos. Conocen la Ley, saben y se advierte que la notaría responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes. En consecuencia, la notaría no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidos con posterioridad a la firma del (de los) otorgantes y de la notaría. Además el notario le advierte a los comparecientes, que cualquier aclaración a la presente escritura pública implica el otorgamiento de una nueva escritura pública de aclaración, cuyos costos serán asumidos única y exclusivamente por los comparecientes (Artículo 35 decreto Ley 960 de 1970).

Por Documento Privado No. Sin núm. de representante legal, del 25 de julio de 2017, inscrito el 25 de agosto de 2017 bajo el número 00037881 del libro V, Juan David Isaza Villa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.469.886 de Bogotá, en su calidad de gerente de la sociedad de la referencia, por medio del presente documento, confiere poder especial amplio y suficiente a María Lucia Montoya Franco, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.373.380 de Sogamoso, para que en nombre y representación de CALYPSO, adelante todos los trámites necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarias a cargo de la compañía, entre las facultades otorgadas a la apoderada se encuentran de forma especial aunque no exclusivamente las siguientes: 1. Presentar, modificar y suscribir ante el Banco de la República o ante los intermediarios del mercado cambiario, todos los formularios cambiarios, en físico o por medios electrónicos, que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarias a cargo de la compañía. 2. Presentar y suscribir ante el Banco de la República o la entidad que haga sus veces o ante los intermediarios del mercado cambiario cualquier registro, informe, modificación, sustitución y/o cancelación de

inversión internacional o de endeudamiento externo realizada por la compañía. 3. Atender visitas a la compañía por parte de la DIAN, Banco de la República o Supersociedades, relacionadas con asuntos cambiarios. 4. Responder ante el Banco de la República, DIAN, Supersociedades o cualquier entidad competente, cualquier solicitud y/o requerimiento de documentación y/o información cambiaria de la compañía. 5. Recibir todos los documentos y notificarse en nombre de la compañia, presentar peticiones, recursos y realizar cualquier gestión ante el Banco de la República, DIAN o Supersociedades relacionada con temas cambiarios. 6. Solicitar estados de cuenta de inversiones internacionales, endeudamiento externo y en general solicitar en nombre de la compañía cualquier tipo de información cambiaria ante el Banco de la República, la DIAN o la Supersociedades. La apoderada está facultada para realizar todas actividades que sean necesarias en relación con cualquier tema de los relacionados anteriormente. La apoderada tendrá adicionalmente la facultad de sustituir el presente poder y revocar dichas sustituciones, desistir y recibir. Este poder tiene vigencia a partir del día 25 de julio de 2017 y permanecerá vigente hasta julio 25 de 2019.

Por Documento Privado sin número, del 15 de julio de 2019, inscrito el 17 de Julio de 2019 bajo el registro No. 00041855 del libro V, Jaime Alberto Parra Rodriguez, identificado con Cédula de ciudadanía No. 79.755.575 de Bogotá D.C., quien, obrando en su calidad de Representante Legal de la sociedad de la referencia, confiere poder especial amplio y suficiente a Maria Lucia Montoya Franco, identificada con la cédula de ciudadanía No.46.373.380 de Sogamoso, en calidad de Directora de Planeación Financiera y Tesorería de CALYPSO S.A.S, para que en nombre y representación de la sociedad CALYPSO S.A.S., adelante todos los trámites necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarias a cargo de CALYPSO S.A.S., confiriéndose de manera expresa a la apoderada las siguientes facultades: 1. Presentar, modificar y suscribir ante el Banco de la República o ante los Intermediarios del Mercado Cambiario, todos los Formularios Cambiarios, en físico o por medios electrónicos, que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarias a cargo de CALYPSO S.A.S. 2. Presentar y suscribir ante el Banco de la República o la entidad que haga sus veces o ante los Intermediarios del Mercado Cambiario cualquier registro, informe, modificación, sustitución y/o cancelación de inversión internacional o de endeudamiento externo realizado por CALYPSO S.A.S. 3. Atender las

visitas que se realicen en CALYPSO S.A.S por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Banco de la República o Superintendencia de Sociedades, relacionadas con asuntos cambiarios. 4. Responder ante el Banco de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Superintendencia de Sociedades o cualquier entidad competente, cualquier solicitud y/o requerimiento de documentación y/o información cambiaria de CALYPSO S.A.S. 5. Recibir documentos relacionados en asuntos cambiarios, notificarse en nombre de CALYPSO S.A.S de cualquier trámite, presentar peticiones, recursos y realizar cualquier gestión ante el Banco de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o Superintendencia de Sociedades relacionada con temas Cambiarios. 6. Solicitar Estados de Cuenta de Inversiones Internacionales, Endeudamiento Externo y en general solicitar en nombre de CALYPSO S.A.S cualquier tipo de información cambiaria ante el Banco de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN- o la Superintendencia de Sociedades. La Apoderada queda debidamente facultada para realizar todas las diligencias que sean necesarias para gestionar y culminar las actividades anteriormente descritas. El presente poder especial tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su emisión y reemplaza cualquier poder anterior otorgado por CALYPSO COMERCIALIZADORA SAS a la señora Maria Lucia Montoya Franco.

Por Documento Privado del 23 de julio de 2021, del Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 26 de Julio de 2021, con el No. 00045686 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial, amplio y suficiente a María Lucia Montoya Franco, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.373.380 de Sogamoso, Mediante Documento Privado del 15 de diciembre de 2022, inscrito el 21 de Diciembre de 2022 bajo el registro No. 00048941 del libro V, para que, en nombre y representación de la Sociedad, adelante todos los trámites necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarías a cargo de la Sociedad. Entre las facultades otorgadas a la apoderada se encuentran de forma especial, aunque no exclusivamente las siguientes: 1. Presentar, modificar y suscribir ante el Banco de la República o ante los intermediarios del mercado cambiarlo, todos los formularios cambiarlos, en físico o por medios electrónicos, que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones cambiarlas a carga de la compañía. 2. Presentar y suscribir ante el Banco de la República o la entidad que haga sus veces o ante los intermediarios del mercado cambiarlo cualquier registro, informe, modificación, sustitución y/o cancelación de

inversión internacional o de endeudamiento externo realizada por la compañía. 3. Atender visitas a la compañía por parte de la DIAN, Banco de la República o Superintendencia de Sociedades, relacionadas con asuntos cambiarios. 4. Responder ante el Banco de la República, DIAN, Superintendencia de Sociedades o cualquier entidad competente, cualquier solicitud y/o requerimiento de documentación y/o Información cambiarla de la compañía. 5. Recibir todos los documentos y notificarse en nombre de la compañía, presentar peticiones, recursos y realizar cualquier gestión ante el Banco de la República, DIAN o Superintendencia de Sociedades relacionada con temas cambiarlos. 6. Solicitar estados de cuenta de inversiones internacionales, endeudamiento externo y en general solicitar en nombre de la compañía cualquier tipo de información cambiaria ante el Banco de la República, la DIAN o la Superintendencia de Sociedades. La apoderada está facultada para realizar todas actividades que sean necesarias en relación con cualquier tema de los relacionados anteriormente. La apoderada tendrá adicionalmente la facultad de sustituir el presente poder y revocar dichas sustituciones, desistir y recibir. Este poder tiene vigencia a partir del día 25 de julio de 2021 y permanecerá vigente hasta diciembre 31 de 2024.

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4.555	8-XI-1.983	27. BTA.	15-XI-1983-NO.142374
5.935	30-XII-1.983	27. BTA.	18-I-1984-NO.145725
2.219	25-IV-1.985	27. BTA.	21-V-1985-NO.170254
817	20-II-1.990	4. BTA.	27-II-1990-NO.288108
10.586	27-XII -1.991	4A.STAFE BTA	21-I -1992-NO.352778
3.183	23-V -1.993	4A.STAFE BTA	15-VII-1993-NO.412538

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003873 del 29 de octubre de 2003 de la Notaría 4 de Bogotá D.C.	00905307 del 6 de noviembre de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0003659 del 28 de diciembre de 2004 de la Notaría 5 de Bogotá D.C.	00977100 del 16 de febrero de 2005 del Libro IX

Acta No. 76 del 30 de abril de 2009 de la Asamblea de Accionistas	01300648 del 28 de mayo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2351 del 28 de agosto de 2009 de la Notaría 4 de Bogotá D.C.	01329282 del 24 de septiembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2673 del 7 de diciembre de 2011 de la Notaría 14 de Bogotá D.C.	01535225 del 15 de diciembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 2282 del 13 de octubre de 2015 de la Notaría 14 de Bogotá D.C.	02030831 del 27 de octubre de 2015 del Libro IX
E. P. No. 5716 del 26 de octubre de 2016 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.	02155613 del 8 de noviembre de 2016 del Libro IX
Acta No. 106 del 30 de marzo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02223676 del 12 de mayo de 2017 del Libro IX
Acta No. 123 del 2 de diciembre de 2022 de la Accionista Único	02999707 del 24 de julio de 2023 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 13 de marzo de 2009 de Representante Legal, inscrito el 13 de marzo de 2009 bajo el número 01282430 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- DALASE S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado del 5 de julio de 2016 de Representante Legal, inscrito el 7 de julio de 2016 bajo el número 02120107 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- SPRADLING GROUP INC.
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2015-08-24

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

** Aclaración Situación de Control y Grupo Empresarial **
Se aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 5 de julio de 2016, bajo el Registro No. 02120720, en el sentido de indicar que la sociedad extranjera SPRADLING GROUP INC (matriz) configuro grupo empresarial con las sociedades: DALASE SAS, comercializadora CALYPSO SAS y PROQUINAL S.A. (subordinadas).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4719
Actividad secundaria Código CIIU: 4330

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: CALYPSO 7 DE AGOSTO II

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.:	00039791
Fecha de matrícula:	3 de septiembre de 1973
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 25 No. 67-26
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	SABANA PRINCIPAL
Matrícula No.:	00061371
Fecha de matrícula:	22 de mayo de 1975
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 12 No. 14 41
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	CALYPSO RESTREPO
Matrícula No.:	00094506
Fecha de matrícula:	2 de noviembre de 1977
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 24 C No.18 - 03 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	CALYPSO RICAURTE
Matrícula No.:	00109873
Fecha de matrícula:	31 de octubre de 1978
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 24 # 10 38 P1
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	CALYPSO CENTRO
Matrícula No.:	00132800
Fecha de matrícula:	31 de marzo de 1980
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 15 No. 10 84
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	SABANA TOBERIN
Matrícula No.:	00210010
Fecha de matrícula:	17 de abril de 1984

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 161 No. 20 26
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	PLASTICOS MONSERRATE
Matrícula No.:	00235192
Fecha de matrícula:	26 de abril de 1985
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 12 No 14 - 49
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LA ESQUINA DE LOS PLASTICOS
Matrícula No.:	00379732
Fecha de matrícula:	31 de julio de 1989
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 24 # 78 - 26
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO 7 DE AGOSTO CRA 25
Matrícula No.:	00403086
Fecha de matrícula:	27 de marzo de 1990
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 25 No. 67-63
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	SABANA RICAURTE
Matrícula No.:	00542956
Fecha de matrícula:	6 de abril de 1993
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 24 No. 9 24
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	SABANA 7 DE AGOSTO
Matrícula No.:	00557410
Fecha de matrícula:	27 de julio de 1993
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección:	Cr 25 No. 66 16
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	HULES DE LA 14
Matrícula No.:	00591437
Fecha de matrícula:	11 de abril de 1994
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 14 No. 12 23 29
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO BOYACA REAL
Matrícula No.:	00675420
Fecha de matrícula:	13 de diciembre de 1995
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av Cl 72 No 72 A - 31
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	HULES LA SABANA
Matrícula No.:	00730423
Fecha de matrícula:	4 de septiembre de 1996
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Ac 72 No 70 G 61
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO BOYACA REAL II
Matrícula No.:	00907219
Fecha de matrícula:	7 de diciembre de 1998
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Ac 72 77 A 37 Lc 101
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO CARVAJAL
Matrícula No.:	00907220
Fecha de matrícula:	7 de diciembre de 1998
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 69 B No. 31 53 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre:	CALYPSO RIONEGRO
Matrícula No.:	00907225
Fecha de matrícula:	7 de diciembre de 1998
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 60 No. 98A 55
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	SABANA 6
Matrícula No.:	00930878
Fecha de matrícula:	30 de marzo de 1999
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Ac 68 No 24 17
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	SABANA 7 TABORA
Matrícula No.:	01004660
Fecha de matrícula:	31 de marzo de 2000
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av Cl 72 # 74 A 80
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	PLASTICOS DE LA SABANA FONTIBON
Matrícula No.:	01075874
Fecha de matrícula:	20 de marzo de 2001
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 17 No. 99 53
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	PLASTICOS DE LA SABANA RESTREPO
Matrícula No.:	01136358
Fecha de matrícula:	26 de octubre de 2001
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 18 Sur No. 24 B 18
Municipio:	Bogotá D.C.

Nombre:	CALYPSO KENNEDY

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.:	01157767
Fecha de matrícula:	14 de febrero de 2002
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 40 Sur No. 73 D 67
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LA SALA DE LOS PLASTICOS
Matrícula No.:	01691517
Fecha de matrícula:	4 de abril de 2007
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Ak 54 No 47 08 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO PRADO VERANIEGO
Matrícula No.:	01751732
Fecha de matrícula:	2 de noviembre de 2007
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cll 129 N° 46-05
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO 12 DE OCTUBRE CALLE 74
Matrícula No.:	01941529
Fecha de matrícula:	27 de octubre de 2009
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 74 No. 52 - 16
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	PLASTICOS DE LA SABANA ZIPAQUIRA
Matrícula No.:	02406136
Fecha de matrícula:	29 de enero de 2014
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 8 No. 10 46 Lc 101 Edif Zara
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CEDI CALYPSO BOGOTA
Matrícula No.:	02494660
Fecha de matrícula:	5 de septiembre de 2014

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 38 No 12 34
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO SUBA.
Matrícula No.:	02533568
Fecha de matrícula:	19 de enero de 2015
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 139 No. 102-09
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	TODO PISOS CALYPSO
Matrícula No.:	02570848
Fecha de matrícula:	7 de mayo de 2015
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 45 No. 129 A 21 Autopista Norte
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO PATIO BONITO
Matrícula No.:	02702902
Fecha de matrícula:	27 de junio de 2016
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 86 Sur No. 40 B - 84
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CALYPSO SOACHA
Matrícula No.:	02794582
Fecha de matrícula:	17 de marzo de 2017
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 4 No. 14 - 12 Lc 1
Municipio:	Soacha (Cundinamarca)
Nombre:	CALYPSO SAN CARLOS
Matrícula No.:	03461170
Fecha de matrícula:	7 de diciembre de 2021
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección: Dg 51 B Sur N. 17-43
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 158.436.273.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4719

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 24 de julio de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de febrero de 2024 Hora: 13:51:08
Recibo No. 0124011698
Certificado sin costo para afiliado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12401169831432

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14953899588

(415)7707212489984(8020) 000001495389958 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 5 2 0 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA CALYPSO S .A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CALYPSO S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 A 35 36

42. Correo electrónico contab.dalase@orgcalypso.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1 5 2 3	2 4 1 7 8 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	1 9 8 0 0 2 1 9	4 3 3 0	1 9 8 0 0 2 1 9	6 8 1 0	7 0 2 0		5 6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 10 14 15 18 23 26 33 41 42 48 52 55 59

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
23- Agente de retencion en ventas
26- Declaración individual precios de tran
33- Impuesto nacional al consumo
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 04 / 16 : 58: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOGOLLON DIAZ YHON HENRY
985. Cargo Apoderado General Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 11:53:11AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764035031386

(415)7707212489984(8020) 001876403503138 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 7 5 2 0 8	7				

11. Razón social
COMERCIALIZADORA CALYPSO S .A.S.

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes — Cód. 3 1

24. Dirección
CL 11 A 35 36

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-08-30 / 01:45:04 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres MOGOLLON DIAZ YHON HENRY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79996607 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Apoderado General.
1006. Organización COMERCIALIZADORA CALYPSO S .A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-08-30/13:45:04

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764035031386

(415)7707212489984(8020) 001876403503138 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860075208	7				

11. Razón social
COMERCIALIZADORA CALYPSO S .A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PLASTICOS DE LA SABANA CEDI CR 38 12 34	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E011	41,001	63,000	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación
Bancaria

Fecha: 02 de febrero de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS,** identificado con **NIT** No **860075208** denominada **COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS**, a la fecha **02/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	13321960531	04/25/2005 (M/D/A)	ACTIVA	CARRERA DECIMA	53

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bogotá, 20 de febrero de 2024

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Ciudad.

YO HILDA LEONO R VELANDIA MUÑOZ Identificada con C.C. No. 20.652.191 expedida en la ciudad de Guatavita (Cund), en mi condición de contador Público del CONSORCIO ARQING HÁBITAT certifico que las retenciones relacionadas a continuación son las correctas para la FACTURA PROFORMA 180693.

CALYPSO - 180693

VALOR BASICO	**$**	**8.097.448**
IVA	**$**	**1.538.515**
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$**	**9.635.963**
AUTORRETENEDOR FUENTE E ICA	**$**	**-**
	$	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**9.635.963**

Cordialmente

HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador Publico
CONSORCIO ARQING HABITAT

CALYPSO® UN MUNDO DE SOLUCIONES LA SABANA® CALYPSO® PROYECTOS SPRADLING GROUP

Geotextil Tejido T250

Construimos una propuesta de suministro de Geotextiles Tejidos para sus obras, apalancada en nuestros años de experiencia industrial en la fabricación de productos con los controles de calidad que necesitan los clientes y nuestra cadena de suministro en todo el territorio colombiano.

PROPIEDADES FÍSICAS	UNIDAD	VALOR TÍPICOS	NORMA
Ancho	cm	385	P.I Medido
Cantidad	m	140	P.I Medido
Área total	m^2	539	Calculado
Resistencia a rayos ultravioleta	%	> 50% luego de 500 horas	ASTM D4355
Color	Negro		
Presentación rollo	Geotextil de 3,85m de ancho, doblado a 1,92m por 140m de largo		

PROPIEDADES MECÁNICAS	UNIDAD	VALOR TÍPICO	NORMA
Resistencia a la tensión Método Grab	N	1300	ASTM D4632
Elongación Método Grab	%	20	ASTM D4632
Resistencia al rasgado trapezoidal	N	777	ASTM D4533
Resistencia a la tensión longitudinal Método tira ancha	kN/m	31	ASTM D4595
Elongación longitudinal Método tira ancha	%	20	ASTM D4595
Resistencia a la tensión transversal Método tira ancha	kN/m	31	ASTM D4595
Elongación transversal Método tira ancha	%	20	ASTM D4595
Resistencia al punzonamiento	kN	5,5	ASTM D6241

PROPIEDADES HIDRÁULICAS	UNIDAD	VALOR TÍPICOS	NORMA
Tamaño de apertura aparente máximo	mm	0,6	ASTM D4751
Permitividad	s-1	0,037	ASTM D4491
Permeabilidad	cm/s	0,013	ASTM D4491
Tasa de flujo	l/min-m2	87,161	ASTM D4491

VMPR: Valor mínimo promedio por rollo

BENEFICIOS

El geotextil brinda al sector de la construcción un producto con notables propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas. Se destaca por su alta resistencia a la tensión, su rasgado trapezoidal, su baja deformación tensil, su alta resistencia al punzonamiento, su bajo creep en el tiempo y sus propiedades hidráulicas adecuadas que permiten el paso del agua.

Para nosotros, la optimización de los costos de logística y almacenamiento es uno de nuestros focos, por lo que nuestra propuesta se basa en un ancho de producto de 3,85 m, que es doblado hasta un ancho de 1,92 m y enrollado en una presentación de 120 m de largo.

ORDEN DE COMPRA Y/ O SERVICIO

CONSORCIO ARQING HÁBITAT

DIA	MES	AÑO
01	FEBRERO	2024

ORDEN DE COMPRA Nº: 003 -2024 ANT
PEDIDO A: COMERCIALIZADOR CALYPSO SAS
FACTURAR A NOMBRE DE: CONSORCIO ARQING HÁBITAT - CT 1164 DE 2023
NIT: 901.550.418-2
TELÉFONO: (601) 3106560 - 311-4489923

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GEOTEXTIL T250 / 2100 3.85X140M	2490	M2	$ 3.252	$ 8.097.448
2					$ -
3					$ -
4					$ -
5					$ -
				IVA	$ 1.538.515
					$ 9.635.963

OBSERVACIONES:
Remitir cuenta de cobro y/o factura electrónica según aplique, resolución de facturación, a correo administrador@arqingco.com, acompañado del RUT actualizado y de la copia de la certificación bancaria para poder hacer giro.

PEDIDO POR:
Jully Torres

AUTORIZADO POR:
Ing. Nidia Pabón

PROVEEDOR:
Marina Rojas Cruz



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.941.791
DIAZ LOPEZ

APELLIDOS
RAFAEL ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAR-1977
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

12-ABR-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00081982-M-0079941791-20080927 0003820952A 1 1690021975

Certificado
Bancario

Viernes, 22 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TRANSIOBRAS SAS identificado(a) con NIT 901523492, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	58900001099	2021/09/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

SDHT-1160-2024-083 - SOLICITUD DE RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co> 27 de febrero de 2024, 18:30
Para: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Cc: Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, por medio de la presente me permito informar que los rendimientos financieros se generan en su totalidad a la liquidación de la fiducia, y con el cierre de la misma se remite por este medio la solicitud de generación de recibo con código de barras para el pago correspondiente del contratista de obra, seguidamente se adjunta dicha consignación en los documentos de liquidación de fiducia.

Atentamente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jean Angarita Vasquez
Contratista
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

De: Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 18:32
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>; Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>
Asunto: SDHT-1160-2024-083 - SOLICITUD DE RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cordial saludo,

remito lo referido en el asunto,

Atentos a su respuesta
--
CORDIALMENTE:

SOLIUN
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su

retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Jean Angarita Vasquez
Contratista - No 690 - 2023
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "

SDHT-1160-2024-083

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2024
Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **SOLICITUD DE RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cordial saludo,

Remito solicitud a la entidad para generar recibo de pago de rendimientos financieros del mes de enero 2024 por un valor de $ 217,686.15.

RENDIMIENTOS	
ENERO	217,686.15

Atentamente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (1) anexos
Con copia: N/A
Elaboró: JCO

ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA Comité de seguimiento No.6

FECHA: lunes 26 de febrero del 2024 HORA INICIO: 8:45 a.m. HORA FIN: 11:30 a.m.

LUGAR: Oficina de interventoría Soliun

ASUNTO: Verificación y estado actual del contrato

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA:
1.Presentación por parte del consultor Land Entropia de informe dando respuesta a las dudas que se habían presentado por parte de la SDHT, contratista de obra e interventoría. El Documento del informe se anexa como de la presente acta.
2. Verificación y estado actual del contrato de obra No. 1164 del 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión en presencia de la interventoría Soliun SAS contrato No. 1160 del 2023, contratista de obra consorcio Arqing hábitat contrato No.1164 del 2023, consultor de estudios y diseños Consorcio Land Entropia contrato No. 1280 del 2022 y representantes por parte de la secretaria distrital de hábitat.
El contratista manifiesta que el apoyo a la supervisión debe estar presente en el comité, principalmente por la participación del consultor Land Entropia, donde la entidad es quien tiene un vínculo directo con el consultor.
El contratista solicita a la entidad contratante claridad sobre la definición para proceder con el suministro e instalación del mobiliario propuesto inicialmente, donde la entidad contratante manifiesta que aún no tiene respuesta y que está realizando las consultas y trámites pertinentes. El contratista y la interventoría ratifican su postura según lo mencionado en comité del 20 de febrero del 2024 de proceder con el suministro e instalación del mobiliario propuesto inicialmente, bajo la respuesta de no objeción por parte del IDRD y las disposiciones del POT.
El contratista expresa su preocupación por la falta de definición para la implementación del mobiliario y los tiempos transcurridos de ejecución de obra, así mismo manifiesta que a la fecha no cuenta con un presupuesto con alcance definido total y que va a ejecutar lo que está en diseños. Así mismo expresa que el tiempo transcurrido de ejecución de obra no es de su responsabilidad.
El consultor Land Entropia inicia con la presentación del informe que realizaron dando respuesta a las inquietudes que habían presentado por parte de la SDHT, contratista de obra e interventoría, con respecto a los documentos entregables de los estudios y diseños. Dicho informe se anexa a la presente acta para evidenciar la información trasmitida por el consultor.

Se manifiesta que dentro de la información presentada por el consultor, se encuentra respuesta para la SDHT sobre el desglose del AIU correspondiente a 13 territorios, dada esta información la SDHT se compromete a dar respuesta del desglose del AIU que aplica para el presente contrato teniendo en cuenta que son 5 territorios.
Se manifiesta por parte de la interventoría que debido a que los estudios, el presupuesto y los diseños no son consecuentes. Surge la necesidad de implementar actividades adicionales para el buen desarrollo del proyecto y que estos no deben superar en cantidad el 30% de los APU'S contractuales con el fin de evitar implicaciones legales, adicionalmente se deja claridad que esta situación responde a una mala planeación por parte de la entidad contratante.
El consultor informa que el especialista de geotecnia emite concepto con respecto a la estructura granular, manifestando que solo es aceptable el uso de material reciclado en la subbase y no en la base granular.
Se cuestiona al consultor por la falta de información sobre las consultas de garantías vigentes con las que cuenta cada territorio, donde el consultor manifiesta que realizó las consultas ante el IDRD y otras entidades, pero no a las alcaldías locales, por tal motivo no se tenía conocimiento desde la etapa de estudios y diseños que el parque Santa Cecilia cuenta con una póliza de estabilidad vigente y por lo cual no se pueden realizan las actividades propuestas inicialmente.
Se plantea realizar cambios en la modulación de las plaquetas en concreto que se encuentran propuestas en los andenes, ya que se hallan de forma muy continua y puede generar afectaciones en la estabilidad y construcción de los pisos en concreto. El consultor informa que lo tendrá en cuenta, así como todas las sugerencias por temas constructivos y de estabilidad para realizar los cambios en planos y determinaciones en campo según las visitas que tienen contempladas realizar como seguimiento a la ejecución de las obras.
Se solicita aclarar el color a utilizar en las señaléticas a instalar, ya que según lo entregado por la consultoría se encuentran en color verde cumpliendo con la cartilla del IDRD, y no con el requerimiento del contrato de obra en cuanto a color.
El consultor manifiesta que para el parque Riveras de occidente ellos no tienen priorizado y contemplado dentro de los diseños el andén que colinda con el salón comunal, ya que no estuvo dentro del polígono de intervención aprobado inicialmente y que la inclusión de este tramo responde a una solicitud realizada por la entidad contratante que hace falta formalizar.
En lo presentado por el consultor, se anexa un presupuesto con actividades adicionales necesarias para la ejecución de las obras, por tal motivo se requiere la respuesta por parte de la entidad contratante para la implementación de estas actividades adicionales.
El consultor informa que va a realizar acompañamiento a la ejecución de las obras mediante visitas en campo y asistencia virtual a comités de seguimiento de obra.
Se espera por parte de la entidad contratante la respuesta formal para la modificación en el alcance de las actividades para el parque Santa Cecilia debido a las pólizas de estabilidad con las que cuentan algunas zonas del parque.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA Comité de seguimiento No.6

COMPROMISOS PACTADOS EN		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Respuesta desglose de AIU para el contrato.	SDHT	05/03/2024
La formalización de la solicitud para ajuste de polígono del parque Riveras de occidente	SDHT	05/03/2024
Definición del color para las señaléticas a instalar	SDHT	05/03/2024
Implementación de actividades adicionales	SDHT	05/03/2024

ACTA DE Comité de seguimiento No.6

ASISTENTES:

Firma Nombre: Cargo: Entidad:	Firma Nombre: Cargo: Entidad:
Firma Nombre: Cargo: Entidad:	Firma Nombre: Cargo: Entidad:
Firma Nombre: Cargo: Entidad:	Firma Nombre: Cargo: Entidad:

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Comité de seguimiento # 6

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Interventoría	Fecha Día / Mes / Año	26/02/24	Hora:	8:45

#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Contratista	Ninguno	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	LAURA CAMILA CEPEDA M	1022394234	SDH - SO						X		3012118899	laura.cepeda@habitatbogota.gov.co	
2	Carolina Salazar	1020820361	SDHT - SO						X		3203152025	maria.salazar@habitatbog	Carolina SP
3	MAURICIO BOTON	80726486	C. ARGINO HAB								3101964055	mboton@arquingco.com	
4	Nidia Pabón	52884074	C. A. Habitat.						X		3106560	nidiapabon@arquingco.com	
5	Juan David Vega T	98771882	Consorciolandentropía						X		32163634.06	consorciolandentropia@gmail.com	
6	Santiago Restrepo	1037633544	consorcio land entropía						X		3174354927	"	Santiago R
7	Edna Constanza Cepeda	51870499	SOLUM								3017443572	proyectos@ridionsol.com	
8	Juan Sebastian Rueda	1098730430	Solum								3175678658		Juan Rueda
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 5

FECHA: 20/02/24 HORA INICIO: 9:00 am. HORA FIN: 11:00 am.

LUGAR: Oficina interventoria - Solun SAS

ASUNTO: Verificación y estado actual del contrato

ASISTENTES: Se anexa listado de asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

Comité de seguimiento COP 1169 - Verificación y estado actual del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Aprobación acta anterior:

Se informa que del acta anterior se recibieron observaciones por parte de la entidad, las cuales se subsanaron y se remitió el acta ajustada por correo electrónico, por lo tanto, se aprueba el acta anterior pues no se presentan más observaciones por las partes.

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Revisión informe mensual social de interventoria:

La entidad informa que el día de ayer se realizó reunión con la profesional social de interventoria para los comentarios al informe mensual 1, plan de gestión social y plan de seguimiento social. Por lo anterior, la entidad solicita informar en qué estado se encuentra la atención de las observaciones, las cuales se enmarcan en algunas cosas que por obligación contractual están establecidas y se deben reportar.

La interventoria informa que se comunicó con la profesional social del contratista, en efecto hay observaciones por parte de la entidad al informe mensual de obra y al informe mensual de interventoria, al plan de gestión social (el cual ya se había aprobado) y al plan de seguimiento social. El contratista informa que a la fecha se encuentran subsanando las observaciones pues fueron emitidas el día de ayer.

El contatista manifiesta que se encuentia revisando el anexo social publicado en la plataforma Secop 2 con el fin de evidenciar dónde está la diferencia frente a lo solicitado ahora, la entidad manifiesta que lo requerido es ajeno a la

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Página

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 5

metodología pero se encuentra establecido en las obligaciones contractuales específicas descritas en el anexo técnico de los contratos de obra e interventoría, el contratista manifiesta que el contrato cuenta con sus documentos contractuales (contrato, pliego, anexos) publicados en Secop, cualquier documento posterior a ello se sale del alcance contractual, por lo cual se están revisando los documentos. La entidad reitera que lo solicitado se encuentra descrito en las obligaciones contractuales, a lo cual el contratista aclara que si las observaciones son aplicables se subsanarán, si no aplica se remitirá la respuesta con el sustento correspondiente.

La interventoría informa que se están revisando las observaciones punto a punto y que se evidencian algunas en las que no se está de acuerdo, por lo cual se solicitará reunión nuevamente vía correo electrónico.

2.2. Remisión informes mensuales de interventoría:

Se cumplió el compromiso, se remitieron los informes y a la fecha no se ha retibido realimentación por parte de la entidad del componente SST y ambiental. La entidad informa que realizará la revisión de los componentes y remitirá respuesta el día de mañana.

2.3. Subsanación informe mensual SST - 1 — Contratista:

Se cumplió el compromiso, el contratista remitió la subsanación correspondiente, la cual se verificó por parte de interventoría, encontrándose que cumple con lo requerido, el informe se encuentra radicado en la entidad.

2.4. Reunión con el consultor:

Se cumplió el compromiso, se realizó la reunión, sin embargo no se cumplió con el objetivo pues no ha sido posible definir el mobiliario

En cuánto a las observaciones de mobiliario por parte del IDRD, leído el memorando del IDRD, se aclara que la no objeción establece que la SDHT tiene la potestad sobre el mobiliario y se solicitan ensayos y certificaciones de calidad, manuales de mantenimiento, prueba piloto, los cuales se pueden llevar a cabo en este contrato de acuerdo con lo manifestado por interventoría y contratista.

La entidad manifiesta que se encuentra a la espera de la respuesta definitiva por parte del IDRD para instalación de mobiliario.

2.5. Presupuesto Santa Cecilia:

El contratista remitió balance presupuestal el día de hoy en horas de la mañana para revisión.

2.6. Presupuesto actualizado Patio Bonito:

El contratista remitió balance presupuestal el día de hoy en horas de la mañana para revisión.

2.7. Presupuesto actualizado Riveras:

El contratista remitió balance presupuestal el día de hoy en horas de la mañana para revisión.

* Se realizará revisión del documento "balance presupuestal" en reunión de contratista e interventoría el día de hoy posterior a la finalización del comité.

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 5

3. Componente SST:

- Se informa reporte de 8 trabajadores mediante documentos, a la fecha 6 están laborando
- Está activo el frente de Palo Bonito y ayer se inició riberas de occidente.
- Se revisó tema de dotación, EPP, punto de hidratación, cerramiento, campamento, baño, se emitieron recomendaciones al contratista y se tomó registro fotográfico.
- Se solicita actualizar el PMT acorde con las obras a ejecutar, pues el sendero peatonal está quedando interno, por lo cual no se está cumpliendo con lo aprobado por movilidad.

El contratista aclara que el PMT quedó aprobado así pues inicialmente no estaba contemplado el sardinel, por lo cual se extendió el cerramiento, ya se estan tomando las medidas correspondientes.

- Se solicita brigada de aseo, el contratista manifiesta que se ha realizado la actividad constantemente pero la comunidad continúa dejando los desechos de las mascotas a pesar del cerramiento.

Se solicita tomar registro fotográfico de lo evidenciado.

- Se robaron una valla y dos señales.
- Se recomienda aseo y de ser posible fumigar, pues el olor es muy incómodo para los trabajadores, además hay muchas moscas.
- Se avala el informe 1 del contratista por parte de interventoria.

* Se aclara que la obligación de revisión de informes de obra es de la interventoria, y los de interventoria no deben ser validados con los de obra y emitir observaciones a ambos, la entidad sólo válida el informe de interventoria y si es necesario, la interventoria requiere el informe de obra.

4. Componente técnico:

- El contratista entrega muestra de adoquín morado para aval de la interventoria y la entidad.
- El tono será validado por la entidad, se recuerda por parte de interventoria que se deben cumplir las especificaciones y realizar los ensayos a los que haya lugar.
- La otra opción para un morado más claro es pintura (sintético), pero se incrementa el costo del piso.
- El contratista aclara que en el concreto el pigmento morado se va a ver muy similar a la muestra presentada en el adoquin de concreto.
- El contratista solicita revisar el tema de la orden de giro del anticipo, frente a la compra de señales que no están incluidos en el listado del presupuesto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 5

- Se aclara que el tema de las señales no es claro cómo se va a pagar, por ello no se ha aprobado el giro, se necesita definición por la entidad de cómo se va a pagar.
- Se reitera que el consultor no dió respuesta de fondo al desglose del AIU, por lo cual es necesario que la entidad emita pronunciamiento para identificar en dónde se pagaría el PMT, si se puede incluir el ítem o está inmerso este costo en el AIU.
- Al respecto, la entidad manifiesta que se encuentra a la espera de la respuesta consolidada del consultor a las observaciones dadas a los estudios y diseños para el día lunes 26 de febrero de 2024.

5. Componente ambiental:

- En el recorrido de obra realizado se evidenciaron observaciones que se remitieron al contratista, como: la protección de los individuos arbóreos y de los sumideros
- Se subsanó este tema por parte del contratista.
- En cuánto al robo de una de las vallas se solicita colocar la denuncia y allegar el comunicado con las evidencias correspondientes, se solicita allegar la trazabilidad de la instalación.
- Para el frente de riveras se solicita adelantar la protección de los individuos arbóreos y sumideros.
- Se aclara que la gestión ante las entidades para el retiro de contenedores y redes eléctricas es obligación del contratista, sin embargo, de la entidad y la interventoria se realizará seguimiento, pero la labor es del contratista (todos los trámites, licencias y permisos).
- Señalizar las áreas de acopio.

6. Componente técnico:

- El dia de hoy se realizó reunión para socialización de observaciones al plan de trabajo con la profesional de calidad de interventoria y la directora de obra:
  - Se solicita incluir el PMT.
  - Se incluyó el tema de las vallas.
  - Se debe incluir la metodología para la liberación y aprobación de actividades acorde a la especificación técnica, durante y despues de cada actividad.
  - El PIE (Plan de inspección y ensayos) debe contemplar el control de cambios.
  - Contractualmente se aceptaron los diseños!, así que se debe hacer control de cambios.

* Para el cierre de la etapa de apropiación de diseños se recuerda que se debe suscribir un acta con la apropiación y las observaciones planteadas por el contratista y la interventoría.

Se aclara que para la revisión de los presupuestos primero es necesario establecer qué ítems son contractuales identificando los insumos, para la construcción de los precios no previstos.

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 5

- En cuanto a las gradas de Santa Cecilia se recomienda no intervenir pues el área no está contemplada dentro del polígono del RUPI

- Se solicita programar reunión social de inicio en Santa Cecilia, se recuerda que en el comité pasado se definió la intervención de la cancha pues esa zona no se encuentra en estabilidad.

- Se evidencia atraso en el inicio de la ejecución de actividades ya definidas, como en el frente de Santa Cecilia en el cual no se ha programado la reunión aunque se aclaró la intervención la semana pasada.

- El contratista de obra manifiesta que en el comité pasado no se estableció fecha para realización de la reunión social de Santa Cecilia, únicamente se estableció el compromiso de entrega del presupuesto.

- Se aclara que la fecha de compromiso de entrega del plan de trabajo es propuesta por la interventoría y el contratista no manifestó objeción.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA

COMPROMISOS PACTADOS EN		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Mesa de trabajo subsanación observaciones comp. social	Contratista - Interventoria SDHT	Por Definir
Respuesta informes mensuales int SST/ Amb.	SDHT.	21-02-24.
Mesa de trabajo presupuesto	Contratista - Interv	20-02-24.
Ajuste PMT Patio Bonito	Contratista	Pendiente.
Validación muestra adoquín morado	SDHT	Pendiente.
Doumento oficial desglose AIU.	SDHT	Pendiente.
Denuncia valla hurtada	Contratista	Próx Comité.
Plan de trabajo (Subsanación)	Contratista	23-02-24.
Reunión social Santa Cecilia	Contratista	Pendiente.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO 5

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Edna Constanza Cepeda
Cargo: Directora Interventoría
Entidad: SOLUN SAS

Firma
Nombre: JEAN ANGARITA.
Cargo: APOYO SUPERV.
Entidad: SDHT.

Firma
Nombre: KAREN M. BARON
Cargo: D.C.
Entidad: C. ARQUING HABITAT.

Firma
Nombre: Nidia Yolanda Pabón
Cargo: Director de Obra
Entidad: CONSORCIO ARQUING HABITAT.

Firma
Nombre: Joan Sebastian Pueda
Cargo: Residente Interventoría 2
Entidad: Solun SAS

Firma
Nombre: Yinetth Cruz Arauleo
Cargo: Profesional SSI
Entidad: Solun SAS

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Comité de seguimiento # 5 COP 1164-23

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Interventoria	Fecha Día / Mes / Año	20/02/24	Hora:	9:00 a.m.

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Nidia Pabón	52884074	C.A. HABITAT.						X		3106560	nidiapabon@arquingco.com	
2	[illegible]	80721186	C.A - HABITAT						X		3106560	[illegible]	
3	Gabriela Nayera Cera	72,201057	C.A. Habitat						X		3162253596		
4	Yineth Cruz Branzoleg.	28797-SJ	Interv. Solicu.								3226258254	[illegible]	
5	Raul D Pelado C	79573492	Interv - Soliv u						X		3213980388	proyectos @ soliunsas.com	
6	Carolina Salazar	1020820361	SDHT - SO						X		3203452025	mary.salazar@habitatbogota	Carolina SP
7	LAURA CAMILA ORDUÑA M.	1022394224	SDHT - SO						X		3042145899	laura.oduna@habitatbogo	
8	Juan Sebastian Pineda	1098730430	Interventoría						X		3175678638	proyectos@soliunsas.com	Juan Pineda
9	Yeimy. Natalia Ramirez	1057412941	Interventoria						X		3207099728	proyectos @ soliunsas.com.	Yeimy Natalia R
10	Edna Constanza Cepeda	51'870.491	Interventoría.								3017443572	proyectos@soliunsas.com	
11	JOAN ALCANTA.	79645805	SDHT - SO						X		3212563770	joana.ancantas@habitat	
12	Karen Adriana Algeciras C.	1014266409	Interventoria						X		7653016	proyectos@soliunsas.com	Karen A.
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 4

FECHA: 13/02/24 HORA INICIO: 8:30 am HORA FIN: 10:00 am

LUGAR: Secretaria Distrital de Habitat - SDHT

ASUNTO: Estado actual del contrato

ASISTENTES: Se anexa listado de asistentes

ORDEN DEL DÍA:

Verificación y estado actual del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión compromisos pactados:

1.1. Subsanación plan de trabajo - Realización mesa de trabajo: La interventoria informa que la mesa de trabajo no se llevó a cabo, sin embargo, se remitieron las observaciones mediante oficio por correo electrónico, las cuales se subsanaron en el documento remitido por el contratista el día de ayer, el documento se encuentra en revisión por parte de interventoria.

1.2. Entrega informes mensuales:

El contratista hizo entrega de los informes mensuales de todos los componentes para revisión de interventoria, se emitieron observaciones al informe SST, los informes de interventoria se remiten el dia de hoy para revisión de la entidad. la entidad aclara que se deben allegar primero por correo para revisión previa a la radicación.

1.3. Ajuste diseño - presupuesto:

La interventoria informa que en horas de la mañana se recibió correo electrónico por parte de la entidad con la respuesta del consultor, se aclara que no se remitió la información el dia de hoy pues el consultor no cumplió el compromiso de entrega el pasado viernes como se tenia previsto y allegó la información ayer en horas de la noche.

1.4. Aprobación orles vallas:

Se cumplió el compromiso, el aval de las vallas se realizó por parte de la entidad el 6 de febrero de 2024 via correo electrónico.

1.5. Referencia pigmento morado:

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 4

Se allegó por parte de la entidad referencia del pigmento morado acorde al lenguaje de la manzana del cuidado.

1.6. Cronograma por territorio:

Se cumplió el compromiso, el contratista remitió el día de ayer en horas de la tarde el cronograma por territorio para revisión de la interventoría.

Se prevé el inicio de obras en patio bonito.

1.7. Última versión carpeta diseños:

Corresponde a la información entregada por correo electrónico esta mañana por parte de la entidad.

1.8. Cambio hoja de vida profesional social:

Se aclara que la por parte de interventoría y contratista que de acuerdo con lo manifestado la profesional social aprobada del contratista continúa en este contrato y se retira del otro proyecto con SDHT, cumpliendo la dedicación del 100%.

1.9. Subsanación documentos vallas:

Se cumplió el compromiso, se subsanaron las observaciones y se remitió el trámite a las alcaldías locales, los soportes de radicación se incluirán en el siguiente informe mensual de ejecución.

1.10. Radicado físico planes:

Se cumplió el compromiso, el contratista radicó los planes en físico en la oficina de interventoria.

1.11. Documentos personal operativo:

El contratista remite documentación de 2 personas para labores operativas en Patio Bonito.

2. Componente social:

- Se informa por parte de interventoría que a la fecha se han realizado 3 reuniones: Patio Bonito, Camelias y Riberas de occidente, Riberas con asistencia de 20 personas, Camelias con asistencia de 6 personas y Patio Bonito con asistencia de 6 personas. Se tiene programada la reunión de Chuniza el viernes 16 de febrero a las 9:00 am, ya se remitió el volante y se está realizando convocatoria, la presentación de ésta socialización se encuentra en revisión de interventoria y se remitirá respuesta el dia de hoy.

- La reunión en el frente Chuniza será el viernes a las 9:00 am con presencia de los profesionales de interventoria y contratista.

- En cuánto a la reunión en Santa Cecilia el pasado 6 de febrero de 2024, la misma no se realizó por directriz de interventoría, es un tema técnico que se tratará en dicho componente.

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 4.

- El informe mensual 4 fue entregado por el contratista, se emitieron las observaciones del caso por parte de interventoría, las cuales fueron subsanadas por la profesional social del contratista, dando aprobación al informe, para su radicación en físico.
- El informe mensual de interventoría se remitió a la entidad el 7 de febrero, a la fecha sin observaciones, la entidad manifiesta que remitirá la respuesta correspondiente el próximo jueves.
- Se iniciaron las actividades de levantamiento de actas de vecindad, en Patio Bonito se levantaron 11 actas de vecindad de fachadas, se programó en Camelias la actividad el próximo viernes 16 de febrero de 8 am a 12:00 m. En este territorio se solicitaron actas de fachada e internas por la cercanía de las casas a la intervención.
- El plan de gestión social se encuentra radicado en interventoría.
- Está pendiente la definición técnica en Santa Cecilia para continuar con el proceso de gestión social. Se solicita tener en cuenta los tiempos mínimos requeridos.

3. Componente SST:

- El plan SG-SST del contratista se encuentra avalado y radicado en interventoría.
- El informe mensual de interventoría se encuentra listo para remitir a la entidad.
- El informe mensual # 1 del contratista se revisó y se remitieron las observaciones correspondientes por oficio.
- Se remitieron documentos de ingreso de 2 trabajadores por parte del contratista.
- Se recomienda por parte de interventoría al contratista que las subsanaciones al informe se alleguen lo antes posible.
- Se recomienda por parte de interventoría al contratista que las afiliaciones de los trabajadores no se realicen por cooperativa para evitar inconvenientes, se recomienda que sea a nombre del contratista.
- El contratista manifiesta que ésta semana se remitirá más documentación para ingreso de trabajadores y que se encuentra al día con la gestión de la dotación para los trabajadores.

4. Componente ambiental:

- Se informa por parte de interventoría que se remitió la semana pasada el registro del soporte de radicación de cada una de las vallas ante las alcaldías locales.
- Se recibió en físico el MAD y el RCD
- Se recibió el informe mensual # 1, el cual ya se allegó en físico y se encuentra avalado por interventoría.

- El PIN está abierto desde enero.

5. Componente técnico:

- La entidad manifiesta que el consultor no ha cumplido con los compromisos pactados frente a la atención de las observaciones generadas, si bien anoche se allegó documentación, no se evidencia respuesta punto a punto como se solicitó desde el inicio.

En cuanto al mobiliario, se aclara que aunque se tiene un comunicado de no objeción del IDRD, la misma entidad remite observaciones por lo cual el tema aún no está claro.

- La entidad manifiesta que está evaluando la posibilidad de usar mobiliario nacional de la cartilla IDRD.
- Se solicita realizar mesa de trabajo con el consultor el día de mañana, la idea es proponer el mobiliario a usar en vez de las estancias.
- El contratista manifiesta que frente a lo enunciado por la entidad presenta varios inconvenientes técnicos, como el tema de Santa Cecilia, los senderos se encuentran en buen estado y de acuerdo con lo evidenciado en el recorrido están en garantía, se informa que se intervinieron en el año 2022, ésta situación altera el presupuesto y la planeación para la ejecución del contrato.
- En Santa Cecilia se evidencian senderos nuevos realizados en 2022 y el juego infantil es nuevo, se aclara que el polígono del parque no incluye las graderías propuestas, se podría contemplar la intervención de la cancha, la cuál está en mal estado y no ha sido intervenida en otros contratos.
- El contratista manifiesta que todas estas situaciones alteran el presupuesto y la planeación, desde hace 1 mes no ha sido posible concretar la compra.
- En mal estado se encuentra el piso de caucho, se podría contemplar el mantenimiento.
- El contratista manifiesta que con cada cambio debe realizar mediciones y presupuestos nuevos, lo cuál altera el presupuesto inicial contratado en el proceso de selección.
- El contratista reitera que estos cambios representan afectaciones al tiempo.
- Se aclara que la reunión en Santa Cecilia no se realizó pues no asistió la comunidad, por ello la interventoría solicitó nueva convocatoria.
- Se evidencia por parte de interventoría un cambio del presupuesto con un probable cambio superior al 30%, por lo cual se debe revisar lo que se propone para la intervención.
- El contratista reitera que no se han podido realizar compras para el contrato pues no es claro lo que se va a intervenir: (cantidad de mobiliario).

De acuerdo con lo definido en comité frente a la priorización de la intervención en la cancha (para el frente Santa Cecilia), el contratista manifiesta que:

realizará visita de nuevo al frente, tomará medidas de nuevo y realizará el presupuesto de la intervención.
En este frente (Santa Cecilia) se prioriza cancha y senderos aledaños de la cancha, los temas de mobiliario se evaluarán de acuerdo con la priorización presupuestal.

- Frente Palo Bonito:

- Se aclara que no es viable la instalación de placas de concreto para los senderos propuestos en este parque pues hay afectación por las raíces de los árboles, se propone como solución técnica que los senderos sean articulados y para ello la instalación de adoquín, se proponen adoquines morados que aunque tarda 20 días en fabricación nos daría el color.
- El juego propuesto en la zona de juegos infantiles se aclara que no hay homologación para el contrato, se debería generar un nuevo ítem.
- Se descarta la posibilidad de instalar una zona de gimnasio multifuerza pues no es posible cambiar el uso propuesto en la zona, ya que es una zona de juego infantil.
- El juego infantil propuesto es importado, altura 1,4, no se encuentra en bodega y requiere tiempos de importación.
- Hay otros juegos en stock, pero cambia el espesor del caucho, pues éste depende de la altura de caída.
- Se solicita documentar el sustento técnico para las priorizaciones.
- En cuanto a las estancias se encuentran por definir las cantidades, además de que para el aval de IDRD se solicita implementar un plan piloto para el aval.
  Se propone que éste sea el plan piloto, para que sea considerado por la entidad.
- Se reitera que es necesario definir el tema de las estancias pues se está afectando el plazo del contrato.
- La entidad manifiesta que la idea es revisar lo correspondiente el día de mañana, en la reunión con el consultor.

Desde el componente social se manifiesta preocupación pues los planos socializados a la comunidad han sufrido cambios, se solicita aclarar cómo se manejarían las PQR.
La entidad manifiesta que se realizarían las aclaraciones mediante reuniones extraordinarias.

La reunión con el consultor se establece para el día de mañana a las 4:00 pm, virtual.

Se manifiesta que dado lo definido en comité es necesario realizar un balanceo en el presupuesto.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 4

- Se aclara que a la fecha en los presupuestos se siguen dejando las estancias propuestas inicialmente en el contrato.

- En riberas se cambiaría el bordillo por sardinel.

- En Chunisa dependería de lo que se hable con la comunidad, se contempla anden, demarcación y mantenimiento.

- El contratista y la interventoría recomiendan instalar las estancias, pues el diseño proviene de una filosofía de la manzana del cuidado.

- Se solicita por parte del contratista definición pues ya sólo quedan dos meses del contrato.

- La próxima semana se iniciaría Riberas, una vez se finalicen las actas de vecindad, al igual de Camelias.

- El contratista aclara que los tiempos de prórroga o adicionales afectan directamente la ejecución, en lo referente al % de dedicación de los profesionales.

- Se solicita por parte del contratista, de ser posible, que se compartan los planos en dwg.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA

COMPROMISOS PACTADOS EN		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN
Revisión informe mensual social de interventoria.	SDHT	15 - 02 - 24.
Remisión informes mensuales interventoria.	Interventoria	13 - 02 - 24.
Subsanación informe mensual SST 1 - Contratista	Contratista	14 - 02 - 24
Reunión con el consultor	Contratista - Interventoria SDHT	14 - 02 - 24 Virtual, 4:00 pm.
PPTO Actualizado Santa Cecilia (Presupuesto).	Contratista	16 - 02 - 24.
Presupuesto actualizado Patio Bonito	Contratista	14 - 02 - 24.
Presupuesto actualizado Riberas	Contratista	16 - 02 - 24

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Edna Constanza Cajada.
Cargo: Directora Interventoria
Entidad: SOLUN

Firma
Nombre: Nidia Pabon
Cargo: Director de Interventoría
Entidad: Consorcio Arqing. Obra. Hábitat.

Firma
Nombre: Carolina Salazar Penagos
Cargo: Contratista SDHT
Entidad: SDHT - SO

Firma
Nombre: Carlos Mauricio Borda G.
Cargo: R.L
Entidad: Consorcio Arqing Habitat.

Firma
Nombre: Fran Andrade.
Cargo: Apoyo Supervision.
Entidad: SDHT.

Firma
Nombre: Gustavo Palacios
Cargo: Residente
Entidad: Consorcio Arqing Habitat.

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Comité de seguimiento # 4 COP 1164/23

Dependencia responsable de la reunión / actividad: Interventoría

Fecha Día / Mes / Año: 13/02/24

Hora: 8:30 am.

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Yeimy Natalia Ramirez	1059912941	Interventoria								3207094728		Yeimy Ramirez
2	Paola Andrea Leon	53026061	Contratista								3015124653		
3	Goldina Najera Cera	72301051	Contratista								316 2235695		
4	Heidi Rocio Cárdenas J.	35478754	Interventoria			X							
5	LUIS A. MEDRANO B	1997658	INTERVENTORIA			X					3103264771		
6	Yineth Cruz Aranzales.	28.797.581	Interventoria			X					3202213228		
7	Juan Sebastian Rueda	1098730130	Interventoría								3225825145	Yinethsiso28@gmail.com	
8	Edna Constanza Casada S.	51870.499	Interventoría								3176578638		
9	Gustavo Pabon B.		~~contratista~~								3017443572	proyectos@solunsas.com	
10	Rosa. Patricia Chaparro N	43743870	SDHT. - SO						X				
11	LAURA CAMILA ORDOÑA M.	1022399229	SDHT - SO						X		3105816702	rosa.chaparro@habitatbogota.gov.co	
12	Sandra Santamaria Segura	53117651	Contratista						X		3012118899	lauraordona@habitatbogota.gov.co	
13	Cesar Alan Moya	53114857	contratista			X					3134678870	ambientalcesar@gmail.com	
14	~~ERNAL~~ Anacona.	7464505	SDHT - SO			X					3106531497	miler0180@hotmail.com	
15	Nidia Pabon	52884074	Contratista						X		3212533780	ing.ambient@gmail.com	
16	MAURICIO BOTON	80724186	CONTRATISTA						X		3105560	nidiapabon@arquigo.com	
17	GUSTAVO PABON	19055247	CONTRATISTA						X		3105560	mauricioboton@arquigo.com	
18	Karen Adriana Algecíras C.	1014266409	Interventoría			X					3106760	proyectos@arquigo.com	
19											7653016	proyectos@solunsas.com	Karen A.
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO 3

6/02/24 9:00 am. 12:00 m.
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:

LUGAR: Opcima Interventoria – Solun SAS.

ASUNTO: Estado actual del contrato

ASISTENTES: Se anexa listado

ORDEN DEL DÍA:
Verificación y estado actual del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Componente social - preparación de reuniones:
· Se solicita por parte de la supervisión preparar con suficiente antelación la reunión pues se inició tarde porque el videobean llegó tarde, se inició la socialización tarde por esta razón.
- Se realizó la presentación pero el plano impreso no era el actualizado sino que era el avalado por IDRD, por tanto no correspondía a la última versión.
- Se recuerda por parte de la entidad que la idea de firmar un plano en las reuniones se debe a la espectativa que se genera por la intervención, pues la comunidad cree que se intervendrá todo el parque lo cual no obedece a las acciones de acupuntura, el mismo plano suscrito se lleva a la reunión final para las aclaraciones a lo que haya lugar.
- La interventoría manifiesta que la dedicación de la profesional social es el 100%, se solicita asistencia de la profesional al comité.
- La supervisión aclara que probablemente la social está en el otro contrato de Arging con el hábitat, la interventoría manifiesta que sí, que ya socializó con el contratista la situación para el cambio correspondiente.
Se recuerda que el componente social del contrato es primordial.
- Se solicita entregar a tiempo las presentaciones y volantes a la interventoría para revisión y trámite.
- Se solicita radicación en físico del plan de gestión social, el cual se encuentra avalado por interventoría hace 3 semanas y no se ha allegado el documento.
2. Aprobación acta anterior:

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO 3

Se aprueba el acta anterior por parte de la entidad, por parte del contratista se encuentra pendiente de revisión

3. La supervisión solicita entrega de informes mensuales y semanales, la interventoría manifiesta que se remitió el informe semanal # 4 el día de ayer y se remitirán los informes mensuales del periodo del 5 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

4. Revisión compromisos pactados:

4.1. Ajuste diseño / presupuesto, a cargo del diseñador (consultor):

La entidad informa que se solicitaron los ajustes conforme al comité pasado, el consultor manifestó que emitiría respuesta el pasado viernes, no obstante a la fecha no se ha recibido la información. El consultor manifestó que remitirá la relación del mobiliario, en cuanto al acero y el concreto manifestó que realizará la revisión pues sí se tenía contemplado.

- Se destaca por parte de interventoría que se pueden iniciar actividades de obra pero se requiere claridad.

4.2. Entrega de artes y check list vallas:

- Se cumplió el compromiso, se remitieron los artes de las vallas revisados por interventoría, con copia a comunicaciones de la entidad para su aprobación, al momento no se ha obtenido la respuesta.
- Así mismo, se remitieron por parte del contratista a la interventoría los artes con la documentación para radicado en las alcaldías locales, documentos que se encuentran en revisión.

La entidad aclara que el profesional de comunicaciones no se encuentra laborando actualmente, por lo cual se trasladó a otro profesional de SDHT para revisión.

- El contratista manifiesta que en cuánto al presupuesto, después de las mesas de trabajo el consultor debía realizar algunos ajustes o complementos, sin embargo no se allegaron los ajustes pues el consultor entregó los presupuestos trabajados en las mesas de trabajo, por ejemplo, los ítems no previstos están sin numeración con la casilla en rojo, observaciones en el costado derecho sin el complemento necesario para la subsanación de los diseños.
- Conforme a lo estableado en el comité anterior, se emitieron las observaciones en dónde se aclaró lo que hacia falta por parte del consultor, de acuerdo con lo acordado.
- Del tema presupuestal se deriva lo correspondiente al mobiliario, posibles cambios que no se han definido. El contratista informa que el día de ayer tuvo reunión con el proveedor, pero ante la falta de definición no se ha podido concretar la compra.
- Se aclara que en las presentaciones se incluye la fecha de terminación contractual, lo cuál es preocupante pues a la fecha no se ha definido el tema del mobiliario.
- En cuánto a las vallas, conforme a lo manifestado por interventoría se allegó

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO 3

el diseño y la documentación.
La SDHT manifiesta que las vallas se aprobarían en el transcurso del día.

4.3 Especificación del pigmento morado:
La entidad informa que en las mesas de trabajo se compartió el tono del pigmento para anden y vía correo electrónico, el contratista manifiesta que en efecto se recibió la información pero la misma no contiene la referencia de color (#), de acuerdo con la cartilla de la Secretaría de la Mujer se evidencia referencia #E630A0, se remitirá la información por parte de la entidad.

4.4. Entrega boletín informativo:
La interventoría manifiesta que el boletín informativo de inicio no se entregó, se elaboró pero se solicitó incluir la nota referente al suministro del mobiliario, se solicita subsanación del mismo.
El día de mañana se programaron actas de vecindad en Patio Bonito, con el acta se entregaría el boletín, el contratista manifiesta que revisará e informará si es posible entregar el boletín el día de mañana pues se está conciliando la nota para incluir en el boletín.

4.5 Cronograma por territorios:
El contratista manifiesta que se remitió el cronograma general, sin embargo, a la fecha no se cuenta con un presupuesto claro para poder definir las actividades que se van a realizar en cada uno de los territorios, en ese sentido ese cronograma sería cumplir un requisito que no es aplicable. Se solicita definir el presupuesto por parque (de cada territorio), pues con el cambio de especificaciones o mejor, con la inclusión de las especificaciones reales para la ejecución de las obras el presupuesto se va a aumentar, Lo anterior, afecta el cronograma.
Se solicita por parte de interventoría allegar el cronograma como se solicita pues forma parte de los requerimientos iniciales, así como el plan de trabajo el cual presenta observaciones, pues se debe cumplir con lo descrito en el anexo técnico el cual enuncia que el plan de trabajo como mínimo debe contener: plan de ejecución y manejo de materiales, transporte, acopios y suministros, manejo de escombros y material vegetal de acuerdo con la normatividad, señalización de seguridad para área de influencia de trabajo (incluir el PMT), implementación de las vallas (que ya se mencionaron pero no se incluyeron en el plan), señalización peatonal, medidas de mitigación de impacto ambiental por transito de volquetas y maquinaria, vibraciones, ruidos, emisiones, cierre de vías y pasos, generación y acopio, aprobación de especificaciones técnicas. No hay desglose ni descripción de lo expuesto, el documento no se acepta bajo estas condiciones pues no se cumple con lo descrito en el anexo técnico, el plan debía entregarse

dento o a los 5 días posteriores a la firma del acta de inicio. Se solicita subsanación.

El contratista manifiesta que es importante tener en cuenta que hay actividades que se pueden enunciar en el documento pero que están en los otros planes como el PMA, el PGRCD, entonces el plan de trabajo no debe repetir lo que contienen los otros planes.

La interventoría aclara que no se trata de repetir la información, lo que se solicita es hacer referencia o el resumen básico del tema pues el documento es un manual, en cuanto a lo técnico está el uso del color pero no se incluyó en el documento.

El contratista aclara que para el componente técnico del manual depende de la definición del presupuesto, pues si el alcance del contrato, específicamente del mobiliario no está definido pues el documento no tendrá la información clara.

Se reitera que se necesita claridad de las intervenciones a realizar para poder plasmar cómo se van a hacer, sin mencionar que el tiempo del contrato sigue avanzando sin ésta definición.

Se propone realizar mesa de trabajo para subsanación del plan de trabajo, pues el mismo se puede realizar ya que en éste no se incluyen cantidades.

La entidad informa que ya se designó subdirector, quien será el supervisor del contrato para tomar las decisiones correspondientes. En cuanto al mobiliario, se aclara que en la socialización se manifestó que se instalaría mobiliario pero no se definió cuál, por tanto, no se ha presentado inconveniente con comunidad.

La interventoría solicita que se aclare que el mobiliario está en proceso de definición, por temas de fabricación y de tiempos.

El contratista manifiesta preocupación pues el mobiliario y los juegos representaban por lo menos 700' del presupuesto, posterior a las mesas de trabajo se retiró 1 juego para compensar otras actividades y en este momento no es claro el mobiliario, no se sugiere cambiar las estancias que son la esencia del diseño, la interventoría manifiesta que las estancias se pueden realizar con otro tipo de elementos, el contratista manifiesta que se puede pero es empezar el proceso de cero desde el diseño lo que afecta el tiempo.

La entidad manifiesta que solicitará aclaración para definición por parte del nuevo supervisor.

Se aclara que de acuerdo con la experiencia y lo indicado por el proveedor, el concreto del mobiliario debe ser de 4.000, adicionar fibras y demás, por ello el valor se incrementa.

Se manifiesta preocupación por el tiempo del contrato.

5. Componente social:

-El día de hoy se realizará reunión en Santa Cecilia, se aclara que el plano impreso que se presenta no es la última versión.

El contratista manifiesta que la información se recibió, aclarando lo acontecido en la reunión del sábado, se recibió la información el 24 de enero de 2024,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO # 3

no obstante, cuando se revisó la carpeta se evidencia modificación al plano el 25 de enero, razón por la cual se solicita cerrar el tema y que no se comparta un drive donde el consultor seguirá editando sino que se entregue un archivo de descarga para que todos tengamos la misma información.
- Se aclara en el plano de Santa Cecilia, sólo se va a pintar la demarcación y no las pintura completa, las bancas se desplazaron de lugar, de acuerdo con la mesa de trabajo.
- Se contemplaría colocar las estructuras de voleibol (sin mallas), no se arregla la concha, sólo es demarcación.
- Zona de juegos de piso pintados no se contempla.
- Mobiliario (bancas) para evitar parqueo, no es procedente pues está fuera del polígono del parque.
- El juego se conservaría.
- El plano se cambiará en físico, en el plano y en el boletín informativo.
- En cuanto a la fecha de terminación del contrato, si la misma se llega a modificar se informará a la comunidad con los miembros (5) del comité.
- La entidad hace entrega de la última versión de las plantas (planos) de cada parque para las presentaciones.
- Se aclara que en el PPTO no hay adoquín
- los andenes son en concreto.
- El adoquín sería un ítem complementario para el tema del manejo de las raíces
- No se incluye acero en el contrato, la descripción del concreto no incluye acero, pos lo cual sería un ítem complementario.
- Las dilataciones serían moradas, el adoquín sería gris.
- Se solicita presencia de todos los profesionales del contratista en las reuniones sociales, de interventoría han asistido todos los componentes.
- Se solicita presencia de la profesional social del contratista en los comités, pues la dedicación es del 100%, referente a ello el contratista manifiesta que remitirá cambio de la profesional.
- Se solicita tomar las medidas pertinentes para cumplir con la hora de inicio de las reuniones.
- El contratista aclara que la profesional social no pudo asistir al comité debido a un tema familiar, pero sí se tenía prevista la asistencia.
- Se recuerda que mañana hay 2 reuniones más: a las 2 en Riveras de occidente y a la 5 en las Camelias, se solicitan las presentaciones y boletines informativos, se recuerda que esta documentación debe remitirse 5 días antes para su revisión y aprobación.
- La entidad solicita cumplir con los tiempos de entrega para poder revisar con tiempo, mínimo 1 día antes.

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 3.

7. Componente ambiental:
- Las vallas están avaladas, es sólo colocar las comillas al inicio del objeto.
- En cuánto al trámite de los documentos ayer se emitieron observaciones que no se han subsanado en su totalidad en cuanto ubicación de los parques (dirección de las vías) en Chunza.
- Si la entidad aprueba el arte hoy se radicarían las vallas en las Alcaldías locales respectivas el día de mañana.
- Se solicita presencia en los comités del profesional ambiental del contratista.

8. Componente SST:
- El plan SST se encuentra avalado pero no se ha radicado en Físico.
- Se aclara que se debe allegar el paquete completo para radicar a la entidad.
- Se recibió información del personal mínimo contractual, faltan 4 examenes médicos, el contratista informa que se encuentra trabajando en lo correspondiente.
- Se solicita iniciar con la logística para la dotación de trabajadores, se anexa al presente guía de indumentaria de personal mínimo requerido. Se socializa el color de la chaqueta.
- Para parte operativa rojo con negro y # del contrato.
- Se solicita remisión de documentos de personal operativo, previo al ingreso de personal a cada territorio.
- El contratista manifiesta que no ha ingresado con personal por la definición del alcance, sin embargo se tiene previsto entrega de documentación esta semana.
- La entidad solicita iniciar los cerramientos, el contratista manifiesta que es necesario definir alcance para evitar inconvenientes de tener un cerramiento sin personal trabajando. Se reitera que aún no se tiene la definición de juegos y mobiliario.
- No es válida la homologación de juegos para el contrato, por temas de calidad.
- En Patio Bonito la comunidad ha sugerido colocar gimnasio multifuerza en vez de juego, en la ejecución de los diseños.
- En la socialización de obra se solicitó que no se instale piso de caucho, por temas de consumo.

* Se solicita entrega de informes mensuales del periodo comprendido entre el 5 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

- Se evaluará la posibilidad en Patio Bonito de instalar gimnasio multifuerza en la zona a intervenir, no se puede aumentar la zona.
- Se solicita aclarar en las presentaciones que la intervención es mantenimiento y no obra nueva, pues se manifestó anteriormente que es "parque nuevo", lo cual no corresponde al contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITE SEGUIMIENTO # 3.

- Se sugiere visita a terreno para aterrizar presupuesto.

9. Componente técnico:
- En Camelia se presenta inconveniente con lo de la virgen, se define que la comunidad haga el retiro de la virgen para la intervención propuesta.
- En cuánto a los andenes en concreto se aclara que según diseño es morado, pues es muy difícil obtener un tono uniforme de morado en el concreto, casi que es 1 tono por fundida.
- Se evalúa la opción de plaquetas prefabricadas moradas para las dilataciones
- Se aclara que en Camelia los biosaludables están en garantías.
- El plano de Camelia sí es la última versión.
- Se solicita nuevamente aclarar con el consultor para que remita la última versión sin ediciones posteriores.
- En cuánto a las intervenciones de los senderos se debe recalcular el área, pues se tiene una porción del anden pero el mantenimiento se requiere completo. (Parque Chunizal).
- En las graderías propuestas se tiene el mismo problema de las tonalidades moradas pues no será uniforme.
La interventoría manifiesta que las graderías no se aprueban por IDRD, a menos de que sea mantenimiento de lo existente, No se avalan nuevas por normatividad. (Santa Cecilia).
- (Santa Cecilia): La cancha no se va a pintar, es sólo la demarcación.
- Se reitera que no hay adoquín en el PPTO, es todo concreto.
- Se reitera que el morado se debe manejar en una gama de tonalidades pues no es posible técnicamente conseguir el mismo morado: por clima, por los agregados, por el cemento, etc.
El morado claro no cumple con la resistencia del contrato, pero se podría realizar en otro tono, pues el morado claro necesita cemento blanco el cual no aporta a la resistencia, debe ser cemento gris, por lo cual, se tendrá otro tono.
- Se solicita realizar pruebas para los tonos, el contratista aclara que realizará la labor pero no demolición de lo realizado por tonalidad.
- Se solicita ser precisos en la reunión con el alcance.
- En cuánto a los andenes se tiene el inconveniente de las domiciliarias en la parte de arriba y abajo del territorio, los senderos se encuentran en mal estado. Demoler los andenes por las domiciliarias no se podría.
- Para mantenimiento de módulos se revisará cada tema puntual de acuerdo con la directriz de la Alcaldía Local.
- Se revisará el tema de las domiciliarias en campo.
- Para la loseta táctil se podría instalar, de color convencional del mercado.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO #3.

- Para el tema del informe semanal, dadas las condiciones de definición y ajuste del contrato, aún no se incluirá el tema de la programación, sino el tema social.
- Se debe actualizar la programación por territorio, para ello se debe cerrar el tema de las observaciones del consultor.
- Se solicita la remisión de los ítems complementarios para la revisión correspondiente.
- Se solicita iniciar las actividades de obra, para darle dinamismo al contrato, el contratista manifiesta que está en pro de ello sin embargo preocupa un inicio de obra sin definiciones claras y que el personal de obra no tenga una directriz.
- Los giros del anticipo solo se autorizan por actividades incluidas en el contrato.
- Por el momento no se proyecta cobro de acta para febrero, se proyecta para inicios de marzo.
- Se propone mesa de trabajo de APU's y presupuesto para la próxima semana, se entregarían los documentos para revisión esta semana por parte del contratista.
- Se recuerda que se debe incorporar el cambio de la especificación del concreto en el presupuesto.
- Se recuerda que se solicita asistencia de todos los profesionales del contratista a la reunión social.

- Se aclara que la sigla PPTO obedece a Presupuesto.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE COMITE SEGUIMIENTO 3

ASISTENTES:

Firma
Nombre: LAURA CAMILA OROZCO
Cargo: CONTRATISTA - ARQ.
Entidad: SDHT - SD

Firma
Nombre: JEAN ANGARITA.
Cargo: APOYO SUPERVISION
Entidad: SDHT.

Firma
Nombre: Rosa Patricia Chaparro.
Cargo: Contratista - Prof Social AAU
Entidad: SDHT.

Firma
Nombre: CAREN MARCELA BOSON
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: C ARQUITECTURA.

Firma
Nombre: Edna Constanza Caicedo.
Cargo: Directora Interventoria.
Entidad: SOLIUM.

Firma
Nombre: LUISA MEDRANO R.
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA
Entidad: SOLIUM INGENIERIA

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA

COMPROMISOS PACTADOS EN		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
Mesa de trabajo subsanación plan de trabajo	Contratista - Interventoría	7-02-24.
Entrega informes mensuales	Contratista /Interv	10-02-24.
Ajuste diseño /presupuesto	Consultor	Pendiente. Próximo jueves (8-2-24)
Aprobación artes vallas	SDHT	6-02-24.
Referencia pigmento morado.	SDHT	7-02-24.
Cronograma por territorio	Contratista	Pendiente.
Ultima versión diseños carpeta	SDHT	Pendiente.
Cambio hoja de vida prof social	Contratista	Próx comité.
Subsanación doc vallas Rad. Alcaldías.	Contratista	8-02-24.
Rad en físico Planes	Contratista	8-02-24
Documentos personal operativo	Contratista	9-02-24.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA


Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: Comité de seguimiento #3 COP 1164 - 2023

Dependencia responsable de la reunión / actividad	Interventoría	Fecha Día / Mes / Año	6-02-2024.	Hora:	9:00 am.

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Diana Marcela Gome Contreras	1020746809	Solion					X			3194281034		
2	Edna Constanza Cepeda	51870499	Solion							X	3017443572	proyectos@solionsas.com	
3	Juan Sebastian Rueda	1098730430	Solion								3175678638		Juan Rueda
4	Galdino Moyera Otero	72301051	Arqingco Habitat								3162253598	galdino@yahoo.com	
5	Yeimy Natalia Ramirez	1057412941	Solion								3207094728		Yeimy Natalia R.
6	Carolina Salazar	1020820361	SDHT-SO						X		3208952025	mary.salazar@habitat	Carolina S P
7	JEAN ANGARITA. H.	79645805	SDHT-SO						X		3212563770	jean.angarita@HABITAT.	
8	LUIS A. MEDRANO B.	1031658	SOLION SAS								3202132228		
9	Oscar Gómez	1032364321	SDHT-SO						X		3208176654	oscar.gomez@HABITAT	Oscar Gómez.
10	LAURA CAMILA ORDUÑA	1022399244	SDHT - SO						X		3012115899	laura.orduna@habitatbogota	
11	CINDERA HURTADO	53116837	CONTRATISTA						X		3068514497		
12	Dimeth Cruz Arcinale,	39797551	Solionsas								3224587515		
13	Rosa P Chaparro	47638890	SDHT.						X		3105816702	rosa.chaparro@habitatbog	
14	Maria Rosario Cárdenas	35478759	Solion SAS								3103264771	Sand. Solion@sdi.com	Maria Rosario C.
15	Nidia Pabon	52884074	C. ARQING HABITAT						X		3106560	nidiapabon@arqingco.com	
16	Gustavo Palacios	19055241	C. ARQING HABITAT						X		3106560	gustavopalacios@arqingco.com	
17	Mauricio Botón	80724186	C. ARQING HABITAT						X		3106560	mauriciobotan@arqingco.com	
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

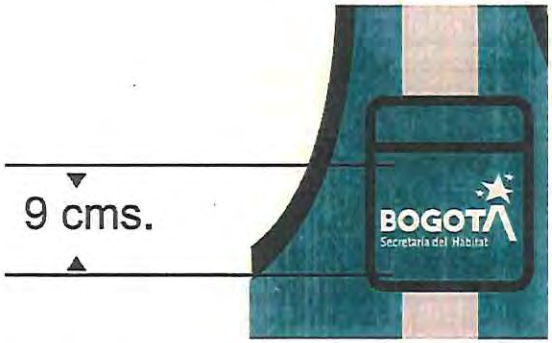







Chaqueta con mangas removibles

Personal Profesional (interventoría, estudios y diseños, consultorias, obra)

Descripción:

- Material impermeable en color verde aguamarina (corresponde al color del Sector Hábitat)- **Basado en Manual de Marca de Alcaldía Mayor**
- Cuello en V y bordes negros de 1 cm
- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.
- Bolsillos externos e internos como se indica.
- Deberán portar los escudos como se indica, además el letrero **CONTRATISTA O INTERVENTORÍA,** según sea el caso y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.

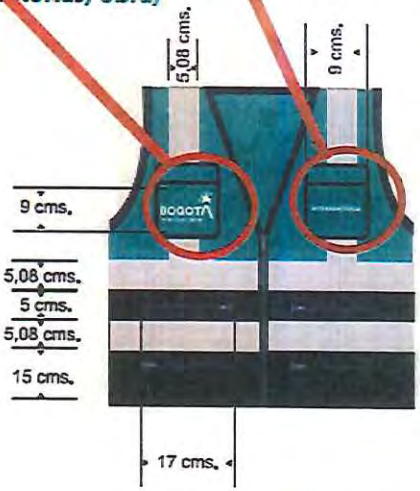

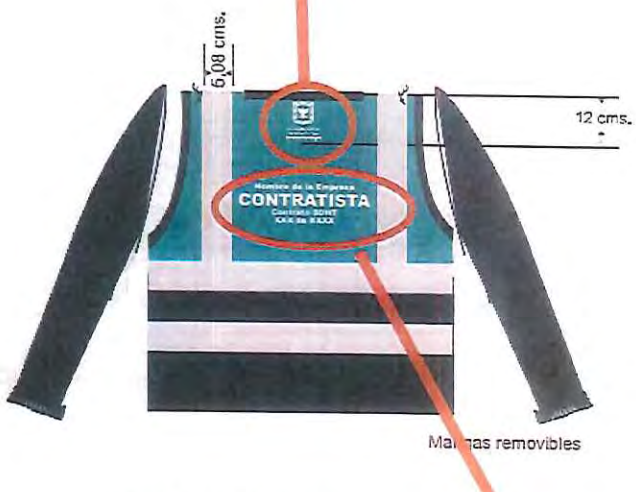

Mangas removibles

Nombre de la Empresa
INTERVENTORÍA
Contrato SDHT
XXX de XXXX

Nombre de la Empresa
CONTRATISTA
Contrato SDHT
XXX de XXXX

Nota. Tambien aplica para los profesionales y/o residentes de contratos que realicen reconocimiento en terreno, comisión de topografía o recorridos. Deberán estar plenamente identificados con la dotación según se indica.

INTERVENTORIA

CONTRATO SDHT

1160 de 2023

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SOLIUN

FECHA DE ELABORACIÓN	domingo, 25 de febrero de 2024	INFORME No.	7	PERIODO	DEL	19/01/2024	AL	25/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORMACIÓN GENERAL DE PARQUES		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA - SOLIUN SAS		CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO ARQUING HABITAT
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1160-2023	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	4/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19/04/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	67 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	67 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 291.788.204,00	VALOR INICIAL :	$ 2.528.960.329,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 758.688.098,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 291.788.204,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.770.272.231,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 291.788.204,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.770.272.231,00
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO	INTERVENTOR:	SOLIUN SAS

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO				N/A	
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

CONTRATO DE OBRA

Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO	11	1	2024	$ 758.688.098,00	30
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN								
No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	FASE DE OBRA							
1.0	PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE					33%	37%	4%
	- Se inician las actividades de obra con los preliminares como: cerramiento provisional de obra, protección de sumideros, protección de individuos arbóreos, instalación de señalización vehicular y peatonal, instalación de vayas informativas, demolición de piso en concreto y desmonte de bancas existentes. - Se cuenta en obra con un total de 3 trabajadores operativos para este frente. - Se solicita por parte de la interventoría la correcta implementación del PMT, según lo aprobado por la SDM. - Se verifica implementación y cumplimiento de temas correspondientes a programas ambientales y SST							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		40%	45%	5%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		3%	0%	-3%
3	MOBILIARIO			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
2.0	PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA					0%	0%	0%
	- La demora en el inicio de las actividades de obra del presente territorio, responden a la dificultad que se presentó para la programación y realización de la reunión social de inicio, inicialmente se programa el día martes 06 de febrero contando con la asistencia de personal de la SDHT, contratista e interventoría, que por motivo de baja asistencia por parte de la comunidad no se pudo realizar. Posteriormente se propone una segunda fecha el día sábado 24 de febrero, la reunión para esta fecha no se pudo programar ya que la comunidad manifestó tener otra actividad que se cruzaba con el horario propuesto. Finalmente, para el día lunes 26 de febrero se programó la reunión social de inicio en común acuerdo entre las partes incluyendo la comunidad. - Se define nuevo alcance para las actividades de obra a realizar en el parque Santa Cecilia, teniendo en cuenta las condiciones actuales del parque que cuenta con pólizas de estabilidad vigentes sobre las zonas de intervención propuestas inicialmente.							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		0%	0%	0%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
3	MOBILIARIO			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
3.0	PARQUE URBANIZACION LA CAMELIA					20%	15%	-5%
	- Se inician las actividades de obra con los preliminares como: cerramiento provisional de obra, protección de sumideros, protección de individuos arbóreos, instalación de señalización vehicular y peatonal, instalación de vayas informativas, demolición de piso en concreto y desmonte de bancas existentes. - Se cuenta en obra con un total de 3 trabajadores operativos para este frente. - Se solicita por parte de la interventoría la correcta implementación del PMT, según lo aprobado por la SDM. - Se verifica implementación y cumplimiento de temas correspondientes a programas ambientales y SST							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		25%	20%	-5%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
3	MOBILIARIO			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
4.0	PARQUE PATIO BONITO II - D					21%	23%	2%
	-Se continua con las actividades de desmonte de adoquín en senderos peatonales, demolición de bordillos de confinamiento de zonas peatonales, se realiza retiro de material de demolición. - Se cuenta en obra con un total de 4 trabajadores operativos para este frente. - Se solicita por parte de la interventoría la correcta implementación del PMT, según lo aprobado por la SDM. -Se verifica implementación y cumplimiento de temas correspondientes a programas ambientales y SST							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		28%	30%	2%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
3	MOBILIARIO			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
5.0	PARQUE CHUNIZA 1					17%	2%	-15%

	- Se realiza levantamiento de actas de vecindad							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		24%	2%	-22%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
3	MOBILIARIO			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%

4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1						N/A
2						0,00%

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	9,00%	13,00%	-4,00%
Durante la Semana	7,00%	5,00%	2,00%
Actual Acumulado	16,00%	18,00%	-2,00%

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Falta aclarar por parte del consultor los temas de controversia presentados por parte de la SDHT, contratista de obra e interventoría.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
1.- Por parte del equipo de supervisión de SDHT se realizaran las consultas pertinentes al consultor para posteriormente trasmitir las aclaraciones a cada una de los temas presentados.	supervisión de la SDHT		27/02/2024

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1-Se esta evaluando la necesidad de generar nuevos análisis de precios unitarios complementarios de acuerdo a la revisión preliminar y las inconsistencias encontradas en los estudios y diseños.
2- Según lo expuesto por el consultor en reunión virtual del día miércoles 14 de febrero, se encuentra incluido dentro del AIU de los 13 territorios parte del campamento, los baños y el PMT. La SDHT informa que se encuentra a la espera de que el consultor lo defina el desglose del AIU para los 5 territorios que contempla el contrato 1164 del 2023, lo anterior con el fin de dar claridad sobre los ítems en cuestión.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

1- Se da inicio a las actividades de obra en los parques Riveras de Occidente y La Camelia.
2-Adicional a las actas de vecindad diligenciadas en los parques Patio Bonito, urbanización La Camelia y Riveras de occidente, en el trascurso del periodo de la presente semana se realiza el diligenciamiento de las actas de vecindad correspondientes al parque Chunlza
3-El contratista presenta en comité de obra, la muestra del adoquín de color que se va a utilizar en las zonas definidas para el presente contrato, el cual es probado por parte de la SDHT para su implementación.
4-Asistencia a comité de avance de obra, revisando el estado actual de los contratos de obra e interventoría.
5-Se solicita al contratista de obra la implementación del PMT de acuerdo a lo presentado y aprobado a la SDM.

Aspectos administrativos:

1- Se radican los informes mensuales de interventoría una vez atendidas las observaciones y recomendaciones realizadas por la entidad.
2- Se solicita al contratista de obra entregar a la interventoría la documentación requerida tanto ambiental como de calidad para los proveedores de los materialesnecesarios para la ejecución de las actividades de obra.
3- Se emiten observaciones a matriz de inspección y ensayos del contratista de obra.
4- Se remite a la SDHT el informe semanal No.6 por parte de la interventoría
5- Se emite concepto favorable por parte de la interventoría para el tramite de la orden de giro No.1 presentada por el contratista de obra
6- Se remite a la entidad la programacion de obra segun las condiciones actuales del contrato, lo que quiere decir que se encuentra sujeta a cambios debido a la necesidad de implementar actividades adicionales.

Componente ambiental

1-Se participa en Comité del contrato en Oficina de Interventoría Soliun . 20/02/2024
2-Se realiza recorrido a el Parque patio Bonito II -D , Parque Riberas de Occidente y Parque Camelia el día 22/02/2024 , donde se verifica aspectos relacionados con Vallas , sumideros , individuos arbóreos, puntos de recolección de residuos.
3- Se remite al correo oficio SDHT-1160-2024-079 - Observaciones SST-MA el día 23/02/2024 relacionado con observaciones realizadas producto de recorrido realizado el día anterior.

Componente SST

1-Se realiza recorrido parque (Patio Bonito), se verifica personal (4) trabajadores, Riveras del Occidente (3) trabajadores, Camelias (3) trabajadores.
2-Revisión de documentación, verificación de entrega de elementos de Protección Personal inducción y dotación.
3-Se participa en comité del contrato en la oficina de la Interventoría.
4-Se remite observaciones al contratista por medio de oficio.

Componente social

1- Revisión de pieza informativa para reunión de inicio del parque: Santa Cecilia, se da aprobación por el profesional social de la interventoría y se remite a la entidad quien aprueba volante informativo para proceso de convocatoria, posterior envió a profesional social del contratista para proceso de divulgación.
2- Revisión de presentación para reunión del parque Santa Cecilia la cual presento observaciones remitidas al contratista quienes ajustan y remiten nuevamente, se revisa y se remite a la entidad.
3- Realizar ajustes a informe mensual no. 1 y plan de seguimiento social de Interventoría.
4- Verificación mediante registro fotográfico, del proceso de convocatoria a reunión de inicio Parque Santa Cecilia.

9, Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL

PERSONAL INTERVENTORIA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

PERSONAL DE OBRA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPO / MAQUINARÍA	CANT.
RETRO EXCAVADORA	0
MINICARGADOR	0
VOLQUETA	0
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	0
MARTILLO NEUMÁTICO	0
COMPRESOR	0
CANGURO APISONADOR	0
TOTAL	

ESTADO DEL TIEMPO		
DIA	ORAS DE LLUVI	ESTADO
LUNES	0	
MARTES	0	
MIÉRCOLE	0	
JUEVES	0	
VIERNES	0	
SÁBADO	0	
DOMINGO	0	
TOTAL DE Hr.	0,00 Hr/semana	

ESTADO
LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Los ajuste necesarios sobre el presupuesto, APU'S y la inclusión de actividades adicionales para la correcta ejecución de las actividades de obra, generan afectaciones sobre la definición del balance presupuestal de obra definitivo.
2-El atraso que presenta la programación, responde a demoras en el desarrollo de reuniones sociales de inicio, por circunstancias de disposición y asistencia por parte de la comunidad en territorio correspondiente a Santa Cecilia.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ

BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SOLIUN

FECHA DE ELABORACIÓN	domingo, 18 de febrero de 2024	INFORME No.	6	PERIODO	DEL	12/01/2024	AL	18/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORMACIÓN GENERAL DE PARQUES		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA - SOLIUN SAS		**CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO ARQUING HABITAT**
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1160-2023	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1154-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	4/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19/04/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	61 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	61 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 291.788.204,00	VALOR INICIAL :	$ 2.528.960.329,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 758.688.098,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 291.788.204,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.770.272.231,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 291.788.204,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.770.272.231,00
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO	INTERVENTOR:	SOLIUN SAS

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO				N/A	
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

CONTRATO DE OBRA

Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO	11	1	2024	$ 758.688.098,00	30
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN								
No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	FASE DE OBRA							
1	PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE					23%	36%	13%
	-Se realiza reunión social de inicio con la comunidad y contando con la asistencia de personal de interventoría, contratista de obra y SDHT -Se realiza el levantamiento de actas de vecindad de los predios que colindan con la zona de intervención -Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM -Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría							
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		29%	46%	17%
	INFORME DE REVISION Y OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			0		100%	100%	0%
	Mesas de trabajo, concertaciones y Entrega documentacion contractual			0		100%	100%	0%
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD			0		100%	100%	0%
1,1	Localización, trazado y replanteo.			0		67%	100%	33%
1,2	Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		4%	100%	96%
1,3	Demolición de andenes ó pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		20%	0%	-20%
1,4	Desmonte de barandas existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		100%	0%	-100%
1,5	Demonte de bancas en concreto existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,6	Excavación mecanica ó manual de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ			0		0%	0%	0%

1,7	Desmonte de basurera existente BE 01, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		100%	0%	-100%
1,8	Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		100%	0%	-100%
	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro (CIO 10206)			0		100%	0%	-100%
	Alquiler Campamento 36 m2 incluye servicios públicos provisionales INSUMO IDU 8577			0		15%	12%	-3%
	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS) APU CIO 13521 MES			0		15%	12%	-3%
	Control y manejo de tránsito. Incluye todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas necesarias para el desarrollo de la obra. Incluye personal necesario para manejo de tránsito con chaleco reflectivo e implementos de seguridad			0		15%	12%	-3%
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro) (cio 14439)			0		15%	0%	-15%
	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro (cio13660)			0		100%	0%	-100%
	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.** (CIO 11391)			0		100%	0%	-100%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		100%	0%	-100%
2,1	A04_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 2.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	A5_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas circulares de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con diametro de 0.30 m, espesor de 0.08 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado. adosado sobre zona verde existente o nueva, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A05 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,3	A04B_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 1.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,4	Suministro, transporte o instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ, de dimensiones ancho 32 cm, espesor 10 cm y longitud variable, adosado sobre anden en concreto existente o nuevo para conformación de sistema de movilidad peatonal tipo MP01, MP 02 ó MP03, incluye la demolición del elemento existente en los puntos a instalar, así una capa de base de 15 cm. La botada del material sobrante de la demolición se contempla dentro de esta.			0		0%	0%	0%
2,5	A01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de espesor ademas los materiales y elementos necesarios para correcta construcción según diseño y medidas establecidas en plano ademas de , curado, protección hasta la entrega final.			0		0%	0%	0%
2,6	A03_PISO EN CAUCHO. Construcción de PISO EN CAUCHO PIGMENTADO MORADO (EPDM). Acabado en piso de 15mm, incluye sub base granular e= 11cm, Losa en concreto de 21 Mpa de e = 7cm, estireno butaideno (SBR) de e = 4cm. pingemento color morado. Acabados según aprobación de diseñador, Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
2,7	PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.			0		0%	0%	0%
2,8	PPC02_PINTURA PISO CICLORUTA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de ciclorutа PCC02.			0		0%	0%	0%
2,9	Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimenciones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, Sub base granular de e = 0.05 y gravialla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			0		0%	0%	0%
2,1	Construcción de GRADERIA EN CONCRETO VACIADA EN SITUI de concreto de 21 Mpa o 3000 PSI y pigmento morado, conformado por 2 contra hullas de 0.50m y 2 huellas de 0.40m ademas de 2 llaves de cimentación de 0.20m de espesor y 0.30m de ancho, la longitud de ambos elementos es variable, ademas incluye excavaciones y todo lo necesaria para su debida ejecución, fraguado y entrega a satisfacción.			0		0%	0%	0%
2,11	Construcción de ADOQUIN TACTIL GUIA DE 0.20x0.20x0.06, con pigmento color morado acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,12	Construcción de A20_LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 0.40x0.40x0.06, con pigmento color AMARILLO acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,13	ES01_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 10 contrahuellas y 10 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.15 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,14	ES02_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,15	ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,16	ES04_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 4.0 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,17	ES05_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 3.55 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,18	ES06_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 2.00 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,19	ES07_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 14 contrahuellas y 14 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso Ibtermedio, con huella de hasta 0.3 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	ES08_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 8 contrahuellas y 8 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso Ibtermedio, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,21	ES09_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 5 contrahuellas y 5 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,22	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto F'c = 21 Mpa para zapatas corridas en cimentación de muros de contención, incluye formaletas, aditivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
2,23	Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución			0		0%	0%	0%
2,24	Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción, así como la disposición de cualquier residuo de excavación y/o residuo de construcción luego de la terminación de la actividad, ademas del aseo y la limpieza final del area de trabajo.			0		0%	0%	0%
2,25	Suministro, transporte e instalación de bolardo metalico alto en hierro Referencia M-63, incluye la exvación de la zona de instalación, suministro, transporte e instalación de concreto F'c = 21 Mpa preparado en obra para la cimentación del bolardo, el cargue y la disposición final de residuos de excavación y/o residuos así como el aseo y limpieza final de la zona de intervención.			0		0%	0%	0%
	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3			0		0%	0%	0%

	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A APU CIO 19249			0		0%	0%	0%
	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Ciiln APU CIO 15085			0		0%	0%	0%
	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)** APU CIO 10415			0		0%	0%	0%
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos APU CIO 12541			0		0%	0%	0%
	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)(CIO 15669)			0		0%	0%	0%
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			0		0%	0%	0%
	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)			0		0%	0%	0%
3	**MOBILIARIO**			0		0%	0%	0%
3,1	EC02_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC02, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	EC03_ESTANCIAS DE CONTEMPLACION Construcción de ESTANCIA CONTEMPLACIÓN EC03, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado. incluye sisitema de cimentación conformado por 2 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 7 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 7 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,3	EC04_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC04, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,4	EC05_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC05, conformada por 1 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,5	EC07_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC07, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 4 esferas prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado; incluye sistema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,6	EA01_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA01, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 esfera prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 5 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,7	EA03_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,8	EA05_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA05, conformada por 4 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 9 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,9	EA06_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA06, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 4 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,1	EA07_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de ESTANCIA DE ABRIGO EA07, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 4 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.62, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,11	EA08_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA08, conformada por 1 banca prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de an concreto de 3000 psi ó 21 MPa ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 3 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,12	EAP01_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 mesa circular de ajedrez prefabricada en concreto de 21 Mpa o 3000 PSI con radio de 0.40, 1 Pedestal en concreto de 21 Mpa y/o 3000 PSI con pigmento color morado de 0.24m de base mayor 0.11m de base menor y terminación circular con altura de 0.11m, el resto de pedestal posa una altura de 0.55m y ancho de 0,30m. , incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, ademas de anclajes mesa - pedestal pedestal - cimentación incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,13	EAP02_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP02, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,14	EAP03_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de estancia de apoyo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 6 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts,1 mesa de juegos conformada por una superficie de 0.80 mts de diametro y e 0.08 mts, una semi esfera y un pedestal en concreto f'c = 21 Mpa color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 8 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,15	ER01_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,16	ER02_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER02, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,17	ER03_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER03, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 4 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,18	ER04_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,19	ER05_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER05, conformada por 5 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,3 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 12 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	BS01_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA SIMPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,21	BS02_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,22	BS03_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA TRIPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,23	JI04_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI04.			0		0%	0%	0%
3,24	JI05_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI05.			0		0%	0%	0%
3,25	JI06_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI06.			0		0%	0%	0%
3,26	JI07_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI07.			0		0%	0%	0%
3,27	JI08_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI08.			0		0%	0%	0%
3,28	JI09_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI09.			0		0%	0%	0%

3,29	Cerramiento contra impacto IDRD h=5.00 m. (tubo galvanizado, varilla redonda, malla eslabonada y ángulo. acabado superficial en pintura líquida resistente a la intemperie, incluye viga de cimentación) (incluye suministro e instalación)			0		0%	0%	0%
3,3	BS01_Suministro, transporte e instalacion de GIMNASIO BIOSALUDABLE, conformado por EQUIPO 1, EQUIPO 2, EQUIPO 3 y EQUIPO 4. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
3,31	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 1.70 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de fijación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,32	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 0.80 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de fijación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,33	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elemantos de fijación de acuerdo con diseños arquitectonicos			0		0%	0%	0%
3,34	Suministro, transporte e instalación de puerta para cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación, bisagras, broche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo con diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,35	C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,36	M05_BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto color morado de 21 Mpa o 3000 PSI con espaldar elaborado en tubular de 2" pintado con pintura electroestatica. Dimensiones 2.10 x 0.44 x 0.67, incluye los elementos elementos de apoyo a través de una esfera en concreto prefabricada color morado de 21 Mpa ø = 0.22 mts y una semiesfera de a= 0.44 mts y h= 0.22 prefabricada en concreto color morado ambas con el centro hueco ø = 0.08, y las cimentaciones a través de 2 zapatas de 0.50 x 0.50 x 0.50 y un pedestal de ø = 0.08 mts y h= 0.58 mts, acero de refuerzo, exacavación con cargue y disposición final ademas de todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
4,1	Suministro, transporte e instalación de grama, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.			0		0%	0%	0%
4,2	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo en tierra negra medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación y conformación de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
4,3	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo limo arenoso medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación hasta alcanzar minimo el 85% del proctor del material, conformación y de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%

5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
5,1	JIE01_JUEGOS INFANTILES EXISTENTE. Mantenimiento de juegos infantiles existentes. Incluye revisión y ajuste, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,2	JIE02_BIOSALDABLES EXISTENTE. Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre existentes. Incluye revisión y ajuste, reemplazo de elementos en mal estado, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,3	MCA01_LIMPIEZA DE CARCAMO EXISTENTE. Retiro de tapas, limpieza, extracción de residuos y disposición final en carcamos existentes de hasta 0.50 x 0.50,.incluye la disposición final de todos los residuos retirados y la posterior reinstalación de las tapas existentes en buen estado.			0		0%	0%	0%
5,4	MCA02_REEMPLAZO TAPAS DE CARCAMO. Retiro y reemplazo de tapas de carcamo prefabricadas en concreto de 0.40 mts de ancho para uso peatonal			0		0%	0%	0%
5,5	RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla similar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revite en arena de revoque y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la disposición de los escombros sobrantes del adoquin retirado en mal estado en lugar autorizado por entidad ambiental competente.			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
6,1	SRC ó SRG 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.80 x 1.20 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción de pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,2	SRI 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRI 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.60 x 0.70 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,3	SRJ 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRJ 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1 x 3.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 1.30, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,4	SRU 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRU 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1.00 x 2.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,5	SRV 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.401 x 0.301 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
2	PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA					11%	0%	-11%

	- Se realizan actividades documentales por parte del área social para programar la reunión de inicio con la comunidad y el posterior levantamiento de actas de vecindad -Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM -Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría							
1	**PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS**			0		15%	0%	-15%
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD			4		100%	0%	-100%
1,1	Localización, trazado y replanteo.			3		60%	0%	-60%
1,2	Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			2		4%	0%	-4%
1,3	Demolición de andenes ó pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			1		25%	0%	-25%
1,4	Desmonte de barandas existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,5	Demonte de bancas en concreto existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,6	Excavación mecanica ó manual de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ			0		0%	0%	0%
1,7	Desmonte de basurera existente BE 01, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,8	Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro (CIO 10206)			0		0%	0%	0%

	Alquiler Campamento 36 m2 incluye servicios públicos provisionales INSUMO IDU 9577			9		13%	0%	-13%
	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS) APU CIO 13521 MES			9		13%	0%	-13%
	Control y manejo de tránsito. Incluye todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas necesarias para el desarrollo de la obra. Incluye personal necesario para manejo de tránsito con chaleco reflectivo e implementos de seguridad			9		13%	0%	-13%
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro) (cio 14439)			0		0%	0%	0%
	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro (cio13660)			0		0%	0%	0%
	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.** (CIO 11391)			0		0%	0%	0%
2	**OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES**			0		0%	0%	0%
2,1	A04_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 2.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	A5_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas circulares de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con diametro de 0.30 m, espesor de 0.08 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado. adosado sobre zona verde existente o nueva, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A05 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,3	A04B_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 1.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,4	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ, de dimensiones ancho 32 cm, espesor 10 cm y longitud variable, adosado sobre anden en concreto existente o nuevo para conformación de sistema de movilidad peatonal tipo MP01, MP 02 ó MP03, incluye la demolición del elemento existente en los puntos a instalar, así una capa de base de 15 cm. La botada del material sobrante de la demolición se contempla dentro de esta.			0		0%	0%	0%
2,5	A01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de espesor ademas los materiales y elementos necesarios para correcta construcción según diseño y medidas establecidas en plano ademas de , curado, protección hasta la entrega final.			0		0%	0%	0%

2,6	A03_PISO EN CAUCHO. Construcción de PISO EN CAUCHO PIGMENTADO MORADO (EPDM). Acabado en piso de 15mm, incluye sub base granular e= 11cm, Losa en concreto de 21 Mpa de e = 7cm, estireno butadieno (SBR) de e = 4cm. pingamento color morado. Acabados según aprobación de diseñador, Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
2,7	PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.			0		0%	0%	0%
2,8	PPC02_PINTURA PISO CICLORUTA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de ciclorute PCC02.			0		0%	0%	0%
2,9	Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimenciones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, Sub base granular de e = 0.05 y gravilla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			0		0%	0%	0%
2,1	Construcción de GRADERIA EN CONCRETO VACIADA EN SITU de concreto de 21 Mpa o 3000 PSI y pigmento morado, conformado por 2 contra huilas de 0.50m y 2 huellas de 0.40m ademas de 2 llaves de cimentación de 0.20m de espesor y 0.30m de ancho, la longitud de ambos elementos es variable, ademas incluye excavaciones y todo lo necesaria para su debida ejecucón, fraguado y entrega a satisfacción.			0		0%	0%	0%
2,11	Construcción de ADOQUIN TACTIL GUIA DE 0.20x0.20x0.06, con pigmento color morado acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,12	Construcción de A20_LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 0.40x0.40x0.06, con pigmento color AMARILLO acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,13	ES01_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 10 contrahuellas y 10 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.15 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,14	ES02_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,15	ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,16	ES04_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 4.0 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,17	ES05_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 3.55 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,18	ES06_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 2.00 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,19	ES07_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 14 contrahuellas y 14 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.3 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	ES08_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 8 contrahuellas y 8 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,21	ES09_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 5 contrahuellas y 5 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,22	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto F'c = 21 Mpa para zapatas corridas en cimentación de muros de contención, incluye formaletas, aditivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
2,23	Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución			0		0%	0%	0%
2,24	Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción, así como la disposición de cualquier residuo de excavación y/o residuo de construcción luego de la terminación de la actividad, ademas del aseo y la limpieza final del area de trabajo.			0		0%	0%	0%
2,25	Suministro, transporte e instalación de bolardo metalico alto en hierro Referencia M-63, incluye la exvación de la zona de instalación, suministro, transporte e instalación de concreto F'c = 21 Mpa preparado en obra para la cimentación del bolardo, el cargue y la disposición final de residuos de excavación y/o residuos así como el aseo y limpieza final de la zona de intervención.			0		0%	0%	0%
	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3			0		0%	0%	0%
	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A APU CIO 19249			0		0%	0%	0%
	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin APU CIO 15085			0		0%	0%	0%
	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)** APU CIO 10415			0		0%	0%	0%

	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos APU CIO 12541			0		0%	0%	0%
	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)(CIO 16869)			0		0%	0%	0%
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			0		0%	0%	0%
	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)			0		0%	0%	0%
3	**MOBILIARIO**			0		0%	0%	0%
3,1	EC02_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC02, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	EC03_ESTANCIAS DE CONTEMPLACION Construcción de ESTANCIA CONTEMPLACIÓN EC03, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 2 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 7 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 7 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,3	EC04_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC04, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,4	EC06_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC06, conformada por 1 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,5	EC07_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC07, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 4 esferas prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,6	EA01_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA01, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 esfera prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 5 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,7	EA03_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,8	EA05_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA05, conformada por 4 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 9 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,9	EA06_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA06, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 4 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,1	EA07_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de ESTANCIA DE ABRIGO EA07, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 4 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.62, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,11	EA08_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA08, conformada por 1 banca prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de en concreto de 3000 psi ó 21 MPa ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 3 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,12	EAP01_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 mesa circular de ajedrez prefabricada en concreto de 21 Mpa o 3000 PSI con radio de 0.40, 1 Pedestal en concreto de 21 Mpa y/o 3000 PSI con pigmento color morado de 0.24m de base mayor 0.11m de base menor y terminación circular con altura de 0.11m, el resto de pedestal pose una altura de 0.55m y ancho de 0.30m. , incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, ademas de anclajes mesa - pedestal pedestal - cimentación incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,13	EAP02_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP02, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,14	EAP03_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de estancia de apoyo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 6 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts,1 mesa de juegos conformada por una superficie de 0.80 mts de diametro y e 0.08 mts, una semi esfera y un pedestal en concreto f'c = 21 Mpa color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 8 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,15	ER01_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoya de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,16	ER02_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER02, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,17	ER03_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER03, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 4 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,18	ER04_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,19	ER05_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER05, conformada por 5 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,3 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 12 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,2	BS01_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA SIMPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,21	BS02_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,22	BS03_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA TRIPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,23	JI04_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI04.			0		0%	0%	0%
3,24	JI05_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI05.			0		0%	0%	0%
3,25	JI06_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI06.			0		0%	0%	0%
3,26	JI07_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI07.			0		0%	0%	0%
3,27	JI08_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI08.			0		0%	0%	0%
3,28	JI09_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI09.			0		0%	0%	0%
3,29	Cerramiento contra impacto IDRD h=5.00 m. (tubo galvanizado, varilla redonda, malla eslabonada y ángulo. acabado superficial en pintura líquida resistente a la intemperie, incluye viga de cimentación) (incluye suministro e instalación)			0		0%	0%	0%
3,3	BS01_Suministro, transporte e instalacion de GIMNASIO BIOSALUDABLE, conformado por EQUIPO 1, EQUIPO 2, EQUIPO 3 y EQUIPO 4. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
3,31	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 1.70 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%

3,32	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 0.80 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,33	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación de acuerdo con diseños arquitectonicos			0		0%	0%	0%
3,34	Suministro, transporte e instalación de puerta para cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación, bisagras, broche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo con diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,35	C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,36	M05_BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto color morado de 21 Mpa o 3000 PSI con espaldar elaborado en tubular de 2" pintado con pintura electroestatica. Dimensiones 2.10 x 0.44 x 0.67, incluye los elementos elementos de apoyo a través de una esfera en concreto prefabricada color morado de 21 Mpa ø = 0,22 mts y una semiesfera de ø= 0.44 mts y h= 0.22 prefabricada en concreto color morado ambas con el centro hueco ø = 0,08, y las cimentaciones a través de 2 zapatas de 0.50 x 0.50 x 0.50 y un pedestal de ø = 0.08 mts y h= 0.58 mts, acero de refuerzo, excavación con cargue y disposición final ademas de todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%
4,1	Suministro, transporte e instalación de grama, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.			0		0%	0%	0%
4,2	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo en tierra negra medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación y conformación de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
4,3	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo limo arenoso medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación hasta alcanzar mínimo el 85% del proctor del material, conformación y de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
5,1	JIE01_JUEGOS INFANTILES EXISTENTE. Mantenimiento de juegos infantiles existentes. Incluye revisión y ajuste, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,2	JIE02_BIOSALDABLES EXISTENTE. Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre existentes. Incluye revisión y ajuste, reemplazo de elementos en mal estado, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%

5,3	MCA01_LIMPIEZA DE CARCAMO EXISTENTE. Retiro de tapas, limpieza, extracción de residuos y disposición final en carcamos existentes de hasta 0.50 x 0.50,.Incluye la disposición final de todos los residuos retirados y la posterior reinstalación de las tapas existentes en buen estado.			0		0%	0%	0%
5,4	MCA02_REEMPLAZO TAPAS DE CARCAMO. Retiro y reemplazo de tapas de carcamo prefabricadas en concreto de 0.40 mts de ancho para uso peatonal			0		0%	0%	0%
5,5	RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla similar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revite en arena de revoque y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la disposición de los escombros sobrantes del adoquin retirado en mal estado en lugar autorizado por entidad ambiental competente.			0		0%	0%	0%
6	**SEÑALIZACIÓN**			0		0%	0%	0%
6,1	SRC ó SRG 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.80 x 1.20 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción de pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,2	SRI 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRI 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.60 x 0.70 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,3	SRJ 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRJ 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1 x 3.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 1.30, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,4	SRU 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRU 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1.00 x 2.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,5	SRV 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.401 x 0.301 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
3	**PARQUE URBANIZACION LA CAMELIA**					9%	2%	-7%
	-Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad de los predios perimetrales que colindan con la zona de intervención -Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM -Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría							
1	**PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS**			0		12%	2%	-10%
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD			0		100%	100%	0%

1,1	Localización, trazado y replanteo.			8		100%	0%	-100%
1,2	Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			2		4%	0%	-4%
1,3	Demolición de andenes ó pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			1		17%	0%	-17%
1,4	Desmonte de barandas existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,5	Demonte de bancas en concreto existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,6	Excavación mecanica ó manual de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ			0		0%	0%	0%
1,7	Desmonte de basurera existente BE 01, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,8	Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro (CIO 10206)			1		7%	0%	-7%
	Alquiler Campamento 36 m2 Incluye servicios públicos provisionales INSUMO IDU 9577			8		12%	0%	-12%
	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+BASEOS) APU CIO 13521 MES			8		12%	0%	-12%
	Control y manejo de tránsito. Incluye todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas necesarias para el desarrollo de la obra. Incluye personal necesario para manejo de tránsito con chaleco reflectivo e implementos de seguridad			6		10%	0%	-10%

	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro) (clo 14439)			0		0%	0%	0%
	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro (clo13660)			0		0%	0%	0%
	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.** (CIO 11391)			0		0%	0%	0%
2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
2,1	A04_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 2.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	A5_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas circulares de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con diametro de 0.30 m, espesor de 0.08 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado. adosado sobre zona verde existente o nueva, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A05 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,3	A04B_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 1.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,4	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ, de dimensiones ancho 32 cm, espesor 10 cm y longitud variable, adosado sobre anden en concreto existente o nuevo para conformación de sistema de movilidad peatonal tipo MP01, MP 02 ó MP03, incluye la demolición del elemento existente en los puntos a instalar, así una capa de base de 15 cm. La botada del material sobrante de la demolición se contempla dentro de esta.			0		0%	0%	0%
2,5	A01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de espesor ademas los materiales y elementos necesarios para correcta construcción según diseño y medidas establecidas en plano ademas de , curado, protección hasta la entrega final.			0		0%	0%	0%
2,6	A03_PISO EN CAUCHO. Construcción de PISO EN CAUCHO PIGMENTADO MORADO (EPDM). Acabado en piso de 15mm, incluye sub base granular e= 11cm, Losa en concreto de 21 Mpa de e = 7cm, estireno butaldeno (SBR) de e = 4cm. pingemento color morado. Acabados según aprobación de diseñador, incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
2,7	PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.			0		0%	0%	0%
2,8	PPC02_PINTURA PISO CICLORUTA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de ciclorute PCC02.			0		0%	0%	0%

2,9	Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimencionas de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. Sub base granular de e = 0.05 y gravialla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			0		0%	0%	0%
2,1	Construcción de GRADERIA EN CONCRETO VACIADA EN SITUI de concreto de 21 Mpa o 3000 PSI y pigmento morado, conformado por 2 contra huilas de 0.50m y 2 huellas de 0.40m ademas de 2 llaves de cimentación de 0.20m de espesor y 0.30m de ancho, la longitud de ambos elementos es variable, ademas incluye excavaciones y todo lo necesaria para su debida ejecucón, fraguado y entrega a satisfacción.			0		0%	0%	0%
2,11	Construcción de ADOQUIN TACTIL GUIA DE 0.20x0.20x0.06, con pigmento color morado acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,12	Construcción de A20_LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 0.40x0.40x0.06, con pigmento color AMARILLO acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,13	ES01_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 10 contrahuellas y 10 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.15 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,14	ES02_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,15	ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,16	ES04_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 4.0 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,17	ES05_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 3.55 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,18	ES06_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 2.00 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,19	ES07_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 14 contrahuellas y 14 huellas de 2,15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.3 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	ES08_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 8 contrahuellas y 8 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,21	ES09_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 5 contrahuellas y 5 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,22	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto F'c = 21 Mpa para zapatas corridas en cimentación de muros de contención, incluye formaletas, aditivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
2,23	Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución			0		0%	0%	0%
2,24	Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción, así como la disposición de cualquier residuo de excavación y/o residuo de construcción luego de la terminación de la actividad, ademas del aseo y la limpieza final del area de trabajo.			0		0%	0%	0%
2,25	Suministro, transporte e instalación de bolardo metalico alto en hierro Referencia M-63, incluye la exvación de la zona de instalación, suministro, transporte e instalación de concreto F'c = 21 Mpa preparado en obra para la cimentación del bolardo, el cargue y la disposición final de residuos de excavación y/o residuos así como el aseo y limpieza final de la zona de intervención.			0		0%	0%	0%
	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3			0		0%	0%	0%
	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A APU CIO 19249			0		0%	0%	0%
	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin APU CIO 15085			0		0%	0%	0%
	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)** APU CIO 10415			0		0%	0%	0%
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos APU CIO 12541			0		0%	0%	0%
	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)(CIO 15669)			0		0%	0%	0%
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			0		0%	0%	0%

	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)			0		0%	0%	0%
3	**MOBILIARIO**			0		0%	0%	0%
3,1	EC02_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC02, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	EC03_ESTANCIAS DE CONTEMPLACION Construcción de ESTANCIA CONTEMPLACIÓN EC03, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 2 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 7 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 7 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,3	EC04_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC04, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,4	EC06_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC06, conformada por 1 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,5	EC07_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC07, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 4 esferas prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,6	EA01_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA01, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 esfera prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 5 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,7	EA03_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,8	EA05_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA05, conformada por 4 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 9 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,9	EA06_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA06, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 4 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,1	EA07_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de ESTANCIA DE ABRIGO EA07, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 4 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.62, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,11	EA08_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA08, conformada por 1 banca prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de en concreto de 3000 psi ó 21 MPa ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 3 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,12	EAP01_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 mesa circular de ajedrez prefabricada en concreto de 21 Mpa o 3000 PSI con radio de 0.40, 1 Pedestal en concreto de 21 Mpa y/o 3000 PSI con pigmento color morado de 0.24m de base mayor 0.11m de base menor y terminación circular con altura de 0.11m, el resto de pedestal pose una altura de 0.55m y ancho de 0.30m. , incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, ademas de anclajes mesa - pedestal pedestal - cimentación incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,13	EAP02_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP02, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,14	EAP03_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de estancia de apoyo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 6 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts,1 mesa de juegos conformada por una superficie de 0.80 mts de diametro y e 0.08 mts, una semi esfera y un pedestal en concreto f'c = 21 Mpa color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 8 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,15	ER01_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,16	ER02_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER02, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,17	ER03_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER03, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 4 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,18	ER04_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.60m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,19	ER05_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER05, conformada por 5 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,3 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 12 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	BS01_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA SIMPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,21	BS02_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,22	BS03_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA TRIPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle especifico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%

3,23	JI04_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI04.			0		0%	0%	0%
3,24	JI05_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI05.			0		0%	0%	0%
3,25	JI06_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI06.			0		0%	0%	0%
3,26	JI07_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI07.			0		0%	0%	0%
3,27	JI08_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI08.			0		0%	0%	0%
3,28	JI09_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI09.			0		0%	0%	0%
3,29	Cerramiento contra impacto IDRD h=5.00 m. (tubo galvanizado, varilla redonda, malla eslabonada y ángulo. acabado superficial en pintura líquida resistente a la intemperie, incluye viga de cimentación) (incluye suministro e instalación)			0		0%	0%	0%
3,3	BS01_Suministro, transporte e instalacion de GIMNASIO BIOSALUDABLE, conformado por EQUIPO 1, EQUIPO 2, EQUIPO 3 y EQUIPO 4. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
3,31	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 1.70 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de fijación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,32	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 0.80 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de fijación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,33	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación de acuerdo con diseños arquitectonicos			0		0%	0%	0%
3,34	Suministro, transporte e instalación de puerta para cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación, bisagras, broche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo con diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3.35	C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3.36	M05_BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto color morado de 21 Mpa o 3000 PSI con espaldar elaborado en tubular de 2" pintado con pintura electroestatica. Dimensiones 2.10 x 0.44 x 0.67, incluye los elementos elementos de apoyo a través de una esfera en concreto prefabricada color morado de 21 Mpa a = 0.22 mts y una semiesfera de e= 0.44 mts y h= 0.22 prefabricada en concreto color morado ambas con el centro hueco e = 0.08, y las cimentaciones a través de 2 zapatas de 0.50 x 0.50 x 0.50 y un pedestal de a = 0.08 mts y h= 0.58 mts, acero de refuerzo, exacavación con cargue y disposición final ademas de todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
4	**ZONAS VERDES Y JARDINERIA**			0		0%	0%	0%
4,1	Suministro, transporte e instalación de grama, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.			0		0%	0%	0%
4,2	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo en tierra negra medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación y conformación de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
4,3	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo limo arenoso medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación hasta alcanzar minimo el 85% del proctor del material, conformación y de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
5	**MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES**			0		0%	0%	0%
5,1	JIE01_JUEGOS INFANTILES EXISTENTE. Mantenimiento de juegos infantiles existentes. Incluye revisión y ajuste, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,2	JIE02_BIOSALDABLES EXISTENTE. Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre existentes. Incluye revisión y ajuste, reemplazo de elementos en mal estado, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,3	MCA01_LIMPIEZA DE CARCAMO EXISTENTE. Retiro de tapas, limpieza, extracción de residuos y disposición final en carcamos existentes de hasta 0.50 x 0.50,.Incluye la disposición final de todos los residuos retirados y la posterior reinstalación de las tapas existentes en buen estado.			0		0%	0%	0%
5,4	MCA02_REEMPLAZO TAPAS DE CARCAMO. Retiro y reemplazo de tapas de carcamo prefabricadas en concreto de 0.40 mts de ancho para uso peatonal			0		0%	0%	0%
5,5	RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla similar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revite en arena de revoque y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la disposición de los escombros sobrantes del adoquin retirado en mal estado en lugar autorizado por entidad ambiental competente.			0		0%	0%	0%

6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
6,1	SRC ó SRG 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.80 x 1.20 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción de pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,2	SRI 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRI 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.60 x 0.70 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,3	SRJ 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRJ 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1 x 3.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 1.30, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,4	SRU 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRU 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1.00 x 2.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,5	SRV 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.401 x 0.301 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
4	PARQUE PATIO BONITO II - D							
	Se da inicio a las actividades de obra con los preliminares, desarrollándose en el transcurso del periodo de la presente semana, localización y replanteo, instalación de cerramiento de obra, demolición del piso existente en adoquín, demolición de bordillos. Se cuenta con personal operativo aprobado Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría					11%	2%	-9%
1	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS			0		15%	2%	-13%
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD			0		100%	100%	0%
1,1	Localización, trazado y replanteo.			8		100%	0%	-100%
1,2	Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			3		5%	0%	-5%
1,3	Demolición de andenes ó pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			3		43%	0%	-43%

1,4	Desmonte de barandas existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,5	Demonte de bancas en concreto existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,6	Excavación mecanica ó manual de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ			0		0%	0%	0%
1,7	Desmonte de basurera existente BE 01, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,8	Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro (CIO 10206)			0		0%	0%	0%
	Alquiler Campamento 36 m2 incluye servicios públicos provisionales INSUMO IDU 9577			9		13%	0%	-13%
	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS) APU CIO 13521 MES			9		13%	0%	-13%
	Control y manejo de tránsito, incluye todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas necesarias para el desarrollo de la obra. Incluye personal necesario para manejo de tránsito con chaleco reflectivo e implementos de seguridad			9		13%	0%	-13%
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslogo+Retiro) (cio 14439)			0		0%	0%	0%
	Demol pav asfaltico e=0,05m(sin corte+carg+retiro (cio13560)			0		0%	0%	0%
	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.** (CIO 11391)			0		0%	0%	0%

2	OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES			0		0%	0%	0%
2,1	A04_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 2.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	A5_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas circulares de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con diametro de 0.30 m, espesor de 0.08 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado. adosado sobre zona verde existente o nueva, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A05 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,3	A04B_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 1.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,4	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ, de dimensiones ancho 32 cm, espesor 10 cm y longitud variable, adosado sobre anden en concreto existente o nuevo para conformación de sistema de movilidad peatonal tipo MP01, MP 02 6 MP03, incluye la demolición del elemento existente en los puntos a instalar, así una capa de base de 15 cm. La botada del material sobrante de la demolición se contempla dentro de esta.			0		0%	0%	0%
2,5	A01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de espesor ademas los materiales y elementos necesarios para correcta construcción según diseño y medidas establecidas en plano ademas de , curado, protección hasta la entrega final.			0		0%	0%	0%
2,6	A03_PISO EN CAUCHO. Construcción de PISO EN CAUCHO PIGMENTADO MORADO (EPDM). Acabado en piso de 15mm, incluye sub base granular e= 11cm, Losa en concreto de 21 Mpa de e = 7cm, estireno butaideno (SBR) de e = 4cm. pingemento color morado. Acabados según aprobación de diseñador, incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
2,7	PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.			0		0%	0%	0%
2,8	PPC02_PINTURA PISO CICLORUTA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de ciclorura PCC02.			0		0%	0%	0%
2,9	Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimenciones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, Sub base granular de e = 0.05 y gravialla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			0		0%	0%	0%
2,1	Construcción de GRADERIA EN CONCRETO VACIADA EN SITUI de concreto de 21 Mpa o 3000 PSI y pigmento morado, conformado por 2 contra huilas de 0.50m y 2 huellas de 0.40m ademas de 2 llaves de cimentación de 0.20m de espesor y 0.30m de ancho, la longitud de ambos elementos es variable, ademas incluye excavaciones y todo lo necesario para su debida ejecucón, fraguado y entrega a satisfacción.			0		0%	0%	0%
2,11	Construcción de ADOQUIN TACTIL GUIA DE 0.20x0.20x0.06, con pigmento color morado acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%

2,12	Construcción de A20_LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 0.40x0.40x0.06, con pigmento color AMARILLO acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,13	ES01_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 10 contrahuellas y 10 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.15 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,14	ES02_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,15	ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,16	ES04_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 4.0 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,17	ES05_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 3.55 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,18	ES06_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 2.00 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,19	ES07_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 14 contrahuellas y 14 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.3 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	ES08_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 8 contrahuellas y 8 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,21	ES09_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 5 contrahuellas y 5 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,22	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto F'c = 21 Mpa para zapatas corridas en cimentación de muros de contención, incluye formaletas, aditivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
2,23	Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución			0		0%	0%	0%

2,24	Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción, así como la disposición de cualquier residuo de excavación y/o residuo de construcción luego de la terminación de la actividad, ademas del aseo y la limpieza final del area de trabajo.			0		0%	0%	0%
2,25	Suministro, transporte e instalación de bolardo metalico alto en hierro Referencia M-63, incluye la exvación de la zona de instalación, suministro, transporte e instalación de concreto F'c = 21 Mpa preparado en obra para la cimentación del bolardo, el cargue y la disposición final de residuos de excavación y/o residuos así como el aseo y limpieza final de la zona de intervención.			0		0%	0%	0%
	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3			0		0%	0%	0%
	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A APU CIO 19249			0		0%	0%	0%
	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+CIIn APU CIO 15085			0		0%	0%	0%
	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)** APU CIO 10415			0		0%	0%	0%
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos APU CIO 12541			0		0%	0%	0%
	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)(CIO 16669)			0		0%	0%	0%
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			0		0%	0%	0%
	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)			0		0%	0%	0%
3	**MOBILIARIO**			0		0%	0%	0%
3,1	EC02_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC02, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI Ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS Ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,2	EC03_ESTANCIAS DE CONTEMPLACION Construcción de ESTANCIA CONTEMPLACIÓN EC03, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado. Incluye sisitema de cimentación conformado por 2 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 7 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 7 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,3	EC04_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC04, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,4	EC06_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC06, conformada por 1 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluya excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,5	EC07_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC07, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 4 esferas prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,6	EA01_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA01, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 esfera prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 5 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,7	EA03_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,8	EA05_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA05, conformada por 4 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 9 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,9	EA06_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA06, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 4 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,1	EA07_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de ESTANCIA DE ABRIGO EA07, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 4 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.62, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,11	EA08_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA08, conformada por 1 banca prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de en concreto de 3000 psi ó 21 MPa ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 3 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,12	EAP01_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 mesa circular de ajedrez prefabricada en concreto de 21 Mpa o 3000 PSI con radio de 0.40, 1 Pedestal en concreto de 21 Mpa y/o 3000 PSI con pigmento color morado de 0.24m de base mayor 0.11m de base menor y terminación circular con altura de 0.11m, el resto de pedestal pose una altura de 0.55m y ancho de 0.30m. , incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, ademas de anclajes mesa - pedestal pedestal - cimentación incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,13	EAP02_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP02, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,14	EAP03_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de estancia de apoyo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts,1 mesa de juegos conformada por una superficie de 0.80 mts de diametro y e 0.08 mts, una semi esfera y un pedestal en concreto f'c = 21 Mpa color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 8 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,15	ER01_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,16	ER02_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER02, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,17	ER03_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER03, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 4 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,18	ER04_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,19	ER05_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER05, conformada por 5 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,3 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 12 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	BS01_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA SIMPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,21	BS02_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,22	BS03_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA TRIPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones conformadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,23	JI04_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI04.			0		0%	0%	0%
3,24	JI05_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI05.			0		0%	0%	0%
3,25	JI06_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI06.			0		0%	0%	0%

3,26	JI07_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI07.			0		0%	0%	0%
3,27	JI08_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI08.			0		0%	0%	0%
3,28	JI09_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI09.			0		0%	0%	0%
3,29	Cerramiento contra impacto IDRD h=5.00 m. (tubo galvanizado, varilla redonda, malla eslabonada y ángulo. acabado superficial en pintura líquida resistente a la intemperie, incluye viga de cimentación) (incluye suministro e instalación)			0		0%	0%	0%
3,3	BS01_Suministro, transporte e instalacion de GIMNASIO BIOSALUDABLE, conformado por EQUIPO 1, EQUIPO 2, EQUIPO 3 y EQUIPO 4. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
3,31	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 1.70 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,32	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 0.80 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,33	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación de acuerdo con diseños arquitectonicos			0		0%	0%	0%
3,34	Suministro, transporte e instalación de puerta para cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación, bisagras, broche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo con diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,35	C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,36	M05_BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto color morado de 21 Mpa o 3000 PSI con espaldar elaborado en tubular de 2" pintado con pintura electroestatica. Dimensiones 2.10 x 0.44 x 0.67, incluye los elementos elementos de apoyo a través de una esfera en concreto prefabricada color morado de 21 Mpa ø = 0.22 mts y una semiesfera de ø= 0.44 mts y h= 0.22 prefabricada en concreto color morado ambas con el centro hueco ø = 0.08, y las cimentaciones a través de 2 zapatas de 0.50 x 0.50 x 0.50 y un pedestal de ø = 0.08 mts y h= 0.58 mts, acero de refuerzo, excavación con cargue y disposición final ademas de todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
4	ZONAS VERDES Y JARDINERIA			0		0%	0%	0%

4,1	Suministro, transporte e instalación de grama, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.			0		0%	0%	0%
4,2	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo en tierra negra medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación y conformación de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
4,3	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo limo arenoso medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación hasta alcanzar mínimo el 85% del proctor del material, conformación y de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
5	**MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES**			0		0%	0%	0%
5,1	JIE01_JUEGOS INFANTILES EXISTENTE. Mantenimiento de juegos infantiles existentes. Incluye revisión y ajuste, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,2	JIE02_BIOSALDABLES EXISTENTE. Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre existentes. Incluye revisión y ajuste, reemplazo de elementos en mal estado, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,3	MCA01_LIMPIEZA DE CARCAMO EXISTENTE. Retiro de tapas, limpieza, extracción de residuos y disposición final en carcamos existentes de hasta 0.50 x 0.50,.incluye la disposición final de todos los residuos retirados y la posterior reinstalación de las tapas existentes en buen estado.			0		0%	0%	0%
5,4	MCA02_REEMPLAZO TAPAS DE CARCAMO. Retiro y reemplazo de tapas de carcamo prefabricadas en concreto de 0.40 mts de ancho para uso peatonal			0		0%	0%	0%
5,5	RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla similar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revite en arena de revoque y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la disposición de los escombros sobrantes del adoquin retirado en mal estado en lugar autorizado por entidad ambiental competente.			0		0%	0%	0%
6	**SEÑALIZACIÓN**			0		0%	0%	0%
6,1	SRC ó SRG 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.80 x 1.20 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción de pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,2	SRI 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRI 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.60 x 0.70 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%

6,3	SRJ 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRJ 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1 x 3.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y perales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 1.30, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,4	SRU 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRU 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1.00 x 2.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y perales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,5	SRV 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.401 x 0.301 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y perales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
5	**PARQUE CHUNIZA 1**					**9%**	**2%**	**-7%**
	-Se realiza reunión social de inicio con la comunidad y contando con la asistencia de personal de interventoria, contratista de obra y SDHT -Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM -Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoria							
1	**PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS**			0		13%	2%	-11%
	SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD					100%	100%	0%
1,1	Localización, trazado y replanteo.			6		100%	0%	-100%
1,2	Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			2		4%	0%	-4%
1,3	Demolición de andenes ó pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			2		25%	0%	-25%
1,4	Desmonte de barandas existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,5	Demonte de bancas en concreto existentes, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,6	Excavación mecanica ó manual de material heterogéneo de 0-2 m medido in situ			0		0%	0%	0%

1,7	Desmonte de basurera existente BE 01, incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
1,8	Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad.			0		0%	0%	0%
	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargo y retiro (CIO 10206)			0		0%	0%	0%
	Alquiler Campamento 36 m2 incluye servicios públicos provisionales INSUMO IDU 9577			6		10%	0%	-10%
	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS) APU CIO 13521 MES			6		10%	0%	-10%
	Control y manejo de tránsito. Incluye todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas necesarias para el desarrollo de la obra. Incluye personal necesario para manejo de tránsito con chaleco reflectivo e implementos de seguridad			6		10%	0%	-10%
	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro) (cio 14439)			0		0%	0%	0%
	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro (cio13660)			0		0%	0%	0%
	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.** (CIO 11391)			0		0%	0%	0%
2	**OBRAS EN CONCRETO, PISOS Y SUPERFICIES**			0		0%	0%	0%
2,1	A04_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 2.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	A5_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas circulares de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con diametro de 0.30 m, espesor de 0.08 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado. adosado sobre zona verde existente o nueva, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A05 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,3	A04B_CONEXIONES PEATONALES LIVIANAS. Contrucción de huellas de piso en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa sobre zona verde con ancho de 0.30 m, espesor de 0.08 y longitud 1.10 vaciadas en sitiu, con pigmeto color morado.sobre terreno, incluye excavación en los sitios a instalar, así una capa de sub base de 15 cm de espesor. La botada del material sobrante de la excavación. Ademas de todos los elementos necesarios para su curado y entrega final. que conforma el sistema de movilidad A04 con acabado semicircular como se muestra en planos arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,4	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ, de dimensiones ancho 32 cm, espesor 10 cm y longitud variable, adosado sobre anden en concreto existente o nuevo para conformación de sistema de movilidad peatonal tipo MP01, MP 02 ó MP03, incluye la demolición del elemento existente en los puntos a instalar, así una capa de base de 15 cm. La botada del material sobrante de la demolición se contempla dentro de esta.			0		0%	0%	0%
2,5	A01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de espesor ademas los materiales y elementos necesarios para correcta construcción según diseño y medidas establecidas en plano ademas de , curado, protección hasta la entrega final.			0		0%	0%	0%
2,6	A03_PISO EN CAUCHO. Construcción de PISO EN CAUCHO PIGMENTADO MORADO (EPDM). Acabado en piso de 15mm, incluye sub base granular e= 11cm, Losa en concreto de 21 Mpa de e = 7cm, estireno butaideno (SBR) de e = 4cm, pingamento color morado. Acabados según aprobación de diseñador, incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
2,7	PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.			0		0%	0%	0%
2,8	PPC02_PINTURA PISO CICLORUTA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de ciclorута PCC02.			0		0%	0%	0%
2,9	Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimenciones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, Sub base granular de e = 0.05 y gravialla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.			0		0%	0%	0%
2,1	Construcción de GRADERIA EN CONCRETO VACIADA EN SITUI de concreto de 21 Mpa o 3000 PSI y pigmento morado, conformado por 2 contra huellas de 0.50m y 2 huellas de 0.40m ademas de 2 llaves de cimentación de 0.20m de espesor y 0.30m de ancho, la longitud de ambos elementos es variable, ademas incluye excavaciones y todo lo necesaria para su debida ejecución, fraguado y entrega a satisfacción.			0		0%	0%	0%
2,11	Construcción de ADOQUIN TACTIL GUIA DE 0.20x0.20x0.06, con pigmento color morado acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,12	Construcción de A20_LOSETA TÁCTIL ALERTA DE 0.40x0.40x0.06, con pigmento color AMARILLO acabados según aprobación de diseñador. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción.			0		0%	0%	0%
2,13	ES01_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 10 contrahuellas y 10 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.15 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,14	ES02_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

2,15	ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,16	ES04_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 4.0 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,17	ES05_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 3.55 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,18	ES06_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 4 contrahuellas y 4 huellas de 2.00 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.18 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,19	ES07_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 14 contrahuellas y 14 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.3 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,2	ES08_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 8 contrahuellas y 8 huellas de 2.15 mts de ancho y un descanso ibtermedio, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,21	ES09_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 5 contrahuellas y 5 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de hasta 0.4 m y contra huella de hasta 0.17 m con pigmento en color morado, incluye vigas de cimentación en concreto de 21mpa o 3000 PSI de 0.30m de ancho y 015 m de espesor de acuerdo con diseños estructurales, ademas de acero de refuerzo y excavación, incluye todos los elemntos necesarios para su correcta intalación segun diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
2,22	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto F'c = 21 Mpa para zapatas corridas en cimentación de muros de contención, incluye formaletas, aditivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
2,23	Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución			0		0%	0%	0%
2,24	Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción, así como la disposición de cualquier residuo de excavación y/o residuo de construcción luego de la terminación de la actividad, ademas del aseo y la limpieza final del area de trabajo.			0		0%	0%	0%
2,25	Suministro, transporte e instalación de bolardo metalico alto en hierro Referencia M-63, incluye la exvación de la zona de instalación, suministro, transporte e instalación de concreto F'c = 21 Mpa preparado en obra para la cimentación del bolardo, el cargue y la disposición final de residuos de excavación y/o residuos así como el aseo y limpieza final de la zona de intervención.			0		0%	0%	0%
	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3			0		0%	0%	0%

	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A APU CIO 19249			0		0%	0%	0%
	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+CIIIn APU CIO 15085			0		0%	0%	0%
	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)** APU CIO 10415			0		0%	0%	0%
	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos APU CIO 12541			0		0%	0%	0%
	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)(CIO 16669)			0		0%	0%	0%
	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **			0		0%	0%	0%
	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)			0		0%	0%	0%
3	**MOBILIARIO**			0		0%	0%	0%
3,1	EC02_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC02, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	EC03_ESTANCIAS DE CONTEMPLACION Construcción de ESTANCIA CONTEMPLACIÓN EC03, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado. incluye sisitema de cimentación conformado por 2 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 7 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 7 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,3	EC04_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC04, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,4	EC06_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC06, conformada por 1 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,5	EC07_ESTANCIAS DE CONTEMPLACIÓN. Construcción de estancia de contemplación EC07, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 4 esferas prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,6	EA01_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA01, conformada por 2 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 esfera prefabricada C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 5 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 5 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,7	EA03_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,8	EA05_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA05, conformada por 4 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 5 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 2 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 9 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,9	EA06_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA06, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 4 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,1	EA07_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de ESTANCIA DE ABRIGO EA07, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 4 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m con pigmento color morado, 2 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 2 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.62, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,11	EA08_ESTANCIAS DE ABRIGO. Construcción de estancia de abrigo EA08, conformada por 1 banca prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de en concreto de 3000 psi ó 21 MPa ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 3 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,12	EAP01_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 1 mesa circular de ajedrez prefabricada en concreto de 21 Mpa o 3000 PSI con radio de 0.40, 1 Pedestal en concreto de 21 Mpa y/o 3000 PSI con pigmento color morado de 0.24m de base mayor 0.11m de base menor y terminación cicular con altura de 0.11m, el resto de pedestal pose una altura de 0.55m y ancho de 0.30m. , incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, ademas de anclajes mesa - pedestal pedestal - cimentación incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,13	EAP02_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de ESTANCIAS DE APOYO EAP02, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 5 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 5 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 5 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,14	EAP03_ESTANCIAS DE APOYO. Construcción de estancia de apoyo EA03, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 6 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts,1 mesa de juegos conformada por una superficie de 0.80 mts de diametro y e 0.08 mts, una semi esfera y un pedestal en concreto f'c = 21 Mpa color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 8 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,15	ER01_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,16	ER02_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER02, conformada por 3 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,1 jardinera prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, 2 esferas prefabricadas C03 en concreto de 3000 Psi ó 21 Mpa con ø =0.22 y h= 0.20 mts con pigmento color morado, 1 semi esfera C04 de ø = 0.44 mts y h = 0.22 mts; incluye sisitema de cimentación conformado por 6 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y ø = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%

3,17	ER03_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER03, conformada por 2 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 2 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 3 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 1 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 4 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 4 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,18	ER04_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabicadas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación conformado por 1 Esfera de apoyo de concreto de 3000PSI ø0.22m x 0.20m, 2 Media Esfera de apoyo de concreto de 3000PS ø0.80m x 0.20m ambas con pigmento color morado, 3 pedestales en concreto de 3000 Psi y/o 21 Mpa de 0.30 X 0.30 X 0.30 y 3 elementos de conexión en concreto de 3000 PSI y/o 21 Mpa de 0.08 X 0.08 X 0.42, incluye excavación y todos los elemntos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,19	ER05_ESTANCIAS DE RESGUARDO. Construcción de estancia de resguardo ER05, conformada por 5 bancas prefabricas C01 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado,3 jardineras prefabicada C02 en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado; incluye sisitema de cimentación conformado por 12 dados en concreto de 0.5 x 0.5 x0.5 y un pedestal de h=0.07 mts y e = 0.07 ms incluye excavación, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, instalación y entrega, conforme a diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,2	BS01_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA SIMPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,21	BS02_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,22	BS03_Suministro, transporte e instalacion de BASURERA TRIPLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje embebido en cimentación. Basurera según diseño estructural. Dimensiones, especificaciones e instalación según detalle específico y planos de taller del fabricante y/o especificaciones generales de construcción.			0		0%	0%	0%
3,23	JI04_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI04.			0		0%	0%	0%
3,24	JI05_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI05.			0		0%	0%	0%
3,25	JI06_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI06.			0		0%	0%	0%
3,26	JI07_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI07.			0		0%	0%	0%
3,27	JI08_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI08.			0		0%	0%	0%
3,28	JI09_JUEGOS INFANTILES. Suministro, transporte e instalación de JUEGOS INFANTILES JI09.			0		0%	0%	0%

3,29	Cerramiento contra impacto IDRD h=5.00 m. (tubo galvanizado, varilla redonda, malla eslabonada y ángulo. acabado superficial en pintura líquida resistente a la intemperie, incluye viga de cimentación) (incluye suministro e instalación)			0		0%	0%	0%
3,3	BS01_Suministro, transporte e instalacion de GIMNASIO BIOSALUDABLE, conformado por EQUIPO 1, EQUIPO 2, EQUIPO 3 y EQUIPO 4. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.			0		0%	0%	0%
3,31	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 1.70 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,32	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto referencia M13-A dimensiones 0.80 x 0.60 x 0.45 mts según diseño arquitectonico, incluye elementos de filación a pisos en concreto a través de epoxico tipo hilti RE 500 ó similar			0		0%	0%	0%
3,33	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación de acuerdo con diseños arquitectonicos			0		0%	0%	0%
3,34	Suministro, transporte e instalación de puerta para cerramiento en baranda tipo M-80A, incluye todos los elementos de fijación, bisagras, broche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de acuerdo con diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,35	C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
3,36	M05_BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto color morado de 21 Mpa o 3000 PSI con espaldar elaborado en tubular de 2" pintado con pintura electroestatica. Dimensiones 2.10 x 0.44 x 0.67, incluye los elementos elementos de apoyo a través de una esfera en concreto prefabricada color morado de 21 Mpa ø = 0.22 mts y una semiesfera de ø= 0.44 mts y h= 0.22 prefabricada en concreto color morado ambas con el centro hueco e = 0.08, y las cimentaciones a través de 2 zapatas de 0.50 x 0.50 x 0.50 y un pedestal de ø = 0.08 mts y h= 0.58 mts, acero de refuerzo, exacavación con cargue y disposición final ademas de todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos.			0		0%	0%	0%
4	**ZONAS VERDES Y JARDINERIA**			0		0%	0%	0%
4,1	Suministro, transporte e instalación de grama, para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.			0		0%	0%	0%
4,2	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo en tierra negra medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación y conformación de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%
4,3	Suministro, transporte e instalación y compactación de material de prestamo limo arenoso medido in situ, para conformación de zonas verdes en monticulos de acuerdo con diseños arquitectonicos. Incluye riego en capas de maximo 20 cm, compactación hasta alcanzar mínimo el 85% del proctor del material, conformación y de la superficie, regado y todo lo necesario para su correcta ejecución.			0		0%	0%	0%

5	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓNES			0		0%	0%	0%
5,1	JIE01_JUEGOS INFANTILES EXISTENTE. Mantenimiento de juegos infantiles existentes. Incluye revisión y ajuste, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,2	JIE02_BIOSALDABLES EXISTENTE. Mantenimiento de equipos de gimnasio al aire libre existentes. Incluye revisión y ajuste, reemplazo de elementos en mal estado, limpieza y todos los demas elementos requeridos para su correcto funcionamiento			0		0%	0%	0%
5,3	MCA01_LIMPIEZA DE CARCAMO EXISTENTE. Retiro de tapas, limpieza, extracción de residuos y disposición final en carcamos existentes de hasta 0.50 x 0.50,.Incluye la disposición final de todos los residuos retirados y la posterior reinstalación de las tapas existentes en buen estado.			0		0%	0%	0%
5,4	MCA02_REEMPLAZO TAPAS DE CARCAMO. Retiro y reemplazo de tapas de carcamo prefabricadas en concreto de 0.40 mts de ancho para uso peatonal			0		0%	0%	0%
5,5	RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla silmilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revite en arena de revoque y todo lo necesario para su correcta ejecución, así como la disposición de los escombros sobrantes del adoquin retirado en mal estado en lugar autorizado por entidad ambiental competente.			0		0%	0%	0%
6	SEÑALIZACIÓN			0		0%	0%	0%
6,1	SRC ó SRG 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.80 x 1.20 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción de pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,2	SRI 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRI 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.60 x 0.70 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y construcción pedestales en concreto 3500 psi dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,3	SRJ 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRJ 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1 x 3.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 1.30, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,4	SRU 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRU 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 1.00 x 2.00 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%
6,5	SRV 000_Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000 según diseños, incluye placa informativa dimensiones 0.401 x 0.301 mts, tapa en lamina calibre 18 coll rolled soldada, marco y parales en tubo galvanizado ø = 2" tratado con pintura electrostatica TGIC ó laca horneable color verde oscuro ref RAL 6005, excavación y pedestales en concreto dimensiones 0.25 x 0.25 x 0.50, así como la disposición de todos los escombros y/o residuos resultantes de la instalación en lugar autorizado por la entidad ambiental competente y todo lo necesario para su correcta instalación.			0		0%	0%	0%

4. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1						N/A
2						0,00%

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior			0,00%
Durante la Semana	9,00%	13,00%	-4,00%
Actual Acumulado	9,00%	13,00%	-4,00%

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Falta aclarar por parte del consultor el tipo de mobiliario que se va a implementar junto a su respectiva ficha técnica , código e imagen de referencia.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
1.- Por parte del equipo de supervisión de SDHT se realizaran las consultas pertinentes al consultor para posteriormente trasmitir las aclaraciones a cada una de las dudas generadas.	supervisión de la SDHT		20/02/2024

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1-Se esta evaluando la necesidad de generar nuevos análisis de precios No previstos de acuerdo a la revisión preliminar y las inconsistencias encontradas en los estudios y diseños.
2- Según lo expuesto por el consultor en reunión virtual del día miércoles 14 de febrero hace falta aclarar en que medida se encuentra incluido dentro del AIU el presupuesto para campamento, baños e implementación de PMT en los territorios.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

1- Se da inicio a las actividades de obra en el parque Patio Bonito.
2-Se cuenta a la fecha con las actas de vecindad diligenciadas de los parques Patio Bonito, urbanización La Camelia y Riveras de occidente.
3-Asistencia a comité de avance de obra, revisando el estado actual de los contratos.

Aspectos administrativos:

1- Se envían observaciones a la programación V1 presentada por el contratista de obra.
2- Se aclara que el plan de trabajo fue entregado dentro de los tiempos estipulados y que a la fecha se presentan observaciones y comentarios sobre el documento en su version No.4
3- Se remiten observaciones al contratista sobre los APU'S del contrato presentados.
4- Se da respuesta a la orden de giro No.1 presentada por el contratista de obra.

Componente ambiental

1-Se participa en Comité de seguimiento del contrato en Secretaria distrital del Hábitat el día 13/02/2024
2-Se realiza recorrido a el Parque patio Bonito II -D el día 15/02/2024 , donde se verifica aspectos relacionados con Vallas , sumideros , individuos arbóreos, puntos de recolección de residuos.
3- Se remite al correo algunas observaciones producto de recorrido a la profesional ambiental del contratista relacionadas con la instalación de la Valla de información del contrato, protección de individuos arbóreos, Acordonar zona de acopio de materiales, protección de sumideros, puntos de recolección de residuos solidos y jornadas de aseo . 15/02/2024.
4- Se participa en reunión social de Parque Chuniza el día 16/02/2024

Componente SST

1-Se realiza recorrido parque (Patio Bonito), se verifica personal (4) trabajadores. Revisión de documentación, verificación de entrega de elementos de Protección Personal y dotación.
2-Se participa en comité del contrato en el Hábitat
3-El contratista subsano observaciones del informe SST No.1.
4-Se da aprobación al informe SST No.1 del Contratista.
5-Se remite recomendaciones por medio de correo de acuerdo a la visita al parque.

Componente social

1- Revisión de pieza informativa para reunión de inicio del parque: Chuniza, se da aprobación por el profesional social de la interventoría y se remite a la entidad quien aprueba volante informativo para proceso de convocatoria, posterior envió a profesional social del contratista para proceso de divulgación.
2- Revisión de presentación para reunión del parque Chuniza la cual presento observaciones remitidas al contratista quienes ajustan y remiten nuevamente, se revisa y se remite a la entidad.
3- Dia 12 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque Riveras, en la cual se conto con la asistencia de 20 personas del sector, profesionales de interventoría, contratista y entidad, se presentan actividades a ejecutar por cada uno de los componentes SST, ambiental, social y técnico. Se da respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por los asistentes
4-Dia 13 febrero: Asistencia a comité de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas por el componente social y se establecen compromisos.
5-Dia 16 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque Chuniza en el cual se conto con la asistencia de 12 personas de las comunidad, profesionales de interventoría, contratista y entidad, se presentan actividades a ejecutar por cada uno de los componentes SST, ambiental, social y técnico. Se da respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por los asistentes.

9. Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL

PERSONAL INTERVENTORIA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

PERSONAL DE OBRA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPO / MAQUINARIA	CANT.
RETRO EXCAVADORA	0
MINICARGADOR	0
VOLQUETA	0
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	0
MARTILLO NEUMÁTICO	0
COMPRESOR	0
CANGURO APISONADOR	0
TOTAL	

ESTADO DEL TIEMPO		
DIA	ORAS DE LLUVI	ESTADO
LUNES	0	
MARTES	0	
MIÉRCOLE	0	
JUEVES	0	
VIERNES	0	
SÁBADO	0	
DOMINGO	0	
TOTAL DE Hr.	0,00 Hr/semana	

ESTADO
LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Con los adelantos en los ajustes a los planos y presupuestos, aprobaciones de PMT'S, aprobación de personal mínimo y entrega del cronograma inicial por parte del contratista, se constituye un panorama favorable para el inicio de las obras.
2-El atraso presentado en la programación responde a demoras presentadas en el desarrollo de reuniones sociales de inicio por circunstancias de disposición y asistencia por parte de la comunidad en algunos de los territorios.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ

BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SOLIUN

FECHA DE ELABORACIÓN	domingo, 11 de febrero de 2024	INFORME No.	5	PERIODO	DEL	5/02/2024	AL	11/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORMACIÓN GENERAL DE PARQUES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - SOLIUN SAS		CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO ARQUING HABITAT	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1160-2023	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	4/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19/04/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	54 DIAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	54 DIAS
VALOR INICIAL :	$ 291.788.204,00	VALOR INICIAL :	$ 2.528.960.329,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 758.688.098,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 291.788.204,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.770.272.231,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 291.788.204,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.770.272.231,00
SUPERVISOR:	Camilo Andrés Peñuela Cano	INTERVENTOR:	SOLIUN SAS

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA							
Concepto	Fecha			Valor			%
ANTICIPO				N/A			
PAGO 1							
PAGO 2							
PAGO 3							
PAGO 4							
PAGO 5							
PAGO 6							
PAGO 7							
PAGO 8							
PAGO 9							
PAGO 10							
PAGO 11							
PAGO 12							
TOTAL PAGADO							
PENDIENTE POR PAGAR							

CONTRATO DE OBRA							
Concepto	Fecha			Valor			%
ANTICIPO				$		758.688.098,00	30
PAGO 1							
PAGO 2							
PAGO 3							
PAGO 4							
PAGO 5							
PAGO 6							
PAGO 7							
PAGO 8							
PAGO 9							
PAGO 10							
PAGO 11							
PAGO 12							
TOTAL PAGADO							
PENDIENTE POR PAGAR							

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO EJECUTADO	DIFERENCIA
	FASE DE OBRA						
1	PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE						
	Se realizan actividades de revisión en campo del alcance de cada una de las actividades de obra y la correspondencia de la ultima versión en planos entregados por el consultor con respecto al estado actual de las zonas de intervención. Se adelantan tramites los cuales son requisitos previos al inicio de las actividades de obra como: - Aprobación al plan de gestión del riegos de desastres mediante comunicado SDHT-1160-2024-054 - Se realizan observaciones por parte de la interventoría a la matriz de inspección y ensayos entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-055 -Se realizan observaciones por parte de la interventoría al plan de trabajo entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-059 - Revisión de los APU del contrato entregados por el contratista de obra - Se emiten observaciones a la orden de giro No. 01 presentada por el contratista mediante comunicado SDHT-1160-2024-050 - Se encuentra programada la reunión social de inicio ya que en la primera convocatoria no se conto con asistencia de la comunidad						
2	PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA						
	Se realizan actividades de revisión en campo del alcance de cada una de las actividades de obra y la correspondencia de la ultima versión en planos entregados por el consultor con respecto al estado actual de las zonas de intervención. Se adelantan tramites los cuales son requisitos previos al inicio de las actividades de obra como: - Aprobación al plan de gestión del riegos de desastres mediante comunicado SDHT-1160-2024-054 - Se realizan observaciones por parte de la interventoría a la matriz de inspección y ensayos entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-055 -Se realizan observaciones por parte de la interventoría al plan de trabajo entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-059 - Revisión de los APU del contrato entregados por el contratista de obra - Se emiten observaciones a la orden de giro No. 01 presentada por el contratista mediante comunicado SDHT-1160-2024-050 - Se encuentra programada la reunión social de inicio ya que en la primera convocatoria no se conto con asistencia de la comunidad						
3	PARQUE URBANIZACION LA CAMELIA						
	Se realizan actividades de revisión en campo del alcance de cada una de las actividades de obra y la correspondencia de la ultima versión en planos entregados por el consultor con respecto al estado actual de las zonas de intervención. Se adelantan tramites los cuales son requisitos previos al inicio de las actividades de obra como: - Aprobación al plan de gestión del riegos de desastres mediante comunicado SDHT-1160-2024-054 - Se realizan observaciones por parte de la interventoría a la matriz de inspección y ensayos entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-055 -Se realizan observaciones por parte de la interventoría al plan de trabajo entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-059 - Revisión de los APU del contrato entregados por el contratista de obra - Se emiten observaciones a la orden de giro No. 01 presentada por el contratista mediante comunicado SDHT-1160-2024-050 - Se realizó la reunión social de inicio y se realiza volanteo para el diligenciamiento de las actas de vecindad						
4	PARQUE PATIO BONITO II - D						
	Se realizan actividades de revisión en campo del alcance de cada una de las actividades de obra y la correspondencia de la ultima versión en planos entregados por el consultor con respecto al estado actual de las zonas de intervención. Se adelantan tramites los cuales son requisitos previos al inicio de las actividades de obra como: - Aprobación al plan de gestión del riegos de desastres mediante comunicado SDHT-1160-2024-054 - Se realizan observaciones por parte de la interventoría a la matriz de inspección y ensayos entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-055 -Se realizan observaciones por parte de la interventoría al plan de trabajo entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-059 - Revisión de los APU del contrato entregados por el contratista de obra - Se emiten observaciones a la orden de giro No. 01 presentada por el contratista mediante comunicado SDHT-1160-2024-050 - Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad						
5	PARQUE CHUNIZA 1						
	Se realizan actividades de revisión en campo del alcance de cada una de las actividades de obra y la correspondencia de la ultima versión en planos entregados por el consultor con respecto al estado actual de las zonas de intervención. Se adelantan tramites los cuales son requisitos previos al inicio de las actividades de obra como: - Aprobación al plan de gestión del riegos de desastres mediante comunicado SDHT-1160-2024-054 - Se realizan observaciones por parte de la interventoría a la matriz de inspección y ensayos entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-055 -Se realizan observaciones por parte de la interventoría al plan de trabajo entregada por el contratista mediante oficio SDHT-1160-2024-059 - Revisión de los APU del contrato entregados por el contratista de obra - Se emiten observaciones a la orden de giro No. 01 presentada por el contratista mediante comunicado SDHT-1160-2024-050 - Se cuenta con programación para reunión social de inicio						
	NOTA: Es de aclarar que a la fecha se esta realizando el cierre de las reuniones social con comunidad, según el plan de gestión social y el diligenciamiento de las actas de vecindad. Para posteriormente dar inicio a las actividades de obra.						

4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1						N/A
2						0,00%

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%

Durante la Semana			
Actual Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Falta aclarar por parte del consultor el tipo de mobiliario que se va a implementar junto a su respectiva ficha técnica , código e imagen de referencia.
2. Se reciben documentos por parte del apoyo a la supervision de la SDHT mediante correo electronico el dia martes 13 de febrero con el comunicado del consultor Consorcio Land Entropia, donde se anexa respuesta a las solicitudes realizadas.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
1.- Por parte del equipo de supervisión de SDHT se realizaran las consultas pertinentes al consultor para posteriormente trasmitir las aclaraciones a cada una de las dudas generadas.	supervisión de la SDHT		13/02/2024

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1-Se esta evaluando la necesidad de generar nuevos análisis de precios unitarios para actividades complementarias, de acuerdo a la revisión preliminar y las inconsistencias encontradas en los estudios y diseños.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

1- Para el presente periodo se cuenta con la aprobación de la totalidad de los PMT'S por parte de la SDM
2-Se cuenta con las actas de vecindad diligenciadas del parque Patio Bonito y se tiene programado para la siguiente semana realizar las actas de vecindad de los parques urbanizacion La Camelia y Riveras de occidente
3- Se adelantan acciones conjuntas entre las partes en pro de ajustar los planos y presupuestos acorde al alcance y condiciones de cada una de las zonas de intervención.

Aspectos administrativos:

1- Se envian observaciones al plan de trabajo presentado por el contratista de obra
2- Se adelantan revisiones a planos y presupuestos con el fin de ir depurando las inconsistencias presentadas entre ellos.
3- El contratista allega a la interventoría los APU del contrato
4- Se realiza revisión por parte de la interventoría de los informes mensuales entregados por el contratista de obra

Componente ambiental

1- Se aprueba V2 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres -08/02/2024.
2- Se remite oficio SDHT-1160-2024-056 -Devolución Manual Ambiental De Obra teniendo en cuenta que en la versión física faltan algunos anexos , de igual forma se solicita adjuntar los documentos en cuanto a proveedores de materiales, canteras y gestores RCD el día 9/02/2024.
3-Se recibió por parte del contratista el informe ambiental N°1, y se da aprobación por parte de Interventoría mediante oficio SDHT-1160-2024-053 -Aprobación informe ambiental N°1 el día 9/02/2024.

Componente SST

1-Se elabora Informe Mensual SST No.1 de Interventoría
2-Se revisa informe SST No.1 del contratista, se remiten observaciones.
3-Se participo en Comité.

Componente social

1-Revisión de piezas informativas para reuniones de inicio de los parques : La Rivera de occidente, La Camelia, Santa Cecilia, se da aprobación por el profesional social de la interventoría y se remite a la entidad quien aprueba volantes informativos para proceso de convocatoria, posterior envio a profesional social del contratista para proceso de divulgación.
2-Revision de presentaciones para reuniones de los parques: La Rivera de occidente, La Camelia, Santa Cecilia, las cuales presentaron observaciones remitidas al contratista quienes ajustan y remiten nuevamente, se revisa y se remite a la entidad, quienes remiten observaciones las cuales se subsanan por el contratista nuevamente.
3-Dia 06 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque Santa Cecilia la, cual no se realiza por decisión del área técnica de no ejecutar, se presentara en comité técnico y se definirá decisión para programar nuevamente a comunidad del sector.
4-Dia 07 febrero: Se reprograma reunión de inicio parque Riveras de occidente teniendo en cuenta la no asistencia de la comunidad, se establece contacto con la presidente de la JAC quien refiere que el mejor horario par el desarrollo de la reunión es en horas de la tarde- noche por ello se programa para el 12 de febrero 5:00 pm.
5-Dia 07 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque La Camelia en el cual se conto con la asistencia de 6 personas de las comunidad, profesionales de interventoría, contratista y entidad, se presentan actividades a ejecutar por cada uno de los componentes SST, ambiental, social y técnico. Se da respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por los asistentes.

9, Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL

PERSONAL INTERVENTORIA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

PERSONAL DE OBRA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPO / MAQUINARÍA	CANT.
RETRO EXCAVADORA	0
MINICARGADOR	0
VOLQUETA	0
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	0
MARTILLO NEUMÁTICO	0
COMPRESOR	0
CANGURO APISONADOR	0
TOTAL	

ESTADO DEL TIEMPO		
DIA	ORAS DE LLUVI	ESTADO
LUNES	0	
MARTES	0	
MIÉRCOLE	0	
JUEVES	0	
VIERNES	0	
SÁBADO	0	
DOMINGO	0	
	0,00 Hr/semana	

ESTADO
LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Teniendo en cuenta que se han adelantado labores de revisión y ajustes sobre diseños iniciales y presupuestos, se adelantan los tramites y acciones pertinentes que permitan dar inicio a las actividades de obra, teniendo claridad que se siguen realizando los ajustes pertinentes que permitan en buen desarrollo de las obras.
2- A medida que se van adelantando los ajustes sobre los documentos para el desarrollo de las obras se considera pertinente el pronto inicio de las actividades de obra en cada uno de los territorios.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FECHA DE ELABORACIÓN	domingo, 4 de febrero de 2024	INFORME No.	4	PERIODO	DEL	29/01/2024	AL	4/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME	INFORMACIÓN GENERAL DE PARQUES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - SOLIUN SAS		CONTRATO DE OBRA. - CONSORCIO ARQUING HABITAT	
CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1160-2023	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 1164-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A	**FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	4/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19/04/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
PLAZO TRANSCURRIDO:	47	PLAZO TRANSCURRIDO:	47
VALOR INICIAL :	$ 291.788.204,00	VALOR INICIAL :	$ 2.528.960.329,00
VALOR ADICION 1:	N/A	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
ANTICIPO	N/A	ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 291.788.204,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.528.960.329,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 291.788.204,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.528.960.329,00
SUPERVISOR:	ALBA JACQUELINE CELI HERRERA	INTERVENTOR:	SOLIUN SAS

2. BALANCE FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO				N/A	
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

CONTRATO DE OBRA					
Concepto	Fecha			Valor	%
ANTICIPO					30
PAGO 1					
PAGO 2					
PAGO 3					
PAGO 4					
PAGO 5					
PAGO 6					
PAGO 7					
PAGO 8					
PAGO 9					
PAGO 10					
PAGO 11					
PAGO 12					
TOTAL PAGADO					
PENDIENTE POR PAGAR					

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	% ACTIVIDAD	PROGRAMADO EJECUTADO	DIFERENCIA
	FASE DE OBRA						
1	PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE						
	Una vez atendidas las principales inquietudes sobre las inconsistencias que presentan los planos y la programación, se continúa ultimando detalles que permitan total claridad para la plena ejecución de las obras, informando sobre las dudas que se siguen presentando acerca de los diseños y presupuestos con el fin de obtener las aclaraciones pertinentes por parte del consultor, más sin embargo se siguen adelantando las acciones que conlleven al inicio de las actividades de obra proyectadas para la siguiente semana. Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría El día 31 de enero se realiza proceso de convocatoria en Riveras de Occidente, para reunión de inicio por profesional social del contratista. Se reprograma reunión de inicio parque Riveras de occidente teniendo en cuenta que el contratista convoca junta de acción comunal y comunidad de otros sector por equivocación, por lo cual se reprograma para siguiente semana.						
2	PARQUE DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA						
	Una vez atendidas las principales inquietudes sobre las inconsistencias que presentan los planos y la programación, se continúa ultimando detalles que permitan total claridad para la plena ejecución de las obras, informando sobre las dudas que se siguen presentando acerca de los diseños y presupuestos con el fin de obtener las aclaraciones pertinentes por parte del consultor, más sin embargo se siguen adelantando las acciones que conlleven al inicio de las actividades de obra proyectadas para la siguiente semana. Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría Se adelanta convocatoria para programar reunión social en el transcurso de la próxima semana						
3	PARQUE URBANIZACION LA CAMELIA						
	Una vez atendidas las principales inquietudes sobre las inconsistencias que presentan los planos y la programación, se continúa ultimando detalles que permitan total claridad para la plena ejecución de las obras, informando sobre las dudas que se siguen presentando acerca de los diseños y presupuestos con el fin de obtener las aclaraciones pertinentes por parte del consultor, más sin embargo se siguen adelantando las acciones que conlleven al inicio de las actividades de obra proyectadas para la siguiente semana. Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría Se adelanta convocatoria para programar reunión social de inicio en el transcurso de la próxima semana						
4	PARQUE PATIO BONITO II - D						
	Una vez atendidas las principales inquietudes sobre las inconsistencias que presentan los planos y la programación, se continúa ultimando detalles que permitan total claridad para la plena ejecución de las obras, informando sobre las dudas que se siguen presentando acerca de los diseños y presupuestos con el fin de obtener las aclaraciones pertinentes por parte del consultor, más sin embargo se siguen adelantando las acciones que conlleven al inicio de las actividades de obra proyectadas para la siguiente semana. Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría El día 31 de enero se realiza proceso de convocatoria en Patio Bonito, para reunión de inicio por profesional social del contratista Día 03 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque Patio Bonito en el cual se conto con la asistencia de 6 personas de las comunidad, profesionales de interventoría, contratista y entidad, se presentan actividades a ejecutar por cada uno de los componentes SST, ambiental, social y técnico. Se da respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por los asistentes.						
5	PARQUE CHUNIZA 1						
	Una vez atendidas las principales inquietudes sobre las inconsistencias que presentan los planos y la programación, se continúa ultimando detalles que permitan total claridad para la plena ejecución de las obras, informando sobre las dudas que se siguen presentando acerca de los diseños y presupuestos con el fin de obtener las aclaraciones pertinentes por parte del consultor, más sin embargo se siguen adelantando las acciones que conlleven al inicio de las actividades de obra proyectadas para la siguiente semana. Se cuenta con la totalidad de los PMT aprobados por la SDM Se cuenta con el personal mínimo aprobado de parte del contratista de obra como de la interventoría Aun no se han iniciado los acercamientos para programación de reunión social de inicio.						
	NOTA: Es de aclarar que a la fecha se esta realizando el cierre de las reunión social con comunidad, según el plan de gestión social. Para dar inicio a las actividades de obra.						

4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1						N/A
2						0,00%

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante la Semana	6,00%	9,00%	-3,00%

Actual Acumulado	6,00%	9,00%	-3,00%

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Programada	9,00%	9,00%
Valor de la Obra Programada		

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Los estudios y diseños presentan observaciones - en especificaciones y presupuestos, estas son informadas a la entidad mediante comité del día miércoles 31 de enero del 2024
2. Se reciben documentos por parte de la SDHT con ajustes y aclaraciones realizadas por el consultor.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA
1.- Por parte del equipo de supervisión de SDHT se realizaran las consultas pertinentes al consultor para posteriormente trasmitir las aclaraciones a cada una de las dudas generadas.	supervisión de la SDHT		6/02/2024

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1-Se esta evaluando la necesidad de generar nuevos análisis de precios No previstos de acuerdo a la revisión preliminar y las inconsistencias encontradas en los estudios y diseños.
2-Según lo comunicado por el equipo de supervisión de la SDHT en comité, se destaca la importancia de considerar los recursos necesarios para campamentos y baños en cada una de las zonas de intervención dentro del desglose del AIU con los cuales no se cuenta. Por ende, se propone la creación de un ítem adicional que abarque estos gastos para el contratista.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Aspectos técnicos:

1- El inicio de las actividades de obra no se produjo en el desarrollo de la semana.
2- Para el presente periodo se cuenta con la aprobación de la totalidad de los PMT'S por parte de la SDM
3- Se adelantan acciones conjuntas entre las partes en pro de ajustar los planos y presupuestos acorde al alcance y condiciones de cada una de las zonas de intervención.

Aspectos administrativos:

1- Se envían observaciones a la programación presentada por el contratista de obra.
2- Se adelantan revisiones a planos y presupuestos con el fin de ir depurando las inconsistencias presentadas entre ellos.
3- Se recibe plan de trabajo por parte del contratista el cuales se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Componente ambiental

1- Remisión de observaciones a la profesional ambiental del contratista respecto al MAO V2 mediante oficio SDHT-1160-2024-038 - Observaciones MAO y PMA-RCD versión 2 el día 28/01/2024.
2-Se realiza mesa de trabajo el día 29/01/2024 con la profesional ambiental del contratista para subsanar observaciones remitidas frente a MAO y PMA RCD y tramites relacionados con el pin, de igual forma se da aprobación de estos mediante oficio SDHT-1160-2024-039 - APROBACIÓN MAO Y PMA-RCD V.2- CONSORCIO ARQING HABITAT.
3- El día 30/01/2024 el contratista remite pin ambiental 24722 , por tanto se remite a la entidad soporte de apertura de pin y MAO-PMA RCD aprobado.
4- Se remiten observaciones en cuanto al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres el día 30/01/2024.
5- Aprobación de los artes de las vallas PAC y pendones de los 5 frentes objeto del Contrato el día 02/02/2024 por parte de Interventoría.
6- Se remiten observaciones frente a los documentos para el registro de Vallas ante cada Alcaldía Local el día 5/02/2024
7- Revisión de la versión V1 del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres -05/02/2024.

Componente SST

1-Se recibe Aprobación del Plan SST de la Interventoría por medio de Comité.
2-Se remite aprobación del Plan SST del Contratista.
3-Se remiten observaciones de Documentos personal mínimo requerido del contratista (Exámenes Médicos de Ingreso).
4-Se remite solicitud de documentos de personal operativo previo al inicio de obra.
5-Se participa en reunión Social del parque Patio Bonito

Componente social

1-Revisión de plan de gestión social V2 el cual presento observaciones por el profesional social de la Interventoría, dichas observaciones se remiten por correo para proceso de subsanación, la profesional social del contratista remite v3 del plan de gestión social el cual es revisado y aprobado el día 30 de enero, se remite correo de aprobación y solicitud de radicado al contratista.
2-Remisión de PGS y plan de seguimiento social a profesional social de la entidad con el objetivo de solicitud de revisión y validación.
3-Revisión de piezas informativas para reuniones de inicio de los parques : La Rivera de occidente y Patio Bonito II sector, se da aprobación por el profesiona social de la Interventoría y se remite a la entidad quien ajustar volantes informativos para proceso de convocatoria, posterior envió a profesional social del contratista para proceso de divulgación.
4-El día 31 de enero se realiza proceso de convocatoria en los sectores Riveras de Occidente y Patio Bonito, para reunión de inicio por profesional social del contratista.
5-Revision de presentaciones para reuniones de los parques: Riveras de occidente y Patio Bonito, las cuales presentaron observaciones remitidas al contratista quienes ajustan y remiten nuevamente, se revisa y se remite a la entidad, quienes remiten observaciones las cuales se subsanan por el contratista nuevamente.
6- Dia 03 febrero: Asistencia a reunión de inicio parque Patio Bonito en el cual se conto con la asistencia de 6 personas de las comunidad, profesionales de interventoría, contratista y entidad, se presentan actividades a ejecutar por cada uno de los componentes SST, ambiental, social y técnico. Se da respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por los asistentes.
7- Se reprograma reunión de inicio parque Riveras de occidente teniendo en cuenta que el contratista convoca junta de acción comunal y comunidad de otros sector por equivocación, por lo cual se reprograma para siguiente semana.

9, Ejecución de Obras-CONTROL DE PERSONAL

PERSONAL INTERVENTORIA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

PERSONAL DE OBRA	
CARGO	CANT.
DIRECTOR OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SOCIAL	1
PROFESIONAL EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG/SST	1
PROFESIONAL AMBIENTAL	1
TOTAL	5

EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPO / MAQUINARIA	CANT.
RETRO EXCAVADORA	0
MINICARGADOR	0
VOLQUETA	0
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	0
MARTILLO NEUMÁTICO	0
COMPRESOR	0
CANGURO APISONADOR	0
TOTAL	

ESTADO DEL TIEMPO		
DIA	ORAS DE LLUVI	ESTADO
LUNES	0	
MARTES	0	
MIÉRCOLE	0	
JUEVES	0	
VIERNES	0	
SÁBADO	0	
DOMINGO	0	
TOTAL DE Hr.	0,00 Hr/semana	

ESTADO
LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Teniendo en cuenta que se han adelantado labores de revisión y ajustes sobre diseños iniciales y presupuestos, se adelantan los tramites y acciones pertinentes que permitan dar inicio a las actividades de obra, teniendo claridad que se siguen realizando los ajustes pertinentes que permitan en buen desarrollo de las obras.
2- Con los adelantos en los ajustes a los planos y presupuestos, aprobaciones de PMT'S, aprobación de personal mínimo y entrega del cronograma inicial por parte del contratista, se constituye un panorama favorable para el inicio de las obras.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ

ANEXO 5. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

CONSORCIO ARQING HABITAT	Contrato de Obra 1164-2021	COD:	SDHT-001
		VERSION No.:	01
		FECHA:	25-feb-22
	PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS	HOJA No. 1	DE 1

ACTIVIDAD	NORMA TÉCNICA	INSPECCIÓN	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RECURSOS	RESPONSABLE	REGISTRO
Localización y Replanteo	Especificaciones Particulares de Obra	Ejecución de levantamientos topográfico y confrontación con levantamiento topográfico de Interventoría	Inicio y Terminación de Obra	Se deben cumplir los requerimientos establecidos en el presente contrato, y debe estar a satisfacción por la Interventoría.	- Comisión de Topografía, - Recurso Humano	Ingeniero Residente, Comisión de Topografía	Bitácora de Obra
Excavaciones	Especificaciones Particulares de Obra	Inspección en obra con comisión topográfica	Inicio y Terminación	Excavación o parcial de material existente en las zonas que indiquen los planos de diseño del proyecto	- Maquinaria de Excavación - Mano de Obra	Ingeniero Residente	Bitácora de Obra
Demoliciones y Descapote	Términos de Referencia	Inspección en obra	Por jornada de trabajo	Demolición total o parcial de estructuras existentes y retiro de cobertura vegetal en las zonas que indiquen los planos de diseño del proyecto	- Maquinaria de Construcción - Mano de Obra	Ingeniero Residente	Bitácora de Obra
BARANDA CERRAMIENTO S M-83	Especificaciones IDRD, Capítulo 10	Inspección en obra	Por llegada de material	Revision de componentes, dimensiones de acuerdo al sitio, protocolos de calidad y resistencia. Certificacion de calidad del material por parte del proveedor y certificación de calidad de los materiales.	- Recurso Humano -Certificación del proveedor	Ingeniero Residente	Bitácora de Obra
CANECAS M-120	Especificaciones IDRD, Capítulo 10	Inspección en obra	Por llegada de material	Certificacion de calidad del material por parte del proveedor. Junto con la certificación de calidad de proveedor, se enviará certificación de calidad de los materiales.	- Recurso Humano	Ingeniero Residente	Bitácora de Obra
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	Especificaciones IDRD I.N.V.E-161, I.N.V.E-162 Y I.NV.E-164.	Los materiales a emplear en la construcción de rellenos donde se utilice este material deberán proceder de fuentes autorizadas por la Interventoría y deberán cumplir con lo parámetros correspondientes a subbase granular tipo IDRD consignadas en las especificaciones. Se requiere certificación por parte del proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones IDRD. Ensayos:	Curva granulometrica Una (1) por procedencia Equivalente de arena I.N.V.E-133 Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Valor de azul de metileno I.N.V.E-235 Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Desgaste en la máquina de los ángeles I.N.V.E-218 Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Densidad seca de la capa compactada cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad) Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área). • Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales. • Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo. • Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.	Debe estar entre los limites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD. Equivalente de arena I.N.V.E-133 Mayor o igual que 25 % Valor de azul de metileno I.N.V.E-235 Menor o igual que 1 % (1gr/100gr) Desgaste en la máquina de los ángeles I.N.V.E-218 Menor o igual que 50 % Densidad seca de la capa compactada Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor Modificado Puede ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo I.N.V.E-161, I.N.V.E-162 Y I.NV.E-164. Uniformidad de la superficie Medido con una boquillera de 3m, no se aceptarán altibajos superiores a 2,0 cm. Una vez la superficie se ha compactado completamente.	- Herramienta de Compactación - Recurso Humano	Ingeniero Residente	- Bitácora de Obra - Se debe pedir certificación al proveedor que garantice el cumplimiento de las carácterísticas
	I.N.V.E-142	Proctor Modificado	Una (1) cada 500 m3 de material suministrado				Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la cantera
	I.N.V.E-213	Granulometría	Una (1) cada 500 m3 de material suministrado	Debe estar entre los limites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD.			Se debe pedir certificación del proveedor.
	I.N.V.E-125	Límite líquido	Una (1) cada 500 m3 de material suministrado	Menor o igual al 40 %			
