CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	7/02/2024	**PERIODO No.**	8	DEL	**1/02/2024**	AL	**7/02/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CIN-456-2023	CONTRATO No.:	COP-452-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	89	PLAZO ACTUALIZADO:	89
PLAZO TRANSCURRIDO:	50 EQUIVALE AL 56.18%	PLAZO TRANSCURRIDO:	50 EQUIVALE AL 56.18%
VALOR INICIAL :	$ 136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$ 509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$ 509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024		no iniciado
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
15	INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - PTAR LA UNIÓN	21/02/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la semana 8 de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

Mediante comunicado INT-SUMA-019-2024 del 2 de febrero la interventoría solicito los apus de los ítems no previstos y el cronograma general del proyecto de acuerdo con la etapa I, revisión y apropiación de los estudios y diseños.

EL día 5 de febrero mediante oficio INT-SUMA-21-2024 la interventoría dio aprobación a los ajustes de carácter hidráulico del proyecto y al inicio de obras de ítems contractuales.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER I	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	7/02/2024	**PERIODO No.**	8	DEL	**1/02/2024**	AL	**7/02/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

•El día 1 de febrero la interventoría remitió a la supervisión el plan de acción social para la revisión y aprobación de este, mediante comunicado INT-SUMA-017-2024.

•Mediante comunicado INT-SUMA-019-2024 del 2 de febrero la interventoría solicito los apus de los ítems no previstos y el cronograma general del proyecto de acuerdo con la etapa I, revisión y apropiación de los estudios y diseños.

•EL día 5 de febrero mediante oficio INT-SUMA-21-2024 la interventoría dio aprobación a los ajustes de carácter hidráulico del proyecto y al inicio de obras de ítems contractuales.


•El día 7 de febrero mediante oficio INT-SUMA-24-2024 la interventoría realizo la aprobación de tres (3) actas de vecindad en la vereda la Unión, sin embargó se solicitó el envió de documentación con las firmas respectivas, adicional al levantamiento de las actas de vecindad de los otros cuatro sistemas a intervenir.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>





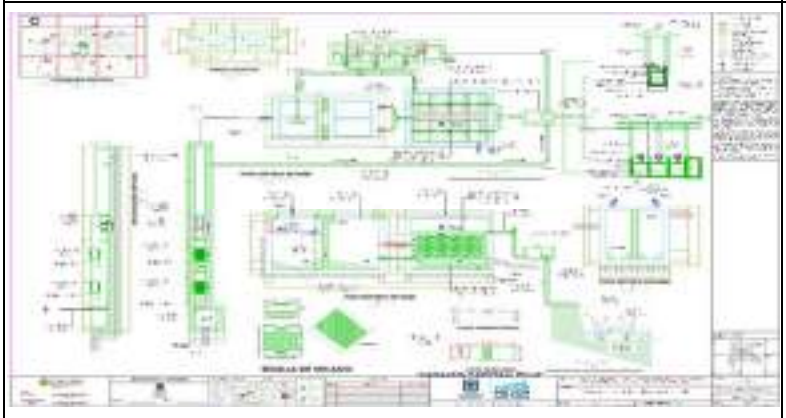

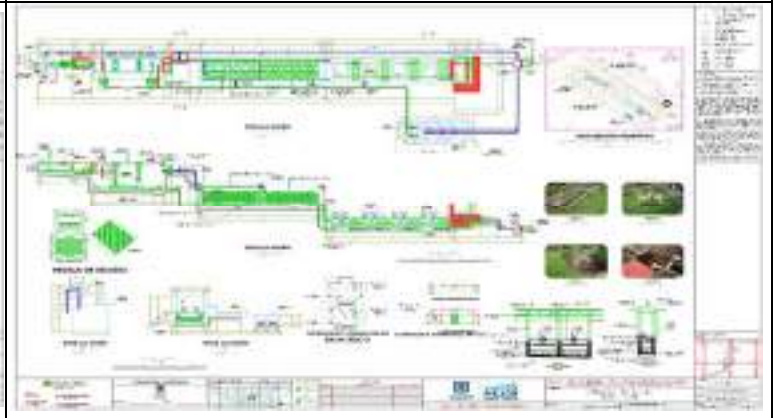

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	14/02/2024	**PERIODO No.**	9	DEL	**8/02/2024**	AL	**14/02/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CIN-456-2023		CONTRATO No.:	COP-452-2023	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	89		PLAZO ACTUALIZADO:	89	
PLAZO TRANSCURRIDO:	57 EQUIVALE AL	64.04%	PLAZO TRANSCURRIDO:	57 EQUIVALE AL	64.04%
VALOR INICIAL :	$	136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$	509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$	-	VALOR ADICION(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$	509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$	-	VALOR PAGADO:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$	509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024	14/02/2024	-37
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024		no iniciado
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024		no iniciado
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024		no iniciado
15	INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - PTAR LA UNIÓN	21/02/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39		#¡VALOR!

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la semana 9 de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

El contratista mediante oficio OF-CGHW_010 del 9 de febrero realiza solicitud de prórroga del contrato de obra por el termino de 1 mes de acuerdo con novedades en los diseños y el presupuesto existente, como resultado de la etapa I, revision a los diseños existentes.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	14/02/2024	**PERIODO No.**	9	DEL	**8/02/2024**	AL	**14/02/2024**

•El contratista mediante oficio OF-CGHW_010 del 9 de febrero realiza solicitud de prórroga del contrato de obra por el termino de 1 mes de acuerdo con las siguientes aclaraciones:

NOVEDADES EN LOS DISEÑOS:

Al estudiar los planos entregados por la entidad contratante, se identificó que era necesario potenciar los diseños originales, con el propósito de poder entregar una obra con la calidad que requiere, una operatividad ideal del sistema y el cumplimiento de la norma de vertimientos a futuro Resolución 631 de 2015.
En la revisión de los diseños entregados, hubo la necesidad de incluir algunos accesorios hidrosanitarios adicionales a nivel de detalle que permitiera la interconexión entre las estructuras proyectadas.
Dentro de los ajustes realizados, se incluyeron los perfiles hidráulicos que permitieran aseverar los niveles de los accesorios hidráulicos y tanques con un mejor nivel de detalle.
Luego de la revisión y complementación de los diseños, se vio la necesidad de adicionar sistemas de tratamiento preliminares, dispositivos de aforo de caudal según las reglamentaciones actuales, así como estructuras de tratamiento primario, que estimulen las condiciones estables en el tratamiento biológico proyectado.
Se debe hacer hincapié en la PTAR - planta de tratamiento de aguas residuales de centro poblado de San Juan, en donde luego de la visita de campo, se encontró que se trata de un caso especial, debido a que las estructuras de los tanques existentes (RAV y FILTRO) se encuentran construidos en un sistema de muros prefabricados, el cual al ser intervenido existe la posibilidad de causar una afectación estructural importante, es por esta razón que se están evaluando diferentes alternativas de intervención y dar una solución óptima, de la misma forma que se ha planteado para las otras 4 intervenciones a ejecutar.


NOVEDADES EN EL PRESUPUESTO:

Debido a la revisión hidráulica y de diseño entregada y los ajustes que se han efectuado, también se ha tenido que actualizar la parte presupuestal del proyecto, eso incluye una revisión de las cantidades, ajuste a los ítems contractuales, especificaciones técnicas, recurso humano y por consiguiente actualizar el tema de transporte de materiales.
Como parte de la revisión de los ítems contractuales y las actualizaciones hechas a los diseños, algunos ítems no se tendrán en cuenta, debido a esto, se han planteado ítems no previstos necesarios con el propósito que al momento de entregar las obras sean completamente funcionales y cumplan los requerimientos y características actuales para este tipo de sistemas de tratamiento de aguas y por ende que sean de total beneficio de la comunidad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografias a color, con resolución no menor a 3MB>



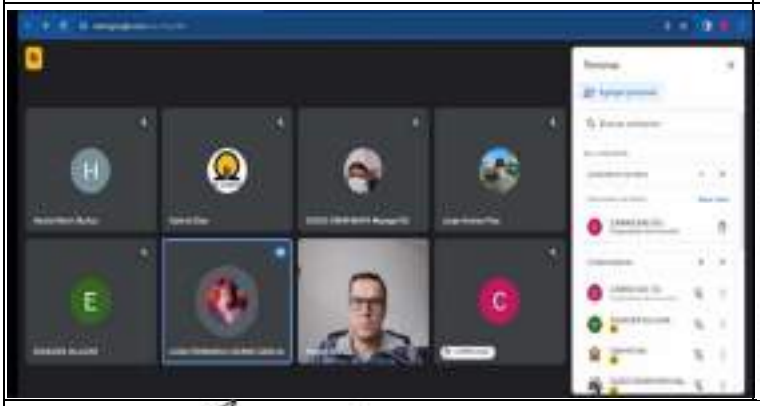


FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	21/02/2024	**PERIODO No.**	10	DEL	**15/02/2024**	AL	**21/02/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	CIN-456-2023			CONTRATO No.:	COP-452-2023		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES			PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	89			PLAZO ACTUALIZADO:	89		
PLAZO TRANSCURRIDO:	64	EQUIVALE AL	71.91%	PLAZO TRANSCURRIDO:	64	EQUIVALE AL	71.91%
VALOR INICIAL :	$		136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$		509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$		509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024	14/02/2024	-37
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024	20/02/2024	-35
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024	20/02/2024	-35
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024	20/02/2024	-25
15	INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - PTAR LA UNIÓN	21/02/2024		no iniciado
Plazo del proyecto en días		39	64	-25

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la semana 10 de ejecución de la Fase I: "REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE" se continua con la revisión y analisis de los Estudios y Diseños Existentes por parte del Contratista de Obra.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	21/02/2024	**PERIODO No.**	10	DEL	**15/02/2024**	AL	**21/02/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


•La interventoría mediante oficio INT-SUMA-29-2024 realiza la recomendación de aprobación de la solicitud de prorroga presentada por el CONSORCIO GHW SUMAPAZ.

•El día miércoles 21 de febrero de 2024 se realizó socialización del proyecto con la comunidad aleña al pozo séptico de santo domingo, en la cual se les explico el alcance de la intervención en el sitio, al igual que la fecha de inicio y el plazo para la misma.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>



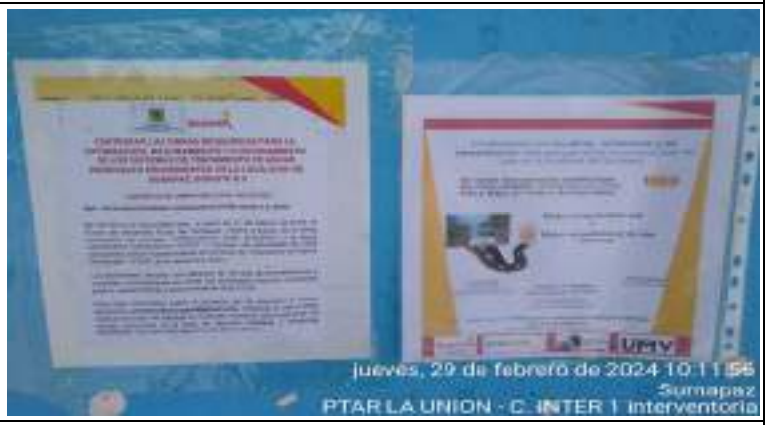





FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

CONSORCIO INTER 1	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	29/02/2024	**PERIODO No.**	11	DEL	**22/02/2024**	AL	**29/02/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CIN-456-2023	CONTRATO No.:	COP-452-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de diciembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de marzo de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	89	PLAZO ACTUALIZADO:	89
PLAZO TRANSCURRIDO:	72 EQUIVALE AL 80.90%	PLAZO TRANSCURRIDO:	72 EQUIVALE AL 80.90%
VALOR INICIAL :	$ 136,881,167.00	VALOR INICIAL :	$ 509,524,708.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 136,881,167.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 509,524,708.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 136,881,167.00	VALOR POR PAGAR:	$ 509,524,708.00
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA LOZANO	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER 1

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	19/12/2023	19/12/2023	0
2	INFORME DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES	8/01/2024	16/01/2024	-8
5	REVISIÓN Y AJUSTE ESTUDIOS HIDRÁULICOS	8/01/2024	16/01/2024	-8
7	ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA	16/01/2024	24/01/2024	-8
8	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	16/01/2024	24/01/2024	-8
9	ENTREGA DEL SG SST	16/01/2024	16/01/2024	0
10	REVISIÓN Y AJUSTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN	8/01/2024	14/02/2024	-37
11	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y APUS DEFINITIVOS	16/01/2024	20/02/2024	-35
13	Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños,	16/01/2024	20/02/2024	-35
14	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	26/01/2024	20/02/2024	-25
15	INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - PTAR LA UNIÓN	21/02/2024	23/02/2024	-2
Plazo del proyecto en días		39	64	-25

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. N/A por la ETAPA I	$ -	0.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

En la semana 11 de ejecución de la Fase 2: "EJECUCIÓN DE OBRA" se inician con labores preliminares en la PTAR LA UNIÓN como replanteo manual, demoliciones de concreto estructural, demolición de tuberia existente, excavaciones manuales en material comun.

El contratista el dia 22 de febrero de 2024 mediante oficio CGHW_005_14 realizo entrega de los Apus de items no previsto, asi como cotizaciones de los insumos, para la respectiva revisión de la interventoria.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A. NO APLICA

CONSORCIO INTER I	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 18-Ago-2023

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	29/02/2024	**PERIODO No.**	11	DEL	**22/02/2024**	AL	**29/02/2024**

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato o proyecto y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Mediante oficio INT-SUMA-36-2024 se realizan las segundas observaciones a los Apus de los ítems no previstos del resultado de la etapa I, revisión y ajuste a los diseños.

Mediante oficio INT-SUMA-37-2024 se realizan las terceras observaciones a los Apus de los ítems no previstos del resultado de la etapa I, revisión y ajuste a los diseños, de fecha 28 febrero de 2024.

El lunes 26 de febrero se da inicio a las labores de obra, específicamente en la PTAR de la Unión, el día miércoles 28 de febrero se realiza el primero comité de obra en donde quedaron plasmados los siguientes compromisos:

- Envió de la programación general del proyecto a la interventoría por parte del contratista de obra.
- Respuesta a las solicitudes realizadas por la interventoría en diversos oficios para el procedimiento de la solicitud de prorroga de los contratos, por parte del CONSORCIO GHW SUMAPAZ.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>













FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: LUISA FERNANDA LOZANO

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
