ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	lunes, 4 de diciembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/06/2020

FECHA REALIZACION INFORME	lunes, 4 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se realiza comité de obra virtual en presencia de la entidad, contratista o interventoria en horas de la mañana
- Se avanza en la ejecucion de excavaciones en tramo 1
- NO se avanza en la construccion de la segunda cercha , debido a falta de material en obra

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO: 4/12/2023

Comentarios: Avance excavaciones



FOTO 2: 04/12/2023

Comentarios: Avance excavaciones

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Urrutia. Cc. 1147832103.
4. Fowinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015963535
6. Julian Balbuena. Cc. 8239/228
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217625
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. Jose Rieja Blanquicet. CC. 1.063.135.645
10. Jose Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.890

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboro	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

- Se realiza comite de obra virtual con la presencia de obra, interventoria con especialista estructural, contratista con especialista estructural. Se evalua el avance de la obra junto con observaciones a los diseños respecto a la cimentación evaluada en obra la semana pasada. Se evalua por parte de la supervisión del contrato realizar excavaciones puntuales, sobre eje vertical de columnas en modulos 3 y 2 el cual se compromete a solicitar autorizacion para ejecutar excavaciones de hallazgo de cimentación.
- Se esta a la espera de envio de planos y detalles evaluados por especialista de la entidad para dar via obras a realizar.
- Se continua con excavaciones del terreno natural en el eje vertical de columna ejes (1C) (1H) (1F) (3i) en costado exterior.
- En el momento se cuentan con 2 perfiles metalicos terminados en soldadura, se esta a la espera de llegada de material ya que la construcción de los perfiles metalicos en Bogotá con las especificaciones solicitadas en planos es cerrada. Se Manda Fabricar material en Malambo - Atlantico el cual ya se tiene el material listo para su traslado a obra se espera su llegada el dia miercoles en horas de la tarde.
- Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente.

Alejandro Adell
Apoyo a la Dirección

martes, 5 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	martes, 5 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- se recibe material para cerramiento en tramo 1 consiguinete a la cancha de voleibol
- Se avanza en la ejecucion de excavaciones en tramo 1
- NO se avanza en la construccion de la segunda cercha , debido a falta de material en obra

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO: 5/12/2023

Comentarios: Recibo de material en obra



FOTO 2: 05/12/2023

Comentarios: Avance excavaciones

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82291288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

-Se continua con extracción de cimientos c/p (3 I) y corte de placa del mismo con el fin de realizar extracción de cimientos centrado. la existencia de zapata centrado dividen el cual coincidencia con vigas de las otras zapatas.
-Se recibe en obra Madera, Polvorón y Plastico para mientras concreto pertinente a las zonas intervenidas y taller de orientación.
-Se inicia instalación de Madera como Parales para soporte de concreto.
-A en obra se cuenta con 2 cercas terminadas con soldadura y listas para aplicación de Pintura.
-Al Finalizar la jornada se realiza orden y aseo.

Alexander Abad
Apoyo a la dirección

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	miércoles, 6 de diciembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	miércoles, 6 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- se recibe material de perfileria para cerchas las cuales han venido llegando de manera parcial desde la costa atlantica
- Se avanza en la ejecucion de excavaciones en tramo 1
- Se avanza en la elaboracion de la segunda cercha
- Se adelantan apiques internos en la parte de techo para verificacion de elementos presentes en el techo , donde se encuentra que este techo esta compuesto por

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 6/12/2023

Comentarios: Recibo de material en obra



FOTO 2 06/12/2023

Comentarios: Avance excavaciones



FOTO 3: 06/12/2023

Comentarios: Avance Apiques , hallazgo cimentacion



FOTO 4: 06/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc 71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobo	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

6/11/23.

- Se reciben Perfiles metálicos Viga Cerchas Metálicas Procedente de Malambo - Atlántico este Material cumple con las especificaciones técnicas de Fondo en Placas de Cubierta.
- Se continua con instalación de reforzamiento Sismorresistente en taller de ornamentación y Modulo 1.
- Se realiza Vaciado de Material de excavación Proveniente de hallazgos de Cimientos y acopio en lugar establecido Permanente Frente a Parqueaderos del Modulo 1.
- Se realiza aplique en Cielo raso existente en Modulo 1 el cual Muestra un espesor de 5cm en Retiro de bajo resistencia y hallazgo de Placa en concreto de alta resistencia sobre el Retiro. Se desconoce el espesor de la Placa y Si Cuenta con Acero de refuerzo.
- Al Finalizar la Jornada Laboral se realiza orden y aseo.

Alexander Abril
Apoyo a la dirección

24

ICA / GRUL	INTERVENTORIA EJECUCION LABORATORIO ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		Fecha: Jueves, 7 de diciembre de 2023
				Codigo: EJE.INT.TEC.FO.003
				Version: 01
				Fecha de Actualización: 1/09/2020

FECHA REALIZACION DE OBRA:	Jueves, 7 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No.:	OOC 170 2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20-11-23	FIN	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Riesgo Tormenta Electrica	Brecha anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de maltana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, no desarrollan las actividades de mantenimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO

se revisa material de perfileria para cerchas las cuales han sido llegando de manera normal desde la costa atlantica

Se avanza en el corte, figurado y armado de la tercera cercha

Se adelanta instalación de materias sobrantes de excavaciones

Se adelantan aplomos internos en la parte de techo para verificación de elementos presentes en el techo, donde se encuentra que este techo esta compuesto por una viga metalica

se adelanta aplomo en columnas las cuales indican un espesor de 6 cms las cuales tienen una medida de 25x25cms

RECOMENDACIONES

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general
2. Se adelanta la verificación de la documentación del personal que se encuentra presente en obra así como la verificación de los EPP
3. A la fecha no se cuenta con la programación general de obra, se remite comunicación al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 7/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 07/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 3: 07/12/2023

Comentarios: Acopio material auxiliar



FOTO 4: 07/12/2023

Comentarios: apoyos a techo

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

[illegible]

INTERVENTORIA - GRUCONN S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Profesional	ERICA [illegible]	Residente administrativo de Interventoria
Profesional SST - MA	ANA [illegible]	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Operativo	CARGO AJUSTO GRADO CALENO	Dirección de Interventoria
Operativo	CARGO AJUSTO GRADO CALENO	Dirección de Interventoria

Ing. Erica [illegible]
Residente administrativo de Interventoria

Ing. Carlos Augusto Giraldo Calderon
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

7/12/23

- Se continua con trabajos de soldadura de cerchas metálicas de cubierta, empalmando perfiles en C. Formando secciones de 10x10 según especificaciones indicadas en los planos de cubierta.
- Se realiza la instalación total de canaletas perimetral de zona de soldadura, acopio de RCD y acopio de agregados.
- Se continua con trabajos de RCD a punto de acopio definido inicialmente.
- Se realiza afinado en cielo raso encontrando pared con altura de 4 o 5cm de espesor, en la parte superior del parete se encuentra placa de concreto de otra estructura, se escarifica 3cm de dicha placa para la encuentra altura de retiro. Se suspende verificación e interna o intervención.
- Se realiza verificación de encabezamiento en columnas, el cual indica espesor de 6 y 6,5cm, las columnas terminadas tienen sección de 25x25 las columnas perimetrales columnas centrales 35x25 esta ampliación se realiza por encabezamiento de tubo bajante desde la cubierta, las columnas cuentan con 1cm de parete en cada cara, el área la sección estructural de las columnas es de 23x23 cm.
- Se esta a la espera de definir los planos estructurales de las obras a realizar.
- Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.

Alejandro Abril
Ing. Apoyo a la dirección.

viernes, 8 de diciembre de 2023

ICA GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 01 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	viernes, 8 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la tercera cercha asi como el inicio de la construccion de la 4 cercha
- se continua con el acopio dematerial sobrante producto de las excavaciones

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 8/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 08/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriena. Cc. 1147538102.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Bahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. Jose Biejia Blanquicet. CC. 1.063.125.045
10. Jose Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.064.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboro	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

8/12/23

- Se constancia actividades de soldadura de cerchas de cubierta metálica, se acosta en la armada de cercha 3, cortando perfiles empalmados el día de ayer, se comprueba en criterios teóricos de material, sección transversal, y geometría indicada en los planos de cubierta.
- Se mantiene la geometría simétrica en ambos ala de la cercha colocado y acodado por especialista estructural de inspección.

Alejandro Abad
Apoyo a la dirección

sábado, 9 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	sábado, 9 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la tercera cercha asi como el inicio de la construccion de la 4 cercha
- se continua con el acopio dematerial sobrante producto de las excavaciones

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 9/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 09/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

9/12/23

-Se continuan trabajos de Soldadura y Fabricación de Cerca metalica #3. el lineo de cerca #4.

-Se continuan con actividades de Retiro de material de excavación desde dentro del edificio, modulo 1 Posteriormente de excavación y localización de Cimientos junto con la demolición de Placa de Contrapiso. Este Material es ubicado en Zona designada para el acopio de ECD Frente al modulo 1 en Zona del Parqueadero del Casa Se encuentra con Cerramiento en Polisombra

-Al Finalizar la jornada Se realiza orden y aseo

Alejandro Ruiz
Apoyo a la Dirección

domingo, 10 de diciembre de 2023

ICA GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	domingo, 10 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la tercera cercha asi como el inicio de la construccion de la 4 cercha

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

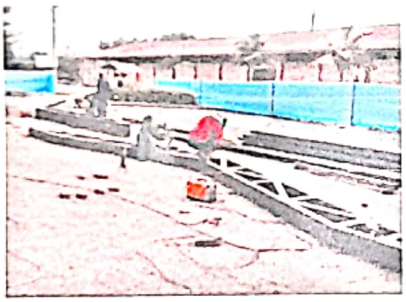


FOTO 1: 10/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 10/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovimson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valna. Cc. 1015993535
6. Julian Maheccha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217029
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. Jose Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.845
10. Jose Luis Bravo Nuñez.CC 1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboro	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Reviso SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Reviso	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobo	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

10/12/23

-Se continua con actividades de construcción de cordón metálico #4 cortando perfiles empalmados [ ] con dimensiones 10x10 cm. e=30 mm. Se monta SIMETRA en ambas alas de la cepa, montando misma pendiente de la calzada y medidas de los transversales en ambos costados de las cepas.

-Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.

Alejandro Aleuy
Apoyo a la dirección
