ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [x]		INFORME FINAL [ ]	
Tipo de Contrato: OBRA [x]		INTERVENTORÍA [ ]	
Informe Número: ____5____		Periodo comprendido entre el 30 de diciembre 2023 hasta el 31 de enero de 2024.	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.762.2023 de 2023			
Nombre Completo del Contratista: JC INGENIERIA VIAL SAS			
Documento de identificación del contratista: 900.459.964-0			
Nombre (s) del Supervisor (es): WILMER TABARES MARIN			
Organismo: SECRETARIA DE MOVILIDAD			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 96%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 96%	
Objeto del contrato: "REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30 de agosto de 2023	9 de marzo de 2024
Modificación del contrato: Prorroga a 9 de marzo	
Suspensión: NA	
Reanudación: NA	
Cesión: NA	
Terminación anticipada: NA	
Acta de recibo final de obra: NA	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del Contrato: es hasta por la suma de MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE $ 1,105'400,831
Adición: $154.839.368
Prórroga: 9 de marzo de 2024
Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 1,260.240.199	$ 189.016.164	$ 1.019.455.606	$ 51.768.429

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA JC INGENIERIA VIAL S.A.S

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de febrero de 2024
Firmada por YENNY ROCIO REYES MARIN identificada con CC. 65.785.043, y con tarjeta profesional No. 273487-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de Revisor Fiscal de JC INGENIERIA VIAL S.A.S identificada con NIT 900459964-0.


PERSONA NATURAL: NA
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: NA
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: NA
Operador: NA
Fecha de Pago: NA
Periodo de pago: NA

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO


El contratista realizó las siguientes actividades las cuales se verificaron en sitio de la siguiente forma:

- C16 K85 Se fabricó un marco para tapa especial.

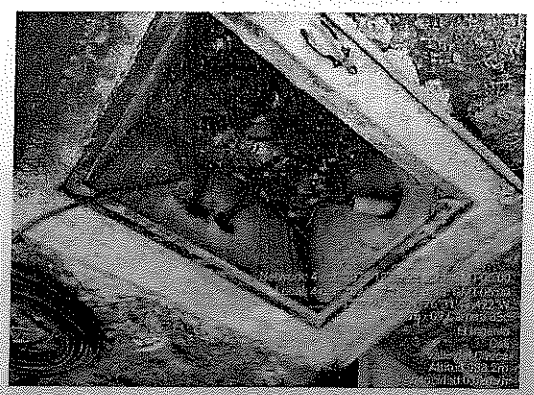

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C73 K25U - Se realizó un diseño para la intersección C73 K25U

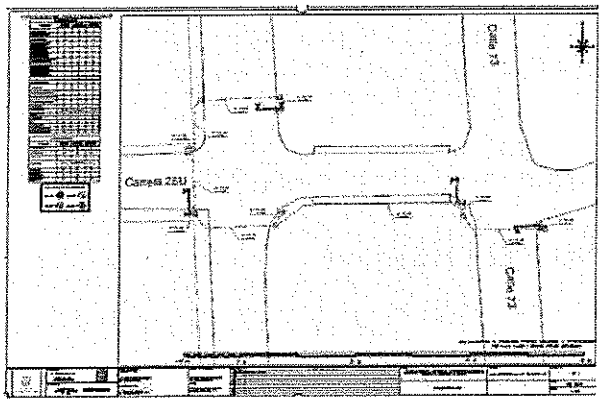

C18 A2N Y 3N

- Se realizó anclaje tipo 1 en flujo 1B.
- Se instaló un poste T2 en el flujo 1B.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C30 T25


- Se realizó caja de paso principal y un pedestal tipo 2.
- Se fabricaron dos tapas para caja sencilla.
- Rotura y empalme a caja existente.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C33A K15


- Retiro de anclaje
- Se instalaron 3 m de ducteria de 3" en zona dura.
- Se instaló dos anclajes tipo 1.
- Se instaló un poste T1 troncocónico
- Se instaló un poste T2 con brazo de 5,5 m.

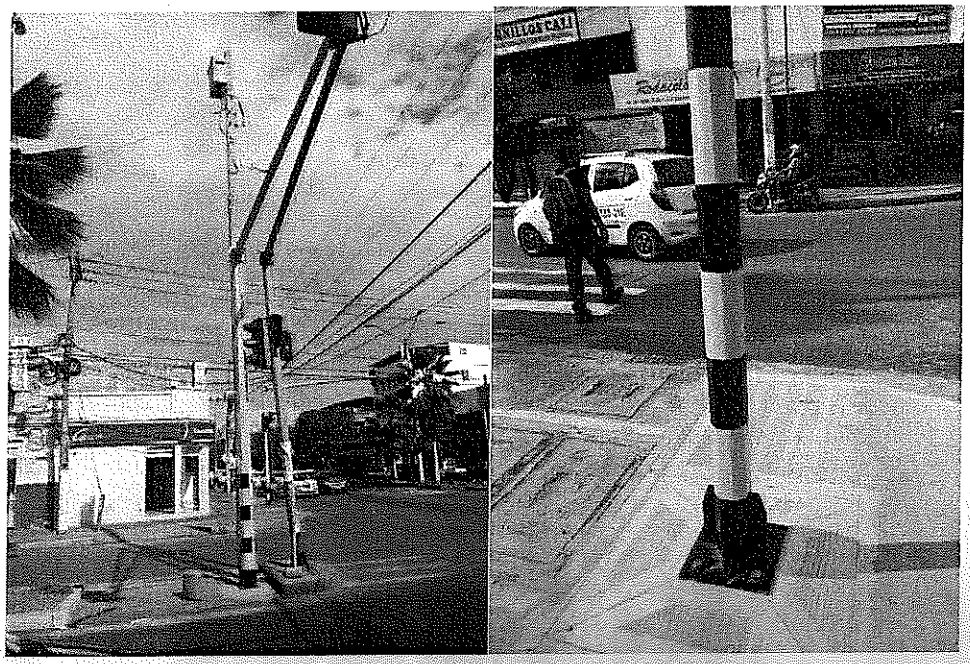

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C34 K23


- Se suministraron 5 tapas para caja sencilla.

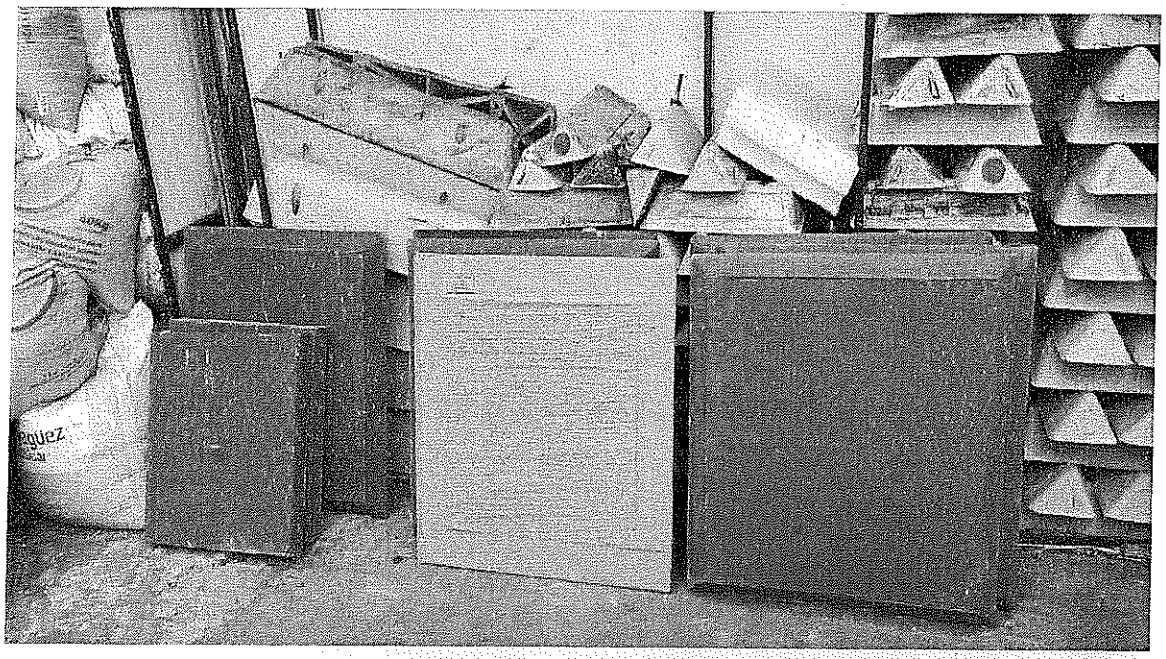

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


C25 K8

- Se suministraron dos para caja sencilla.

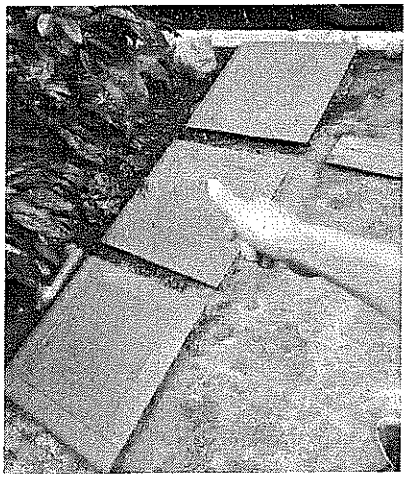

C14 K50


- Se instaló un pedestal tipo 1
- Se instaló una caja principal
- Se instalaron 30 cm de ducto de 4"
- Se realizó rotura y empalme a caja existente.

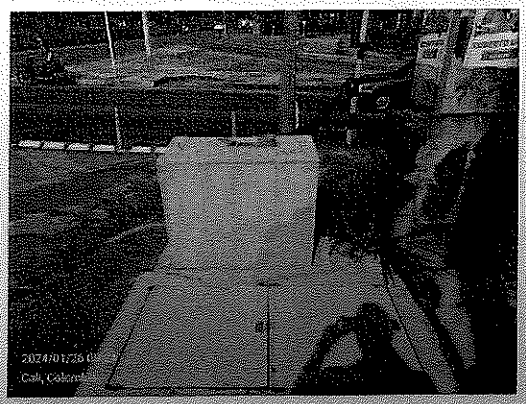

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C14 K34

- Se instaló pedestal tipo 1
- Se instalo caja principal.
- Se instalaron dos m de ducto de 4"
- Se hace rotura y empalme a caja existente.

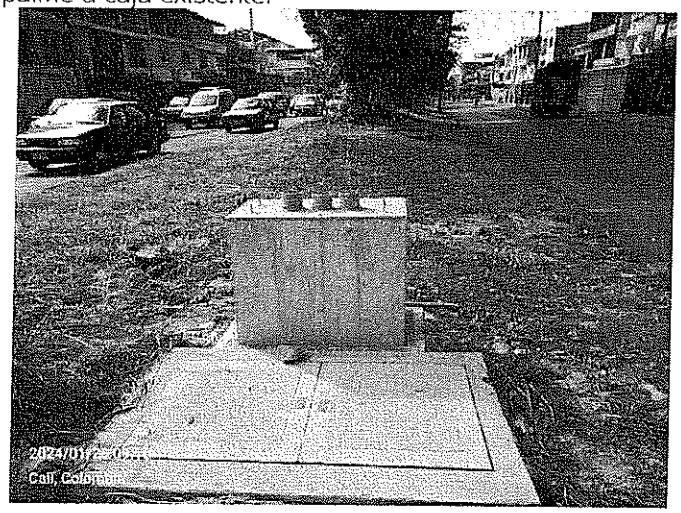

C14 K32

- Se instaló pedestal tipo 1
- Se instaló caja principal.
- Se instaló 1 m de ducto de 4"
- Se hace rotura y empalme a caja existente.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


C13 K39

- Se fabricó y se instaló 14,4 m de baranda con tubería redonda.



C44 K5N

- Se instaló pedestal tipo 1
- Se instaló caja principal.
- Se instalaron 2,20 m de ducto de 4"
- Se hizo demolición de anden de 38 cm3 y reponen nuevamente.

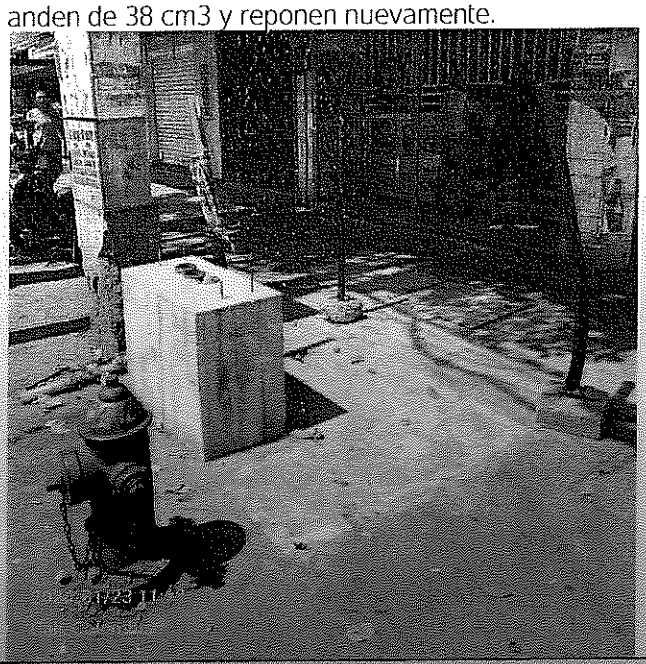

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C62 K1D

- Se hizo anclaje tipo 1
- Se instaló 30 cm de ducteria de 3"
- Se hace rotura y empalme a caja existente



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C5 K79

- Se hizo diseño de intersección
- Se instalaron 3 anclajes tipo 1
- Se construyeron 3 cajas sencillas
- Se construye una caja doble
- Se **instalaron 29,01 m de ducteria de 4" en zona blanda**
- Se hace rotura y empalme a caja existente



C19 K100

- **Se instalaron 40 cm de ducteria de 4" en zona blanda**
- Se hace rotura y empalme a caja existente



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


C26 K99

- Se construyó caja principal
- **Se instalaron 45 cm de ducteria de 4" en zona blanda**
- Se hace rotura y empalme a caja existente



C25 y C26 K 98

- Se realizó diseño de intersección
- Se construyeron 7 cajas sencillas.
- **Se instalaron 46,63 m de ducteria de 4" por topo**
- **Se instalaron 15,1 m de ducteria de 2"** por topo

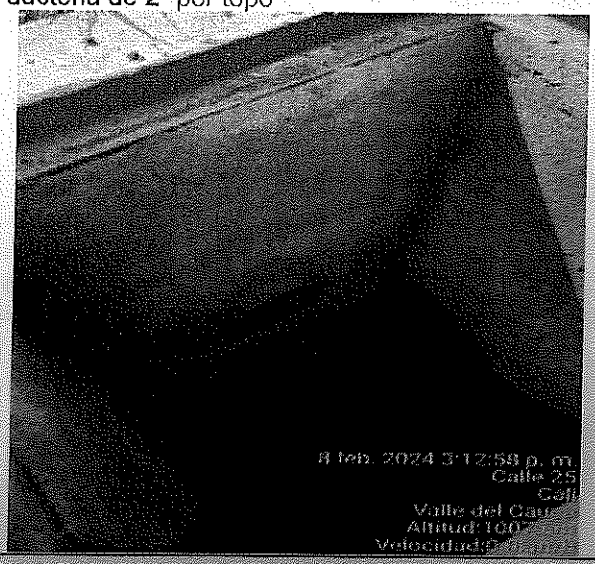

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C72U K28D


- Se realizó diseño de intersección
- Se realizó socialización del trabajo realizado
- Se instaló pedestal tipo 1
- Se instalaron 4 anclajes tipo 1.
- Se construyo caja principal
- Se construyeron 5 cajas sencillas
- Se instalaron 2,26 m de ducteria de 4" por topo
- Se instalaron 2,2 m de ducteria de 4"x 2 en zona blanda
- Se instalaron 16,5 m de ducteria de 4" en zona blanda
- Se instalaron 17,18 m de ducteria de 3" en zona blanda
- Se instaló 7,85 m de ducteria de 2" en zona blanda
- Se instalaron 7,3 m2 de adoquín 20x10
- Se hicieron 2 roturas y empalme a caja existente
- Se instalaron 31,6 m de ducteria de 4" dirigida para terreno rocoso.




Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

C72W K28D

- Se instaló un anclaje tipo 1
- Se construyeron dos cajas sencillas
- Se instalaron 4,73 m de ducteria de 4" en zona blanda
- Se demolieron 2,264 m3 de anden y se construyen nuevamente 1,867 m3
- Se demolieron 17,28 m2 de losa y se reponen 16 m2 de losa
- Se instalaron 19 m de ducteria de 2" por dirigida para terreno rocoso.

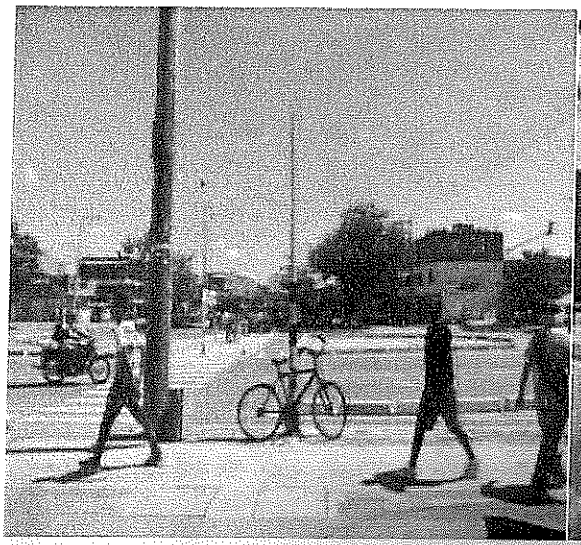

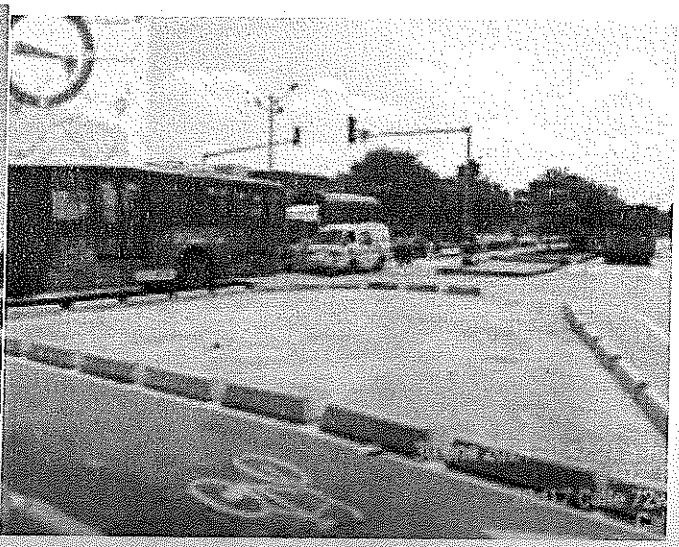

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

C14 K39

- Se instalaron 2 anclajes tipo 1
- Se instalaron 2,10 m de ducteria de 3" en zona blanda.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Personal:

Cargo	Nombre	%	Contacto	Correo
Director de Obra	Jesus Hernando Cortes	50%		jingenieriavial@hotmail.com
Profesional Gerencia de proyectos	Cristian Lopez	30%	3012614215	
Residente de Obra	Carlos Augusto Patiño	100%	3162584675	caupa13@outlook.com
Auxiliar de Ingenieria	Victor Andres Moreno	100%	3222113534	andresmorenoaingenieria@gmail.com
Inspector de Obra	Manuel Granados	100%	3112276730	
Profesional en Transito y Transporte	Paul Nuñez	30%	3194364697	
Profesional SST	Alejandro Bastidas	30%		
Inspector SST	Felipe Alvarez	100%	3187641354	felipecoordinador.sst@gmail.com
Profesional Ambiental	Jorge Varela	30%	3147948898	
Profesional Social	Maria Fernanda Marcillo	30%	3116922718	

6. FIRMAS RESPONSABLES

WILMER TABARES MARIN
Nombre y firma del Supervisor V.B.

GUSTAVO ADOLFO CAMBINDO MEZU
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión


Enrique Garcia O

ENRIQUE GARCIA
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

JIMMY OPAYOME
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali Febrero 19 de 2024.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

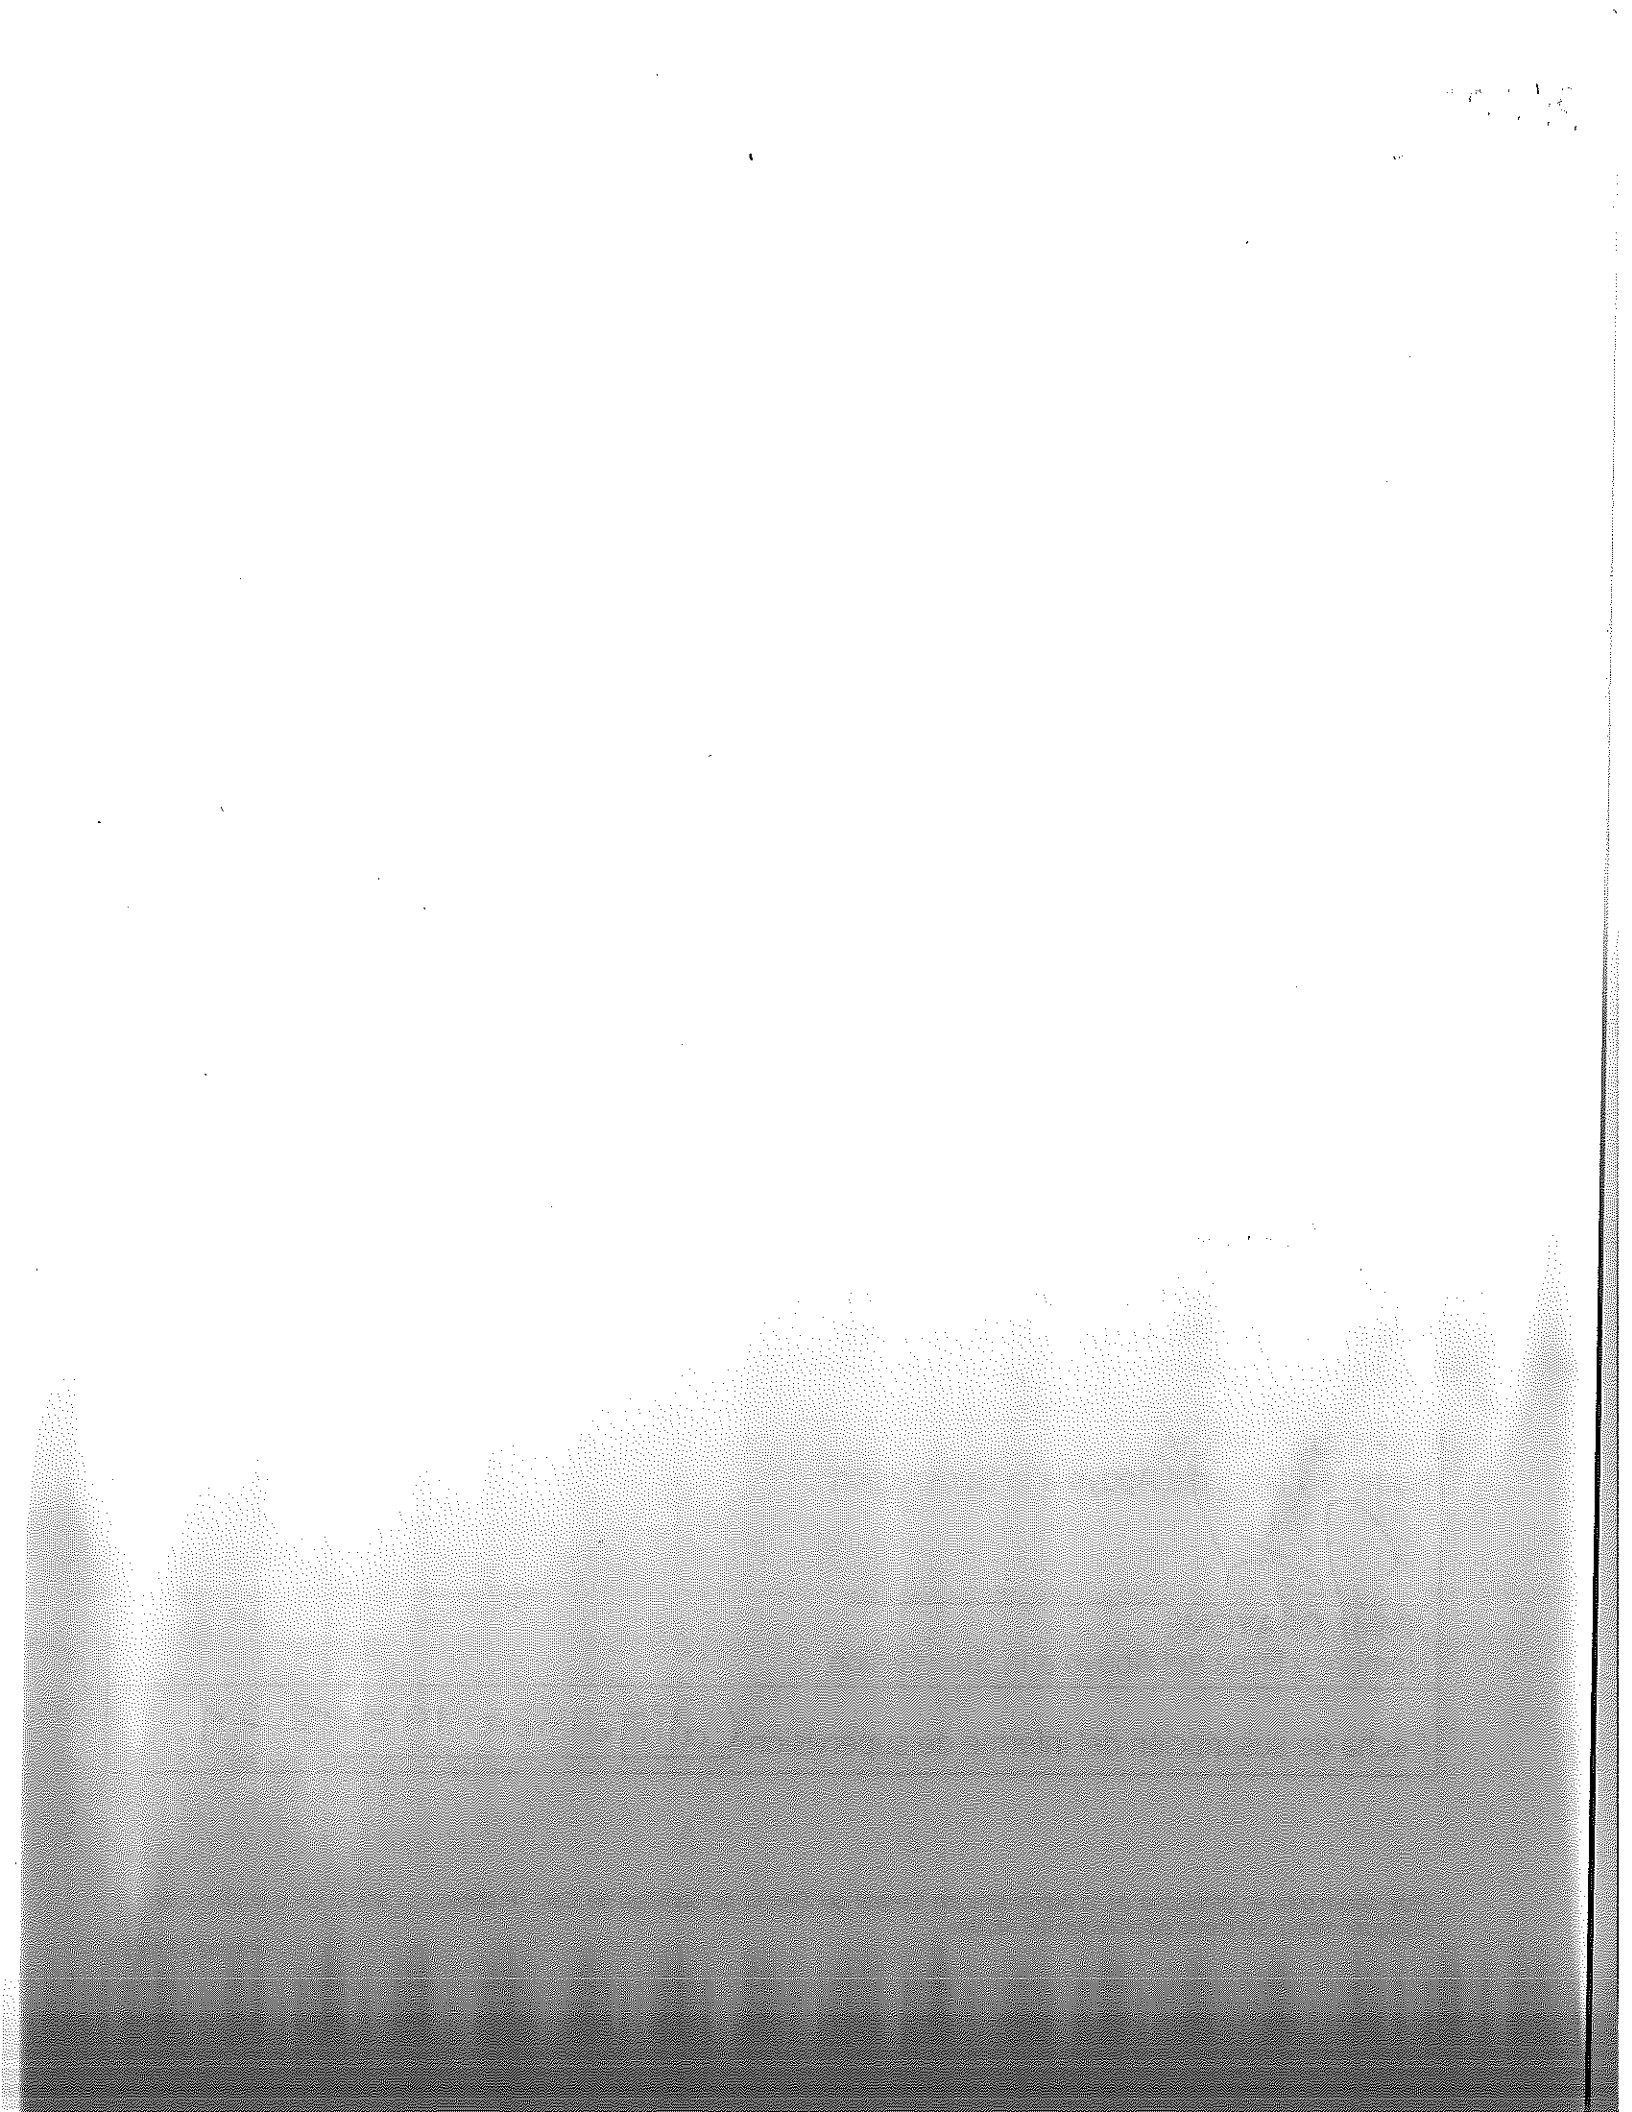

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 173

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045714725 que habilita desde FE 111 hasta FE 300. Vence 2024-09-09

CALLE 74 BIS Nº 85-16 BOGOTA TEL:4308393
CORREO:jcingenieriavial@hotmail.com

- **Estudios de Trafico**
- **Mantenimiento Recuperación Vial**
- **Pavimentos**
- **Construcción**
- **Semaforización**
- **Demarcación y Señalización Vial**
- **Consultorías**
- **Obras Complementarias**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

.

JC INGENIERIA VIAL SAS

Nit 900459964 0

CLIENTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
NIT	890399011 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 2 NORTE 10 70	Cali	6531063

OBSERVACIONES

Contrato de obra Nº 4152.010.26.1.762.2023 Acta Nº5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/02/2024	19/02/2024	Credito

	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACTA DE OBRA Nº 05-Contrato de obra Nº 4152.010.26.1.762.2023 CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTERUCTRUA FISICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN FICHA BP-26002902	Und.	1,00	140.741.746	0%	140.741.746
2	ADMINISTRACION 29,3%	Und.	1,00	41.237.331	0%	41.237.331
3	IMPREVISTOS 0%	Und.	1,00	0	0%	0
4	UTILIDAD 5%	Und.	1,00	7.037.087	0%	7.037.087

DOCUMENTO DE PRUEBA.
DISEÑO DE DOCUMENTOS.
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL.

Total Items 4 **Valor en Letras**

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**189.016.164**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**189.016.164**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**189.016.164**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2024 10:21:55

_____

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
JC INGENIERIA VIAL SAS

ACEPTO:

Firma y Sello: _____

Nombre:_____

CC o NIT: _____**Fecha:**_____
