
IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20240306

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0	**0**	**IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20240308**	**$51,447,186,375.00**	**1266 días**	**vie 14/01/22**	**vie 16/01/26**
1	**1**	**CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1847-2021: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4**	**$51,447,186,375.00**	**1266 días**	**vie 14/01/22**	**vie 16/01/26**
2	1.1	ACTA DE INICIO	$0.00	0 días	vie 14/01/22	vie 14/01/22
3	**1.2**	**FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**$607,849,447.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
4	1.2.1	ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN 1	$0.00	0 días	vie 03/06/22	vie 03/06/22
5	1.2.2	REINICIO 1	$0.00	0 días	mar 05/07/22	mar 05/07/22
6	1.2.3	ACTA No. 4 SUSPENSIÓN 2	$0.00	0 días	vie 01/07/22	vie 01/07/22
7	1.2.4	REINICIO 2	$0.00	0 días	jue 04/08/22	jue 04/08/22
8	1.2.5	ACTA No. 5 SUSPENSIÓN 3	$0.00	0 días	vie 05/08/22	vie 05/08/22
9	1.2.6	REINICIO 3	$0.00	0 días	lun 22/08/22	lun 22/08/22
10	1.2.7	ACTA No. 6 SUSPENSIÓN 4	$0.00	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22
11	1.2.8	REINICIO 4	$0.00	0 días	lun 26/09/22	lun 26/09/22
12	1.2.9	ACTA No. 7 SUSPENSIÓN 5	$0.00	0 días	lun 26/09/22	lun 26/09/22
13	1.2.10	REINICIO 5	$0.00	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22
14	1.2.11	ACTA No. 8 SUSPENSIÓN 6	$0.00	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22
15	1.2.12	REINICIO 6	$0.00	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22
16	1.2.13	ACTA No. 9 SUSPENSIÓN 7	$0.00	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22
17	1.2.14	REINICIO 7	$0.00	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22
18	1.2.15	ACTA No. 10 SUSPENSIÓN 8	$0.00	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22
19	1.2.16	REINICIO 8	$0.00	0 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23
20	1.2.17	ACTA No. 11 SUSPENSIÓN 9	$0.00	0 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23
21	1.2.18	REINICIO 9	$0.00	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23
22	1.2.19	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	$0.00	0 días	mar 05/03/24	mar 05/03/24
23	1.2.20	**ACTA 12 REINICIO DE CONTRATO DE OBRA**	$0.00	0 días	mié 06/03/24	mié 06/03/24
24	1.2.21	**ENTREGA POR PARTE DEL IDU (12 CIVS)**	$0.00	4 días	mié 06/03/24	lun 11/03/24
25	1.2.22	COMPONENTE TECNICO	$442,310,447.00	752 días	vie 14/01/22	jue 16/05/24
26	**1.2.22.1**	**HOJAS DE VIDA FASE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINAR**	**$3,587,000.00**	**740 días**	**vie 14/01/22**	**jue 02/05/24**
27	1.2.22.1.1	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO MINIMO	$622,000.00	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22
28	1.2.22.1.2	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 1	$300,000.00	15 días	vie 14/01/22	lun 31/01/22
29	1.2.22.1.3	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 2	$1,664,998.00	30 días	mié 06/03/24	vie 12/04/24
30	1.2.22.1.4	REVISION HOJAS DE VIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	5 días	vie 12/04/24	jue 18/04/24
31	1.2.22.1.5	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA A LA INTERVENTORIA	$1,000,000.00	6 días	jue 18/04/24	jue 25/04/24
32	1.2.22.1.6	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU	$1.00	5 días	jue 25/04/24	jue 02/05/24
33	1.2.22.2	DESGLOSE DEL AIU OFERTADO	$2,616,255.00	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22
34	**1.2.22.3**	**ANTICIPO**	**$8,630,000.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
35	1.2.22.3.1	PLAN DETALLADO DE INVERSION DEL ANTICIPO	$1,565,000.00	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22
36	1.2.22.3.2	SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO	$1,565,000.00	30 días	mar 18/01/22	lun 21/02/22
37	1.2.22.3.3	SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO FASE 2	$5,500,000.00	58 días	mié 06/03/24	jue 16/05/24
38	**1.2.22.4**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU**	**$19,130,000.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
39	1.2.22.4.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS VERSION 0	$2,829,996.00	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22

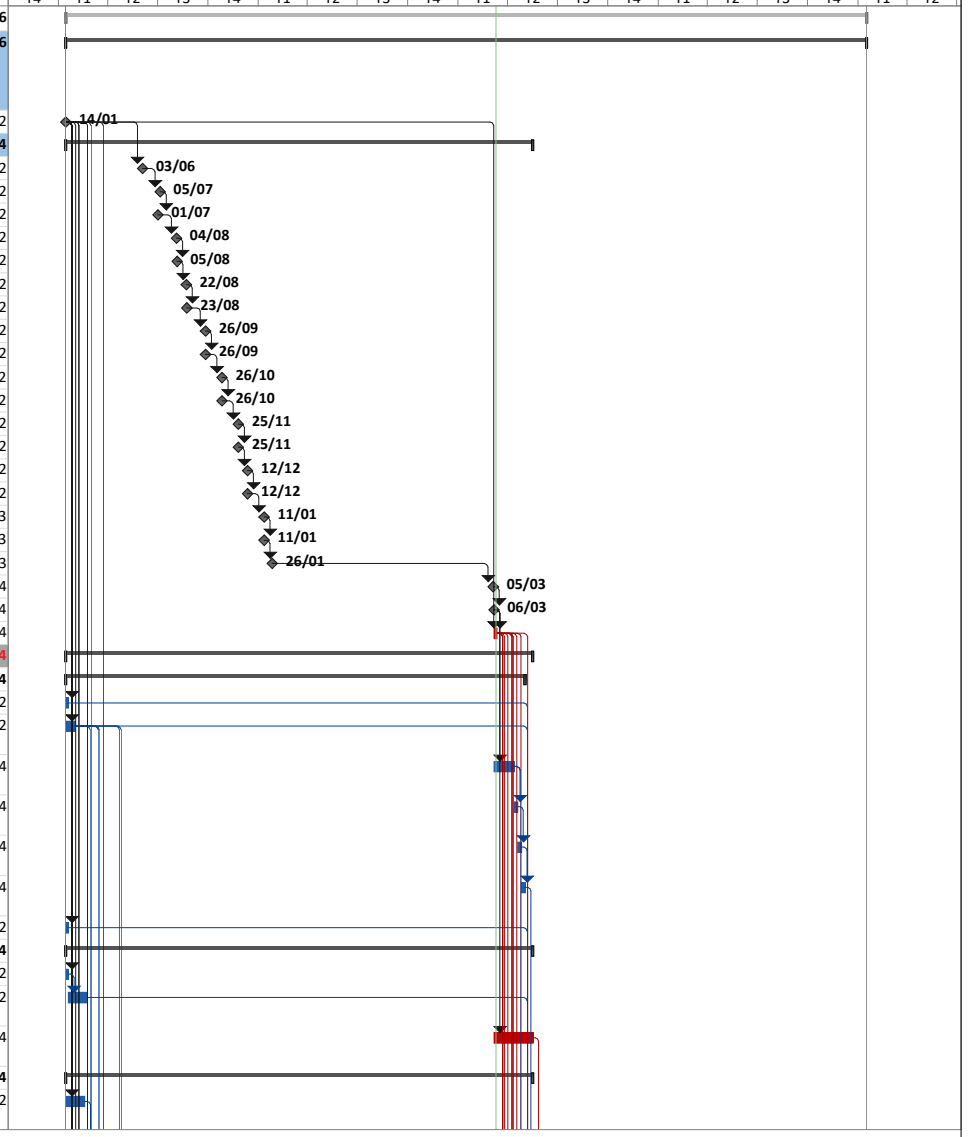


Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso

IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20240306


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
40	1.2.22.4.2	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	$1.00	5 días	jue 17/02/22	mar 22/02/22
41	1.2.22.4.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$200,000.00	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22
42	1.2.22.4.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS VERSION FINAL	$1.00	5 días	vie 25/02/22	jue 03/03/22
43	1.2.22.4.5	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2 (12 CIVS)	$7,100,000.00	42 días	lun 11/03/24	jue 02/05/24
44	1.2.22.4.6	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	$1.00	5 días	jue 02/05/24	mié 08/05/24
45	1.2.22.4.7	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) FASE 2	$9,000,000.00	3 días	mié 08/05/24	vie 10/05/24
46	1.2.22.4.8	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2(12CIVS)	$1.00	4 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
47	**1.2.22.5**	**HOJAS DE VIDA PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION**	**$5,600,000.00**	**28 días**	**vie 12/04/24**	**jue 16/05/24**
48	1.2.22.5.1	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA DE CONSTRUCCION	$3,099,998.00	14 días	vie 12/04/24	lun 29/04/24
49	1.2.22.5.2	REVISION HOJAS DE VIDA ETAPA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	$1.00	5 días	lun 29/04/24	lun 06/05/24
50	1.2.22.5.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A LA INTERVENTORIA	$2,500,000.00	3 días	lun 06/05/24	jue 09/05/24
51	1.2.22.5.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	$1.00	6 días	jue 09/05/24	jue 16/05/24
52	1.2.22.6	ADQUIRIR INFORMACION DEL CONTRATO	$3,130,000.00	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22
53	1.2.22.7	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO.	$939,000.00	16 días	vie 14/01/22	mar 01/02/22
54	**1.2.22.8**	**REVISION DOCUMENTOS CONTRATOS CONSULTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**$98,943,192.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
55	1.2.22.8.1	CARTA GENERADA POR EL IDU DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y	$0.00	0 días	vie 14/01/22	vie 14/01/22
56	1.2.22.8.2	REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS (FASE 1)	$62,000,000.00	60 días	vie 14/01/22	mié 23/03/22
57	1.2.22.8.3	REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS (FASE 2)	$36,943,191.00	49 días	lun 11/03/24	jue 09/05/24
58	1.2.22.8.4	ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (INFORMACIÓN ELEMENTOS 12 CIVs)	$1.00	5 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
59	1.2.22.8.5	CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 12 CIVs	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
60	1.2.22.9	VISITA A OBRA	$3,130,000.00	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22
61	**1.2.22.10**	**TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**	**$6,260,000.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
62	1.2.22.10.1	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	$1.00	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22
63	1.2.22.10.2	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	$3,129,999.00	5 días	jue 20/01/22	mar 25/01/22
64	1.2.22.10.3	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP 12 CIVS RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
65	1.2.22.10.4	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 12 CIVS	$3,130,000.00	6 días	jue 09/05/24	jue 16/05/24
66	**1.2.22.11**	**ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS**	**$11,559,000.00**	**736 días**	**mar 01/02/22**	**jue 16/05/24**

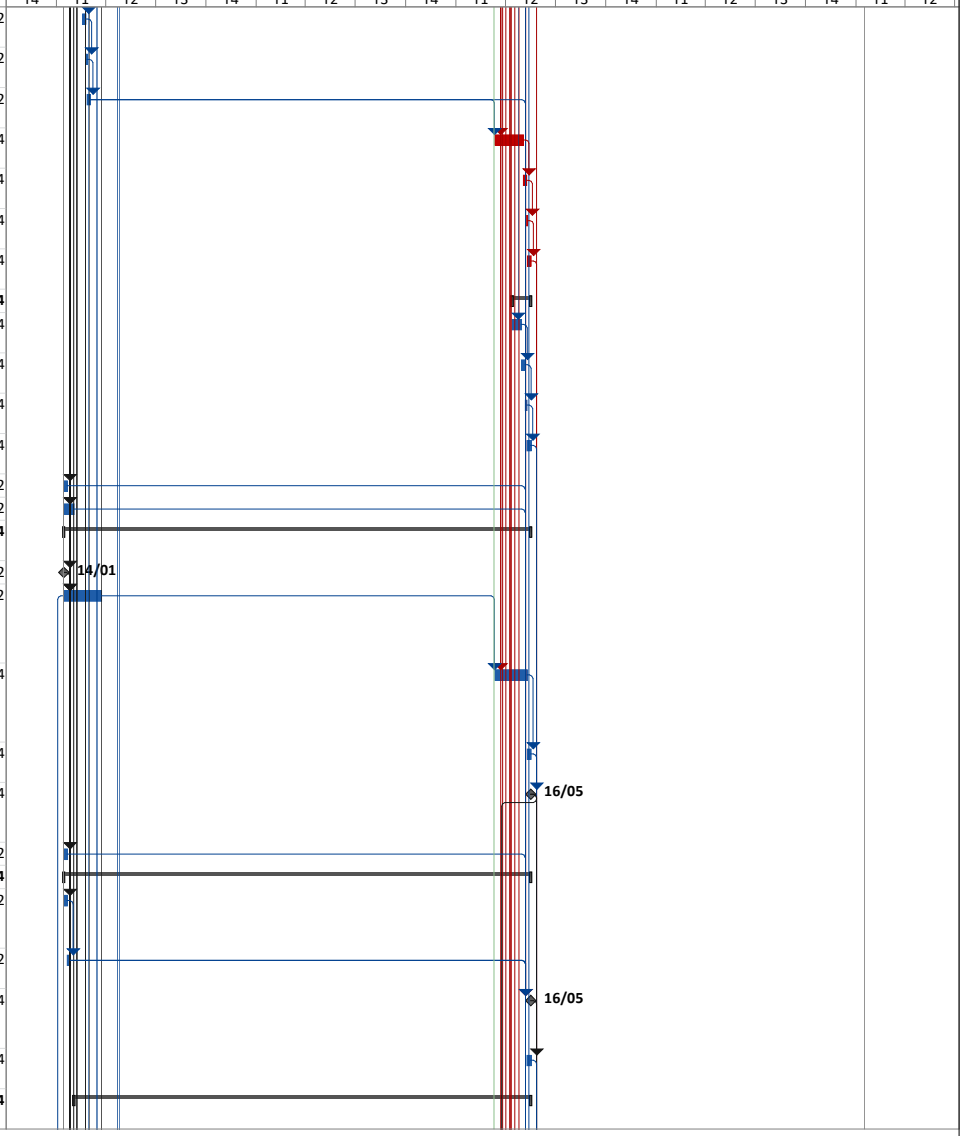

Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
67	1.2.22.11.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS VERSION 0	$5,958,998.00	22 días	mar 01/02/22	vie 25/02/22
68	1.2.22.11.2	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	5 días	vie 25/02/22	jue 03/03/22
69	1.2.22.11.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$5,600,000.00	3 días	mar 07/05/24	jue 09/05/24
70	1.2.22.11.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	$1.00	5 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
71	**1.2.22.12**	**ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA**	**$46,000,000.00**	**27 días**	**lun 15/04/24**	**jue 16/05/24**
72	1.2.22.12.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRESUPUESTO DE OBRA VERSION 12 CIVS	$30,499,998.00	22 días	lun 15/04/24	jue 09/05/24
73	1.2.22.12.2	REVISION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	$1.00	3 días	jue 09/05/24	mar 14/05/24
74	1.2.22.12.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$15,500,000.00	2 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24
75	1.2.22.12.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO FINAL	$1.00	3 días	mar 14/05/24	jue 16/05/24
76	**1.2.22.13**	**ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE**	**$31,000,000.00**	**20 días**	**lun 22/04/24**	**jue 16/05/24**
77	1.2.22.13.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA VERSION 12 CIVS	$21,000,000.00	10 días	lun 22/04/24	sáb 04/05/24
78	1.2.22.13.2	REVISION DEL PDT POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	4 días	sáb 04/05/24	jue 09/05/24
79	1.2.22.13.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$9,999,998.00	2 días	jue 09/05/24	vie 10/05/24
80	1.2.22.13.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PDT FINAL	$1.00	4 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
81	**1.2.22.14**	**ELABORACION Y APROBACION PAC**	**$21,000,000.00**	**10 días**	**sáb 04/05/24**	**jue 16/05/24**
82	1.2.22.14.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PAC VERSION	$12,500,000.00	3 días	sáb 04/05/24	mié 08/05/24
83	1.2.22.14.2	REVISION DEL PAC POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	3 días	mié 08/05/24	vie 10/05/24
84	1.2.22.14.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$8,499,998.00	2 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24
85	1.2.22.14.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PAC FINAL	$1.00	2 días	mié 15/05/24	jue 16/05/24
86	**1.2.22.15**	**ELABORACION Y APROBACION INFORME FINAL ETAPA**	**$180,786,000.00**	**17 días**	**jue 25/04/24**	**jue 16/05/24**
87	1.2.22.15.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL)	$110,285,998.00	10 días	jue 25/04/24	mié 08/05/24
88	1.2.22.15.2	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	3 días	mié 08/05/24	vie 10/05/24
89	1.2.22.15.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$70,500,000.00	2 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24
90	1.2.22.15.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	$1.00	2 días	mié 15/05/24	jue 16/05/24
91	1.2.22.16	FIN COMPONENTE TECNICO	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
92	**1.2.23**	**COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.**	**$30,304,000.00**	**752 días**	**vie 14/01/22**	**jue 16/05/24**
93	1.2.23.1	ASIGNACION DEL DELEGADO POR PARTE DE LA SDM	$100,000.00	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22
94	**1.2.23.2**	**PRESENTACION Y APROBACION DEL PMT**	**$15,204,000.00**	**91 días**	**mié 26/01/22**	**mié 11/05/22**
95	1.2.23.2.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PMT GENERAL (VERSION INICIAL)	$12,362,000.00	40 días	mié 26/01/22	vie 11/03/22
96	1.2.23.2.2	REVISION DEL PMT ESPECIFICO TRAMOS INICIALES, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	$1.00	27 días	vie 11/03/22	mar 12/04/22
97	1.2.23.2.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$2,841,998.00	5 días	mar 12/04/22	mié 20/04/22
98	1.2.23.2.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	$1.00	24 días	mar 12/04/22	mié 11/05/22

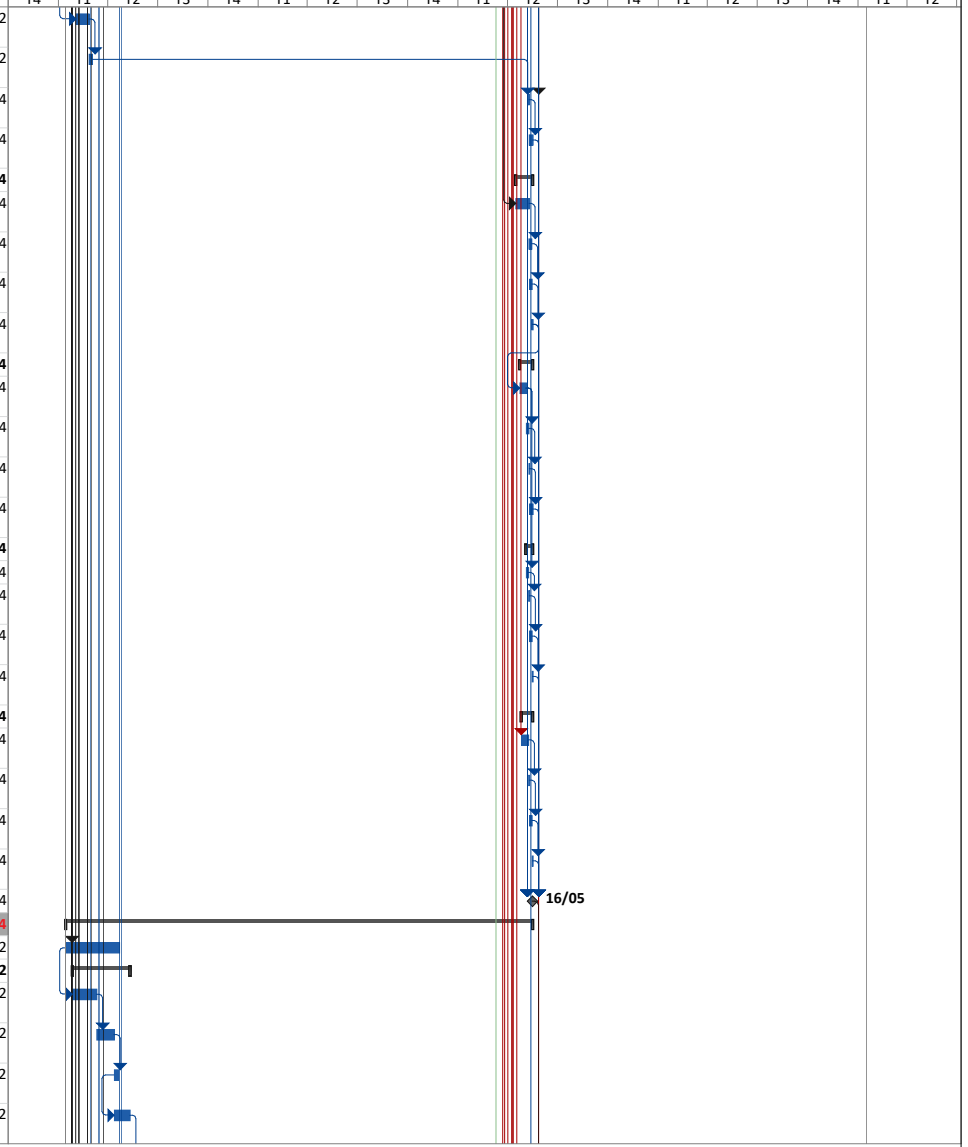

Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
99	1.2.23.3	RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE DE LA SDM DE LOS PMTS FASE 1 APROBADO POR INTERVENTORIA	$500,000.00	21 días	mié 04/05/22	vie 27/05/22
100	1.2.23.4	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE PMT 12 CIVS ENTREGADOS POR IDU	$6,000,000.00	10 días	mar 26/03/24	mar 09/04/24
101	1.2.23.5	REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PMT 12 CIVS	$1.00	8 días	mar 09/04/24	mié 17/04/24
102	1.2.23.6	RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE DE LA SDM DE LOS PMTS APROBADO 12 CIVS POR INTERVENTORIA	$3,499,999.00	12 días	mié 17/04/24	jue 02/05/24
103	1.2.23.7	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO (VERSION CORREGIDA)	$2,500,000.00	6 días	jue 02/05/24	jue 09/05/24
104	1.2.23.8	APROBACION DE PMT ESPECIFICO TRAMOS 12 CIVS, PARA INICIO DE FASE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA SDM	$2,500,000.00	6 días	jue 09/05/24	jue 16/05/24
105	1.2.23.9	FIN COMPONENTE PMT	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
106	1.2.24	COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	$80,341,000.00	736 días	mar 01/02/22	jue 16/05/24
107	**1.2.24.1**	**FASE 1**	**$11,458,430.00**	**176 días**	**mar 01/02/22**	**mar 23/08/22**
108	1.2.24.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$2,972,999.00	100 días	lun 07/02/22	vie 03/06/22
109	1.2.24.1.2	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$1.00	100 días	lun 07/02/22	vie 03/06/22
110	1.2.24.1.3	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS CAPITULOS O ANEXOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES, GUIAS PLANES Y	$3,130,000.00	11 días	mar 01/02/22	lun 14/02/22
111	1.2.24.1.4	VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS	$1,565,000.00	152 días	lun 28/02/22	lun 22/08/22
112	1.2.24.1.5	INVENTARIO Y BALANCES DE ZONAS VERDES	$1,565,000.00	58 días	mié 16/03/22	mar 24/05/22
113	1.2.24.1.6	REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	$854,490.00	108 días	vie 22/04/22	mar 23/08/22
114	1.2.24.1.7	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	$657,300.00	69 días	lun 14/03/22	vie 03/06/22
115	1.2.24.1.8	VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O	$713,640.00	35 días	lun 25/04/22	vie 03/06/22
116	**1.2.24.2**	**FASE 2**	**$68,882,570.00**	**725 días**	**lun 14/02/22**	**jue 16/05/24**
117	1.2.24.2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$999,999.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
118	1.2.24.2.2	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$1.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
119	1.2.24.2.3	VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS	$1,935,000.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
120	1.2.24.2.4	REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	$1,645,510.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
121	1.2.24.2.5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	$1,842,700.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
122	1.2.24.2.6	VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O	$786,360.00	39 días	lun 01/04/24	jue 16/05/24
123	**1.2.24.2.7**	**ELABORARÁ EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAO (MANEJO AMBIENTAL EN OBRA).**	**$43,673,000.00**	**163 días**	**lun 14/02/22**	**vie 19/08/22**

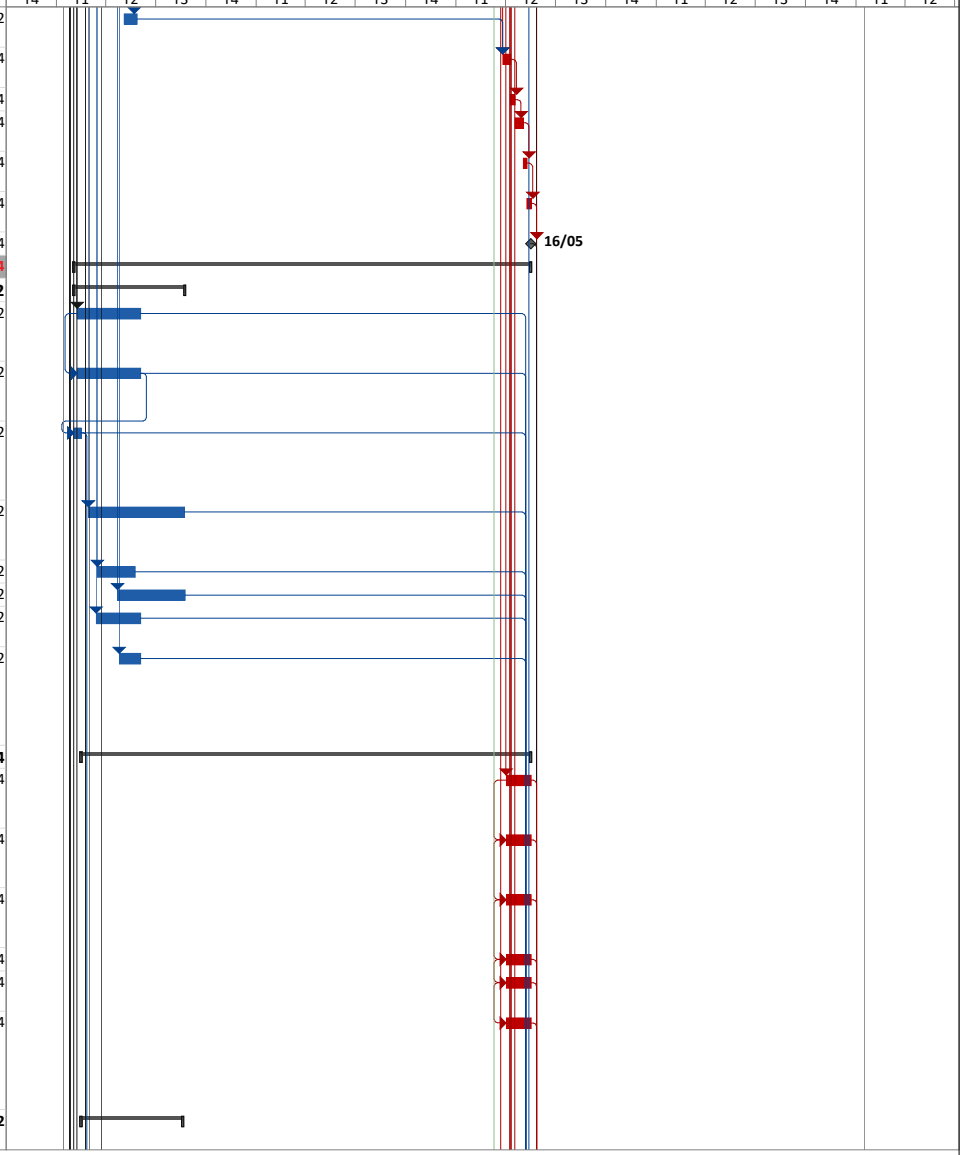

Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
124	1.2.24.2.7.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL)	$33,073,000.00	30 días	lun 14/02/22	vie 18/03/22
125	1.2.24.2.7.2	REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$100,000.00	5 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22
126	1.2.24.2.7.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$2,500,000.00	89 días	lun 18/04/22	mié 27/07/22
127	1.2.24.2.7.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	$4,000,000.00	10 días	vie 22/07/22	mar 02/08/22
128	1.2.24.2.7.5	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU	$4,000,000.00	16 días	mar 02/08/22	vie 19/08/22
129	1.2.24.2.8	ACTIVIDADES TRATAMIENTOS SILVICULTURALES FRENTES INICI/	$18,000,000.00	11 días	lun 08/08/22	vie 19/08/22
130	1.2.24.2.9	FIN COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
131	1.2.25	COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉG	$49,577,000.00	752 días	vie 14/01/22	jue 16/05/24
132	1.2.25.1	ELABORAR Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS METODOLOGICOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE SOCIAL	$1,565,000.00	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22
133	1.2.25.2	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	$1,565,000.00	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22
134	1.2.25.3	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL PROYECTO	$1,565,000.00	90 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22
135	1.2.25.4	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS MISMOS	$1,565,000.00	60 días	mar 01/03/22	mié 11/05/22
136	1.2.25.5	INVENTARIO DE PREDIOS, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA	$1,565,000.00	90 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22
137	1.2.25.6	ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 1)	$3,000,000.00	38 días	jue 21/04/22	vie 03/06/22
138	1.2.25.7	ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 2)	$7,000,000.00	33 días	lun 08/04/24	jue 16/05/24
139	1.2.25.8	INSTALARÁ EL CAMPAMENTO Y PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUNTO IDU.	$939,000.00	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22
140	1.2.25.9	REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 1)	$1,800,000.00	105 días	mar 01/02/22	vie 03/06/22
141	1.2.25.10	REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 2)	$700,000.00	30 días	jue 11/04/24	jue 16/05/24
142	1.2.25.11	DIRECTORIO DE ACTORES	$313,000.00	21 días	jue 24/03/22	mar 19/04/22
143	1.2.25.12	ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE APLIQUEN, PARA APROBACIÓN INFORME DIALOGO CIUDADANO	$5,000,000.00	54 días	lun 11/03/24	jue 16/05/24
144	**1.2.25.13**	**ELABORACION Y APROBACION INFORME DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**$23,000,000.00**	**731 días**	**lun 07/02/22**	**jue 16/05/24**
145	1.2.25.13.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 1)	$500,000.00	100 días	lun 07/02/22	vie 03/06/22
146	1.2.25.13.2	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 2)	$16,000,000.00	20 días	mar 09/04/24	jue 02/05/24
147	1.2.25.13.3	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	$1.00	4 días	jue 02/05/24	mar 07/05/24
148	1.2.25.13.4	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	$6,499,998.00	3 días	mar 07/05/24	jue 09/05/24
149	1.2.25.13.5	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	$1.00	3 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24
150	1.2.25.13.6	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
151	1.2.25.14	FIN COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTR	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
152	**1.2.26**	**ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO**	**$5,317,000.00**	**717 días**	**mié 23/02/22**	**jue 16/05/24**
153	1.2.26.1	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH (FA	$1,970,000.00	86 días	mié 23/02/22	vie 03/06/22
154	1.2.26.2	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH (FA	$217,000.00	24 días	mié 17/04/24	jue 16/05/24
155	1.2.26.3	ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 1)	$1,675,000.00	86 días	mié 23/02/22	vie 03/06/22

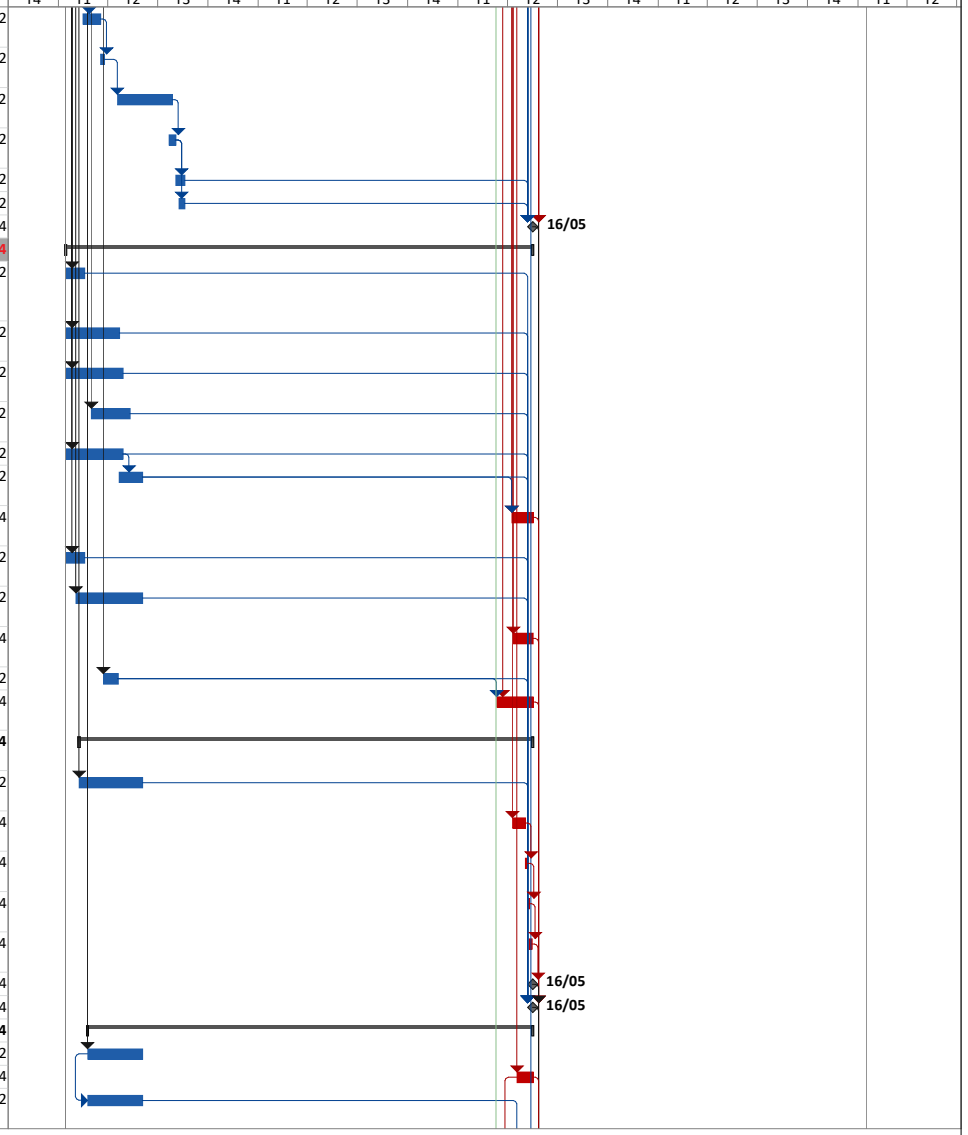


Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso

IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20240306

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
156	1.2.26.4	ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 2)	$1,455,000.00	24 días	mié 17/04/24	jue 16/05/24
157	1.2.26.5	FIN ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
158	1.2.27	FIN DE ETAPA OBRAS INICIALES Y PRELIMINARES	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
159	**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**$50,839,336,928.00**	**514 días**	**jue 16/05/24**	**vie 16/01/26**
160	1.3.1	ACTA DE INICIO FASE DE EJECUCION	$0.00	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24
161	1.3.2	CONTRUCCION 12 CIVS	$20,583,583,558.00	229 días	jue 16/05/24	mié 12/02/25
162	1.3.3	(*) ENTREGA POR PARTE DEL IDU REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 17 CIVS " Nota: Esta fecha no podrá desplazarse de manera automática. En el evento en que el IDU no ha hecho entrega de la totalidad de los estudios y diseños definitivos o no objetados de los	$0.00	0 días	vie 11/10/24	vie 11/10/24
163	**1.3.4**	**REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 17 CIVS ENTREGADOS POR IDU**	**$0.00**	**50 días**	**vie 11/10/24**	**mié 11/12/24**
164	1.3.4.1	INFORME TECNICO	$0.00	50 días	vie 11/10/24	mié 11/12/24
165	1.3.4.2	COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.	$0.00	50 días	vie 11/10/24	mié 11/12/24
166	1.3.4.3	COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	$0.00	50 días	vie 11/10/24	mié 11/12/24
167	1.3.4.4	COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉ	$0.00	50 días	vie 11/10/24	mié 11/12/24
168	1.3.4.5	ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	$0.00	50 días	vie 11/10/24	mié 11/12/24
169	1.3.5	CONTRUCCION 17 CIVS	$30,255,753,370.00	287 días	mié 11/12/24	vie 14/11/25
170	1.3.6	ETAPA RECIBO OBRAS	$0.00	51 días	vie 14/11/25	vie 16/01/26
171	1.3.7	FIN ETAPA CONSTRUCCIÓN	$0.00	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26
172	1.4	FIN DEL PROYECTO	$0.00	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26

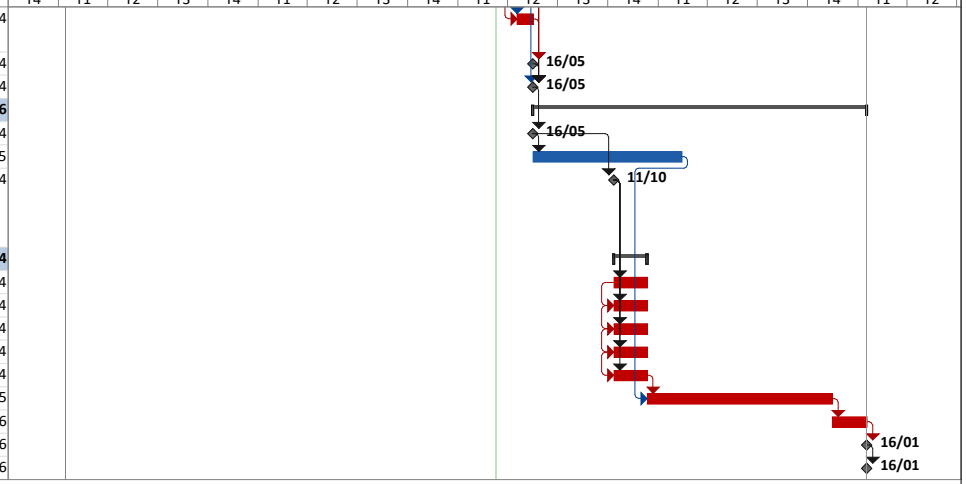

(*) - NOTA:
Esta fecha no podrá desplazarse de manera automática. En el evento en que el IDU no ha hecho entrega de la totalidad de los estudios y diseños definitivos o no objetados de los 17 CIVS en la mencionada fecha, las partes procederán a la suspensión del Contrato por el término que acuerden y deberán evaluar el término de una prórroga de la Fase de Ejecución, la cual tendrá como objetivo la ejecución de los CIVS, cuyos estudios y diseños definitivos o no objetados no hayan sido entregados por el IDU en el término anteriormente establecido.
En este caso, el IDU se deberá obligar a reconocer al Consorcio todos los costos en que incurra en el periodo de suspensión y prórroga, incluidos los de administración contractual y componentes. Para tal efecto, adicionará al contrato los recursos necesarios.

JOSUE REINALDO RUGELES PINEDA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SABANA CENTRO

RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL

Proyecto:IDU-1847-2021 - ZONAS
Fecha: 08/03/2024

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tareas críticas
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	División crítica
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso
