
PRORROGA CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON - NIT. 901.775.608-1


| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTA INICIO** | 0 días | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 |
| 2 | **ETAPA PRELIMINARES** | **11 días** | **lun 11/12/23** | **lun 25/12/23** |
| 3 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | 11 días | lun 11/12/23 | lun 25/12/23 |
| 4 | **PRELIMINARES** | **78.8 días** | **mar 26/12/23** | **vie 12/04/24** |
| 5 | REPLANTEO GENERAL | 16 días | mar 26/12/23 | mar 16/01/24 |
| 6 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (E=10-15CM) | 5 días | mié 17/01/24 | mar 23/01/24 |
| 7 | CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) | 5 días | mié 17/01/24 | mar 23/01/24 |
| 8 | Lavado de andenes y descolmatación de juntas. Incluye alquiler de hidrolavadora 1300 W. Incluye implementos de aseo (detergente industrial). Transporte, agua, combustible y mano de obra. | 8 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 9 | Arena lavada de peña con cemento para embouquillado de adoquin para pendiente mayor al 6% (incluye suministro, barrido para sellado de juntas y compactación). | 8 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 10 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **20 días** | **mié 24/01/24** | **mar 20/02/24** |
| 11 | **EXCAVACIONES CON RETIRO** | **15 días** | **mié 24/01/24** | **mar 13/02/24** |
| 12 | EXCAVACIÓN MANUAL+RETIRO SUELO BLANDO+TRASIEG <50M | 15 días | mié 24/01/24 | mar 13/02/24 |
| 13 | EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC | 15 días | mié 24/01/24 | mar 13/02/24 |
| 14 | **NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO** | **2 días** | **mié 14/02/24** | **jue 15/02/24** |
| 15 | NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03 | 1 día | mié 14/02/24 | mié 14/02/24 |
| 16 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN) | 1 día | jue 15/02/24 | jue 15/02/24 |
| 17 | **PROTECCIÓN DE TALUDES** | **3 días** | **vie 16/02/24** | **mar 20/02/24** |
| 18 | NIVELACION Y CONFORMACION TALUDES (M2) ** | 3 días | vie 16/02/24 | mar 20/02/24 |
| 19 | **RELLENOS** | **3 días** | **vie 16/02/24** | **mar 20/02/24** |
| 20 | GRAVILLA DE RIO 3/4" (CON TRANSPORTE) | 3 días | vie 16/02/24 | mar 20/02/24 |
| 21 | **CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS** | **63 días** | **mié 17/01/24** | **vie 12/04/24** |
| 22 | Demoliciones pisos de concreto o adoquín hasta 15 cm de ancho. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | 15 días | mié 24/01/24 | mar 13/02/24 |
| 23 | Demoliciones bordillo para instalación tubería y balas de piso. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | 15 días | mié 24/01/24 | mar 13/02/24 |
| 24 | Reconstrucción bordillo en concreto de 3000 psi tipo grauting donde se instalaron las balas de piso y la tubería | 1 día | mié 10/04/24 | mié 10/04/24 |
| 25 | Reconstrucción de anden en concreto 3000 PSI (210 KG/CM2) premezclado E=0.10M (Incluye suministro, formaleteo, refuerzo malla electrosoldada, fundida y curado) | 1 día | jue 11/04/24 | jue 11/04/24 |
| 26 | Bordillo prefabricado A-80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) | 30 días | mié 14/02/24 | mar 26/03/24 |
| 27 | Bordillo prefabricado A-10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) para confinado de elementos de jardineria a piso. | 30 días | mié 14/02/24 | mar 26/03/24 |
| 28 | Mantenimiento correctivo de espacio público en adoquín de arcilla liviano en bordes de materas, contenedores de raíces, dados y otros. Incluye cortes de adoquín para ajuste de figura, base en arena y embouquillado donde se requiera hasta 20 cm. Incluye alq | 15 días | jue 21/03/24 | mié 10/04/24 |
| 29 | Recebo comun (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) | 8 días | mié 14/02/24 | vie 23/02/24 |
| 30 | Geotextil NT 2000 para separación de materiales de capas de rellenos. Incluye suministro e insta | 8 días | mié 14/02/24 | vie 23/02/24 |
| 31 | Suministro e instalación de piso deck y paredes en madera Teka (e=2 cms), la cual debe tener los tratamientos necesarios para su uso al exterior (aplicación de impregnante o lasur preparado con resinas acrílicas de base acuosa para la protección de madera | 2 días | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 32 | Suministro, instalación y transporte barrera New Jersey prefabricado monodireccional 0,3*1,0*0,80*0,15. Incluye mano de obra instalación.. Incluye cortes con pulidora para dar perfecta continuidad en esquinas y remates. No incluye base. Incluye boquilla p | 1 día | vie 05/04/24 | lun 08/04/24 |
| 33 | Reconstrucción de piso zona calistenia. Incluye demolición de carpeta asfaltica, nivelación de rasante, instalación de carpeta de rodadura asfaltica E= 0,06m, compactación, protección de elementos existentes con forro plastico. | 18 días | mié 17/01/24 | jue 11/04/24 |
| 34 | **ESTRUCTURA** | **40.8 días** | **mié 14/02/24** | **mié 10/04/24** |
| 35 | **CIMENTACIÓN** | **39.8 días** | **mié 14/02/24** | **mar 09/04/24** |
| 36 | DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN REFUER** | 7 días | mié 14/02/24 | jue 22/02/24 |
| 37 | TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETO IMP. 3000 PSI | 1 día | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 38 | **ESTRUCTURAS METÁLICAS** | **1 día** | **mar 09/04/24** | **mié 10/04/24** |
| 39 | ESTRUCTURA METÁLICA OBRA | 1 día | mar 09/04/24 | mié 10/04/24 |
| 40 | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO** | **7 días** | **mié 14/02/24** | **jue 22/02/24** |
| 41 | ACERO DE REFUERZO 60000 ** | 7 días | mié 14/02/24 | jue 22/02/24 |
| 42 | **REDES HIDRÁULICAS** | **47.8 días** | **mié 07/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 43 | **REDES Y CONDUCCIÓN** | **47.8 días** | **mié 07/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 44 | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS | 1 día | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 |
| 45 | FILTRO FRANCES40*40 EXCAV+GEONT-1600+TUBO 100MM ** | 10 días | vie 16/02/24 | jue 29/02/24 |
| 46 | TUBERIA NOVAFORT D=110MM EXCA Y RELLENO RECEBO | 1 día | mié 10/04/24 | jue 11/04/24 |
| 47 | TUBERIA NOVAFORT D=160MM EXCA Y RELLENO RECEBO | 4 días | mié 07/02/24 | lun 12/02/24 |
| 48 | CARCAMOT-1 3000 PSI+REJILLA VEH.CONC | 4 días | mar 13/02/24 | vie 16/02/24 |
| 49 | CAJA INSPECCIÓN (0.60X0.60M) HPROM=0.74M (INC.EXCA | 4 días | mié 07/02/24 | lun 12/02/24 |
| 50 | Suministro e instalación de tanque horizontal de 2000 Litros. 1.57m de alto, 1.62m de largo y 1.44m de ancho. En resina de polietileno, incluye transporte | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 51 | Cañuela prefabricada A-120 con medidas Largo: 80 cm Alto: 22,5 cm Ancho: 30 cm suministro e instalación incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi | 8 días | lun 19/02/24 | mié 28/02/24 |
| 52 | Suministro e instalación de bomba manual. Incluye accesorios para instalación. Ver diseño | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 53 | Suministro e instalación. Geodren con tubería circular 100mm h=0.5 o drenaflex con tubería circular 100mm h=0.5. | 2 días | mar 13/02/24 | mié 14/02/24 |
| 54 | **REDES ELÉCTRICAS** | **14 días** | **mié 27/03/24** | **sáb 13/04/24** |
| 55 | Puesta a Tierra Medidor | 3 días | mié 27/03/24 | vie 29/03/24 |
| 56 | Kit Solar Basico 24V 1700Whdia | 8 días | mié 27/03/24 | vie 05/04/24 |
| 57 | Caja de Proteccion IP65 60x40x25 | 2 días | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 58 | FOTOCELDAS LUMINARIAS POSTE(EXT) | 1 día | mié 10/04/24 | mié 10/04/24 |
| 59 | Kit Solar Litio 3000W 48VDC 14000Whdia | 8 días | mié 27/03/24 | vie 05/04/24 |
| 60 | (DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W | 2 días | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 61 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m-CEFE COMETAS(Sum+Ins | 2 días | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 62 | (BL2) -Luminaria Bolardo Exterior corto LED 10.8W | 2 días | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 63 | Salida luminaria piso 3N12 (PVC 3/4") | 2 días | lun 08/04/24 | mar 09/04/24 |
| 64 | POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE | 11 días | mié 27/03/24 | mié 10/04/24 |
| 65 | Certificados de Retie y Retilap. | 3 días | jue 11/04/24 | sáb 13/04/24 |

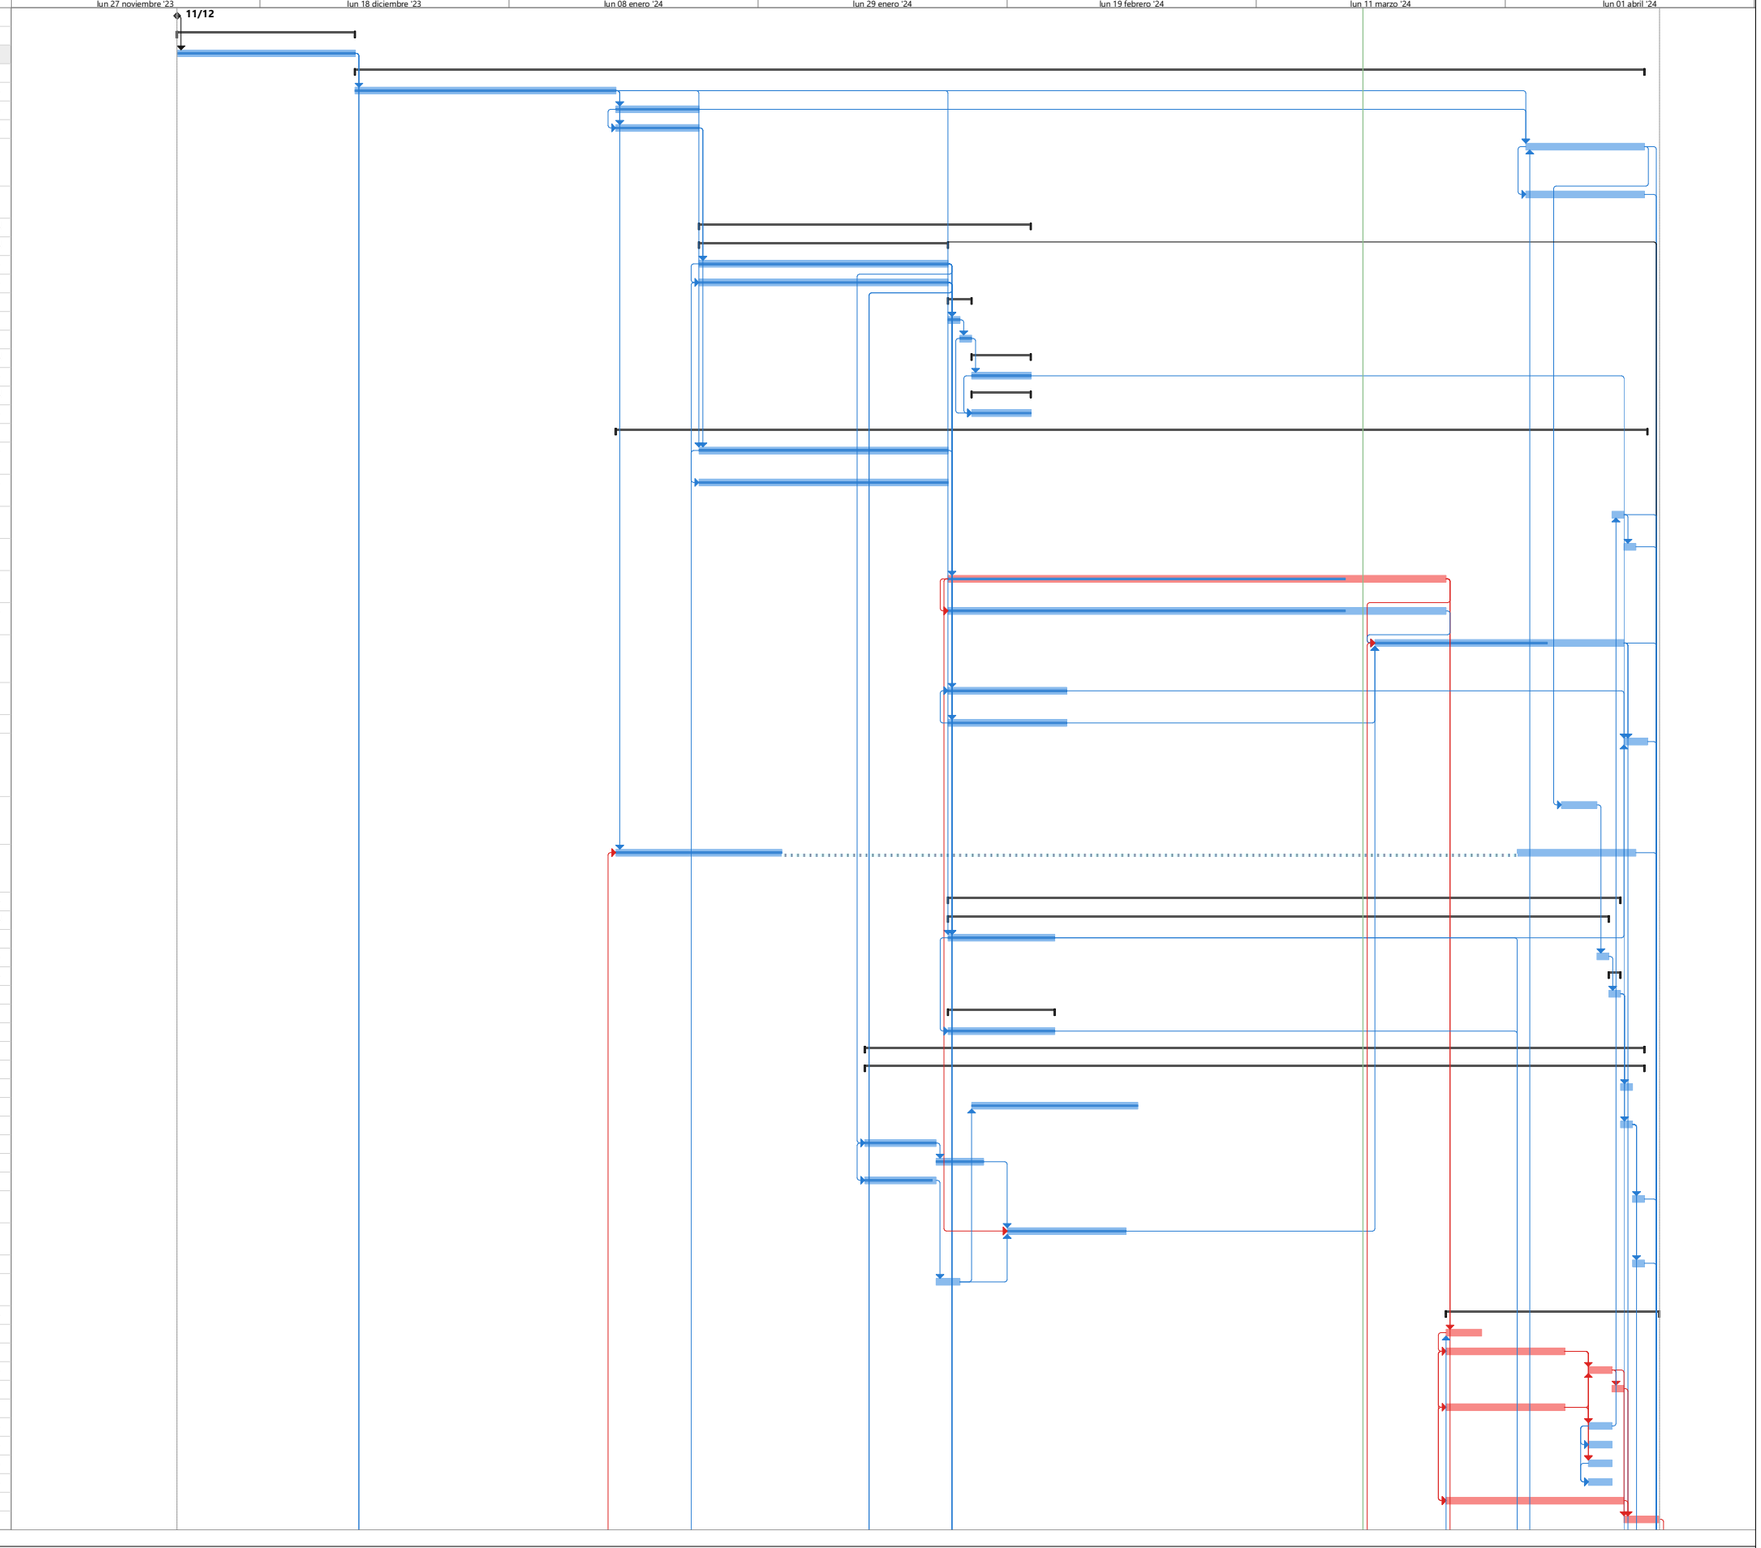


Cont. 655-2023
Inicio: 11 Dic 2023

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 66 | **EXTERIORES** | **43 días** | **mié 14/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 67 | **EMPRADIZACIÓN** | **43 días** | **mié 14/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 68 | EMPRADIZACION GRAMA CON SEMILLA RAY-GRASS ** | 2 días | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 69 | JARDINERÍA DENSIDAD 12 PLANTAS POR M2 -CDRC | 2 días | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 70 | Muro para jardinera tipo silla configuración organica. Incluye mortero de pega, dovelado, pañete terminado final. Ver detalle | 1 día | mié 14/02/24 | mié 14/02/24 |
| 71 | **SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN** | **2 días** | **jue 11/04/24** | **vie 12/04/24** |
| 72 | GEOCELDA(ARE+TIE) | 1 día | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 73 | Relleno en tierra negra abonada | 2 días | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 74 | Suministro, transporte y plantación de arbusto de amarre de bajo porte 1m - 1,5m maximo de alto | 2 días | jue 11/04/24 | vie 12/04/24 |
| 75 | **MOBILIARIO** | **43 días** | **mié 14/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 76 | **MOBILIARIO URBANO** | **36.8 días** | **mié 14/02/24** | **jue 04/04/24** |
| 77 | Suministro de matera circular M-32-A | 24 días | mié 14/02/24 | mié 27/03/24 |
| 78 | Suministro e instalación de sillas M-11-A de concreto prefabricado de 2,00*0,5*0,46 y asiento en madera teka. Ver plano de detalles | 24 días | mié 14/02/24 | lun 18/03/24 |
| 79 | BUTACO HEXAGONAL CONCRET ESPECIAL D40 SEGUN DISEÑO | 24 días | mié 14/02/24 | lun 18/03/24 |
| 80 | Biciparquedero M-22-A. incluye suministro e instalación. Incluye platinas de anclaje. No incluye base en concreto | 24 días | mié 14/02/24 | lun 18/03/24 |
| 81 | NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins) | 24 días | mié 14/02/24 | mar 02/04/24 |
| 82 | Suministro y entrega de zona de inflado de llantas de bicicletas, con caja protectora en lámina de acuerdo al diseño | 10 días | mié 13/03/24 | mar 26/03/24 |
| 83 | Suministro e instalación de protector M-91. Dos tubos | 4 días | mar 19/03/24 | jue 04/04/24 |
| 84 | **SEÑALIZACIÓN** | **9 días** | **mar 02/04/24** | **vie 12/04/24** |
| 85 | Señal tipo ecobarrio. Tablero 2.001m x 0.90m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.00m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación. Ver diseño | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 86 | Señal sc-80 2 caras (sum + inst) | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 87 | Señal idg-s 2 caras (sum + inst) | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 88 | Señal informativa si-05, tablero 1.401m x 0.512m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.60m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 89 | SEÑAL PLANO UBICACION PARQUE (SUM + INST) | 1 día | jue 11/04/24 | jue 11/04/24 |
| 90 | **CONTENEDOR MARITIMO** | **47 días** | **jue 08/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 91 | **CONTENEDOR MARITIMO** | **47 días** | **jue 08/02/24** | **vie 12/04/24** |
| 92 | Suministro de contenedor marítimo (ver APU y especificación) de carga reciclado de 20 pies, en buen estado. Incluye certificación de nacionalización Dian. | 38 días | jue 08/02/24 | lun 01/04/24 |
| 93 | Suministro y aplicación de manto impermeabilizante Manto autoadhesivo 1m x 3mm cubiertas contenedor y superficies enterradas | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 94 | Suministro e instalación de estructura para fijación contenedor a cimentación. En ángulo de 2""1/4 | 3 días | mié 13/03/24 | vie 15/03/24 |
| 95 | Suministro e instalación de repisas en madera tipo cajón con soporte en estructura metálica en paredes existentes del contenedor de 35 cm de ancho por 2 m. Incluye soportes soldados, pie de amigos y todos los elementos necesarios para su puesta en funcion | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 96 | Suministro e instalación de mesa plegable de 2,00*0,50. Incluye base madera entamborada de 4 cm con acabado en fórmica, bisagras, sistema de pie de amigos de soporte de cierre. Ver diseño plano de detalle. | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 97 | Suministro e instalación de tablero superboard 20mm en area exterior del contenedor para evitar contacto con el terreno natural, con recubrimiento en emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contened | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 98 | Suministro e aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contenedor. Para partes expuestas del contenedor, se debe aplicar 3 manos. | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 99 | **COMPONENTE PARQUE PARA PERROS** | **38 días** | **jue 08/02/24** | **lun 01/04/24** |
| 100 | **COMPONENTE PARQUE PARA PERROS** | **38 días** | **jue 08/02/24** | **lun 01/04/24** |
| 101 | Suministro e instalación de Baranda M-83. Incluye excavación, concreto dados, pintura electrostatica. | 38 días | jue 08/02/24 | lun 01/04/24 |
| 102 | Suministro e instalación de Anillo individual alto en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 125 cm | 26 días | jue 08/02/24 | jue 14/03/24 |
| 103 | Suministro e instalación de Anillo individual bajo en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 85 cm | 26 días | jue 08/02/24 | jue 14/03/24 |
| 104 | Suministro e instalación de Anillos dobles en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura variable de 45 cm a 85 cm | 26 días | jue 08/02/24 | jue 14/03/24 |
| 105 | Suministro e instalación de Escalones en tubo galvanizado de 6 peldaños para gimnasio canino con medidas de diámetro 40 cm en el paso y altura variable entre 15 y 30 cm. | 26 días | jue 08/02/24 | jue 14/03/24 |
| 106 | Suministro e instalación de Sube y baja para perros en tubo de acero galvanizado. 360 cm de largo x 40 cm de ancho y 45 cm de altura. | 26 días | jue 08/02/24 | jue 14/03/24 |
| 107 | Suministro e instalación de arena de peña. | 2 días | mié 27/03/24 | jue 28/03/24 |
| 108 | Suministro e instalación de poste en madera de diametro superior a 20 cm en abarco | 2 días | vie 29/03/24 | lun 01/04/24 |
| 109 | **ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B** | **58 días** | **mié 24/01/24** | **vie 12/04/24** |
| 110 | **ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B** | **58 días** | **mié 24/01/24** | **vie 12/04/24** |
| 111 | Suministro y pintura de imágenes artísticas o murales, con un diseño igual o similar al propuesto. Incluye aerosoles y todos los materiales necesarios para realizar los artes. Incluye mano de obra y limpieza de superficie previo a la aplicación de la pint | 9 días | mar 02/04/24 | vie 12/04/24 |
| 112 | Mantenimiento de baranda, incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficies metálicas. Aplicar tres manos, inc | 8 días | vie 15/03/24 | mar 26/03/24 |
| 113 | Mantenimiento de parque juegos calistenia, columpios y otros. incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficie | 8 días | vie 15/03/24 | mar 26/03/24 |
| 114 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | 13 días | mié 24/01/24 | vie 09/02/24 |
| 115 | **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y PMT** | 79 días | mar 26/12/23 | vie 12/04/24 |
| 116 | **TOTAL GESTIÓN SOCIAL** | 80 días | mar 26/12/23 | sáb 13/04/24 |
| 117 | **ACTA DE TERMINACIÓN** | 0 días | sáb 13/04/24 | sáb 13/04/24 |

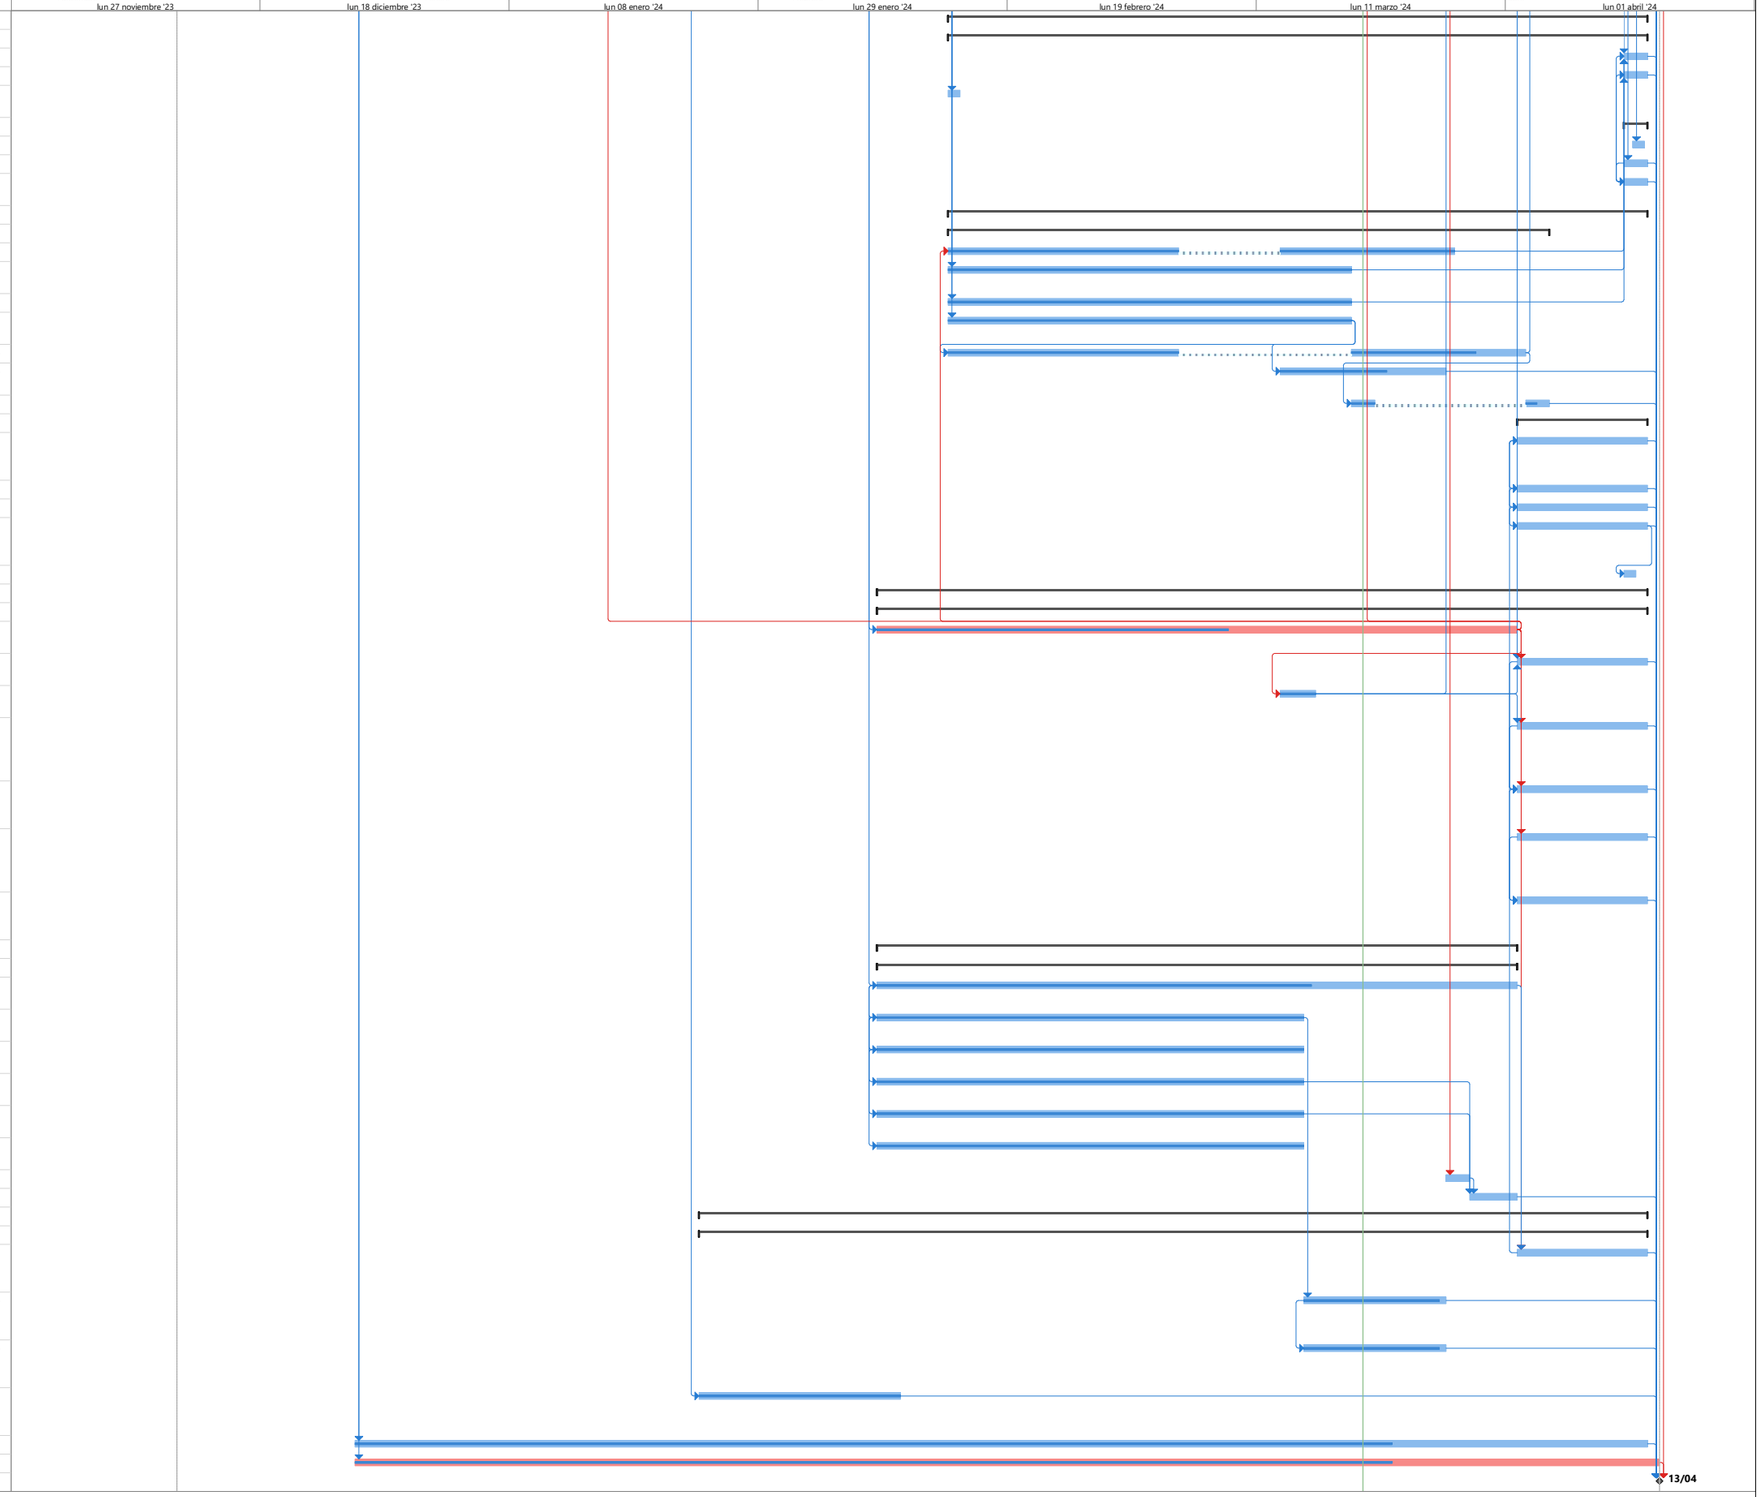


Cont. 655-2023
Inicio: 11 Dic 2023

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
