GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	MEDIO AMBIENTE	FECHA ACTA	lunes, 11 de diciembre de 2023
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.5468750	Número Radicado Interno del Contrato:	25102023-1589
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.604.010-1	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONVINIENTE	INCIVILPRO S.A.S.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4390	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA

Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - DEPARTAMENTO DE CALDAS, COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 949 DE 2023.

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 380.763.947	$ -	$ 76.152.789

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 380.763.947	PÚBLICA
Aporte Convenio No 28062023-1119	0%	$ -	
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	2/11/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	15/12/2023
	Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024318	$ 87.592.628,00		$ 87.592.628,00	0-0416
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	**$ 87.592.628,00**		**$ 87.592.628,00**	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 380.763.947,00	Valor del Anticipo:		$ 76.152.789
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 87.592.628,00		Amortización Acta 1	$ 15.230.558	
Valor Acta Nro. 2	$ -		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ -		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ -		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ -		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ -		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ -		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ -		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ -		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ -		Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11	$ -		Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 293.171.319,00		Saldo por Amortizar:	$ 60.922.231	
SUMAS IGUALES	**$ 380.763.947,00**	**$ 380.763.947,00**	**SUMAS IGUALES**	$ 76.152.789	$ 76.152.789

OBSERVACION: Se realiza la autorizacion del presente pago donde el conviniente se compromete a culminar el total de las actividades del contrato y presentar un informe final de las mismas.

Nota: EL CONVINIENTE HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: Paola Andrea Loaiza Cruz
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: Edison Ramirez Lemus
Supervisor

Firma
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO
14 DIC. 2023 13174

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	MEDIO AMBIENTE	FECHA ACTA	lunes, 11 de diciembre de 2023

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.5468750	Número Radicado Interno del Contrato:	25102023-1589
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.604.010-1	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONVINIENTE	INCIVILPRO S.A.S.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4390	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - DEPARTAMENTO DE CALDAS, COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 949 DE 2023.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 380.763.947	$ -	$ 76.152.789

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 380.763.947	PÚBLICA
Aporte Convenio No 28062023-1119	0%	$ -	
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	2/11/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	15/12/2023
	Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024318	$ 87.592.628,00		$ 87.592.628,00	0-0301
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	**$ 87.592.628,00**		**$ 87.592.628,00**	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 380.763.947,00	Valor del Anticipo:		$ 76.152.789
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 87.592.628,00		Amortización Acta 1	$ 15.230.558	
Valor Acta Nro. 2	$ -		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ -		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ -		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ -		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ -		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ -		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ -		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ -		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ -		Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11	$ -		Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 293.171.319,00		Saldo por Amortizar:	$ 60.922.231	
SUMAS IGUALES	**$ 380.763.947,00**	**$ 380.763.947,00**	**SUMAS IGUALES**	$ 76.152.789	$ 76.152.789

OBSERVACION: Se realiza la autorizacion del presente pago donde el conviniente se compromete a culminar el total de las actividades del contrato y presentar un informe final de las mismas.

Nota: EL CONVINIENTE HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: Paola Andrea Loaiza Cruz

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: Edison Ramirez Lemus

Supervisor

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE PAGO No. 01

SIG

Codigo: HS-FO-10
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

Acta N°:		Corte:	Fecha: Diciembre 11 de 2023
Contrato N°:	SAMC-SMA-037-2023	Contratista: Incivilpro SAS	Objeto: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA No.949 de 2023
Fecha Iniciación:	NOVIEMBRE 2 DE 2023		
Fecha Vencimiento inicial:	DICIEMBRE 15 DE 2023		
Fecha Suspensión:			
Fecha Reiniciación:			
Fecha Vencimiento final:			
Plazo inicial:		Plazo Adicional: N/A	Valor Adición: N/A

Municipio: Manizales

Interventor: Edison Ramirez Lemus

Supervisora:

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
				CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES																
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DEL PROYECTO EN EL LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	M2	$ 4.131	262,23	$ 1.083.338	96,84	359,07	$ 1.483.400			359,07	$ 1.483.400	100%	359,07	$ 1.483.400	100
1.02	DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	$ 2.721	69,85	$ 190.068	209,90	279,75	$ 761.225			279,75	$ 761.225	100%	279,75	$ 761.225	100
1.03	DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOSA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE NUEVA CIMENTACIÓN.(INCLUYE RETIRO)	M2	$ 24.235	29,94	$ 725.596	6,65	36,59	$ 886.637			36,59	$ 886.637	100%	36,59	$ 886.637	100
					$ 1.999.002			$ 3.131.262				$ 3.131.262			$ 3.131.262	
2. REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS																
2.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS - VIGAS DE FUNDACION , LOSA DE CONTRAPISO Y ZAPATAS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	$ 33.592	52,39	$ 1.759.894	-16,82	35,57	1.194.739,00			35,57	$ 1.194.739	100%	35,57	$ 1.194.739	100
2.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS DE 0 - 2 METROS - REDES SANITARIAS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	$ 33.592	131,27	$ 4.409.622		131,27	4.409.622,00					0%			0
2.03	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	m3	$ 164.234	10,48	$ 1.721.168	-2,32	8,16	1.340.146,00			8,16	$ 1.340.146	100%	8,16	$ 1.340.146	100

2.04	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	$ 4.106	69,85	$ 286.822		69,85	286.822,00					0%			0%
2.05	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, PRÉSTAMOS O CANTERAS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 METROS) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M METROS)	m3-km	$ 1.334	1.910,07	$ 2.547.269		1.910,07	2.547.269,00					0%			0%
					$ 10.724.775			$ 9.778.598				$ 2.534.885			$ 2.534.885	
3. CONSTRUIR CIMIENTOS																
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	m3	$ 490.861	3,35	$ 1.644.384	-0,13	3,22	$ 1.582.487			3,22	$ 1.582.487	100%	3,22	$ 1.582.487	100%
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	m3	$ 688.838	7,67	$ 5.283.384	-0,01	7,67	$ 5.279.939			7,67	$ 5.279.939	100%	7,67	$ 5.279.939	100%
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	$ 699.250	12,42	$ 8.684.685	-0,67	11,75	$ 8.213.321			11,75	$ 8.213.321	100%	11,75	$ 8.213.321	100%
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	$ 82.316	69,85	$ 5.749.747		69,85	$ 5.749.747					0%		$ 0	0%
3.05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN FY= 4200 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	$ 7.131	936,30	$ 6.676.989		936,30	$ 6.676.989			936,30	$ 6.676.989	100%	936,30	$ 6.676.989	100%
					$ 28.039.189			$ 27.502.483				$ 21.752.736			$ 21.752.736	
4. SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO																

4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	$ 1.091.797	8,06	$ 8.799.883	-1,92	6,14	$ 6.703.633			6,14	$ 6.703.633	100%		6,14	$ 6.703.633	100%
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	$ 1.056.805	16,27	$ 17.194.225		16,27	$ 17.194.225			16,27	$ 17.194.225	100%		16,27	$ 17.194.225	100%
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m	$ 29.833	281,01	$ 8.383.371		281,01	$ 8.383.371					0%			$ 0	0%
4.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	$ 18.055	80,33	$ 1.450.358		80,33	$ 1.450.358					0%			$ 0	0%
4.05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	$ 7.131	4.890,89	$ 34.878.159		4.890,89	$ 34.878.159			2.400,00	$ 17.115.000	49%		2.400,00	$ 17.115.000	49%
					$ 70.705.996			$ 68.609.746				$ 41.012.858				$ 41.012.858	
5. SUMINISTRAR Y CONSTRUIR OBRAS EN MAMPOSTERIA																	
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	$ 56.214	543,54	$ 30.554.558		543,54	$ 30.554.558					0%				0%
					$ 30.554.558			$ 30.554.558									
6. SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS-ACABADOS																	

6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO NEVADO BLANCO O SIMILAR DE 55,2x55,2 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	$ 84.767	53,56	$ 4.540.131		53,56	$ 4.540.131					0%			0%
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO PARA BAÑOS MIKONOS ARD BLANCO O SIMILAR DE 33,8X33,8 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	$ 83.191	12,30	$ 1.023.254		12,30	$ 1.023.254					0%			0%
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM PINTADO. INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2	$ 90.392	8,71	$ 787.316		8,71	$ 787.316					0%			0%
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	m	$ 37.820	11,36	$ 429.639		11,36	$ 429.639					0%			0%
					$ 6.780.340			**$ 6.780.340**								
7. SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA																
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALVANIZADA DE 4" SEPARADA	m2	$ 289.503	37,50	$ 10.856.363		37,50	$ 10.856.363					0%			0%
7.02	SUMINISTRO INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*2,00m)	un	$ 1.019.852	10,00	$ 10.198.520		10,00	$ 10.198.520					0%			0%
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*0,70m)	un	$ 648.130	1,00	$ 648.130		1,00	$ 648.130					0%			0%
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON PANELES EN VIDRIO (2,00m*2,10m)	un	$ 2.306.580	1,00	$ 2.306.580		1,00	$ 2.306.580					0%			0%
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO (0,8m*2,1m)	un	$ 590.847	8,00	$ 4.726.776		8,00	$ 4.726.776					0%			0%

7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO PEQUEÑO (0,90 m*2,10 m)	un	$ 752.879	8,00	$ 6.023.032		8,00	$ 6.023.032					0%			0
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30x30 PERSIANA BLANCA O SIMILAR	un	$ 55.761	8,00	$ 446.088		8,00	$ 446.088					0%			0
					$ 35.205.489			$ 35.205.489								
8. SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS																
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON TEJA METALICA ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 BLANCA RAL 9002 O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, GANCHOS DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	m2	$ 68.578	209,83	$ 14.389.722		209,83	$ 14.389.722					0%			0
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA CON TEJA TRANSPARENTE DE 1.07x5.90 M Ecoroof UPVC 2.5 mm O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	m2	$ 104.984	48,74	$ 5.116.920		48,74	$ 5.116.920					0%			0
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITOS	m2	$ 38.180	7,61	$ 290.550		7,61	$ 290.550					0%			0
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PHR-C 220x80x20 2.0mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m	$ 72.088	197,80	$ 14.259.006		197,80	$ 14.259.006					0%			0
					$ 34.056.198			$ 34.056.198								
9. SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS																
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	$ 457.376	2,00	$ 914.752		2,00	$ 914.752					0%			0
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA). INCLUYE REJILLA DE PISO PARA B	un	$ 119.652	1,00	$ 119.652		1,00	$ 119.652					0%			0
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL NÁPOLES DE 1 METRO BLANCO+ COÑAC (INCLUYE MESÓN POCETA IZQUIERDA) O SIMILAR. CON LAVAPLATOS PARA	un	$ 1.053.556	1,00	$ 1.053.556		1,00	$ 1.053.556					0%			0
9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSETA DE ASEO DE 46X36 CM FIRPLAK O SIMILAR.	un	$ 349.992	1,00	$ 349.992		1,00	$ 349.992					0%			0
					$ 2.437.952			$ 2.437.952								
10. SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS																
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS	un	$ 47.905	17,00	$ 814.385		17,00	$ 814.385					0%			0
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	m	$ 12.684	45,70	$ 579.659		45,70	$ 579.659					0%			0

10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 11.	m	$ 13.856	16,35	$ 226.546		16,35	$ 226.546					0%			0%
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 13,5.	m	$ 13.077	8,00	$ 104.616		8,00	$ 104.616					0%			0%
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21.	un	$ 21.207	60,00	$ 1.272.420		60,00	$ 1.272.420					0%			0%
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	$ 35.244	14,00	$ 493.416		14,00	$ 493.416					0%			0%
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDORES AGUA 1 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRES	un	$ 913.317	1,00	$ 913.317		1,00	$ 913.317					0%			0%
10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1/2" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	un	$ 9.383	22,85	$ 214.402		22,85	$ 214.402					0%			0%
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 3/4" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	un	$ 9.573	9,00	$ 86.157		9,00	$ 86.157					0%			0%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	un	$ 9.812	16,00	$ 156.992		16,00	$ 156.992					0%			0%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	$ 64.329	11,00	$ 707.619		11,00	$ 707.619					0%			0%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	$ 112.023	2,00	$ 224.046		2,00	$ 224.046					0%			0%
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2"	m	$ 22.951	44,60	$ 1.023.615		44,60	$ 1.023.615					0%			0%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	m	$ 42.232	56,00	$ 2.364.992		56,00	$ 2.364.992					0%			0%
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	m	$ 32.146	25,00	$ 803.650		25,00	$ 803.650					0%			0%
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	$ 47.648	5,00	$ 238.240		5,00	$ 238.240					0%			0%
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA AGUAS SERVIDAS 80X80cm	un	$ 378.063	9,00	$ 3.402.567		9,00	$ 3.402.567					0%			0%
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE AGUAS RESIDUALES DE DIÁMETRO 1,20M. EN CONCRETO DE 3000PSI (21 MPA) ESPESOR DE 0.2M	un	$ 543.717	2,00	$ 1.087.434		2,00	$ 1.087.434					0%			0%

10.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 1 1/2" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	m	$ 36.503	13,00	$ 474.539		13,00	$ 474.539					0%			0
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	m	$ 44.820	65,70	$ 2.944.674		65,70	$ 2.944.674					0%			0
10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 110 MM	m	$ 27.059	28,00	$ 757.652		28,00	$ 757.652					0%			0
10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 160 MM	m	$ 41.630	75,00	$ 3.122.250		75,00	$ 3.122.250					0%			0
10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 6" x 4" DE AGUAS LLUVIAS	un	$ 58.971	9,00	$ 530.739		9,00	$ 530.739					0%			0
10.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	m	$ 84.704	10,00	$ 847.040		10,00	$ 847.040					0%			0
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 10L	un	$ 1.032.720	1,00	$ 1.032.720		1,00	$ 1.032.720					0%			0
10.26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	m	$ 17.012	15,00	$ 255.180		15,00	$ 255.180					0%			0
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 200 MM	m	$ 57.432	20,00	$ 1.148.640		20,00	$ 1.148.640					0%			0
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	m	$ 83.871	40,00	$ 3.354.840		40,00	$ 3.354.840					0%			0
					$ 29.182.347			$ 29.182.347								
11. INSTALACIONES ELECTRICAS																
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T (INCLUYE TOMACORRIENTE	un	$ 104.802	14,00	$ 1.467.228		14,00	$ 1.467.228					0%			0
11.02	SUMINISTROE INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A	un	$ 164.270	6,00	$ 985.620		6,00	$ 985.620					0%			0
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T TIPO INTEMPERIE (INCLUYE TOMACORRIENTE, TAPA PLASTICA DUPLEX TIPO INTERPERIE, CAJA	un	$ 109.088	6,00	$ 654.528		6,00	$ 654.528					0%			0
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (INCLUYE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O EMPOTRAR DE 18 W, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA SUPLEMENTO, CABLE N°12 AWG	un	$ 156.382	17,00	$ 2.658.494		17,00	$ 2.658.494					0%			0
11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (INCLUYE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA SUPLEMENTO, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS	un	$ 200.141	22,00	$ 4.403.102		22,00	$ 4.403.102					0%			0
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA REFLECTOR (INCLUYE REFLECTOR LED DE 30W, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA	un	$ 188.898	2,00	$ 377.796		2,00	$ 377.796					0%			0

11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA AVISO DE SALIDA LUMINOSO (INCLUYE AVISO DE SALIDA LUMINOSO, CAJA RADWELT 5000	un	$ 266.722	2,00	$ 533.444		2,00	$ 533.444					0%			0%
11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE (INCLUYE AVISO DE SALIDA LUMINOSO, CAJA RADWELT	un	$ 193.855	2,00	$ 387.710		2,00	$ 387.710					0%			0%
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE	un	$ 107.374	25,00	$ 2.684.350		25,00	$ 2.684.350					0%			0%
11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE (INCLUYE CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE	un	$ 109.610	4,00	$ 438.440		4,00	$ 438.440					0%			0%
11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE 4 VARILLAS DE COBRE DE 5/8" 2.4M, 12 M DE CABLE CU No 1/0 AWG DESNUDO, 1	un	$ 1.916.398	1,00	$ 1.916.398		1,00	$ 1.916.398					0%			0%
11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (INCLUYE	un	$ 771.301	1,00	$ 771.301		1,00	$ 771.301					0%			0%
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO (INCLUYE MEDIDOR BIFÁSICO, 1 BREAKER DE 2X63A, CAJA HERMETICA)	un	$ 512.841	1,00	$ 512.841		1,00	$ 512.841					0%			0%
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN CABLE 2xNo 1/0 AWG (F) + 1xNo 1/0 AWG (N) SERIE AA8000 (INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m	$ 163.941	95,00	$ 15.574.395		95,00	$ 15.574.395					0%			0%
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2xNo 1/0(F) + 1xNo 1/0(N) + 1 No 10(T) AWG XLPE 15kV 133% (INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m	$ 192.292	31,00	$ 5.961.052		31,00	$ 5.961.052					0%			0%
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE PASO DE 80 X 80 X 100 CM SEGÚN NORMAS CHEC (PAREDES DE 15CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS #3 CADA 0.3, LOSA SUPERIOR EN CONCRETO 4000 PSI, TAPA METALICA CON ANGULO METALICO DE 2	un	$ 833.524	1,00	$ 833.524		1,00	$ 833.524					0%			0%
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 METROS (INCLUYE TEMPLETE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	un	$ 1.376.276	1,00	$ 1.376.276		1,00	$ 1.376.276					0%			0%
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO TUBERÍA IMC DE 1 1/2" (INCLUYE CAPACETE, CINTA BANDIT, HEBILLAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	m	$ 773.337	3,00	$ 2.320.011		3,00	$ 2.320.011					0%			0%

					$ 43.856.510			$ 43.856.510								
	SUBTOTAL OBRAS				$ 293.542.356			$ 291.095.483				$ 68.431.741			$ 68.431.741	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 293.542.356			$ 291.095.483				$ 68.431.741			$ 68.431.741	
	CERTIFICADO RETIE				$ 2.500.000			$ 2.500.000								
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				$ 2.529.500			$ 2.529.500								
	COSTO TOTAL				$ 380.763.947			$ 377.631.952								

COSTO DIRECTO			$ 293.542.356	$ 291.095.483		$ 68.431.741		$ 68.431.741
A. (%)	23	%	$ 67.514.742	66.951.961		$ 15.739.300		$ 15.739.300
I. (%)	1	%	$ 2.935.424	2.910.955		$ 684.317		$ 684.317
U. (%)	4	%	$ 11.741.694	11.643.819		$ 2.737.270		$ 2.737.270
TOTAL			$ 375.734.216	372.602.218		$ 87.592.628		$ 87.592.628

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE PAGO No. 01 SIG	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

RETENCION PARA LIQUIDACION (-5%)
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS M/CTE.

AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%)
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato	$ 380.763.947	
Valor acta No. 01	87.592.628	
Valor Acta No. 02		
Valor Acta No. 03		
Saldo Contrato	293.171.319	
SUMAS IGUALES	380.763.947	

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo	$ 76.152.789	
Amortización Acta No. 01	15.230.558	
Amortización Acta No. 02		
Amortización Acta No. 03		
Saldo Anticipo	60.922.232	
SUMAS IGUALES	76.152.789	

ALEXANDER PATIÑO TORRES
Representante Legal-Incivilpro-sas
CONTRATISTA

EDISON RAMIREZ LEMUS
INTERVENTOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IncivilPro

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d742a0680a583f30cfc048fdcee42c62c1f61700148e4f91a57e63c2c2ae8cf7
7158bcc5c4c47da1c89395256ca8d636

Número de Factura: FE-200
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCIVILPRO S.A.S
Nombre Comercial: INCIVILPRO S.A.S
Nit del Emisor: 900604010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 24 22 02 OF 307
Teléfono / Móvil: 578934465
Correo: incivilpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 04 - INC

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 21 CL 22 23
Teléfono / Móvil: 3012492291
Correo: eramirezl@caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	ACTA 1 CONTRATO DE OBRA SAMC SMA 037 2023 COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 68.431.741,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.431.741,00
2	A	ADMINISTRACION 23 VEINTITRES POR CIENTO	NIU	1,00	$ 15.739.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.739.300,00
3	I	IMPREVISTOS 1 UNO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 684.317,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 684.317,00
4	U	UTILIDAD 4 CUATRO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 2.737.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.737.270,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA 1 CONTRATO DE OBRA SAMC-SMA-037-2023 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANI MAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PR OTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA No.949 de 2023

Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA SAMC-SMA-037-2023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 15:55:23
Documento generado el: 2023-12-11 15:55:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			87.592.628,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			87.592.628,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			87.592.628,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	87.592.628,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053527455 Rango desde: 188 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14858599414

(415)7707212489984(8020) 000001485859941 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 4 0 1 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: INCIVILPRO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CR 24 22 02 OF 307

42. Correo electrónico: incivilpro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 0 1	5 7 8 8 0 1 5 0 1	5 7 3 0 1 2 4 9 2 2 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 2 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 3 1 1	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 02 / 04 : 50: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 08-03-2023 12:03:45PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INCIVILPRO SAS Identificado con NI 9006040101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina GILBERTO ALZATE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004197167
Fecha de apertura:	25 de Abril de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en la Oficina 0457 GILBERTO ALZATE de la ciudad de MANIZALES, el día Miércoles, 16 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

IncivilPro

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO MIGUEL GUSTAVO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, IDENTIFICADO CON C.C. Nº 19.189.793 TARJETA PROFESIONAL Nº 26824-T ACTUANDO COMO REVISOR FISCAL DE LA FIRMA INCIVILPRO SAS IDENTIFICADA CON NIT 900.604.010-1

CERTIFICAN QUE:

INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1 respecto a toda su planta de empleados, se encuentra a Paz y Salvo con todos sus aportes causados y vencidos al Sistema de Seguridad Social integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES) De igual forma se encuentra a Paz y Salvo con los aportes PARAFISCALES, PAGO DE SALARIOS y HONORARIOS.


Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Manizales a los 5 días del mes de DICIEMBRE de 2022 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Cordialmente,

Miguel Gustavo Jiménez Velásquez
Revisor Fiscal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 19.189.793
TP. 26824-T

Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 16.077.530




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
19.189.793

JIMENEZ VELASQUEZ
APELLIDOS

MIGUEL GUSTAVO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1952
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS ORTEGO VACHA

INDICE DERECHO

A-0900100-35164493-M-0019189793-20071128 0049307331M 02 225846670




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

26824-T

MIGUEL GUSTAVO
JIMENEZ VELASQUEZ
C.C.19189793
RESOLUCION INSCRIPCION 773 FECHA 1990/04/05
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 34381



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 1961

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5B9D333EEB415E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19189793 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 26824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *






IncivilPro

INFORME DE AVANCE DE OBRA No.1

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA No.949 de

CONTRATO SAMC-SMA-037-2023

INCIVILPRO S.A.S
CONTRATISTA

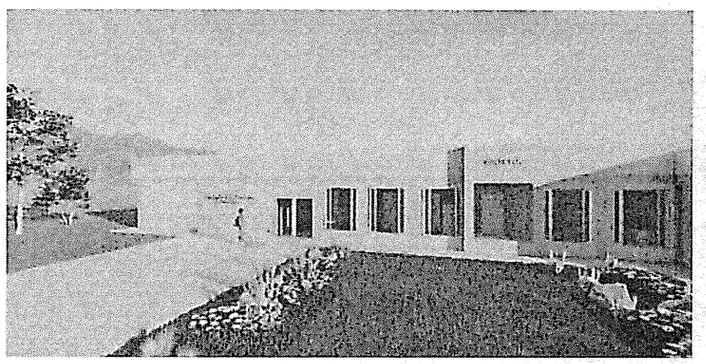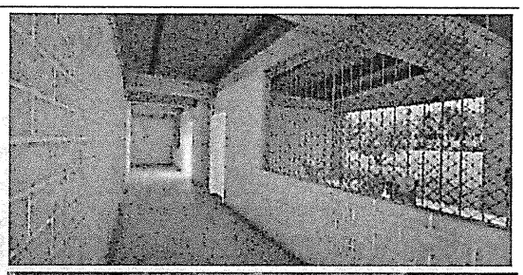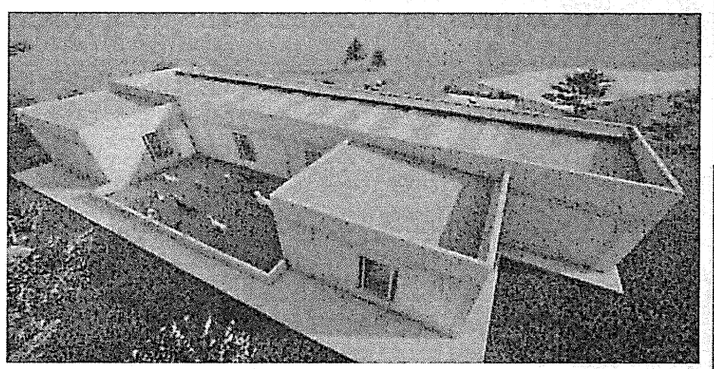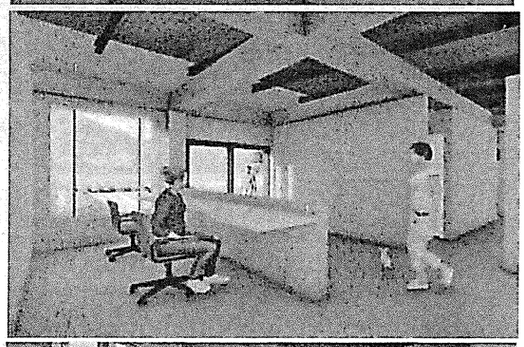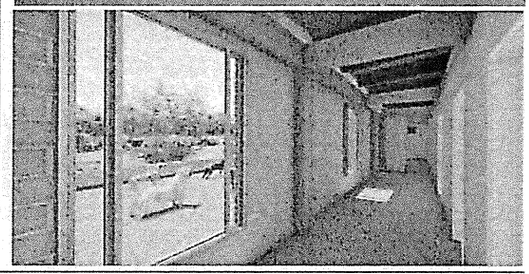IncivilPro

AVANCE DE OBRA:

Inicio de Obra:
Fecha: Noviembre 20 de 2023.

Se ha adelantado las actividades Localización y Replanteo, Descapote Manual, Cortes de Pavimento, Demoliciones parciales de losa, Demoliciones de Concreto Hidráulico, Excavación Manual para estructuras y cimentación, Figuración y colocación de Acero, Solados de Limpieza, Concreto para zapatas y cerramiento de la obra con fibra.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

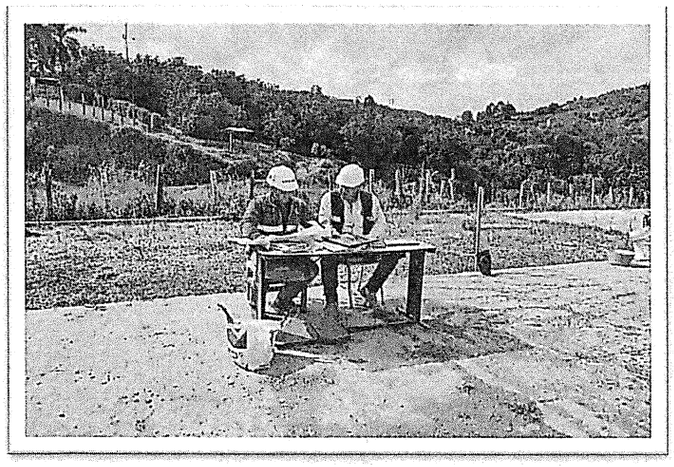


Ilustración 1.

Revisión de Planos y demás información del Contrato de Ejecución.

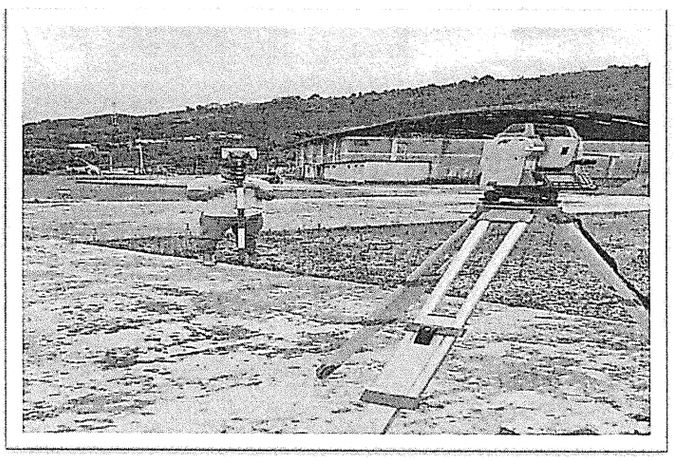


Ilustración 2.

Actividades de Localización y Replanteo.



Ilustración 3.

Actividades de Construcción de hiladeros para el inicio de las excavaciones.

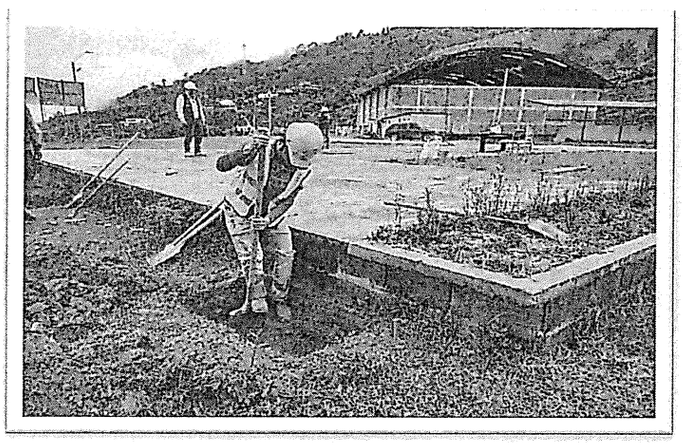


Ilustración 4.

Actividades de Excavación para las zapatas de Cimentación.

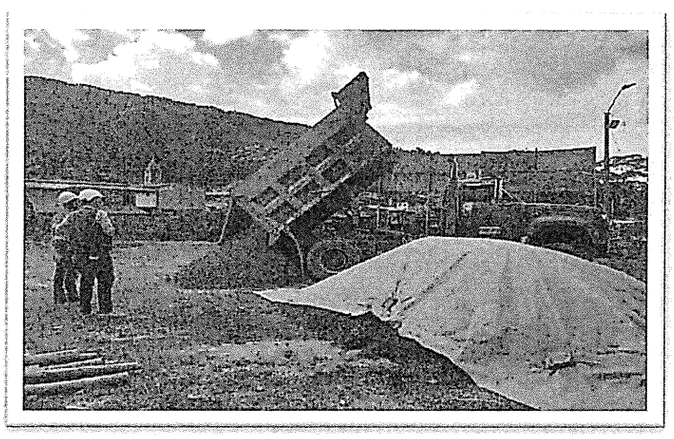


Ilustración 5.

Acopio de material de rio para el vaciado de los concretos de cimentación.

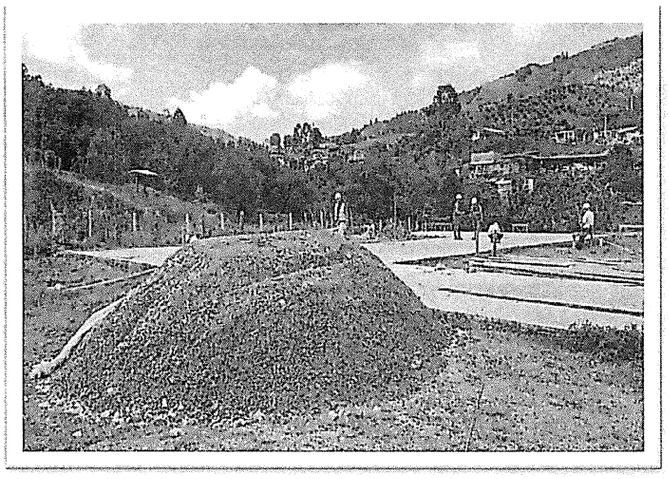


Ilustración 6.

Acopio de material de cantera para los posteriores llenos de la estructura.

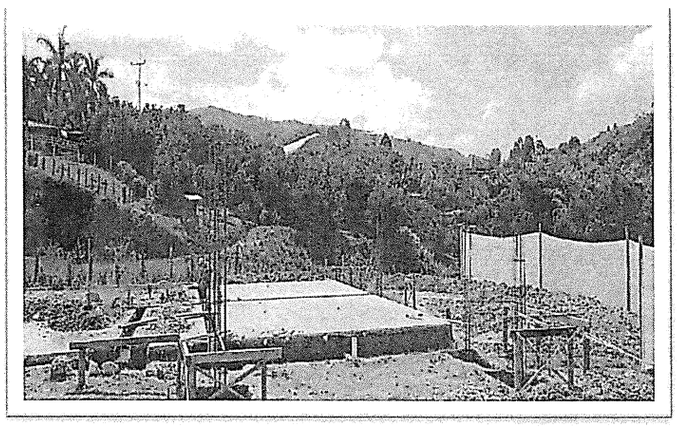


Ilustración 7.

Figuración y colocación de hierro para la cimentación (zapatas).



Ilustración 8.

Figuración de castillos de hierro para columnas.

IncivilPro

ALEXANDER PATIÑO TORRES
Representante Legal
Incivilpro S.A.S
