DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.5402648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**CUBIERTA**	
ITEM Nº:	2.1.1	DESCRIPCION ITEM	**Mantenimiento estructura metalica existente incluye grata metalica, lavado con hidrolavadora y porterior imprimacion con anticorrosivo a dos manos color a elegir, incluye todo lo neceario para la correcta ejecucion d el actividad**
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	10,00	16,23		1		162,30
BLOQUE D	10,00	16,23		1		162,30
BLOQUE D	10,00	16,23		1		162,30
BLOQUE D	10,00	16,23		1		162,30
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS						
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS	7,68	35,20		1		270,34
BLOQUE LOGISTICA						
BLOQUE LOGISTICA	9,70	14,00		1		135,80
BLOQUE ADMINISTRATIVO						
ADMINISTRATIVO	5,20	3,37		1,00		17,52
ADMINISTRATIVO	20,96	8,28		1,00		173,55
ADMINISTRATIVO	4,16	3,30		1,00		13,73
ADMINISTRATIVO	3,40	3,30		1,00		11,22
BLOQUES DE COCINA						
COCINA	28,32	7,20		1		203,90
BLOQUE 1070 B						
1070 B	10,64	9,80		1		104,27
TOTAL EJECUTADO						**1.579,53**
COBRADO ACTA 1				1634		1.634,00
COBRADO ACTA 2				-4,47		- 4,47
						-
				SUBTOTAL		**-50,00**
				VIENEN		
				TOTAL		**-50,00**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON
Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ
Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.540 2648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**CUBIERTA**	
ITEM N°:	2.1.2	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de teja Canaleta 90 color Blanco Ral 9002 Cal 22(0,90 mm) prepintada en superpoliester Ambas caras.incluye todos los elementos para su correcta instalacion**
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO












LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT		MEDIDA TOTAL
BLOQUE D						
BLOQUE D	10,07	16,23		1		163,44
BLOQUE D	10,07	16,23		1		163,44
BLOQUE D	10,07	16,23		1		163,44
BLOQUE D	10,07	16,23		1		163,44
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS						
BLOQUE COMERCIO Y SERVICIOS	8,08	35,20		1		284,42
BLOQUE LOGISTICA						
BLOQUE LOGISTICA	10,04	14,18		1		142,37
BLOQUE ADMINISTRATIVO						
ADMINISTRATIVO	5,60	3,37		1,00		18,87
ADMINISTRATIVO	20,96	8,68		1,00		181,93
ADMINISTRATIVO	4,56	3,30		1,00		15,05
ADMINISTRATIVO	3,80	3,30		1,00		12,54
BLOQUES DE COCINA						
COCINA	28,32	7,38		1		209,00
BLOQUE 1070 B						
1070 B	10,64	10,13		1		107,78
BODEGA COCINA						
CUARTO DE BODEGA	2,91	3,30		1		9,60
TOTAL EJECUTADO						**1.635,31**
COBRADO ACTA 1				534,57		534,57
COBRADO ACTA 2				1094,96		1.094,96
				SUBTOTAL		**5,78**
				VIENEN		
				TOTAL		**5,78**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON
Firma

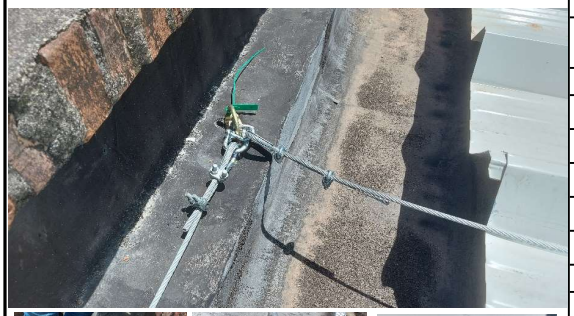


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ
Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.540 2648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	19/03/2024
CAPITULO		**CUBIERTA**	
ITEM N°:	2.1.4	DESCRIPCION ITEM	**Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas. Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos(incluye suministro, transporte e instalación de accesorios y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).**

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO			
 	BLOQUE LOGISTICA	13,10			2,00		26,20
	BLOQUE LOGISTICA	10,60			2,00		21,20
	BLOQUE COCINA	21,00			1,00		21,00
	BLOQUE COCINA	8,50			2,00		17,00
	BLOQUE COCINA	27,00			1,00		27,00
							
  							
	TOTAL EJECUTADO						**112,40**
	COBRADO ACTA 2				104		104,00
					SUBTOTAL		**8,40**
					VIENEN		
					TOTAL		**8,40**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima
