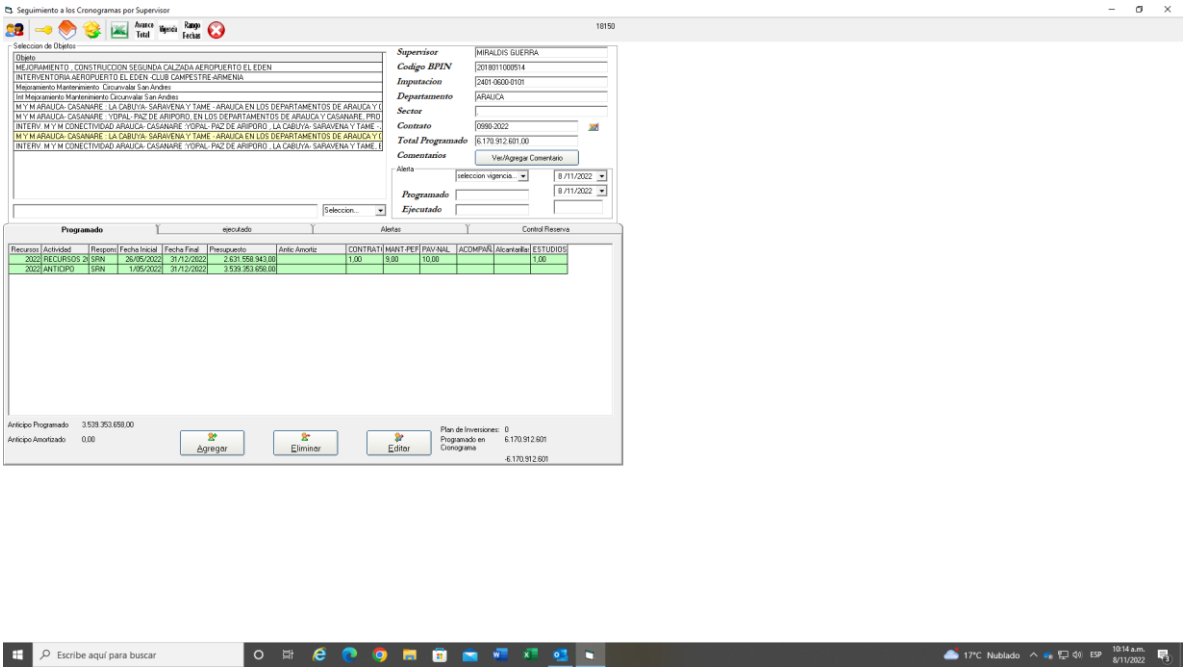
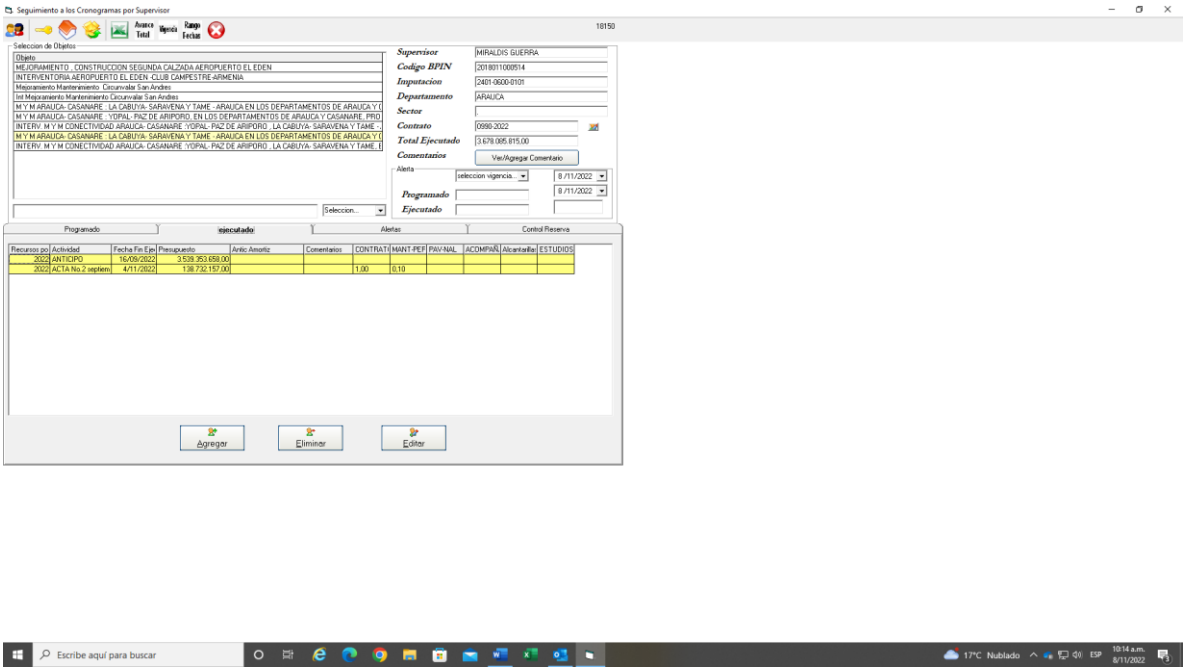

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18150
Seleccion de Objetos
Objeto
MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AEROPUERTO EL EDEN
INTERVENTORIA AEROPUERTO EL EDEN -CLUB CAMPESTRE-ARMENIA
Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
Int Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
M Y M ARAUCA- CASANARE - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
M Y M ARAUCA- CASANARE - YOPAL- PAZ DE ARIPORO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE, PRO
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE - YOPAL- PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME -
M Y M ARAUCA- CASANARE - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE - YOPAL- PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - L
Seleccion...
Supervisor
MIRALDIS GUERRA
Codigo BPIN
2018011000514
Imputacion
2401-0600-0101
Departamento
ARAUCA
Sector
Contrato
0998-2022
Total Programado
6.170.912.601,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
8/11/2022
Programado
8/11/2022
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recurso
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
MANT-PEP
PAV-NAL
ACOMPAÑ
Alcantarilla
ESTUDIOS
2022 RECURSOS 2(SRN 26/05/2022 31/12/2022 2.631.558.943,00 1,00 9,00 10,00 1,00
2022 ANTICIPO SRN 1/05/2022 31/12/2022 3.539.353.658,00
Anticipo Programado 3.539.353.658,00
Anticipo Amortizado 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma 6.170.912.601
-6.170.912.601
Escribe aquí para buscar
17°C Nublado
ESP
10:14 a.m.
8/11/2022


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18150
Seleccion de Objetos
Objeto
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AEROPUERTO EL EDEN
INTERVENTORIA AEROPUERTO EL EDEN -CLUB CAMPESTRE-ARMENIA
Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
Int Mejoramiento Mantenimiento Circunvalar San Andres
M Y M ARAUCA- CASANARE - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
M Y M ARAUCA- CASANARE - YOPAL- PAZ DE ARIPORO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE, PRO
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE -YOPAL- PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME -
M Y M ARAUCA- CASANARE - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y C
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE -YOPAL- PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - L
Seleccion...
Supervisor
MIRALDIS GUERRA
Codigo BPIN
2018011068514
Imputacion
2401-0600-0101
Departamento
ARAUCA
Sector
Contrato
0998-2022
Total Ejecutado
3.678.085.815,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
8/11/2022
Programado
8/11/2022
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos por
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATA
MANT-PEF
PAV-NAL
ACOMPAÑA
Alcantarilla
ESTUDIOS
2022
ANTICIPO
16/09/2022
3.539.353.658,00
2022
ACTA No.2 septiem
4/11/2022
138.732.157,00
1,00
0,10
Agregar
Eliminar
Editar

Escribe aquí para buscar
17°C Nublado
ESP
10:14 a.m.
8/11/2022
