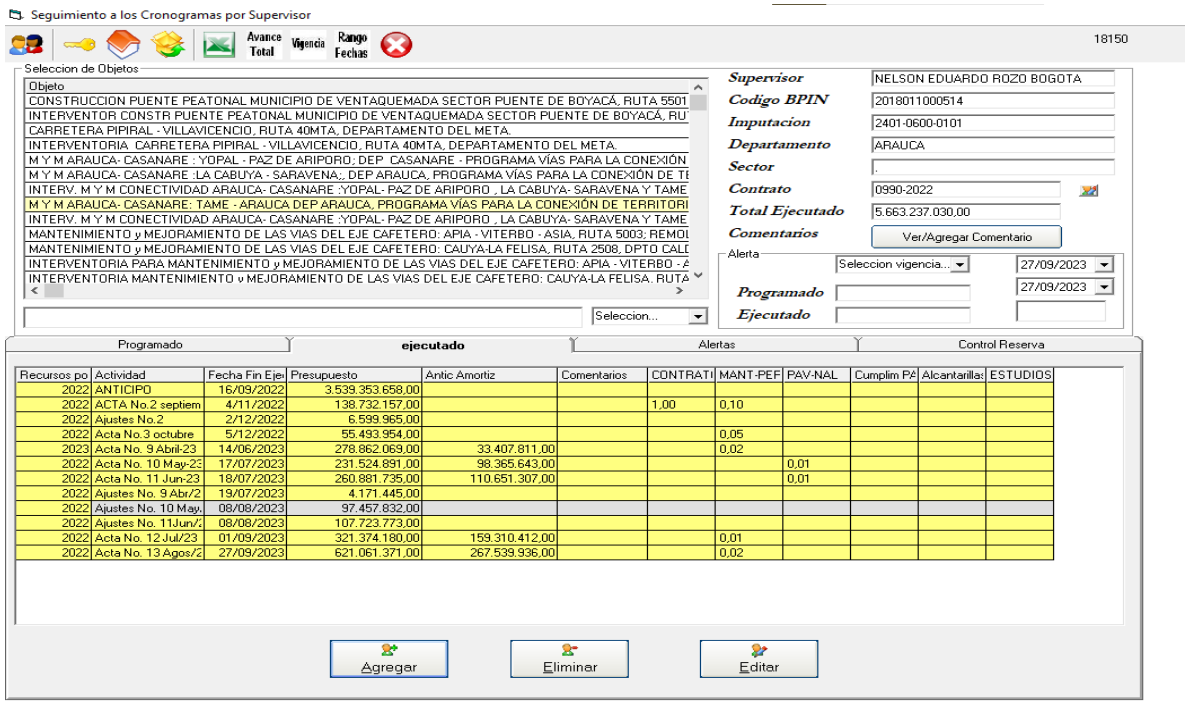
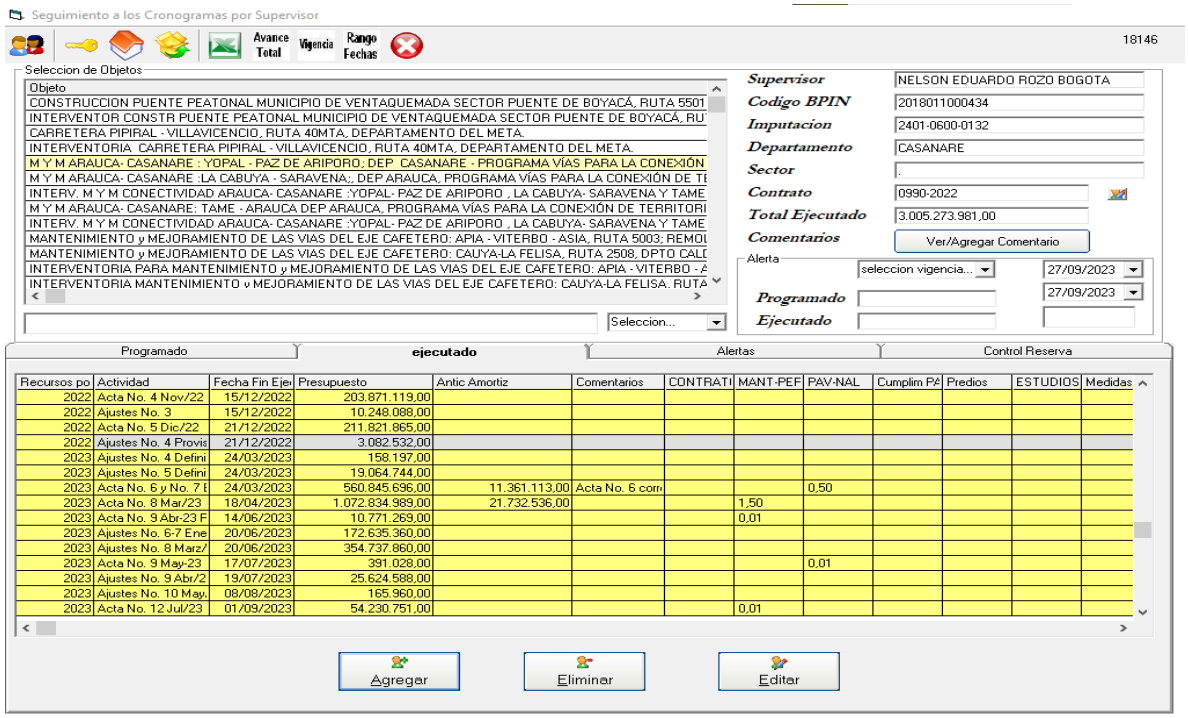

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18150
Seleccion de Objetos
Objeto
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA 5501
INTERVENTOR CONSTR PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RU
CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL - PAZ DE ARIPORO; DEP CASANARE - PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN
M Y M ARAUCA- CASANARE :LA CABUYA - SARAVENA;, DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TE
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
M Y M ARAUCA- CASANARE: TAME - ARAUCA DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORI
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOL
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DPTO CALL
INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - A
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA
Seleccion...
Supervisor
NELSON EDUARDO ROZO BOGOTA
Codigo BPIN
2018011000514
Imputacion
2401-0600-0101
Departamento
ARAUCA
Sector
.
Contrato
0990-2022
Total Ejecutado
5.663.237.030,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
27/09/2023
27/09/2023
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
Cumplim PA
Alcantarillas
ESTUDIOS
2022 ANTICIPO 16/09/2022 3.539.353.658,00
2022 ACTA No.2 septiem 4/11/2022 138.732.157,00 1,00 0,10
2022 Ajustes No.2 2/12/2022 6.599.965,00
2022 Acta No.3 octubre 5/12/2022 55.493.954,00 0,05
2023 Acta No. 9 Abril-23 14/06/2023 278.862.069,00 33.407.811,00 0,02
2022 Acta No. 10 May-23 17/07/2023 231.524.891,00 98.365.643,00 0,01
2022 Acta No. 11 Jun-23 18/07/2023 260.881.735,00 110.651.307,00 0,01
2022 Ajustes No. 9 Abr/2 19/07/2023 4.171.445,00
2022 Ajustes No. 10 May. 08/08/2023 97.457.832,00
2022 Ajustes No. 11Jun/2 08/08/2023 107.723.773,00
2022 Acta No. 12 Jul/23 01/09/2023 321.374.180,00 159.310.412,00 0,01
2022 Acta No. 13 Agos/2 27/09/2023 621.061.371,00 267.539.936,00 0,02
Agregar
Eliminar
Editar


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
18146
Seleccion de Objetos
Objeto
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RUTA 5501
INTERVENTOR CONSTR PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUENTE DE BOYACÁ, RU
CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL - PAZ DE ARIPORO; DEP CASANARE - PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN
M Y M ARAUCA- CASANARE :LA CABUYA - SARAVENA;, DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TE
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
M Y M ARAUCA- CASANARE: TAME - ARAUCA DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORI
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOL
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DPTO CALL
INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - A
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA
Seleccion...
Supervisor
NELSON EDUARDO ROZO BOGOTA
Codigo BPIN
2018011000434
Imputacion
2401-0600-0132
Departamento
CASANARE
Sector
.
Contrato
0990-2022
Total Ejecutado
3.005.273.981,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
27/09/2023
27/09/2023
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
MANT-PEF
PAV-NAL
Cumplim PA
Predios
ESTUDIOS
Medidas
2022 Acta No. 4 Nov/22 15/12/2022 203.871.119,00
2022 Ajustes No. 3 15/12/2022 10.248.088,00
2022 Acta No. 5 Dic/22 21/12/2022 211.821.865,00
2022 Ajustes No. 4 Provis 21/12/2022 3.082.532,00
2023 Ajustes No. 4 Defini 24/03/2023 158.197,00
2023 Ajustes No. 5 Defini 24/03/2023 19.064.744,00
2023 Acta No. 6 y No. 7 E 24/03/2023 560.845.696,00 11.361.113,00 Acta No. 6 corr 0,50
2023 Acta No. 8 Mar/23 18/04/2023 1.072.834.989,00 21.732.536,00 1,50
2023 Acta No. 9 Abr-23 F 14/06/2023 10.771.269,00 0,01
2023 Ajustes No. 6-7 Ene 20/06/2023 172.635.360,00
2023 Ajustes No. 8 Marz/ 20/06/2023 354.737.860,00
2023 Acta No. 9 May-23 17/07/2023 391.028,00 0,01
2023 Ajustes No. 9 Abr/2 19/07/2023 25.624.588,00
2023 Ajustes No. 10 May. 08/08/2023 165.960,00
2023 Acta No. 12 Jul/23 01/09/2023 54.230.751,00 0,01
Agregar
Eliminar
Editar
