CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 18

PREACTA

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	5/02/2024	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	18	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	ENERO 2024				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
2	201.7	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
4	210.1.1	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
5	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
6	211.1	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
7	220.1	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
8	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 90.000,00	$ 0,00
9	231.1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
10	320.1	Subbase Granular clase A	m3	4,20	$ 130.000,00	$ 546.000,00
11	330.1	Base granular clase A	m3		$ 169.998,00	$ 0,00
12	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 185.564,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 546.000,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
13	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.921,00	$ 0,00
14	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 877.928,00	$ 0,00
16	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 906.881,00	$ 0,00
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
18	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
19	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 8	450.2.1P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (la cabuya - saravena)	m3		$ 839.492,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	33,60	$ 29.753,00	$ 999.701,00
21	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 76.890,00	$ 0,00
22	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
23	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 175.045,00	$ 0,00
24	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 867.426,00	$ 0,00
25	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	7,14	$ 681.276,00	$ 4.860.904,00
26	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 488.230,00	$ 0,00
27	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
28	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
29	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
30	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
31	673.2	Material granular drenante	m3		$ 138.313,00	$ 0,00
32	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 182.187,00	$ 0,00
33	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	35,00	$ 259.317,00	$ 9.076.095,00
Subtotal						**$ 14.936.700,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
34	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
35	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	67,34	$ 24.098,00	$ 1.622.759,00
36	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
37	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 402.358,00	$ 0,00
38	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.677,00	$ 0,00
39	730.1	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
40	730.2	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
41	740.1	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 1.622.759,00**
OBRAS VARIAS						
42	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
43	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
44	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA	**$ 17.105.459,00**

TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
45	200.2.	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
46	201.7.	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
47	201.15.	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
48	210.1.1.	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
49	210.1.2.	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
50	211.1.	Remoción de Derrumbes	m3		$ 9.819,00	$ 0,00
51	220.1.	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
52	230.1P.	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 90.000,00	$ 0,00
53	231.1.	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
NP 1	211.1P	Desprendimiento controlado de talud	m3		$ 384.195,00	$ 0,00
NP 15	221.3P	Enrocado tamaño minimo 80 cm (incluye transporte)	m3		$ 239.191,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
54	320.1.	Subbase Granular clase A	m3		$ 110.000,00	$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	5/02/2024	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	18	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	ENERO 2024				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	330.1.	Base granular clase A	m3		$ 162.359,00	$ 0,00
56	330.4.	Base granular para bacheo clase A	m3		$ 177.926,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
57	420.2.	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.921,00	$ 0,00
58	421.1.	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
59	450.2P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 870.583,00	$ 0,00
60	450.9P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 899.536,00	$ 0,00
61	460.1P.	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
62	465.1.	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76.269,00	$ 0,00
63	466.1.	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 9	450.2.2P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (yopal - paz de ariporo)	m3		$ 832.147,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
64	600.1.1.	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
65	610.1.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 76.890,00	$ 0,00
66	610.2.	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 102.240,00	$ 0,00
67	610.3.	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 167.406,00	$ 0,00
68	630.3.	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 858.953,00	$ 0,00
69	630.4.	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 672.682,00	$ 0,00
70	630.6.	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 479.592,00	$ 0,00
71	640.1.	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
72	661.1.	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
73	671.1.	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 595.249,00	$ 0,00
74	673.1.	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
75	673.2.	Material granular drenante	m3		$ 131.850,00	$ 0,00
76	673.3.	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 174.549,00	$ 0,00
77	681.1.	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 253.147,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
78	1P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
79	2P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 24.098,00	$ 0,00
80	4P.	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
81	5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 401.969,00	$ 0,00
82	6P.	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 327.288,00	$ 0,00
83	730.1.	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
84	730.2.	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
85	740.1.	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
OBRAS VARIAS						
86	800.1.	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
87	900.2.	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
88	900.3.	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO	**$ -**

TRAMO 3: TAME-ARAUCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
89	200.2..	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.188.899,00	$ 0,00
90	201.7..	Demolición de Estructuras	m3		$ 112.050,00	$ 0,00
91	201.15..	Remoción de alcantarillas	m		$ 67.459,00	$ 0,00
92	210.1.1..	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3		$ 10.685,00	$ 0,00
93	210.1.2..	Excavación sin clasificar de préstamos	m3		$ 12.612,00	$ 0,00
94	220.1..	Terraplenes	m3		$ 13.170,00	$ 0,00
95	230.1P..	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3		$ 150.000,00	$ 0,00
96	231.1..	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7.610,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
97	320.1..	Subbase Granular clase A	m3		$ 176.000,00	$ 0,00
98	330.1..	Base granular clase A	m3		$ 223.469,00	$ 0,00
99	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	41,66	$ 239.036,00	$ 9.958.240,00
NP 3	310.1	Conformacion de la calzada existente	m2		$ 2.105,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 9.958.240,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
100	420.2..	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.921,00	$ 0,00
101	421.1..	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.865,00	$ 0,00
102	450.2P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 929.343,00	$ 0,00
103	450.9P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	57,09	$ 958.296,00	$ 54.709.119,00
104	460.1P..	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 69.997,00	$ 0,00
105	465.1..	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	1.816,40	$ 76.269,00	$ 138.535.012,00
106	466.1..	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4.205,00	$ 0,00
NP 04	500.1.1	Pavimento de concreto hidráulico mr-43 (4,2 mpa)	m3		$ 1.179.116,00	$ 0,00
NP 10	450.2.3P	Suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para parcheo (tapa hueco) (Tame-Corocoro-arauca)	m3		$ 890.907,00	$ 0,00
NP 11	233.2.1P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 160 kn	m2		$ 13.401,00	$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	5/02/2024
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	18	VERSION	
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
PERIODO	ENERO 2024			
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0			

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 12	233.2.2P	Geomalla para refuerzo de pavimentos asfalticos 300 kn	m2		$ 16.458,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 193.244.131,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
107	600.1.1..	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 29.753,00	$ 0,00
108	610.1..	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 43.279,00	$ 0,00
109	610.2..	Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 117.517,00	$ 0,00
110	610.3..	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 228.517,00	$ 0,00
111	630.3..	Concreto clase 28 MPA	m3		$ 926.738,00	$ 0,00
112	630.4..	Concreto clase 21 MPA	m3		$ 741.436,00	$ 0,00
113	630.6..	Concreto clase 14 MPA	m3		$ 548.694,00	$ 0,00
114	640.1..	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.623,00	$ 0,00
115	661.1..	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 626.762,00	$ 0,00
116	671.1..	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3		$ 655.713,00	$ 0,00
117	673.1..	Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7.777,00	$ 0,00
118	673.2..	Material granular drenante	m3		$ 183.559,00	$ 0,00
119	673.3..	Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 235.659,00	$ 0,00
120	681.1..	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 302.506,00	$ 0,00
NP 2	663.1	Suministro e instalacion tuberia de plastico tipo pvc norma ntc- 5055 de diametro 900 mm	m		$ 2.430.479,00	$ 0,00
NP 5	672.3	Bordillo en concreto vaciado ensitio	m		$ 48.614,00	$ 0,00
NP 6	672.5P	Piedra pegada incluye la conformación y compactación de taludes	m2		$ 136.180,00	$ 0,00
NP 7	691.1P	Limpieza con hidrolavadora de elementos de concreto en superficie	m2		$ 4.455,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
121	1P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.991,00	$ 0,00
122	2P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	109,52	$ 24.098,00	$ 2.639.213,00
123	4P..	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8.377,00	$ 0,00
124	5P..	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 405.079,00	$ 0,00
125	6P..	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 330.398,00	$ 0,00
126	730.1..	Defensa metalica	m		$ 300.790,00	$ 0,00
127	730.2..	Sección final	u		$ 103.783,00	$ 0,00
128	740.1..	Captafaros	u		$ 9.793,00	$ 0,00
NP 13	701.1P	Suministro e instalacion de tachones viales para señalizacion	u		$ 56.435,00	$ 0,00
NP 14	701.2P	Suministro e instalacion de delineadores verticales (hitos) para señalizacion	u		$ 63.921,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 2.639.213,00**
OBRAS VARIAS						
129	800.1..	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 18.621,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
TRANSPORTES						
130	900.2..	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.175,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 0,00**
					SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA	**$ 205.841.584,00**
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 222.947.043,00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$	222.947.043,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$	1.629.228,39
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)	**$**	**224.576.271,39**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)		
19,00%	$	-
VALOR BASICA TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA	**$**	**224.576.271,39**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

FIRMA:

NOMBRE: ING. EDWIN YESID SANCHEZ BERRIO

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

FIRMA:

NOMBRE: ING. ROSIO GARCIA BERMUDEZ

CARGO: INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 18

MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CALCULO


ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 10
ITEM Subbase Granular clase A
UNIDAD m3

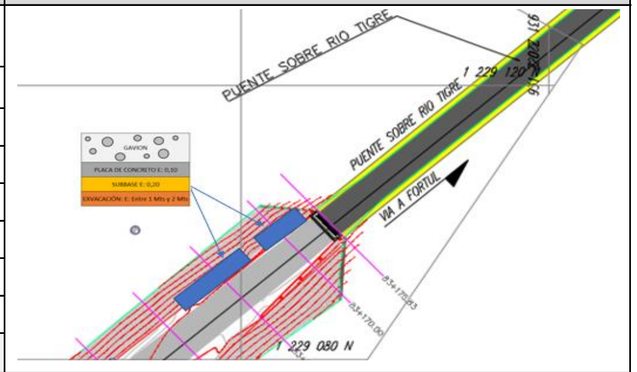DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Construcción de Gaviones	PR 83 + 160	PR 83 + 175	2,10			0,20			10,00			4,20	4,20	Ver anexo 1.	
MEMORIA TECNICA													4,20		

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 20
ITEM Excavaciones varias sin clasificar
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
Excavación para Construcción de Gaviones	PR 83 + 160	PR 83 + 175	2,10			1,00			4,00			8,40	8,40	Ver anexo 1.	
			2,10			2,00			6,00			25,20	25,20		
MEMORIA TECNICA														33,60	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 25
ITEM Concreto clase 21 MPA
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	CANT.	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Recubrimiento de Gaviones para recuperación de banca	PR 127 + 000	PR 127 + 031	1,00			0,10			16,45			1,65	3,00	4,94		
			1,00			0,10			1,00			0,10	1,00	0,10		
Construcción de losa para Gaviones	PR 83 + 160	PR 83 + 175	2,10			0,10			4,00			0,84		0,84	Ver anexo 1.	
			2,10			0,10			6,00			1,26		1,26		
MEMORIA TECNICA															**7,14**	



ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO LA CABUYA - SARAVENA

No. ITEM 33

ITEM Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			VOL (M3)	CANT	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
Construcción de Gaviones	PR 83 + 160	PR 83 + 175			1,00			1,00			2,00	2,00	12,00	24,00	Ver anexo 1.	
					1,00			1,00			2,00	2,00	5,50	11,00		
MEMORIA TECNICA															35,00	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

ANEXO 1.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA :	PR-83+160 AL PR 83+175 RUTA-6515	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE GAVIONES
		FECHA : ENERO DE 2024	


EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR		
AREA	8,40 12,60	
ESPESOR	1,00 2,00	
METROS CUBICOS DE EXCAVACION	33,60	mts^3

SUB-BASE GRANULAR CLASE A		
LARGO	10,000	
ANCHO	2,10	
ALTO	0,20	
METROS CUBICOS DE SUB-BASE GRANULAR	4,20	mts^3

CONCRETO CLASE 21 MPA		
LARGO	10,00	
ANCHO	2,10	
ALTO	0,10	
METROS CUBICOS DE CONCRETO 3000psi	2,10	mts^3

GAVIONES (2x1x1)	UNIDADES 17,50	
LARGO	2,000	
ANCHO	1,00	
ALTO	1,00	
METROS CUBICOS DE GAVIONES	35,00	mts^3

Observaciones:

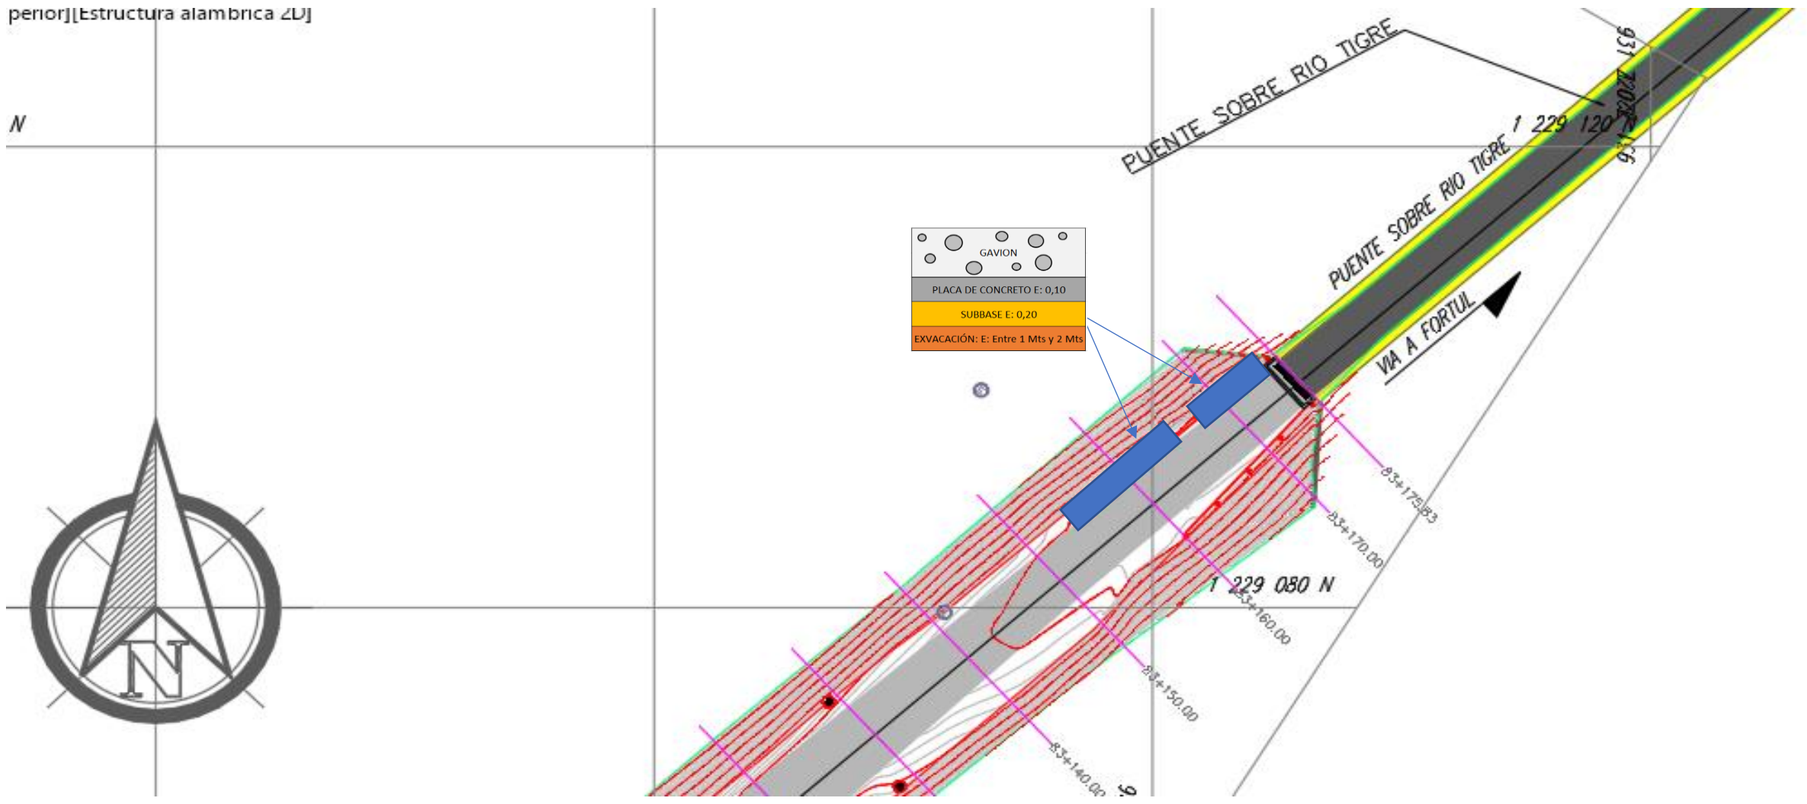

REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró y Calculó :

Ramiro Jiménez Pérez - Topógrafo MP-01-1104 CPNT

Reviso Y Aprobo :

Consorcio GIS JPS Reactivación

Juan Carlos Hernández Pérez - T.P. 01-13056

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6515
TRAMO TAME - COROCORO

No. ITEM 35

ITEM Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			CANT.	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
DEMARCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	PR 127 + 000	PR 127 + 031			3,70						9,10	2,00	67,34		
MEMORIA TECNICA														67,34	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO TAME - COROCORO
No. ITEM 99
ITEM Base granular para bacheo clase A
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
BACHEO RUTA 6605	K107+797				7,30			0,08			3,30	24,09		1,93		
	K107+818				2,45			0,08			3,40	8,33		0,67		
	K107+932				2,70			0,08			3,60	9,72		0,78		
	K107+943				3,70			0,08			3,24	11,99		0,96		
	K107+970				3,70			0,08			3,30	12,21		0,98		
	K108+203				2,10			0,08			3,24	6,80		0,54		
	K108+260				2,30			0,08			2,50	5,75		0,46		
	K108+600				1,80			0,08			5,80	10,44		0,84		
	K108+661				2,65			0,08			3,50	9,28		0,74		
	K108+763				3,50			0,08			8,00	28,00		2,24		
	K108+788				3,50			0,08			4,50	15,75		1,26		
	K108+906				7,30			0,08			6,00	43,80		3,50		
	K108+928				7,30			0,08			10,00	73,00		5,84		
	K108+959				7,30			0,08			8,70	63,51		5,08		
	K109+539				4,00			0,08			3,20	12,80		1,02		
	K109+671				1,85			0,08			2,20	4,07		0,33		
	K110+751				3,95			0,08			3,40	13,43		1,07		
	K110+796				4,30			0,08			12,05	51,82		4,15		
	K110+867				4,00			0,08			6,75	27,00		2,16		
	K110+900				3,00			0,08			4,00	12,00		0,96		
	K110+909				5,00			0,08			3,15	15,75		1,26		
	K110+948				2,55			0,08			2,65	6,76		0,54		
	K111+002				2,50			0,08			3,08	7,70		0,62		
	K111+130				7,30			0,08			6,40	46,72		3,74		
TOTAL ACTA PARCIAL															**41,66**	





ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO COROCORO - ARAUCA
No. ITEM 103
ITEM Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheo
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
BACHEO RUTA 6605	K107+797				7,30			0,12			3,30	24,09		2,89		
	K107+818				2,45			0,10			3,40	8,33		0,83		
	K107+932				2,70			0,10			3,60	9,72		0,97		
	K107+943				3,70			0,10			3,24	11,99		1,20		
	K107+970				3,70			0,10			3,30	12,21		1,22		
	K108+203				2,10			0,10			3,24	6,80		0,68		
	K108+260				2,30			0,10			2,50	5,75		0,58		
	K108+600				1,80			0,10			5,80	10,44		1,04		
	K108+661				2,65			0,10			3,50	9,28		0,93		
	K108+763				3,50			0,10			8,00	28,00		2,80		
	K108+788				3,50			0,10			4,50	15,75		1,58		
	K108+906				7,30			0,12			6,00	43,80		5,26		
	K108+928				7,30			0,12			10,00	73,00		8,76		
	K108+959				7,30			0,12			8,70	63,51		7,62		
	K109+539				4,00			0,10			3,20	12,80		1,28		
	K109+671				1,85			0,10			2,20	4,07		0,41		
	K110+751				3,95			0,10			3,40	13,43		1,34		
	K110+796				4,30			0,10			12,05	51,82		5,18		
	K110+867				4,00			0,10			6,75	27,00		2,70		
	K110+900				3,00			0,10			4,00	12,00		1,20		
	K110+909				5,00			0,10			3,15	15,75		1,58		
	K110+948				2,55			0,10			2,65	6,76		0,68		
	K111+002				2,50			0,10			3,08	7,70		0,77		
	K111+130				7,30			0,12			6,40	46,72		5,61		
TOTAL ACTA PARCIAL															**57,09**	





ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO TAME - COROCORO - ARAUCA
No. ITEM 105
ITEM Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
UNIDAD m3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			AREA (M2)	UN	VOLUMEN	OBSERVACIONES	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM					
BACHEO PANAMA - ARAUCA	K77+780	K78+820												1816,40		
TOTAL ACTA PARCIAL														**1816,40**		

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

ANEXO 2.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDA ARAUCA-CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0"

FRENTE DE OBRA :	PR-77+780 AL PR-78+820 "PANAMA DE ARAUCA"	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES.
		FECHA : ENERO DE 2024	

REGISTRO FOTOGRAFICO o ESQUEMA





REGISTRO FOTOGRAFICO o ESQUEMA



AREA INTERVENIDA

PR DE INICIO	77+780	
PR FINAL	78+820	
LONGITUD ACCESOS	140,00	mts
LONGITUD DE ESTRUCTURA NUEVA	900,00	mts
ANCHO PROMEDIO	7,60	mts
ESPESOR DE LA EXCAVACION ACCESOS	0,10	mts
ESPESOR DE LA EXCAVACION NUEVA	0,25	mts
TOTAL EXCAVACION	1816,40	mts^3

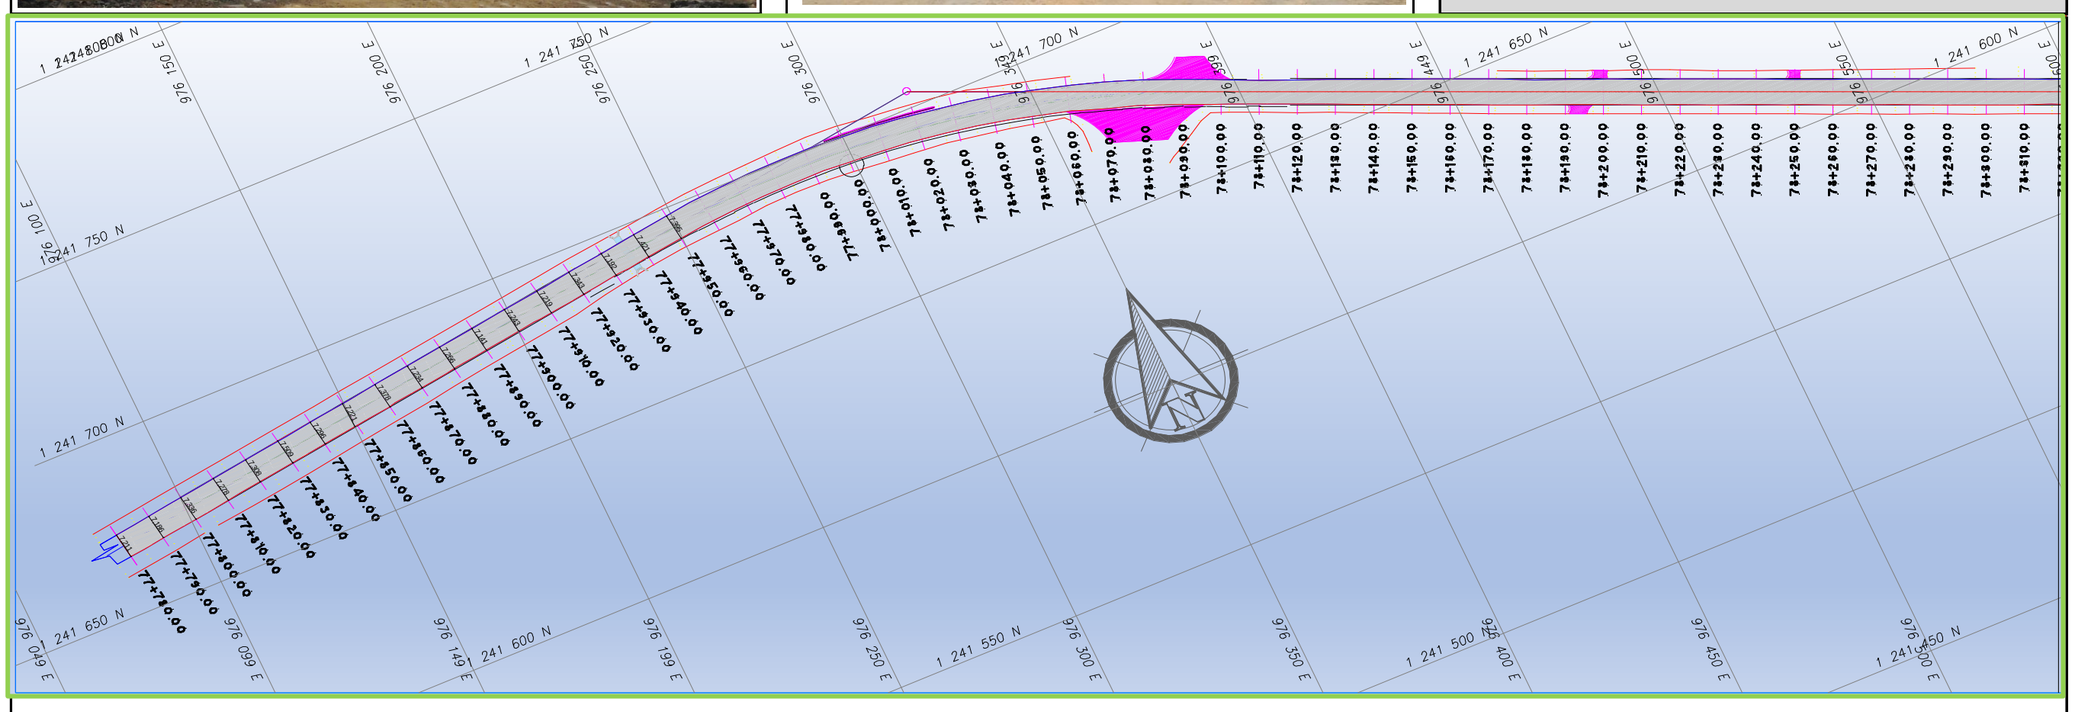

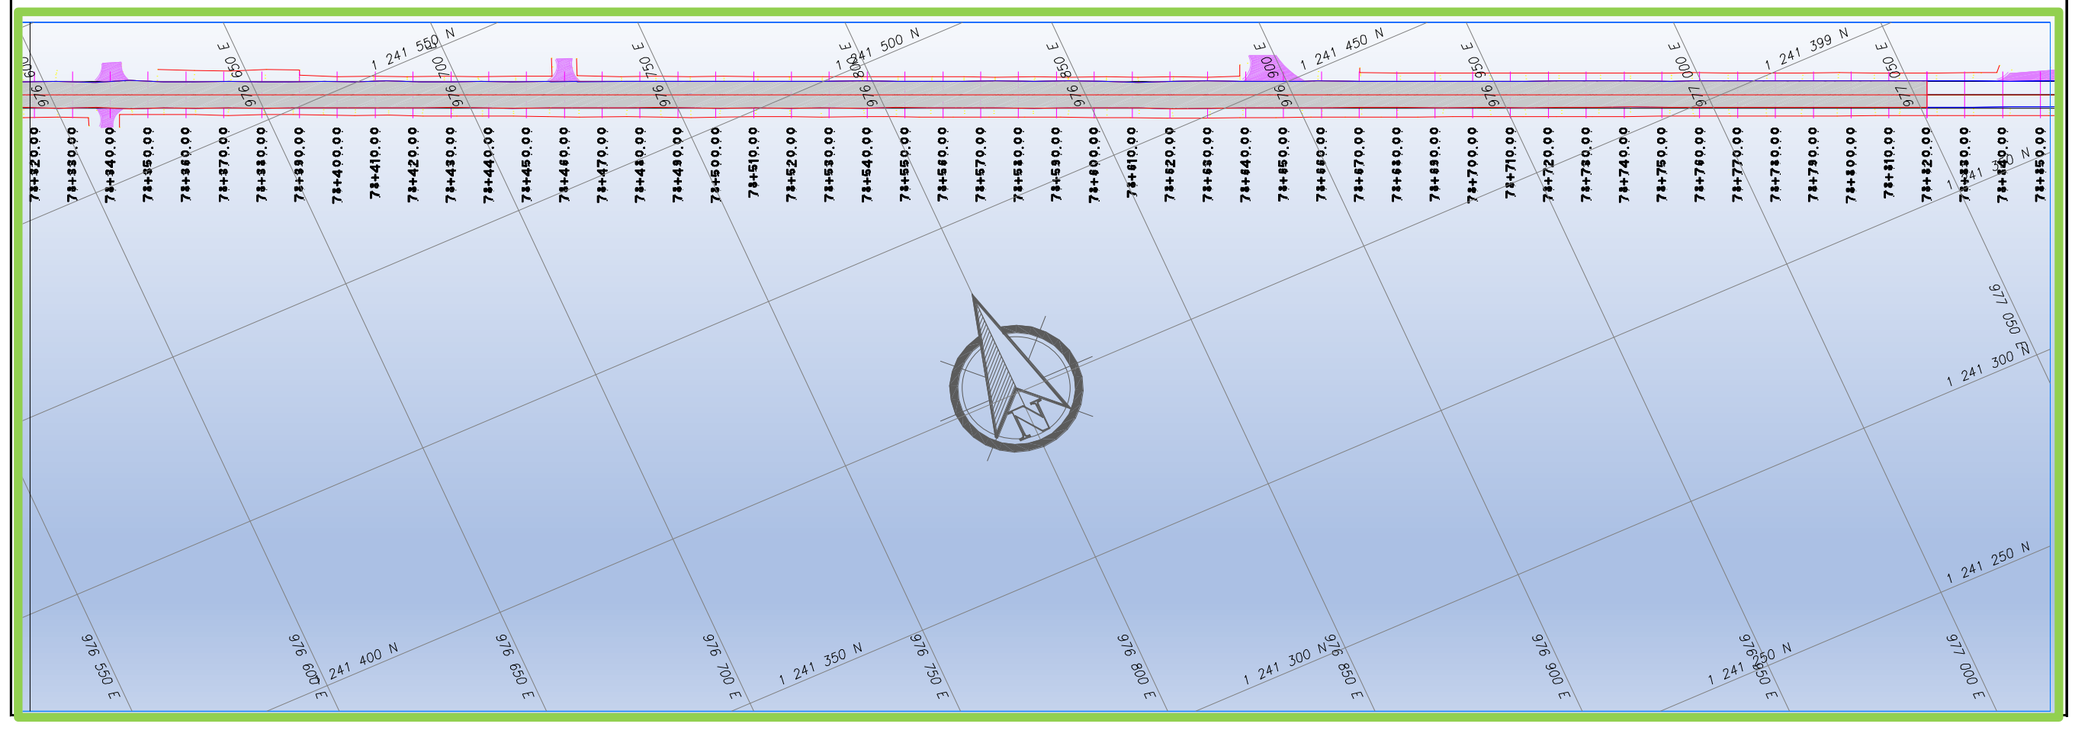

Elaboró y Calculó :

Ramiro Jiménez Pérez - Topógrafo MP-01-1104 CPNT

Reviso Y Aprobo :

Consorcio GIS JPS Reactivación

Juan Carlos Hernández Pérez - T.P. 01-13056

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 18

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

Consorcio TVG
NIT: 901.577.851-6

CONTRATO No.: 990 DE 2022
FECHA DE CORTE: ENERO 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
INTERVENTORÍA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
RUTA 6605
TRAMO TAME - COROCORO

No. ITEM 122

ITEM Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

UNIDAD m2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIA	TERMINA	ANCHO (M)			ESPESOR -ALTURA(M)			LONGITUD (M)			CANT.	TOTAL	OBS	FOTOGRAFÍAS Y/O ESQUEMA
			A1	A2	A. PROM	E1	E2	E. PROM	L1	L2	L. PROM				
DEMARCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	PR 64 + 000	PR 64 + 600			3,70						7,40	4,00	109,52		
MEMORIA TECNICA														109,52	

ING. EDWIN YESID SANCHEZ
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO TVG

ING. ROSIO GARCIA
ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 18

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 / MSE-FR-22-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE- ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE / COMFIAR / COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	REINEL ANTONIO TORRES PABÓN	13.503.711	DIRECTOR DE OBRA	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 8.000.000	$ 552.000	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 320.000	PORVENIR	9462150501	$ 1.360.000	$ 320.000			
2	AZORIN GARCIA PARDO	19.346.917	LIDER DE INTEGRACION	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 6.000.000	$ 414.000	V	SALUD TOTAL	9462150501	$ 240.000	COLPENSIONES	9462150501	$ 1.020.000	$ 240.000			
3	EDWIN YESID SANCHEZ BERRIOS	88.247.940	RESIDENTE DE OBRA	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 5.500.000	$ 379.500	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 220.000	COLPESIONES	9462150501	$ 935.000	$ 220.000			
4	YULIET PAOLA ARIAS ROJAS	1.098.781.018	INGENIERA AUXILIAR	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 2.500.000	$ 172.500	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 100.000	COLPENSIONES	9462150501	$ 400.000	$ 100.000			
5	MARTHA ROCIO PERICO PINZON	1.116.859.066	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 3.500.000	$ 241.500	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 140.000	COLPENSIONES	9462150501	$ 560.000	$ 140.000			
6	MONICA YADITZA AMAYA RODRIGUEZ	1.006.457.127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.160.000	$ 80.040	V	SANITAS	9462150501	$ 46.400	PORVENIR	9462150501	$ 185.600	$ 46.400			
7	MARLY SOFIA EREGUA QUIJANO	68.298.416	AUXILIAR SISO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.500.000	$ 80.040	V	SANITAS	9462150501	$ 60.000	PORVENIR	9462150501	$ 185.600	$ 60.000			
	PERSONAL DE CHAPARRITO - ARAUCA				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
8	DARWIN CABALLERO	1.116.855.358	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 11 DE ENERO
9	MARLON YESID TELLEZ CASTELLANO	1.007.272.393	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 18 DE ENERO
10	ANA DELITH BOLIVAR	1.116.774.013	CONTROLADORA VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 185.600	$ 46.400			INGRESO 18 DE ENERO
11	DURLEY KATERINE PARALES	1.116.809.497	CONTROLADORA VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS		$ 52.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400			INGRESO 18 DE ENERO
	PERSONAL DE SARAVENA- ARAUCA				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
12	YEISON FERNEY DUARTE SANCHEZ	1.005.065.297	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 16 ENERO DE
13	GABRIEL EVANGELISTA CONTRERAS VILLAMIZAR	1.049.393.495	OFICIAL DE OBRA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 72.000	PORVENIR	9462150501	$ 288.000	$ 72.000			INGRESO 16 ENERO DE
14	GUILLERMO CAMARGO PARRA	96.188.522	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 16 ENERO DE
15	YEISON ALEXANDER VELAZCO HERNANDEZ	1.127.912.951	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS	9462150501	$ 52.000	PORVENIR	9462150501	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 16 ENERO DE
	PERSONAL DE PANAMA																		
16	LEIDY JHOHANNA FINO HERNANDEZ	1.030.603.235	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 25 DE ENERO
17	NELSON ORLANDO MARTINEZ SANCHEZ	1.115.727.786	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 25 DE ENERO
18	CEILA TOVAR VEGA	68.302.064	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 25 DE ENERO
19	RUBEN DARIO GONZALEZ TOVAR	1.115.739.970	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 25 DE ENERO
20	LISNARDO ROJAS ROPERO	1.007.408.423	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.300.000	$ 89.700	V	NUEVA EPS		$ 52.000	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 25 DE ENERO
	PERSONAL TOPOGRAFIA (OPS)																		
21	RAMIRO JIMENEZ PEREZ	91.436.917	TOPOGRAFO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INDEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 80.040	V	NUEVA EPS	28167250	$ 52.000	COLPENSIONES	28167250	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO 09 DE ENERO
22	RUBER JAVIER MONTERREY CARRILLO	1.115.729.280	CADENERO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TVG	$ 1.800.000	$ 124.200	V	NUEVA EPS		$ 72.000	PORVENIR		$ 288.000	$ 72.000			INGRESO 11 DE ENERO
	PERSONAL DE ASFALTO																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha del **ENERO**

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **REINEL ANTONIO TORRES PABON**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-62434 NTS

Firma

Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022

ACTA DE OBRA No. 18

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	416349334	9462150501	E	2024/01/15	2024/01/25	BANCO DE OCCIDENTE	10	$12,086,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARAUCA (22 Afiliados)																					$39,588,089	$6,475,300			$39,588,089	$1,584,800			$40,108,476	$1,605,800			$39,588,089		$2,311,500		$0	$0		$11,977,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: TAME (22 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	**Afiliados(22)**			$39,588,089	$6,475,300			$39,588,089	$1,584,800			$40,108,476	$1,605,800			$39,588,089		$2,311,500		$0	$0		$11,977,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901577851	6	CONSORCIO TVG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE	calle 46 29 50	YOPAL-CASANARE	3124337305	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	416349334	9462150501	E	2024/01/15	2024/01/25	BANCO DE OCCIDENTE	10	$12,086,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,475,300	$58,800	$0	$6,534,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$104,900	$1,000	$0	$105,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,237,200	$11,300	$0	$1,248,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,320,300	$39,100	$0	$4,359,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$812,900	$7,400	$0	$820,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,311,500	$20,900	$0	$2,332,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	22	$2,311,500	$20,900	$0	$2,332,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,605,800	$14,500	$0	$1,620,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	22	$1,605,800	$14,500	$0	$1,620,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,584,800	$14,500	$0	$1,599,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$934,900	$8,500	$0	$943,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$312,100	$2,900	$0	$315,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$240,000	$2,200	$0	$242,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$97,800	$900	$0	$98,700
TOTAL				**22**	**$11,977,400**	**$108,700**	**$0**	**$12,086,100**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28167250
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAMIRO JIMENEZ PEREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91436917	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	DIAGONAL 30 6 59	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	RAJIMENEZP_24@YAHOO.ES	TELÉFONO	6944430
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28167250

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91436917	03	No	No	No	81	736	0	Salario	JIMENEZ PEREZ RAMIRO	$1.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91436917																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91436917	COLPENSIONES	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91436917	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.200.000	0.1250000	$150.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91436917	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$192.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$192.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$150.000	$0	0	$0	0	$0	$150.000	0	$0	$0	$150.000	$0	0	$0	$0	$150.000	$0	$0	$150.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$150.000
PENSIONES	1	$192.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$342.000
