

Id	Nombre de tarea	UND	Cantidad	Dias_Ca	Comienzo	Fin	Costo	Sucesoras	Predecesoras	% completado
1	**CONTRATO 085-00-B-COFAC-BACOF-2023 OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTUCTURA DEL ESCUADRÓN DE SEGURIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE**			**131**	**vie 22/12/23**	**mar 30/04/24**	**$ 368 066 811.82**			**0%**
2	**PRELIMINARES**			**34**	**mié 14/02/24**	**lun 18/03/24**	**$ 10 775 500.00**			**0%**
3	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	257,00	5	jue 14/03/24	lun 18/03/24	$ 4 626 000.00	24	20	0%
4	CORTE DE MURO CON PULIDORA	ML	100,00	2	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 980 000.00	9,11	6	0%
5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	11,00	3	jue 29/02/24	sáb 2/03/24	$ 225 500.00	17		0%
6	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS	Un	31,00	1	mié 21/02/24	mié 21/02/24	$ 1 085 000.00	4	39	0%
7	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M²	227,00	2	mié 14/02/24	jue 15/02/24	$ 3 859 000.00	39	29	0%
8	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**			**3**	**sáb 24/02/24**	**lun 26/02/24**	**$ 9 885 000.00**			**0%**
9	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS	MI	100,00	3	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 9 885 000.00		4	0%
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**12**	**sáb 24/02/24**	**mié 6/03/24**	**$ 24 681 600.00**			**0%**
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V	Un	68,00	2	sáb 24/02/24	dom 25/02/24	$ 17 000 000.00	12	4	0%
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) SOLO APARATO	Un	51,00	2	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 2 958 000.00	13	11	0%
13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO D	Un	4,00	2	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 122 000.00	14	12	0%
14	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO D	Un	7,00	4	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 299 600.00	15	13	0%
15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDA	Un	9,00	2	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 4 302 000.00	22	14	0%
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			**10**	**lun 4/03/24**	**mié 13/03/24**	**$ 9 949 400.00**			**0%**
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	Un	12,00	2	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 6 060 000.00	18	5	0%
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O	Un	17,00	2	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 1 968 600.00	19	17	0%
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	Un	10,00	4	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 170 000.00	20	18	0%
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA	Un	8,00	2	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 1 750 800.00	3	19	0%
21	**PAÑETES**			**7**	**jue 7/03/24**	**mié 13/03/24**	**$ 219 250.00**			**0%**
22	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M²	5,00	7	jue 7/03/24	mié 13/03/24	$ 219 250.00		15	0%
23	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			**21**	**mar 19/03/24**	**lun 8/04/24**	**$ 50 418 740.00**			**0%**
24	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	257,00	7	mar 19/03/24	lun 25/03/24	$ 12 032 740.00	25	3	0%
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TABLON TRADICION SAHARA 30.5X30.5 PRIM ALFA O SIMILAR	M²	247,00	7	mar 26/03/24	lun 1/04/24	$ 32 776 900.00	26	24	0%
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO SANITARIO R70 24.5X9X9 SAHARA	MI	70,00	7	mar 2/04/24	lun 8/04/24	$ 5 609 100.00	32	25	0%
27	**ACABADOS DE MUROS DE PINTURA**			**111**	**vie 22/12/23**	**mié 10/04/24**	**$ 94 883 357.30**			**0%**
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	568,11	10	dom 7/01/24	mar 16/01/24	$ 10 225 897.30	31	30	0%
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	1400,00	25	sáb 20/01/24	mar 13/02/24	$ 54 782 000.00	7	31	0%
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	839,20	16	vie 22/12/23	sáb 6/01/24	$ 23 329 760.00	28		0%
31	RESANE CON ESTUCO PLASTICO Y PINTURA ESMALTE PARA ZOCALOS ALTURA 10 CMS , PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE (ESCARIFICADO Y LIJADO)	ML	460,00	3	mié 17/01/24	vie 19/01/24	$ 5 888 000.00	29	28	0%
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE	M²	10,00	2	mar 9/04/24	mié 10/04/24	$ 657 700.00	34	26	0%
33	**CARPINTERIA METALICA**			**12**	**jue 11/04/24**	**lun 22/04/24**	**$ 35 376 778.68**			**0%**

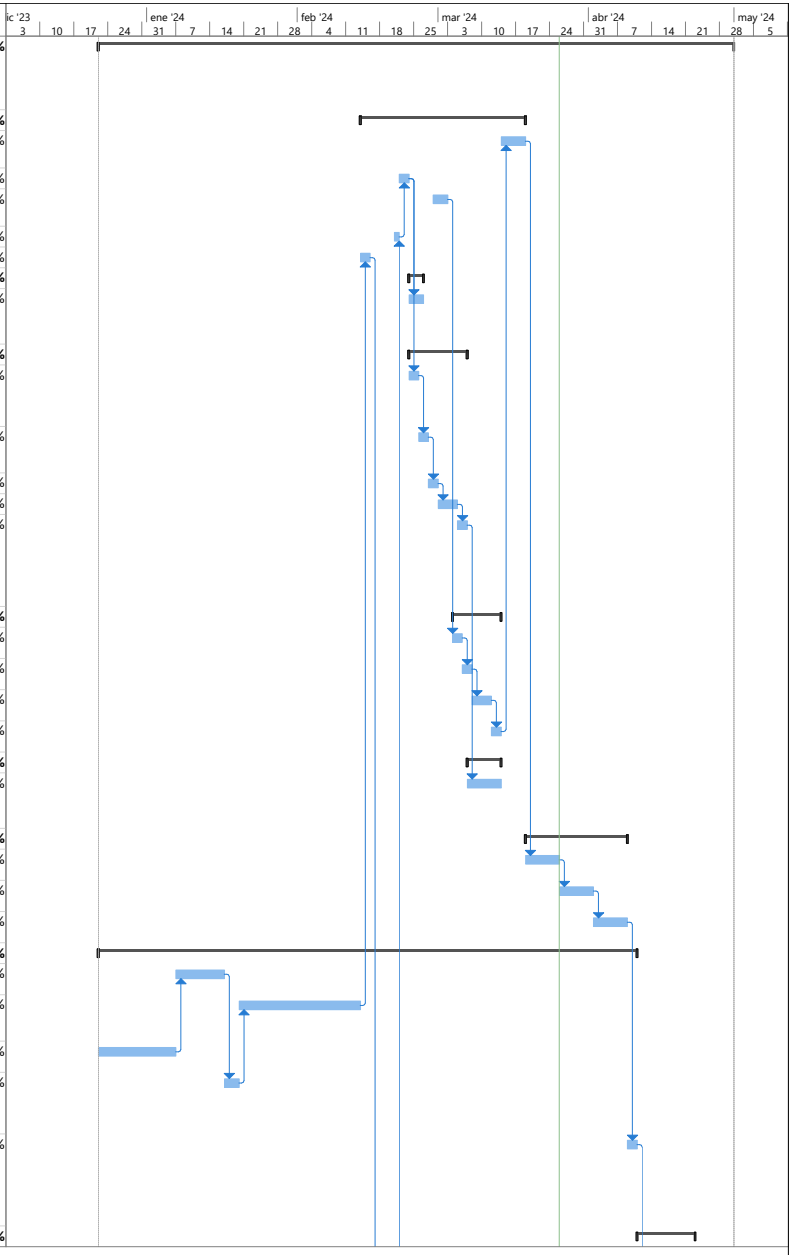

Proyecto: PDT
Fecha: mar 26/03/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Nombre de tarea	UND	Cantidad	Dias_Ca	Comienzo	Fin	Costo	Sucesoras	Predecesoras	% completado
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	M²	13,31	6	jue 11/04/24	mar 16/04/24	$ 6 857 528.68	35	32	0%
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA COMODA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, LISA A DOBLE CARA, MARCO EN ANGULO 1 1/4" X 1/8 " , DE ANCHO 0,70 M, ALTO 1.50 M, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION INCLUYE PASADOR .	Un	25,00	6	mié 17/04/24	lun 22/04/24	$ 28 519 250.00	37	34	0%
36	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**			**4**	**mar 23/04/24**	**vie 26/04/24**	**$ 7 486 353.73**			**0%**
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 SOCODA.	M²	8,18	4	mar 23/04/24	vie 26/04/24	$ 7 486 353.73	41	35	0%
38	**CUBIERTAS**			**5**	**vie 16/02/24**	**mar 20/02/24**	**$ 58 848 075.00**			**0%**
39	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALA	M²	247,50	5	vie 16/02/24	mar 20/02/24	$ 58 848 075.00	6	7	0%
40	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**			**131**	**vie 22/12/23**	**mar 30/04/24**	**$ 65 542 757.11**			**0%**
41	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M³	12,00	2	lun 29/04/24	mar 30/04/24	$ 636 156.00		37	0%
42	COSTOS INDIRECTOS			1	vie 22/12/23	vie 22/12/23	$ 64 906 601.11			0%

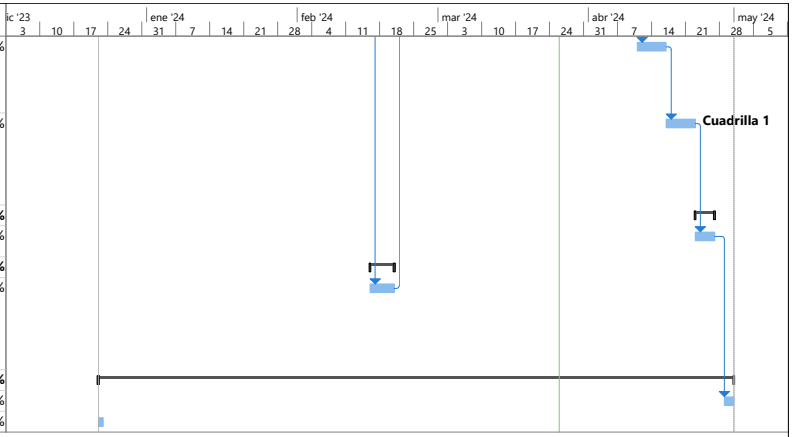

Proyecto: PDT
Fecha: mar 26/03/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				
