EJECUCIÓN CONTRATO No. 20230725

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

CONTRATISTA
Construcciones y pavimentos Boyacá S.A.S.
NIT. 826.002.051-1

REPRESENTANTE
EMILIANO VARGAS MESA
INGENIERO CIVIL. E.C.I
CC. 9.520.277 DE SOGAMOSO

TABLA DE CONTENIDO

ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 4

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. (ANEXOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS) 4
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA. 4
RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. (SE ADJUNTA COPIA DE ACTAS EN LOS ANEXOS) 4
1.3 PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO. 5
1.3.1 CONTRATISTA. 5
1.3.2 MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 5
1.4 GARANTIAS INICIALES CONTRATO (PÓLIZAS). 5
1.4.1 CONDICIONES INICIALES GARANTÍAS O PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. 5
1.5 RELACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZADA. 6
1.6 RELACIÓN PERSONAL EN OBRA. 6
1.7 RELACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 6

ASPECTO FINANCIERO. 7

1.8 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. 7
1.9 BALANCE FINANCIERO. 8
1.10 CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURAS. 8
1.11 RENDIMIENTO FINANCIERO DEL ANTICIPO. 8
1.12 ACTA DE PAGO PARCIAL. 8
1.13 ACTA DE RECIBO FINAL. 8

ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO. 9

1.14 ACTIVIDADES O ITEM EJECUTADOS. 9
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA VANEGAS-APOSENTOS 9
1.15 SABANA PRESUPUESTAL. 12
1.16 MEMORIAS DE OBRA CANTIDADES EJECUTADAS. 12
1.17 REGISTRO FOTOGRAFICO (ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA OBRA). 12
1.17.1 FOTOS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 12
1.17.2 FOTOS DURANTE LA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 14
1.17.3 FOTOS DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 15

1.18 INFORME DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 17
1.18.1 ENSAYOS DE LABORATORIO. 17

PORCENTAJE DE OBRA Y FINANCIERO EJECUTADO 18

RELACION DE PLAZOS 18

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 19

ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. (Anexos contrato administrativo de obras)
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

Contrato de obra No:	20230725
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ PAVIBOY SAS
Contratante:	MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Valor inicial del contrato:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($486.201.057)
Fecha de iniciación:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Plazo inicial:	TRES (03) MESES QUE EMPIEZAN A CONTABILIZARSE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Prorroga 1:	Veintisiete (27) días.
Prorroga 2:	Veintisiete (27) días.
Fecha de terminación:	4 DE DICIEMBRE DEL 2023 (según acta de inicio)
Fecha de terminación real:	24 DE ENERO DE 2024
Forma de pago:	MEDIANTE PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCIÓN
Supervisor:	WILSON RENÉ CORREDOR PARRA

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. (Se adjunta copia de Actas en los anexos)

ACTA DE INICIO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2	27 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE RECIBO FINAL:	24 DE ENERO DE 2024

1.3 PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO.
1.3.1 CONTRATISTA.

CARGO	NOMBRE	PROFESIÓN
Director de obra	Emiliano Vargas Mesa	Ing. Civil
Ingeniero Residente de Obra	Cristhian Camilo Plazas	Ing. Civil

1.3.2 MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

CARGO	NOMBRE	PROFESIÓN
Supervisor	Ing. Wilson René Corredor Parra	Ing. Civil

1.4 GARANTIAS INICIALES CONTRATO (Pólizas).

1.4.1 CONDICIONES INICIALES GARANTÍAS O PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por compañía SEGUROS MUNDIAL

-PÓLIZA de CUMPLIMIENTO No. BY-100037212

AMPAROS	VIG.DESDE	VIG.HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-12-2023	28/07/2024	$ 48.620.105,70
PRESTACIONES SOCIALES	23-12-2023	28/01/2027	$ 97.240.211.40
CALIDAD DEL SERVICIO	23-12-2023	28/10/2028	$ 2.241.242.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05-12-2023	05/12/2028	$ 145.860.317.10

*Actualizado ultimas pólizas subscritas, para su verificación se encuentran todas las pólizas suscritas en los Anexos.

1.5 RELACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZADA.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Volqueta sencilla 6 m3 y doble troque 12 m3	1	Suministro y retiro de materiales.
Retroexcavadora sobre llantas	1	excavación y retiro
Vibrocompactador	1	Compactación.
Carro tanque irrigador	1	Imprimación con emulsión asfáltica.
Finisher o terminadora de asfalto	1	Extendida y nivelación de mezcla asfáltica.
Compactador de llantas	1	Compactación.
Cortadora de pavimento	1	Cortar pavimento.
Motoniveladora	1	Nivelar capas granulares

1.6 RELACIÓN PERSONAL EN OBRA.

NOMBRE	CARGO
PLAZAS TAPIAS CRISTHIAN CAMILO	INGENIERO
ADAME LÓPEZ DEISY MAYERLY	AUXILIAR SOCIAL
COMBITA ÁLVAREZ JOSÉ DAVID	AYUDANTE
GONZÁLEZ MARTÍNEZ IVÁN	CONDUCTOR
GUTIÉRREZ LUIS HERNÁN.	CONDUCTOR
MACETO ASTERIO	AYUDANTE
MESA BAYONA JAVIER ALONSO	OPERADOR
MESA PALACIOS JAIME	CONDUCTOR

1.7 RELACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

la siguiente tabla muestra las planillas de aportes pagadas a la fecha por el contratista, adicionalmente para su verificación se adjuntan las planillas en los anexos, así como la carta de certificación del revisor fiscal, donde se afirma que Paviboy ltda. Se encuentra a paz y salvo en los conceptos de pago de nómina, aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales de todo el personal vinculado al proyecto (ver anexos).

PLANILLA Nº	FECHA
7901836390	septiembre 2023 - octubre 2023
7905410746	Octubre 2023 - noviembre 2023
7909156879	Noviembre 2023 – diciembre 2023
7910248132	Diciembre 2023 - enero2024

ASPECTO FINANCIERO.

1.8 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.

Se cuenta con el siguiente registro presupuestal para el contrato con la siguiente información:

Fecha: 22/08/2023
Numero: 2023002196
OBJETO: C- 20230725 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES ENE L MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL 3M

RUBRO-FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.32.02.02.005-24-32-28-2402-16-1.3..1.1.07	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	$ 486.201.057,00
	TOTAL:	$ 486.201.057,00

Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal para el contrato con la siguiente información:

Fecha: 06/06/2023
Numero: 2023001110

CUENTA	NOMBRE	VALOR
2.32.02.02.005-24-32-28-2402-16-1.3..1.1.07	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	$ 500.000.000,00
	TOTAL:	$ 500.000.000,00

1.9 BALANCE FINANCIERO.

A continuación, se presenta el balance financiero.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 486.201.057,00	
Valor del anticipo (50%)		$0
Valor adicional		
Valor a pagar en el acta de liquidación		$ 477.962.167
Saldo sin ejecutar		$ 8.238.890
Sumas iguales	$ 486.201.057,00	$ 486.201.057,00

1.10 CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURAS.

A continuación, se presenta la relación de las FACTURAS del contrato No **20230725** (VER ANEXOS).

La factura se encuentra pendiente a la radicación y revisión de este documento.

1.11 RENDIMIENTO FINANCIERO DEL ANTICIPO.

Para el contrato **20230725** no se desembolsó ningún anticipo.

1.12 ACTA DE PAGO PARCIAL.

En el contrato **20230725** a la fecha no se han radicado actas de pago parcial.

1.13 ACTA DE RECIBO FINAL.

La obra se encuentra ejecutada con un avance del 100 % de terminación, el acta de recibo final se encuentra pendiente a la entrega de este documento.

ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO.

1.14 ACTIVIDADES O ITEM EJECUTADOS.

El contrato está representado por la construcción de la vía que conduce de la iglesia de Vanegas hacia aposentos en una longitud terminada de 400 m, la obra presentó diferentes actividades como se describe a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA VANEGAS-APOSENTOS



Excavaciones Varias sin Clasificar:

Esta actividad implica la remoción de material del suelo, sin una clasificación específica. En el contexto de la construcción de una vía, estas excavaciones podrían incluir la remoción de tierra y otros materiales para preparar el terreno.

Base Granular Clase C Gradación Gruesa:

Refiere a la colocación de una capa de material granular, clasificada como Clase C, con una gradación gruesa. Esta base proporciona soporte y estabilidad a la estructura de la vía, ayudando a distribuir las cargas y prevenir el asentamiento.

Subbase Granular Clase C:

Similar a la base granular, pero ubicada debajo de esta, la subbase granular Clase C actúa como una capa de transición para mejorar la capacidad de carga del suelo subyacente y proporcionar una superficie adecuada para la colocación de la base.

Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 - Compra de Mezcla:

Se refiere a la adquisición de una mezcla asfáltica densa en caliente, designada como tipo MDC-19. Este material se utiliza comúnmente para la pavimentación de carreteras y proporciona una superficie resistente y duradera.

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa:

Este tipo de acero se utiliza como refuerzo estructural. La designación "Fy 4200 MPa" indica la resistencia a la tracción del acero, lo que significa que tiene una alta capacidad para soportar cargas y tensiones en aplicaciones como placas de entrada de viviendas.

Concreto Resistencia 21 MPa (D):

Indica la elaboración de concreto con una resistencia a la compresión de 21 megapascales (MPa), con un diseño específico, posiblemente para su uso en ampliación de alcantarillas, placas de entrada a viviendas y acceso a la vía.

Caracterización del corredor vial postulado:

Esta actividad implica la recopilación, análisis y evaluación de las características y condiciones del corredor vial desarrolladas.

Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños Base:

Esta actividad consiste en examinar y, si es necesario, modificar los estudios y diseños base existentes relacionados con el proyecto. Puede abarcar aspectos como planos, especificaciones técnicas y cálculos para garantizar que estén actualizados y alineados con los requisitos específicos del corredor vial postulado.

Conformación de la calzada existente:

Esta actividad implica la adecuación y preparación de la superficie de la calzada existente para garantizar su nivelación y capacidad de soporte antes de realizar otras intervenciones.

Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1:

Consiste en la aplicación de una capa de emulsión asfáltica CRL-1 sobre la superficie de la calzada para mejorar la adherencia entre el asfalto existente y las nuevas capas que se aplicarán posteriormente.

Suministro e instalación de bordillo prefabricado a-10:

Refiere a la provisión y colocación de bordillos prefabricados del tipo A-10, que se utilizan comúnmente para delimitar y definir los bordes de la calzada, proporcionando un aspecto estético y funcional.

Sumidero en ladrillo sl 100:

Implica la instalación de un sumidero construido con ladrillos del tipo SL 100. Este componente tiene como función la captación y evacuación de aguas pluviales, contribuyendo a mantener la calzada libre de acumulaciones de agua.

Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=8":

Implica la adquisición y colocación de una tubería de PVC con un diámetro de 8 pulgadas destinada a formar parte del sistema de alcantarillado para el transporte de aguas residuales.

Tubería de concreto reforzado clase ii de 600 mm de diámetro interior:

Esta actividad consiste en la utilización de una tubería de concreto reforzado de Clase II con un diámetro interior de 600 mm, diseñada para su aplicación en sistemas de alcantarillado y drenaje.

Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador:

Refiere al rellenado de espacios con material de afirmado, el cual se compacta utilizando una rana. Este proceso busca proporcionar estabilidad y confinamiento a los bordillos.

Excavación manual en material común (incluye retiro):

Esta actividad comprende la remoción manual de material común, incluyendo su posterior retiro, con el propósito de adecuar la zona según los requerimientos del proyecto.

1.15 SABANA PRESUPUESTAL.

La sabana presupuestal se puede verificar en el anexo.

1.16 MEMORIAS DE OBRA CANTIDADES EJECUTADAS.

Las memorias de cantidades se pueden verificar en el anexo.

1.17 REGISTRO FOTOGRAFICO (antes, durante y después de la obra).


1.17.1 Fotos antes de la construcción de la vía





1.17.2 Fotos Durante la de la construcción de la vía



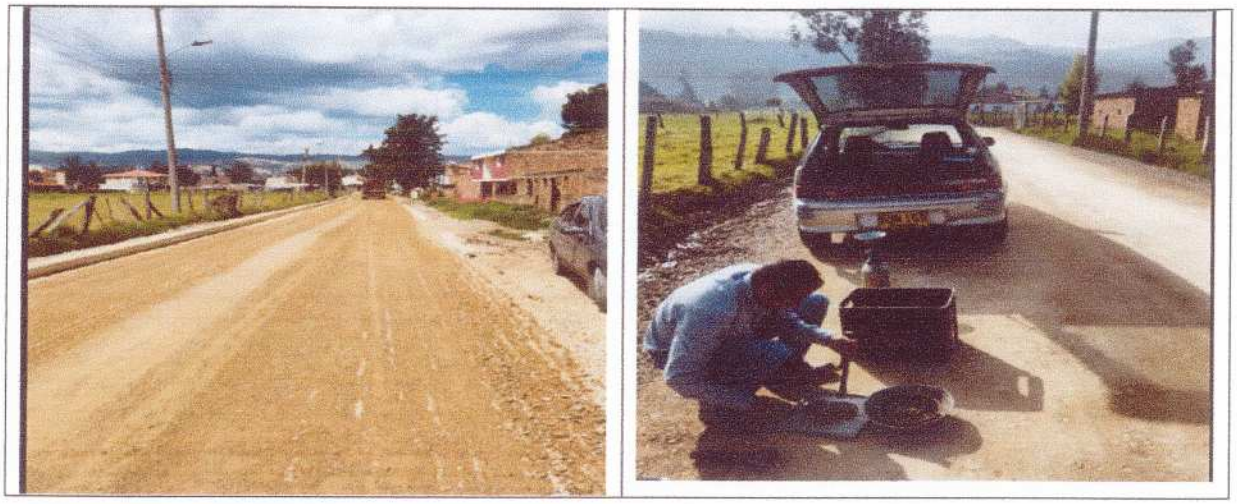

1.17.3 Fotos después de la construcción de la vía





1.18 INFORME DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

1.18.1 ENSAYOS DE LABORATORIO.

A continuación, se presentan la totalidad de los ensayos de laboratorio para los ítems ejecutados, teniendo ensayos insitu y de planta. En los ensayos se muestra que cada uno de los materiales cumple correctamente con las especificaciones descritas en la norma INVIAS en cuanto a materiales para construcción de vías nuevas.

ENSAYO	MATERIAL	FECHA
Gradación, porcentaje de asfalto, estabilidad, flujo y densidad.	MDC -19	26/12/2023
Gradación, porcentaje de asfalto, estabilidad, flujo y densidad.	MDC -19	18/01/2024
Ensayo de densidad en el terreno método del cono y la arena.	BASE GRANULAR	17/01/2024
Ensayo de densidad en el terreno método del cono y la arena.	BASE GRANULAR	26/12/2024
Características generales y granulometría de los materiales INV E-213	BASE GRANULAR	11/12/2023
Índice de plasticidad	BASE GRANULAR	12/12/2023
Equivalente de arena de suelos y agregados finos INV e-133	BASE GRANULAR	14/12/2023
Abrasión de agregados en la máquina de los ángeles inv e-218 y 219	BASE GRANULAR	15/12/2023
Determinación de la resistencia del agregado grueso al desgaste por abrasión utilizando el aparato Micro - Deval INV e-238	BASE GRANULAR	15/12/2023
Ensayo Proctor modificado INV E-141 Y 142	BASE GRANULAR	18/12/2023
Ensayo de solidez sanidad de agregados	BASE GRANULAR	16/12/2023

Caras fracturadas y aplanamiento y alargamiento	BASE GRANULAR	13/12/2023
Caras fracturadas y aplanamiento y alargamiento	BASE GRANULAR	13/12/2023
Ensayo Proctor modificado INV E-141 y 142	SUB-BASE GRANULAR	22/11/2023
Características generales y granulometría de los materiales	SUB-BASE GRANULAR	29/11/2023
Límites de Atterberg INV E 125 Y 126	SUB-BASE GRANULAR	30/11/2023
Equivalente de arena de suelos y agregados finos INV E133	SUB-BASE GRANULAR	29/11/2023
Determinación de la resistencia del agregado grueso al desgaste por abrasión utilizando el aparato Micro-Deval INV E-238	SUB-BASE GRANULAR	04/12/2023
Abrasión de agregados en la máquina de los ángeles INV E-218 Y219	SUB-BASE GRANULAR	1/12/2023

PORCENTAJE DE OBRA Y FINANCIERO EJECUTADO

En la siguiente tabla se presenta el avance físico y financiero del presente contrato.
*AVANCE FÍSICO ACUMULADO: Es la suma da los trabajos terminados a la fecha.
*AVANCE FINANCIERO: Es el importe de todos los trabajos en el contrato ya pagados.

CONCEPTO	%	CANTIDAD EN COP ($)
*AVANCE FÍSICO ACUMULADO	100	$ 477.962.167
*AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	0	0

RELACION DE PLAZOS

En la siguiente tabla se muestra la relación de plazos durante el contrato.

RELACION	FECHA	PLAZO	FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA
ACTA DE INICIO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	UN (3) MESES	03 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N 1	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIEZ (27) DÍAS	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N 2	23 DE DICIEMBRE DE 2023	DIEZ (27) DÍAS	24 DE ENERO DE 2023
MODIFICATORIO N1	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	DIEZ (27) DÍAS	31 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICATORIO N2	18 DE ENERO DE 2024	DIEZ (27) DÍAS	24 DE ENERO DE 2023

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.

- La anterior obra realizada, se deja en perfectas condiciones de estabilidad, recibida satisfactoriamente por la comunidad, en cabeza por el presidente de la junta de acción comunal de cada localidad de igual forma por parte de la interventoría del contrato.
- La ejecución de obra se realizó con forme a la normativa vigente, cumpliendo con calidad de materiales e instalaciones.
- Cada una de las actividades realizadas en obra fueron informadas a la secretaria de infraestructura de Sogamoso, aceptando recomendaciones de su parte y de la comunidad.
- Las dimensiones totales de obra fueron medidas de manera precisa por contratista e interventoría, verificándolas correctamente.
- El anterior informe presentado muestra la totalidad de las actividades realizadas en obra, así como su porcentaje de ejecución el cual es de un 100%.

ANEXOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023001110

ACUERDO 015 DE 2022, DECRETO 596 DE 2022

El suscrito PROFESIONAL ESPEC COD 222 GRADO 08, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha:	06/06/2023	**Sector:**	
Tercero:	891855130	**Programa:**	001
Nombre:	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	**Proyecto:**	
Dependencia :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**Cargo :**	

Cuenta	Nombre	UE	Funte Recurso	CPC	Valor	Saldo Disponible
2.3.2.02.02.005-24-32-28-2402-16-1.3.1.1.07	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	9999999999 9999999999	9999999999999999999 99	53211	$ 500,000,000.00	$ 500,000,000.00

Total Disponibilidad: $ 500,000,000.00

CONCEPTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA VANEGAS - SECTOR APOSENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

PROFESIONAL ESPEC COD 222 GRADO 08

Registro Presupuestal

Número: 2023002196

ACUERDO 015 DE 2022, DECRETO 596 DE 2022

FECHA:	22/08/2023	**SECTOR:**	
A FAVOR DE:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	**PROGRAMA:**	VARIOS
NIT:	826002051	**PROYECTO:**	

Cuenta	Nombre	UE	CPC	Fuente	Tipo Af	Número	Crédito	Contra Crédito	Saldo disponib
2.3.2.02.02.005-24-32-28-2402-16-1.3.1.1.07	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	99999999999 999999999	53211	99999999999999 999999	DIS	2023001110	486,201,057.00	0.00	486,201,057.00

Total Registro: 486,201,057.00

OBJETO: C-20230725 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL 3 M

Se expide en SOGAMOSO a los 22 dias del mes de agosto de 2023

PROFESIONAL ESPEC COD 222 GRADO 08


INFORME DE CALIDAD DE MATERIALES

Versión No. 3 Fecha de Aprobación: Julio 25 de 2005	GRADACION, PORCENTAJE DE ASFALTO, ESTABILIDAD, FLUJO Y DENSIDAD. PR-008-F13	**EMILIANO VARGAS MESA** **Ingeniero Civil** EVM Construcciones y Pavimentos

OFICINA O PROYECTO:	Mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales en el municipio de Sogamoso.
FECHA:	Diciembre 26 de 2023.
TIPO DE ASFALTO:	60 -70
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19
DESCRIPCION:	Mezcla densa en caliente MDC-19.
CLIENTE:	Municipio de Sogamoso.

GRADACION			
Tamiz	*Peso (g)*	*% Retenido*	*% Pasa*
1"	0.0	0.0	100.0
3/4"	0.0	0.0	100.0
1/2"	155.0	10.9	89.1
3/8"	80.0	5.6	83.5
Nº. 4	328.0	23.1	60.4
Nº.10	284.5	20.0	40.3
Nº. 40	308.0	21.7	18.6
Nº. 80	118.5	8.3	10.3
Nº. 200	53.0	3.7	6.5

EXTRACCION	
P. Inicial (g)	1502.5
P.Final (g)	1420.0
P.Filtro antes	16.0
P.Filtro desp	16.5
Asfalto (%)	5.46

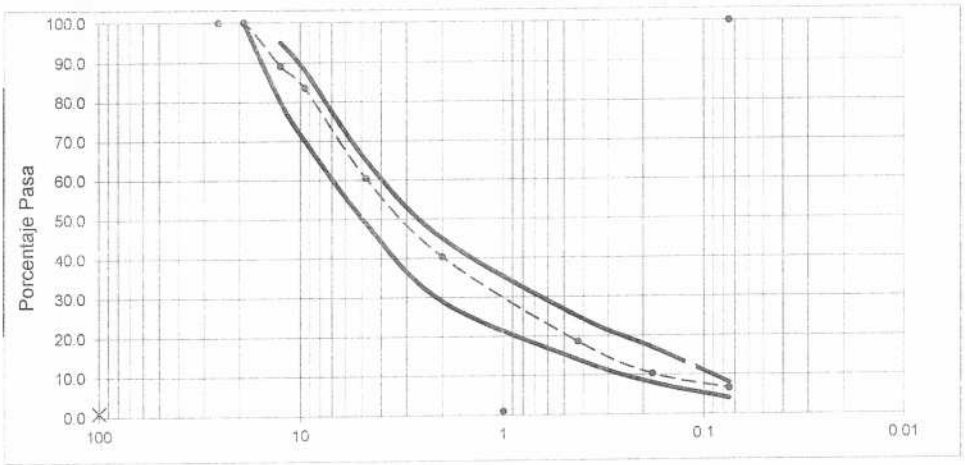

DENSIDAD - ESTABILIDAD - FLUJO				
Briqueta No.	1	2	*3*	*Promedio*
Peso en el aire (g)	1214.8	1216.5	1215.6	
Peso en el aire SSS (g)	1215.9	1217.5	1216.9	
Peso en el agua (g)	701.7	702.6	701.8	
Volumen (cm^3)	514.2	514.9	515.1	
Peso unitario mezcla total (g/cm^3)	2.363	2.363	2.360	2.362
Peso especifico maximo teorico	2.468	2.468	2.468	
Porcentaje de vacios (%)	4.275	4.271	4.379	4.308
Factor de corrección	1.00	1.00	1.00	
Estabilidad medida (kg)	1231.4	1203.2	1225.8	
Estabilidad corregida (kg)	1231	1208	1228	1223
Flujo (mm)	3.35	3.35	3.40	3.37


LABORATORISTA:		INGENIERO	

Versión No. 3 Fecha de Aprobación: Julio 25 de 2005	GRADACION, PORCENTAJE DE ASFALTO, ESTABILIDAD, FLUJO Y DENSIDAD. PR-008-F13	**EMILIANO VARGAS MESA** **Ingeniero Civil** EVM Construcciones y Pavimentos

OFICINA O PROYECTO:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.
FECHA:	Enero 18 de 2024.
TIPO DE ASFALTO:	60 -70
TIPO DE MEZCLA:	MDC-19
DESCRIPCION:	Mezcla densa en caliente MDC-19.
CLIENTE:	Municipio de Sogamoso.

GRADACION			
Tamiz	*Peso (g)*	*% Retenido*	*% Pasa*
1"	0.0	0.0	100.0
3/4"	0.0	0.0	100.0
1/2"	144.5	10.2	89.8
3/8"	96.5	6.8	83.0
Nº. 4	311.0	21.9	61.1
Nº.10	298.5	21.0	40.1
Nº. 40	295.0	20.8	19.3
Nº. 80	131.0	9.2	10.0
Nº. 200	57.5	4.1	6.0

EXTRACCION	
P. Inicial (g)	1500.5
P.Final (g)	1419.0
P.Filtro antes	16.0
P.Filtro desp	16.5
Asfalto (%)	5.40

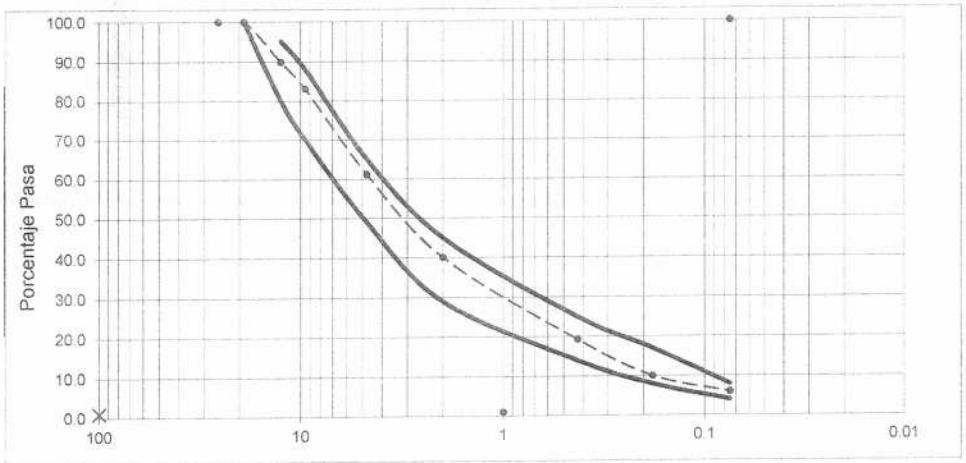

DENSIDAD - ESTABILIDAD - FLUJO				
Briqueta No.	1	2	*3*	*Promedio*
Peso en el aire (g)	1217.3	1221.5	1215.8	
Peso en el aire SSS (g)	1218.8	1222.7	1217.1	
Peso en el agua (g)	702.6	704.3	703.3	
Volumen (cm^3)	516.2	518.4	513.8	
Peso unitario mezcla total (g/cm^3)	2.358	2.356	2.366	2.360
Peso especifico maximo teorico	2.468	2.468	2.468	
Porcentaje de vacios (%)	4.449	4.526	4.121	4.366
Factor de corrección	1.00	1.00	1.00	
Estabilidad medida (kg)	1316.1	1265.3	1271.0	
Estabilidad corregida (kg)	1316	1270	1273	1287
Flujo (mm)	3.40	3.30	3.33	3.34

LABORATORISTA:		INGENIERO	

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y LA ARENA

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.
Fecha:	Enero 17 de 2024
Descripcion de la muestra:	Material granular para **Base**.
Laboratorista:	Jose Jacinto montaña.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas

Ensayo N°		5	6	7				
Capa		Base	Base	Base				
Abscisa		k0+250 I.	k0+330 D.	k0+385 I				
Peso frasco + arena antes	gr	7123	7080	7016				
Peso frasco + arena despues	gr	4091	4011	4047				
Arena usada	gr	3032	3069	2969				
Peso arena en el cono	gr	1609	1609	1609				
Peso arena en hueco	gr	1423	1460	1360				
Densidad de la arena	gr/cm^3	1.41	1.41	1.41				
Volumen del hueco	cm^3	1009.2	1035.5	964.5				
Peso suelo húmedo	gr	2355	2441	2264				
Densidad suelo húmedo	gr/cm^3	2.33	2.36	2.35				
Recipiente N°		22	4	11				
Peso recipiente + muestra húmeda	gr	401.3	393.6	367.5				
Peso recipiente + muestra seca	gr	389.7	384.1	358.8				
Peso recipiente	gr	56.3	53.4	54.8				
Peso agua	gr	11.6	9.5	8.7				
Peso muestra seca	gr	333.4	330.7	304				
Contenido de humedad	%	3.5	2.9	2.9				
Densidad suelo seco	gr/cm^3	2.26	2.29	2.28				
Densidad máxima de laboratorio	gr/cm^3	2.24	2.24	2.24				
Peso humedo de material > 3/4	gr	248	302	397				
Peso seco sobretamaños	gr	243.1	296.1	389.2				
Peso material fino humedo	gr	2107	2139	1867				
Peso material fino seco	gr	2036.2	2079.3	1815.1				
Peso total de la muestra seca	gr	2279.3	2375.3	2204.3				
Densidad del suelo	gr/cm^3	2.26	2.29	2.29				
Porcentaje sobretamaños	%	10.7	12.5	17.7				
Porcentaje de particulas finas	%	89.3	87.5	82.3				
Densidad bulk sobretamaños	gr/cm^3	2.62	2.62	2.62				
Densidad correjida	gr/cm^3	2.28	2.28	2.299				
Volumen del material > 3/4	cm^3	94.5	115.1	151.4				
Porcentaje de compactacion	%	99.3	100.5	99.4				

OBSERVACIONES: Vereda Vanegas.

LABORATORISTA

INGENIERO

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y LA ARENA

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.
Fecha:	Diciembre 26 de 2023
Descripcion de la muestra:	Material granular para **Base**.
Laboratorista:	Jose Jacinto montaña.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas

Ensayo N°		1	2	3	4			
Capa		Base	Base	Base	Base			
Abscisa		k0+025 I.	k0+075 D.	k0+125 I	k0+175 D.			
Peso frasco + arena antes	gr	6664	6634	6581	6559			
Peso frasco + arena despues	gr	3784	3592	3891	3710			
Arena usada	gr	2880	3042	2690	2849			
Peso arena en el cono	gr	1609	1609	1609	1609			
Peso arena en hueco	gr	1271	1433	1081	1240			
Densidad de la arena	gr/cm^3	1.41	1.41	1.41	1.41			
Volumen del hueco	cm^3	901.4	1016.3	766.7	879.4			
Peso suelo húmedo	gr	2108	2371	1824	2097			
Densidad suelo húmedo	gr/cm^3	2.34	2.33	2.38	2.38			
Recipiente N°		6	19	1	9			
Peso recipiente + muestra húmeda	gr	346.5	407.2	473.2	430.8			
Peso recipiente + muestra seca	gr	334.5	395.3	453.8	414.8			
Peso recipiente	gr	51.6	53.1	52.8	52.4			
Peso agua	gr	12	11.9	19.4	16			
Peso muestra seca	gr	282.9	342.2	401	362.4			
Contenido de humedad	%	4.2	3.5	4.8	4.4			
Densidad suelo seco	gr/cm^3	2.24	2.25	2.27	2.28			
Densidad máxima de laboratorio	gr/cm^3	2.24	2.24	2.24	2.24			
Peso humedo de material > 3/4	gr	258	323	205	305			
Peso seco sobretamaños	gr	252.9	316.7	201.0	299.0			
Peso material fino humedo	gr	1850	2048	1619	1792			
Peso material fino seco	gr	1774.7	1979.2	1544.3	1716.2			
Peso total de la muestra seca	gr	2027.7	2295.8	1745.3	2015.2			
Densidad del suelo	gr/cm^3	2.25	2.26	2.28	2.29			
Porcentaje sobretamaños	%	12.5	13.8	11.5	14.8			
Porcentaje de particulas finas	%	87.5	86.2	88.5	85.2			
Densidad bulk sobretamaños	gr/cm^3	2.62	2.62	2.62	2.62			
Densidad correjida	gr/cm^3	2.28	2.29	2.278	2.290			
Volumen del material > 3/4	cm^3	98.4	123.1	78.2	116.3			
Porcentaje de compactacion	%	98.6	98.8	99.9	100.1			

OBSERVACIONES: Vereda Vanegas.

LABORATORISTA

INGENIERO

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y GRANULOMETRÍA DE LOS MATERIALES
INV E-213


EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso. Departamento de Boyaca. Programa colombia rural nacional.		
Fecha:	Diciembre 11 de 2023		
Descripcion de la muestra:	Material granular de trituracion de calizas para **base.**		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña	Obra:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas.	Procedencia material:	Planta de trituracion E.V.M.

GRANULOMETRÍA

Peso total muestra seca. gr	6144

Tamiz	Apertura (mm)	Peso retenido	% Retenido individual	% que pasa	norma BG-38	
					Min	Max
2"	50.8	0	0.0	100.0	100	100
1 1/2"	37.5	43.5	0.7	99.3	100	100
1	25.4	823.0	13.4	85.9	70	100
3/4"	19	711.5	11.6	74.3	60	90
3/8"	9.5	891.5	14.5	59.8	45	75
4	4.75	926.5	15.1	44.7	30	60
10	2	617.5	10.1	34.7	20	45
40	0.425	565.0	9.2	25.5	10	30
200	0.075	878.5	14.3	11.2	5	15

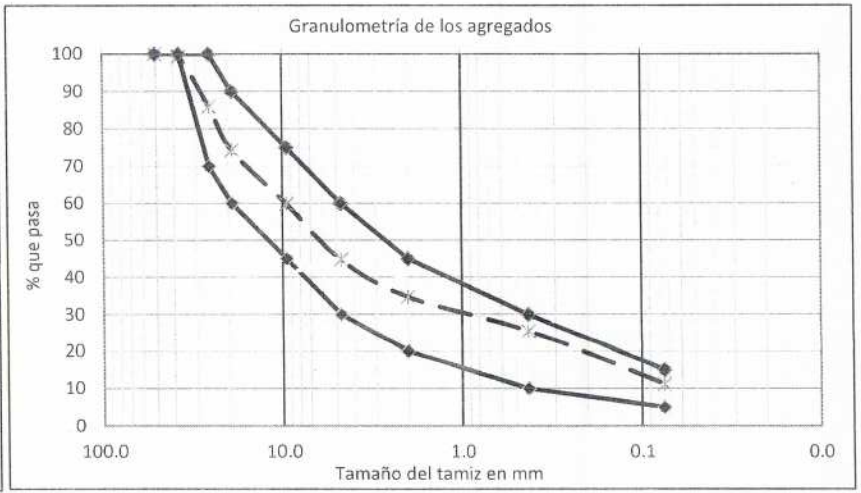

Laboratorista


Ingeniero

INDICE DE PLASTICIDAD


EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos

PROYECTO:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del minicipio de Sogamoso.	
FECHA :	Diciembre 12 de 2023	
DESCRIPCION DE LA MUESTRA:	Material granular de trituracion de caliza para base.	
PROCEDENCIA MATERIAL:	Planta de trituracion E.V.M.	Via vereda Vanegas.

Descripción	Limite líquido			Límite Plástico		
Número de golpes	22	27	30			
Número de cápsula	17	14	6	1	29	
Peso suelo húmedo + Cap. (g)	37.56	36.89	35.84	28.48	27.73	
Suelo seco + Cap. (g)	33.12	32.63	31.78	25.75	25.02	
Peso cápsula (g)	11.45	11.28	11.09	11.12	11.18	
Contenido de humedad (%)	20.49	19.95	19.62	18.66	19.58	



CURVA DE FLUIDEZ



CARTA DE PLASTICIDAD

Limite liquido:	20.13
Limite Plastico:	19.12
Índice de plasticidad:	1.00

LABORATORISTA

INGENIERO

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS
INV E-133

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 14 de 2023		
Descripcion:	Material granular de trituracion de calizas para **base**.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña	Muestra tomada en:	Via vereda vanegas
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

Prueba N°			Probeta N° 1	Probeta N° 2	Probeta N° 3	OBSERVACIONES
Lectura de arcilla	mm	(1)	261	263	260	
Lectura de arena	mm	(2)	77.0	80	81	
Equivalente de arena	%	(2) / (1)	29.5	30.4	31.2	
Promedio	%		31.0			

Laboratorista

Ingeniero

ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
INV E-218 y 219

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 15 de 2023		
Descripcion de la muestra:	Material granular de trituracion de calizas para **base** granular.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña C.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material :	Planta E.V.M.

PRUEBAS

MUESTRA N°	1	1	3	3
N° Revoluciones	500	100		
Descripción	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR		
Procedencia material	Planta	Planta		
Gradación usada	A	A		
N° Esferas	12	12		
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (g)	5000	5000		
Pb = Peso muestra seca después del ensayo.	3488	4833		
Diferencia = Pa - Pb	1512	167		
Desgaste (%)	30.2	3.3		

OBSERVACIONES

DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA, Y REVOLUCIONES

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)								
Pasa	Retenido	A	B	C	D	E			F	G
3"	2-1/2"					2500				
2-1/2"	2"					2500				
2"	1-1/2"					5000			5000	5000
1-1/2"	1"	1250							5000	5000
1"	3/4 "	1250								
3/4 "	1/2"	1250	2500							
1/2"	3/8 "	1250	2500							
3/8 "	1/4"			2500						
1/4"	No. 4			2500						
No. 4	No. 8				5000					
N° esferas		12	11	8	6	12			12	12
N° revoluciones		500	500	500	500	1000			1000	1000

Laboratorista

Ingeniero

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL -INV E-238

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 15 de 2023		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña C.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

CARACTERÍSTICAS	1	2	3
Descripción de la muestra	*BASE GRANULAR*		
Procedencia del material	*Planta E.V.M.*		
Gradación usada	*19mm*		
Peso de las esferas (gr)	*500*		
N° Revoluciones por minuto (RPM)	*100*		
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (gr)	*1501*		
Pb = Peso muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre tamiz N° 4 y N° 16	*1128*		
Diferencia = Pa – Pb	373		
Desgaste (%)	24.9		

OBSERVACIONES

DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)			Tiempo indicado según gradación		
Pasa	Retenido	Gradación 19 mm	Gradación 12,5 mm	Gradación 9.5 mm	Tipo de gradación	Tiempo de rotacion (min)	N° revoluciones
19.1 mm	16.0 mm	375			Gradación 19 mm	120 ± 1	12000 ± 100
16.0 mm	12.5 mm	375					
12.0 mm	9.5 mm	750					
12.5 mm	9.5 mm		750		Gradación 16 mm	105 ± 1	10500 ± 100
9.5 mm	6.3 mm		375				
6.3 mm	4.75 mm		375				
9.5 mm	6.3 mm			750	Gradación 12.5 mm	95 ± 1	9500 ± 100
6.3 mm	4.75 mm			750			
Peso de esferas		5000.1 gr	5000.1 gr	5000.1 gr			
N° revoluciones		100 rpm	100 rpm	100 rpm			

Laboratorista


Ingeniero

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
INV E-141 Y 142

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 18 de 2023	Contratista:	Municipio de Sogamoso.
Descripcion de la muestra:	Material granular de trituracion para **base.**		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

ENSAYO DE PROCTOR	Unidad	1	2	3	4	5
Peso de la muestra húmeda y molde	g	7566	7806	7877	7813	
Peso del molde	g	2852	2852	2852	2852	
Peso de la muestra húmeda	g	4714	4954	5025	4961	
Peso de la muestra seca	g	4565.2	4727.3	4749.2	4650.0	
Volumen del molde	cm3	2123	2123	2123	2123	
Densidad de la muestra seca	g/cm3	**2.150**	**2.227**	**2.237**	**2.190**	
Recipiente N°		21	14	4	10	
Peso muestra húmeda + recipiente	g	437.5	402.5	377.1	349.0	
Peso muestra seca + recipiente	g	425.4	386.4	359.3	330.4	
Peso agua	g	12.1	16.1	17.8	18.6	
Peso recipiente	g	54.2	50.6	52.8	52.3	
Peso muestra seca	g	371.2	335.8	306.5	278.1	
Humedad natural	%	3.3	4.8	5.8	6.7	
Humedad promedio	%	**3.3**	**4.8**	**5.8**	6.7	

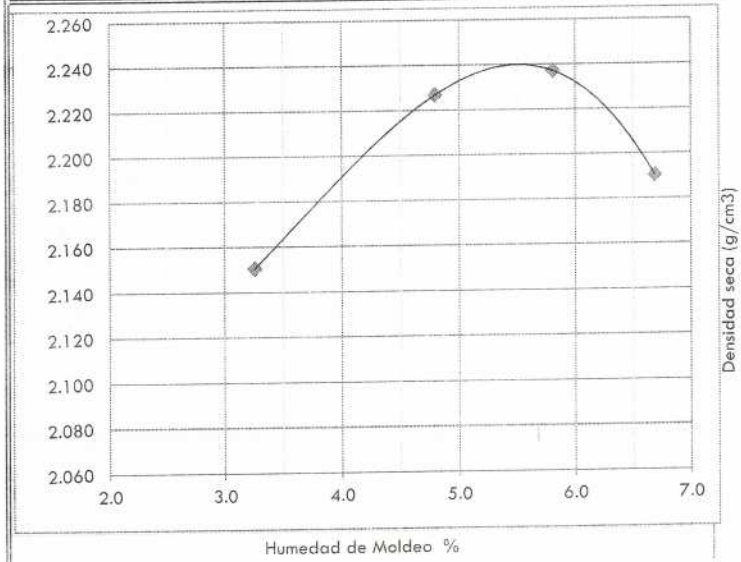

Densidad máxima	g/cm3	**2.240**
Humedad óptima	%	**5.5**

Laboratorista

Ingeniero

ENSAYO DE SOLIDEZ SANIDAD DE AGREGADOS

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 16 de 2023		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña C.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

A. AGREGADO GRUESO

Tamiz		Graducación Original	Peso de la muestra			Pérdida			PERDIDA PONDERADA
Pasa	Retenido		Antes del ensayo		Después del ensayo	Individual		Corregida	
		(%)	gr	%	gr	gr	%	%	
1.1/2"	1"	13.4	301.5	100	277.5	24	8.0	1.07	1.95
1"	3/4"	11.6	881.5	100.0	773.0	108.5	12.3	1.43	2.62
3/4"	3/8"	14.5	1,410.0	100.0	1266.5	143.5	10.2	1.48	2.70
3/8"	N°4	15.1	1,200.5	100.0	1094.0	106.5	8.9	1.34	2.45
Totales		54.6						5.31	7.77

B. AGREGADO FINO

Tamiz		Gradación Original	Peso de la muestra			Pérdida			PERDIDA PONDERADA
Pasa	Retenido		Antes del ensayo		Después del ensayo	Individual		Corregida	
		(%)	gr	%	gr	gr	%	%	

Solucion: Sulfato de Sodio.

Ciclos	Iniciación	I	II	III	IV	V
Fecha	11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023
Hora	7.0 am	7.0 am	7.0 am	7.0 am	7.0 am	7.0 am

Laboratorista

Ingeniero

CARAS FRACTURADAS Y APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 13 de 2023		
Descripcion:	Material granular de trituracion de calizas parab **base**.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

GRANULOMETRIA				CARAS FRACTURADAS		PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS				
Apertura (mm)	% Retenido individual	% Retenido acumulado	% Pasa acumulado	1 cara	2 caras	% Retenido individual	% Aplanadas pasa	% partículas aplanadas	% Alargadas retenida	% partículas alargadas
				%	%					
50.8	0.0	0.0	100.0							
38.1	0.7	0.7	99.3	100%	100%	0.7	19.5	13.8	16.1	11.4
25.4	13.4	14.1	85.9	100%	100%	13.4	21.5	288.1	19.7	263.7
19.1	11.6	25.7	74.3	100%	100%	11.6	19.5	226.2	18.3	211.6
12.5	14.5	40.2	59.8	100%	100%	14.5	19.2	278.3	17.6	255.5
9.53	15.1	55.3	44.7	100%	100%	15.1	22.7	341.8	20.4	307.6
				100%	100.0%	55.3	102.4	1148.3	18.4	1049.8

Características generales	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad
1 Cara fracturada	**100%**	75%	-	%
2 Caras fracturadas	**100%**	75%	-	%
Índice aplanamiento	**21%**	-	35%	%
Índice alargamiento	**19%**	-	35%	%
MUS suelta				
MUC compacta				

Laboratorista

Ingeniero

CARAS FRACTURADAS Y APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 13 de 2023		
Descripcion:	Material granular de trituracion de calizas parab **base.**		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña	Muestra toma da en:	Via vereda Vanegas
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

Peso suelo seco si lavar (g)	6144								
Tamiz (pulg y mm)	Peso retenido (g)	Caras Fracturadas (g) 1 CARA			Caras Fracturadas (g) 2 CARAS			Aplanamiento y Alargamiento		
		Fracturadas	Redondas	Dudosas	Fracturadas	Redondas	Dudosas	Peso muestra (g)	Aplanadas pasa (g)	Alargadas retenida (g)
2"	0									
1 1/2"	43.5	43.5	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0	43.5	8.5	7
1"	823	823.0	0.0	0.0	823.0	0.0	0.0	823.0	177.0	162.0
3/4"	711.5	711.5	0.0	0.0	711.5	0.0	0.0	711.5	139.0	130.0
3/8"	891.5	891.5	0.0	0.0	891.5	0.0	0.0	891.5	171.0	157.0
N°. 4	926.5	926.5	0.0	0.0	926.5	0.0	0.0	926.5	210.0	189.0

MASAS UNITARIAS	A	B	C		PESOS P (g)	
Peso unitario suelto MUS (g)					P grava SSS	
Peso unitario compacto MUC (g)					P canasta sumergida	
Volumen recipiente (cm3)					P seco grava + tara	
Peso recipiente (g)					P canasta + grava sumergida	
Masa unitaria suelta MUS (g/cm3)					P muestra antes ensayo	
Masa unitaria compacta MUC (g/cm3)					P muestra despues ensayo	

Laboratorista


Ingeniero

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
INV E-141 Y 142

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales del municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Noviembre 22 de 2023	Contratista:	municipio de sogamoso
Descripcion:	Material granular de trituracion para **Sub- base.**		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia maìerial:	Planta E.V.M

ENSAYO DE PROCTOR	Unidad	1	2	3	4	
Peso de la muestra húmeda + molde	g	7593	7766	7841	7837	
Peso del molde	g	2852	2852	2852	2852	
Peso de la muestra húmeda	g	4741	4914	4989	4985	
Peso de la muestra seca	g	4583	4695	4705	4651	
Volumen del molde	cm3	2123.1	2123.1	2123.1	2123.1	
Densidad de la muestra seca	g/cm3	**2.159**	**2.211**	**2.216**	**2.191**	
Recipiente N°		2	7	5	11	
Peso muestra húmeda + recipiente	g	267.3	294.1	276.3	254.2	
Peso muestra seca + recipiente	g	260.2	283.3	263.5	240.7	
Peso agua	g	7.1	10.8	12.8	13.5	
Peso recipiente	g	53.7	52.2	51.8	52.7	
Peso muestra seca	g	206.5	231.1	211.7	188.0	
Contenido de humedad	%	3.4	4.7	6.0	7.2	
Humedad Promedio	%	**3.4**	**4.7**	**6.0**	**7.2**	

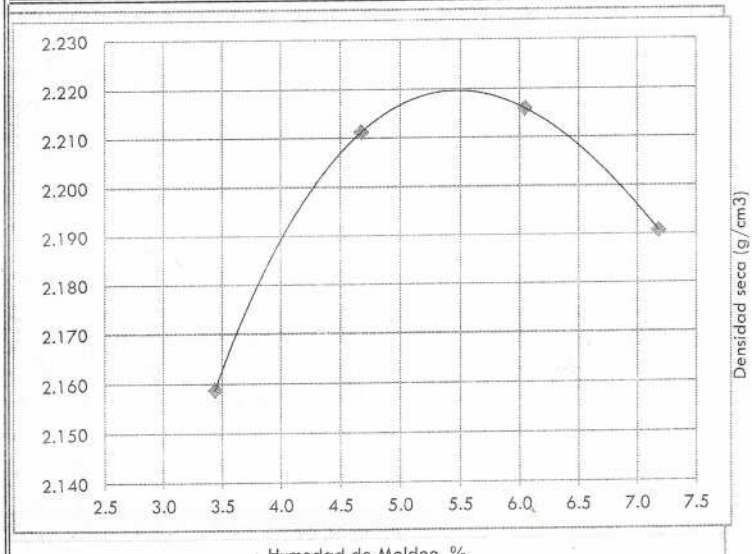

CLASIFICACIÓN		
L.L.	%	
L.P.	%	
I.P.		
Pasa N° 200	%	
A.A.S.H.T.O.		
U.S.C.		
Índice de grupo		
Densidad máxima	g/cm3	**2.22**
Humedad óptima	%	**5.5**

Laboratorista

Ingeniero

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y GRANULOMETRÍA DE LOS MATERIALES
INV E-213

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de sogamoso.		
Fecha:	Noviembre 29 de 2023	Contratista:	Municipio de Sogamoso
Descripcion de la muestra	Material granular para **sub- base.**		
Laboratorista	Jose Jacinto montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero	Cristian Camilo Plazas.	Procedencia material	Planta E.V.M.


CARACTERÍSTICAS GENERALES	UNIDAD	VALOR	ESPECIFICACIÓN
	%		
	%		
	%		
	gr/cm3		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		
	%		

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA

Peso total muestra (gr)	5977

Tamiz	Apertura (mm)	Peso retenido	% Retenido individual	% que pasa	norma BG-38	
					Min	Max
2"	50.8	36	0.6	100.0	100	100
1 1/2"	37.5	569.5	9.5	90.5	70	95
1	25.4	811.0	13.6	76.9	60	90
1/2"	12.5	997.5	16.7	60.2	45	75
3/8"	9.5	885.0	14.8	45.4	40	70
4	4.75	708.0	11.8	33.6	25	55
10	2	672.0	11.2	22.3	15	40
40	0.425	516.0	8.6	13.7	6	25
200	0.075	423.0	7.1	6.6	2	15

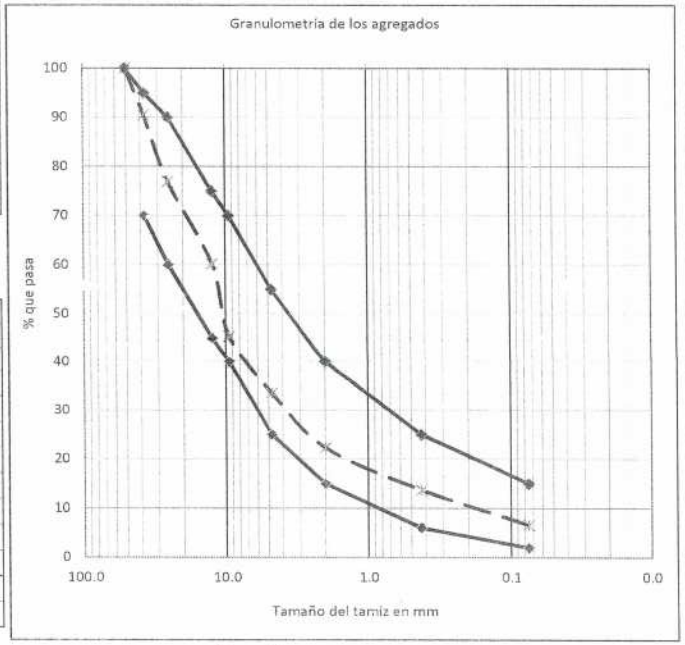

Laboratorista

Ingeniero

LIMITES DE ATTERBERG
INV E-125 y 126

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Noviembre 30 de 2023	Contratista:	Municipio de Sogamoso.
Descripcion de la	Material granular para **sub- base**.		
Laboratorista	Jose Jacinto montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero	Cristian camilo Plazas	Procedencia material :	Planta E.V.M.


LÍMITE LÍQUIDO

Determinación N°	1	2	3
Recipiente N°	22	85	190
P. Recipiente + Suelo húmedo (g)	24.84	22.61	23
P. Recipiente + Suelo seco (g)	21.56	19.77	20.07
P. Recipiente (g)	5.47	6.3	6.49
P. Suelo seco	3.28	2.84	2.93
P. Agua (g)	16.09	13.47	13.58
% Humedad	20.39	21.08	21.58
N° Golpes, N	32	24	20

LÍMITE PLÁSTICO

Determinación N°	1	2
Recipiente N°	7	4
P. Recipiente + Suelo húmedo (g)	31.99	28.44
P. Recipiente + Suelo seco (g)	29.95	26.19
P. Recipiente (g)	17.69	12.93
P. Suelo seco	2.04	2.25
P. Agua (g)	12.26	13.26
% Humedad	16.64	16.97

Límite líquido	%	20.99
Límite plástico	%	16.80
Índice de plasticidad		4.19
Humedad natural	%	
Clasificación		
Grupo		

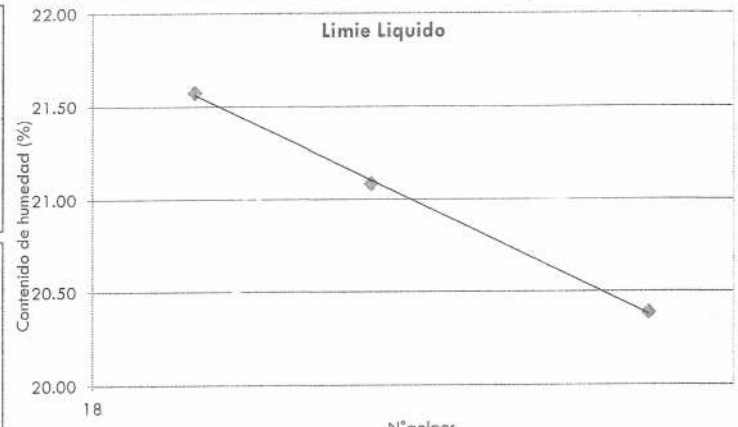

OBSERVACIONES

Laboratorista

Ingeniero

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS
INV E-133

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Noviembre 29 de 2023.	Contratista:	Municipio de Sogamoso.
Descripcion:	Material granular para **sub- base**.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

Prueba N°			Probeta N° 1	Probeta N° 2	Probeta N° 3	OBSERVACIONES
Lectura de arcilla	pulg	(1)	275	271	278	
Lectura de arena	pulg	(2)	73.0	72	76	
Equivalente de arena	%	(2) / (1)	26.5	26.6	27.3	
Promedio	%		27.0			

Laboratorista

Ingeniero

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL -INV E-238

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 04 de 2023	Contratista:	Municipio de Sogamoso.
Descripcion:	Material granular de trituracion para **sub- base**.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas.	Procedencia material:	Planta E.V.M

CARACTERÍSTICAS	1	2	3
Descripción de la muestra	*Sub- base.*		
Procedencia del material	*Acopio planta*		
Gradación usada	*19mm*		
Peso de las esferas (gr)	*5000*		
N° Revoluciones por minuto (RPM)	*100*		
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (gr)	*1500*		
Pb = Peso muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre tamíz N° 4 y N° 16	*1123*		
Diferencia = Pa – Pb	*377*		
Desgaste (%)	25.1		

OBSERVACIONES

ESPECIFICACION INVIAS 2013

DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)			Tiempo indicado según gradación		
Pasa	Retenido	Gradación 19 mm	Gradación 12,5 mm	Gradación 9.5 mm	Tipo de gradación	Tiempo de rotacion (min)	N° revoluciones
19.1 mm	16.0 mm	375			Gradación 19 mm	120 ± 1	12000 ± 100
16.0 mm	12.5 mm	375					
12.0 mm	9.5 mm	750					
12.5 mm	9.5 mm		750		Gradación 16 mm	105 ± 1	10500 ± 100
9.5 mm	6.3 mm		375				
6.3 mm	4.75 mm		375				
9.5 mm	6.3 mm			750	Gradación 12.5 mm	95 ± 1	9500 ± 100
6.3 mm	4.75 mm			750			
Peso de esferas		5000.1 gr	5000.1 gr	5000.1 gr			
N° revoluciones		100 rpm	100 rpm	100 rpm			

Laboratorista

Ingeniero

ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
INV E-218 y 219

EVM Construcciones y Pavimentos

Proyecto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vias rurales en el municipio de Sogamoso.		
Fecha:	Diciembre 01 de 2023	Contratista:	Municipio de Sogamoso
Descripcion:	Material granular para **sub- base**.		
Laboratorista:	Jose Jacinto Montaña.	Muestra tomada en:	Via vereda Vanegas.
Ingeniero:	Cristian Camilo Plazas	Procedencia material:	Planta E.V.M.

PRUEBAS

MUESTRA N°	1
N° Revoluciones	500
Descripción	Sub- base
Procedencia material	PLANTA E.V.M
Gradación usada	A
N° Esferas	12
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (g)	5000
Pb = Peso muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre tamiz N° 12	3456
Diferencia = Pa - Pb	1544
Desgaste (%)	30.9

OBSERVACIONES

DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA, Y REVOLUCIONES

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	E	F	G
3"	2-1/2"					2500		
2-1/2"	2"					2500		
2"	1-1/2"					5000	5000	5000
1-1/2"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4 "	1250						
3/4 "	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8 "	1250	2500					
3/8 "	1/4"			2500				
1/4"	No. 4			2500				
No. 4	No. 8				5000			
N° esferas		12	11	8	6	12	12	12
N° revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

Laboratorista

Ingeniero

PLANILLAS DE APORTES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolomi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:			BOYACA
DIRECCIÓN:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	7707177
TIPO APORTANTE:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7909156879	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACION:			365789440

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.432.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.500	$ 0	$ 1.432.100	$ 19.500	$ 1.451.600
230301	230301-PORVENIR	27	$ 6.769.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.100	$ 0	$ 6.769.500	$ 92.100	$ 6.861.600
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.084.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 0	$ 1.084.800	$ 14.800	$ 1.099.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 3.990.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300	$ 0	$ 3.990.400	$ 54.300	$ 4.044.700
SUBTOTALES:										**$ 13.276.800**	**$ 180.700**	**$ 13.457.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 170.000	$ 2.400	$ 0	$ 172.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 0	$ 300	$ 0	$ 16.800	$ 300	$ 0	$ 17.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.500	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 193.500	$ 2.700	$ 0	$ 196.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 742.200	$ 0	$ 10.100	$ 0	$ 742.200	$ 10.100	$ 0	$ 752.300
EPS006	EPS006-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.500	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 88.500	$ 1.300	$ 0	$ 89.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	31		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.224.900	$ 0	$ 30.300	$ 0	$ 2.224.900	$ 30.300	$ 0	$ 2.255.200
SUBTOTALES:													**$ 3.435.900**	**$ 47.100**	**$ 0**	**$ 3.483.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	49		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.886.800	$ 5.886.800	$ 80.100	$ 0	$ 5.966.900
SUBTOTALES:									**$ 5.886.800**	**$ 80.100**	**$ 0**	**$ 5.966.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	49	$ 3.440.600	$ 46.800	$ 3.487.400
SUBTOTALES:			**$ 3.440.600**	**$ 46.800**	**$ 3.487.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENE

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7909156879	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			14		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	365789440

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DIAS | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DIAS COT | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENE

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7787177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7909156879		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			365789449

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
											PENSIÓN							SALUD						ARP												CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC 1057578168	TRIANA VARGAS EMMA SOFIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	28	$ 1.092.000	$ 174.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.800	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.092.000	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.092.000		$ 76.100	28	$ 1.092.000	$CCF10-COMFABOY	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1057582664	FIGUEREDO RIVEROS MILTON ANDRES	DEPEND		$ 1.884.850	VARIABLE			SI	01-30	230301-PORVENIR	30	$ 1.884.850	$ 301.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.884.850	$ 75.400	$ 0	$ 75.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.884.850		$ 131.200	30	$ 1.884.850	$CCF10-COMFABOY	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1057590086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.859.394	FIJO			SI		230201-PROTECCION	29	$ 1.797.415	$ 287.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.600	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.797.415	$ 71.900	$ 0	$ 71.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.797.415		$ 125.200	29	$ 1.797.415	$CCF10-COMFABOY	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1057590086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.859.394	FIJO			SI		230201-PROTECCION	1	$ 61.980	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 61.980	$ 2.500	$ 0	$ 2.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 61.980		$ 0	1	$ 61.980	$CCF10-COMFABOY	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1057580832	CORBITA ALVAREZ JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.912.032	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.912.032	$ 306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.912.032	$ 76.500	$ 0	$ 76.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.912.032		$ 133.100	30	$ 1.912.032	$CCF10-COMFABOY	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1057584779	SOLORZANO RAMIREZ FELIPE	DEPEND		$ 2.210.700	VARIABLE			SI	01-30	230301-PORVENIR	30	$ 2.210.700	$ 353.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.210.700	$ 88.500	$ 0	$ 88.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.210.700		$ 153.900	30	$ 2.210.700	$CCF10-COMFABOY	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1057586366	PLAZAS TAPIAS CRISTHIAN CAMILO	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI	26-30	230301-PORVENIR	2	$ 226.667	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.300	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 226.667	$ 9.100	$ 0	$ 9.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 226.667	1	$ 0	2	$ 226.667	$CCF10-COMFABOY	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1057586366	PLAZAS TAPIAS CRISTHIAN CAMILO	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	28	$ 3.173.334	$ 507.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 507.800	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 3.173.334	$ 127.000	$ 0	$ 127.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 3.173.334		$ 220.900	28	$ 3.173.334	$CCF10-COMFABOY	$ 127.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1057604014	CORREO ZEA SERGIO YESID	DEPEND		$ 1.659.394	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.659.394	$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.659.394	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.659.394		$ 115.500	30	$ 1.659.394	$CCF10-COMFABOY	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1057604233	MOLANO LOPEZ DAVID HERNANDO	DEPEND		$ 1.232.099	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.232.099	$ 197.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.232.099	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.232.099		$ 85.800	30	$ 1.232.099	$CCF10-COMFABOY	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1057605266	VARGAS RIOS CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1083884835	MANTILLA PALENCIA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.927.731	$ 308.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.927.731	$ 77.200	$ 0	$ 77.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.927.731		$ 134.200	30	$ 1.927.731	$CCF10-COMFABOY	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1120564	ROJAS BOADA CARLOS EDGN	DEPEND		$ 1.620.000	FIJO			SI		230201-PROTECCION	30	$ 1.620.000	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.620.000	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.620.000		$ 112.800	30	$ 1.620.000	$CCF10-COMFABOY	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 4137643	MARTINEZ ARIAS RAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI		26-14 COTENSIONES	30	$ 4.282.909	$ 685.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 685.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.282.909	$ 171.400	$ 0	$ 171.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.282.909		$ 298.100	30	$ 4.282.909	$CCF10-COMFABOY	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7797177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7909156879	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO		2023
DÍAS DE MORA:		14					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				365789440

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
35	CC 46373875	BENAVIDES VASQUEZ ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.350.139	$ 376.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.350.139	$ 94.100	$ 0	$ 94.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.350.139		$ 163.900	30	$ 2.350.139	SCCF10-COMFABOY	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 46375436	RUIZ FONSECA ANA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 9870865	MACIETO ASTERIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 7218548	BENITEZ MELO JOSE DEL CARMEN	DEPEND	NO GRUNO COT PENSIONADO	$ 1.160.000	VARIABLE			SI								01-30										30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 7489648	BOHORQUEZ PERALTA JOSE ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 7486116	MESA BAYONA JAVIER ALONSO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.549.598	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.549.598	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.549.598		$ 107.900	30	$ 1.549.598	SCCF10-COMFABOY	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 7486318	TUNARROSA MOLINA OSCAR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.537.710	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.537.710	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.537.710		$ 107.100	30	$ 1.537.710	SCCF10-COMFABOY	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 7481123	VARGAS PEREZ JOSELYN	DEPEND		$ 2.176.050	VARIABLE			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.176.050	$ 348.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.176.050	$ 87.100	$ 0	$ 87.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.176.050		$ 151.900	30	$ 2.176.050	SCCF10-COMFABOY	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 7482754	GONZALEZ MARTINEZ IVAN	DEPEND		$ 1.589.255	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.589.255	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.589.255	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.589.255		$ 110.700	30	$ 1.589.255	SCCF10-COMFABOY	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 7483444	MESA PALACIOS JAIME	DEPEND		$ 2.528.500	VARIABLE			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.528.500	$ 657.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 657.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.528.500	$ 101.200	$ 0	$ 101.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.528.500		$ 176.900	30	$ 2.528.500	SCCF10-COMFABOY	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 7484261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 74187796	GUTIERREZ VALERO CARLOS EBINEDER	DEPEND		$ 2.780.005	VARIABLE			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.780.005	$ 446.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 446.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.780.005	$ 111.600	$ 0	$ 111.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.780.005		$ 194.200	30	$ 2.780.005	SCCF10-COMFABOY	$ 111.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 74188284	TIBADUIZA POLGUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.689.310	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.689.310	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.689.310	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.689.310		$ 119.300	30	$ 1.689.310	SCCF10-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 7845278	FONSECA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	INGRESO SUSTITUTIVO SALUDS	$ 3.417.674	FIJO			SI																		30	$ 3.417.674	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 136.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.417.674	$ 136.600	$ 0	$ 136.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.417.674		$ 237.900	30	$ 3.417.674	SCCF10-COMFABOY	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: NOBSA
DIRECCION: KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR
TIPO EMPRESA: PRIVADA
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 826002051
PAVIBOY LTDA
DEPARTAMENTO: BOYACA
TELÉFONO: 7797177
CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricación de productos de la refinación del pet
SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - SOGAMOSO
SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 79009156879
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA: 14
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/28
TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION SALUD: MES diciembre AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACION: 365786440

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7909156879	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			365789440

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL												SALUD						ARP				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN																																	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
63	CC 9520748	GUEVARA CASTRO HUGO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														I-25-26			25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667	1	$ 0	1	$ 38.667	CCF10-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 9531069	CUTIERREZ LUIS HERNAN	DEPEND		$ 2.038.459	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.038.459	$ 326.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.038.459	$ 81.600	$ 0	$ 81.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.038.459		$ 141.800	30	$ 2.038.459	CCF10-COMFABOY	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 26.394.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN[illegible]

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	a26002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7905410746	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		285154855

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.124.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 0	$ 1.124.700	$ 10.100	$ 1.134.800
230301	230301-PORVENIR	25	$ 6.409.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.200	$ 0	$ 6.409.800	$ 57.200	$ 6.467.000
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.070.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 1.070.900	$ 9.600	$ 1.080.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 3.572.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.900	$ 0	$ 3.572.200	$ 31.900	$ 3.604.100
SUBTOTALES:										**$ 12.177.600**	**$ 109.800**	**$ 12.286.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.800	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 136.800	$ 1.300	$ 0	$ 136.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	31		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.210.800	$ 0	$ 19.800	$ 0	$ 2.210.800	$ 19.800	$ 0	$ 2.230.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 718.900	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 718.900	$ 6.500	$ 0	$ 725.400
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 170.000	$ 1.600	$ 0	$ 171.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 79.500	$ 800	$ 0	$ 80.300
SUBTOTALES:													**$ 3.316.000**	**$ 30.000**	**$ 0**	**$ 3.346.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	48		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.696.400	$ 5.696.400	$ 50.900	$ 0	$ 5.747.300
SUBTOTALES:									**$ 5.696.400**	**$ 50.900**	**$ 0**	**$ 5.747.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	48	$ 3.316.000	$ 29.600	$ 3.345.600
SUBTOTALES:			**$ 3.316.000**	**$ 29.600**	**$ 3.345.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN (FSP: SUBSISTENCIA, SOLIDARIDAD; APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR, EMPLEADO; INDICADOR TARIFA ESPECIAL; TOTAL APORTE) | SALUD (VALOR ADRES; TOTAL APORTE) | ARP (CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE) | PARAFISCALES (CCF: ADMIN, TOTAL APORTE; SENA: TOTAL APORTE; ICBF: TOTAL APORTE; ESAP: TOTAL APORTE; MINEDU: TOTAL APORTE)

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DUN | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 820062051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO: NOBSA DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN: KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO TELÉFONO: 7707177
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7905410746 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES octubre AÑO 2023 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/11/24 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 265154855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	828002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7905410746			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			295154855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
21	CC 1057590086	ROJAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.859.394	FIJO			SI																	
22	CC 1057590932	COMBITA ALVAREZ JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.912.032	FIJO			SI																	
23	CC 1057564779	SOLER RICO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.987.260	VARIABLE			SI								01-30									
24	CC 1057596566	PLAZAS TAPIAS CRISTHIAN CAMILO	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																	
25	CC 1057604014	ZORRO ZEA SERGIO YESID	DEPEND		$ 1.659.394	FIJO			SI																	
26	CC 1057604339	MOLANO LOPEZ DAVID HERNANDO	DEPEND		$ 1.232.099	FIJO			SI																	
27	CC 1057605266	VARGAS RIOS CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
28	CC 1065884830	BAUTISTA PALENCIA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.927.731	FIJO			SI																	
29	CC 1120544	ROJAS ROJAS CARLOS EDEN	DEPEND		$ 1.620.000	FIJO			SI																	
30	CC 4137643	MARTINEZ ARIAS SAUL	DEPEND		$ 4.282.909	FIJO			SI																	
31	CC 46360195	RODRIGUEZ ORDUZ ESTHELDE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.431.920	FIJO			SI																	
32	CC 46373875	BERMUDEZ VASQUEZ ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO			SI																	
33	CC 46375436	RUIZ FONSECA ANA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
34	CC 46375436	RUIZ FONSECA ANA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	13-16

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
21	230201-PROTECCION	30	$ 1.859.394	$ 297.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.859.394	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.859.394		$ 129.500	30	$ 1.859.394	CCF10-COMFABOY	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	230301-PORVENIR	30	$ 1.912.032	$ 306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.912.032	$ 76.500	$ 0	$ 76.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.912.032		$ 133.100	30	$ 1.912.032	CCF10-COMFABOY	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	230301-PORVENIR	30	$ 1.987.260	$ 318.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 318.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.987.260	$ 79.500	$ 0	$ 79.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.987.260	1	$ 138.400	30	$ 1.987.260	CCF10-COMFABOY	$ 79.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	230301-PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000	1	$ 236.700	30	$ 3.400.000	CCF10-COMFABOY	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	230301-PORVENIR	30	$ 1.659.394	$ 265.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.659.394	$ 66.400	$ 0	$ 66.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.659.394		$ 115.500	30	$ 1.659.394	CCF10-COMFABOY	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	230301-PORVENIR	30	$ 1.232.099	$ 197.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.232.099	$ 49.300	$ 0	$ 49.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.232.099		$ 85.800	30	$ 1.232.099	CCF10-COMFABOY	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	230301-PORVENIR	30	$ 1.927.731	$ 308.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.927.731	$ 77.200	$ 0	$ 77.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.927.731		$ 134.200	30	$ 1.927.731	CCF10-COMFABOY	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	230201-PROTECCION	30	$ 1.620.000	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.620.000	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.620.000		$ 112.800	30	$ 1.620.000	CCF10-COMFABOY	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.282.909	$ 685.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 685.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.282.909	$ 171.400	$ 0	$ 171.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.282.909		$ 298.100	30	$ 4.282.909	CCF10-COMFABOY	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.431.920	$ 57.300	$ 0	$ 57.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.431.920		$ 99.700	30	$ 1.431.920	CCF10-COMFABOY	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	230201-PROTECCION	30	$ 2.350.139	$ 376.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.350.139	$ 94.100	$ 0	$ 94.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.350.139		$ 163.600	30	$ 2.350.139	CCF10-COMFABOY	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF10-COMFABOY	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	230301-PORVENIR	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 77.334		$ 0	2	$ 77.334	CCF10-COMFABOY	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820082051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NOBSA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELEFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7905410746	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		285154855

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA PENSIONAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN					SALUD						ARP				PARAFISCALES						
																												FSP																					
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT.	IBC	GCF ADMIN	GCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
35	CC 5870365	SAMACOTO ASTERIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 7216546	BENITEZ MELO JOSE DEL CARMEN	DEPEND	NO OBLIG LOT PENSIONES	$ 1.900.250	VARIABLE			SI								01-30																																
																												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.250	$ 76.100	$ 0	$ 76.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.250	1	$ 132.300	30	$ 1.900.250	$CCF10-COMFABOY	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 7469048	BOHORQUEZ PERILLA JOSE ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 7486156	MESA BAYONA JAVIER ALONSO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.549.598	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.549.598	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.549.598		$ 107.800	30	$ 1.549.598	$CCF10-COMFABOY	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 7418038	TUNARROSA MOLINA OSCAR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.537.710	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.537.710	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.537.710		$ 107.100	30	$ 1.537.710	$CCF10-COMFABOY	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 74181123	VARGAS PEREZ JOSELYN	DEPEND		$ 2.089.250	VARIABLE			SI								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.089.250	$ 334.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.089.250	$ 83.600	$ 0	$ 83.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.089.250	1	$ 146.900	30	$ 2.089.250	$CCF10-COMFABOY	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 74182754	GONZALEZ MARTINEZ IVAN	DEPEND		$ 1.589.255	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.589.255	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.589.255	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.589.255		$ 110.700	30	$ 1.589.255	$CCF10-COMFABOY	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 74183444	MESA PALACIOS JAIME	DEPEND		$ 2.116.410	VARIABLE			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.116.410	$ 338.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 338.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.116.410	$ 84.700	$ 0	$ 84.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.116.410	1	$ 147.400	30	$ 2.116.410	$CCF10-COMFABOY	$ 84.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 74184261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 74187796	GUTIERREZ VALERO CARLOS EDWISDER	DEPEND		$ 2.280.350	VARIABLE			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.280.350	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.280.350	$ 91.300	$ 0	$ 91.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.280.350	1	$ 158.800	30	$ 2.280.350	$CCF10-COMFABOY	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 74188294	TIBAQUIRA ROQUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.699.310	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.699.310	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.699.310		$ 118.300	30	$ 1.699.310	$CCF10-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 79145278	PONGUEA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	AUSENTISMO SUSTITUCION SALDOS	$ 3.417.674	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.417.674	$ 136.800	$ 0	$ 136.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.417.674		$ 237.900	30	$ 3.417.674	$CCF10-COMFABOY	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 79106853	BENITEZ CAZA TEOFILO FRANCISCO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 79860161	ALEMAN ROJAS DIDIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.491.454	FIJO			SI														L-64-04			230301-PORVENIR	1	$ 49.782	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 49.782	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 49.782	1	$ 0	1	$ 49.782	$CCF10-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolom

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7767177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79054110746	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			295154855

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:			BOYACA
DIRECCIÓN:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	7707177
TIPO APORTANTE:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7901836390
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			18
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/30
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243137094

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.116.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 1.116.500	$ 20.800	$ 1.139.300
230301	230301-PORVENIR	25	$ 6.105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.500	$ 0	$ 6.105.300	$ 113.500	$ 6.218.800
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.072.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 0	$ 1.072.900	$ 20.000	$ 1.092.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 3.600.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.000	$ 0	$ 3.600.600	$ 67.000	$ 3.667.600
SUBTOTALES:										**$ 11.997.300**	**$ 221.300**	**$ 12.118.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	31		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.150.500	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 2.150.500	$ 40.000	$ 0	$ 2.190.500
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 170.000	$ 3.200	$ 0	$ 173.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.300	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 144.300	$ 2.700	$ 0	$ 147.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 701.400	$ 0	$ 13.100	$ 0	$ 701.400	$ 13.100	$ 0	$ 714.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.300	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 82.300	$ 1.800	$ 0	$ 83.900
SUBTOTALES:													**$ 3.248.500**	**$ 60.800**	**$ 0**	**$ 3.309.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	47		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.471.600	$ 5.471.600	$ 101.800	$ 0	$ 5.573.400
SUBTOTALES:									**$ 5.471.600**	**$ 101.800**	**$ 0**	**$ 5.573.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	47	$ 3.246.500	$ 60.400	$ 3.306.900
SUBTOTALES:			**$ 3.246.500**	**$ 60.400**	**$ 3.306.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1082385417	BANABRA GALINDO DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	05														
2	CC 1012322775	CARREÑO JIMENEZ MYCOL ESTIVEN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	27														
3	CC 1051589666	TUNARROSA AREZQUITA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI										01-02					
4	CC 1051589666	TUNARROSA AREZQUITA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI											L-13-15				
5	CC 1051589666	TUNARROSA AREZQUITA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI															
6	CC 1053302046	TORRES AGUDELO LAURA CAROLINA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI															

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	26	$ 1.005.334	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.900	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 40.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.005.334		$ 70.000	26	$ 1.005.334	CCF10-COMFABOY	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	4	$ 154.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.800	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 6.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 154.667		$ 10.800	4	$ 154.667	CCF10-COMFABOY	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	2	$ 88.379	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14.200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 88.379	$ 3.600	$ 0	$ 3.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 88.379		$ 0	2	$ 88.379	CCF10-COMFABOY	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	27	$ 1.193.112	$ 190.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.900	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.193.112	$ 47.800	$ 0	$ 47.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.193.112	168	$ 83.100	27	$ 1.193.112	CCF10-COMFABOY	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2023/10/31 12:33 PM USUARIO: SOI CC23433993

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:			BOYACA
DIRECCIÓN:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	7707177
TIPO APORTANTE:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7901836390	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			18		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	243137094

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	SEGURIDAD SOCIAL											SALUD							ARP				PARAFISCALES								
																												PENSIÓN																																						
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																				
																												SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE		DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																																		ADMIN																																
																																			DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
7	CC 1053513306	SUAREZ PEREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.509.394	FIJO			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.509.394	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.509.394	$ 60.400	$ 0	$ 60.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.509.394		$ 105.100	30	$ 1.509.394	CCF10-COMFABOY	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	CC 1053544625	RODRIGUEZ BARRERA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 1.679.394	FIJO			SI														L-09-09				231001-COLFONDOS	1	$ 55.980	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.980	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.980		$ 0	1	$ 55.980	CCF10-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	CC 1053544625	RODRIGUEZ BARRERA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 1.679.394	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	29	$ 1.623.415	$ 259.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.623.415	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.623.415		$ 113.000	29	$ 1.623.415	CCF10-COMFABOY	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	CC 1053569066	ALVAREZ CESAR FERNANDO	DEPEND		$ 1.277.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.277.000	$ 204.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.277.000	$ 51.100	$ 0	$ 51.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.277.000		$ 89.900	30	$ 1.277.000	CCF10-COMFABOY	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	CC 1053586173	ACEVEDO ALARCON DEBY MARCELA	DEPEND		$ 1.416.835	FIJO			SI														L-09-09				230301-PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.295	1	$ 0	1	$ 47.295	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	CC 1053586173	ACEVEDO ALARCON DEBY MARCELA	DEPEND		$ 1.416.835	FIJO			SI														L-23-23				230301-PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.295		$ 0	1	$ 47.295	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	CC 1053586173	ACEVEDO ALARCON DEBY MARCELA	DEPEND		$ 1.416.835	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	28	$ 1.324.246	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.324.246	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.324.246		$ 92.200	28	$ 1.324.246	CCF10-COMFABOY	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	CC 1053587725	ADAME LOPEZ DEISY MAYERLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.429.394	$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.429.394	$ 57.200	$ 0	$ 57.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.429.394		$ 99.500	30	$ 1.429.394	CCF10-COMFABOY	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	CC 1057574737	BENITEZ AMADO MAURICIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.373.264	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.373.264	$ 219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.373.264	$ 55.000	$ 0	$ 55.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.373.264		$ 95.600	30	$ 1.373.264	CCF10-COMFABOY	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	CC 1057576729	ALVAREZ ALVAREZ LILIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	CC 1057578166	TRIANA VARGAS DIANA SOFIA	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI														L-25-25				230301-PORVENIR	2	$ 84.000	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.500	EPS017-FAMISANAR	2	$ 84.000	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 84.000		$ 0	2	$ 84.000	CCF10-COMFABOY	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	CC 1057578166	TRIANA VARGAS DIANA SOFIA	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	28	$ 1.176.000	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.200	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.176.000	$ 47.100	$ 0	$ 47.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.176.000		$ 81.900	28	$ 1.176.000	CCF10-COMFABOY	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	CC 1057582684	ENRIQUEZ RIVEROS MILTON ANDRES	DEPEND		$ 1.939.800	VARIABLE			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.939.800	$ 310.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.939.800	$ 77.600	$ 0	$ 77.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.939.800		$ 135.100	30	$ 1.939.800	CCF10-COMFABOY	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
20	CC 1057580066	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.859.394	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.859.394	$ 297.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.859.394	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.859.394		$ 129.500	30	$ 1.859.394	CCF10-COMFABOY	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

2023/10/31 12:33 PM USUARIO: SOI CC2343893

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7767177
TIPO APORTANTE:	81-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7901836390	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES octubre AÑO		2023
DÍAS DE MORA:	18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243137094

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7787177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79018363 90	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243137094

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
35	CC 46373875	BENAVIDES VASQUEZ ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO		SI
36	CC 46373875	BENAVIDES VASQUEZ ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 2.350.139	FIJO		SI
37	CC 46375436	RUIZ FONSECA ANA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI
38	CC 5870865	MACETO ASTERIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI
39	CC 5870865	MACETO ASTERIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI
40	CC 7218546	BENITEZ MELO JOSE DEL CARMEN	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIÓN	$ 1.963.075	VARIABLE		SI
41	CC 74861438	BOHORQUEZ PERILLA JOSE ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI
42	CC 74861156	MESA BAYONA JAVIER ALONSO	DEPEND		$ 1.549.598	FIJO		SI
43	CC 74160318	TUNARROSA MOLINA OSCAR	DEPEND		$ 1.537.710	FIJO		SI
44	CC 74161123	VARGAS PEREZ JOSELYN	DEPEND		$ 2.101.500	FIJO		SI
45	CC 74162754	GONZALEZ MARTINEZ IVAN	DEPEND		$ 1.589.255	FIJO		SI
46	CC 74183444	MESA PALACIOS JAIME	DEPEND		$ 2.344.400	VARIABLE		SI
47	CC 74184261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI
48	CC 74187796	GUTIERREZ VALERO CARLOS ESNEIDER	DEPEND		$ 2.098.000	VARIABLE		SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
35												L-16-16			
36															
37															
38										07-08					
39															
40							01-30								
41															
42															
43															
44							01-30								
45															
46							01-30								
47															
48							01-30								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	1	$ 78.338	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.600
230201-PROTECCION	28	$ 2.271.802	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.500
230301-PORVENIR	29	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
230301-PORVENIR	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400
230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
231001-COLFONDOS	30	$ 1.549.598	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.537.710	$ 246.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.100
231001-COLFONDOS	30	$ 2.101.500	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.300
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.589.255	$ 254.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.300
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.344.400	$ 375.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 375.200
230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.098.000	$ 335.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.700

SALUD

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	1	$ 78.338	$ 3.200	$ 0	$ 3.200
EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.271.802	$ 90.900	$ 0	$ 90.900
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100
EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.963.075	$ 78.600	$ 0	$ 78.600
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.549.598	$ 62.000	$ 0	$ 62.000
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.537.710	$ 61.600	$ 0	$ 61.600
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.101.500	$ 84.100	$ 0	$ 84.100
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.589.255	$ 63.600	$ 0	$ 63.600
EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.344.400	$ 93.800	$ 0	$ 93.800
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.098.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000

ARP

ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 78.338		$ 0
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.271.802		$ 158.200
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 77.334		$ 0
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.963.075		$ 136.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.549.598		$ 107.900
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.537.710		$ 107.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.101.500		$ 146.300
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.589.255		$ 110.700
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.344.400		$ 163.200
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.098.000		$ 146.100

PARAFISCALES

DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	$ 78.338	CCF10-COMFABOY	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	$ 2.271.802	CCF10-COMFABOY	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	$ 77.334	CCF10-COMFABOY	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	$ 1.082.667	CCF10-COMFABOY	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.963.075	CCF10-COMFABOY	$ 78.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.549.598	CCF10-COMFABOY	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.537.710	CCF10-COMFABOY	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.101.500	CCF10-COMFABOY	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.589.255	CCF10-COMFABOY	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.344.400	CCF10-COMFABOY	$ 93.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.098.000	CCF10-COMFABOY	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 826002051
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NOBSA	DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN:		KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO: 7787177
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79018363 90	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1a				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243137694

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
49	CC 74189264	TIBADUZA HOLGUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.699.310	FIJO			SI
50	CC 79146979	FONSECA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	BIDEVIN BUSTIDEV SALDOB	$ 3.417.674	FIJO			SI
51	CC 79504653	BENITEZ DAZA TEOFILO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI
52	CC 79990161	ALONSO ROJAS DIDIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.483.454	FIJO			SI
53	CC 80833427	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.680	FIJO			SI
54	CC 9083347	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.680	FIJO			SI
55	CC 9522826	RIVEROS PEREZ VICTOR RAFAEL	DEPEND		$ 2.057.540	VARIABLE			SI
56	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
57	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
58	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
59	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
60	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
61	CC 9525826	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI
62	CC 95000	REYES MESA JAVIER ALONSO	DEPEND		$ 1.233.828	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
49																
50																
51	04															
52																
53												L-18-18				
54																
55							01-30									
56												L-02-02				
57												L-09-09				
58																
59												L-30-30				
60												L-23-23				
61												L-16-16				
62																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
49	230301-PORVENIR	30	$ 1.699.310	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.900
50			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
51	230301-PORVENIR	27	$ 1.044.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100
52	230301-PORVENIR	28	$ 1.483.454	$ 239.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.000
53	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100
54	230301-PORVENIR	28	$ 1.281.491	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.100
55	25-14 COLPENSIONES	33	$ 2.057.540	$ 329.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329.300
56	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
57	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
58	25-14 COLPENSIONES	25	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
59	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
60	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
61	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000
62	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.191.734	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.700

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
49	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.699.310	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
50	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.417.674	$ 136.800	$ 0	$ 136.800
51	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 41.800
52	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.483.454	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
53	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800
54	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.281.491	$ 51.300	$ 0	$ 51.300
55	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.057.540	$ 82.400	$ 0	$ 82.400
56	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
57	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
58	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
59	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
60	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
61	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000
62	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.191.734	$ 47.700	$ 0	$ 47.700

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
49	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.699.310		$ 118.300
50	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.417.674		$ 237.900
51	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.044.000		$ 72.700
52	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.483.454		$ 104.800
53	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0
54	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.281.491		$ 89.200
55	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.057.540		$ 143.300
56	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0
57	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0
58	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 2.500.000		$ 174.000
59	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0
60	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0
61	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0
62	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.191.734		$ 83.000

PARAFISCALES

Nº	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
49	$ 1.699.310	CCF10-COMFABOY	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	$ 3.417.674	CCF10-COMFABOY	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	$ 1.044.000	CCF10-COMFABOY	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	$ 1.483.454	CCF10-COMFABOY	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	$ 1.281.491	CCF10-COMFABOY	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	$ 2.057.540	CCF10-COMFABOY	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	$ 2.500.000	CCF10-COMFABOY	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	$ 1.191.734	CCF10-COMFABOY	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN[illegible]

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7901836390			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			243137094

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7767177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910248132	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACION:			42914980S

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.546.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.400	$ 0	$ 3.546.700	$ 54.400	$ 3.603.100
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.373.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 0	$ 1.373.900	$ 21.100	$ 1.395.000
230301	230301-PORVENIR	25	$ 7.219.800	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 116.600	$ 800	$ 7.269.800	$ 111.400	$ 7.381.200
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.053.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 0	$ 1.053.600	$ 16.200	$ 1.069.800
SUBTOTALES:										$ 13.245.000	$ 203.100	$ 13.449.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	31		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.581.500	$ 0	$ 39.600	$ 0	$ 2.581.500	$ 39.600	$ 0	$ 2.621.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.100	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 80.100	$ 1.300	$ 0	$ 81.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 50.500	$ 800	$ 0	$ 51.300
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.600	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 170.600	$ 2.700	$ 0	$ 173.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 701.400	$ 0	$ 10.800	$ 0	$ 701.400	$ 10.800	$ 0	$ 712.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.100	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 172.100	$ 2.700	$ 0	$ 174.800
SUBTOTALES:													$ 3.756.200	$ 57.900	$ 0	$ 3.814.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	46		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.114.300	$ 6.114.300	$ 93.700	$ 0	$ 6.208.000
SUBTOTALES:									$ 6.114.300	$ 93.700	$ 0	$ 6.208.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	46	$ 3.757.900	$ 57.600	$ 3.815.500
SUBTOTALES:			$ 3.757.900	$ 57.600	$ 3.815.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082558587	CARDENAS LASSO CHARLY JOHONY	DEPEND		$ 1.259.394	FIJO			SI														L-23-23				230301-PORVENIR	1	$ 41.980	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 41.980	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.980		$ 0	1	$ 41.980	CCF10-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1082558587	CARDENAS LASSO CHARLY JOHONY	DEPEND		$ 1.259.394	FIJO			SI														L-30-30				230301-PORVENIR	1	$ 41.980	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 41.980	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 41.980		$ 0	1	$ 41.980	CCF10-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1082558587	CARDENAS LASSO CHARLY JOHONY	DEPEND		$ 1.259.394	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	28	$ 1.175.439	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.100	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.175.439	$ 47.100	$ 0	$ 47.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.175.439		$ 81.900	28	$ 1.179.439	CCF10-COMFABOY	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1097286579	PARRA GARCIA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		22												01-22				230301-PORVENIR	22	$ 942.793	$ 150.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 150.900	EPS017-FAMISANAR	22	$ 942.793	$ 37.800	$ 0	$ 37.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 942.793	1	$ 65.700	22	$ 942.793	CCF10-COMFABOY	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1097769821	HENAO OSPINA EDINSON ALBERTO	DEPEND		$ 1.850.394	FIJO			SI		22												01-22				230201-PROTECCION	22	$ 1.591.472	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.591.472	$ 63.700	$ 0	$ 63.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 1.591.472		$ 110.800	22	$ 1.591.472	CCF10-COMFABOY	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1051522276	PATIÑO SANCHEZ LEONEL RICARDO	DEPEND		$ 1.150.000	FIJO			SI		30												01-30				230301-PORVENIR	28	$ 1.154.923	$ 184.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.800	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.154.923	$ 46.200	$ 0	$ 46.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.154.923		$ 80.400	28	$ 1.154.923	CCF10-COMFABOY	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELEFONO:	7707127
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7910248132			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			429148865

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DNO | SLN | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910248132	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			429149805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
21	CC 1053586173	ACEVEDO AJARCON DEIBY MARCELA	DEPEND		$ 1.413.335	FIJO			SI																	
22	CC 1053586173	ACEVEDO AJARCON DEIBY MARCELA	DEPEND		$ 1.413.335	FIJO			SI														L-30-30			
23	CC 1053587733	ADAME LOPEZ DEIBY MAYERLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI																	
24	CC 1053587733	ADAME LOPEZ DEIBY MAYERLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI														L-23-23			
25	CC 1053587733	ADAME LOPEZ DEIBY MAYERLY	DEPEND		$ 1.429.394	FIJO			SI														L-30-30			
26	CC 1057574737	BENITEZ AVADO MAURICIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.373.264	FIJO			SI																	
27	CC 1057574737	BENITEZ AVADO MAURICIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.373.264	FIJO			SI														L-30-30			
28	CC 1057574737	BENITEZ AVADO MAURICIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.373.264	FIJO			SI														L-28-28			
29	CC 1057576759	IBAÑEZ ALVAREZ LILIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	30							01-30									
30	CC 1057576759	IBAÑEZ ALVAREZ LILIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														L-23-23			
31	CC 1057576759	IBAÑEZ ALVAREZ LILIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														L-09-09			
32	CC 1057576759	IBAÑEZ ALVAREZ LILIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														L-30-30			
33	CC 1057578166	TRIANA VARGAS DIANA SOFIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI														L-30-30			
34	CC 1057578166	TRIANA VARGAS DIANA SOFIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI														L-23-23			

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN							SALUD						ARP					PARAFISCALES								
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
21	230301-PORVENIR	28	$ 1.324.246	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.324.246	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.324.246		$ 92.200	28	$ 1.324.246	SCCF10-COMFABOY	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	230301-PORVENIR	1	$ 47.295	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.295	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.295		$ 0	1	$ 47.295	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	230301-PORVENIR	28	$ 1.334.102	$ 213.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.500	NUEVA EPS CM	28	$ 1.334.102	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.334.102		$ 92.000	28	$ 1.334.102	SCCF10-COMFABOY	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	230301-PORVENIR	1	$ 47.647	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.700	NUEVA EPS CM	1	$ 47.647	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.647		$ 0	1	$ 47.647	CCF10-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	230301-PORVENIR	1	$ 47.647	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.700	NUEVA EPS CM	1	$ 47.647	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.647		$ 0	1	$ 47.647	CCF10-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	231001-COLFONDOS	28	$ 1.281.714	$ 205.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.100	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.281.714	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.281.714		$ 88.300	28	$ 1.281.714	SCCF10-COMFABOY	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	231001-COLFONDOS	1	$ 46.776	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 46.776	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 46.776		$ 0	1	$ 46.776	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	231001-COLFONDOS	1	$ 45.776	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45.776	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 45.776	1	$ 0	1	$ 45.776	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	230301-PORVENIR	27	$ 1.508.142	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.400	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.508.142	$ 60.400	$ 0	$ 60.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.508.142		$ 105.800	27	$ 1.508.142	SCCF10-COMFABOY	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	230301-PORVENIR	1	$ 42.000	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS017-FAMISANAR	1	$ 42.000	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 42.000		$ 0	1	$ 42.000	CCF10-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	230301-PORVENIR	1	$ 42.000	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.800	EPS017-FAMISANAR	1	$ 42.000	$ 1.700	$ 0	$ 1.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 42.000		$ 0	1	$ 42.000	CCF10-COMFABOY	$ 1.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826008051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:		KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7787177
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7910248132	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			429148805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
											PENSIÓN								SALUD						ARP												CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
35	CC 1057578166	TRIANA VARGAS DIANA SOFIA	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI		230301-PORVENIR	28	$ 1.176.000	$ 188.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.200	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.176.000	$ 47.100	$ 0	$ 47.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.176.000		$ 51.900	28	$ 1.176.000	SCCF10-COMFABOY	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1057582644	FIGUEREDO RIVEROS MILTON ANDRES	DEPEND		$ 2.027.300	VARIABLE			SI																																		
37	CC 1057583684	FIGUEREDO RIVEROS MILTON ANDRES	DEPEND		$ 2.027.300	VARIABLE			SI																																			
38	CC 1057583684	FIGUEREDO RIVEROS MILTON ANDRES	DEPEND		$ 2.027.300	VARIABLE			SI																																			
39	CC 1057580086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.958.394	FIJO			SI																																			
40	CC 1057580086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.958.394	FIJO			SI																																			
41	CC 1057580086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.958.394	FIJO			SI																																			
42	CC 1057580086	ROSAS SANDOVAL LAURA YINETH	DEPEND		$ 1.958.394	FIJO			SI																																			
43	CC 1057580832	COMBITA ALVAREZ JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.012.032	FIJO			SI																																			
44	CC 1057580832	COMBITA ALVAREZ JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.012.032	FIJO			SI																																			
45	CC 1057584779	SOLER RICO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.999.950	VARIABLE			SI																																			
46	CC 1057584779	SOLER RICO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.998.950	VARIABLE			SI																																			
47	CC 1057584779	SOLER RICO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.998.950	VARIABLE			SI																																			
48	CC 1067566566	PLAZAS TAPIAS CRISTHIAN CAMILO	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																																			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7910248132			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	429146805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7797177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7910248132	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	17		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	429149805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT. | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7910248132		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		426149805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | DOM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NOBSA	DEPARTAMENTO: BOYACA
DIRECCIÓN:		KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELEFONO: 7707177
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910248132	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACION:			429149805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 5 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7767177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7910248132	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024		
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			42914985

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL														SALUD								ARP					PARAFISCALES								
																										PENSIÓN																																										
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
105	CC 74183444	MESA PALACIOS JAIME	DEPEND		$ 2.093.544	VARIABLE			SI													L-23-33				25-14 COLPENSIONES	1	$ 89.765	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 89.765	$ 2.800	$ 0	$ 2.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 89.765		$ 0	1	$ 89.765	CCF10-COMFABOY	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
106	CC 74184261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.169.000	FIJO			SI																	230301-PROTECCION	28	$ 1.092.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.092.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.092.667		$ 75.400	28	$ 1.092.667	CCF10-COMFABOY	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
107	CC 74184261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.169.000	FIJO			SI													L-30-30				230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF10-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
108	CC 74184261	RODRIGUEZ CORTES LORENZO	DEPEND		$ 1.169.000	FIJO			SI													L-23-22				230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF10-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
109	CC 74187706	GUTIERREZ VALERO CARLOS EMEDEN	DEPEND		$ 2.472.920	VARIABLE			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.308.059	$ 369.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.300	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.308.059	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.308.059		$ 169.700	28	$ 2.308.059	CCF10-COMFABOY	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
110	CC 74187706	GUTIERREZ VALERO CARLOS EMEDEN	DEPEND		$ 2.472.920	VARIABLE			SI													L-23-22				25-14 COLPENSIONES	1	$ 82.431	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 82.431	$ 3.300	$ 0	$ 3.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 82.431		$ 0	1	$ 82.431	CCF10-COMFABOY	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
111	CC 74187706	GUTIERREZ VALERO CARLOS EMEDEN	DEPEND		$ 2.472.920	VARIABLE			SI													L-30-30				25-14 COLPENSIONES	1	$ 82.431	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 82.431	$ 3.300	$ 0	$ 3.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 82.431		$ 0	1	$ 82.431	CCF10-COMFABOY	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
112	CC 74189294	TIBADUIZA HOLGUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.699.319	FIJO			SI													L-23-23				230301-PORVENIR	1	$ 56.644	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.644	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 56.644		$ 0	1	$ 56.644	CCF10-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
113	CC 74189294	TIBADUIZA HOLGUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.699.319	FIJO			SI													L-30-30				230301-PORVENIR	1	$ 56.644	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.644	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 56.644		$ 0	1	$ 56.644	CCF10-COMFABOY	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
114	CC 74189294	TIBADUIZA HOLGUIN WALTER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.699.319	FIJO			SI		30							01-30								230301-PORVENIR	28	$ 3.916.583	$ 626.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 626.700	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 3.916.583	$ 156.700	$ 0	$ 156.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 3.916.583		$ 272.900	28	$ 3.916.583	CCF10-COMFABOY	$ 156.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
115	CC 79145278	FONSECA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	ADELIA BUSTODEV SALDOS	$ 3.417.574	FIJO			SI													L-23-23						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.923	$ 4.600	$ 0	$ 4.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 113.923		$ 0	1	$ 113.923	CCF10-COMFABOY	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
116	CC 79145278	FONSECA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	ADELIA BUSTODEV SALDOS	$ 3.417.574	FIJO			SI													L-30-30						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.923	$ 4.600	$ 0	$ 4.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 113.923		$ 0	1	$ 113.923	CCF10-COMFABOY	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
117	CC 79145278	FONSECA GUTIERREZ CARLOS ARTURO	DEPEND	ADELIA BUSTODEV SALDOS	$ 3.417.574	FIJO			SI		30							01-30										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 4.898.867	$ 196.000	$ 0	$ 196.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 4.898.867		$ 341.000	28	$ 4.898.867	CCF10-COMFABOY	$ 196.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
118	CC 79588653	BENITEZ DAZA PEDRO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.169.000	FIJO			SI													L-23-23				230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF10-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELEFONO:	7797177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79102481132	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		17			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACION:		428149805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
119	CC 79586853	BENITEZ DAZA TEOFILO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														L-30-30			
120	CC 79586853	BENITEZ DAZA TEOFILO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI								01-30									
121	CC 79990161	ALEMAN ROJAS DIDIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.493.454	FIJO			SI																	
122	CC 79990161	ALEMAN ROJAS DIDIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.493.454	FIJO			SI														L-23-22			
123	CC 79990161	ALEMAN ROJAS DIDIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.493.454	FIJO			SI														L-30-30			
124	CC 80833427	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI														L-09-09			
125	CC 80833427	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI	30								01-30								
126	CC 80833427	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI														L-30-30			
127	CC 80833427	MARTINEZ GALINDO CARLOS ERNEY	DEPEND		$ 1.325.880	FIJO			SI														L-23-23			
128	CC 9522928	RIVEROS PEREZ VICTOR RAFAEL	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.971.020	VARIABLE			SI														L-23-23			
129	CC 9522928	RIVEROS PEREZ VICTOR RAFAEL	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.971.020	VARIABLE			SI														L-30-30			
130	CC 9522928	RIVEROS PEREZ VICTOR RAFAEL	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.971.020	VARIABLE			SI								01-30									
131	CC 9525828	DATIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI														L-16-16			
132	CC 9525828	GUTIERREZ PULIDO SAMUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	APP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
119	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF10-COMFABOY	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
120	230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF10-COMFABOY	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
121	230301-PORVENIR	28	$ 1.393.891	$ 223.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.100	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.393.891	$ 55.800	$ 0	$ 55.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.393.891		$ 97.100	28	$ 1.393.891	CCF10-COMFABOY	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
122	230301-PORVENIR	1	$ 49.782	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 49.782	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 49.782	1	$ 0	1	$ 49.782	CCF10-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
123	230301-PORVENIR	1	$ 49.782	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 49.782	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 49.782		$ 0	1	$ 49.782	CCF10-COMFABOY	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
124	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
125	230301-PORVENIR	27	$ 1.681.874	$ 269.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.100	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.681.874	$ 67.300	$ 0	$ 67.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.681.874		$ 117.100	27	$ 1.681.874	CCF10-COMFABOY	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
126	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
127	230301-PORVENIR	1	$ 44.190	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 44.190	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.190		$ 0	1	$ 44.190	CCF10-COMFABOY	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
128					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 65.701	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 65.701		$ 0	1	$ 65.701	CCF10-COMFABOY	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
129					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 65.701	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 65.701		$ 0	1	$ 65.701	CCF10-COMFABOY	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
130					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.839.619	$ 73.600	$ 0	$ 73.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.839.619		$ 128.100	28	$ 1.839.619	CCF10-COMFABOY	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
131	25-14 COLPENSIONES	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF10-COMFABOY	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
132	25-14 COLPENSIONES	25	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 2.500.000		$ 174.000	25	$ 2.500.000	CCF10-COMFABOY	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	826002051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAVIBOY LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	TELÉFONO:	7707177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fabricación de productos de la refinación del pet
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910248132
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2023	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
DÍAS DE MORA:		17	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 429148805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

BITÁCORA DE OBRA

Bitacora de Obra

Objeto
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Sogamoso - Departamento de Boyacá - Programa Colombia Rural Nacional

Contratista
Construcciones y Pavimentos Boyacá PAVIBOY SAS
Contrato No. 20230725
R/L. Emiliano Vargas Mesa

Interventoría
Consorcio Interobras
R/L Javier Anaca Guastumal
Contrato No. 1746 de 2023

Powered by CamScanner

Fecha: 03-10-2023 Martes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Cuadrilla topográfico, Operadores, ayudante de obra, Insp. Interventoría.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Equipo topográfico.
- Actividades ejecutadas
· Se realiza instalación de la señalización del PAT
· Se inician labores de obra con la excavación de la subrasante desde la abscisa, K0+020-K0+060

Ing. Residente Insp. Interventoría

Fecha: 04-10-2023 Miercoles.
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Cuadrilla topográfica, Operadores, Ayudante de obra, Insp. Interventoría.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo Topografico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
· Se continuan con las labores de excavación de la subrasante en el tramo K0+060-K0+080
· Se realizan apiques para tener cuidado con la tubería de gas, agua y acometidas electricas

Ing. Residente Insp. Interventoria

Fecha: 05-10-2023 Jueves
Clima: Soleado durante la tarde, (inicia nublado)
Personal: Ing. Residente, Cuadrilla topografica, Operadores, Ayudante de obra, Insp Interventoria
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo topografico, herr. menor
- Actividades ejecutadas
· Se continua con las labores de excavación de

Powered by CamScanner

la subrasante en el tramo K0+060-K0+080.
• Se realizan apiques para revisión de tuberías existentes.

Ing. Residente Insp Interventoría.

(*) Fecha: 06-10-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente, Cuadrilla topografica, ayudante de obra, operadores, Insp interventoria.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, retroexcavadora, Equipo topografico y herr menor
- Actividades ejecutadas
• Se continua con la excavación en el tramo K0+060-K0+080.
• Se realiza cargue de material
• Se realizan apiques para revisión de las tuberías existentes.

Ing. Residente Insp Interventoría.

(*) Fecha: 07-10-2023 Sábado
Clima: lluvia en la jornada de la mañana
Personal: Ing residente, Cuadrilla topografica, ayudante de obra, operadores, Insp Interventoría.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo topografico, herr menor
- Actividades ejecutadas
• Se realiza perfilación y compactación de Subrasante.
• Se encuentra tubería de acueducto de 3" superficial, a la cual se le produce una ruptura
• Reparación de tubería de 3" por parte de la empresa de servicios publicos.

Powered by CamScanner

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 09-10-2023 Lunes.
Clima: Nublado
Personal: Ing residente, Cuadrilla topográfica, Operadores, ayudante de obra, Insp. Interventoría.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Equipo topografico y herr. menor
- Actividades ejecutadas
• Se realiza perfilación y compactación de la subrasante en el tramo K0+020 - K0+060
• Realizacion de apiques para revisión de profundidad de acueductos

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 10-10-2023 Martes
Clima: Nublado
Personal: Ing. residente, Cuadrilla topografica, Operadores, ayudante obra, Insp interventoria, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta, herr. menor
- Actividades ejecutadas.
• Se continua con la perfilación y compactación de la Subrasante tramo K0+060 - K0+100
• Se realiza el cargue de material Sobrante de excavación.

Ing. Residente Insp Interventoria

(*) Fecha: 11-10-2023. Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Insp interventoría, Cuadrilla

Powered by CamScanner

topográfica, Operadores, ayudante de obra,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas.
• Arreglo y profundización de tubería por parte de la empresa Conservicios.
• Limpieza del canal del costado derecho desde KD+000 - KD+200.
• Verificación de niveles topograficos.

Ing Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 12-10-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, ayudante de obra.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Volqueta, herr. menor, Equipo topográfico.
- Actividades ejecutadas
• Se continuo con la perfilación y compactación de la subrasante
• Se reparten volantes indicando a la comunidad la ~~modificación~~ de PMT.
-

Ing. Residente Insp. Interventoria

(*) Fecha: 13-10-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, ayudante de obra.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Volqueta,

Powered by CamScanner

Equipo topografico, hoja menor
- Actividades ejecutadas
• Cargue de material sobrante de excavación
• Instalación de señal para cumplimiento de la modificación del PMT.
• Instalación de subbase granular clase C de KD+020 - KD+100.
• Mejoramiento para entrada de vehículos

Ing. Residente Insp Interventoría

⊛ Fecha: 14-10-2023 - Sábado
Clima: Nublado - lluvia noche anterior.
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, ayudante de obra, Prof. SISO
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador, Motoniveladora, Cargador, Volqueta, Equipo topografico, hoja menor
- Actividades ejecutadas
• Se inicia con charla de seguridad y salud en el trabajo
• Instalación de subbase granular clase C de KD+100 - KD+200.

Ing. Residente Insp Interventoría

⊛ Fecha: 16-10-2023 Lunes.
Día festivo - No se realizan actividades

Ing. Residente Insp. Interventoría.

⊛ Fecha: 17-10-2023 Martes.
Clima: Clima soleado en la mañana; se presentan lluvias en la jornada de la tarde

Powered by CamScanner

Personal Ing. residente, Insp. interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, ayudante de obra.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta, Equipo topográfico, herr. men
- Actividades ejecutadas
• Compactación de subbase granular clase C
• Replanteo y nivelación topográfica de K0+030 - K0+160.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha 18-10-2023 - Miercoles
Clima: Nublado
Personal: Ing. residente, Insp. Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, ayudante de obra
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Equipo topográfico, herr menor.
- Actividades ejecutadas
• Se realiza perfilación y limpieza de la abscisa K0+300 - K0-350
• Se realiza nivelación topográfica
• Retiro de material Sobrante

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 19-10-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Insp. interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, ayudante de obra,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Equipo topográfico, herr. menor
- Actividades ejecutadas
• Se realiza replanteo topográfico
• Limpieza de la abscisa K0+190 - K0+210

Powered by CamScanner

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 20-10-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal Ing residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, ayudante de obra
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta, Equipo topográfico, herr. menor
- Actividades ejecutadas
• Se continua con la instalación de subbase granular KO+430- KO+160.
• Se realiza replanteo y nivelación de KO+180- KO+300

Ing. residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 21-10-2023 Sábado
Clima: Soleado - Nublado en la tarde
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, ayudante de obra
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta, tanque, Equipo topográfico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
• Se realiza humectación y compactación de la Subbase granulas.

Ing. residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 23-10-2023 Lunes
Clima: Soleado - Llovió noche anterior.
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica operadores, ayudante de obra.

Powered by CamScanner

Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador, Motoniveladora, Cargador, Volqueta, Equipo topográfico y ben menor.

- Actividades ejecutadas
- Instalación de subbase granular clase c K0+160 - K0+200.
- Humectación y compactación de la subbase existente.
- Excavación de subrasante K0+200 - K0+300.
- Se realizan apiques para verificación de altura de fundiciones
- Revisión de niveles topográficos

Ing. Residente Insp. Interventoría

(#) Fecha: 24-10-2023 Martes

Clima: Soleado - Nublado en la tarde (lluvia)

Personal: Ing. residente, Insp. interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, ayudante de obra

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta, Equipo topográfico, ben menor.

- Actividades ejecutadas
- Se continua con la instalación de Subbase granular clase c K0+160 - K0+200.
- Verificación de niveles topográficos.

Ing. Residente Insp Interventoría

(#) Fecha: 25-10-2023 Miercoles.

Clima: Nublado

- No se adelantan actividades Constructivas la motoniveladora se encuentra en mantenimiento.

Ing Residente Insp Interventoría

Powered by CamScanner

(*) Fecha: 26-10-2023 Jueves
Clima: Se presentan fuertes lluvias la noche anterior y lluvias durante el transcurso del día
NOTA: No se realizan actividades constructivas como consecuencia de las constantes lluvias

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 27-10-2023 - Viernes.
Clima: Nublado - Lloviznas al final de la jornada
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador, Cargador, Equipo topográfico, herr. menor
- Actividades ejecutadas
• Verificación de niveles K0+020 - K0+200
• Replanteo y toma de niveles K0+200 - K0+260
NOTA: Motoniveladora continua en mantenimiento

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 28-10-2023 Sábado
Clima: Nublado
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador, Cargador, Motoniveladora, Equipo topográfico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
• Se adelantan actividades de limpieza de cunetas.
• Se ~~realizan~~ apiques.

Ing. Residente Insp. Interventoría

Powered by CamScanner

(*) Fecha: 30-10-2023 Lunes.
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Insp. Interventoría, cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador, Motoniveladora, Cargador, Equipo topográfico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
• Se realizan apiques y toma de niveles de tuberías de agua y gas domiciliario, para toma de decisiones

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 31-10-2023 Martes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Insp interventoría, cuadrilla topográfica, ayudante obra, operadores
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Cargador, Equipo topográfico y herr menor
- Actividades ejecutadas
• Se realiza excavación, entre las abscisas K0+200 - K0+260
• Se realiza perfilación y compactación de la subrasante, entre las abscisas K0+200 - K0+260.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 01-11-2023 Miercoles.
Clima: Se presenta un clima Soleado en la mañana - En la tarde se presentan lluvias

Powered by CamScanner

Fuertes y leves.
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Cargador, Vibrocompactador, Equipo topográfico.
- Actividades ejecutadas
• Suministro e instalación de subbase granular clase C, entre las abscisas K0+200 - K0+260
• Verificación de niveles de subbase
•

Ing. Residente Ing. Interventoría

⊛ Fecha: 02-11-2023 Jueves
Clima: Fuertes lluvias en la jornada de la tarde
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Cargador, Vibrocompactador, Equipo topográfico, her. menor.
- Actividades ejecutadas.
• Instalación subbase granular de la abscisa K0+200 - K0+260. (Continuación)

Ing. Residente Ing Interventoría

⊛ Fecha: 03-11-2023 Viernes.
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Cargador, Vibrocompactador, Equipo topográfico, her. menor.
⇒ Actividades ejecutadas
• Continuación con la instalación de

Powered by CamScanner

Subbase granular clase C. KO+200 - KO+260
• Compactación Subbase granular clase C.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 04-11-2023 Sábado
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, herr menor, Equipo topográfico
- Actividades ejecutadas
• Se realizan actividades de limpieza de cunetas
• Verificación de niveles KO+200 - KO+300.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 06-11-2023 Lunes
No se realizan actividades - Día Festivo -

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 07-11-2023 Martes
Clima: Nublado - Lluvias
Personal: Ing. residente, Insp. interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Equipo topográfico, herr menor.
- Actividades ejecutadas
• Excavación de la Subrasante entre las

Powered by CamScanner

abscisas K0+260 - K0+360.
- Perfilación y compactación de la subrasante K0+260 - K0+360.
- Se realizan apiques para verificación de tuberías.
- Verificación de niveles de la subrasante
- Verificación de acueducto

NOTA: Se rompe acometida de acueducto en actividades de excavación.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(#) Fecha: 08-11-2023 Miercoles
Clima: Soleado.
Personal: Ing residente, Insp interventoría, Cuadrilla topografica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, herr. menor.

→ Actividades ejecutadas
- Aneglo de acometida por parte de empresa de servicios públicos, Coosevicios
- Instalación de subbase granular clase C, para cerrado de K0+260 - K0+300.

Ing. residente Insp Interventoría

(#) Fecha: 09-11-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, ayudante de obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, herr menor.

Powered by CamScanner

- Actividades ejecutadas
  - Instalación de subbase granular clase C entre abscisa K0+300 - K0+380.
  - Compactación de subbase granular clase C.
  - Verificación de niveles.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 10-11-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, tanque, Equipo topografico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
  - Humectación Subbase instalada
  - Instalación subbase granular clase C K0+300 - K0+400
  - Compactación subbase

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 11-11-2023 Sábado.
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, tanque, Equipo topografico, herr. menor.
- Actividades ejecutadas
  - Instalación Subbase granular clase C K0+300 - K0+400.
  - Compactación Subbase.

Powered by CamScanner

Ing Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 13-11-2023 Lunes Festivo.

No se realizan actividades

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 14-11-2023 Martes

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompuctador, Volqueta, Tanque, Equipo topografico, herr. menor

- Actividades ejecutadas
  - Retiro, relleno y compactación de Fallo.
  - Humectación de la subbase granular
  - Compactación de subbase y Subrasante
  - Instalación Subbase granular clase C, entre las abscisas K0+300 - K0+400.

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 15-11-2023 Miercoles

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente, Interventoria, Cuadrilla topografica, Operadores

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompuctador, Volqueta, Equipo topografico, herr. menor.

- Actividades ejecutadas
  - Nivelación y estacado para instalación de base entre las abscisas K0+000 - K0+200

Powered by CamScanner

- Realización de ensayos de densidad
- Compactación Subbase

Ing. Residente Insp Interventoría

Fecha: 16-11-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topografico, herr menor
- Actividades ejecutadas
- Humectación de la subbase
- Continuación con la instalación de base entre K0+000 - K0+200
- Compactación de Subbase granular
- Compactación de base granular

Ing. Residente Insp Interventoría

Fecha: 17-11-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, ayudante obra, operadores.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo Topográfico, herr menor
- Actividades ejecutados
- Verificación de niveles de base granular
- Compactación y perfilación de 10cm de base para instalación de bordillos

Ing. Residente Insp Interventoría

Powered by CamScanner

* Fecha: 18-11-2023 Sábado.
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, tanque, pen menor
- Actividades ejecutadas
• Se descargan bordillos
• Toma de niveles para instalación de bordillos

Ing. Residente Insp Interventoría

* Fecha: 20-11-2023 Lunes.
Clima: Soleado.
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográficos, tanque, pen menor.
- Actividades ejecutadas
• Verificación de niveles para instalación de bordillos
• Instalación de bordillos prefabricados
• Humectación y compactación de la subbase


Ing. Residente Insp. Interventoría

* Fecha: 21-11-2023 Martes.
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador,


Powered by CamScanner

Vibrocompactadora, Volqueta, Equipo topográfico, tanque, herr. menor.

- Actividades ejecutadas
  - Se continua con actividades de instalación de bordillo prefabricado.
  - Se realiza mezclo de tuberías por punto de abscervicios.




Ing. Residente.




Insp. Interventoría

(*) Fecha: 22-11-2023 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactadora, Volqueta, tanque, Equipo topográfico, herr. menor.
→ Actividades ejecutadas
- Se continua con actividades de instalación de bordillos.
- Toma de muestras para ensayos de densidades
- Suministro e instalación de base granular K0+300 - K0+400



Ing. Residente.



Insp Interventoría

(*) Fecha: 23-11-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactadora, Volqueta, tanque, Equipo topográfico, herr. menor.
→ Actividades ejecutadas

Powered by CamScanner

- Se continua con actividades de instalación de bordillos

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 24-11-2023 Viernes
clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, tanque, herr. menor
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación de base granular clase c. K0+200 - K0+300.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 25-11-2023 Sábado
clima: soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herr menor.
→ Actividades ejecutadas.
- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación de base granular clase c K0+200 - K0+300
- Chequeo de niveles de base granular.

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 27-11-2023 Lunes.
clima: Soleado

Powered by CamScanner

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, operadores, maestro, 5 ayudantes,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herramienta menor
⇒ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado.
- Toma de niveles y nivelación de bordillos.
- Humectación y compactación de la base granular.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 28-11-2023 Martes.
Clima: Soleado - Breves lluvias iniciando jornada
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herramienta menor
⇒ Actividades ejecutadas:
- Instalación de bordillo prefabricado.
- Humectación y compactación de la base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 29-11-2023 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, maestro, 3 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herramienta menor.
⇒ Actividades ejecutadas.

Powered by CamScanner

- Toma de niveles para bordillos
- Inst. de bordillo prefabricado
- Compactación base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

(+) Fecha: 30-11-2023 - Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, her. menor.
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado
- Humectación y compactación de base granular.


Ing. Residente Insp. Interventoría

(+) Fecha: 01-12-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, her. menor.
→ Actividades ejecutadas:
- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación de ~~sub~~base granular entre las abscisas K0+020 - K0+070, segunda capa.
- Humectación y compactación de base granular.
- Revisión de niveles de base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

Powered by CamScanner

- Toma de niveles para bordillos
- Inst. de bordillo prefabricado
- Compactación base granular.




Ing. Residente Insp. Interventoría

(#) Fecha: 30-11-2023 - Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herr. menor.
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado
- Humectación y compactación de base granular.




Ing. Residente Insp. Interventoría

(#) Fecha: 01-12-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, herr. menor
→ Actividades ejecutadas:
- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación de ~~sub~~base granular entre las abscisas K0+020 - K0+070, segunda capa
- Humectación y compactación de base granular.
- Revisión de niveles de base granular



Ing. Residente Insp. Interventoría

* Fecha: 02-12-2023 Sábado
Clima: Soleado.
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, her. menor.
→ Actividades ejecutadas:
· Instalación de bordillo prefabricado



Ing. Residente Insp. Interventoría

* Fecha: 04-12-2023 Lunes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, her. menor.
→ Actividades ejecutadas
· Instalación de bordillo prefabricado.



Ing. Residente Insp. Interventoría

* Fecha: 05-12-2023 Martes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactador, Volqueta, Equipo topográfico, her. menor.
→ Actividades ejecutadas
· Instalación de bordillo prefabricado.
· Excavación para ampliación de alcantarilla

abscisa K0+300.
- Instalación de alcantarilla para ampliación, abscisa K0+300.
- Armado de acero para encole de alcantarilla
- Se ~~ende~~ base de muro y aletas de encole de alcantarilla, abscisa K0+300.

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 06-12-2023 Miercoles
Clima: Soleada
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes.
Maquinarias y Equipos: Motoniveladora, Cargador, Vibrocompactadora, Volqueta, Equipo topografico, Retroexcavadora, herramienta menor.
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado
- Se continua, con armado de acero para encole de alcantarilla K0+300.
- Suministro e instalación de material de relleno para atraque de bordillos.
- Toma de niveles para continuación ultima capa de base granular K0+030 - K0+170.

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 07-12-2023 Jueves
Clima: Soleada
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfico, Operadores, Maestro, 5 ayudantes.
Maquinarias y Equipos: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herramienta menor.

→ Actividades ejecutadas
- Se extrae y se funde concreto de alcantarilla K0+300.
- Instalación de base granular K0+000 - K0+100
- Excavación de la subrasante entre las abscisas K0+000 - K0+030, incluido sobreancho.
- Instalación de base granular entre las abscisas K0+000 - K0+030, incluido sobreancho.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 08-12-2023 Viernes.
Clima: Soleado
No se realizan actividades - día festivo.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 09-12-2023 Sábado.
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactadora, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herramienta menor.
→ Actividades ejecutadas.
- Desenconchado muro de alcantarilla (Encole, abscisa K0+300)
- Toma de niveles para bordillos.
- Excavación para instalación de bordillos
- Descargue de bordillos.

(*) Fecha: 11-12-2023 Lunes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes,

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herr. menor.

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado.
- Instalación de base granular entre las abscisas K0+030 - K0+200.
- Humectación y compactación de base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 12-12-2023 Martes.

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herr. menor

→ Actividades ejecutadas.

- Instalación de bordillos.
- Instalación base granular entre las abscisas K0+030 - K0+200.
- Humectación y compactación de base granular
- Ampliación Zanja izquierda K0+300 - K0+308

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 13-12-2023 Miercoles

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 5 ayudantes.

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herr. menor.

→ Actividades ejecutadas.
- Instalación de bordillos.
- Instalación de base granular entre las abscisas K0+030 - K0+200.
- Humectación y compactación de base granular.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 14-12-2023 Jueves
Clima: Soleado (Jornada mañana), Lluvias (Jornada tarde)
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, her. menor
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación base granular entre las abscisas K0+000 - K0+200.
- Humectación y compactación de la base granular.
- Relleno cabezote de encole K0+300.

Ing. Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 15-12-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico her menor
→ Actividades ejecutadas.
- Instalación bordillo prefabricada
- Instalación base granular entre las abscisas

K0+000 - K0+200

- Humectación y compactación de base granular.
- Instalación de relleno para apoyo de bordillo



Ing. Residente



Insp. Interventoría

✱ Fecha: 16-12-2023 Sábado


Clima: Nublado - lluvias.

Personal: Ing. residente, Insp interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.


Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herr menor

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado
- Cerrado base granular entre las abscisas K0+000 - K0+200.
- Verificación de niveles base granular



Ing. Residente



Insp. Interventoría

✱ Fecha: 18-12-2023 Lunes

Clima: Se presentan lluvias

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico herr. menor

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado
- Cerrado base granular entre las abscisas K0+000 - K0+200.
- Verificación niveles base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 19-12-2023 Martes
Clima: Nublado - Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr. menor.

→ Actividades ejecutadas
- Instalación de bordillo prefabricado.
- Instalación de base granular entre las abscisa K0+300 - K0+400.
- Compactación base granular entre las abscisas K0+000 - K0+200.
- Replanteo de entradas de viviendas, para construcción de rampas de acceso.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 20-12-2023 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr. menor.

→ Actividades ejecutadas
- Instalación base granular entre las abscisas K0+200 - K0+300.
- Compactación base granular

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 21-12-2023 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico hem menor
→ Actividades ejecutadas
· Compactación base granular
· Toma y verificación de niveles de bordillos.
· Excavación zanja para instalación de bordillo prefabricado.

Ing Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 22-12-2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, hem menor
→ Descargue de bordillo prefabricado
· Instalación de bordillo prefabricado
· Compactación base granular.

Ing Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 23-12-2023 Sábado
Clima: Soleado
Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo

topografica, herr menor

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado
- Cerrado final base granular K0+000 - K0+240.

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 25-12-2023 Lunes

No se realizan actividades - Día festivo

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 26-12-2023 Martes

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Cuadrilla de pavimentos, Maestro & ayudantes

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactadores, pavimentadora, Retroexcavadora, Equipo topográfico, herr. menor

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado
- Riego de imprimación entre las abscisas K0+000 - K0+240.
- Instalación de mezcla asfaltica entre las abscisas K0+000 - K0+240

Ing. Residente Insp. Interventoría

(*) Fecha: 27-12-2023 Miercoles

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta

Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr. menor

→ Actividades ejecutadas:

- Instalación de bordillo prefabricado
- Instalación base granular K0+240 - K0+300

Ing. Residente — Insp. Interventoría

Fecha: 28-12-2023 Jueves.

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr menor.

→ Actividades ejecutadas

- Instalación de bordillo prefabricado
- Atraque de bordillo

Ing Residente — Insp Interventoría

Fecha: 29-12-2023 Viernes

Clima: Soleado

Personal: Ing. residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes

Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, herr menor

→ Actividades ejecutadas

- Terminación de instalación y embogurrado de bordillo prefabricado entre K0+000 - K0+400

Ing Residente — Insp Interventoría

* Fecha: 30-12-2023 Sábado
No se realizan actividades

Ing. Residente — Insp Interventoría

* Fecha: 01-01-2024 Lunes
Día festivo - No se realizan actividades

Ing. Residente — Insp Interventoría

* Fecha: 02-01-2024 Martes
Clima: Soleado
No se realizaron actividades.

Ing. Residente — Insp Interventoría

* Fecha: 03-01-2024 Miercoles
Clima: Soleado
No se realizaron actividades

Ing. Residente — Insp Interventoría


* Fecha: 04-01-2024 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente, Interventoría, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, herramienta menor, Rana
→ Actividades ejecutadas.
· Excavación manual para rampas de acceso a viviendas.

Ing. Residente — Insp Interventoría

⊛ Fecha: 05-01-2024 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Maestro 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Her. menor, Rana
→ Actividades ejecutadas
- Excavación manual para rampas de acceso a viviendas.
- Compactación de afirmado para atraque de bordillos




Ing Residente




Insp Interventoría

⊛ Fecha: 06-01-2024 Sábado
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Maestro 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Retroexcavadora Vibrocompactador, Her menor, Rana
→ Actividades ejecutadas
- Excavación manual para rampas de acceso a viviendas
- Compactación de afirmado para atraque de bordillos.



Ing Residente



Insp interventoría

⊛ Fecha: 08-01-2024 Lunes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Maestro 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Her menor, Rana

→ Actividades ejecutadas
- Excavación manual para rampas de acceso a viviendas
- Instalación de base granular para rampas de acceso a viviendas.
- Inicio construcción de sumidero N°1.

Ing Residente Insp Interventor

⊛ Fecha: 09-01-2024 Martes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, Herr. menor, Rana
→ Actividades ejecutadas.
- Instalación base granular para rampas de acceso a viviendas.
- Armado de acero para rampas de acceso a viviendas.
- Finalización de construcción de sumidero N°1
- Instalación afirmado para arranque de bordillos.

Ing Residente Insp Interventoría

⊛ Fecha: 10-01-2024 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, Herr menor, Rana

→ Actividades ejecutadas
- Compactación de afirmado para anden de bordillos
- Armado acero para rampas de acceso a viviendas
- Inicio construcción de sumidero N°2.

Ing Residente Insp Interventoría

⊛ Fecha: 11-01-2024 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografia, Herr menor
→ Actividades ejecutadas
- Excavación manual para rampas de acceso a viviendas.
- Armado acero para rampas de acceso a viviendas.
- Finalización construcción de sumidero N°2.

Ing Residente Insp Interventoría

⊛ Fecha: 12-01-2024 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografia, Herr menor
→ Actividades ejecutadas
- Instalación de base para rampas de acceso a

viviendas.
- Armado de acero para rampas de acceso a viviendas.
- Inst base granular para cesado entre las abscisas Km+300 - Km+400.

Ing Residente Insp. Interventoría

(*) 13-01-2024 Sábado
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico, Herr menor
→ Actividades ejecutadas
- Armado acero para rampas de acceso a viviendas.
- Instalación base granular para cesado entre las abscisas Km+300 - Km+400.

Ing Residente Insp Interventoría

(*) 15-01-2024 Lunes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topografico Herr menor
→ Actividades ejecutadas
- Compactación base granular entre las abscisas Km+300 - Km+400.
- Inicio construcción de sumidero N°3

· Se funde concreto 21 MPa para construcción de rampas de acceso a viviendas

Ing Residente Insp Interventoría

* Fecha: 16-01-2024 Martes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, Her. menor.
→ Actividades ejecutadas
· Armado de acero para rampas de acceso a viviendas.
· Inicio construcción sumidero N°3.

Ing. Residente Insp Interventoría

* Fecha: 17-01-2024 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoría, Cuadrilla topográfica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Equipo topográfico, Her menor.
→ Actividades ejecutadas
· Armado acero para rampas de acceso a viviendas.
· Compactación base granular entre las abscisas K0+300 - K0+400.

Ing Residente Insp Interventoría

(*) Fecha: 18-01-2024 Jueves
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoria, Cuadrilla topografica, Operadores, Cuadrilla de pavimento, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Volqueta, Vibrocompactador, pavimentadora, Retroexcavadora, Equipo topografico Herr. menor
→ Actividades ejecutadas
- Riego de impregnación entre las abscisas K0+240 - K0+400.
- Instalación de mezcla asfaltica entre las abscisas K0+240 - K0+400

Ing Residente Insp Interventoria

(*) Fecha: 19-01-2024 Viernes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoria, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, (Pavimen), Equipo topografica, Herr. menor.
→ Actividades ejecutadas
- Se funde concreto 21 MPa para rampas de acceso a viviendas.

Ing Residente Insp Interventoria

(*) Fecha: 20-01-2024 Sábado
Clima: Soleado
Personal: Ing residente, Interventoria, Cuadrilla topografica, Operadores, Maestro, 6 ayudantes.
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador,

Retroexcavadora, Herr. menor.
→ Actividades ejecutadas
• Inicio construcción sumidero N°4

Ing Residente Insp Interventoría

Ⓐ Fecha: 22-04-2024 Lunes
Clima: Soleado
Personal: Ing residente Interventoria, Maestro 6 ayudantes
Maquinaria y Equipo: Herr. menor
→ Actividades ejecutadas
• Finalización construcción de sumidero N°4

Ing Residente Insp Interventoría

CARTERAS TOPOGRÁFICAS

CARTERA DE MDC-19

ABSCISA	IZQUIERDA			EJE			DERECHA					
ABSCISA	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ALTURA	AREA	VOLUMEN
K0+000	1,123,217.51	1,118,279.23	2519,92	1,123,215.66	1,118,277.54	2519,92	1,123,213.81	1,118,275.86	2519,92	0,09	0,45	
												4,50
K0+010	1,123,224.24	1,118,271.83	2519,93	1,123,222.39	1,118,270.15	2519,92	1,123,220.54	1,118,268.46	2519,9	0,09	0,45	
												4,50
K0+020	1,123,230.92	1,118,264.26	2519,97	1,123,229.01	1,118,262.65	2519,92	1,123,227.09	1,118,261.04	2519,87	0,09	0,45	
												4,50
K0+030	1,123,237.30	1,118,256.52	2520,03	1,123,235.37	1,118,254.93	2519,98	1,123,233.44	1,118,253.34	2519,93	0,09	0,45	
												4,50
K0+040	1,123,243.60	1,118,248.72	2520,09	1,123,241.65	1,118,247.15	2520,04	1,123,239.71	1,118,245.59	2519,99	0,09	0,45	
												4,50
K0+050	1,123,249.87	1,118,240.94	2520,15	1,123,247.93	1,118,239.37	2520,1	1,123,245.98	1,118,237.80	2520,05	0,09	0,45	
												4,50
K0+060	1,123,256.16	1,118,233.23	2520,21	1,123,254.25	1,118,231.62	2520,16	1,123,252.34	1,118,230.01	2520,11	0,09	0,45	
												4,50
K0+070	1,123,262.60	1,118,225.56	2520,27	1,123,260.68	1,118,223.96	2520,22	1,123,258.75	1,118,222.36	2520,17	0,09	0,45	
												4,50
K0+080	1,123,268.99	1,118,217.89	2520,33	1,123,267.08	1,118,216.28	2520,28	1,123,265.17	1,118,214.67	2520,23	0,09	0,45	
												4,50
K0+090	1,123,275.41	1,118,210.12	2520,39	1,123,273.45	1,118,208.57	2520,34	1,123,271.49	1,118,207.02	2520,29	0,09	0,45	
												4,50
K0+100	1,123,281.63	1,118,202.39	2520,45	1,123,279.72	1,118,200.78	2520,4	1,123,277.81	1,118,199.17	2520,35	0,09	0,45	
												4,50
K0+110	1,123,288.08	1,118,194.71	2520,5	1,123,286.15	1,118,193.12	2520,45	1,123,284.22	1,118,191.53	2520,4	0,09	0,45	
												4,50
K0+120	1,123,294.45	1,118,187.01	2520,56	1,123,292.53	1,118,185.42	2520,51	1,123,290.60	1,118,183.82	2520,46	0,09	0,45	
												4,50
K0+130	1,123,300.83	1,118,179.27	2520,62	1,123,298.88	1,118,177.70	2520,57	1,123,296.94	1,118,176.13	2520,52	0,09	0,45	
												4,50
K0+140	1,123,307.12	1,118,171.55	2520,68	1,123,305.20	1,118,169.95	2520,63	1,123,303.28	1,118,168.34	2520,58	0,09	0,45	
												4,50
K0+150	1,123,313.51	1,118,163.76	2520,74	1,123,311.54	1,118,162.22	2520,69	1,123,309.58	1,118,160.67	2520,64	0,09	0,45	
												4,50
K0+160	1,123,319.69	1,118,155.89	2520,8	1,123,317.72	1,118,154.35	2520,75	1,123,315.75	1,118,152.82	2520,7	0,09	0,45	
												4,50
K0+170	1,123,325.85	1,118,148.09	2520,86	1,123,323.92	1,118,146.51	2520,81	1,123,321.98	1,118,144.92	2520,76	0,09	0,45	
												4,50
K0+180	1,123,332.18	1,118,140.28	2520,92	1,123,330.21	1,118,138.73	2520,87	1,123,328.24	1,118,137.19	2520,82	0,09	0,45	
												4,50
K0+190	1,123,338.35	1,118,132.38	2520,99	1,123,336.37	1,118,130.85	2520,94	1,123,334.39	1,118,129.32	2520,89	0,09	0,45	
												4,50
K0+200	1,123,344.47	1,118,124.53	2521,07	1,123,342.52	1,118,122.97	2521,02	1,123,340.56	1,118,121.41	2520,97	0,09	0,45	
												4,50
K0+210	1,123,350.69	1,118,116.65	2521,16	1,123,348.71	1,118,115.12	2521,11	1,123,346.74	1,118,113.59	2521,06	0,09	0,45	
												4,50
K0+220	1,123,356.78	1,118,108.64	2521,26	1,123,354.77	1,118,107.16	2521,21	1,123,352.75	1,118,105.68	2521,16	0,09	0,45	
												4,50
K0+230	1,123,362.71	1,118,100.67	2521,36	1,123,360.73	1,118,099.13	2521,31	1,123,358.75	1,118,097.60	2521,26	0,09	0,45	
												4,50
K0+240	1,123,368.84	1,118,092.85	2521,45	1,123,366.91	1,118,091.27	2521,4	1,123,364.97	1,118,089.69	2521,35	0,09	0,45	
												4,50
K0+250	1,123,375.17	1,118,085.02	2521,55	1,123,373.19	1,118,083.49	2521,5	1,123,371.21	1,118,081.96	2521,45	0,09	0,45	

													4,50
K0+260	1,123,381.27	1,118,077.11	2521,65	1,123,379.29	1,118,075.57	2521,6	1,123,377.32	1,118,074.03	2521,56	0,09	0,45		
													4,50
K0+270	1,123,387.40	1,118,069.09	2521,73	1,123,385.37	1,118,067.63	2521,69	1,123,383.34	1,118,066.17	2521,65	0,09	0,45		
													4,50
K0+280	1,123,392.92	1,118,060.40	2521,79	1,123,390.72	1,118,059.20	2521,79	1,123,388.53	1,118,058.00	2521,75	0,09	0,45		
													4,50
K0+290	1,123,398.26	1,118,052.17	2521,86	1,123,396.16	1,118,050.81	2521,89	1,123,394.07	1,118,049.45	2521,84	0,09	0,45		
													4,50
K0+300	1,123,403.69	1,118,043.73	2521,92	1,123,401.58	1,118,042.40	2521,98	1,123,399.46	1,118,041.07	2521,92	0,09	0,45		
													4,50
K0+310	1,123,409.12	1,118,035.53	2522,02	1,123,407.09	1,118,034.07	2522,08	1,123,405.07	1,118,032.60	2522,02	0,09	0,45		
													4,50
K0+320	1,123,415.08	1,118,027.59	2522,12	1,123,413.09	1,118,026.07	2522,18	1,123,411.11	1,118,024.54	2522,12	0,09	0,45		
													4,50
K0+330	1,123,421.27	1,118,019.82	2522,17	1,123,419.33	1,118,018.25	2522,23	1,123,417.39	1,118,016.68	2522,17	0,09	0,45		
													4,50
K0+340	1,123,427.70	1,118,012.24	2522,27	1,123,425.79	1,118,010.62	2522,33	1,123,423.89	1,118,009.00	2522,27	0,09	0,45		
													4,50
K0+350	1,123,434.21	1,118,004.67	2522,37	1,123,432.32	1,118,003.04	2522,43	1,123,430.42	1,118,001.41	2522,37	0,09	0,45		
													4,50
K0+360	1,123,440.52	1,117,996.77	2522,47	1,123,438.56	1,117,995.23	2522,53	1,123,436.59	1,117,993.68	2522,47	0,09	0,45		
													4,50
K0+370	1,123,447.08	1,117,989.48	2522,57	1,123,445.24	1,117,987.79	2522,63	1,123,443.40	1,117,986.10	2522,57	0,09	0,45		
													4,50
K0+380	1,123,453.50	1,117,981.59	2522,67	1,123,451.54	1,117,980.03	2522,73	1,123,449.58	1,117,978.48	2522,67	0,09	0,45		
													4,50
K0+390	1,123,460.01	1,117,974.22	2522,76	1,123,458.16	1,117,972.54	2522,82	1,123,456.31	1,117,970.86	2522,76	0,09	0,45		
													4,50
K0+400	1,123,466.17	1,117,966.59	2522,86	1,123,464.20	1,117,965.05	2522,92	1,123,462.23	1,117,963.51	2522,86	0,09	0,45		

VOLUMEN TOTAL DE CORTE	*180,00*
FACTOR EXPANSIÓN	*221,4*

CARTERA DE BASE

ABSCISA	IZQUIERDA			EJE			DERECHA					
ABSCISA	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ALTURA	AREA	VOLUMEN
K0+000	1,123,217.51	1,118,279.23	2519,83	1,123,215.66	1,118,277.54	2519,83	1,123,213.81	1,118,275.86	2519,83	0,20	1,08	
												10,80
K0+010	1,123,224.24	1,118,271.83	2519,84	1,123,222.39	1,118,270.15	2519,83	1,123,220.54	1,118,268.46	2519,81	0,20	1,08	
												10,80
K0+020	1,123,230.92	1,118,264.26	2519,88	1,123,229.01	1,118,262.65	2519,83	1,123,227.09	1,118,261.04	2519,78	0,20	1,08	
												10,80
K0+030	1,123,237.30	1,118,256.52	2519,94	1,123,235.37	1,118,254.93	2519,89	1,123,233.44	1,118,253.34	2519,84	0,20	1,08	
												10,80
K0+040	1,123,243.60	1,118,248.72	2520	1,123,241.65	1,118,247.15	2519,95	1,123,239.71	1,118,245.59	2519,9	0,20	1,08	
												10,80
K0+050	1,123,249.87	1,118,240.94	2520,06	1,123,247.93	1,118,239.37	2520,01	1,123,245.98	1,118,237.80	2519,96	0,20	1,08	
												10,80
K0+060	1,123,256.16	1,118,233.23	2520,12	1,123,254.25	1,118,231.62	2520,07	1,123,252.34	1,118,230.01	2520,02	0,20	1,08	
												10,80
K0+070	1,123,262.60	1,118,225.56	2520,18	1,123,260.68	1,118,223.96	2520,13	1,123,258.75	1,118,222.36	2520,08	0,20	1,08	
												10,80
K0+080	1,123,268.99	1,118,217.89	2520,24	1,123,267.08	1,118,216.28	2520,19	1,123,265.17	1,118,214.67	2520,14	0,20	1,08	
												10,80
K0+090	1,123,275.41	1,118,210.12	2520,3	1,123,273.45	1,118,208.57	2520,25	1,123,271.49	1,118,207.02	2520,2	0,20	1,08	
												10,80
K0+100	1,123,281.63	1,118,202.39	2520,36	1,123,279.72	1,118,200.78	2520,31	1,123,277.81	1,118,199.17	2520,26	0,20	1,08	
												10,80
K0+110	1,123,288.08	1,118,194.71	2520,41	1,123,286.15	1,118,193.12	2520,36	1,123,284.22	1,118,191.53	2520,31	0,20	1,08	
												10,80
K0+120	1,123,294.45	1,118,187.01	2520,47	1,123,292.53	1,118,185.42	2520,42	1,123,290.60	1,118,183.82	2520,37	0,20	1,08	
												10,80
K0+130	1,123,300.83	1,118,179.27	2520,53	1,123,298.88	1,118,177.70	2520,48	1,123,296.94	1,118,176.13	2520,43	0,20	1,08	
												10,80
K0+140	1,123,307.12	1,118,171.55	2520,59	1,123,305.20	1,118,169.95	2520,54	1,123,303.28	1,118,168.34	2520,49	0,20	1,08	
												10,80
K0+150	1,123,313.51	1,118,163.76	2520,65	1,123,311.54	1,118,162.22	2520,6	1,123,309.58	1,118,160.67	2520,55	0,20	1,08	
												10,80
K0+160	1,123,319.69	1,118,155.89	2520,71	1,123,317.72	1,118,154.35	2520,66	1,123,315.75	1,118,152.82	2520,61	0,20	1,08	
												10,80
K0+170	1,123,325.85	1,118,148.09	2520,77	1,123,323.92	1,118,146.51	2520,72	1,123,321.98	1,118,144.92	2520,67	0,20	1,08	
												10,80
K0+180	1,123,332.18	1,118,140.28	2520,83	1,123,330.21	1,118,138.73	2520,78	1,123,328.24	1,118,137.19	2520,73	0,20	1,08	
												10,80
K0+190	1,123,338.35	1,118,132.38	2520,9	1,123,336.37	1,118,130.85	2520,85	1,123,334.39	1,118,129.32	2520,8	0,20	1,08	
												10,80
K0+200	1,123,344.47	1,118,124.53	2520,98	1,123,342.52	1,118,122.97	2520,93	1,123,340.56	1,118,121.41	2520,88	0,20	1,08	
												10,80
K0+210	1,123,350.69	1,118,116.65	2521,07	1,123,348.71	1,118,115.12	2521,02	1,123,346.74	1,118,113.59	2520,97	0,20	1,08	
												10,80
K0+220	1,123,356.78	1,118,108.64	2521,17	1,123,354.77	1,118,107.16	2521,12	1,123,352.75	1,118,105.68	2521,07	0,20	1,08	
												10,80
K0+230	1,123,362.71	1,118,100.67	2521,27	1,123,360.73	1,118,099.13	2521,22	1,123,358.75	1,118,097.60	2521,17	0,20	1,08	
												10,80
K0+240	1,123,368.84	1,118,092.85	2521,36	1,123,366.91	1,118,091.27	2521,31	1,123,364.97	1,118,089.69	2521,26	0,20	1,08	
												10,80
K0+250	1,123,375.17	1,118,085.02	2521,46	1,123,373.19	1,118,083.49	2521,41	1,123,371.21	1,118,081.96	2521,36	0,20	1,08	
												10,80
K0+260	1,123,381.27	1,118,077.11	2521,56	1,123,379.29	1,118,075.57	2521,51	1,123,377.32	1,118,074.03	2521,47	0,20	1,08	
												10,80
K0+270	1,123,387.40	1,118,069.09	2521,64	1,123,385.37	1,118,067.63	2521,6	1,123,383.34	1,118,066.17	2521,56	0,20	1,08	

													10,80
K0+280	1,123,392.92	1,118,060.40	2521,7	1,123,390.72	1,118,059.20	2521,7	1,123,388.53	1,118,058.00	2521,66	0,20	1,08		
													10,80
K0+290	1,123,398.26	1,118,052.17	2521,77	1,123,396.16	1,118,050.81	2521,8	1,123,394.07	1,118,049.45	2521,75	0,20	1,08		
													10,80
K0+300	1,123,403.69	1,118,043.73	2521,83	1,123,401.58	1,118,042.40	2521,89	1,123,399.46	1,118,041.07	2521,83	0,20	1,08		
													11,40
K0+310	1,123,409.12	1,118,035.53	2521,93	1,123,407.09	1,118,034.07	2521,99	1,123,405.07	1,118,032.60	2521,93	0,20	1,20		
													12,00
K0+320	1,123,415.08	1,118,027.59	2522,03	1,123,413.09	1,118,026.07	2522,09	1,123,411.11	1,118,024.54	2522,03	0,20	1,20		
													12,00
K0+330	1,123,421.27	1,118,019.82	2522,08	1,123,419.33	1,118,018.25	2522,14	1,123,417.39	1,118,016.68	2522,08	0,20	1,20		
													12,00
K0+340	1,123,427.70	1,118,012.24	2522,18	1,123,425.79	1,118,010.62	2522,24	1,123,423.89	1,118,009.00	2522,18	0,20	1,20		
													12,00
K0+350	1,123,434.21	1,118,004.67	2522,28	1,123,432.32	1,118,003.04	2522,34	1,123,430.42	1,118,001.41	2522,28	0,20	1,20		
													12,00
K0+360	1,123,440.52	1,117,996.77	2522,38	1,123,438.56	1,117,995.23	2522,44	1,123,436.59	1,117,993.68	2522,38	0,20	1,20		
													12,00
K0+370	1,123,447.08	1,117,989.48	2522,48	1,123,445.24	1,117,987.79	2522,54	1,123,443.40	1,117,986.10	2522,48	0,20	1,20		
													12,00
K0+380	1,123,453.50	1,117,981.59	2522,58	1,123,451.54	1,117,980.03	2522,64	1,123,449.58	1,117,978.48	2522,58	0,20	1,20		
													12,00
K0+390	1,123,460.01	1,117,974.22	2522,67	1,123,458.16	1,117,972.54	2522,73	1,123,456.31	1,117,970.86	2522,67	0,20	1,20		
													12,00
K0+400	1,123,466.17	1,117,966.59	2522,77	1,123,464.20	1,117,965.05	2522,83	1,123,462.23	1,117,963.51	2522,77	0,20	1,20		

VOLUMEN TOTAL DE CORTE	*443,40*
FACTOR EXPANSIÓN	*545,382*

CARTERA DE SUBBASE

ABSCISA	IZQUIERDA			EJE			DERECHA					
ABSCISA	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ALTURA	AREA	VOLUMEN
K0+000	1,123,217.51	1,118,279.23	2519,63	1,123,215.66	1,118,277.54	2519,63	1,123,213.81	1,118,275.86	2519,63	0,20	1,08	
												10,80
K0+010	1,123,224.24	1,118,271.83	2519,64	1,123,222.39	1,118,270.15	2519,63	1,123,220.54	1,118,268.46	2519,61	0,20	1,08	
												10,80
K0+020	1,123,230.92	1,118,264.26	2519,68	1,123,229.01	1,118,262.65	2519,63	1,123,227.09	1,118,261.04	2519,58	0,20	1,08	
												10,80
K0+030	1,123,237.30	1,118,256.52	2519,74	1,123,235.37	1,118,254.93	2519,69	1,123,233.44	1,118,253.34	2519,64	0,20	1,08	
												10,80
K0+040	1,123,243.60	1,118,248.72	2519,8	1,123,241.65	1,118,247.15	2519,75	1,123,239.71	1,118,245.59	2519,7	0,20	1,08	
												10,80
K0+050	1,123,249.87	1,118,240.94	2519,86	1,123,247.93	1,118,239.37	2519,81	1,123,245.98	1,118,237.80	2519,76	0,20	1,08	
												10,80
K0+060	1,123,256.16	1,118,233.23	2519,92	1,123,254.25	1,118,231.62	2519,87	1,123,252.34	1,118,230.01	2519,82	0,20	1,08	
												10,80
K0+070	1,123,262.60	1,118,225.56	2519,98	1,123,260.68	1,118,223.96	2519,93	1,123,258.75	1,118,222.36	2519,88	0,20	1,08	
												10,80
K0+080	1,123,268.99	1,118,217.89	2520,04	1,123,267.08	1,118,216.28	2519,99	1,123,265.17	1,118,214.67	2519,94	0,20	1,08	
												10,80
K0+090	1,123,275.41	1,118,210.12	2520,1	1,123,273.45	1,118,208.57	2520,05	1,123,271.49	1,118,207.02	2520	0,20	1,08	
												10,80
K0+100	1,123,281.63	1,118,202.39	2520,16	1,123,279.72	1,118,200.78	2520,11	1,123,277.81	1,118,199.17	2520,06	0,20	1,08	
												10,80
K0+110	1,123,288.08	1,118,194.71	2520,21	1,123,286.15	1,118,193.12	2520,16	1,123,284.22	1,118,191.53	2520,11	0,20	1,08	
												10,80
K0+120	1,123,294.45	1,118,187.01	2520,27	1,123,292.53	1,118,185.42	2520,22	1,123,290.60	1,118,183.82	2520,17	0,20	1,08	
												10,80
K0+130	1,123,300.83	1,118,179.27	2520,33	1,123,298.88	1,118,177.70	2520,28	1,123,296.94	1,118,176.13	2520,23	0,20	1,08	
												10,80
K0+140	1,123,307.12	1,118,171.55	2520,39	1,123,305.20	1,118,169.95	2520,34	1,123,303.28	1,118,168.34	2520,29	0,20	1,08	
												10,80
K0+150	1,123,313.51	1,118,163.76	2520,45	1,123,311.54	1,118,162.22	2520,4	1,123,309.58	1,118,160.67	2520,35	0,20	1,08	
												10,80
K0+160	1,123,319.69	1,118,155.89	2520,51	1,123,317.72	1,118,154.35	2520,46	1,123,315.75	1,118,152.82	2520,41	0,20	1,08	
												10,80
K0+170	1,123,325.85	1,118,148.09	2520,57	1,123,323.92	1,118,146.51	2520,52	1,123,321.98	1,118,144.92	2520,47	0,20	1,08	
												10,80
K0+180	1,123,332.18	1,118,140.28	2520,63	1,123,330.21	1,118,138.73	2520,58	1,123,328.24	1,118,137.19	2520,53	0,20	1,08	
												10,80
K0+190	1,123,338.35	1,118,132.38	2520,7	1,123,336.37	1,118,130.85	2520,65	1,123,334.39	1,118,129.32	2520,6	0,20	1,08	
												10,80
K0+200	1,123,344.47	1,118,124.53	2520,78	1,123,342.52	1,118,122.97	2520,73	1,123,340.56	1,118,121.41	2520,68	0,20	1,08	
												10,80
K0+210	1,123,350.69	1,118,116.65	2520,87	1,123,348.71	1,118,115.12	2520,82	1,123,346.74	1,118,113.59	2520,77	0,20	1,08	
												10,80
K0+220	1,123,356.78	1,118,108.64	2520,97	1,123,354.77	1,118,107.16	2520,92	1,123,352.75	1,118,105.68	2520,87	0,20	1,08	
												10,80
K0+230	1,123,362.71	1,118,100.67	2521,07	1,123,360.73	1,118,099.13	2521,02	1,123,358.75	1,118,097.60	2520,97	0,20	1,08	
												10,80
K0+240	1,123,368.84	1,118,092.85	2521,16	1,123,366.91	1,118,091.27	2521,11	1,123,364.97	1,118,089.69	2521,06	0,20	1,08	
												10,80
K0+250	1,123,375.17	1,118,085.02	2521,26	1,123,373.19	1,118,083.49	2521,21	1,123,371.21	1,118,081.96	2521,16	0,20	1,08	
												10,80
K0+260	1,123,381.27	1,118,077.11	2521,36	1,123,379.29	1,118,075.57	2521,31	1,123,377.32	1,118,074.03	2521,27	0,20	1,08	
												10,80
K0+270	1,123,387.40	1,118,069.09	2521,44	1,123,385.37	1,118,067.63	2521,4	1,123,383.34	1,118,066.17	2521,36	0,20	1,08	

K0+280	1,123,392.92	1,118,060.40	2521,5	1,123,390.72	1,118,059.20	2521,5	1,123,388.53	1,118,058.00	2521,46	0,20	1,08		10,80
K0+290	1,123,398.26	1,118,052.17	2521,57	1,123,396.16	1,118,050.81	2521,6	1,123,394.07	1,118,049.45	2521,55	0,20	1,08		10,80
K0+300	1,123,403.69	1,118,043.73	2521,63	1,123,401.58	1,118,042.40	2521,69	1,123,399.46	1,118,041.07	2521,63	0,20	1,08		10,80
K0+310	1,123,409.12	1,118,035.53	2521,73	1,123,407.09	1,118,034.07	2521,79	1,123,405.07	1,118,032.60	2521,73	0,20	1,20		11,40
K0+320	1,123,415.08	1,118,027.59	2521,83	1,123,413.09	1,118,026.07	2521,89	1,123,411.11	1,118,024.54	2521,83	0,20	1,20		12,00
K0+330	1,123,421.27	1,118,019.82	2521,88	1,123,419.33	1,118,018.25	2521,94	1,123,417.39	1,118,016.68	2521,88	0,20	1,20		12,00
K0+340	1,123,427.70	1,118,012.24	2521,98	1,123,425.79	1,118,010.62	2522,04	1,123,423.89	1,118,009.00	2521,98	0,20	1,20		12,00
K0+350	1,123,434.21	1,118,004.67	2522,08	1,123,432.32	1,118,003.04	2522,14	1,123,430.42	1,118,001.41	2522,08	0,20	1,20		12,00
K0+360	1,123,440.52	1,117,996.77	2522,18	1,123,438.56	1,117,995.23	2522,24	1,123,436.59	1,117,993.68	2522,18	0,20	1,20		12,00
K0+370	1,123,447.08	1,117,989.48	2522,28	1,123,445.24	1,117,987.79	2522,34	1,123,443.40	1,117,986.10	2522,28	0,20	1,20		12,00
K0+380	1,123,453.50	1,117,981.59	2522,38	1,123,451.54	1,117,980.03	2522,44	1,123,449.58	1,117,978.48	2522,38	0,20	1,20		12,00
K0+390	1,123,460.01	1,117,974.22	2522,47	1,123,458.16	1,117,972.54	2522,53	1,123,456.31	1,117,970.86	2522,47	0,20	1,20		12,00
K0+400	1,123,466.17	1,117,966.59	2522,57	1,123,464.20	1,117,965.05	2522,63	1,123,462.23	1,117,963.51	2522,57	0,20	1,20		12,00

VOLUMEN TOTAL DE CORTE	*443,40*
FACTOR EXPANSIÓN	*545,382*

CARTERA DE EXCAVACIÓN

ABSCISA	IZQUIERDA			EJE			DERECHA					
ABSCISA	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ESTE	NORTE	ELEVACIÓN	ALTURA	AREA	VOLUMEN
K0+000	1,123,217.51	1,118,279.23	2519,43	1,123,215.66	1,118,277.54	2519,38	1,123,213.81	1,118,275.86	2519,33	-0,30	-1,64	
												-16,81
K0+010	1,123,224.24	1,118,271.83	2519,44	1,123,222.39	1,118,270.15	2519,39	1,123,220.54	1,118,268.46	2519,34	-0,32	-1,73	
												-16,36
K0+020	1,123,230.92	1,118,264.26	2519,48	1,123,229.01	1,118,262.65	2519,43	1,123,227.09	1,118,261.04	2519,38	-0,29	-1,55	
												-14,92
K0+030	1,123,237.30	1,118,256.52	2519,54	1,123,235.37	1,118,254.93	2519,49	1,123,233.44	1,118,253.34	2519,44	-0,27	-1,44	
												-14,92
K0+040	1,123,243.60	1,118,248.72	2519,5	1,123,241.65	1,118,247.15	2519,45	1,123,239.71	1,118,245.59	2519,4	-0,29	-1,55	
												-12,58
K0+050	1,123,249.87	1,118,240.94	2519,66	1,123,247.93	1,118,239.37	2519,61	1,123,245.98	1,118,237.80	2519,56	-0,18	-0,97	
												-10,06
K0+060	1,123,256.16	1,118,233.23	2519,72	1,123,254.25	1,118,231.62	2519,67	1,123,252.34	1,118,230.01	2519,62	-0,19	-1,04	
												-8,89
K0+070	1,123,262.60	1,118,225.56	2519,78	1,123,260.68	1,118,223.96	2519,73	1,123,258.75	1,118,222.36	2519,68	-0,14	-0,74	
												-7,36
K0+080	1,123,268.99	1,118,217.89	2519,84	1,123,267.08	1,118,216.28	2519,79	1,123,265.17	1,118,214.67	2519,74	-0,14	-0,74	
												-7,45
K0+090	1,123,275.41	1,118,210.12	2519,9	1,123,273.45	1,118,208.57	2519,85	1,123,271.49	1,118,207.02	2519,8	-0,14	-0,75	
												-8,62
K0+100	1,123,281.63	1,118,202.39	2519,96	1,123,279.72	1,118,200.78	2519,91	1,123,277.81	1,118,199.17	2519,86	-0,18	-0,97	
												-7,72
K0+110	1,123,288.08	1,118,194.71	2520,01	1,123,286.15	1,118,193.12	2519,96	1,123,284.22	1,118,191.53	2519,91	-0,11	-0,57	
												-4,48
K0+120	1,123,294.45	1,118,187.01	2520,07	1,123,292.53	1,118,185.42	2520,02	1,123,290.60	1,118,183.82	2519,97	-0,06	-0,32	
												-4,03
K0+130	1,123,300.83	1,118,179.27	2520,13	1,123,298.88	1,118,177.70	2520,08	1,123,296.94	1,118,176.13	2520,03	-0,09	-0,48	
												-4,84
K0+140	1,123,307.12	1,118,171.55	2520,19	1,123,305.20	1,118,169.95	2520,14	1,123,303.28	1,118,168.34	2520,09	-0,09	-0,48	
												-5,11
K0+150	1,123,313.51	1,118,163.76	2520,25	1,123,311.54	1,118,162.22	2520,2	1,123,309.58	1,118,160.67	2520,15	-0,10	-0,54	
												-5,47
K0+160	1,123,319.69	1,118,155.89	2520,31	1,123,317.72	1,118,154.35	2520,26	1,123,315.75	1,118,152.82	2520,21	-0,10	-0,56	
												-6,55
K0+170	1,123,325.85	1,118,148.09	2520,37	1,123,323.92	1,118,146.51	2520,32	1,123,321.98	1,118,144.92	2520,27	-0,14	-0,75	
												-7,09
K0+180	1,123,332.18	1,118,140.28	2520,43	1,123,330.21	1,118,138.73	2520,38	1,123,328.24	1,118,137.19	2520,33	-0,12	-0,66	
												-7,18
K0+190	1,123,338.35	1,118,132.38	2520,5	1,123,336.37	1,118,130.85	2520,45	1,123,334.39	1,118,129.32	2520,4	-0,14	-0,77	
												-8,80
K0+200	1,123,344.47	1,118,124.53	2520,58	1,123,342.52	1,118,122.97	2520,53	1,123,340.56	1,118,121.41	2520,48	-0,18	-0,99	
												-9,52
K0+210	1,123,350.69	1,118,116.65	2520,67	1,123,348.71	1,118,115.12	2520,62	1,123,346.74	1,118,113.59	2520,57	-0,17	-0,92	
												-8,08
K0+220	1,123,356.78	1,118,108.64	2520,77	1,123,354.77	1,118,107.16	2520,72	1,123,352.75	1,118,105.68	2520,67	-0,13	-0,70	
												-6,64
K0+230	1,123,362.71	1,118,100.67	2520,87	1,123,360.73	1,118,099.13	2520,82	1,123,358.75	1,118,097.60	2520,77	-0,12	-0,63	
												-7,63
K0+240	1,123,368.84	1,118,092.85	2520,96	1,123,366.91	1,118,091.27	2520,91	1,123,364.97	1,118,089.69	2520,86	-0,17	-0,90	
												-10,78
K0+250	1,123,375.17	1,118,085.02	2521,06	1,123,373.19	1,118,083.49	2521,01	1,123,371.21	1,118,081.96	2520,96	-0,23	-1,26	
												-11,50
K0+260	1,123,381.27	1,118,077.11	2521,16	1,123,379.29	1,118,075.57	2521,11	1,123,377.32	1,118,074.03	2521,07	-0,19	-1,04	
												-11,32
K0+270	1,123,387.40	1,118,069.09	2521,24	1,123,385.37	1,118,067.63	2521,2	1,123,383.34	1,118,066.17	2521,16	-0,23	-1,22	

													-13,93
K0+280	1,123,392.92	1,118,060.40	2521,3	1,123,390.72	1,118,059.20	2521,3	1,123,388.53	1,118,058.00	2521,26	-0,29	-1,56		
													-16,72
K0+290	1,123,398.26	1,118,052.17	2521,37	1,123,396.16	1,118,050.81	2521,4	1,123,394.07	1,118,049.45	2521,35	-0,33	-1,78		
													-18,79
K0+300	1,123,403.69	1,118,043.73	2521,43	1,123,401.58	1,118,042.40	2521,49	1,123,399.46	1,118,041.07	2521,43	-0,37	-1,98		
													-17,62
K0+310	1,123,409.12	1,118,035.53	2521,53	1,123,407.09	1,118,034.07	2521,59	1,123,405.07	1,118,032.60	2521,53	-0,29	-1,55		
													-13,03
K0+320	1,123,415.08	1,118,027.59	2521,63	1,123,413.09	1,118,026.07	2521,69	1,123,411.11	1,118,024.54	2521,63	-0,20	-1,06		
													-9,70
K0+330	1,123,421.27	1,118,019.82	2521,68	1,123,419.33	1,118,018.25	2521,74	1,123,417.39	1,118,016.68	2521,68	-0,16	-0,88		
													-7,54
K0+340	1,123,427.70	1,118,012.24	2521,78	1,123,425.79	1,118,010.62	2521,84	1,123,423.89	1,118,009.00	2521,78	-0,12	-0,63		
													-4,48
K0+350	1,123,434.21	1,118,004.67	2521,88	1,123,432.32	1,118,003.04	2521,94	1,123,430.42	1,118,001.41	2521,88	-0,05	-0,27		
													-3,67
K0+360	1,123,440.52	1,117,996.77	2521,98	1,123,438.56	1,117,995.23	2522,04	1,123,436.59	1,117,993.68	2521,98	-0,09	-0,47		
													-8,08
K0+370	1,123,447.08	1,117,989.48	2522,08	1,123,445.24	1,117,987.79	2522,14	1,123,443.40	1,117,986.10	2522,08	-0,21	-1,15		
													-11,05
K0+380	1,123,453.50	1,117,981.59	2522,18	1,123,451.54	1,117,980.03	2522,24	1,123,449.58	1,117,978.48	2522,18	-0,20	-1,06		
													-10,33
K0+390	1,123,460.01	1,117,974.22	2522,27	1,123,458.16	1,117,972.54	2522,33	1,123,456.31	1,117,970.86	2522,27	-0,19	-1,01		
													-8,98
K0+400	1,123,466.17	1,117,966.59	2522,37	1,123,464.20	1,117,965.05	2522,43	1,123,462.23	1,117,963.51	2522,37	-0,15	-0,79		

VOLUMEN TOTAL DE CORTE	*-388,80*
FACTOR EXPANSIÓN	*-478,224*

ACTAS RELACIONADAS AL PROYECTO

VIGENTE DESDE: 20/04/2023	**ACTA DE REUNIÓN** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 20230725		PAVIBOY
Página ___ de ___	CÓDIGO:	VERSIÓN: 0	

ACTA N° _____

FECHA	17/10/2023	**HORA INICIO**	9:15 AM	**HORA FIN**	10:30.
LUGAR	Propiedad Manuel Granados.				
PROYECTO					
PROCESO/ REDACTOR	Leidy Tibaduiza A.	**ASUNTO**	Atencion ciudadana.		

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO	FIRMA
Leidy Tibaduiza Aiboleda	Profesional de Apoyo	
Cristhian Camilo Plazas Tapias	Ing. Residente	
Manuel Granados Perez	Propietario	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Cumplir con el compromiso de socializacion adquirido con el Señor Manuel Heiman Granados Perez.

Este documento pertenece a CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director del consorcio.

VIGENTE DESDE: 20/04/2023	**ACTA DE REUNIÓN** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 20230725	PAVIBOY
Página ___ de ___	CÓDIGO:	VERSIÓN: 0

DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 9:15 Am se atiende el llamado del señor Manuel con el objetivo de escuchar la solicitud que tiene con la via alterna que se tenia como desvio en el PMT version 0.

El señor Manuel expone que la via es privada y solicita la Humectacion de la via debido a que los carros continuan circulando por esta via privada.

De parte del contratista Paviboy se explica que debido a las nuevas condiciones conocidas y expuestas por la comunidad en la reunion de socializacion, Paviboy en reunion con el instituto de transito de sogamoso se estableció y se solicito la modificacion del PMT para cierre parcial de la via con Horarios de cierre y apertura en hora pico, sin rutas de desvio alternas.
los Horarios programados para cierre de via es de 7:40 A 12:30 y de 1:40 A 4:30 pm. El contratista debera instalar señalizacion del cierre y entregar volantes informativos, los cuales a la fecha ~~XXX~~ ya se encuentran instalados y entregados, en el transcurso de la semana se continuara repartiendo volantes para informacion de la comunidad

Razon por la cual la solicitud de humectacion de la via no se puede atender debido a las nuevas condiciones de PMT y del conocimiento de que la via es privada, el contratista informa que se realizaron unas adecuaciones por el paso temporal que se genero en dias pasado.

Este documento pertenece a CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director del consorcio.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El señor Manuel muestra la escritura del predio El corral con numero 2991 de 20/10/2011 de la notaria segunda donde expone " un lote de terreno denominado El corral ubicado en la vereda de vanegas de sogamoso departamento de Boyaca identificado catastralmente con el numero 00020000500920000 con un area de 6400 mtz compriendido en linderos: por un costado con de los vendedores, por la cabezera con rafael pineda quebrada al medio, por otro costado con Uriano de. Jesus Tarino y por el pie con la callejuela de parcelacion al primer lindero y cabera.

Una vez conocido lo anterior se continua con el cierre por horarios.

Este documento pertenece a CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director del consorcio.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Este documento pertenece a CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa autorización escrita del director del consorcio.

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

NIT: 891.855.130-1

S.G.C

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2018//05	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento:
SOCIALIZACION DEL ALCANCE DEL CONTRATO 20230725 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

Lugar: VEREDA VANEGAS, MUNICIPIO SOGAMOSO | **Fecha:** 05 DE OCTUBRE DE 2023

Hora Iniciación: 3 PM | **Hora finalización:**

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
	Mercedes Alvarez			Mercedes Alvarez	
	Ana Alvarez			Ana Alvarez	
	Isaura Cely	Vanegas			
	Carmen Granados	Vanegas			
	Angela Alvarado				Angela Alvarado
	Luis Alberto Barrera	Vanegas			
	Herminda Vargas	Vanegas			Herminda Vargas
	Diana Marcela Chaparro	Vanegas		Lizethchaparro995@gmail.com	Diana M. Chaparro
	claudia olaya Gonzalez				Claudia Olaya

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

NIT: 891.855.130-1

S.G.C

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2018//05	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento:
SOCIALIZACION DEL ALCANCE DEL CONTRATO 20230725 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

Lugar: VEREDA VANEGAS, MUNICIPIO SOGAMOSO | **Fecha:** 05 DE OCTUBRE DE 2023

Hora Iniciación: 3 PM | **Hora finalización:**

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
	Ricaborto Alfonso Perez	Alcaldía Sogamoso	Alcalde.	alcalde@sogamoso-boyaca.gov.co	
	LUIS ALEJANDRO NIÑO F	Presidente de la JAC Vanegas	Presidente	luisalejandro500@gmail.com	
	William A. Wilches S.	ALCALDIA SOGAMOSO	PROF. ESPECIALIZADA		
	Jenny Estepa	Vanegas		esje152@yahoo.es	
	Bertha Lilia Perez	Vanegas		Bertha1Perez26@hotmail.com	
	Jorge Eliecer Barrera	Vanegas		JoelBap5@hotmail.com	
	Deisy Ordoz D.	Aposentos		optica megaceuter@Hotmail.com	
	Jesus Rios	Aposentos	director interventoria contrato plan	riosch2@arroyogarzon@gmail.com	
	Yokelyn Bolaños	Aposentos		Hormiba24@hotmail.com	

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

NIT: 891.855.130-1

S.G.C

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2018//05	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento:
SOCIALIZACION DEL ALCANCE DEL CONTRATO 20230725 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

Lugar: VEREDA VANEGAS, MUNICIPIO SOGAMOSO | **Fecha:** 05 DE OCTUBRE DE 2023

Hora Iniciación: 3 PM | **Hora finalización:**

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
	MARTIN SALAMANCA				
	John Rosas Mesa	Habitante			
	José Nino	Parroquia	Parroco	sraeelnmebotail.com	
	Luis M Solamanca	Habitante			
	Herneleuda Bello	Habitante			
	Carlos FAVIAN TORRES	11	—		
	Belen ovejero				
	Ana Belen Garcia				
	campotio				

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

NIT: 891.855.130-1

S.G.C

CÓDIGO: AGH-01-02-F-02	LISTA DE ASISTENCIA	FECHA 2018//05	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

Nombre del Evento:
SOCIALIZACION DEL ALCANCE DEL CONTRATO 20230725 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL"

Lugar: VEREDA VANEGAS, MUNICIPIO SOGAMOSO | **Fecha:** 05 DE OCTUBRE DE 2023

Hora Iniciación: 3 PM | **Hora finalización:**

No.	Nombre	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
	Diana Teiana	contratista		sgfitv_9@hotmail.	
	Gina Marcela Avila	Contratista	Ing. Proyector	ingginamarcela@gmail.com	
	Yaney Sua de Salas				
	Susana Aguelas T			susanagaguilar2007@hotmail.com	
	Emjree Aranguren D				
	Luis Antonio Marin				
	Héctor Helio Figueroa Mendoza			Contratista Yolmo es	
	[illegible]				
	Margarita Pinedo			Margarita Pinedo	Margarita Pinedo
	Reyes Mora Mora				

Firma Organizador	Firma Capacitador	Vo.Bo. Firma Secretario y/o Jefe Oficina

PAVIBOY

ACTA DE CONVENIENCIA

Sogamoso, octubre de 2023

Ref: CONTRATO N° 20230725 **Objeto:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.

ACTA DE CONVENIENCIA

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. Conviene con la señora **FLOR AMANDA SARMIENTO CORREA** identificada con c.c. nº 46360025 de Sogamoso, la disposición de material estéril provenientes de las obras contempladas dentro de las actividades constructivas realizadas el proyecto Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Sogamoso departamento de Boyacá, contemplado dentro del contrato de la referencia, para ser utilizado como relleno de un lote de su propiedad ubicado en la vereda Vanegas del municipio de Sogamoso.

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS no se compromete a realizar la inclusión de obras adicionales, se recomienda no realizar ningún tipo de construcción sobre este relleno, por lo menos en un término de cinco años, aclarando que el contratista no es la entidad competente para autorizar o desautorizar algún tipo de intervención en el predio.

Conforme a lo anterior el señor **FLOR AMANDA SARMIENTO CORREA** firma a conformidad.

CC No 46360025
Propietario

CC No 1.057.596.566
Ing. Residente

CC No 1.053.587.755
Ing. Ambiental

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 200625291631372140 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 25 de Junio de 2020 a las 11:08:21 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 095 - SOGAMOSO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SOGAMOSO VEREDA: VANEGAS
FECHA APERTURA: 08-06-1999 RADICACIÓN: 1999-15314 CON: ESCRITURA DE: 21-05-1955
CODIGO CATASTRAL: **15759000200000005011200000000**COD CATASTRAL ANT: 15759000200050112000
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 200625291631372140 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 25 de Junio de 2020 a las 11:08:21 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 07-12-2016 Radicación: 2016-10416

Doc: ESCRITURA 1664 del 25-11-2016 NOTARIA PRIMERA de SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA TOTALIDAD 12.5%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS CARMENZA CC# 46352262

A: ROJAS SAAVEDRA EDGAR **CC# 79235436 X**

A: ROJAS SAAVEDRA MARCELA **CC# 52094966 X**

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 13-02-2017 Radicación: 2017-984

Doc: ESCRITURA 160. del 06-02-2017 NOTARIA PRIMERA de SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD; 1.144.25 M2., CORRESPONDIENTES AL 12.50% DEL IMMUEBLE).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS MARIA TERESA CC# 41627765

A: CHAPARRO DE VARGAS DORA ESPERANZA **CC# 33449924 X**

A: VARGAS VARGAS JAIME **CC# 19131661 X**

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 21-05-2018 Radicación: 2018-4274

Doc: ESCRITURA 731. del 16-05-2018 NOTARIA PRIMERA de SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL CABALLERO ALEJANDRO CC# 1015460968

DE: BERNAL CABALLERO SERGIO AUGUSTO CC# 1019010713

A: SARMIENTO CORREA FLOR AMANDA **CC# 46360025 X 12.50 %.**

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 01-06-2020 Radicación: 2020-2524

Doc: ESCRITURA 410. del 20-05-2020 NOTARIA PRIMERA de SOGAMOSO VALOR ACTO: $13,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (PARTE EQUIVALENTE AL 6.25% DEL INMUEBLE).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS GLADYS CC# 46360489

A: COLMENARES MONTA/EZ GERMAN ARTURO **CC# 9399016 X**

A: NOMESQUE PEREZ MARY LUZ **CC# 23946200 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *11*

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

Sogamoso 29 de noviembre de 2023

Señores: PAVIBOY

(CONTRATO VIA APOSENTOS VANEGAS SOGAMOSO)

Respetados señores

Solicitamos de su valiosa colaboración, en la instalación de baja rampa en la totalidad del frente de la vivienda de mi propiedad, ya que se proyecta dejar dos ingresos vehiculares a corto plazo.

De antemano agradezco su colaboración.

Atentamente;

Leonardo Moreno Quintana

CC. 74770016

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230410415674930010 **Nro Matrícula: 095-52933**

Impreso el 10 de Abril de 2023 a las 09:55:46 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 095 - SOGAMOSO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SOGAMOSO VEREDA: VANEGAS
FECHA APERTURA: 25-08-1989 RADICACIÓN: 89-04637 CON: ESCRITURA DE: 27-11-1987
CODIGO CATASTRAL: **15759000200000005100300000000**0COD CATASTRAL ANT: 157590002000510030000
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION DE LOS APELLIDOS DE LA PROPIETARIA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: QUINTANA LARA FLORANGELA CC# 51645645

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 14-12-2016 Radicación: 2016-095-6-10608

Doc: ESCRITURA 2.928 DEL 10-12-2016 NOTARIA SEGUNDA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $3,000,000

ESPECIFICACION: OTRO: 0911 DECLARACION DE CONSTRUCCION EN SUELO PROPIO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MORENO BARRERA REINALDO CC# 19199532 (SUCESION).

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 14-12-2016 Radicación: 2016-095-6-10608

Doc: ESCRITURA 2.928 DEL 10-12-2016 NOTARIA SEGUNDA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $12,638,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION "PROINDIVISO".

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MORENO BARRERA REINALDO CC# 19199532

A: MORENO QUINTANA ALDEDIER **CC# 74182821 X 16.66 %.**

A: MORENO QUINTANA DIANA PATRICIA **CC# 1052388657 X 16.66 %.**

A: MORENO QUINTANA LEONARDO **CC# 74770016 X 16.66 %.**

A: QUINTANA LARA FLORANGELA **CC# 51645645 X 50.00 %.**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 12-03-2021 Radicación: 2021-095-6-2583

Doc: ESCRITURA 330 DEL 05-03-2021 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $10,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA TOTALIDAD

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MORENO QUINTANA DIANA PATRICIA CC# 1052388657

A: MORENO QUINTANA LEONARDO **CC# 74770016 X 16.66%**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2011-095-3-121 Fecha: 25-08-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2014-095-3-52 Fecha: 08-05-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

---

* * *

* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Impreso el 10 de Abril de 2023 a las 09:55:46 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

= = = =

PAVIBOY	ACTA DE CONVENIENCIA

Sogamoso, 11 octubre de 2023

Ref: CONTRATO N° 20230725 Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.

ACTA DE CONVENIENCIA

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S. de acuerdo con la solicitud realizada el día 10 de octubre de 2023 ; por el señor(a) Mercedes Alvares Acevedo identificado (a) con c.c. nº 33447642, Conviene la disposición de material estéril provenientes de las obras contempladas dentro de las actividades constructivas realizadas en el proyecto *Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Sogamoso departamento de Boyacá*, en el lote de su propiedad ubicado en la vereda Vanegas del municipio de Sogamoso identificado con matrícula inmobiliaria numero 095-76743.

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS no realizara obras de intervención diferentes a la disposición del material solicitado por el propietario.

Como es de conocimiento del propietario, la empresa recomienda no realizar ningún tipo de construcción sobre este relleno, por lo menos en un término de cinco años, aclarando que el contratista no es la entidad competente para autorizar o desautorizar algún tipo de intervención en el predio, cualquier construcción a realizar deberá realizar la solicitud a la alcaldía municipal de Sogamoso.

Conforme a lo anterior el señor(a) Mercedes Alvares Acevedo firma a conformidad.

Mercedes Alvarez

CC No 33.447.642.
Propietario

CC No 1.057.596.566
Ing. Residente

CC No 1062813135
Ing. Residente Interventoría

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

46.358.816

APELLIDOS

BERNAL ROJAS

NOMBRES

ESPERANZA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1963

SOGAMOSO

(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

07-MAY-1983 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45127021-F-0046358816-20050620 02527 05171A 02 154741646

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230716978679591475 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 16 de Julio de 2023 a las 08:56:21 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 095 - SOGAMOSO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SOGAMOSO VEREDA: VANEGAS
FECHA APERTURA: 08-06-1999 RADICACIÓN: 1999-15314 CON: ESCRITURA DE: 21-05-1955
CODIGO CATASTRAL: **15759000200000005011200000000**COD CATASTRAL ANT: 15759000200050112000
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= = = =

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230716978679591475 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 16 de Julio de 2023 a las 08:56:21 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

A: ZABALA CAICEDO ROBERTO **CC# 8422331**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 15-08-2008 Radicación: 2008-095-6-6316

Doc: ESCRITURA 1085 DEL 28-07-2008 NOTARIA 1 DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION PROINDIVISO (PARTE RESTANTE 9.154M2.-)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL PATIÑO LUIS ANTONIO CC# 1156449

A: BERNAL ROJAS ALVARO **CC# 79241736 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS CARMENZA **CC# 46352262 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS ESPERANZA **CC# 46358816 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS GLADYS **CC# 46360489 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS JAIME ALBERTO **CC# 6768714 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS LUIS ANTONIO **CC# 9518755 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS MARIA TERESA **CC# 41627765 X 12.5%**

A: BERNAL ROJAS NELLY **CC# 33449007 X 12.5%**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 12-02-2014 Radicación: 2014-095-6-1056

Doc: ESCRITURA 0055 DEL 13-01-2014 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $10,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA TOTALIDAD (12.5%)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS NELLY CC# 33449007

A: ROA DE BARRERA GLORIA FANNY **CC# 46350472 X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 12-02-2014 Radicación: 2014-095-6-1057

Doc: ESCRITURA 171 DEL 06-02-2014 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION A ESCRITURA 055 DEL 13-01-2014 (AREA VENDIDA 1.144,25 M2.)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS NELLY CC# 33449007

A: ROA DE BARRERA GLORIA FANNY **CC# 46350472**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 27-03-2014 Radicación: 2014-095-6-2418

Doc: ESCRITURA 398 DEL 15-03-2014 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $10,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA TOTALIDAD (12.5%)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS LUIS ANTONIO CC# 9518755

A: BARRERA ROA LAURA CATALINA **CC# 1057576908 X**

A: BARRERA ROA URIEL ALONSO **CC# 74185964 X**

Powered by CamScanner

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 06-12-2016 Radicación: 2016-095-6-10343

Doc: ESCRITURA 1374 DEL 06-09-2016 NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $7,500,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0301 ADJUDICACION SUCESION DERECHO DE CUOTA TOTALIDAD (12.5%)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS JAIME ALBERTO CC# 6768714

A: BERNAL CABALLERO ALEJANDRO CC# 1015460968 X 6.25%

A: BERNAL CABALLERO SERGIO AUGUSTO CC# 1019010713 X 6.25%

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 07-12-2016 Radicación: 2016-095-6-10416

Doc: ESCRITURA 1664 DEL 25-11-2016 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA TOTALIDAD 12.5%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS CARMENZA CC# 46352262

A: ROJAS SAAVEDRA EDGAR CC# 79235436 X

A: ROJAS SAAVEDRA MARCELA CC# 52094966 X

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 13-02-2017 Radicación: 2017-095-6-984

Doc: ESCRITURA 160 DEL 06-02-2017 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD; 1.144.25 M2., CORRESPONDIENTES AL 12.50% DEL IMMUEBLE).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS MARIA TERESA CC# 41627765

A: CHAPARRO DE VARGAS DORA ESPERANZA CC# 33449924 X

A: VARGAS VARGAS JAIME CC# 19131661 X

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 21-05-2018 Radicación: 2018-095-6-4274

Doc: ESCRITURA 731 DEL 16-05-2018 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $8,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL CABALLERO ALEJANDRO CC# 1015460968

DE: BERNAL CABALLERO SERGIO AUGUSTO CC# 1019010713

A: SARMIENTO CORREA FLOR AMANDA CC# 46360025 X 12.50 %.

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 01-06-2020 Radicación: 2020-095-6-2524

Doc: ESCRITURA 410 DEL 20-05-2020 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $13,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (PARTE EQUIVALENTE AL 6.25% DEL INMUEBLE).

Powered by CamScanner

La validez de este documento podrá verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230716978679591475 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 16 de Julio de 2023 a las 08:56:21 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BERNAL ROJAS GLADYS CC# 46360489

A: COLMENARES MONTAÑEZ GERMAN ARTURO **CC# 9399016 X**

A: NOMESQUE PEREZ MARY LUZ **CC# 23946200 X**

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 26-05-2022 Radicación: 2022-095-6-5246

Doc: ESCRITURA 1047 DEL 23-05-2022 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $11,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD EQUIVALENTE AL 6.25% DEL INMUEBLE).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BARRERA ROA URIEL ALONSO CC# 74185964

A: FREYRE TORRES VLADIMIR IVAN **CC# 1026255582 X 6.25 %.**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *12*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2011-095-3-121 Fecha: 25-08-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2014-095-3-52 Fecha: 08-05-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

---

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

Powered by CamScanner

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230716978679591475 **Nro Matrícula: 095-98916**

Impreso el 16 de Julio de 2023 a las 08:56:21 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-095-1-29840 **FECHA: 16-07-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: LUIS ALBERTO LEON MEJIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **33.447.642**

ALVAREZ ACEVEDO

APELLIDOS

MERCEDES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1953**

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

17-DIC-1974 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0727700-01018809-F-0033447642-20180629 0061761292G 1 7325021369

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231009214883697906 **Nro Matrícula: 095-76743**

Impreso el 9 de Octubre de 2023 a las 11:06:20 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 095 - SOGAMOSO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SOGAMOSO VEREDA: VANEGAS
FECHA APERTURA: 26-07-1994 RADICACIÓN: 94-09904 CON: ESCRITURA DE: 03-08-1972
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

==========

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
LOTE.- 1,200M2.- LINDEROS DE LA ESCRITURA N. 987 DE 03-08-72 DE LA NOTARIA 2. DE SOGAMOSO.-

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION LA MELGA

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 16-10-1972 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 987 DEL 03-08-1972 NOTARIA 2. DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $4,500

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALVAREZ ACEVEDO JOSE AVELINO

A: ALVAREZ ACEVEDO MERCEDES **CC# 33447642** X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10-01-2013 Radicación: 2013-095-6-176

Doc: ESCRITURA 2046 DEL 28-12-2012 NOTARIA PRIMERA DE SOGAMOSO VALOR ACTO: $1,600,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA PARTE 85M2.-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALVAREZ ACEVEDO MERCEDES CC# 33447642

A: RINCON ALVAREZ NIDIA MARLEN **CC# 23770488** X

A: SANABRIA ZAMBRANO FEDERICO **CC# 9531551** X

...documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231127181485931318 **Nro Matrícula: 095-145787**

Pagina 1 TURNO: 2023-095-1-50149

Impreso el 27 de Noviembre de 2023 a las 12:23:18 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 095 - SOGAMOSO DEPTO: BOYACA MUNICIPIO: SOGAMOSO VEREDA: VANEGAS
FECHA APERTURA: 11-05-2016 RADICACIÓN: 2016-3425 CON: SENTENCIA DE: 04-05-2016
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

==========

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE NUMERO UNO Y CONSTRUCCION. CON AREA DE 2.250.00 M2. CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN SENTENCIA NUMERO SIN. DE FECHA 07-04-2016 DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SOGAMOSO. (ARTICULO 8, PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012). LINDEROS: POR EL SUR O FRENTE: CON LA VIA CARRETEABLE QUE CONDUCE AL SECTOR DE APOSENTOS DE LA VEREDA DE VANEGAS, EN UNA LONGITUD DE 42.00 METROS; POR EL NORTE: CON PREDIOS DE LA SE/ORA MARIA ELINDA PINEDA GUTIERREZ, EN UNA LONGITUD DE 50.52 METROS; POR EL OCCIDENTE: CON PREDIO DE HEREDEROS DE LUIS FELIPE BARRERA, EN LONGITUD DE 50.52 METROS Y ENCIERRA

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

PINEDA GUTIERREZ MARIA ELINDA: ADQUIRIO POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. (PERTENENECIA FOLIO MATRIZ N. 095-14377).

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL
1) LT VILLA NUEVA UNO

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

M. CULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

095 - 14377

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 04-05-2016 Radicación: 2016-095-6-3425

Doc: SENTENCIA SIN. DEL 07-04-2016 JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SOGAMOSO

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0131 DECLARACION JUDICIAL DE PERTENENCIA (DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, EN SENTENCIA DE ACCION DE TUTELA DE FECHA 25-04-2016).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PINEDA GUTIERREZ MARIA ELINDA **CC# 24107266 X**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 24-02-2022 Radicación: 2022-095-6-1934

Doc: ESCRITURA 1995 DEL 16-12-2021 NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA, D.C. VALOR ACTO: $20,000,000

Este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SOGAMOSO
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231127181485931318 **Nro Matrícula: 095-145787**

Impreso el 27 de Noviembre de 2023 a las 12:23:18 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA MODALIDAD: (NOVIS) "PROINDIVISO".

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINEDA GUTIERREZ MARIA ELINDA CC# 24107266

A: PINEDA PINEDA PUBLIO ERNESTO **CC# 79442344 X**

A: PINEDA PINEDA SIERVO DE JESUS **CC# 9520534 X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-02-2022 Radicación: 2022-095-6-1935

Doc: ESCRITURA 138 DEL 04-02-2022 NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA, D.C. VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION Y ADICION A LA ESCRITURA NUMERO 1.995 DEL 16-12-2021, DE LA NOTARIA 47 DE BOGOTÁ. (INCLUYEN EN LA VENTA LA CONSTRUCCIÓN QUE APARECE PUBLICITADA EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA Y QUE SE DEJO DE CITAR EN . ESCRITURA OBJETO DE ACLARACIÓN).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINEDA GUTIERREZ MARIA ELINDA CC# 24107266

A: PINEDA PINEDA PUBLIO ERNESTO **CC# 79442344**

A: PINEDA PINEDA SIERVO DE JESUS **CC# 9520534**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 05-09-2022 Radicación: 2022-095-6-9109

Doc: ESCRITURA 1354 DEL 05-08-2022 NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA, D.C. VALOR ACTO: $9,500,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA (TOTALIDAD EQUIVALENTE AL 50% DEL INMUEBLE).

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINEDA PINEDA PUBLIO ERNESTO CC# 79442344

A: PINEDA PINEDA SIERVO DE JESUS **CC# 9520534 X 50.00 %.**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 05-09-2022 Radicación: 2022-095-6-9110

Do SCRITURA 1355 DEL 05-08-2022 NOTARIA CUARENTA Y SIETE DE BOGOTA, D.C. VALOR ACTO: $2,000,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0343 SERVIDUMBRE DE TRANSITO ACTIVA AREA= 100.32 MTS. POR 5.00 MTS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PINEDA PINEDA PUBLIO ERNESTO CC# 79442344

A: PINEDA PINEDA SIERVO DE JESUS **CC# 9520534**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

* * *

* * *

* * *

La validez de este documento podra verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Impreso el 27 de Noviembre de 2023 a las 12:23:18 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

= = = =

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY SAS

No.20230725

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ,ciudadana colombiano, identificada con la cédula de ciudadanía número **46.384.037** en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación según acta de posesión 214 del 01 de septiembre de 2022, actuando en nombre y representación del Municipio de Sogamoso, con NIT. 891.855.130-1 en uso de las facultades y funciones delegadas a través del Decreto de Delegación 023 del 13 de febrero de 2017, quien para los efectos del presente documento se denominará el **MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY SAS,con Nit:8260020511,**Representante legal **EMILIANO VARGAS MESA,**identificado con número de cedula **9.520.277**de Sogamosoquien para los efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA,** persona que bajo la gravedad de juramento manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para contratar con el Municipio, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra , que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás disposiciones legales y reglamentarias, en especial por las cláusulas que más adelante se establecen, previas las siguientes consideraciones:**1.**El municipio de Sogamoso en desarrollo del plan "*Sogamoso Tarea de Todos*", tiene como objetivo mejorar la movilidad mediante la rehabilitación de la malla vial. Dentro de sus proyectos esta "Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad", código BMPI 2023157590045, que busca en sus metas de producto asociadas el mantenimiento de 105 kilómetros de vías rurales.Uno de los métodos para cumplir con esta meta, es la realización de Convenios Interadministrativos con entidades nacionales y departamentales, por tal razón se firmó el Convenio 1444 de 2022 denominado "Aunar esfuerzo para el mantenimiento y mejoramiento de Vías Rurales en el Municipio de Sogamoso, Departamento de Boyacá del Programa Colombia Rural Nacional" con el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, el cual tiene como objeto tiene como objeto "La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte".**2.**La ejecución de las obras de adecuación en las vías de la malla vial urbana, permitirá realizar la rehabilitación, en donde existen fallas estructurales del pavimento y que requieren del mantenimiento oportuno, además disminuir riesgo y mejorar la movilidad de los transeúntes y los automotores que transitan por estas vías. **3.**Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, se requiere contratar una Persona Natural y/o Jurídica idónea en la Ejecución de Obras Civiles de Infraestructura, que lleve a cabo la **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.4.**.Que mediante Resolución **N° 1371** Del 19 de julio de 2023,se ordenó la apertura de proceso de selección Abreviada de Menor cuantía **SAMC-012-2023**para la escogencia del contratista. **5.**Que una vez agotada el procedimiento previsto por la ley para esta modalidad de contratación, se adjudicó el Contrato mediante Resolución 1484 del 10 de Agosto del 2023 al proponente **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S,** con **NIT. 826002051-1,**Representante legal **EMILIANO VARGAS MESA,**identificado con número de cedula **9.520.277**de Sogamoso,dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo de la **SAMC-012-2023.7.-**Que existe disponibilidad presupuestal, para atender este gasto. **PRIMERA:**

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL."SEGUNDA:OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:OBLIGACIONES GENERALES:1. Gestionar y acreditar en la plataforma SECOP II los requisitos de ejecución que corresponden al contratista.**2.**Acudir oportunamente al diligenciamiento del acta de inicio.**3.**Ejecutar el contrato de conformidad con las normas técnicas que rigen la actividad para la cual ha sido contratado.**4.**Subir a SECOP II todos los documentos que la plataforma requiera o que sean solicitados por el supervisor del contrato o por la oficina de contratación del municipio.**5.**Programar con el supervisor las actividades necesarias para la ejecución del contrato.**6.**Acatar las instrucciones que imparta el municipio por medio del secretario del despacho o del supervisor del contrato.**7.**Reportar al supervisor del contrato los imprevistos o anomalías que detecte y que impidan la correcta y oportuna ejecución del contrato.**8.**Reportar al supervisor del contrato los imprevistos o anomalías que detecte y que impidan la correcta y oportuna ejecución del contrato.**9.**Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato y adjuntar las pruebas documentales que se consideren necesarias, tales como fotografías, videos, correspondencia, planillas de asistencia o cualquiera pertinente para probar la debida ejecución del contrato.**10.**Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato y adjuntar las pruebas documentales que se consideren necesarias, tales como fotografías, videos, correspondencia, planillas de asistencia o cualquiera pertinente para probar la debida ejecución del contrato.**11.**Cumplir la obligación de facturar de conformidad con el régimen legal al cual pertenezca el contratista.**12.**Pagar oportunamente las obligaciones relativas al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales cuando a estos últimos haya lugar haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen aclaren.**13.**Informar al supervisor de manera inmediata sobre la ocurrencia de cualquier fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito.**14.**En caso de que este contrato requiera de garantías, proceder a constituirlas luego de aprobado el contrato.**15.**El contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos que establece SG-SST decreto 1072 de 2015 Min Trabajo; de igual manera, asistir a las capacitaciones y/o actividades que sobre el tema haya lugar.**16.**Entregar los documentos que se producen, como consecuencia del objeto contractual, tanto físico como digital, debidamente organizados, acorde a la tabla de retención documental según lineamientos de Archivo Central.**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:1.**El contratista ejecutará las cantidades de obra contratada, en el sitio definido en el texto del contrato, cumpliendo con las especificaciones definidas en el presupuesto oficial y lo requerido por el Interventor.**2.**El CONTRATISTA, en caso de que no tenga sede en esta municipalidad, bien sea persona jurídica o natural, deberá instalar una Sede - campamento en el Municipio o zona cercana al lugar de las obras a intervenir, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. So pena de incurrir en la sanción establecida por el incumplimiento de esta obligación contractual.**3.**El CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el MUNICIPIO DE SOGAMOSO y la ciudadanía, previo acuerdo con la Interventoría antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la Interventoría velar porque se cumpla esta disposición.**4.**Además del Personal Profesional Residente, el CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.El personal que participe en la ejecución de la obra será

contratado directamente por el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, podrá solicitar en cualquier momento el reemplazo de algún trabajador o empleado del CONTRATISTA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.**5**.El CONTRATISTA y la Interventoría deberán elaborar el acta de recibo de obra y liquidación parcial mensual dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítem (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato.**6**.Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el MUNICIPIO DE SOGAMOSO se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.**7**.Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la Interventoría para que proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría Técnica podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales o extras, ni a prórrogas en el plazo de ejecución.**8**.El MUNICIPIO DE SOGAMOSO y la INTERVENTORÍA - podrán rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al CONTRATISTA.**9**.Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, el Interventor o Interventor y de terceras personas.**10.**Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor o Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de estos, ni se cause perjuicio alguno a los predios aledaños al lugar de las obras a intervenir. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra, así como las barreras y elementos mencionados en este numeral, no tendrán ítem de pago, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato.**11**.El contratista deberá incluir personal perteneciente a la población beneficiaria de los Programas de Prosperidad Social, que residan en la zona de influencia. Cuando no exista personal disponible, el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que laInterventoría pueda aprobar el inicio de la ejecución del

contrato.**12.**Instalar valla informativa la cual corresponderá a la vigente establecida por el Ministerio de Transporte. El costo debe ser tenido en cuenta en el AIU.**13.**El CONTRASTISTA debe presentar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA, programa de obra y de inversiones, hojas de vida del personal profesional, documentación que se deberá presentar al interventor para su aprobación según los lineamientos y especificaciones del INVIAS.El contratista ejecutará de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, de conformidad con los ítems, cantidades, especificaciones técnicas y valores unitarios que ofertó y que a continuación se indican:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCION APROXIMADA 350 ML PAVIMENTO FLEXIBLE								
1	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	1.006,20	$ 20.200,00	$ 20.325.240,00
2	330.3	330-13		Base Granular Clase C Gradacion Gruesa	m3	351,00	$ 140.000,00	$ 49.140.000,00
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	m3	468,00	$ 128.000,00	$ 59.904.000,00
4	450.2	450-13		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19-Compra de mezcla	m3	187,20	$ 865.190,00	$ 161.963.568,00
5	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	10.202,40	$ 7.500,00	$ 76.518.000,00
6	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21 MPa (D)	m3	107,64	$ 885.000,00	$ 95.261.400,00
Subtotal								$ 463.112.208,00
SECCIÓN 2 - PROTOCOLO BIOSEGURIDAD								
Subtotal								
SECCIÓN 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA								
8	1P			CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL	Km	13,10	$ 641.059,00	$ 8.397.873,00
9	2P			Revisión y/o ajuste de Estudios y Diseños Bas	GL	1,00	$ 7.470.804,00	$ 7.470.804,00
SUBTOTAL								$ 15.868.677,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 478.980.885,00

Página 1

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	$ 463.112.208,00
DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 4.205.123,00
VALOR BASICO OBRA (A) + (B) = (C)	$ 467.317.331,00
VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA = (D)	$ 15.868.677,00
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%) = (E)	$ 3.015.049,00
VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) = (C+ D + E) = (F)	$ 486.201.057,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

TERCERA. TERMINO:Se pacta por el término de **TRES(03) MESES** que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio.**CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato incluido **AIU(30%)** que corresponde al valor estimado para las obras, el cual no está gravado con el impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, es por la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($486.201.057)**, del cual el subtotales es **CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE ($483.186.008)**, el **VALOR**

del **IVA** que corresponde a la consultoría **(19%)** de **TRES MILLONES QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.015.049).** El Valor del presente contrato se cancelará al contratista de la siguiente forma: **El municipio pagará el precio del contrato así:**Mediante pagos parciales de acuerdo al avance de ejecución. El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera:- Pagos parciales cuya sumatoria no podrá superar el equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, aprobadas por el Interventor designado para tal fin.-Un Pago final, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vez ejecutadas y liquidado en un cien por ciento (100%) el objeto del contrato, previa la presentación de las respectivas actas de liquidación aprobadas por el Interventor del contrato.**Para efectuar los pagos será necesario:**1. La entrega al Interventor de un informe en donde se indiquen las cantidades ejecutadas, con los respectivos soportes.2. La presentación del Informe de Ejecución Contractual por parte del Interventor, en la que se indique que se cumplieron las obligaciones del contrato. 3. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) si aplica.4. La radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores.**Nota:** De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla Pro-Adulto Mayor y Procultura, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato, el cual corresponde al 3% y 2% respectivamente del valor este.**QUINTA. SUPERVISION:** La supervisión del contrato será ejercida por **DEISSY LORENA COY SALAMANCA** ,Secretaria de Infraestrutura y/o quien haga sus veces quien tendrá además de las funciones que por la naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 1993, El Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio Decreto 291 del 27 de diciembre de 2016 y demás normas pertinentes. Además, deberá: a.) Certificar la prestación del servicio contratado en las condiciones exigidas por el MUNICIPIO. b.) Revisar y firmar el Informe de Ejecución Contractual rendido por el CONTRATISTA. c.) Verificar como requisito para cada pago que el contratista haya cancelado la seguridad social integral, es decir salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes. d.) Cumplir con las funciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e.) Informar a la Oficina de Contratación del Municipio con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles, la necesidad de introducir modificaciones, adiciones, terminación anticipada de común acuerdo o similares respecto del contrato. **SEXTA. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:**se compromete a pagar al **CONTRATISTA** la suma acordada con cargo al Presupuesto vigencia 2022, Acuerdo 035 de 2031 y Decreto 452 de 2021 Y DECRETO 484 DE 2021, con las Cuentas que se discriminan así:

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	CPC	Valor a imputar
2023001110	2.3.2.02.02.005-24-32-28-2402-16-1.3.1.1.07	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	01	53211	**$486.201.057**
TOTAL					**$ 486.201.057**

SEPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podrá suspender temporalmente la ejecución de este contrato por mutuo acuerdo entre las partes en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, igualmente cuando se considere necesario por parte del Municipio, también con el consentimiento de ambas partes, pero por causas ajenas a la responsabilidad del contratista.

OCTAVA. GARANTIAS: El CONTRATISTA deberá cubrir los riesgos que a continuación se establecen mediante garantía debidamente constituida a favor del Municipio de Sogamoso, siguiendo los requerimientos y modalidades ordenadas en el Decreto 1082 de 2015: **CUMPLIMIENTODELCONTRATO** (Art. 221.2.31.12. Decreto 1082 / 2015): Por el **DIEZ (10%)** del valor del contrato, durante el término de ejecución del contrato y **SEIS(6)** meses más, contados a partir de la expedición de la garantía. **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** El valor de este amparo será equivalente al **VEINTE(20%)** por ciento del valor del contrato, con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (3) años más. **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** (Art. 221.2.31.12. Decreto 1082 / 2015): Por el TREINTA **(30%)** del valor del contrato, durante el término de ejecución del contrato y CINCO **(5)** años más, contados a partir de la expedición de la garantía.**CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS**.El valor de este amparo será equivalente al **TREINTA (30%)** por ciento del valor total de estos ítems y **CINCO (5)** años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobacion definitiva de la calidad de la revision ,ajustes y/o actualizacion y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por el equivalente a **200 salarios** mínimo mensuales legales vigentes y vigente durante el término de ejecución del contrato.El régimen de garantías se somete a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de Entrega y Recibo Definitivo del bien, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al **CONTRATISTA** de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Municipio de sogamoso.El contratista debe realizar el cargue y publicación de las pólizas a que haya lugar del contrato celebrado y/o otrosí realizado, dentro de la plataforma SECOP II, en la sección de condiciones, de igual forma deberá enviar las pólizas al siguiente correo electrónico contratación@sogamoso-boyaca.gov.co, con las siguientes indicaciones: asunto (entrega de pólizas), número de contrato y nombre de contratista o en su defecto podrán ser radicadas en físico en la oficina de contratación, lo anterior teniendo en cuenta que la plataforma no contempla una alerta al momento del cargue de las pólizas y por ello requieren ser aprobadas y revisadas dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición por parte del supervisor y los profesionales de la oficina de contratación".**El CONTRATISTA** deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el **CONTRATISTA** se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del Municipio de SOGAMOSO y a cuenta del **CONTRATISTA** quien con la firma del contrato autoriza expresamente al Municipio de SOGAMOSO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, dichas garantías deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para efectos de la vigencia de la garantía exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación del contrato. Las Cauciones deberán constituirse a favor del **MUNICIPIO DE SOGAMOSO**. El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente contratación señala. Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el **CONTRATISTA.NOVENA: MULTAS**: En caso

de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en virtud de este contrato contrae el **CONTRATISTA**, el **MUNICIPIO**, podrá imponerle mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento **(1%)** del valor del contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán exceder del diez por ciento **(10%)** de dicho valor, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. **DECIMA.CLAÚSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del Contratista, este pagará al **MUNICIPIO** a título de pena una suma equivalente al diez por ciento **(10%)** del valor total del contrato, como estimación anticipada de perjuicios y sanción penal pecuniaria valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del contrato. Tanto las multas como la sanción penal pecuniaria que llegare a ordenarse como consecuencia del incumplimiento deberán hacerse mediante resolución motivada de la autoridad competente. **PARÁGRAFO:** Las multas impuestas o la Cláusula penal serán descontadas de las sumas que el **MUNICIPIO** adeude al **CONTRATISTA**, quien desde ya lo autoriza, o de la garantía se disminuyere o agotare, esta se repondrá con cargo al contratista hasta el monto inicial. **DECIMA PRIMERA: INCORPORACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN**: Las partes pactamos e incorporamos en este contrato las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales previstas en los artículos 15 ,16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1.993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se derivan. **DECIMA SEGUNDA: NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION LABORAL.** Este contrato de obra y sus efectos se rige por las disposiciones de la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias. Los contratistas están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señaladas por la Ley. Ni la celebración ni la ejecución de este contrato genera relación laboral ni derecho a prestaciones sociales entre los contratantes ni entre el Municipio y los dependientes del contratista. **DECIMA TERCERA: INDEMNIDAD. - El CONTRATISTA** mantendrá indemne al Municipio de Sogamoso de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan de la ejecución del presente contrato. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales de cualquier índole contra el Municipio y que sean de responsabilidad del contratista, éstas serán comunicadas al CONTRATISTA, quien se obliga a mantener indemne al Municipio respondiendo por dichas demandas, reclamaciones o acciones.**DECIMA CUARTA: JURAMENTO Y CESION. El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el derecho vigente, especialmente en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1.993. Este contrato no puede ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Municipio. **DÉCIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A SEGURIDAD SOCIAL.:** El contratista dará estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2.002 y, el Municipio hará las verificaciones e impondrá las sanciones del caso. **DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL CONTRATO:** Además de las causas legales, éste contrato se podrá terminar anticipadamente por las siguientes causas: 1) Por imposibilidad sobreviviente en la ejecución del presente contrato, sea por fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias imprevistas que llevan a dicha conclusión, teniendo como fundamento constitucional el interés público. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes siempre que haya causa que así lo justifique, teniendo como fundamento constitucional el interés público. **PARÁGRAFO:** En cualquier caso el contrato se liquidará en el estado en que se encuentre haciendo los reconocimientos económicos mutuos a que haya lugar. **DECIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN:** El contrato será liquidado dentro del mes siguiente al cumplimiento total del objeto del contrato y/o servicios pactados o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, la fecha del acuerdo que la disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para estos efectos se aplicará el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA:**

PERFECCIONAMIENTO: Este contrato de Obra se entiende perfeccionado por la suscripción del mismo por las partes.**CLAUSULA DECIMA NOVENA: EJECUCION:**La ejecución del contrato se subordina al cumplimiento de las exigencias señaladas en este documento y en especial a las siguientes: **1.-** Perfeccionamiento del contrato y constitución del registro presupuestal. **2.-** Acta de iniciación. **3.-** Constitución y aprobación de las garantías.**5.-**Pago de estampilla pro cultura.**6.CLAUSULAVIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD:** en caso de que exista información sujeta alguna reserva legal las partes deben mantener la confidencialidad de esta información para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencialidad **VIGESIMAPRIMERA. DOCUMENTOS:** Son parte integral de este contrato: Todos los documentos que integran la etapa precontractual del proceso de **SAMC-012-2023. VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO** Para todos los efectos derivados del contrato el CONTRATISTA registra como dirección kilometro 6 via Sogamoso Belencito nobsa y teléfono:3156496385-3203423895correo electrónico:organizacion.evm@gmail.com.En constancia de lo anterior, se firma en Sogamoso a los,

Estampillas	

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjunción y aceptación en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

Proyecto:Dianaleónplazas
Reviso: Margry solanlly huertas

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	04/09/2023				
Contrato No.	20230725	**Fecha Cont.**	22/08/2023	**Tipo**	OBRA
Contratista	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S R/L EMILIANO VARGAS MESA			**Id.**	826002051 9520277
Interventor	CONSORCIO INTEROBRAS				NIT 901717912-9
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEP ARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL				
Valor	($486.201.057) CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
Plazo	TRES (3) MESES que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**Inicia**	04/09/2023	**Fin**	03/12/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No __	Fecha aprobación		31/08/2023	
Póliza	Compañía	SEGUROS MUNDIAL				**Número**	BY-100004817 BY-100037212
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
Pensión	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
ARL	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
Registro P.	Número	2023002196	Valor	$ 486.201.057			

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

CONSORCIO INTEROBRAS
R/L JAVIER ORACA GUASTUMAL
INTERVENTOR

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

*anterior se toma del listado de análisis de precios unitarios detallado 2023 Gobernación de Boyacá.Los sumideros son esenciales para la gestión del drenaje en las carreteras, ya que recogen y dirigen eficazmente el agua de lluvia lejos de la vía. El suministro e instalación de sumideros en ladrillo SL 100 es necesario para prevenir inundaciones y daños a la vía, garantizando así la seguridad y la durabilidad de la infraestructura.El ítem anterior se toma del listado de análisis de precios unitarios detallado 2023 Gobernación de Boyacá.La instalación de codos de PVC sanitario es necesaria para la correcta conducción de aguas residuales y aguas negras, se va a utilizar en los sumideros para evitar la salida de olores. Garantiza un sistema de drenaje de aguas pluviales eficiente y seguro, evitando obstrucciones y fugas que podrían afectar negativamente la calidad del agua y el entorno.El ítem anterior se toma del listado de análisis de precios unitarios detallado 2023 Gobernación de Boyacá.La tubería de alcantarillado es esencial para la recolección y conducción adecuada de aguas pluviales. El suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC D=8" es necesario para realizar la conexión de los sumideros proyectados hasta la zona de descole del mismo.El ítem anterior se toma del listado de análisis de precios unitarios detallado 2023 Gobernación de Boyacá.La tubería de concreto reforzado es fundamental para el drenaje de aguas pluviales en el k0+303, ya que en este sector se encuentra una alcantarilla la cual debe ser ampliada con el fin de mantener el ancho proyectado de la vía. Su inclusión es necesaria para garantizar una gestión adecuada del agua y evitar inundaciones, lo que contribuye a la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la zona.El ítem anterior se toma de los análisis de precios unitarios INVIAS de referencia regionalizados periodo 2023-1 Boyacá Sugamuxi. De igual manera se presenta la actualización de las cantidades de los ítems de la sección 1 Actividades de mejoramiento, donde se ajustan al diseño estructural y geométrico presentado. Se ha analizado el impacto en el cronograma y presupuesto, subrayando la importancia de preservar la integridad de la obra. La solicitud de extensión hasta el 31 de diciembre del 2023 se justifica por condiciones climáticas adversas, interferencias de redes superficiales y restricciones de tráfico.Se anexa acta de mayores y menores cantidades donde se puede observar cada una de estas modificaciones.***5.*** Por lo anterior se hace necesario llevar a cabo de manera eficaz los objetivos planteados por la administración Municipal. **6.** Que en virtud de lo anterior, se ve la necesidad prorrogar el Contrato de OBRA **Nº 20230725**. **7.** Que la presente prórroga se enmarca en lo establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que indica "(...) *En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y los principios y finalidades de esta ley y los de la buena administración*" **8.** Que el **MUNICIPIO** cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2023 para atender este gasto. **9**. Que es deber del MUNICIPIO y el CONTRATISTA la colaboración mutua para que el objeto del contrato se cumpla de manera eficiente. **10.** Que se encuentra pertinente la presente prórroga. En consecuencia de lo anterior, se dispone: **CLAUSULA PRIMERA:** Prorrogar el contrato de OBRA **No. 20230725** de fecha 22 de Agosto del 2023, por el término de **VEINTISIETE (27) DIAS,** contado desde el día 4 de Diciembre de 2023 al 31 de Diciembre del 2023. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** se obliga a tramitar la modificación de las vigencias y si hay lugar al valor asegurado para cada uno de los amparos de la garantía única ante la compañia

aseguradora respectiva de conformidad con el contenido en el presente acuerdo. **CLASULA TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación. **CLASULA CUARTA**: La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes. En consecuencia se firma en Sogamoso.

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjunción y aceptación en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

Proyecto :Diana Rocio Leon Plazas-Profesional Especializada-of-Contratacion

PRORROGA No2 AL CONTRATO DE OBRA No. 20230725 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY SAS.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ,ciudadana colombiano, identificada con la cédula de ciudadanía número **46.384.037**,en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación según acta de posesión 214 del 01 de septiembre de 2022, y según Decreto de Delegación 023 del 13 de febrero de 2017 quien para los efectos del presente se denomina el **MUNICIPIO** de una parte y por la otra, **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY SAS**,con **Nit:8260020511**,Representante legal **EMILIANO VARGAS MESA**, identificado con número de cedula **9.520.277** de Sogamoso , para los efectos de este documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar una prorroga al presente Contrato de OBRA **No 20230725** fecha (22) de Agosto de 2023, el cual se encuentra vigente, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1.** Que el día (22) de Agosto del 2023 se suscribe contrato de OBRA **No. 20230725** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEP ARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.2.** Que se estableció como valor del contrato la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($486.201.057)M/CTE.3.** Que el plazo de ejecución del contrato seria de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **4.** Que se presenta solicitud de prórroga de fecha 21 de Diciembre de 2023, toda vez que (....)*Este Contrato se desprende del Convenio interadministrativo 1444 de 2023, firmado con el Instituto Nacional de Vias (INVIAS),el cual cuenta con prorroga aprobada hasta el dia 31 de diciembre de 2024.Los recursos que hacen parte de este convenio fueron aportados en su totalidad por el INVIAS, y la supervisión del contrato está siendo adelantada por el Consorcio Interobras, interventoria contratada directamente por el INVIAS. Con oficio radicado por dicha interventoría aprobando la prórroga solicitada por el Contratista, se procedió a evaluar el avance de la obra, la cual cuenta con un avance del 68%. Para la supervisión ejercida por el Municipio, es indispensable aprobar la solicitud de prorroga para poder terminar el objeto contractual, teniendo en cuenta que las actividades que hacen falta se consideran obras menores, pero sin las cuales queda totalmente funcional la vía que se está construyendo. Adicionalmente, se ha comprobado por parte de la Supervisión, los hechos que presenta el Contratista como base para solicitar la prórroga, como es la situación imprevista en relación con el suministro de asfalto por parte de Ecopetrol, especificamente en los días comprendidos entre el 1 al 3 de diciembre y del 8 al 10 de diciembre. Esta interrupción en el suministro de un componente esencial para la culminación de la vía ha generado un retraso adicional en el avance de las obras.La solicitud de prórroga presentada cuenta con el respaldo y la aprobación por parte de la interventoría responsable del seguimiento y control de la ejecución del proyecto de acuerdo al oficio CI-2023-0015. La interventoría ha evaluado detalladamente los motivos expuestos para la extensión del plazo de ejecución de la construcción de la vía y ha manifestado su conformidad con la pertinencia y validez de las razones expuestas, avalando así la necesidad de esta ampliación en los tiempos estipulados originalmente, se destaca que la obra cuenta con un avance del 68%.En vista de estos factores que han repercutido en el cronograma establecido, nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga en el plazo de entrega estipulado en el contrato inicial. Esta extensión nos permitirá finalizar de manera adecuada las modificaciones en los diseños, atender las solicitudes de los propietarios de viviendas y gestionar eficazmente la situación del suministro de asfalto por parte de Ecopetrol.***5.** Por lo

anterior se hace necesario llevar a cabo de manera eficaz los objetivos planteados por la administración Municipal. **6.** Que en virtud de lo anterior, se ve la necesidad prorrogar el Contrato de OBRA **Nº 20230725**. **7.** Que la presente prórroga se enmarca en lo establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que indica "(...) *En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y los principios y finalidades de esta ley y los de la buena administración*" **8.** Que el **MUNICIPIO** cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2023 para atender este gasto. **9.** Que es deber del MUNICIPIO y el CONTRATISTA la colaboración mutua para que el objeto del contrato se cumpla de manera eficiente. **10.** Que se encuentra pertinente la presente prórroga. En consecuencia de lo anterior, se dispone: **CLAUSULA PRIMERA:** Prorrogar el contrato de OBRA **No. 20230725** de fecha 22 de Agosto del 2023, por el término de **VEINTISIETE (27) DIAS,** contado desde el día 31 de Diciembre del 2023 hasta el dia 24 de Enero de 2024.**CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** se obliga a tramitar la modificación de las vigencias y si hay lugar al valor asegurado para cada uno de los amparos de la garantía única ante la compañía aseguradora respectiva de conformidad con el contenido en el presente acuerdo. **CLASULA TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación. **CLASULA CUARTA**: La presente prórroga se perfecciona con la firma de las partes. En consecuencia se firma en Sogamoso.

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjunción y aceptación en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

Proyecto :Diana Rocio Leon Plazas-Profesional Especializada-of-Contratacion

PÓLIZAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.24 15:22:38 -05:00

Código de Seguridad: s6yvwzySJ503X6ESJ1QTsQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36156961	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/08/2023	24:00 Horas Del	24/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 20230725 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NOTA (1): EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/08/2023	24:00 Horas Del 24/05/2024	48.620.105,70	109.495,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/08/2023	24:00 Horas Del 24/11/2026	97.240.211,40	949.491,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/08/2023	24:00 Horas Del 24/08/2028	2.241.242,00	44.874,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/11/2023	24:00 Horas Del 24/11/2028	145.860.317,10	2.190.302,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 293.961.876,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.294.162,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.294.162,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	626.841,00
TOTAL A PAGAR	$	3.926.003,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PELSA - AFH

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36156961	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/08/2023	24:00 Horas Del	24/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA (2): EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SOLICITADO EN EL PRESENTE CONTRATO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INCLUIDO EN LA PRESENTE POLIZA LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA PARA TRASLADAR LA VIGENCIA DE DICHOS AMPAROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.24 15:32:00 -05:00

Código de Seguridad: tP34X6/pjndvWr1YYO43jA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36156963	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/08/2023	24:00 Horas Del	24/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.20230725 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO ,

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SOGAMOSO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	175.430,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	175.430,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	175.430,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	34.282,00
TOTAL A PAGAR	$	214.712,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36156963	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/08/2023	24:00 Horas Del	24/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SOGAMOSO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE E SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.27 15:32:08 -05:00

Código de Seguridad: wDuk1s7/nsKdYJ7yrIcLdg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36160156	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	05/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. 20230725, EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04/09/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 20230725 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/09/2023	24:00 Horas Del 04/06/2024	48.620.105,70	109.495,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/09/2023	24:00 Horas Del 05/12/2026	97.240.211,40	949.491,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/09/2023	24:00 Horas Del 04/09/2028	2.241.242,00	44.874,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/12/2028	145.860.317,10	2.190.302,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 293.961.876,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.294.162,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.294.162,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	626.840,78
TOTAL A PAGAR	$	3.926.002,78

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36160156	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	05/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA (1): EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTA (2): EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SOLICITADO EN EL PRESENTE CONTRATO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INCLUIDO EN LA PRESENTE POLIZA LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA PARA TRASLADAR LA VIGENCIA DE DICHOS AMPAROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA AIF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.27 15:33:31 -05:00

Código de Seguridad: N7TnuWLWvHrWx1lMCFpJaQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36160157	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	05/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. 20230725, EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04/09/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODICAR.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	175.430,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	175.430,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	175.430,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	34.281,70
TOTAL A PAGAR	$	214.711,70

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36160157	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	05/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100037212** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SOGAMOSO / MUNICIPIO DE SOGAMOSO** , expedida por la Compañía en **27/10/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **27** días del mes **OCTUBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.23 14:35:01 -05:00

Código de Seguridad: 2rvLhf9qnaIzfhNvxkUoyA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36161730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. 20230725, EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04/09/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODICAR.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DEL CONTRATO NO. 20230725, SEGUN ACTA DE PRORROGA NO. 1 DE FECHA 17/11/2023
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 20230725 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 01/07/2024	48.620.105,70	10.789,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 01/01/2027	97.240.211,40	21.579,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/11/2023	24:00 Horas Del 01/10/2028	2.241.242,00	663,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/12/2028	145.860.317,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 293.961.876,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	33.032,16
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	33.032,16
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.276,11
TOTAL A PAGAR	$	39.308,27

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRSE. AIH

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36161730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	01/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NOTA (1): EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTA (2): EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SOLICITADO EN EL PRESENTE CONTRATO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INCLUIDO EN LA PRESENTE POLIZA LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA PARA TRASLADAR LA VIGENCIA DE DICHOS AMPAROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100037212** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SOGAMOSO / MUNICIPIO DE SOGAMOSO** , expedida por la Compañía en **23/11/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **23** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.23 14:44:06 -05:00

Código de Seguridad: n/uKod4BGGg8qAjBEWfHYg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36161732	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	01/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DEL CONTRATO NO. 20230725, SEGUN ACTA DE PRORROGA NO. 1 DE FECHA 17/11/2023

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	51.484,93
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	51.484,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	51.484,93
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.782,14
TOTAL A PAGAR	$	61.267,07

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - AMP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36161732	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	01/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.10 08:58:39 -05:00

Código de Seguridad: 4xXmVYAzR3y2hzBaAtKO8w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36164529	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	28/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. 20230725, EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04/09/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODICAR.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DEL CONTRATO NO. 20230725, SEGUN ACTA DE PRORROGA NO. 2 DE FECHA 23/12/2023

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 20230725 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 28/07/2024	48.620.105,70	10.789,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/12/2023	24:00 Horas Del 28/01/2027	97.240.211,40	21.579,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/12/2023	24:00 Horas Del 28/10/2028	2.241.242,00	663,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/12/2028	145.860.317,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 293.961.876,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	33.032,16
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	33.032,16
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.276,11
TOTAL A PAGAR	$	39.308,27

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRIVA. APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36164529	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	28/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NOTA (1): EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTA (2): EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SOLICITADO EN EL PRESENTE CONTRATO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INCLUIDO EN LA PRESENTE POLIZA LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA PARA TRASLADAR LA VIGENCIA DE DICHOS AMPAROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100037212** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SOGAMOSO / MUNICIPIO DE SOGAMOSO** , expedida por la Compañía en **10/01/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **10** días del mes **ENERO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.10 09:00:24 -05:00

Código de Seguridad: RUECkzHgcj/sHJZ10/yq9g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36164531	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	28/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	**TELÉFONO**	3156496385
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	**TELÉFONO**	3156496385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DEL CONTRATO NO. 20230725, SEGUN ACTA DE PRORROGA NO. 2 DE FECHA 23/12/2023

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	51.484,93
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	51.484,93
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	51.484,93
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.782,14
TOTAL A PAGAR	$	61.267,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** Ó LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DELSA - AMT

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100004817	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36164531	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	28/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.15 17:40:28 -05:00

Código de Seguridad: WZNtsaiz4jcfuaVE927N5w==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36166328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	18/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	826.002.051-1
DIRECCIÓN	KM 6 VIA SOGAMOSO	TELÉFONO	3156496385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	No. DOC. IDENTIDAD	891.855.130-1
DIRECCIÓN	ED TORRE 6 CL 15 # 12-14 SOGAMOSO	TELÉFONO	7702040

OBJETO DE CONTRATO

MEDIENTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 20230725 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NOTA (1): EL AMPARO DE CALIDAD DE LA REVISION AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 28/07/2024	48.620.105,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/12/2023	24:00 Horas Del 28/01/2027	97.240.211,40	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/12/2023	24:00 Horas Del 28/10/2028	2.241.242,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/01/2024	24:00 Horas Del 24/01/2029	145.860.317,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 293.961.876,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MITCY YINET CHAPARRO SALINAS	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100037212	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36166328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/09/2023	24:00 Horas Del	18/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTA (2): EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SOLICITADO EN EL PRESENTE CONTRATO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INCLUIDO EN LA PRESENTE POLIZA LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA PARA TRASLADAR LA VIGENCIA DE DICHOS AMPAROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100037212** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SOGAMOSO / MUNICIPIO DE SOGAMOSO** , expedida por la Compañía en **15/02/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **15** días del mes **FEBRERO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ACTAS DE CIERRE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales sogamoso		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2023 0725.	Contrato de Interventoria No. 1746 2023.	Acta de Vecindad de Cierre	31 Enero 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Vanegas-Aposentos	Km 31 0
Dirección		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita: Esperanza Bonilla		CC No. 23582.499.		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Esperanza Bonilla.		CC No. 23582.499		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA TATIANA V. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Doña Esperanza Bonilla **Testigo** C.C. O NIT: 23582.499.

Doña Esperanza Bonilla

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma DIANA TIZIANA V.
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma Doris Esperanza Burbano
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 23597449

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

Doris Esperanza Burbano

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoria No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre	(Dia / Mes / Año)

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 10-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** BOYACA	**Municipio** SUGAMUXO	**Vereda** VANEGAS	**PR**	
Dirección			**Teléfonos**		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: LOPE RAMZA BONILLA				CC No. 23 582 449	
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	5	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural				RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado				TERMINADO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No				SI
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado				PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
6. internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Diana Tziana V	Firma:	Firma:	Firma: Doña Esperanza Bonilla
Nombre: **Responsable Unidad Social**	Nombre: **Ing. Residente Contratista**	Nombre: **Ing. Residente Interventoría**	Nombre **Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☒
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☒
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☒
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	**Acta de Vecindad de** **Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐	(Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISO 1RO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 1RO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

CON UNA GRIETA EN

ESTADO DE PAREDES 1RO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

CON UNA GRIETA CERCA A LA VENTANA DE LA SALA, EN LA PARTE BAJA DEL LADO IZQUIERDO / HUMEDAD EN LA PARTE BAJA PAREDES COCINA

ESTADO DE PISO 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PAREDES 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma DIANA IZQUIERDO	Firma	Firma	Firma Dai Esperanza Bonilla
Nombre: **Responsable Unidad Social**	Nombre: **Ing. Residente Contratista**	Nombre: **Ing. Residente Interventoria**	Nombre **Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
			(Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

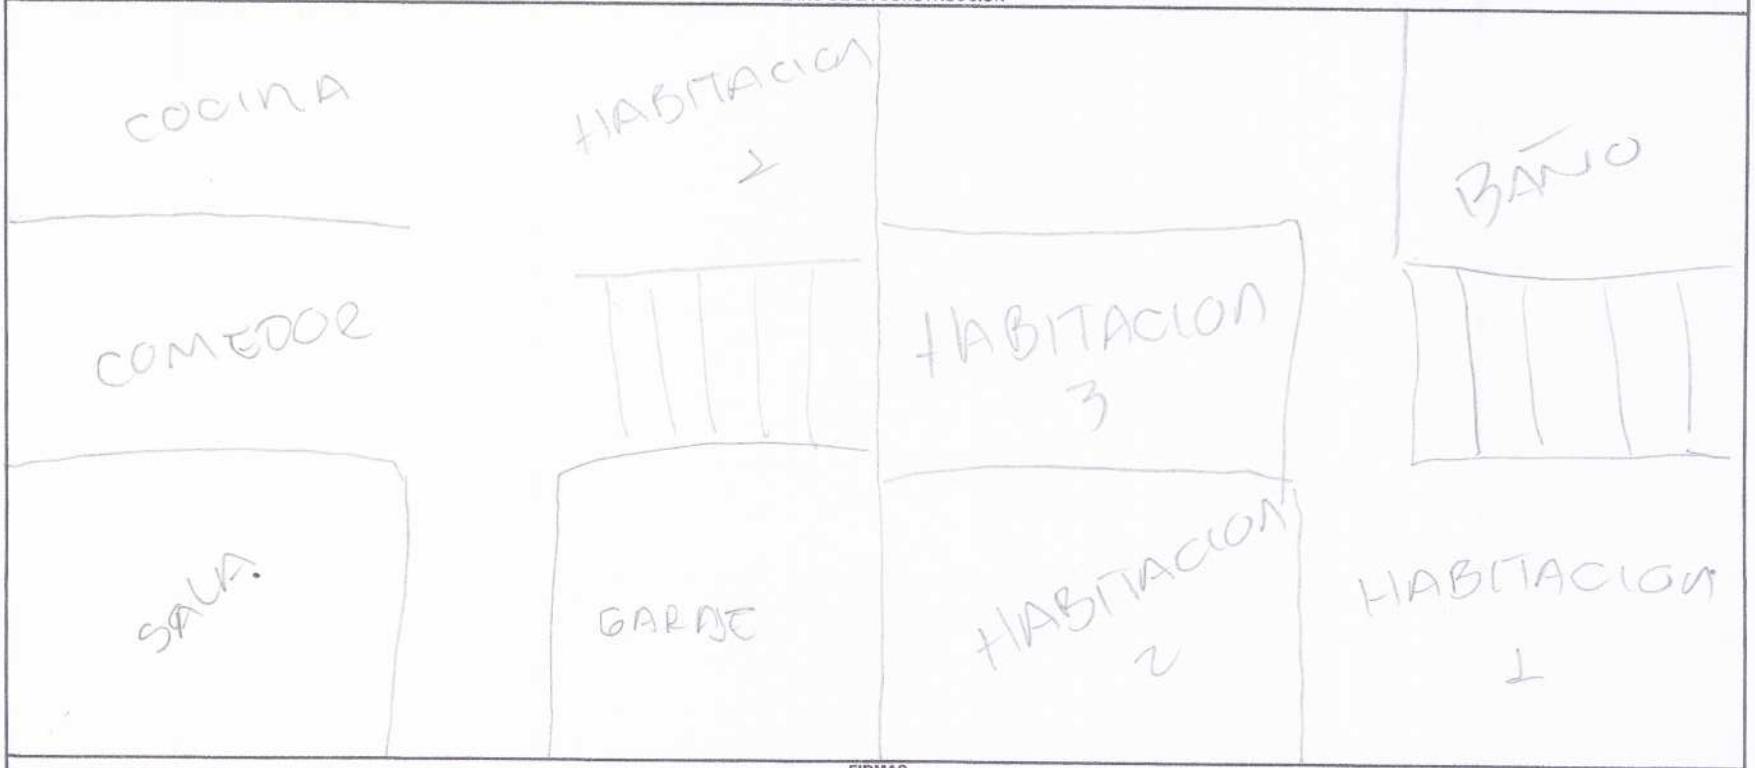

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: Doña Esperanza Bonilla

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales Sogamoso

FECHA (Día / Mes / Año): 31 Enero 2024

Contrato de Obra No. 20230725 | Contrato de Interventoría No. 1746/2023. | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Vanega - Aposento Rot 230	

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Nubia Esperanza Fonseca | CC No. 23582264.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Nubia Esperanza Fonseca | CC No. 23582264.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Diana Zuluaga Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Nubia Esperanza Fonseca Testigo Nubia Esperanza Fonseca C.C. O NIT: 23582264

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre	(Día / Mes / Año)

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma
Nombre: Diana Zuluaga
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre Nubia Esperanza Fonseca
Testigo Nubia Esperanza Fonseca
C.C. O NIT: 23582764

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 9-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección | **Teléfonos**

Nombre de la persona que atiende la visita: | CC No.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yubia Esperanza Fonseca | CC No. 23.582.764

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	Terminada
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	Plano

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet	X		
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: Si ☐ NO ☒

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: Yubia Esperanza Fonseca	Firma:	Firma:	Firma: Yubia Esperanza Fonseca
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☒
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☒
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE				DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ____ / ____	Contrato de Interventoría No. ____ / ____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT.

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.

Firma
Nombre
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O N.I.T.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de vias rurales Sogamoso.

FECHA (Dia / Mes / Año): 31 Enero 2024

Contrato de Obra No. 2023 10725 | Contrato de Interventoria No. 1746 2023. | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Tanegas-Aposentos	KO + 245


Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Marina Correño | CC No. 46 359.046

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Marina Correño | CC No. 46.359.046.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA

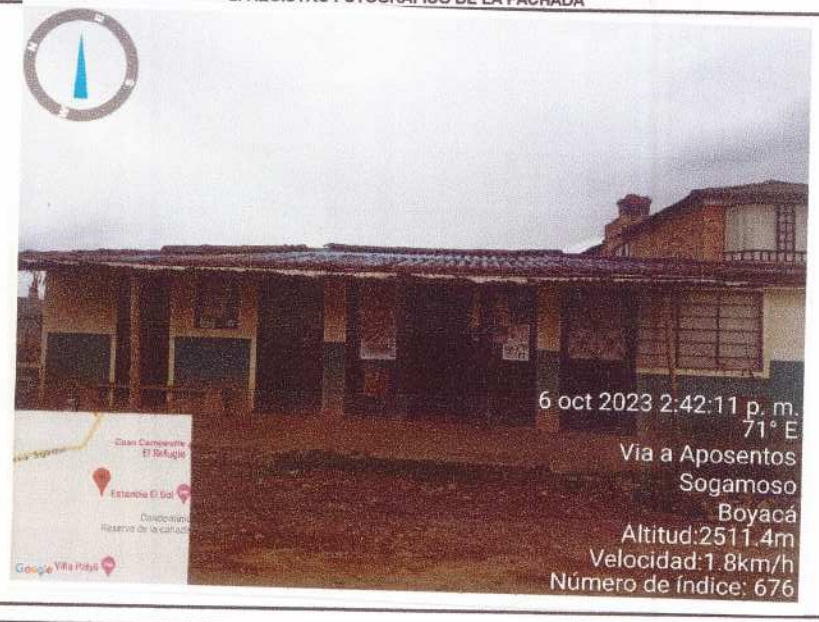

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma
Nombre: Diana Rizzuto
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matricula profesional No.:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matricula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 46 359.046

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoria No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre	(Día / Mes / Año)

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma
Nombre: DIANA RICAURTE
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matricula profesional No.:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matricula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 46.359.046

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoria No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO

Contrato de Obra No. _____ / _____ Contrato de Interventoría No. _____ / _____ Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
Dirección			**Teléfonos**		
Nombre de la persona que atiende la visita: Marina Carreño			CC No. 46.359.046		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.		
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si , 2. No				SI
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				Plano

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable			
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo		**ACCESOS VEHICULARES**
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Garaje
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Si ☐ NO ☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	**Uso del garaje:**
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐

(Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		**SISTEMA DE ENTREPISO:**		**SISTEMA ESTRUCTURAL**		**IRREGURALIDAD EN PLANTA**	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? _____		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? _____		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura. No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐	8. Otro. Cuál? _____		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? _____				17. Otro. Cuál? _____		7. Otro. Cuál? _____	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: **BUENO** ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

Contrato de Obra No. _____ / _____

Contrato de Interventoría No. _____ / _____

Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).

4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales Sogamoso	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2023 1 0725	Contrato de Interventoría No. 1746 1 2023	Acta de Vecindad de Cierre: 31 Enero 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Vanegas - Apostadero	Ko + 180
Dirección		Teléfonos		

Nombre de la persona que atiende la visita: Flor Estella Florez. CC No. 23942.976

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Flor Estella florez. CC No. 23942.976

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: Flor Estella Florez Vargas 23942976

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoria No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matricula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: Flor Estella Flores Vargas 23442979

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 6-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____/_____ | Contrato de Interventoría No._____/_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección | **Teléfonos**

Nombre de la persona que atiende la visita: | CC No.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: FLOR EDILIA FLOREZ | CC No. 23.947.976

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes	4	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	TERMINADO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Si ; **2.** No	SI
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	PLANA

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X	X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable	X		
6. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre Lizeth Alvarez
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 1002 741 093 Nieta

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____/_____ | Contrato de Interventoria No._____/_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☒
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☒
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☒
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☒

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras hibrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐		REGULAR ☒		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

El anden presenta unas fisuras en las baldosas

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐	(Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISO 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PAREDES 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PISO 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PARED 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** ☒ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS		**MALO** ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: 1002 941 073 Lizeth Alvarez Nieto

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Lizeth Alvarez **Testigo** CC O NIT: 1002 741073 Nieta

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales sogamoso.

FECHA (Dia / Mes / Año): 31 Enero 2024

Contrato de Obra No. 2023.0725.

Contrato de Interventoría No. 1746.2023

Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyacá	Sogamoso	Venegas-Aposentos	Ko+400

Dirección:

Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Rafael Foquen. CC No. 9514.470.

Tipo de tenencia de la vivienda: X — 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Wilson Parra - Mauro Julio Para CC No. 9396.619.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matricula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: 9514470

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____ Acta de Vecindad de Cierre	(Dia / Mes / Año)

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoria No._____ /_____	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 10-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____/_____ | Contrato de Interventoría No._____/_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección | **Teléfonos**

Nombre de la persona que atiende la visita: REBECA FLOREZ — CC No. 24.113.009

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo. 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: WILSON JAVIER PARRA — CC No. 9.396.619

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	SIN VIVIENDO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Si ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: DISNARIANA	Firma:	Firma:	Firma: WILSON JAVIER
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (sí / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☒			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál? LADRILLO		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

Contrato de Obra No. _____ / _____

Contrato de Interventoría No. _____ / _____

Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

FECHA (Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO	

BUENO ☐ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE | DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre: wilson Javier
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____	**Acta de Vecindad de** **Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

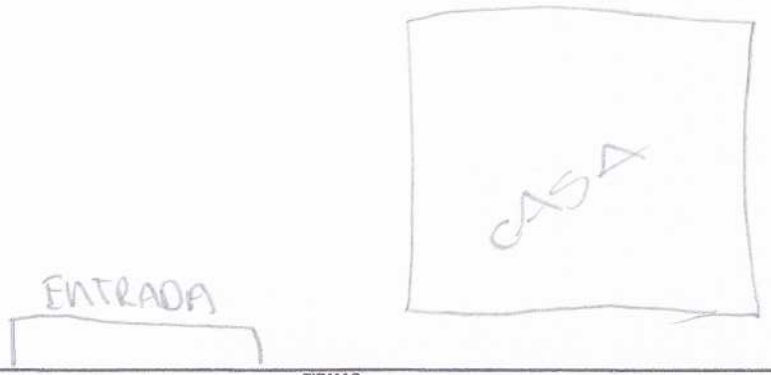

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor. Subdirección de Sostenibilidad. Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO: mejoramiento y mato de vías rurales en el municipio de Sogamoso.

FECHA (Día / Mes / Año): 31 enero 2024

Contrato de Obra No. 2023 / 0725

Contrato de Interventoría No. 1796 / 2023

Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Vuneyas	

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Sonia Lopez. | CC No.:

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Sonia Lopez | CC No.:

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma			
Nombre: DIANA RUANO	Nombre:	Nombre:	Nombre: Sonia Lopez S.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 51763089

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoria No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	C.C. O NIT: 51763089

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 10-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____/_____ | Contrato de Interventoría No._____/_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección | **Teléfonos**

Nombre de la persona que atiende la visita: NUBIA ESPERANZA FONSECA | CC No. 23.582.264

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: SONIA LOPEZ | CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	OBRA GRIS
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No	SI
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI X NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: DANIA TZUNAU	Firma:	Firma:	Firma: Nubia Esperanza Fonseca
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☒
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☒
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☒
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? MADERA	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☒		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	**Acta de Vecindad de** **Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐	(Día / Mes / Año)

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISO 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PAREDES 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 100 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PISO 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PAREDES 200 **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA IZQUIERDO **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Nubia Esperanza Fonseca **Testigo** C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

(Día / Mes / Año)

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN



FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: Nubia Esperanza Fonseca **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	mejoramiento y manto de Vías Rurales, en Soq.		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2023 / 0725	Contrato de Interventoría No. 1796 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	31 Enero 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Boyaca	Municipio: Sogamoso	Vereda: Venegas Aposento Kot 300.	PR
Dirección		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita: María Ramos Cardenas		CC No. 33.447.963.		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción: María Ramos Cardenas		CC No. 33.447.963.		

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA TRIANA **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matricula profesional No.:	Firma Nombre María Ramos C **Testigo** C.C. O NIT: 33447963

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 33447963

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 9-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ /_____ | Contrato de Interventoría No._____ /_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección | **Teléfonos**

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA RAMOS CARDENO | CC No. 33.447.963

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo. 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: | CC No.

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares		No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural	RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	OBRA GRIS
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Si ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	**Observaciones del estado de las redes:**
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: DIANA RUANO	Firma:	Firma:	Firma: María Ramos
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ /_____ | Contrato de Interventoría No._____ /_____ | **Acta de Vecindad de** **Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☒
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☒
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? LADRILLO	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-V-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO

Contrato de Obra No _____ / _____ Contrato de Interventoría No _____ / _____ Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☒ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☒ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PARED (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☒ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐ DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		REGULAR ☐ DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	MALO ☐

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre	Nombre	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No	Matrícula profesional No	C.C. O NIT

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

OBJETO DEL PROYECTO

Contrato de Obra No. _____ / _____

Contrato de Interventoría No. _____ / _____

Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramiento y mto de vias Rurales en Sogamoso	FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2023 1 0725	Contrato de Interventoria No. 1746 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre: 31 ene 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Vanegas Aposentos	Km +00
Dirección		Teléfonos		

Nombre de la persona que atiende la visita: Rosa Emilia Rojas — CC No. 46367803

Tipo de tenencia de la vivienda: 2 3 — 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — X

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Luis Eduardo Florez — CC No. 9530823

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre: Rosa Emilia Rojas Flor
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	C.C. O NIT: 46367803

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: Rosa Emilia Rojas 46.367803

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoria No._____ /_____	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☒	1. Placa maciza de concreto	☒	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☒	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☒	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☒	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y paneles en otros	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☒	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál? LADRILLO		7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	**Acta de Vecindad de** **Inicio** ☐ **Seguimiento** ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISO 1 PC **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PARED 1 PC **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 1 PC **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PISO 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PARED 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE TECHO 2DO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)** — **BUENO** ☒ **REGULAR** ☐ **MALO** ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: DIANA RIVERA	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT. 35447677


Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	
			(Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

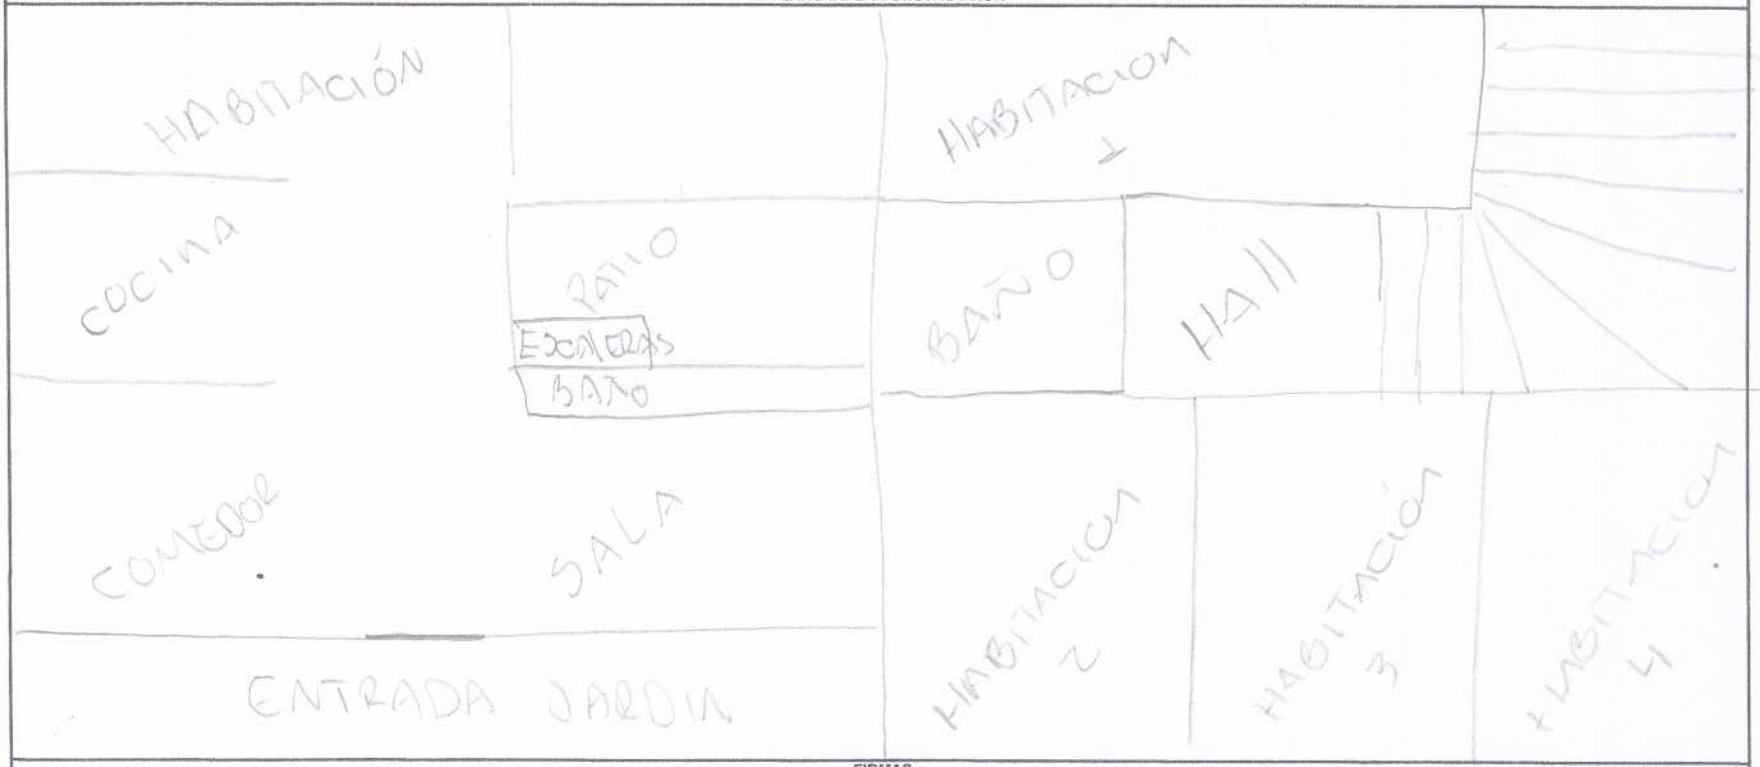

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA PATRICIA **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C C O NIT: 33442677

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

casa 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 6-10-2023 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** BOYACÁ	**Municipio** SOGAMOSO	**Vereda** VANEGAS		**PR**
Dirección			**Teléfonos**		
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: LUIS EDUARDO FLOREZ				CC No.	
Edad de la construcción	23	No. de Apartamentos		No. de pisos	2
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		**1.** Urbano; **2.** Rural			2
ESTADO DEL PREDIO:		**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado			TERMINADO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		**1.** Si ; **2.** No			SI
PENDIENTE DEL TERRENO		**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado			PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X	X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6. Internet		X	
7. Otros		X	Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo		**ACCESOS VEHICULARES**	
2. Comercial		8. Salubridad		Garaje	
3. Industrial		9. Cultural		SI [ ] NO [ ]	
4. Minero		10. Religioso		**Uso del garaje:**	
5. Agropecuario		11.Institucional			
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma: DIANA RIAÑO	Firma:	Firma:	Firma: Luis E Florez S.
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre: Luis E. Florez S
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 9536823

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	[X]	
2. Vigas corridas	[X]	
3. Sistema mixto	[ ]	
4. Caissons	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[ ]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Placa de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[X]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[X]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	[X]
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[X]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y paneles en madera	[ ]
11. Pórticos y paneles en otros	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[X]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE PISOS **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [X] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE PAREDES **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [X] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
UNA QUE OTRA PRESENTAN HUMEDAD

ESTADO DE TECHO **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [X] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ **(Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)**

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		**BUENO** [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		**REGULAR** [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	**MALO** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre:
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:


Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.:

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

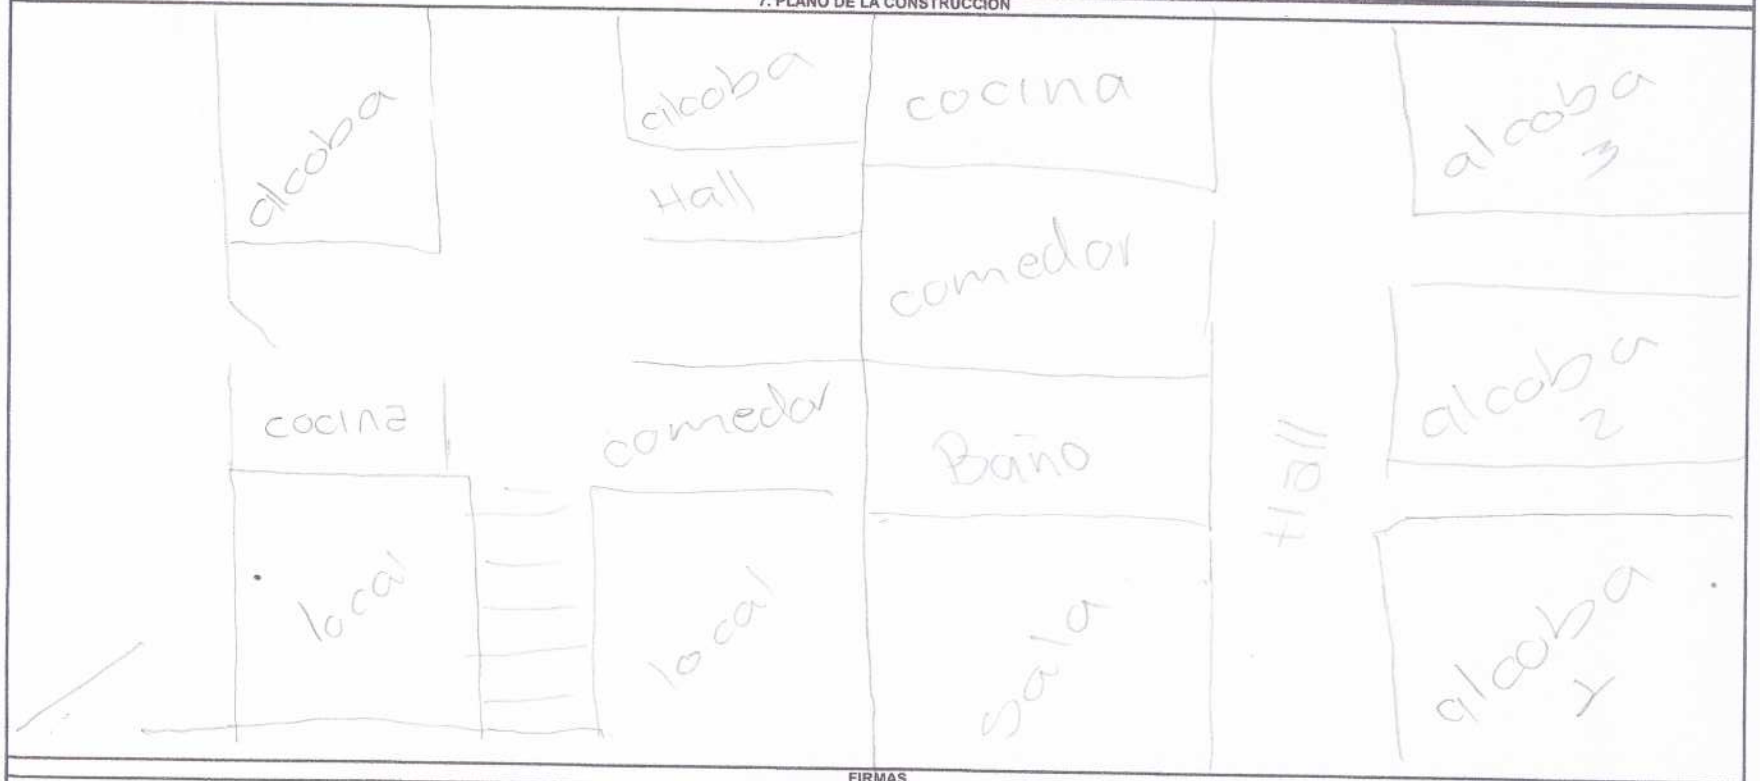

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO Mejoramiento y mto de vías Rurales en el municipio Sogamoso

FECHA (Dia / Mes / Año) 31 enero 2024

Contrato de Obra No. 2023 1 0725

Contrato de Interventoria No. 1746 1 2023

Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyaca	Sogamoso	Uvaraga - Aposento	Ko+ 270

Dirección

Teléfonos

Nombre de la persona que atiende la visita: Nancy Peña Talero CC No. 24.112.490.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Nancy Peña Talero CC No. 24.112.490

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA ZUÑIGA **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoria** Matricula profesional No.:	Firma Nombre Nancy Peña Talero **Testigo** C.C. O NIT: 24112490 Sog

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoria No._____/_____	Acta de Vecindad de Cierre

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma DIANA RIAÑO V.	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.:	C.C. O NIT: 24112490

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoria No._____/_____	**Acta de Vecindad de Cierre**

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 9-10-23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ | Contrato de Interventoría No. _____ / _____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**
Dirección			**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:				CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	NANCY PEÑA TALERO			CC No. 24.112.490

Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	
No. de Hogares		No. total residentes		Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)		Adultos mayores (más de 60 años)		Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano, **2.** Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** SÍ ; **2.** No	
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano, **2.** Ondulado; **3.** Escarpado	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONOMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI X NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	**Uso del garaje:**
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: DIANA RIAÑO	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ /_____ | Contrato de Interventoría No._____ /_____ | **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	☒
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☒
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☒
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C C O NIT:	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C C O NIT:

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE" debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ / _____	Contrato de Interventoría No. _____ / _____	Acta de Vecindad de Inicio ☐ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT.	Matrícula profesional No.	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT.

Original: Contratista
Copias: Interventor; Subdirección de Sostenibilidad; Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	Mejoramto y mto de vias Rurales en Sogamoso		FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 2023 / 0725	Contrato de Interventoria No. 1746 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	31 enero 2024

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Boyacá	Sogamoso	Vanegas - Aposento Not 250.	
Dirección		Teléfonos		
Nombre de la persona que atiende la visita:	Emirce Aranguren.	CC No.	33.447.677.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Emirce Aranguren	CC No.	33.447.677	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS

FIRMAS

Firma Nombre: DIANA RIAÑO **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matricula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** Emirce Aranguren Diaz C.C. O NIT: 33447677

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO			FECHA (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____ /_____	Contrato de Interventoría No._____ /_____	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI ☐ NO ☐

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT:	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
OBJETO DEL PROYECTO		FECHA	(Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. _____/_____	Contrato de Interventoría No._____/_____	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA: 3 - 10 - 23 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. _____ / _____ Contrato de Interventoría No. _____ / _____ **Acta de Vecindad de** Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: BOYACÁ	Municipio: SOCHA	Vereda	PR
Dirección			Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: ERIKA ALEXANDRA DIAZ — CC No. 33 [illegible] 6 7 7

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia, 2. En arriendo; 3. Posesión, 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva			2
Nombre del responsable / propietario de la construcción: [illegible]		CC No	
Edad de la construcción: 17	No. de Apartamentos	No. de pisos	2
No. de Hogares	No. total residentes	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años):	Adultos mayores (más de 60 años)	Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	RURAL
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris 3. Terminado	TERMINADO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si 2. No	SI
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado 3. Escarpado	PLANO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable	X		
8. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI: X NO: ___

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: DIANA TATIANA V.	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O N.I.T:	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.:	C.C. O N.I.T: 33476777

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes
