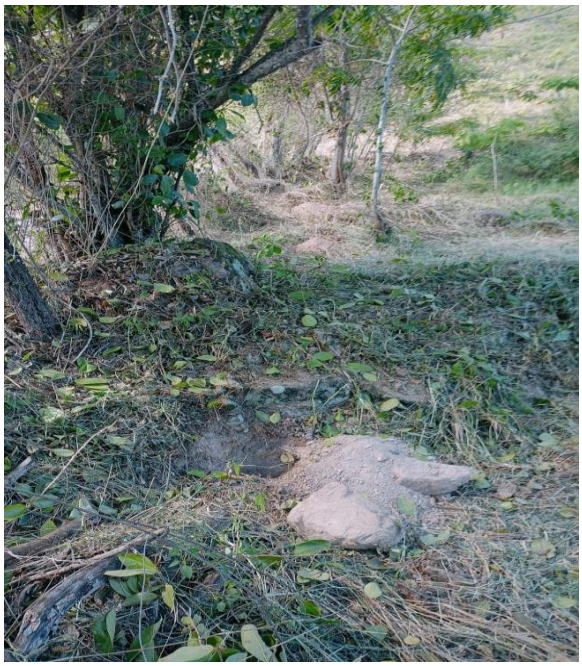
Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	14/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	1

Resumen de las actividades en el día					
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				**Época climática:**	Seca
Actividades	**Programadas (ml)**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Limpia del trazado del aislamiento	600	600	0	**Actividad finalizada**	0
Entrega de insumos (18 postes de madera y 180 postes plásticos, insumos de dotación).				X	quedaron faltando 22 postes de madera, alambre y grapas

Descripción y observaciones
las actividades se realizaron con normalidad.

Actividades planeadas para el día siguiente
Se proyecta para el día de mañana iniciar con las labores de ahoyado e hincado de postes Se proyecta inicia labores en la vereda el cedro predio RNSC el cedro en el Municipio de Pitalito

Registro fotográfico			
1.	Trazado (Limpia) de la línea del futuro cerco	2.	Trazado de la línea por donde irá el cerco

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	15/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	2

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	40	40	X	180
Labores de hincado	220	20	20	X	200

Descripción y observaciones
las actividades se realizaron con retrasos en el tema del ahoyado debido a que el terreno se encontraba muy compacto y muy seco, lo cual dificultaba esta labor, las labores de hincado se realizaron sin ningún percance.


Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas (ML)**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia para el trazado del cerco	2000	200	200	X	1800


Descripción y observaciones
Se presenta dificultad debido al terreno, debido a que presenta pendientes fuertes además de coberturas densas las cuales dificultan las actividades

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
En ambos predios se proyectan seguir labores el día lunes 18 de diciembre. Se proyectan realizar las siguientes entregas de materiales desde el día martes 19 de diciembre a los siguientes predios: Resguardo Huila Rionegro Municipio de Iquira (6 ha restauración activa) Vereda Congreso predio RNSC La chorrera (800 ML) Vereda Termopilas Predio RNSC Villa Estefany Municipio de Rivera (407 ML) Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés Municipio la plata (2000 ML) Vereda El Cedro predio RNSC el cedro Municipio de Pitalito (2000 ML) Vereda el Carmen Predio RNSC El cedro Municipio de Pitalito (1200 ML) Vereda mensura predio RNSC La reserva Municipio de Palestina (600 ML) Vereda Jericó predio RNSC Miranda Municipio de Palestina (200 ML) Vereda Mirador predio La laguna mirador Municipio del Pital (800 ML)

Registro fotográfico			
1.	Hoyo realizado (40x40x40 cm) predio Humedal la laguna	2.	Labores de ahoyado con azadón predio Humedal la laguna
			
3.	Labores de Limpia del trazado del cerco Predio RNSC el cedro	4.	Labores de limpia con machete de la vegetación Predio RNSC el cedro
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	18/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	3

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	40	80	X	140
Labores de hincado	220	20	40	X	180

Descripción y observaciones
las actividades se realizaron con retrasos en el tema del ahoyado debido a que el terreno se encontraba muy compacto y muy seco, lo cual dificultaba esta labor, las labores de hincado se realizaron sin ningún percance.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado	2000	300	500	X	1500

Descripción y observaciones
Se presenta dificultad debido al terreno, debido a que presenta pendientes fuertes además de coberturas densas las cuales dificultan las actividades


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
En ambos predios se proyectan seguir labores el día martes 19 de diciembre. Se proyectan realizar las siguientes entregas de materiales el día de mañana (19 de diciembre): Vereda el Carmen Predio RNSC El cedro Municipio de Pitalito (1200 ML) Vereda el cedro Predio RNSC El cedro Municipio de Pitalito (2000 ML) Resguardo Huila Rionegro Municipio de Iquira (6 ha restauración activa)


Se proyectan las siguientes entregas para el transcurso de la semana:
Vereda Congreso predio RNSC La chorrera (800 ML)
Vereda Termopilas Predio RNSC Villa Estefany Municipio de Rivera (407 ML)
Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés Municipio la plata (2000 ML)
Vereda mensura predio RNSC La reserva Municipio de Palestina (600 ML)
Vereda Jericó predio RNSC Miranda Municipio de Palestina (200 ML)
Vereda Mirador predio La laguna mirador Municipio el pital (800 ML)

Registro fotográfico			
1.	Hoyo realizado (40x40x40 cm) predio Humedal la laguna	2.	Labores de ahoyado con azadón predio Humedal la laguna
			
3.	Labores de Limpia del trazado del cerco Predio RNSC el cedro		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	

	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	19/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	4

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	0	80	X	140
Labores de hincado	220	0	40	X	180

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día por lo cual no hubo ejecución de labores en el predio.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado	2000	0	500	X	1500
Entrega de insumos (300 postes plásticos, 17 rollos de alambre de púa, 21 kilos de grapas y elementos de protección)				X	Quedaron faltando 300 postes plásticos y 134 postes en madera

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día por lo cual no hubo ejecución de labores en el predio.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (360 postes plásticos, 80 postes de madera, 10 rollos de alambre de púa, 13 kilos de grapas y elementos de protección)				Actividad Finalizada	

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual no se iniciaron labores en este predio, solo se realizó la entrega de los insumos.

Resumen de las actividades en el día				ML: HA: 6	
ZONA: RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (360 postes plásticos, 80 postes de madera, 10 rollos de alambre de púa, 13 kilos de grapas, elementos de protección, herramienta)				Actividad Finalizada	

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual no se iniciaron labores en este predio, solo se realizó la entrega de los insumos.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día miércoles 20 de diciembre dependiendo del clima, debido a que se presentaron fuertes lluvias. Se proyectan realizar las siguientes entregas de materiales el día de mañana (20 de diciembre): Vereda mensura predio RNSC La reserva Municipio de Palestina (600 ML) Vereda Jericó predio RNSC Miranda Municipio de Palestina (200 ML) Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés Municipio la plata (2000 ML) Se proyectan las siguientes entregas para el transcurso de la semana: Vereda Congreso predio RNSC La chorrera (800 ML) Vereda Termopilas Predio RNSC Villa Estefany Municipio de Rivera (407 ML) Vereda Mirador predio La laguna mirador Municipio del Pital (800 ML)

Registro fotográfico

1.	Se realizó entrega de insumos a la vereda el cedro predio RNSC el cedro	2.	Entrega de materiales vereda el cedro predio RNSC el cedro
			
3.	Se realizó entrega de insumos a la vereda el Carmen predio RNSC el cedro	4	Se realizó verificación de insumos entregados en la vereda el Carmen predio RNSC el cedro
			
5	Resguardo Huila Rionegro	6	Entrega de herramientas
			
7	Entrega de elementos de protección	8	Verificación de dimensiones de los insumos

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	20/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	5

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	0	80	X	140
Labores de hincado	220	0	40	X	180

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día por lo cual no hubo ejecución de labores en el predio.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado (ML)	2000	0	500	X	1500

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día, por lo cual no se ejecutaron actividades

Descripción y observaciones
No se han iniciado labores

Resumen de las actividades en el día				ML: 200	
ZONA: VEREDA JERICO PREDIO RNSC MIRANDA MUNICIPIO DE PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (60 postes plásticos, 14 postes de madera, 2 rollos de alambre de púa, 2 kilos de grapas y elementos de protección)				Actividad Finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizó con éxito la entrega de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA LA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (180 postes plásticos, 40 postes de madera, 5 rollos de alambre de púa, 7 kilos de grapas y elementos de protección)				Actividad Finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizó con éxito la entrega de insumos

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (240 postes plásticos, 54 postes de madera, 7 rollos de alambre de púa, 9 kilos de grapas y elementos de protección)				Actividad Finalizada	


Observaciones generales
No se pudo realizar la entrega prevista en la Vereda San Andrés predio Humedal San Andrés Municipio la plata (2000 ML) debido a las fuertes lluvias y a las condiciones en la vía de acceso se suspende esta actividad, por esto se realizo la entrega de insumos


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día jueves 21 de diciembre dependiendo del clima, debido a que se presentaron fuertes lluvias. Se proyectan realizar las siguientes entregas de materiales el día de mañana (21 de diciembre): Vereda El Cedro predio RNSC el cedro Municipio de Pitalito (2000 ML) Vereda Mirador predio La laguna mirador Municipio del Pital (800 ML) Vereda Termopilas Predio RNSC Villa Estefany Municipio de Rivera (407 ML)

Registro fotográfico			
1.	Se realizó entrega de insumos a la vereda Jericó predio RNSC miranda	2.	Entrega de materiales vereda Jericó predio RNSC miranda
			
3.	Se realizó entrega de insumos a la vereda La Mensura predio RNSC la reserva	4	Se realizó verificación de insumos entregados en la vereda la mensura predio RNSC la reserva

			
5	Se realizó entrega de insumos a la vereda La Mensura predio RNSC	6	Se realizó entrega de insumos a la vereda La Mensura predio RNSC
			
7	Se realizó entrega de insumos a la vereda el congreso predio la chorrera	8	Entrega de insumos a la vereda el congreso predio la chorrera
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	21/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	6

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (22 postes de madera, 5 rollos de alambre e insumos de dotación).	x	x		**Actividad finalizada**	
Labores de Ahoyado	220	0	80	X	140
Labores de hincado	220	0	40	X	180

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día por lo cual no hubo ejecución de labores en el predio.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado (ML)	2000	0	500	X	1500
Entrega de insumos (300 postes plásticos, 134 postes de madera)	x	x		Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día, lo cual dificulto la entrega del material

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado en el predio (hoyos)	440	50	50	x	340

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual no se presentó mucho avance.

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (122 postes plásticos, 28 postes de madera, 4 rollos de alambre, 5 kilos de grapas e insumos de dotación).	x	x		Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual fue difícil la entrega de los insumos.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 22 de diciembre dependiendo del clima, debido a que se presentaron fuertes lluvias. Se proyectan realizar las siguientes actividades para el día de mañana (22 de diciembre): Continuar con las labores de ahoyado en el predio laguna mirador predio la laguna natural Municipio el Pital Vereda el Carmen predio RNSC el cedro, labores de transporte menor Vereda el cedro predio RNSC el cedro, labores de transporte menor

Registro fotográfico			
1.	Se realizó de terminar la entrega de todos los materiales en el predio laguna natural del Municipio de el Pital	2.	Entrega de materiales en el predio laguna natural del Municipio de el Pital

			
3.	Se realizó entrega de insumos a la vereda el cedro predio RNSC el cedro	4	Se realizó entrega de la totalidad de insumos a la vereda el cedro predio RNSC el cedro
			
5	Se realizaron labores ahoyado en la vereda el Carmen predio RNSC el cedro Municipio de pitalito	6	Labores de ahoyado en la vereda el Carmen predio RNSC el cedro Municipio de pitalito
			

7	Se realizó entrega de insumos a la vereda termopilas predio RNSC villa estefany	8	Se realizó entrega de herramientas a la vereda termopilas predio RNSC villa estefany
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	22/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	7

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Entrega de insumos (22 postes de madera, 5 rollos de alambre e insumos de dotación).	x	x		**Actividad finalizada**	
Labores de Ahoyado	220	20	100	X	120
Labores de hincado	220	60	100	X	120

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoya e hincado sin ninguna normalidad

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado (ML)	2000	0	500	X	1500
Labores de transporte menor en el predio				X	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos en el predio de transporte menor de insumos

Resumen de las actividades en el día	ML: 1200

ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado en el predio (hoyos)	440	0	50	x	390
Transporte menor de insumos				x	


Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual no se presentó mucho avance.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 26 de diciembre.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado en el predio laguna natural del Municipio de el Pital	2.	Labores de Hincado predio laguna natural del Municipio de el Pital
			
3.	Transporte menor vereda el cedro predio RNSC el cedro	4	Labores de Transporte menor de insumos vereda el cedro predio RNSC el cedro
			

5	Transporte menor de insumos mediante mulares en la vereda el Carmen predio RNSC el cedro	6	Transporte mediante mulares en la vereda el Carmen predio RNSC el cedro
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	26/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	8

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Limpia para el trazado del cerco	407	200	200	**x**	**207**

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de limpia del trazado del cerco

Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA LA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA (PRIMER TRAMO)				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado (ML)	212 ML	212	212	Actividad del primer tramo finalizada	

Descripción y observaciones
Trabajo dificultoso por las lluvias

Descripción y observaciones

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día miércoles 27 de diciembre.

Registro fotográfico			
1.	Labores de limpia para el cerco Municipio de Rivera predio Villa estefany	2.	Labores de limpia predio RNSC la reserva Municipio Palestina
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	27/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	9

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				**Época climática:**	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Limpia para el trazado del cerco	407	207	407	**Actividad finalizada**	


Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de limpia del trazado del cerco, se presentaron lluvias a lo largo del día

Registro fotográfico

1.	Labores de limpia para el cerco Municipio de Rivera predio Villa estefany	2.	
			
3.	Labores de limpia para el cerco Municipio de Rivera predio Villa estefany	4.	
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	28/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	10

Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA LA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA (PRIMER TRAMO 212 ML)				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado (hoyos)	96	96	96	**Actividad finalizada (primer tramo)**	
Labores de hincado	96	96	96	**Actividad finalizada (primer tramo)**	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado en el primer tramo del aislamiento el cuanto consta de 212 ML. Se presentaron fuertes lluvias a lo largo del día

ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	40	140	X	80
Labores de hincado	220	20	120	X	100

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado sin ninguna normalidad

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia en el trazado (ML)	2000	0	500	X	1500
Labores de transporte menor en el predio				X	
Labores de hincado	734	184	184	x	550

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos en el predio de transporte menor de insumos y labores de hincado, se presentaron algunas precipitaciones a lo largo del día

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado en el predio (hoyos)	440	100	150	x	290
Transporte menor de insumos				x	
Labores de Hincado	440	150	150		290

Descripción y observaciones
Se presentaron fuertes lluvias por lo cual no se presentó mucho avance.

Resumen de las actividades en el día	ML:1200 ML HA: 6	
ZONA: RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA	Época climática:	Lluvias

Actividades	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado (Para cerco)	440 hoyos	200	200		x
Labores de hincado (para aislamiento	440	200	200		x
Labores de templado y grapado (aislamiento)	440	200	200		x

Descripción y observaciones
Se realizo aproximadamente el 45 % del aislamiento, solo se trabajo el día jueves debido a que las actividades se realizan en minga y no se van a trabajar más días por este año debido al cambio de dirección en el resguardo.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 29 de diciembre. No se han realizado labores en otros predios debido a las condiciones climáticas

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina	2.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina
			

			
5.	Labores de ahoyado e hincado Predio Humedal la laguna natural Municipio del Pital	6.	Labores de ahoyado e hincado Predio Humedal la laguna natural Municipio del Pital
			
7.	Labores de transporte menor en la Vereda el cedro Predio RNSC el cedro Municipio de Pitalito	8.	Labores de hincado Predio el cedro Municipio de Pitalito
			

9.	Labores de ahoyado e hincado en la Vereda el Carmen Predio RNS el cedro	10.	Labores de ahoyado e hincado en la Vereda el Carmen Predio RNS el cedro
			
11.	Labores de ahoyado e hincado en el Resguardo Huila Rionegro del Municipio de Iquira	12.	Labores de ahoyado e hincado en el Resguardo Huila Rionegro del Municipio de Iquira
			
13.	Labores de templado y grapado en el Resguardo Huila Rionegro del Municipio de Iquira	14.	Labores de templado y grapado en el Resguardo Huila Rionegro del Municipio de Iquira

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	29/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	11

Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA LA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA MUNICIPIO PALESTINA (PRIMER TRAMO 212 ML)				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Templado y grapado (4 líneas de alambre)	212	212	212	**Actividad finalizada (primer tramo)**	

Descripción y observaciones
Se realiza finalización del primer tramo de aislamiento (212 ML de aislamiento)

Resumen de las actividades en el día				ML: 200	
ZONA: VEREDA JERICO PREDIO RNSC MIRANDA MUNICIPIO DE PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de ahoyado	74	74	74	Actividad finalizada	
Labores de hincado	74	74	74	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizaron las labores de ahoyado e hincado la otra semana se tiene presupuestado terminar el cerco

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 02 de enero. No se realizaron labores en otros predios debido a las condiciones climáticas (lluvias)

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina	2.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina
			
			
5.	Labores de ahoyado e hincado Predio RNSC miranda Municipio de Palestina	6.	Labores de ahoyado e hincado Predio RNSC miranda Municipio de Palestina

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	30/12/2023	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	12

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Ahoyado	149	20	20	**x**	
Hincado	149	20	20	**x**	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado de postes

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de transporte menor debido a que el predio queda retiro de donde se dejaron los insumos.

Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de Ahoyado	220	40	180	X	40
Labores de hincado	220	60	180	X	40
Templado y grapado (ML)	600	400	400	x	200

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado además de templado y grapado sin ninguna normalidad.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado (ml)	2000	500	500		

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de labores de templado y grapado (ml)

Resumen de las actividades en el día				ML: 200	
ZONA: VEREDA JERICO PREDIO RNSC MIRANDA MUNICIPIO DE PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Templado y grapado (4 líneas de alambre)	200	200	200	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizaron las labores de templado y grapado de alambre terminando el aislamiento

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 02 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado predio Villa Estefany Municipio de Rivera	2.	Labores de ahoyado predio Villa Estefany Municipio de Rivera

			
3.	Labores de hincado predio Villa Estefany Municipio de Rivera	4.	Labores de hincado predio Villa Estefany Municipio de Rivera
			
5.	Labores de transporte menor predio La Chorrera Municipio la Plata	6.	Labores de transporte menor predio La Chorrera Municipio la Plata
			
7.	Labores de hincado y ahoyado predio laguna mirador Municipio el Pital	8.	Labores de hincado y ahoyado predio laguna mirador Municipio el Pital

			
9.	Labores de templado y grapado predio laguna mirador Municipio el Pital	10.	Labores de templado y grapado predio laguna mirador Municipio el Pital
			
11.	Labores de templado y grapado predio el cedro Municipio de Pitalito	12.	Labores de templado y grapado predio el cedro Municipio de Pitalito
			

13.	Labores de templado y grapado de alambre Vereda Jerico Predio RNSC Miranda Municipio de Palestina	14.	Labores de templado y grapado de alambre Vereda Jerico Predio RNSC Miranda Municipio de Palestina
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	02/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	13

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia (ML)	407	407	407	**Actividad finalizada**	

Descripción y observaciones
Se tuvo que volver a realizar la limpia debido a que el propietario, informo por donde se debía realizar la limpia, pero posterior al trabajo hizo cambiar el trazado de la limpia debido a que se había realizado por fuera del cerco existente lo cual generaba un ingreso en predios del colindante

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se plantea seguir labores en otros predios el día 03 de enero de 2024 debido a que No se pudieron adelantar más trabajos debido a las condiciones del clima.

Registro fotográfico			
1.	Labores de limpia predio Villa Estefany Municipio de Rivera	2.	Labores de limpia predio Villa Estefany Municipio de Rivera

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	03/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	14


Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos				x	


Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de transporte menor debido a que el predio queda retirado de donde se dejaron los insumos.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día jueves 04 de enero en otros predios.

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor Vereda congreso Predio RNSC la chorrera		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	04/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	15

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de limpia de cerco (ML)	2000	500	1000	x	
Labores de ahoyado (Hoyos)	734	90	274		460
Labores de hincado (postes)	734	90	274		460

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de limpia, ahoyado e hincado de postes


Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	440	100	250		190
Labores de hincado	440	100	250		190


Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de labores de ahoyado e hincado (ml)

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 05 de enero del 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado Vereda el cedro predio el Cedro Municipio de Pitalito	2.	Labores de hincado Vereda el cedro predio el Cedro Municipio de Pitalito
			
3.	Labores de hincado Vereda el Carmen predio el Cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de hincado Vereda el Carmen predio el Cedro Municipio de Pitalito
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	05/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	16

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	293	100	100	x	
Labores de hincado	293	100	100	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de ahoyado y de hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	440	100	350		90
Labores de hincado	440	100	350		90

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de labores de ahoyado e hincado (ml)

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente

Se proyecta seguir con las labores el día martes 09 de enero del 2024

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado Vereda el congreso predio la Chorrera Municipio de la Plata	2.	Labores de hincado Vereda el congreso predio la Chorrera Municipio de la Plata
			
3.	Labores de hincado Vereda el Carmen predio el Cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de hincado Vereda el Carmen predio el Cedro Municipio de Pitalito
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	09/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	17


Resumen de las actividades en el día				ML: 600	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de Ahoyado	220	28	208	X	12
Labores de hincado	220	28	208	X	12
Templado y grapado (ML)	600	170	570	X	30


Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado además de templado y grapado.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado predio Humedal la Laguna Natural Municipio del Pital	2.	Labores de hincado predio Humedal la Laguna Natural Municipio del Pital
			

3.	Labores de templado y grapado predio Humedal la Laguna Natural Municipio del Pital		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	10/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	18

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	149	89	109	**x**	
Labores de hincado	149	89	109	**x**	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado para ejecutar el templado y el grapado de 300 ML

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA MUNICIPIO LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Ahoyado	293	47	147	x	
Hincado	293	47	147	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado con el fin de iniciar labores de templado y grapado de un primer tramo de 400 ML

Resumen de las actividades en el día				ML: 600 ML	
ZONA: VEREDA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA MUNICIPIO PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Ahoyado	135	125	125	x	Ahoyado e hincado de los (10 postes faltantes)
Hincado	135	125	125	x	Ahoyado e hincado de los (10 postes faltantes)

Descripción y observaciones
Se iniciaron trabajos con nuevo personal, debido a el propietario no quiso continuar con las labores, cuando se realizó la entrega del material sobrante por parte del propietario se entregaron 10 postes menos de plástico.

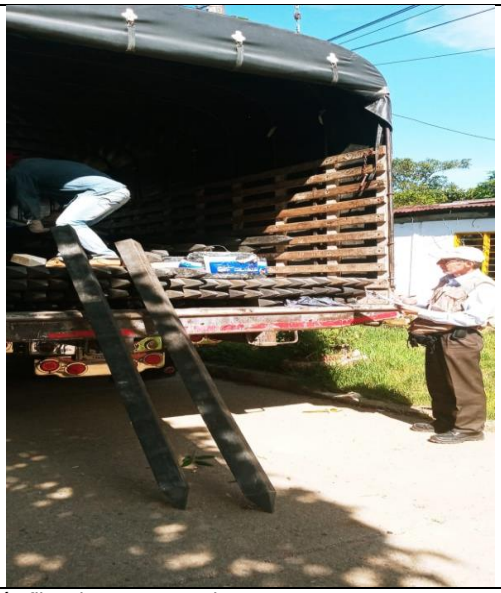
Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRES MUNICIPIO LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de transporte mayor de insumos		Postes plásticos (600) Postes de madera (134) Rollos de alambre de púa 500 m (16) Grapas (21 kilos)		Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizaron las labores de transporte mayor de insumos al predio. Se logro realizar la entrega debido a que anteriormente no se había logrado realizar debido a las condiciones climáticas

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 11 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado predio Villa Estefany Municipio de Rivera	2.	Labores de hincado predio Villa Estefany Municipio de Rivera

			
3.	Labores de ahoyado predio La Chorrera Municipio la Plata	4.	Labores de hincado predio La Chorrera Municipio la Plata
			
5.	Labores de hincado y ahoyado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina	6.	Labores de hincado y ahoyado predio RNSC la reserva Municipio de Palestina
			
7.	Transporte mayor de insumos predio humedal San andrés Municipio la plata	8.	Transporte mayor de insumos predio humedal San andrés Municipio la plata

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galíndez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	11/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	19

Resumen de las actividades en el día				ML: 407	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado (ML)	407	300	300	**x**	

Descripción y observaciones
Quedaron faltando 107 Ml, debido a que ya se realizó el cerramiento de la mayoría del lote se procederá a verificar con el propietario lo restante a aislar.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor				x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de transporte menor por medio de trabajadores debido a que la zona es de difícil acceso para mulares.

Resumen de las actividades en el día				ML: 600 ML	
ZONA: VEREDA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA MUNICIPIO PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Templado y grapado (ML)	387 Aprox	570	357	x	

Descripción y observaciones
Se realizará lo restante con el uso de poste de madera, se presenta acompañamiento por parte de personal de interventoría con el fin de mostrar el trabajo realizado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	734	20	294	x	
Labores hincado	734	20	294	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de ahoyado e hincado para ejecutar labores de templado y grapado al siguiente día

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	440	40	390	x	50
Labores de hincado	440	40	390	x	50

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajos de ahoyado e hincado, posicionamiento del pie de amigo o diagonal

Resumen de las actividades en el día				ML: 212 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 1 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Resumen de las actividades en el día				ML: 160 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 2 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

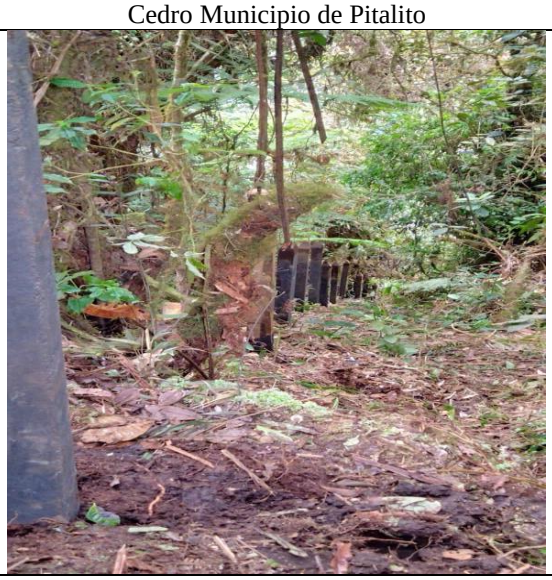
Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Resumen de las actividades en el día				ML: 110 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 3 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 12 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio Villa Estefany Municipio de Rivera	2.	Labores de transporte menor predio La Chorrera Municipio la Plata

			
3.	Labores de templado y grapado predio RNSC la reserva Vereda la mensura Municipio de Palestina	4.	Labores de templado y grapado predio RNSC la reserva Vereda la mensura Municipio de Palestina
			
5.	Labores de ahoyado predio RNSC el cedro Vereda El cedro Municipio de Pitalito	6.	Labores de hincado predio RNSC el cedro Vereda El Cedro Municipio de Pitalito
			

7.	Labores de hincado predio RNSC el cedro Vereda El Carmen Municipio de Pitalito	8.	Labores de transporte mayor de insumos (verificación del propietario y compromiso de cuidado del material) predio Chunche 1 Municipio de Baraya
			
9.	Labores de transporte mayor de insumos (verificación del propietario y compromiso de cuidado del material) predio Chunche 2 Municipio de Baraya	10.	Labores de transporte mayor de insumos (verificación del propietario y compromiso de cuidado del material) predio Chunche 3 Municipio de Baraya
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	12/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	20

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	293	40	140	x	
Labores de hincado	293	40	140	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de ahoyado e hincado se programan labores de templado y grapado la semana siguiente.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado (ml)	2000	300	800	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron trabajos de labores de templado y grapado (300ml)

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de ahoyado	440	40	430	x	10
Labores de hincado	440	40	430	x	10

Descripción y observaciones
Se realizaron las labores de ahoyado e hincado del pie de amigo

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día lunes 15 de enero, y para el día de mañana 13 de enero se tiene programadas unos transportes mayores de materiales e insumos.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio La Chorrera Municipio la Plata	2.	Labores de templado y grapado Predio RNSC el cedro Vereda el cedro Municipio de Pitalito
			
3.	Labores de templado y grapado Predio RNSC el cedro Vereda el cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de ahoyado e hincado Predio RNSC el cedro Vereda El Carmen Municipio de Pitalito
			
5.	Labores de hincado y agregado al hoyo Predio RNSC el cedro Vereda El Carmen Municipio de Pitalito		

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	13/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	21

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Resumen de las actividades en el día				ML: 400 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO RNSC LOS POMOS MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Resumen de las actividades en el día	ML: 200 ML

ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC LOTE RURAL MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Resumen de las actividades en el día				ML: 400 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC VERSALLES MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de insumos. Se realiza verificación de la totalidad de los insumos con el propietario.				x	0

Descripción y observaciones
Se realizaron trabajo de descargue del material.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 12 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Transporte Mayor vereda alto san miguel predio humedal san antonio municipio de paicol	2.	Transporte Mayor vereda alto san miguel predio humedal san antonio municipio de paicol
			

3.	Transporte mayor vereda alto san miguel predio rnsc los pomos municipio de paicol	4.	Transporte mayor vereda alto san miguel predio rnsc los pomos municipio de paicol
			
5.	Transporte mayor vereda el Carmen predio rnsc lote rural municipio de Paicol	6.	Transporte mayor vereda el Carmen predio rnsc lote rural municipio de Paicol
			
7.	Transporte mayor vereda el Carmen predio rnsc Versalles municipio de Paicol	8.	Transporte mayor vereda el Carmen predio rnsc Versalles municipio de Paicol

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	15/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	22

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Ahoyado	440	10	440	Actividad finalizada	
Hincado	440	10	440	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
El avance fue poco debido a las fuertes lluvias

Resumen de las actividades en el día				ML: 600 ML	
ZONA: VEREDA MIRADOR PREDIO HUMEDAL LA LAGUNA NATURAL MUNICIPIO DEL PITAL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Templado y grapado	600	30	600	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución total del cerco.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 16 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC el cedro vereda el Carmen Municipio de Pitalito	2.	Labores de templado y grapado predio Humedal la laguna natural vereda mirador Municipio el Pital
			
3.	Labores de templado y grapado predio Humedal la laguna natural vereda mirador Municipio el Pital		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	16/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	23

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	800	100	100	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML:1200 ML	HA: 6
ZONA: RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	440	240	440	Actividad finalizada	
Labores de hincado	440	240	440	Actividad finalizada	
Labores de templado y grapado (aislamiento)	1200	600	1200	Actividad finalizada	
Transporte de insumos para siembra (4200, entre ocobos, gualanday, nacederos, nogales y Carboneros) además de todos los elementos menores.					
Labores de siembra	3750	1000	1000		x

Descripción y observaciones

Se realizó culminación del aislamiento se entregaron insumos para el establecimiento y se inicio con esta labor.

Resumen de las actividades en el día				ML: 600 ML	
ZONA: VEREDA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA MUNICIPIO PALESTINA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Templado y grapado (ML) segundo tramo	387	30	387	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se termina la ejecución de 30 ml faltantes.


Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día miércoles 17 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio la Chorrera Municipio la Plata	2.	Labores de ahoyado e hincado Municipio de Iquira predio Resguardo Huila Rionegro
			
3.	Labores de templado y grapado Municipio de Iquira predio Resguardo Huila Rionegro	4.	Entrega de insumos Municipio de Iquira predio Resguardo Huila Rionegro

			
5.	Labores de establecimiento Municipio de Iquira predio Resguardo Huila Rionegro	6.	Templado y grapado vereda la mensura predio RNSC la Reserva Municipio de Plaestina
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	17/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	24

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Lluvias
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	800	100	200	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de ahoyado e hincado	734	60	354		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	150		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de templado y grapado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día jueves 18 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio la Chorrera Municipio la Plata	2.	
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio vereda el cedro RNSC el cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de templado y grapado predio RNSC el cedro vereda el Carmen Municipio de Pitalito

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	18/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	25

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	800	100	300	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1000	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL PREDREGAL MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de materiales al predio					

Descripción y observaciones
Se realizó la llevada de insumos para ejecutar las labores

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de templado y grapado	2000	50	850		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	300		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de templado y grapado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 19 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio la Chorrera Municipio la Plata	2.	Labores de transporte de insumos Municipio de Paicol predio RNSC el Pedregal
			
3.	Labores de templado y grapado predio vereda el cedro RNSC el cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de templado y grapado predio RNSC el cedro vereda el Carmen Municipio de Pitalito

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	19/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	26

Resumen de las actividades en el día				ML: 800	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO RNSC LA CHORRERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	800	150	450	x	

Descripción y observaciones
Se adelantaron labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 500	
ZONA: VEREDA SANTA INÉS PREDIO HUMEDAL SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte mayor de materiales al predio					

Descripción y observaciones
Se realizó la llevada de insumos para ejecutar las labores

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de templado y grapado	2000	50	900		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	450		

Descripción y observaciones
Se ejecutaron labores de templado y grapado.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta realizar entregas labores la próxima semana.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado predio la Chorrera Municipio la Plata	2.	Labores de transporte de insumos Municipio de Paicol predio Humedal Santa Inés
			
3.	Labores de templado y grapado predio vereda el cedro RNSC el cedro Municipio de Pitalito	4.	Labores de templado y grapado predio RNSC el cedro vereda el Carmen Municipio de Pitalito

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	22/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	27

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos					

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de transporte menor al sitio de la ejecución del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO LA CHORRERA MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Actividades de ahoyado (segundo tramo de 350)	128	60	60	x	
Actividades de hincado (segundo tramo de 350)	128	60	60	x	

Descripción y observaciones
Se realizan trabajos del segundo tramo

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de trazado de cerco	800	200	200	x	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de limpia y trazado del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 400 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC VERSALLES MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado e hincado	146	73	73	x	
Labores de ahoyado e hincado	146	73	73	x	

Descripción y observaciones
Se adelanta la ejecución de hincado y ahoyado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 110 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO EL CHUNCHE 3 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	41	41	41	actividad	
Labores de hincado	41	41	41	finalizada	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución total del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 407 ML	
ZONA: VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY MUNICIPIO DE RIVERA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	40	40	40	Actividad finalizada	
Labores de hincado	40	40	40	Actividad finalizada	
Labores de templado y grapado	107	107	107	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realiza la totalidad del aislamiento

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	600	x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	2000	100	1000		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 22 de enero.

Registro fotográfico			
1.		2.	Labores de transporte menor vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata

			
3.	Labores trazado de cerco predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol	4.	labores de ahoyado e hincado vereda el carmen predio rnsc versalles municipio de Paicol
			
5.	Labores de ahoyado e hincado vereda espinaloza predio el chunche 3 municipio de Baraya	6.	Labores de templado y grapado vereda termopilas predio rnsc villa estefany municipio de rivera

			
7.	Labores de templado y grapado vereda el carmen predio rnsc el cedro municipio de Pitalito	8.	Labores de templado y grapado vereda el cedro predio rnsc el cedro municipio de Pitalito
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	23/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	28

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de transporte menor al sitio de la ejecución del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO LA CHORRERA MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Actividades de limpia del cerco	230	100	100	x	

Descripción y observaciones
Se realizan trabajos en el segundo tramo

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	293	62	62	x	
Labores de hincado	293	62	62	x	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	750	x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	2000	100	1100		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día miércoles 24 de enero.

Registro fotográfico			
1.		2.	Labores de transporte menor vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol	4.	Labores de templado y grapado vereda el carmen predio rnsc el cedro municipio de Pitalito
			
5.	Labores de templado y grapado vereda el cedro predio rnsc el cedro municipio de Pitalito		

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	24/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	29

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos				x	

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de transporte menor al sitio de la ejecución del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	293	80	142	x	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de ahoyado

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de templado y grapado	1200	100	850	x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	2000	150	1250		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día jueves 25 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de transporte menor vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata	2.	Labores de ahoyado predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol
			
3.	Labores de templado y grapado vereda el carmen predio rnsc el cedro municipio de Pitalito	4.	Labores de templado y grapado vereda el cedro predio rnsc el cedro municipio de Pitalito

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	25/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	30

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Transporte menor de insumos				x	
Labores de ahoyado	734	70	70	x	

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de transporte menor al sitio de la ejecución del cerco además de iniciar las labores de ahoyado

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Trazado y limpia del cerco	800	300	500	x	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de tranzado y limpia por donde va a pasar el aislamiento

Resumen de las actividades en el día	ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO	Época climática:	Seca

Actividades	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1200	100	1000	x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	2000	100	1350		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día viernes 26 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata	2.	Labores de limpia del trazado del cerco predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol
			

3.	Labores de templado y grapado vereda el carmen predio rnsc el cedro municipio de Pitalito	4.	Labores de templado y grapado vereda el cedro predio rnsc el cedro municipio de Pitalito
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	26/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	31

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML Y 6 HA	
ZONA: VEREDA RESGUARDO HUILA RIONEGRO PREDIO RESGUARDO HUILA RIONEGRO MUNICIPIO DE IQUIRA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de siembra	3750	2750	3750	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se adelantaron todas las labores de establecimiento del material vegetal con su respectiva aplicación de insumos.

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de hincado	734	70	70	x	

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de hincado de postes

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de hincado	293	40	102	x	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 400 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC VERSALLES MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	146	30	103	x	
Labores de hincado	146	30	103	x	

Descripción y observaciones
Se adelanta la ejecución de hincado y ahoyado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 110 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO EL CHUNCHE 3 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Templado y grapado del cerco	110	110	110	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución total del cerco.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	1200	150	1000	x	

Descripción y observaciones
Se realizaron labores de templado y grapado

Resumen de las actividades en el día	ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO	Época climática:	Seca

Actividades	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	2000	150	1500		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día lunes 29 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de siembra predio resguardo huila Rionegro Municipio de Iquira	2.	Labores de hincado vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata
			
3.	Labores de hincado predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol	4.	labores de ahoyado e hincado vereda el carmen predio rnsc versalles municipio de Paicol
			

5.	Labores de cerco finalizado vereda espinaloza predio el chunche 3 municipio de Baraya	6.	Labores de templado y grapado vereda el carmen predio rnsc el cedro municipio de Pitalito
			
7.	Labores de templado y grapado vereda el cedro predio rnsc el cedro municipio de Pitalito		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	29/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	32

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	734	93	163		
Labores de hincado	734	93	163		

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO LA CHORRERA MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Actividades de ahoyado (segundo tramo de 350)	128	68	128	Actividad finalizada	
Actividades de hincado (segundo tramo de 350)	128	68	128	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se realizan trabajos del segundo tramo

Resumen de las actividades en el día	ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO	Época climática:	Seca


Actividades	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de templado y grapado	1200	100	1100	x	


Descripción y observaciones
Se están realizando labores de templado y grapado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día martes 30 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio Humedal San Andrés Municipio de la Plata	2.	Labores de ahoyado e hincado predio la Chorrera Municipio de la Plata
			
3.	Labores de templado y grapado predio RNSC el cedro Vereda el Carmen Municipio de Pitalito		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	30/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	33

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	734	421	584		
Labores de hincado	734	421	584		

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de ahoyado e hincado.

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA CONGRESO PREDIO LA CHORRERA MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	350	350	350	Actividad finalizada	

Descripción y observaciones
Se terminan los trabajos para el aislamiento.

Resumen de las actividades en el día				ML: 1200 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO MUNICIPIO DE PITALITO				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**

Labores de templado y grapado	1200	100	1200	x	

Descripción y observaciones
Se finalizó el aislamiento.

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día miércoles 31 de enero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de ahoyado e hincado predio Humedal San Andrés Municipio de la Plata	2.	Aislamiento finalizado predio la Chorrera Municipio de la Plata
			
3.	Labores de templado y grapado predio RNSC el cedro Vereda el Carmen Municipio de Pitalito		

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	Ferney Danilo Castro

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	Andrés Felipe Saavedra

Información general					
Proyecto:	Contrato No. 0423 de 2023	**Objeto:**	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
Fase:	No aplica	**Jornada:**	Diurna	**Ambiente:**	Terrestre / Rural
Fecha del reporte:	31/01/2024	**Cliente:**	CAM	**Reporte N°**	34

Resumen de las actividades en el día				ML: 2000 ML	
ZONA: VEREDA SAN ANDRÉS PREDIO HUMEDAL SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE LA PLATA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de templado y grapado	2000	1000	1000		

Descripción y observaciones
Se realizan actividades de templado y grapado de alambre

Resumen de las actividades en el día				ML: 800 ML	
ZONA: VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PAICOL				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	293	20	162	x	
Labores de hincado	293	60	162	x	
Labores de templado y grapado	800	300	300		

Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de ahoyado e hincado se programa iniciar labores de templado y grapado al día siguiente

Resumen de las actividades en el día	ML: 400 ML	
ZONA: VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC VERSALLES MUNICIPIO DE PAICOL	Época climática:	Seca

Actividades	Programadas	Ejecutadas	Acumuladas	En progreso	Pendiente
Labores de ahoyado e hincado	146	59	132	x	
Labores de templado y grapado	400	310	310	x	

Descripción y observaciones
Se están realizando labores de ahoyado e hincado

Resumen de las actividades en el día				ML: 212 ML	
ZONA: VEREDA ESPINALOZA PREDIO CHUNCHE 1 MUNICIPIO DE BARAYA				Época climática:	Seca
Actividades	**Programadas**	**Ejecutadas**	**Acumuladas**	**En progreso**	**Pendiente**
Labores de ahoyado	77	30	30		


Descripción y observaciones
Se realiza la ejecución de ahoyado

Actividades planeadas para el día siguiente o semana siguiente
Se proyecta seguir con las labores el día jueves 1 de febrero.

Registro fotográfico			
1.	Labores de templado y grapado vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata	2.	Labores de templado y grapado vereda san andrés predio humedal san andrés municipio de la plata
			
3.	Labores de ahoyado e hincado predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol	4.	Labores de templado y grapado predio Humedal San Antonio vereda Alto san Miguel Municipio de Paicol

			
5.	Labores de ahoyado e hincado predio RNSC Versalles municipio de Paicol	6.	Labores de templado y grapado predio RNSC Versalles municipio de Paicol
			
7.	Labores de ahoyado vereda espinaloza predio chunche 1 Municipio de Baraya		
			

Ingrese más filas de ser necesario.

Responsables del reporte:	**Ramiro Devia Galindo**	**Firma:**	
	Ferney Danilo Castro Galindez	**Firma:**	

VALIDACIÓN DEL COORDINADOR DEL PROYECTO	**Andrés Felipe Saavedra**	**Firma:**	
