8. Anexo 1: INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

INFORME DE ANÁLISIS Y MEJORA DE PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

La Fundación Activos Por El Mundo – FAMUNDO, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los proyectos ejecutados en el municipio de Apartadó, los cuales fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Este estudio se ha centrado en identificar posibles falencias y evaluar el desempeño de dichos proyectos, asumiendo la responsabilidad como contratistas de mejorar esas falencias y lograr mejores resultados en los índices de rendimiento del IGPR.

DESAFÍOS INICIALES

Al recibir el municipio de Apartadó, nos encontramos con una serie de inconsistencias y un rendimiento bajo en el Índice de Gestión y Desempeño de Proyectos (IGPR). Es crucial reconocer que estas dificultades no solo son reflejo de la ejecución de los proyectos por parte de los contratistas sino también de las acciones realizadas por quien en su momento realizaba los reportes de información en el aplicativo GESPROY 3.0. Estas inconsistencias actúan como un punto de partida para nuestro compromiso de abordar y superar los desafíos identificados.

Durante el análisis detallado, se han identificado diversas falencias en la ejecución, seguimiento y reporte de información de los proyectos municipales financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Estas falencias abarcan desde aspectos administrativos hasta cuestiones técnicas, afectando significativamente el desempeño general del municipio en el índice de IGPR.

Adicionalmente, los puntajes de desempeño obtenidos en la evaluación revelan áreas críticas que requieren atención inmediata. Estos resultados no solo son indicativos de la realidad actual, sino que también brindan una base sólida para la implementación de medidas correctivas.

Como contratista asumimos el compromiso de solventar las vicisitudes identificadas en la recolección y reporte de información de los proyectos. Nuestro objetivo principal es elevar el desempeño del municipio de Apartadó, especialmente en lo que respecta al IGPR.

CONTEXTO

En el año 2016 se realizó la primera medición del IGPR el enfoque conceptual utilizado establecía dos dimensiones: la gestión administrativa de la entidad y la gestión del desempeño de los proyectos de inversión. En el año 2020, se adoptan cambios en el enfoque conceptual y metodológico, con la expedición de la circular 09-4 del 3 de abril de 2020 la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) implementa el índice de gestión de proyectos de regalías IGPR 2.0.

El índice focaliza la medición en la eficiencia de los proyectos en términos de alcance, tiempo y costo. Atendiendo entre otras las recomendaciones formuladas en estudios por el Banco Mundial, el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo PNUD y

aspectos metodológicos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OECD.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión y la medición se realiza únicamente a la gestión de los proyectos en el trimestre objeto de medición a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo **GESPROY SGR**.

En el año 2021 con la entrada en vigor de la Ley 2056 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la competencia de expedir la metodología para la medición del desempeño en la gestión de los recursos del SGR, que establece el artículo 1692 de la citada Ley.

El DNP administrador del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC) del SGR, identificó el Índice de Gestiona de Proyectos de Regalías IGPR como la propuesta conceptual para adoptar la metodología de medición de desempeño en la gestión de los recursos de regalías.

La medición del desempeño en la gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías aplica para las entidades ejecutoras y beneficiarias del SGR, que podrán ser designadas como ejecutoras, así como aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Regional y el 60% de la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020.

El IGPR determinará el adecuado desempeño que permita a las entidades beneficiarias de inversiones directas aprobar directamente los proyectos y ser designadas como ejecutoras de proyectos de regalías en la vigencia 2023.

REPORTE DE INFORMACION PARA LA MEDICION

Para los efectos de la medición del índice de gestión de proyectos IGPR, las entidades beneficiarios y ejecutoras de los proyectos de inversión deben registrar, aprobar y enviar en el aplicativo GESPROY SGR los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión financiado con los recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación, de forma veraz, oportuna e idónea, dentro d ellos 15 primero días de cada mes con corte al último día del mes anterior. La aprobación y envío de la información está a cargo del representante legal de las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión, se evalúa únicamente la gestión del trimestre objeto de medición, no contempla gestiones de trimestres anteriores. Asimismo, se reconocen las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras.

Estructura Índice de Gestión de Proyectos, IGPR

La estructura de la medición del INDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS — IGPR, tiene dos componentes: Cobertura de Información y Eficiencia, con los que se busca garantizar resultados del uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR.

- ✓ **La Cobertura de Información** corresponde a los datos actualizados y consistentes que se debe registrar y aprobar por el representante legal de la entidad ejecutora, acorde al estado del proyecto de inversión de forma mensual en el aplicativo Gesproy SGR a más tardar el día 15 de cada mes, de acuerdo con la normatividad vigente.
  A la fecha del corte trimestral, la cobertura de información para cada proyecto está definida en tres variables dependientes: completitud, consistencia y oportunidad en el reporte de información del proyecto de inversión en el aplicativo Gesproy-SGR:
  a. **Completitud Y Consistencia De La Información**: se evalúan validando si la información del proyecto es completa y consistente con su estado, así como a través de la alerta de "no reporte de información". Cada variable a verificar contara con una puntuación.
  b. **Oportunidad del Reporte**: Se evalúa identificando sí el representante legal aprobó y envió la información registrada del mes anterior durante los 15 días siguientes en el aplicativo Gesproy. La aprobación y envío de la información estará a cargo del representante legal de la entidad ejecutora del proyecto de inversión.
  El cumplimiento en la aprobación y envió de información en cada mes del trimestre tendrá la siguiente calificación:

1 mes	2 meses	3 meses
33,3 puntos	66,6 puntos	100 puntos



En caso de que la entidad ejecutora reporte de manera inoportuna, incompleta e inconsistente la información tendrá una *reducción* en la calificación del proyecto, lo cual se detalla en las fichas técnicas de los indicadores.

- ✓ **La Eficiencia** se mide en función del cumplimiento del alcance, tiempo y costo del proyecto aprobado. La eficiencia del proyecto es una variable dependiente de la cobertura de información.
  Un proyecto de inversión del SGR es eficiente en la medida que con los recursos aprobados y el tiempo estimado ejecuta los productos definidos para dar solución a la necesidad de la población objetivo.
  Bajo este concepto el IGPR busca determinar la eficiencia del proyecto de acuerdo con el estado en el que se encuentre a la fecha de la medición. Para esto se consideran lo siguientes estados:
    (a) **Sin Contratar:** corresponde a los proyectos aprobados sin migrar a Gesproy, sin suscripción de contratos y sin registro de alcance y programación.

La eficiencia está determinada por la programación de la ejecución y el tiempo que la entidad beneficiaria y la entidad ejecutora, de acuerdo a sus competencias se han tomado para gestionar los aspectos requeridos hasta la suscripción de su primer contrato. Incluyendo las gestiones asociadas con la designación de ejecutor y publicación de acuerdo aprobación en SUIFP SGR, Asignación de recursos y aprobación de cronograma de flujos en el SPGR.

(b) **En Ejecución:** corresponde a los proyectos contratados que no han alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%).
la eficiencia está determinada en función del cumplimiento de los avances físicos y tiempos programados por periodo y el cumplimiento en el costo.

(c) **Terminados:** corresponde a los proyectos con ejecución física del cien por ciento (100%) o terminados autónomamente por la entidad ejecutora; se incluye los proyectos cerrados en el trimestre medido.

la eficiencia está en función del cumplimiento del alcance, asociado a la entrega de los productos definidos, el cumplimiento del tiempo y costo programado, así como el cierre oportuno de los proyectos de inversión.

(d) **Desaprobados:** corresponde a los proyectos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración – OCAD o las entidades beneficiarias; que no inician ejecución y sobre los cuales procede la liberación de recursos del SGR.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la desaprobación se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR.

(e) **Proyectos con decisión motivada de no continuidad:** corresponde a los proyectos aprobados sobre las cuales las entidades ejecutoras deciden de manera motivada sobre la continuidad de este, cuando se encuentren situaciones de riesgo consolidadas, ausencia de viabilidad técnica o jurídica o en aquellos eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El resultado de eficiencia es cero (0) dado que la no continuidad se entiende como consecuencia de una gestión ineficiente de los recursos del SGR y tendrá una afectación durante cuatro (4) trimestres continuos.

Por cada estado del proyecto se definen indicadores de eficiencia, en función a lo reportado en el sistema de información Gesproy SGR y la información que migra de los

aplicativos SUIFP SGR del DNP y Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) del MHCP.


En relación con la programación del proyecto, los avances físicos, el costo y registro de cumplimiento de metas. El detalle de cálculo para los indicadores definidos se relaciona a continuación para cada estado.

RANGOS DE CALIFICACIÓN

Los rangos de calificación del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR se definen en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados —-SINERGIA, relacionados con la guía para la construcción y análisis de indicadores donde específicamente proponen generar mecanismos de alertas tempranas tipo semáforo que consisten en clasificar rangos de puntajes en colores que van del rojo al verde, siendo rojo el rango de puntaje más bajo y verde el más alto.

Por lo cual se adopta la escala de calificación utilizada por SINERGIA en el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Se asignarán los siguientes rangos fijos tanto al resultado del proyecto como al resultado de la entidad ejecutora o beneficiaria de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.

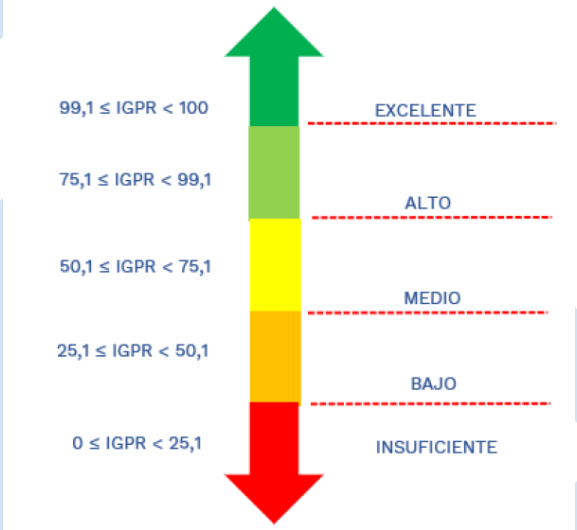

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

ANÁLISIS VISUAL DEL DESEMPEÑO IGPR EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ




En la primera etapa de nuestro análisis, nos sumergimos en el visualizador gráfico de la medición de desempeño del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el municipio de Apartadó. De acuerdo con las cifras presentadas, el municipio exhibe un IGPR de 65.60, ubicándose en la categoría de rango medio en el espectro de evaluación.

Este puntaje sitúa a Apartadó en una posición relativa dentro del conjunto total de municipios de su mismo rango, ocupando concretamente el puesto número 106 de 175 en términos de calidad, eficiencia y cobertura en el reporte de información. Es importante destacar que esta posición intermedia indica un desempeño que, si bien no alcanza los niveles más altos, tampoco se encuentra en los extremos inferiores.

Este análisis visual brinda una perspectiva inicial sobre la situación del municipio en cuanto a la gestión de proyectos de regalías, permitiendo identificar su posición relativa y proporcionando una base para la comprensión más detallada de los factores que contribuyen a este desempeño. A partir de esta información, la Fundación FAMUNDO puede enfocar sus esfuerzos en áreas específicas que podrían beneficiarse de intervenciones estratégicas, con el objetivo de elevar el IGPR y posicionar a Apartadó en un nivel aún más alto de eficiencia y calidad en la ejecución de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.


Histórico de Resultados (Primer Trimestre de 2022 - Tercer Trimestre de 2023)

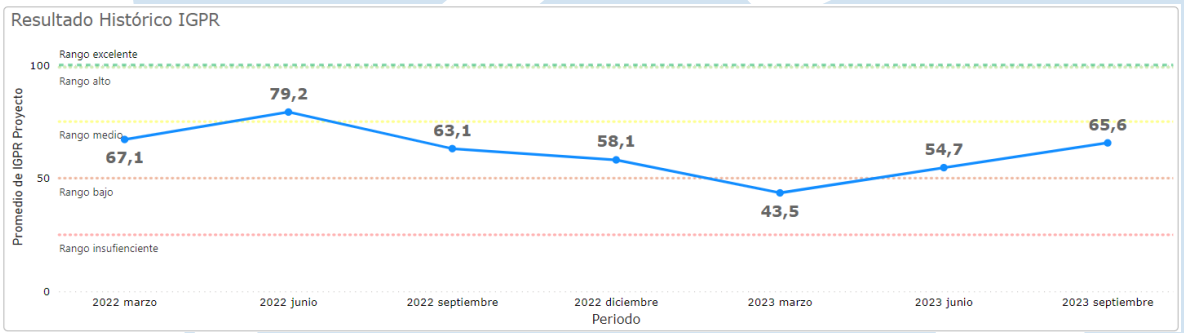

El examen de los resultados históricos del IGPR para el municipio de Apartadó, abarcando desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023, revela

un patrón de desempeño irregular. Durante este periodo, se observan fluctuaciones notables en los puntajes obtenidos, reflejando una dinámica variable en la ejecución de proyectos de regalías.

Destaca el segundo trimestre de 2022 como el periodo de más alto rendimiento de los últimos 2 años, alcanzando una puntuación de 79.2, puntaje que, aunque incremento aun es considerado medio, por otro lado, el primer trimestre de 2023 presenta un marcado descenso en el desempeño, obteniendo una puntuación baja de 43.5. Esta variación sustancial denota una irregularidad significativa en los estándares de IGPR y sugiere la presencia de desafíos operativos o administrativos durante ese periodo específico.

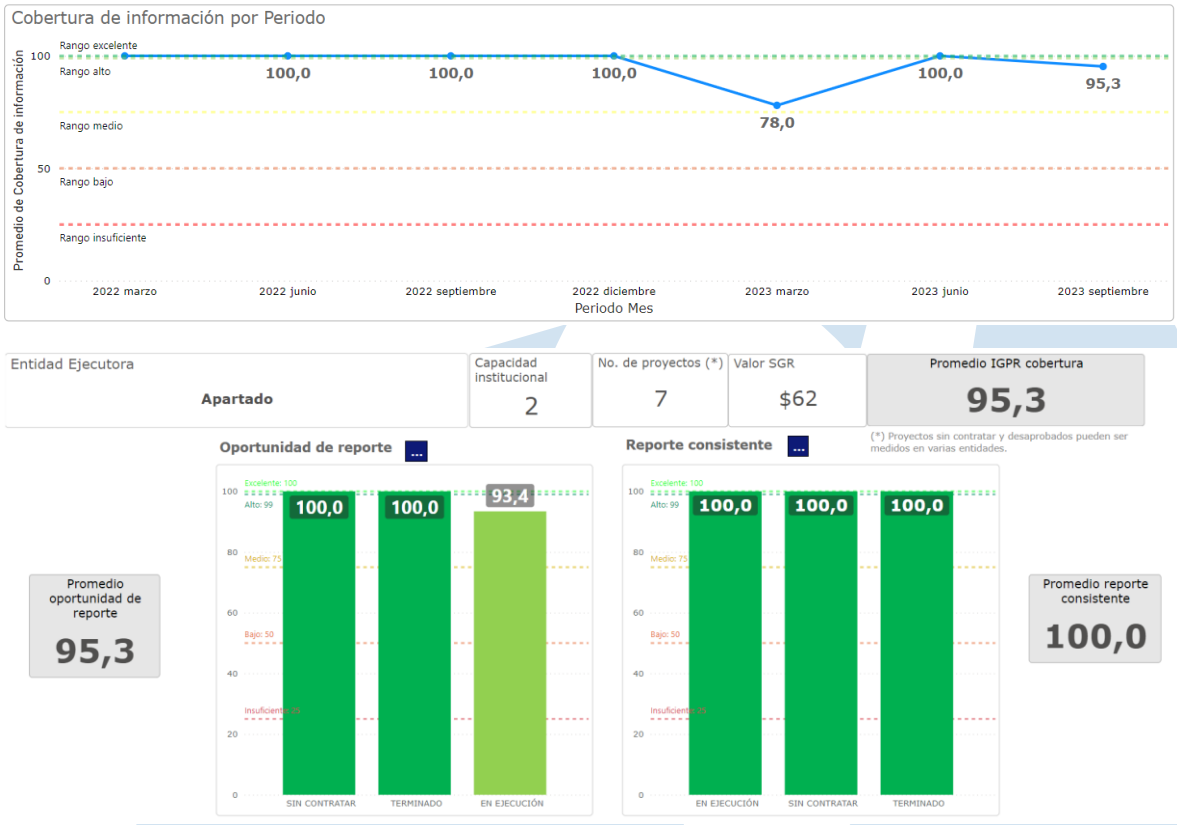


Al examinar detenidamente la cobertura de información por periodo en el IGPR para el municipio de Apartadó, se destaca la puntualidad con la que se ha reportado la información a lo largo de los trimestres. Este aspecto es crucial, ya que la oportunidad en la presentación de datos es esencial para la evaluación adecuada de los proyectos de inversión.


Es alentador observar que el municipio ha obtenido puntajes altos en cuanto a la cobertura de información, indicando que, en términos temporales, la entidad ejecutora ha cumplido eficientemente con el registro y reporte de datos en el aplicativo GESPROY SGR. Este nivel de puntualidad proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y la gestión efectiva de los proyectos de regalías.


No obstante, es crucial recordar que el IGPR no se limita únicamente a la oportunidad en el reporte de información, sino que también abarca la calidad, eficiencia, corrección

y veracidad de los datos presentados. Aunque la cobertura de información ha sido destacada, el puntaje general del municipio se mantiene en un rango medio, lo cual sugiere que existen otros aspectos que también influyen en la evaluación global del desempeño.

Este análisis resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la puntualidad y la precisión en el reporte de información. En consecuencia, se plantea la necesidad de evaluar y mejorar otros aspectos del proceso, garantizando que la eficiencia y corrección en la ejecución de proyectos se reflejen de manera integral en el índice general de gestión. Este enfoque integral será esencial para elevar el desempeño del municipio y avanzar hacia la excelencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

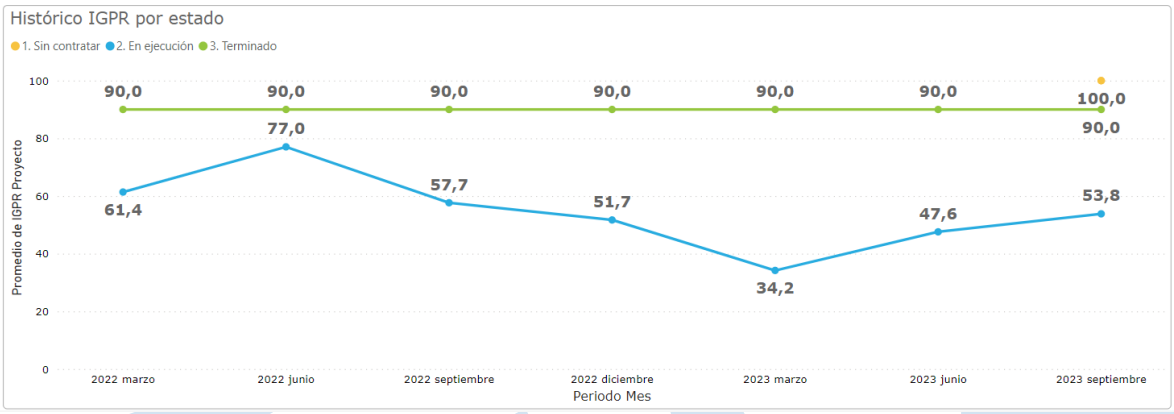



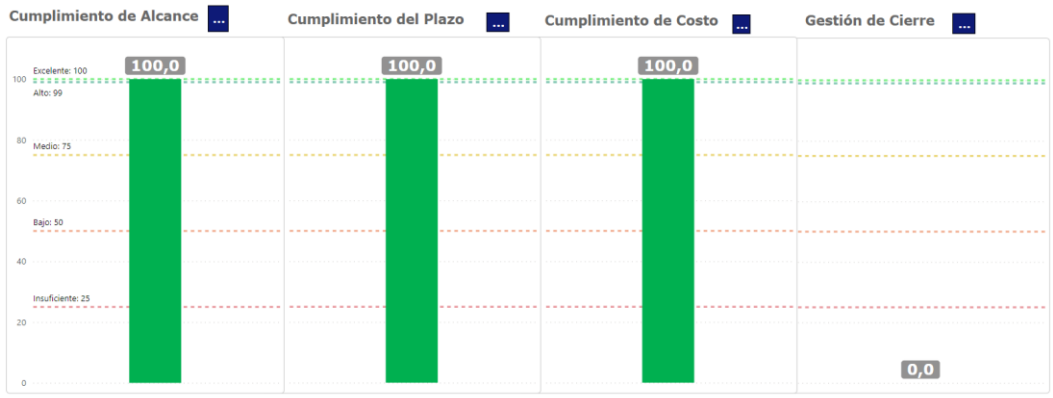

La observación detallada del cuadro anterior destaca una comparación significativa según los estados de los proyectos en el IGPR para el municipio de Apartadó. Una conclusión clave es la presencia de una línea verde que representa los proyectos terminados. A pesar de haber alcanzado la fase de terminación, se observa que el puntaje no supera los 90, lo cual sugiere una falta de cierre efectivo en estos proyectos.

Este hallazgo revela un aspecto crítico en la gestión de proyectos en el municipio, específicamente en la fase de cierre. La falta de puntajes más elevados en proyectos terminados podría atribuirse a diversos factores, entre ellos, la ausencia de reporte de

actas de terminación y liquidación, así como la carencia de un registro fotográfico que documente adecuadamente la finalización del proyecto.

La presencia de indicadores de productos sin avances, aun cuando el proyecto se encuentra en estado terminado, plantea interrogantes sobre la eficacia en la ejecución y la calidad de la gestión durante las fases finales de los proyectos. Esta situación puede afectar la evaluación global del desempeño del municipio en el IGPR y resalta la necesidad crítica de abordar las deficiencias en el cierre de proyectos.

Como parte de las estrategias de mejora, se podría considerar la implementación de protocolos claros para el cierre de proyectos, asegurando que se cumplan los requisitos necesarios, como el reporte de actas, registros fotográficos, y el seguimiento adecuado de los indicadores de productos. Abordar estas áreas de mejora fortalecerá la eficiencia y efectividad en la culminación de los proyectos, contribuyendo así a un desempeño más destacado en el IGPR



La línea azul que representa los proyectos en ejecución en el municipio de Apartadó revela fluctuaciones significativas en los puntajes, señalando posibles desafíos y áreas de mejora en la gestión de estos proyectos. La presencia de puntuaciones bajas sugiere que algunos proyectos en ejecución no están cumpliendo con los estándares esperados en términos de programación, costos y tiempos.

Estas fluctuaciones podrían indicar que ciertos proyectos enfrentan dificultades en su implementación, ya sea por incumplimientos de los contratistas o deficiencias en el reporte de información. Es crucial destacar que estas deficiencias en el reporte podrían ser atribuibles a una negligencia por parte de quienes están a cargo de proporcionar la información en el aplicativo GESPROY.

La falta de cumplimiento con la programación, costos y tiempos puede tener un impacto directo en el desempeño general de los proyectos, afectando la eficiencia y la calidad de su ejecución. Para abordar esta problemática, se podría considerar la implementación de medidas más rigurosas de supervisión y seguimiento, así como la mejora en la comunicación entre las partes involucradas, incluyendo contratistas y responsables de reportar información.

Es esencial identificar y abordar de manera proactiva las causas subyacentes de las fluctuaciones en los puntajes de proyectos en ejecución para garantizar una gestión más eficiente y eficaz. Este análisis permitirá la implementación de estrategias específicas que mejoren la ejecución y contribuyan a un desempeño más consistente y elevado en el IGPR para el municipio de Apartadó.

Concluido el análisis detallado del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) que brindó una visión integral del desempeño general del municipio de Apartadó, procederemos a una revisión minuciosa de cada proyecto individual en el aplicativo GESPROY. Este enfoque específico nos permitirá identificar de manera precisa las faltas de información y las posibles deficiencias en el registro de cada proyecto.

Nos comprometemos a realizar una evaluación exhaustiva, proyecto por proyecto, con el objetivo de identificar áreas específicas que requieran subsanación. Nos centraremos en aspectos clave, como el correcto registro de todas y cada una de las actas de los contratos, reporte de pólizas, registro de avances de indicadores, reporte de ejecución si los hubiese, la integridad del registro fotográfico de inicio, ejecución y terminación, la programación y ejecución adecuada de los proyectos, así como la veracidad y oportunidad en el reporte de información.

Este proceso detallado no solo abordará las deficiencias identificadas, sino que también permitirá implementar estrategias y protocolos mejorados para garantizar la calidad y consistencia en el registro de información en futuros periodos. La colaboración estrecha con los responsables de cada proyecto y contratistas será fundamental para asegurar la transparencia y precisión en la información reportada.

La subsanación de las faltas de información contribuirá no solo a mejorar los puntajes individuales de cada proyecto, sino también a elevar el desempeño general del municipio en el IGPR. Este enfoque proactivo y detallado refleja nuestro compromiso continuo con la mejora constante y la eficacia en la ejecución de proyectos de regalías, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad de Apartadó.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA

En el análisis que se llevará a cabo, abordaremos una variedad de temas clave que son fundamentales para comprender el estado actual de los proyectos municipales en San Apartadó, Antioquia. En primer lugar, examinaremos detalladamente los proyectos que tienen entidad ejecutora designada, miraremos las alertas y posibles riesgos de inversión en estos, luego revisaremos los proyectos en los que el municipio se encuentra en calidad de entidad ejecutora, identificando aquellos en los cuales la municipalidad tiene la responsabilidad directa de la ejecución y, por ende, la obligación de reportar información pertinente. Este enfoque nos permitirá entender la amplitud de la actividad municipal y evaluar su capacidad para gestionar eficazmente proyectos de diversa índole.

Se hará una relación de las alertas y los riesgos de inversión que provienen de la administración pasada y el estado en el que se recibe la información reportada en el GESPROY, con la finalidad de realizar las correcciones respectivas, evaluar el estado de cada proyecto nos permitirá comprender su progreso, identificar posibles errores o falencias en el reporte de la información y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para garantizar el correcto reporte de la información y mejorar así los indicadores de IGPR. Asimismo, estaremos atentos a la identificación de alertas y subsanaciones necesarias, asegurando así que cualquier problema o riesgo potencial sea abordado de manera oportuna y eficaz para evitar mayores complicaciones en el reporte de la información.

1. RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY

1.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
2020000100731	Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia	$ 7.543.169.163	$ 5.736.369.097	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2020050450048	Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia	$ 10.397.673.176	$ 5.000.000.000	TERMINADO
2021050450078	Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó	$ 17.998.323.605	$ 6.000.000.000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022000040002	Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia	$ 13.030.304.753	$ 10.208.714.365	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

2022050450076	Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó	$ 15.577.154.473	$ 15.577.154.473	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
2022050450078	Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó	$ 3.922.817.006	$ 2.822.817.006	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450060	Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó	$ 909.670.896	$ 909.670.896	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450066	Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó	$ 1.180.597.321	$ 1.180.597.321	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450073	Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó	$ 935.915.580	$ 935.915.580	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
20181301010478	Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios PDET En El Marco De La Implementación Del Acuerdo Final Para La Paz A Nivel Nacional	$ 86.331.261.284	$ 86.331.261.284	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:


1.1.1. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA

1.1.1.1. Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia BPIN. 2020000100731.

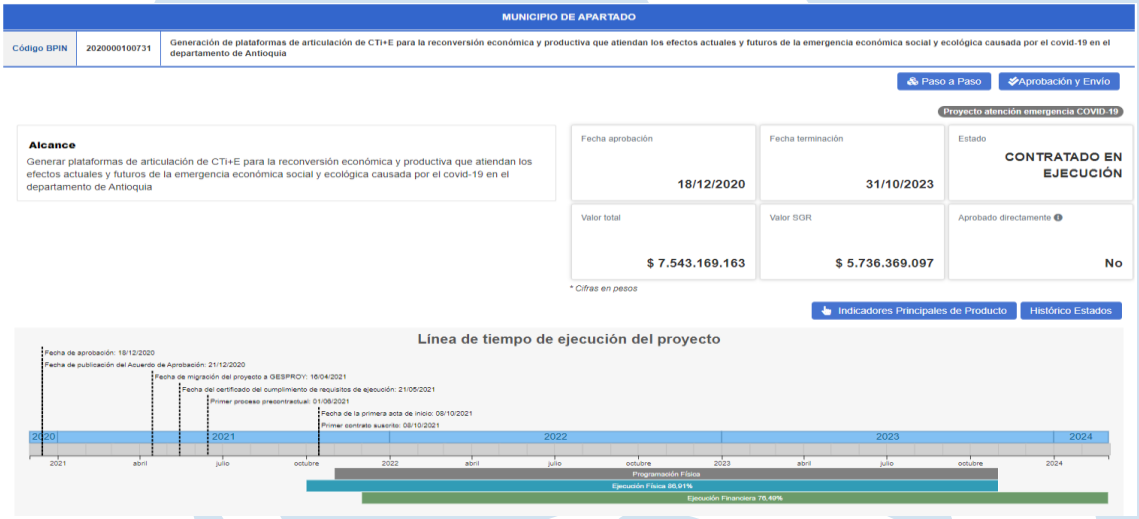

Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.2. Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia. BPIN. 2020050450048.

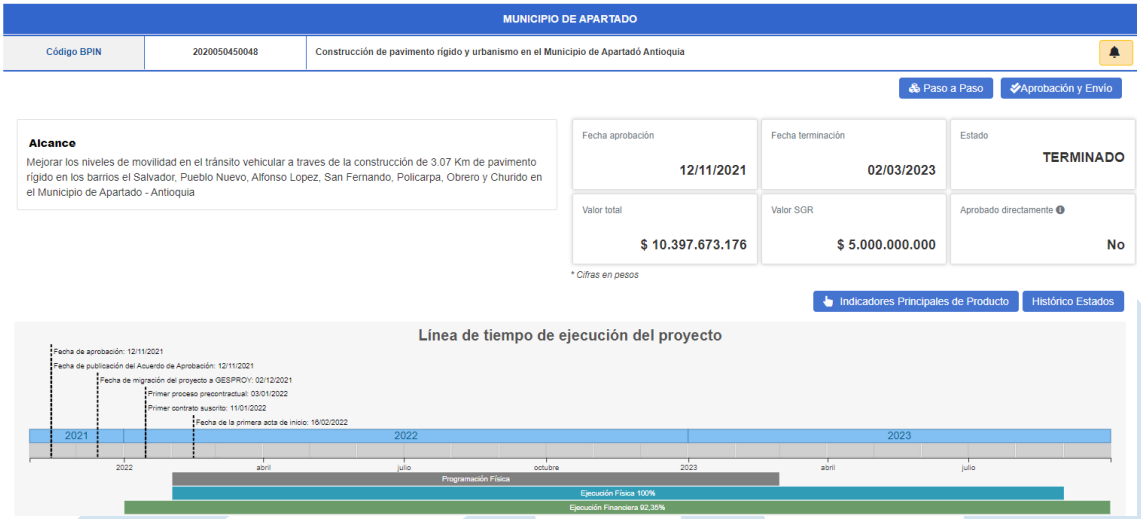

El proyecto en cuestión presenta un total de **DOS ALERTAS**, de las cuales una es considerada de **RIESGO ALTO** y una de **RIESGO BAJO**.

- **EJ 1-30** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad alto, Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad.
- **EJ-1-24** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad medio Proyecto terminado sin cerrar.

Alertas para el proyecto 2020050450048

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ 1-30	Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad	No reporte de informaci¿n de Benficiarios, Sostenibilidad, Concepto t¿cnico Dias desde el estado TERMINADO : 165	$165			Inmediato	
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 166	$166			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- Reporte a los órganos de control.


El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.1.1.3. Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó BIPN. 2021050450078




Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.4. Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia. BPIN. 2022000040002

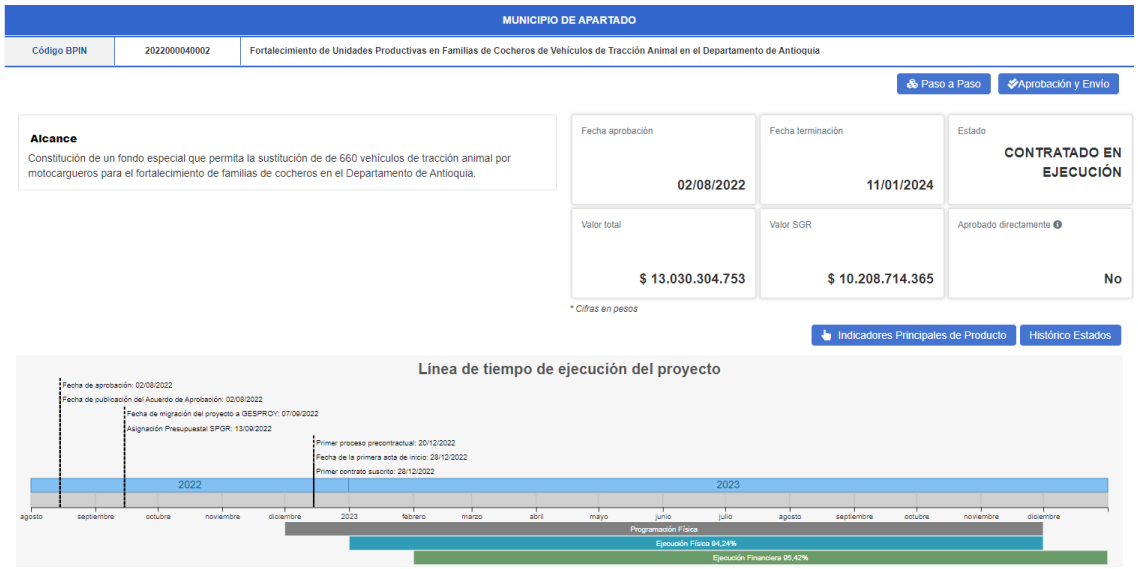


Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.5. Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450076

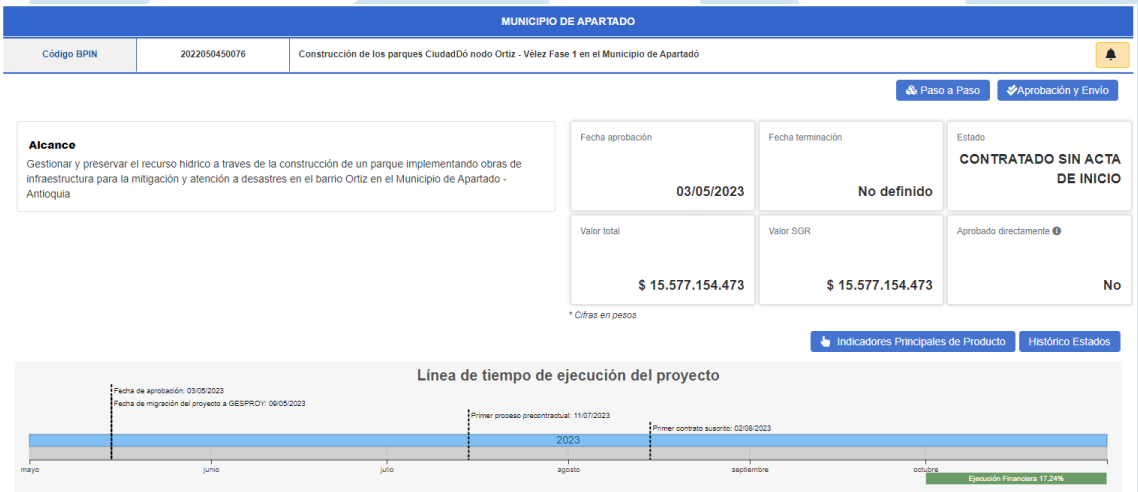

El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ 1-27** Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación

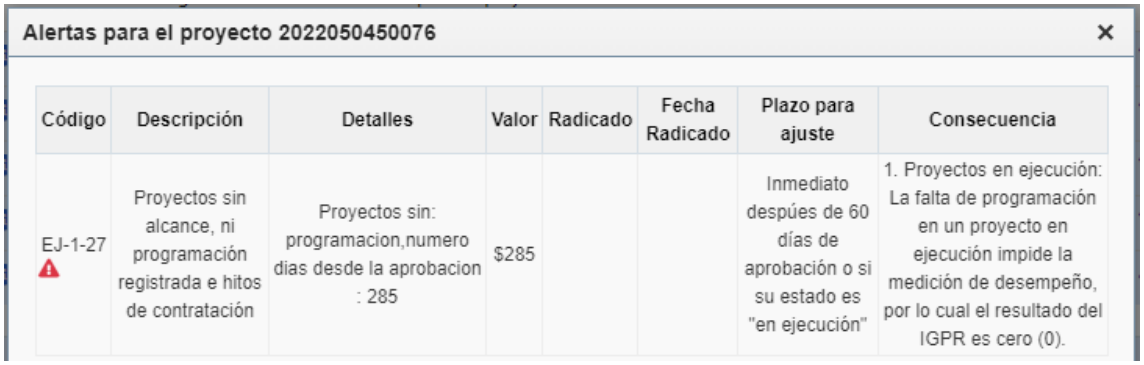

Alertas para el proyecto 2022050450076


Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-27 ⚠	Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 285	$285			Inmediato despúes de 60 días de aprobación o si su estado es "en ejecución"	1. Proyectos en ejecución: La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).

ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.


1.1.1.6. Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450078

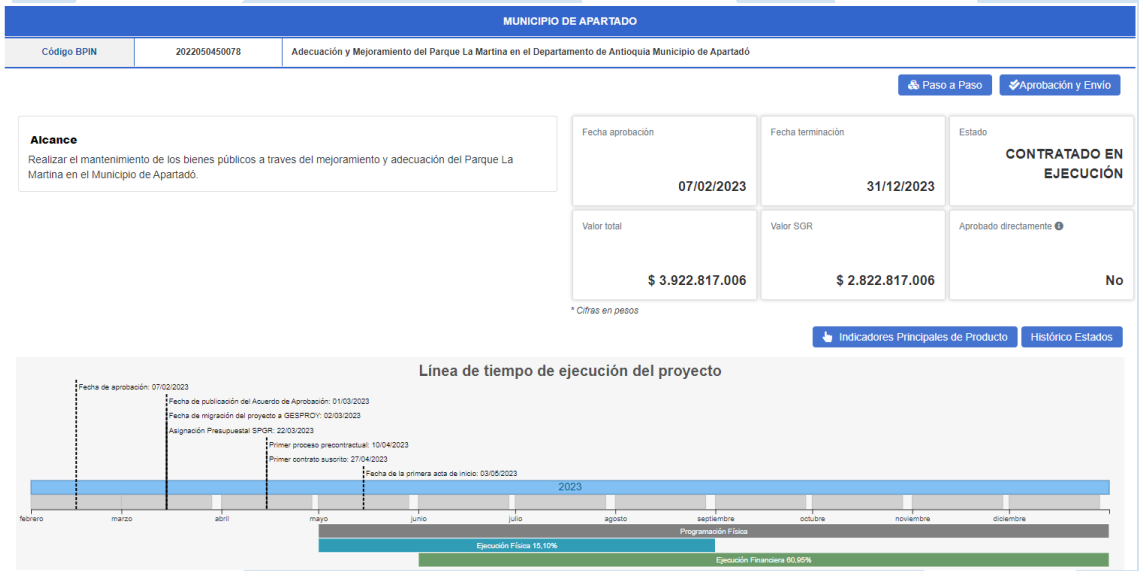

Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y


ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.7. Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450060.

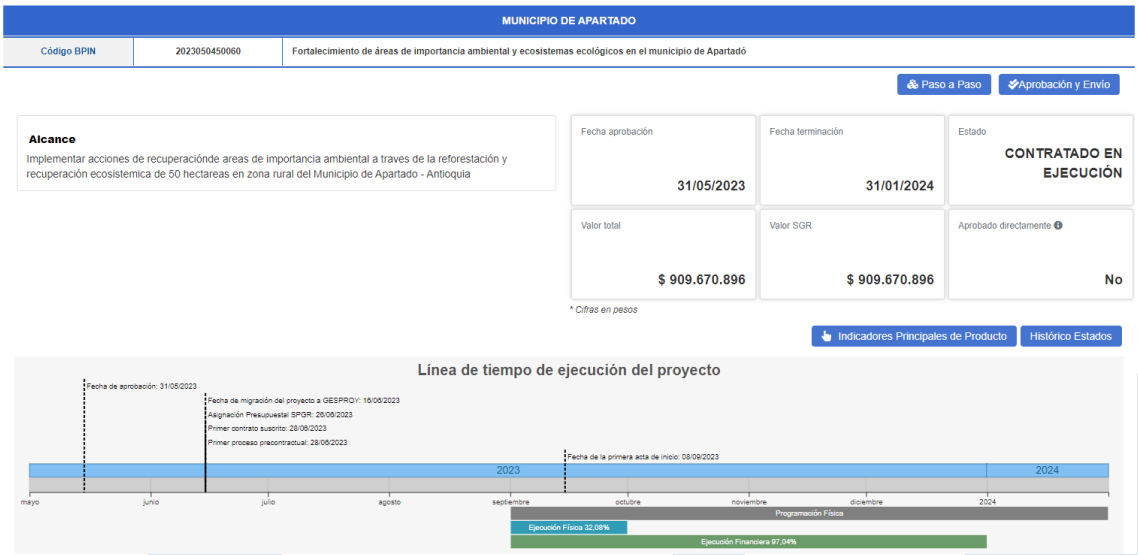


Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.8. Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450066

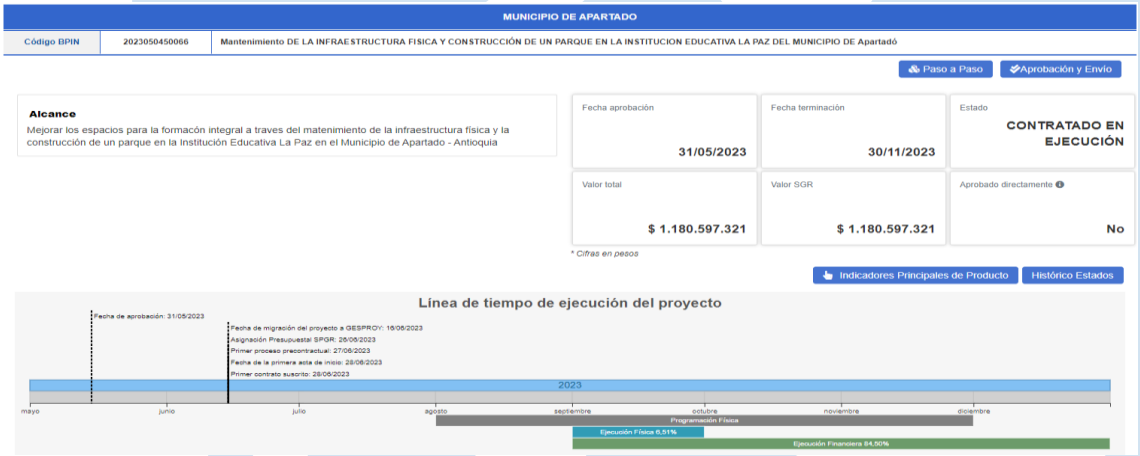


Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.1.1.9. Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó BPIN. 2023050450073.

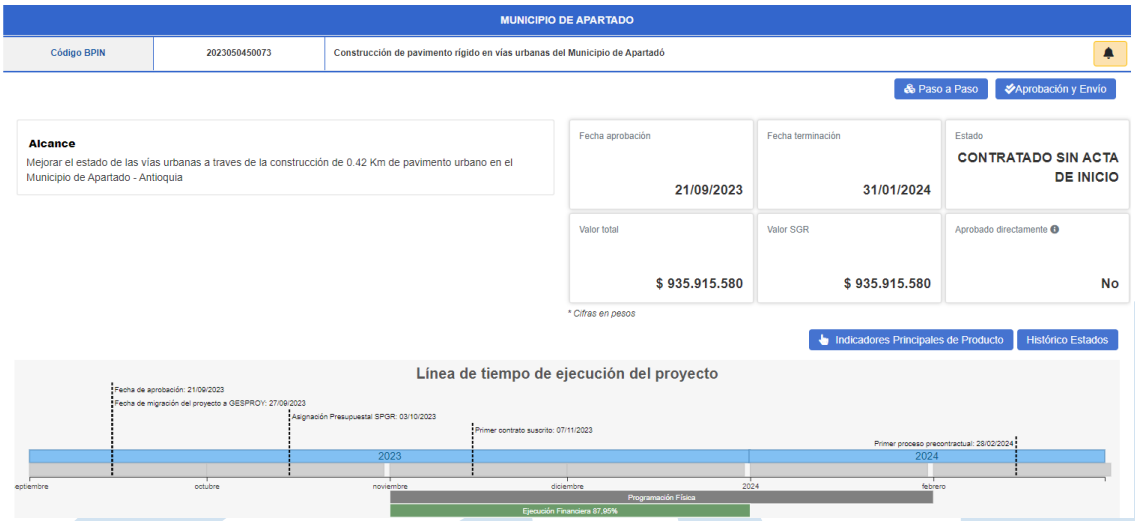

El proyecto en cuestión presenta un total de **DOS ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-1-01** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.
- **EJ-1-31** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad moderado, Riesgo de liberación automática

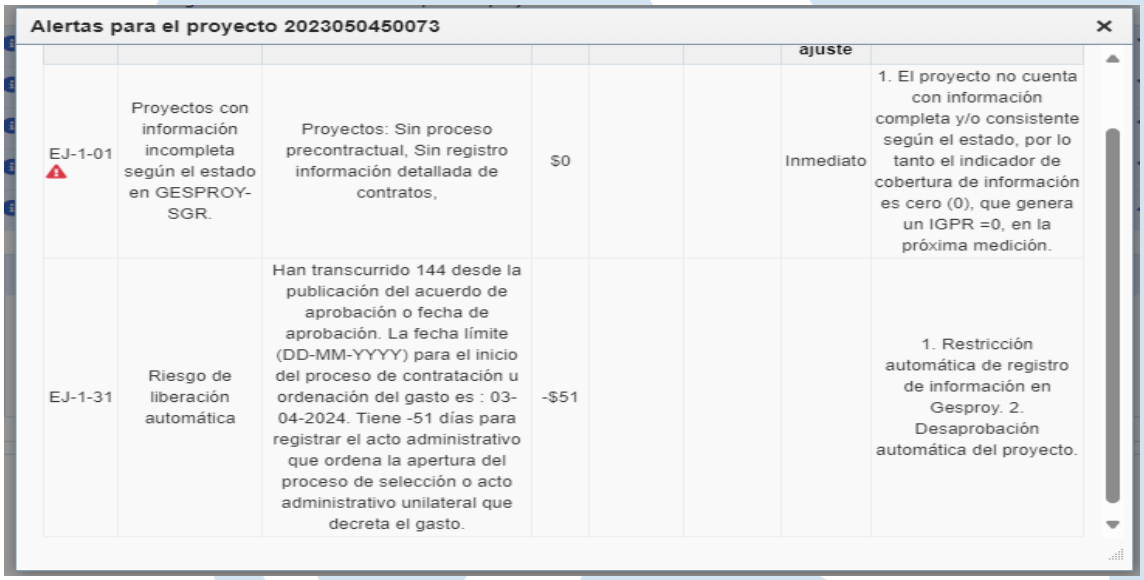


ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

- El indicador de cobertura de información es cero (0), que genera un IGPR =0, en la próxima medición.
- Restricción automática de registro de información en Gesproy.
- Desaprobación automática del proyecto.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.1.1.10. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.

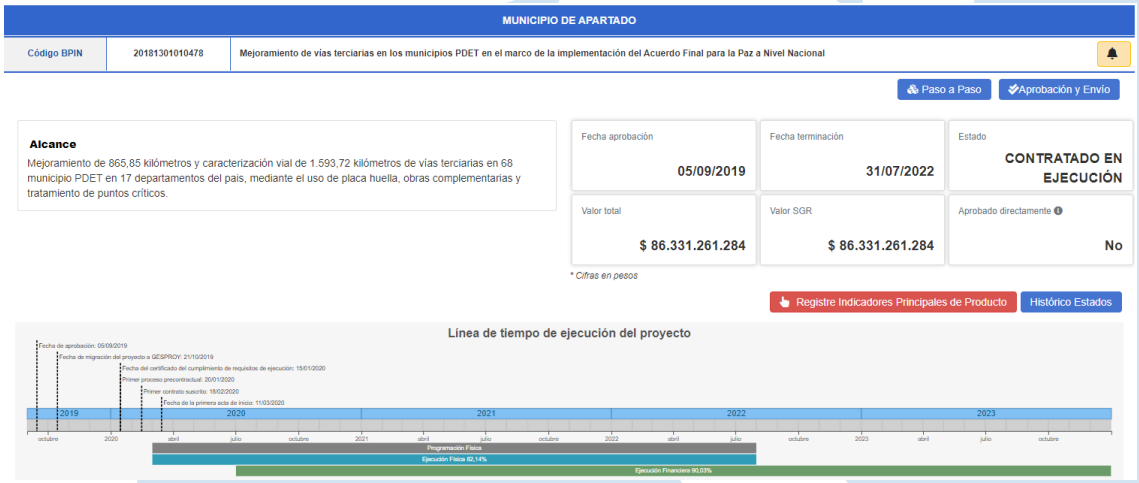

El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-2-27** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado.



Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-2-27	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiaci¿n al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. INVLOCAL_NBI_2056 Dif: -$300.00;	$0				

ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

1.2. PROYECTOS DE INVERSION DONDE EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD EJECUTORA.

Dando continuidad al análisis, es crucial examinar detalladamente los proyectos en los cuales el municipio de Apartadó actúa como entidad ejecutora. En este sentido, es esencial evaluar cómo se han recibido estos proyectos y las alertas que se generaron en periodos anteriores y que gracias a la gestión realizada se subsanaron o se subsanaran, identificando posibles irregularidades o áreas de mejora en su ejecución. Durante el mes de enero, se han llevado a cabo una serie de acciones para subsanar las irregularidades detectadas, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.


Estas acciones incluyen la revisión exhaustiva de los procesos de contratación, la actualización de la información en los sistemas de seguimiento y la implementación de medidas correctivas necesarias para asegurar el avance adecuado de los proyectos.

Sobre todo, se ha puesto un énfasis especial en mejorar los procesos, con miras a obtener mejoras en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y, por ende, en la eficiencia y efectividad global de la gestión municipal. Es fundamental abordar cualquier irregularidad de manera proactiva y tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito de los proyectos ejecutados por el municipio.

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
20211301011050	Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó	$ 28.234.394.168	$ 28.234.394.168	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301012048	Construcción De Unidades Sanitarias Del Sector Rural En El Municipio De Apartadó Departamento De Antioquia	$ 2.377.161.738	$ 2.377.161.738	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301011128	Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó	$ 13.176.723.456	$ 13.176.723.456	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

20201301010064	Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Vial Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia	$ 11.765.449.630	$ 11.281.488.350	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20191301010197	Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó	$ 5.702.726.968	$ 5.098.957.370	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

1.2.1. Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó BPIN. 20191301010197.

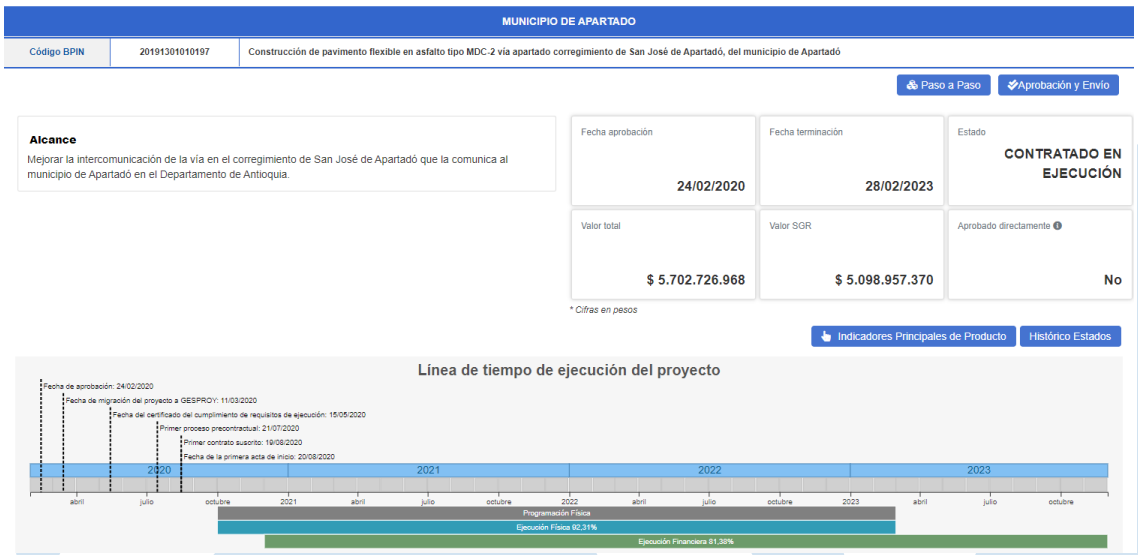

El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa al 100%, sin embargo, la ejecución de productos está apenas en un 21%, lo que sugiere una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar adecuadamente los avances del proyecto. Además, se ha observado la falta de registro fotográfico que evidencie la finalización del proyecto, lo que constituye otra irregularidad. Es importante destacar que el proyecto cuenta con una fuente de financiación de recursos propios, pero hasta la fecha no se han reportado pagos asociados a este tipo de recursos. Estas deficiencias comprometen la integridad y transparencia en la gestión del proyecto, requiriendo una pronta acción correctiva para garantizar la adecuada documentación y seguimiento de su ejecución.

Además de las irregularidades mencionadas, también se ha constatado que no se ha realizado el reporte de información correspondiente al mes de diciembre. Esta omisión agrava aún más la situación, ya que impide una evaluación precisa y oportuna del progreso del proyecto durante esos periodos. Este hecho no solo dificulta la adecuada supervisión y seguimiento del proyecto, sino que también afecta negativamente al Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), empeorando aún más el puntaje ya bajo con el que se

recibió el municipio. Es esencial abordar esta falta de reporte de información de manera inmediata para revertir este impacto negativo en la gestión municipal.

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se realiza la aprobación y envió del mes de diciembre 2023, con la finalidad de evitar alertas.



MUNICIPIO DE APARTADO		
Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)


Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2023	Diciembre	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2024			

- ✓ Se solicita información a la secretaria de planeación para poder realizar la actualización de la información en el sistema.

20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó	5.702.726.968,00	5.098.957.370,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	OBRA	349 de 2020	900019519-MEPROPLÚS SA	$ 5.379.037.777	1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS
						INTERVENTORIA	354 de 2020	901402977-CONSORCIO INTERVIAS APARTADÓ	$ 323.689.191	1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

- ✓ Se reporta pago realizado al contratista de obra el 24 de noviembre de 2023, pago que la anterior administración omitió reportar en el periodo correspondiente, se espera el pago final y la respectiva acta de liquidación para proceder con el cierre en el sistema.



	5	24/11/2023	Comprobante de egreso	5753	900019519 - PETROPLUS SA	ACTA DE PAGO 03 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 202320 ADICION AL CONTRATO NO. 349 DEL 2020 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA TERCIERIA QUE COMUNICAAL CORREGIMIENTO SAN JOSE CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADO	569.593.960,00	0,00	0,00	00.0	569.593.960,00	NO	Por Aplicación	14/02/2024	
										SUBTOTAL:	$569,593,960.0			

Entidad	Tipo Fuente	Incluida SUIFP	Valor del Pago
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Recursos propios 20191301010197	No	$569.593.960,00
		TOTAL:	$569,593,960.0

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $5,122,166,595.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5753

FECHA : 24/11/2023
BENEFICIARIO : METROPLUS SA **NIT.** 900019519 - 9

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 03 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO 202320 ADICION AL CONTRATO NO. 349 DEL 2020 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA TERCIERIA QUE COMUNICAAL CORREGIMIENTO SAN JOSE CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1427.R
ORDEN DE PAGO : OP3255
DOCUMENTO : ACTA DE PAGO 03

VALOR EGRESO **$ 569.593.960.00**

EN LETRAS : QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $569.593.960

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 569.593.960,00	$ 0,00
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 0,00	$ 569.593.960,00
		$ 569.593.960,00	$ 569.593.960,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.2.01.01.001.03.02.24.01.	Pavimentacion de vias corregimiento de San jose	$ 0,00	$ 569.593.960,00
		$ 0,00	$ 569.593.960,00

PAGADOR VISTO BUENO CONTABILIDAD FIRMA DEL BENEFICIARIO


Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

- ✓ Se actualizan metas de producto se ponen al 100% según el avance del proyecto y teniendo en cuenta que este ya está terminado.



Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se actualizan indicadores de productos y se ponen al 100% según el avance del proyecto y teniendo en cuenta que este ya está terminado.

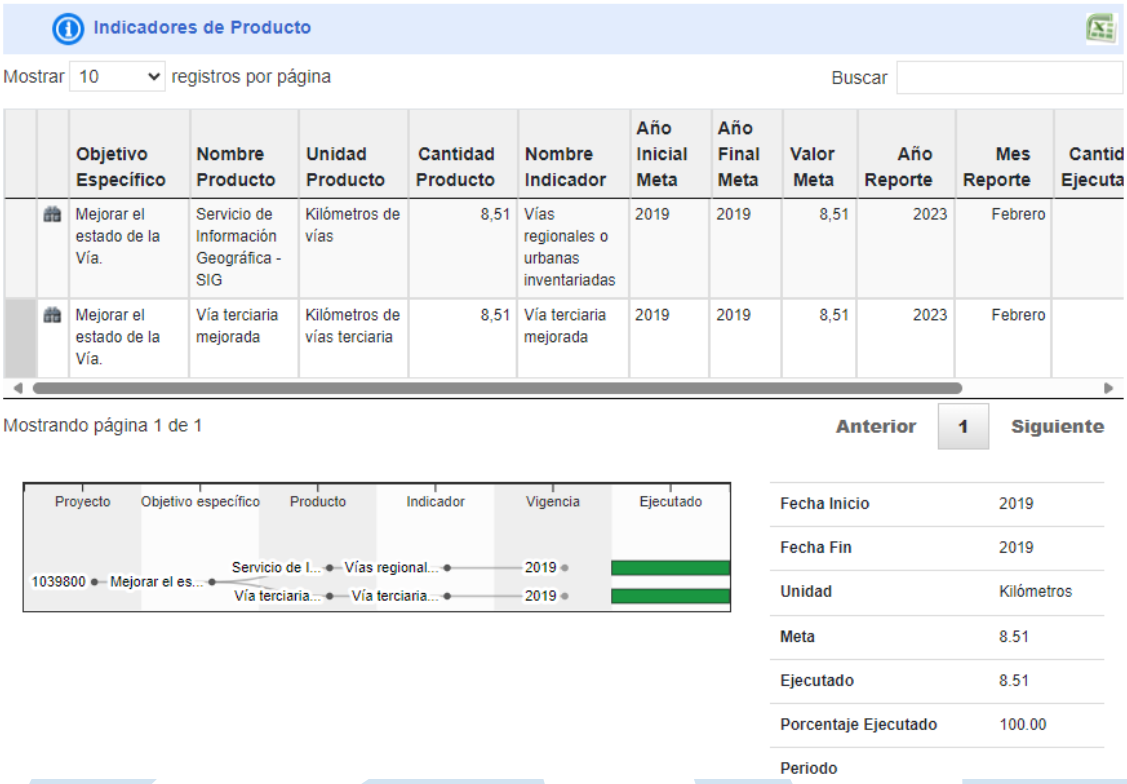

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantid Ejecuta
	Mejorar el estado de la Vía.	Servicio de Información Geográfica - SIG	Kilómetros de vías	8,51	Vías regionales o urbanas inventariadas	2019	2019	8,51	2023	Febrero	
	Mejorar el estado de la Vía.	Vía terciaria mejorada	Kilómetros de vías terciaria	8,51	Vía terciaria mejorada	2019	2019	8,51	2023	Febrero	

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Fecha Inicio	2019
Fecha Fin	2019
Unidad	Kilómetros
Meta	8.51
Ejecutado	8.51
Porcentaje Ejecutado	100.00
Periodo	

- ✓ Se aprueba le mes de enero de 2024, con la información suministrada por la secretaria de infraestructura.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Paso a Paso Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad MUNICIPIO DE APARTADO NIT 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)


Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2024			

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

1.2.2. Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia BPIN. 20201301010064.

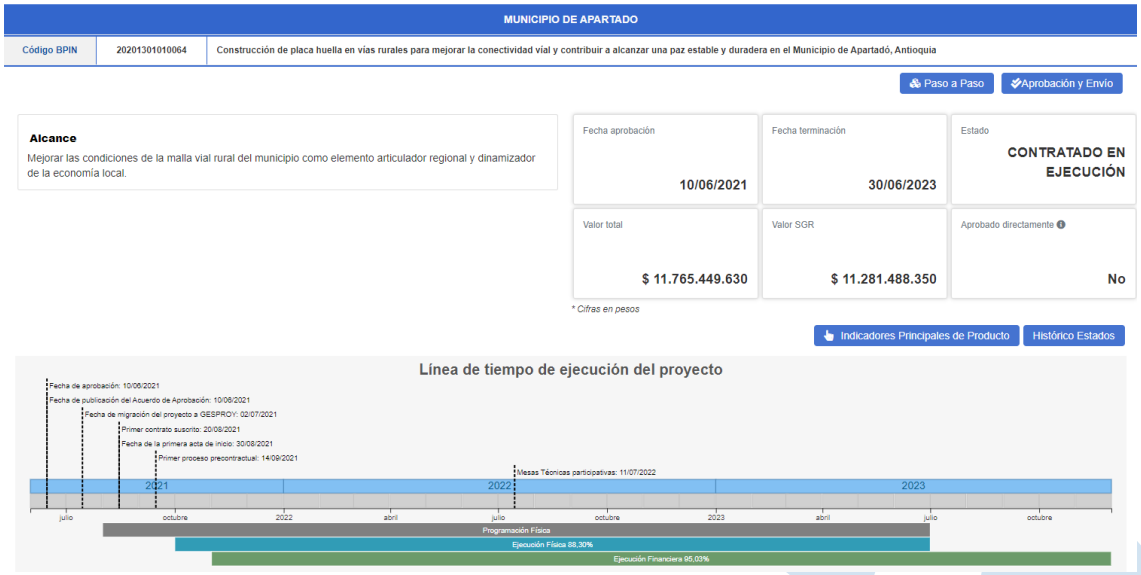

El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa al 88.30% teniendo en cuenta que quien reportaba la información de ejecución omitió darle valor a las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA, cosa que haciendo el correcto reporte se tendría una ejecución del 100%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado la falta de registro fotográfico que evidencie la finalización del proyecto, lo que constituye otra irregularidad, la secretaria de planeación nos adjunta acta de terminación de la interventoría con fecha de 30 de junio de 2023, pero esta no se encuentra reportada en el sistema.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020 Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016 Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	27	09	2021		30	06	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 301 DE 2021.
Objeto del contrato:	"AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍATECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA"
Interventor:	N/A
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquia.
Valor del Convenio	**MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L ($1.064.144.226)**
Valor aporte alcaldía:	MIL DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($1.010.144.226)
Adición:	**TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($34.000.000)**
Duración total del contrato:	Diecinueve (19) meses y dos (02) días.

Es importante destacar que el proyecto cuenta con una fuente de financiación de recursos propios, pero hasta la fecha no se han reportado pagos asociados a este tipo de recursos. Los contratos tampoco tienen reportadas las actas de terminación o liquidación y además no se encuentra aprobado el informe de diciembre de 2023. Este conjunto de deficiencias no solo dificulta la adecuada supervisión y seguimiento del proyecto, sino que también afecta negativamente al Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), agravando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es urgente abordar estas irregularidades para revertir este impacto negativo en la gestión municipal.

Evidencia de el no registro de pagos por fuente de financiación RECURSOS PROPIOS

Pagos

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	*Pagos a Homologar	Reintegros Contratos	Saldo por Pagar
Recursos propios	$483.961.280,00	$0,00	$0,00	$0,00	$483.961.280,00
SGR - Asignación para la paz	$11.281.488.350,00	$11.180.309.663,00	$0,00	$0,00	$101.178.687,00
Total	**$11.765.449.630,00**	**$11.180.309.663,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$585.139.967,00**

No reporta actas de terminación o liquidación y la fecha de terminación del proyecto está programada para el 30 DE JUNIO DE 2023.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	30/08/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO	0,00	30/08/2021		
N°1	Acta de suspensión	28/12/2022	Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-; específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo.	0,00	15/01/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
01	Acta de reinicio	28/02/2023	Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados	0,00	24/05/2023		


Proyecto con avance físico al 100% y los indicadores de producto en 0%

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página Buscar

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Mejorar el estado de las vías terciarias	Servicio de Información Geográfica - SIG	Kilómetros de vías	4,3	Vías regionales o urbanas inventariadas	2020	2020	4,30			0	0
Mejorar el estado de las vías terciarias	Vía terciaria mejorada	Kilómetros de vías terciaria	6,18	Vía terciaria mejorada	2020	2020	6,18			0	0

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente



Fecha Inicio	2020
Fecha Fin	2020
Unidad	Kilómetros
Meta	6.18
Ejecutado	0.00
Porcentaje Ejecutado	0.00
Periodo	

Proyecto sin reporte de información para el mes de diciembre de 2023 situación que genera mala calificación del índice IGPR.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20201301010064	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2023	Noviembre	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS	15/12/2023			
2023	Octubre	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS	15/11/2023			

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

20201301010064	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia	11.765.449.630,00	11.281.488.350,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	OBRA	N° 287-2021	901445176-YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO	$ 10.721.305.404	1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde mayo de 2023 anexar copia
						INTERVENTORIA	CI-301-2021	900795141-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA"	$ 1.044.144.226	1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS, NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde mayo de 2023 anexar copia

- ✓ Se realiza el registro del acta de terminación del contrato de interventoría en el sistema, a espera de acta de liquidación una vez se pague la totalidad del contrato.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020 Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016 Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	27	09	2021		30	06	2023


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 301 DE 2021.
Objeto del contrato:	"AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍATECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA"
Interventor:	N/A
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquia.

Valor del Convenio	**MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L ($1.064.144.226)**
Valor aporte alcaldía:	MIL DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($1.010.144.226)
Adición:	**TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($34.000.000)**
Duración total del contrato:	Diecinueve (19) meses y dos (02) días.



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
✎	✖	sin número	Acta de inicio	27/09/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 301-2021	0,00	29/11/2021		
✎	✖	N°1	Acta de suspensión	28/12/2022	se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo.	0,00	15/01/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
✎	✖	01	Acta de reinicio	28/02/2023	Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados	0,00	24/05/2023		
✎	✖	SN	Acta de Terminación	30/06/2023		0,00	14/02/2024		

✓ Se reporta acta de terminación para el contrato de obra.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	30	08	2021		30	06	2023


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION NRO. 287 DE 2021.
Objeto del contrato: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VÍAS RURALES PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALCANZAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA"	
Interventor:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquía.
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH)** identificado con el NIT Nro. **901445176-6,** representado legalmente por el señor **YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO** identificado con la cedula de ciudadanía Nro.1.027.966.514 de Apartadó — Antioquía.

Valor total del contrato más adición:	**DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M.L ($10.721.305.404).**
Duración total del contrato:	Diecinueve (19) meses y veintiocho (28) días.



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
✎	✖	sin número	Acta de inicio	30/08/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO	0,00	30/08/2021		
✎	✖	N°1	Acta de suspensión	28/12/2022	Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo.	0,00	15/01/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
✎	✖	01	Acta de reinicio	28/02/2023	Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados	0,00	24/05/2023		
✎	✖	SN	Acta de Terminación	30/06/2023		0,00	14/02/2024		

- ✓ Se realiza reportes de pagos realizados por recursos propios. Egresos EG5719, EG5720 y EG5721.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5719-5720 - 5721 - 5741 -

FECHA : 23/11/2023
BENEFICIARIO : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6
CONCEPTO : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2491.R
ORDEN DE PAGO : OP4398
DOCUMENTO : CONTRATO

VALOR EGRESO **$ 113.782.333.00**

EN LETRAS : CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.
****

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $113.782.333

IMPUTACIONES CONTABLES


CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 84.263.653,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 10.190.684,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 19.327.996,00	$ 0,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 113.782.333,00
		$ 113.782.333,00	$ 113.782.333,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.2.01.01.001.03.02.24.01.	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y	$ 0,00	$ 84.263.653,00
2.3.2.01.01.001.03.02.24.01.	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y	$ 0,00	$ 10.190.684,00
2.3.2.01.01.001.03.02.24.01.	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y	$ 0,00	$ 19.327.996,00
		$ 0,00	$ 113.782.333,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

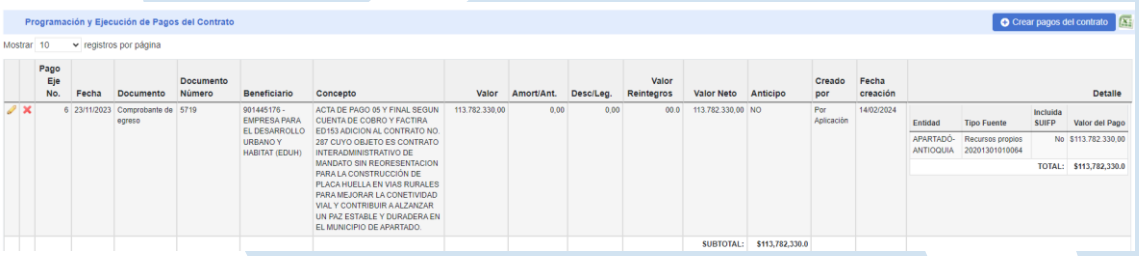
Programación y Ejecución de Pagos del Contrato — Crear pagos del contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/Ant.	Desc/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
6	23/11/2023	Comprobante de egreso	5719	901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH)	ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.	113.782.330,00	0,00	0,00	00.0	113.782.330,00	NO	Por Aplicación	14/02/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: Recursos propios 20201301010064; Incluida SUIFP: No; Valor del Pago: $113.782.330,00; TOTAL: $113,782,330.0
										SUBTOTAL: $113,782,330.0				

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos por el Mundo

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5720

FECHA : 23/11/2023
BENEFICIARIO : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2491.R
ORDEN DE PAGO : OP4399
DOCUMENTO : CONTRATO

VALOR EGRESO **$ 108.896.967.00**

EN LETRAS : CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $108.896.967

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 108.896.967,00	$ 0,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 108.896.967,00
		$ 108.896.967,00	$ 108.896.967,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.2.01.01.001.03.02.24.15.	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la y	$ 0,00	$ 108.896.967,00
		$ 0,00	$ 108.896.967,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON Página 1 de 1

	7	23/11/2023	Comprobante de egreso	5720	901 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH)	ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTIRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	108.896.967,00	0,00	0,00	00.0	108.896.967,00	NO	Por Aplicación	14/02/2024	
											SUBTOTAL:	$108,896,967.0				

Entidad	Tipo Fuente	Incluida SUIFP	Valor del Pago
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Recursos propios 202013010100064	No	$108.896.967,00
		TOTAL:	$108,896,967.0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Fundación Activos por el Mundo

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5721

FECHA : 23/11/2023
BENEFICIARIO : EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT (EDUH) **NIT.** 901445176 - 6

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTURA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2491.R
ORDEN DE PAGO : OP4400
DOCUMENTO : CONTRATO

VALOR EGRESO **$ 225.123.138.00**

EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTITRéS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ***** **

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $225.123.138

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 227.281.398,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 109.003,00
24360301	Honorarios DEL 11%	$ 0,00	$ 1.199.034,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 87.202,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 327.009,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 218.006,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 218.006,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 225.123.138,00
		$ 227.281.398,00	$ 227.281.398,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 87.202,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 218.006,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 327.009,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 218.006,00	$ 0,00
2.3.2.01.01.001.03.02.24.36.	Construcción de placa huella en vias rurales para mejorar la y	$ 0,00	$ 227.281.398,00
		$ 850.223,00	$ 227.281.398,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO


Usuario: BERTHA CEDRON

	8	23/11/2023	Comprobante de egreso	5721	901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT (EDUH)	ACTA DE PAGO 05 Y FINAL SEGUN CUENTA DE COBRO Y FACTRA ED153 ADICION AL CONTRATO NO. 287 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REORESENTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES PARA MEJORAR LA CONETIVIDAD VIAL Y CONTRIBUIR A ALZANZAR UN PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL MUNICIPIO DE APARTADO	227.281.398,00	0,00	2.158.260,00	00.0	225.123.138,00	NO	Por Aplicación	14/02/2024
											SUBTOTAL:	$227,281,398.0			

Entidad	Tipo Fuente	Incluida SUIFP	Valor del Pago
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Recursos propios 2020130101 0064	No	$227.281.398,00
		TOTAL:	$227,281,398.0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se reporta acta de liquidación del contrato de obra.




Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
		sin número	Acta de inicio	30/08/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO	0,00	30/08/2021		
		N°1	Acta de suspensión	28/12/2022	Se presenta un inconveniente en el frente del Guineo-, específicamente en la entrada a la empacadora de la finca Chinita, debido al alto flujo de vehículos de carga que entran y salen constantemente, se han tomado alternativas para intervenir ese tramo sin entorpecer las labores de la finca, pero aún no ha sido posible enmarcar la ruta de ejecución de tan importante tramo.	0,00	15/01/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
		01	Acta de reinicio	28/02/2023	Se reinicia el contrato , superando los inconvenientes presentados	0,00	24/05/2023		
		SN	Acta de Terminación	30/06/2023		0,00	14/02/2024		
	✖	SN	Acta de liquidación no requiere - BPIN: 20201301010064	29/12/2023		10.721.304.819,00	14/02/2024		

- ✓ Se aprueba le mes de diciembre de 2023 y enero de 2024.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN: 20201301010064 — Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2024			
2023	Diciembre	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2024			

1.2.3. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó BPIN. 20201301011128.

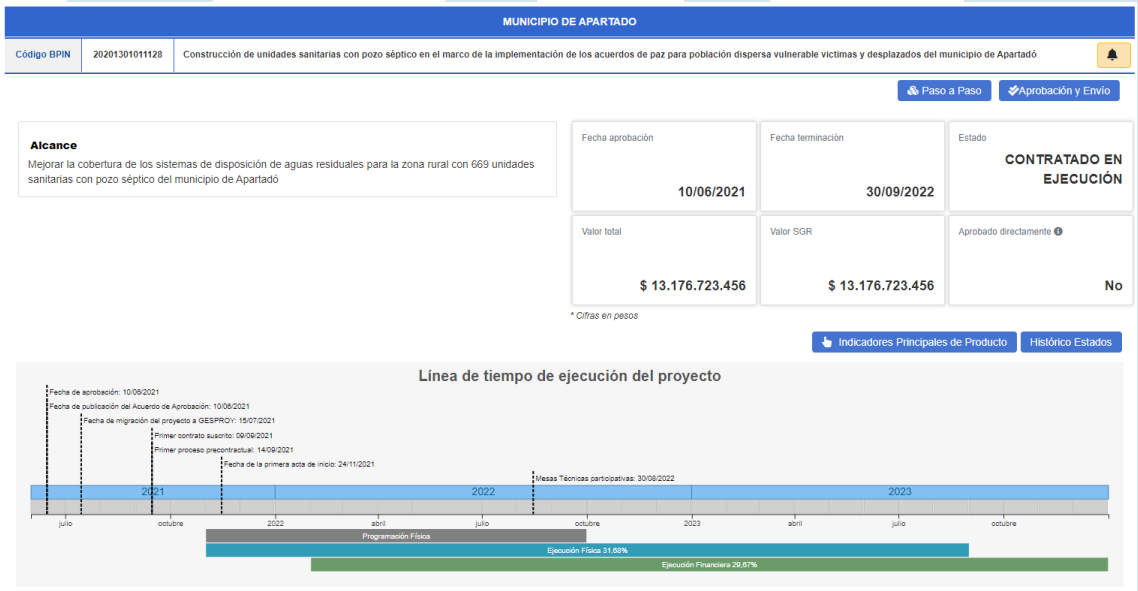

MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN: 20201301011128 — Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural con 669 unidades sanitarias con pozo séptico del municipio de Apartadó

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
10/06/2021	30/09/2022	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 13.176.723.456	$ 13.176.723.456	No

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

El proyecto se ha recibido con una ejecución física del 31.68%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado que el proyecto cuenta con un otrosí en tiempo, fechado el 30 de noviembre de 2023, donde se adicionan 225 días al contrato, extendiendo la fecha de finalización hasta el 15 de julio

de 2024. Esta modificación genera una rigurosa supervisión del contrato, solicitando mensualmente los reportes de ejecución para realizar los respectivos informes.

Por otra parte, hasta la fecha, no se ha aprobado el informe de diciembre de 2023. Esta falta de aprobación afecta el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), agravando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es esencial abordar estas deficiencias de manera urgente para garantizar una adecuada gestión y cumplimiento del proyecto.

No reporte de información mes de diciembre de 2023



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20201301011128	Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar


Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2023	Noviembre	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS	15/12/2023			
2023	Octubre	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS	15/11/2023			

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

20201301011128	Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó	13.176.723.455,66	13.176.723.455,66	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	OBRA	051 de 2021	901066064-EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.	$ 12.314.694.818	1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde AGOSTO de 2023 anexar copia
						INTERVENTORIA	CI-300-2021	900795141-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA"	$ 862.028.637	1. REPORTE DE ULTIMA EJECUCION, 2. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 3. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde AGOSTO de 2023 anexar copia

- ✓ Se reporta acta de suspensión con fecha del 29 de enero de 2024.



Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	24/11/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO DE OBRA N° 286-2021	0,00	24/11/2021		
01	Acta de suspensión	21/09/2022	Modificar la estructura económica del convenio direccionado en el personal técnico	0,00	30/09/2022	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
01	Acta de reinicio	17/08/2023	Por lo anterior se superan las motivaciones que dieron a la suspensión Nro. 01 del Convenio N° 286	0,00	11/09/2023		
02	Acta de suspensión	29/01/2024	Desde la supervisión del convenio interadministrativo por parte del municipio, concordamos en el concepto mencionado por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA en el cual se indica que se debe realizar la suspensión mientras se evalúa con el contratista las deficiencias para cumplir con el cronograma de obra. Este tiempo de suspensión se utilizará para realizar planes de contingencia y que el contratista replantee la programación y que pueda cumplir el objeto contractual a cabalidad en el tiempo estipulado. Suspender el plazo del convenio e Interventoría a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por un término de un (01) mes, realizando revisión una vez transcurrido este tiempo para presentar el reinicio	0,00	14/02/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	

Fundación Activos por el Mundo

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE APARTADO**	Código: F-ADM-CC-011 Versión: 2
	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	Fecha de aprobación: 19-07-2023 Página 1 de 3

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Nueva fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	24	11	2021		15	07	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**286**	de	**2021.**		
Objeto del convenio: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE APARTADÓ Y EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P - "EMPAPA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSAVULNERABLE VÍCTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO."					
Interventor:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA,** identificado con NIT. **900.795.141 - 6,** representado legalmente por el señor **CARLOS BANGUERO MORENO** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.939.465** expedida en Apartadó – Antioquía.				
Supervisor:	**LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
Contratista:	**EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P. "EMPAPA S.A.S. ESP"** identificado con el NIT Nro. 901.066.064-3 y representado legalmente por el señor **ESNEYDER LOPEZ CUESTA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.984.387.				

Valor del Convenio:	DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L ($12.684.135.663)
Valor aporte alcaldía:	DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L ($12.314.694.818)
Valor aporte Empapa:	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. ($369.440.845)
Duración total del Convenio:	Veinte (20) meses y veintiséis (26) días.

FECHA	29	de	ENERO	de	2024

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se reporta acta de suspensión al contrato de interventoría con fecha del 29 de enero de 2024.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-011 Versión: 3
	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	Fecha de aprobación: 19-07-2023 Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Nueva fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	24	11	2021		15	07	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONVENIO	300	de	2021		
Objeto del convenio: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSA VULNERABLE VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".					
Interventor:	N/A.				
Supervisor:	**LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.				
Contratista:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA**, identificado con NIT. 900.795.141 - 6, representado legalmente por el señor CARLOS BANGUERO MORENO también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.939.465 expedida en Apartado — Antioquia.				
Valor del convenio:	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M.L (879.269.210)				
Valor aporte alcaldía:	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($862.028.637)				
Valor aporte Asomura:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTAIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L (17.240.573)				
Duración del Convenio: Diez (10) MESES.					

FECHA	29	de	ENERO	de	2024

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página


Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
✎	✖	sin número	Acta de inicio	24/11/2021	SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 300-2021	0,00	01/12/2021		
✎	✖	01	Acta de suspensión	21/09/2022	Modificar la estructura económica del convenio partiendo del personal técnico	0,00	30/09/2022	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
✎	✖	01	Acta de reinicio	17/08/2023	se reinicia el contrato, superando las consecuencias que originaron la suspensión	0,00	14/09/2023		
✎	✖	02	Acta de suspensión	29/01/2024	Desde la supervisión del convenio interadministrativo por parte del municipio, concordamos en el concepto mencionado por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUIEÑO - ASOMURA en el cual se indica que se debe realizar la suspensión mientras se evalúa con el contratista las deficiencias para cumplir con el cronograma de obra. Este tiempo de suspensión se utilizará para realizar planes de contingencia y que el contratista replantee la programación y que pueda cumplir el objeto contractual a cabalidad en el tiempo estipulado. Suspender el plazo del convenio e Interventoría a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, por un término de un (01) mes, realizando revisión una vez transcurrido este tiempo para presentar el reinicio	0,00	29/01/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	


Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

- ✓ Se aprueba le mes de diciembre de 2023 y enero de 2024




1.2.4. Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia BPIN. 20201301012048.

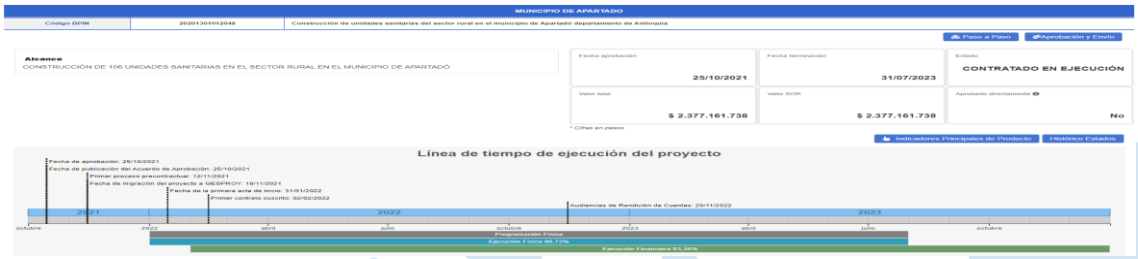

El proyecto se ha recibido con una ejecución física completa del 100%, sin embargo, la ejecución de productos se encuentra en un preocupante 0%, lo que denota una negligencia por parte de quien era responsable de registrar la información, al no reportar correctamente los avances del proyecto. Además, se ha observado que los contratos no tienen registro de actas de terminación, ni registro fotográfico de la finalización del proyecto.

Asimismo, hasta la fecha, no se ha aprobado el informe de diciembre de 2023. Esta serie de deficiencias afectan gravemente el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR), empeorando aún más el puntaje ya bajo con el que se recibió el municipio. Es imperativo abordar estas irregularidades de manera inmediata para asegurar una gestión transparente y eficaz del proyecto.

Evidencia proyecto 100% de ejecución sin registro en indicadores de productos a 0%



Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada
	Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó.	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas	Número de viviendas	106	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	2021	2021	106,00			0

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Proyecto	Objetivo específico	Producto	Indicador	Vigencia	Ejecutado
1250295	Mejorar la co...	Unidades sani...	Viviendas ben...	2021	

Fecha Inicio	2021
Fecha Fin	2021
Unidad	Número
Meta	106.00
Ejecutado	0.00
Porcentaje Ejecutado	0.00
Periodo	

Contrato con ejecución al 100% sin registro de actas de terminación

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
	sin número	Acta de inicio	31/01/2022	se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente.	0,00	14/02/2022		
	N°1	Acta de suspensión	16/11/2022	constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción	0,00	15/12/2022	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
	01	Acta de reinicio	16/05/2023	se superan los inconvenientes que generaron la suspensión	0,00	24/05/2023		

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se solicita información a secretaria de planeación y secretaria de hacienda para recolectar la mayor cantidad posible de información y lograr hacer un correcto reporte de la información.

20201301012048	Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia	2.377.161.738,05	2.377.161.738,05	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	OBRA	CONVENIO - 341-2021	901066064-EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.	$ 2.114.127.410	1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde MAYO de 2023 anexar copia
						INTERVENTORIA	002-2022	1077427408-LOZANO MOSQUERA WILMAR	$ 263.034.328	1. ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION, 2. REPORTE DE PAGOS REALIZADOS NOTA: si el proyecto tiene actas de suspensión, reinicio o cualquier otra acta suscrita desde MAYO de 2023 anexar copia

- ✓ Se reporta acta de terminación del contrato de obra, no se reporta liquidación queda pendiente para el mes de febrero porque aun no se ve reflejado el ultimo pago en el sistema.

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	31/01/2022	se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente.	0,00	14/02/2022		
N°1	Acta de suspensión	16/11/2022	constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción	0,00	15/12/2022	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
01	Acta de reinicio	16/05/2023	se superan los inconvenientes que generaron la suspensión	0,00	24/05/2023		
N/A	Acta de Terminación	30/07/2023		0,00	13/02/2024		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	31	02	2022		30	07	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 341 de 2021
Objeto del contrato: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."	
Interventor:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408.
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P. "EMPAPA S.A.S. ESP"** identificado con el NIT Nro. 901.066.064-3 y representado legalmente por el señor **WBEIMAR ALFONSO RUIZ CHARRASQUIEL**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.941.760.

Valor del Convenio:	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($2.156.409.957)
Valor aporte alcaldía:	DOS MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEITISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M.L ($2.114.127.409)
Valor aporte Empapa:	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. ($42.282.548)
Duración total del contrato:	DOCE (12) MESES.

- ✓ Se reporta acta de terminación y acta de liquidación del contrato de interventoría.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
		sin número	Acta de inicio	31/01/2022	Se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y la reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente contrato.	0,00	14/02/2022		
		N°1	Acta de suspensión	16/11/2022	constantes lluvias en el sector que dificulta la entrada de material de contrucción	0,00	15/12/2022	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
		01	Acta de reinicio	16/05/2023	se reinicia el contrato superando el inconveniente presentando	0,00	24/05/2023		
		N/A	Acta de Terminación	30/07/2023		0,00	13/02/2024		
	✕	N/A	Acta de liquidación no requiere	19/01/2024		244.889.202,00	13/02/2024		

1411

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
	Versión: 0
ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
	Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	31	02	2022		30	07	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 002 de 2022
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA."	
Interventor:	N/A
Supervisor:	LEINER IVAN MENA MURILLO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408.
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262´204.600)
Duración total del contrato:	DOCE (12) MESES.

1417

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
	Versión: 2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
	Página 1 de 4

Fecha:	19 ENE. 2024


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 002 de 2022.
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARMENTO DE ANTIOQUIA."	
Interventor:	**N/A**
Apoyo a la Supervisión:	**N/A**
Supervisor:	**LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRÍGUEZ** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Contratista:	**WILMAR LOZANO MOSQUERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.427.408.
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($262´204.600)
Fecha de terminación del contrato: 30 de julio de 2023.	

- ✓ Se actualiza a 100% los indicadores de producto y metas de producto, teniendo en cuenta que el contrato ya se encuentra al 100% de ejecución.

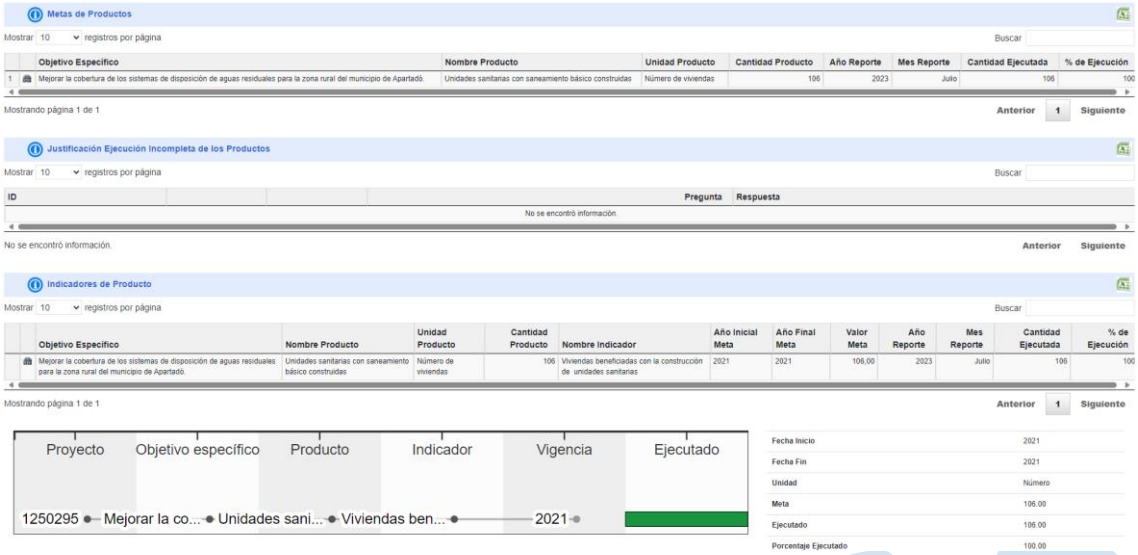

Metas de Productos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó.	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas	Número de viviendas	106	2023	Julio	106	100

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Justificación Ejecución Incompleta de los Productos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	Pregunta	Respuesta
No se encontró información.		

No se encontró información. — Anterior Siguiente

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Mejorar la cobertura de los sistemas de disposición de aguas residuales para la zona rural del municipio de Apartadó.	Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas	Número de viviendas	106	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias	2021	2021	106,00	2023	Julio	106	100

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Proyecto	Objetivo específico	Producto	Indicador	Vigencia	Ejecutado
1250295	Mejorar la co...	Unidades sani...	Viviendas ben...	2021	

Fecha Inicio	2021
Fecha Fin	2021
Unidad	Número
Meta	106.00
Ejecutado	106.00
Porcentaje Ejecutado	100.00

- ✓ Se realiza observación a la ejecución, pues el valor de interventoría reportado es mayor al valor pagado y ejecutado.



Observaciones a la Ejecución — Registrar Observaciones a la Ejecución

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Concepto Seguimiento	Conceptuó	Fecha	% Ejecución Física
la interventoría solo se ejecuto un valor por $244.889.202	JUAN DAVID CARTAGENA ALZATE	13/02/2024	100,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	INTERVENTORIA	mes	13.87	93	No		Inicial			
							Prog	1	263.034.328,05	263.034.328,05
							Eje	0,93	282.832.607,89	263.034.325,34
2	ADMON Costos A.I.U	ADMON Costos A.I.U	0	0	No		Inicial			
							Prog	1	480.295.481	480.295.481
							Eje	0,93	516.446.757,75	480.295.484,71

- ✓ Se realiza aprobación de los periodos diciembre 2023 y enero 2024.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20201301012048	Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia

Paso a Paso — Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	14/02/2024			
2023	Diciembre	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	13/02/2024			


1.2.5. Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó BPIN. 20211301011050.

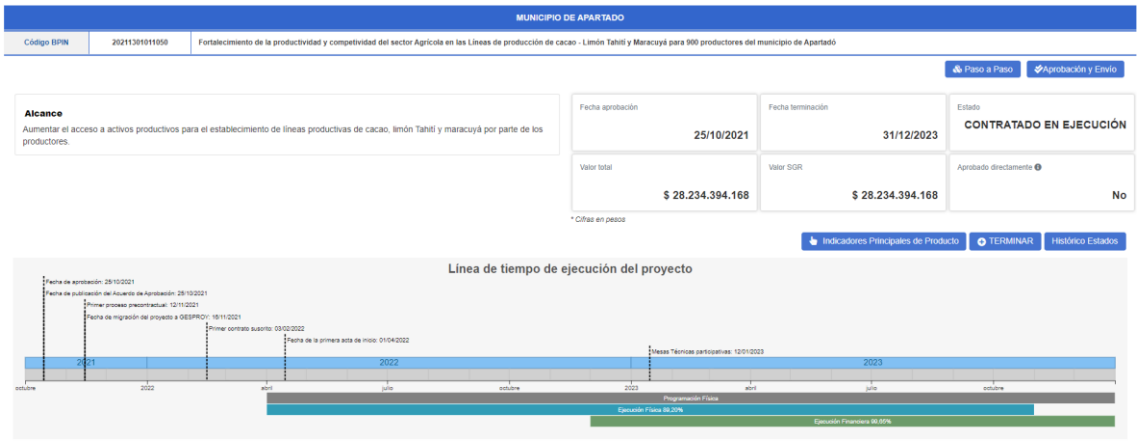


El proyecto se recibe con un avance físico del 89,2% y una ejecución financiera del 99.65%, indicadores que reflejan un progreso sustancial en términos de cumplimiento de metas establecidas. Sin embargo, surgen preocupaciones al observar la información proporcionada por el municipio, que sugiere que el contrato fue terminado y liquidado desde el 21 de diciembre, con la última ejecución registrada en octubre de 2023 y sin reportar por lo menos noviembre 2023. La ausencia de reportes de avance y la marcada falta de indicadores de producto y metas de producto en 0% generan incertidumbre sobre la veracidad y transparencia de la información.

Esta discrepancia entre la ejecución financiera aparentemente completa y la falta de avances registrados plantea interrogantes sobre la integridad de los datos reportados y la negligencia de quien reportaba la información. Es esencial abordar esta situación de manera inmediata para garantizar una evaluación precisa y confiable del proyecto, así como para mantener la coherencia en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y preservar la credibilidad del proceso de ejecución.

Evidencia no reporte de avance de ejecución mes de noviembre




Evidencia indicadores y metas de producto en 0%

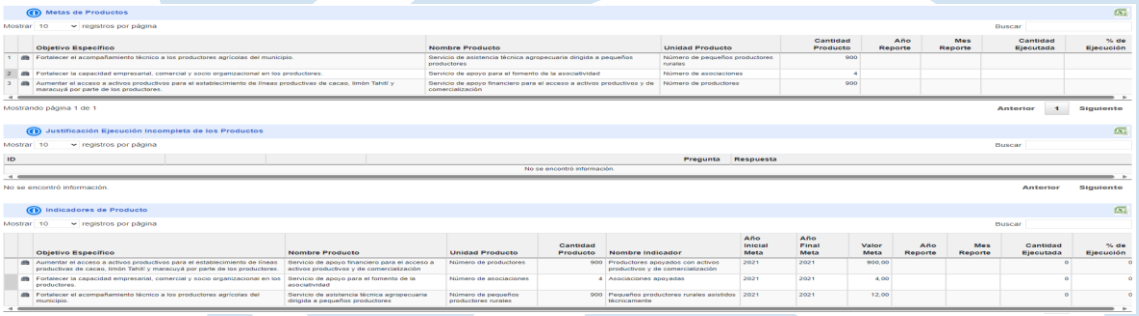

ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se actualizan metas e indicadores de productos a 100 según acta de terminación del 15 de diciembre de 2023.

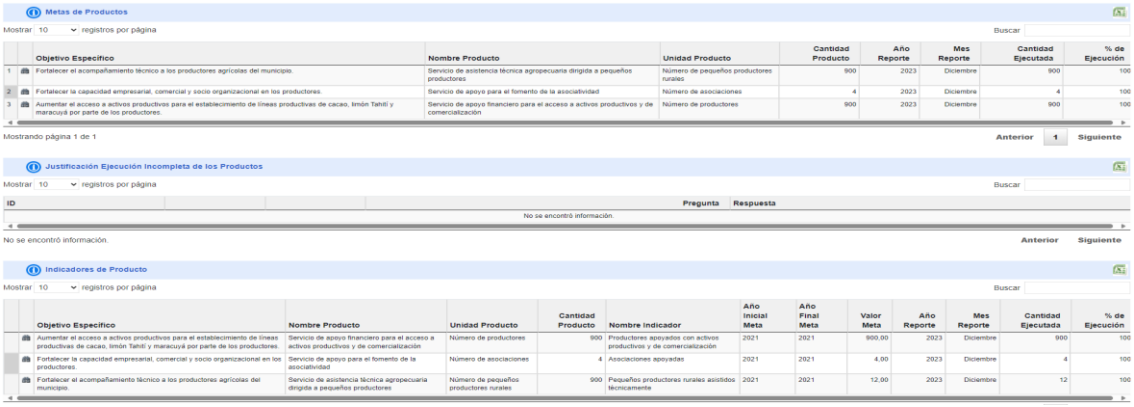

Metas de Productos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Objetivo Especifico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Fortalecer el acompañamiento técnico a los productores agrícolas del municipio.	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	Número de pequeños productores rurales	900	2023	Diciembre	900	100
2	Fortalecer la capacidad empresarial, comercial y socio organizacional en los productores.	Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Número de asociaciones	4	2023	Diciembre	4	100
3	Aumentar el acceso a activos productivos para el establecimiento de líneas productivas de cacao, limón Tahití y maracuyá por parte de los productores.	Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Número de productores	900	2023	Diciembre	900	100

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Justificación Ejecución Incompleta de los Productos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	Pregunta	Respuesta
No se encontró información.		


No se encontró información. — Anterior Siguiente

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Objetivo Especifico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Aumentar el acceso a activos productivos para el establecimiento de líneas productivas de cacao, limón Tahití y maracuyá por parte de los productores.	Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Número de productores	900	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	2021	2021	900,00	2023	Diciembre	900	100
Fortalecer la capacidad empresarial, comercial y socio organizacional en los productores.	Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Número de asociaciones	4	Asociaciones apoyadas	2021	2021	4,00	2023	Diciembre	4	100
Fortalecer el acompañamiento técnico a los productores agrícolas del municipio.	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	Número de pequeños productores rurales	900	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	2021	2021	12,00	2023	Diciembre	12	100

- ✓ Se realiza reporte de acta de terminación y liquidación del contrato de obra.



Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
		sin número	Acta de inicio	01/04/2022	se da inicio al contrato de obra	0,00	06/04/2022		
		N/A	Acta de Terminación	15/12/2023		0,00	16/02/2024		
	✕	N/A	Acta de liquidación no requiere	21/12/2023		26.791.473.704,00	16/02/2024		

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

Fecha: 21 de DICIEMBRE de 2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**340 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Objeto del contrato:	**"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."**
Interventor:	**HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ** C.C. 6.879.344 Representante Legal **CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8**
Supervisor (es)	**OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente**
Apoyo a la supervisión	**NA**
Contratista:	**CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO** C.C. 71.939.465 Representante Legal **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (ASOMURA) NIT. 900795141-6**
Valor Inicial del contrato:	**$26.889.283.296**
Valor adiciones	**$ 0**
Valor Final del Contrato	**$26.889.283.296**
Fecha de Inicio	**01 DE ABRIL DE 2022**

Fecha de terminación del contrato: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	04	2022		15	12	2023


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	340 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
Objeto del contrato:	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."
Interventor(es):	HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ C.C. 6.879.344 Representante Legal CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8
Supervisor (es)	OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
Apoyo (s) a la supervisión	NA
Contratista:	CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO C.C. 71.939.465 Representante Legal ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (ASOMURA) NIT. 900795141-6
Valor del contrato:	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($26.889.283.296)
Duración del contrato:	VEINTE (20) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS

✓ Se realiza reporte de acta de terminación contrato de interventoría.



Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020 Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023 Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	04	2022		30	12	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	216 del 28 de marzo de 2022
Objeto del contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO, LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"
Interventor(es):	NA
Supervisor (es)	OSCAR EDUARDO PEREZ VELEZ, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
Apoyo (s) a la supervisión	NA
Contratista:	CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ NIT. 901.579.850-8 HERNANDO ENRIQUE ANAYA NARVAEZ C.C. 6.879.344
Valor del contrato:	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 1.345.110.872)
Duración del contrato:	VEINTIUN (21) MESES

- ✓ Se realiza aprobación y envío de los meses de diciembre 2023 y enero 2024.

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Enero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	14/02/2024			
2023	Diciembre	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	14/02/2024			

FEBRERO 2024

ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA

Abordaremos una variedad de temas clave que son fundamentales para comprender el estado actual de los proyectos municipales en Apartadó, Antioquia. En primer lugar, revisaremos cada uno de los proyectos que cuentan con entidad ejecutora designada, miraremos las alertas y posibles riesgos de inversión en estos, realizando las respectivas recomendaciones para evitar las consecuencias que puedan generar las alertas encontradas. Luego revisaremos los proyectos en los que el municipio se encuentra en calidad de entidad ejecutora, es decir aquellos en los cuales la municipalidad tiene la responsabilidad directa de la ejecución y, por ende, la obligación de reportar información pertinente en el aplicativo GESPROY.

Dando continuidad, en este informe, se incluirán las recomendaciones necesarias para que la administración las transmita a la entidad ejecutora designada. Estas recomendaciones se basarán en el análisis detallado de las alertas y posibles subsanaciones identificadas durante la revisión de los proyectos. De esta manera, se facilitará una comunicación efectiva entre la administración y la entidad ejecutora, asegurando que se tomen las medidas adecuadas para abordar cualquier riesgo o deficiencia detectada y garantizando así el progreso eficiente de los proyectos municipales.

2. RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY

2.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
2020000100731	Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia	$ 7.543.169.163	$ 5.736.369.097	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2020050450048	Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia	$ 10.397.673.176	$ 5.000.000.000	TERMINADO
2021050450078	Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó	$ 17.998.323.605	$ 6.000.000.000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022000040002	Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia	$ 13.030.304.753	$ 10.208.714.365	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022050450076	Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó	$ 15.577.154.473	$ 15.577.154.473	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO

2022050450078	Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó	$ 3.922.817.006	$ 2.822.817.006	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450060	Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó	$ 909.670.896	$ 909.670.896	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450066	Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó	$ 1.180.597.321	$ 1.180.597.321	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450073	Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó	$ 935.915.580	$ 935.915.580	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
20181301010478	Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios PDET En El Marco De La Implementación Del Acuerdo Final Para La Paz A Nivel Nacional	$ 86.331.261.284	$ 86.331.261.284	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:

1.2.6. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


1.2.6.1. Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia BPIN. 2020000100731.

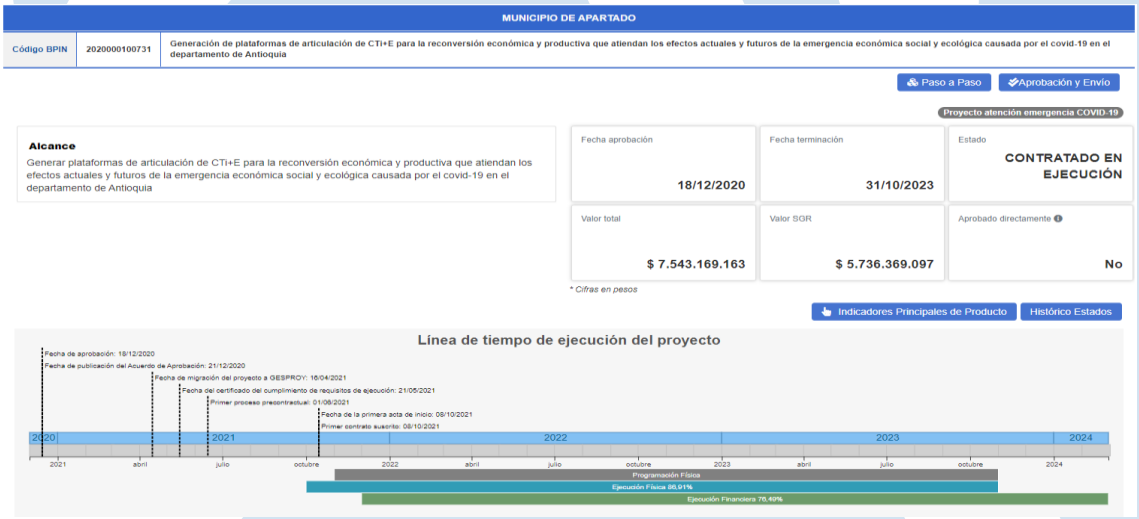


Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización

oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.2.6.2. Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia. BPIN. 2020050450048.

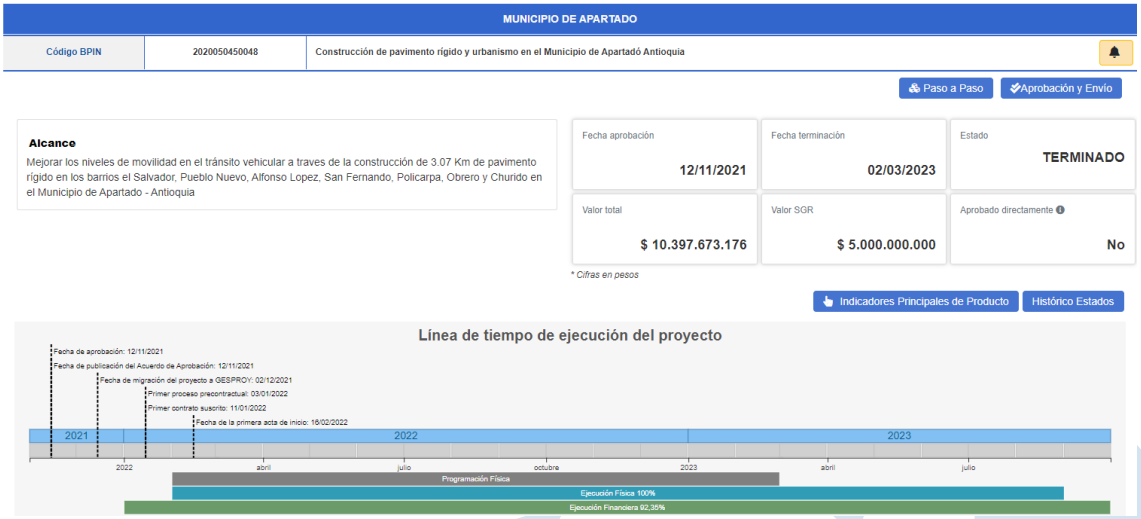

El proyecto en cuestión presenta un total de una alerta **EJ-1-24** Alerta para el proyecto con un nivel de criticidad alto Proyecto terminado sin cerrar.



Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 194	$194			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

ACCIONES: Se recomienda a la entidad que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto, y evitar consecuencias como:

- Reporte a los órganos de control.


El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.2.6.3. Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó BIPN. 2021050450078



Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.


1.2.6.4. Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia. BPIN. 2022000040002

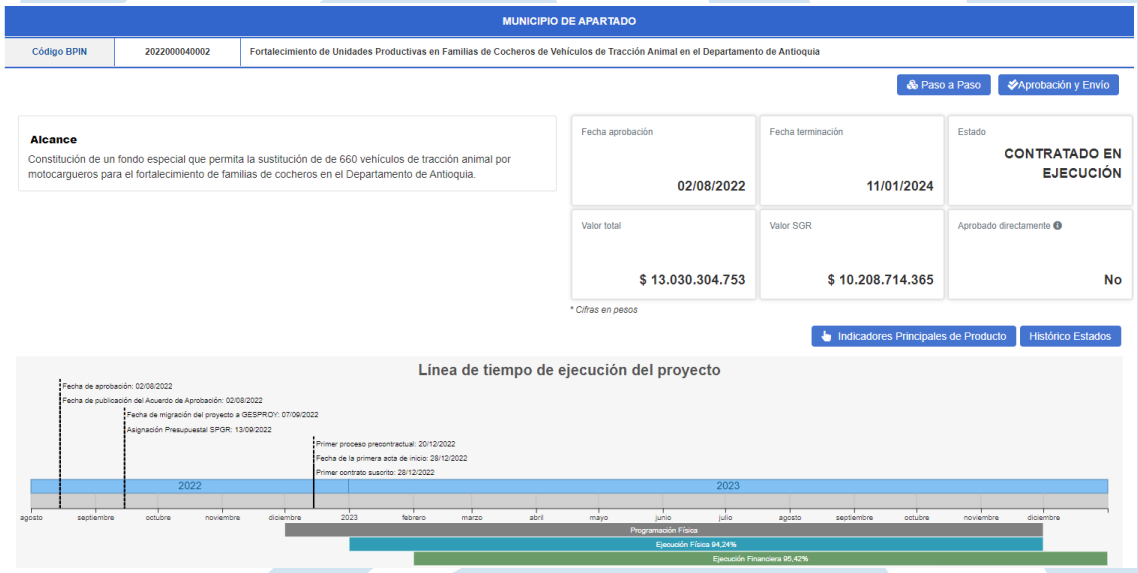

Según la información proporcionada por la entidad ejecutora, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza


una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.2.6.5. Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450076

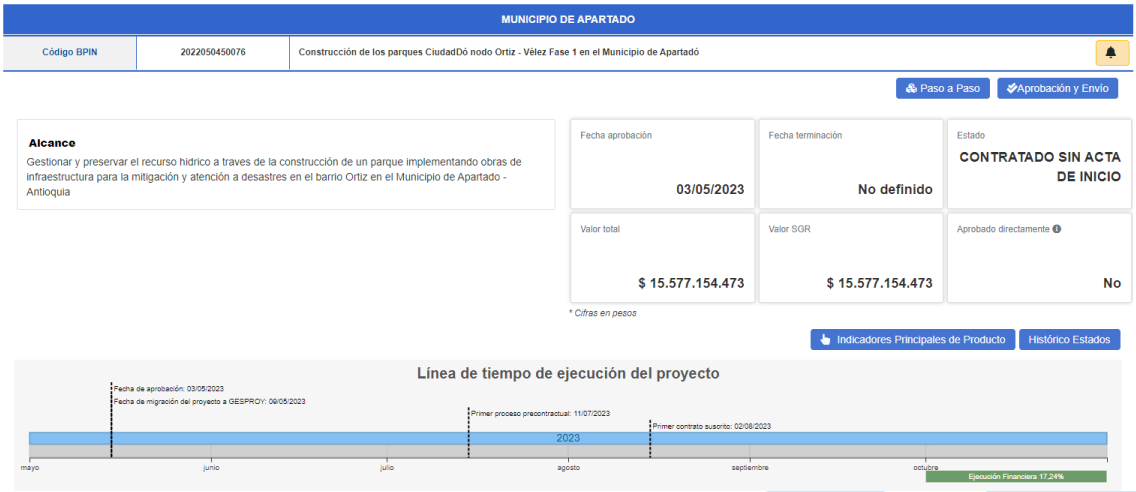

El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ 1-27** Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación

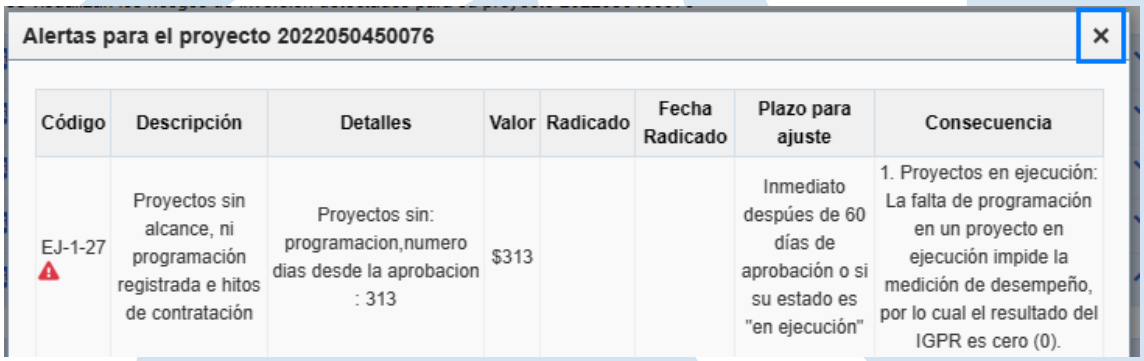

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-27 ⚠	Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 313	$313			Inmediato despúes de 60 días de aprobación o si su estado es "en ejecución"	1. Proyectos en ejecución: La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).


ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto y evitar consecuencias como:

- La falta de programación en un proyecto en ejecución impide la medición de desempeño, por lo cual el resultado del IGPR es cero (0).

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y


la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.2.6.6. Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450078

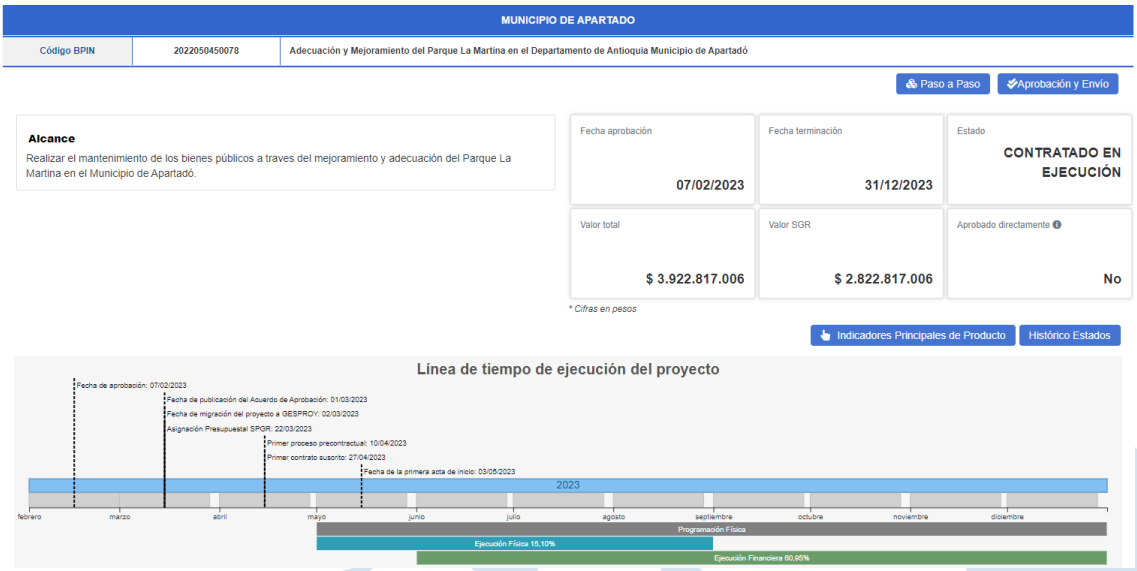

Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.


1.2.6.7. Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450060.

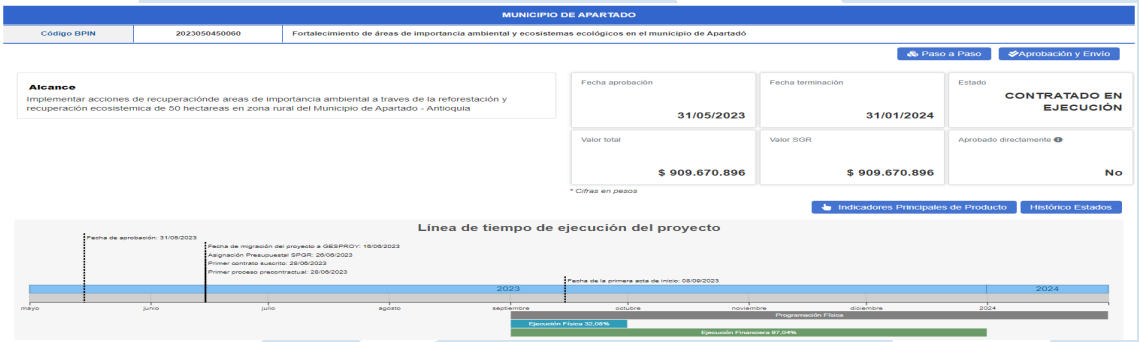

Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización


oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.2.6.8. Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450066

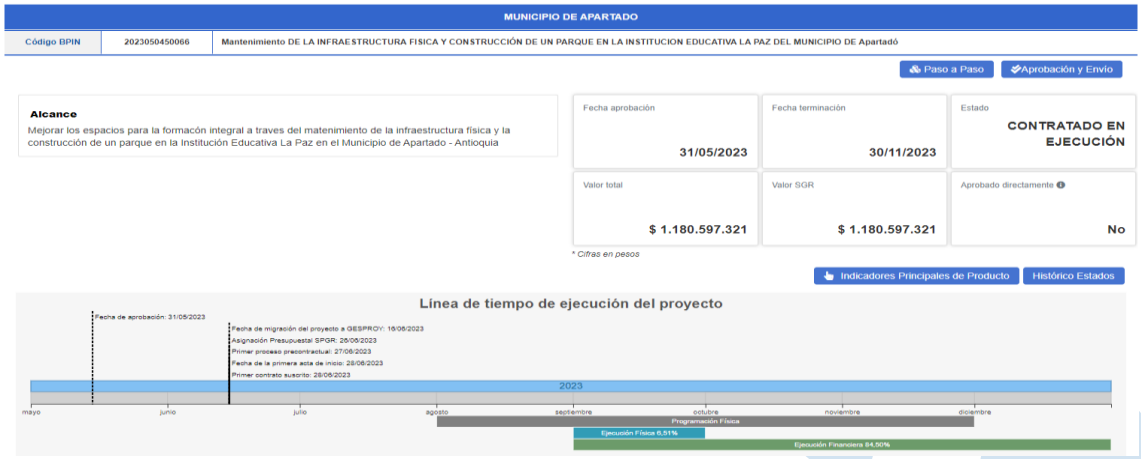

Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

1.2.6.9. Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó BPIN. 2023050450073.

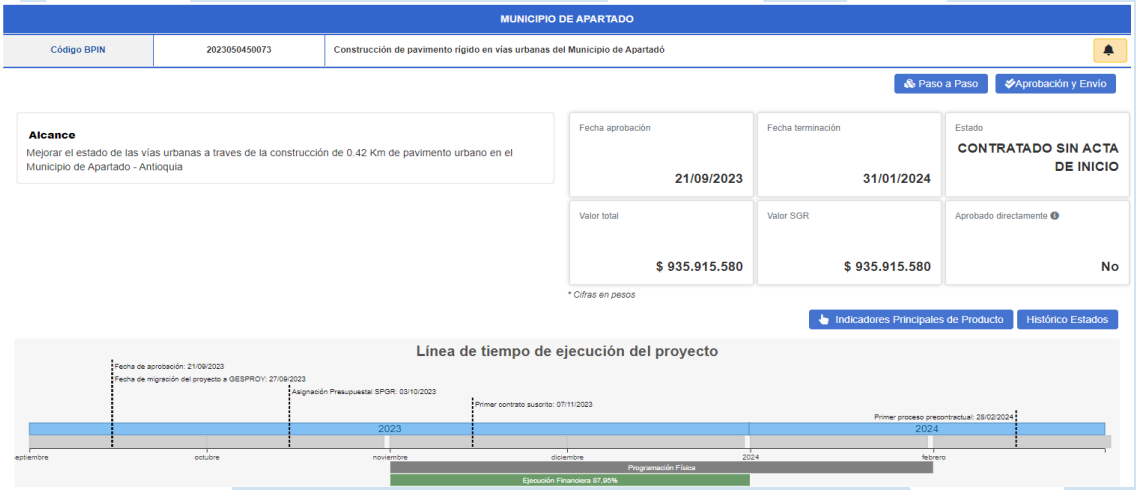


Según la información proporcionada por el aplicativo GESPROY, el proyecto no presenta alertas significativas, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Esta situación refleja un buen desempeño en la gestión y

ejecución del proyecto por parte de la entidad responsable. Asimismo, la actualización oportuna de la información en el sistema GESPROY por parte de la entidad ejecutora garantiza una transparencia y precisión en el reporte de información, lo que facilita la supervisión y seguimiento adecuado del proyecto.

Nota: se debe también decir que la entidad ejecutora subsano las alertas que presentaba el proyecto el mes pasado.

1.2.6.10. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.

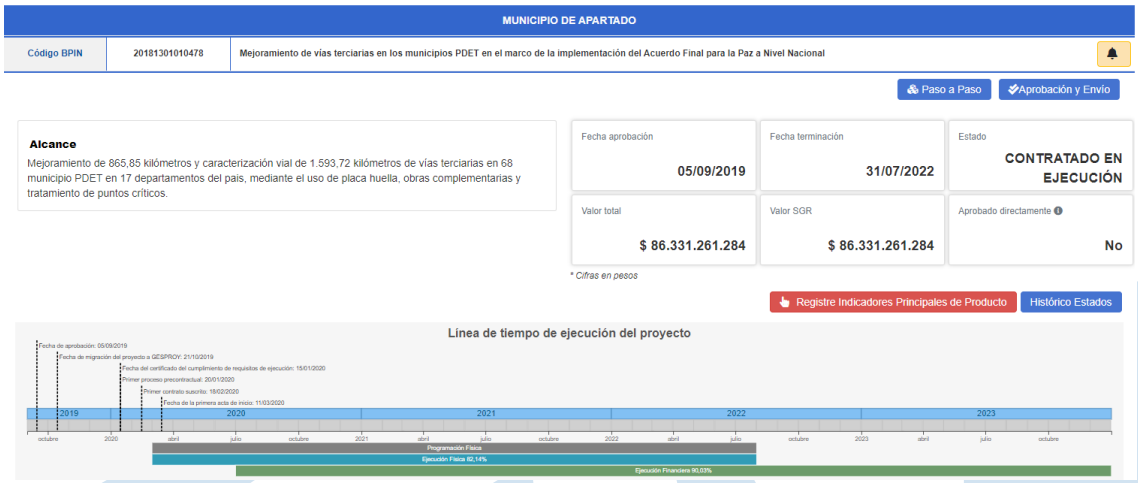

El proyecto en cuestión presenta un total de **UNA ALERTA**, una considerada de **RIESGO ALTO**.

- **EJ-2-27** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado.



ACCIONES: Se recomienda a la entidad aportante de los recursos que solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora la subsanación de las alertas identificadas en el proyecto. Es fundamental abordar estas alertas de manera oportuna y eficiente para mitigar posibles riesgos y garantizar el éxito del proyecto tales como:

1.3. PROYECTOS DE INVERSION DONDE EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD EJECUTORA.

Continuando con nuestro compromiso como contratista y dando cumplimiento al contrato, seguiremos con el reporte de información para el mes de febrero para cada uno de los proyectos en los que el municipio actúa como entidad ejecutora. Es crucial continuar con el reporte de información de estos proyectos, evaluando y abordando las alertas generadas en periodos anteriores.

Durante el mes de enero, se llevaron a cabo acciones para subsanar las irregularidades detectadas, garantizando así una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. Estas acciones incluyen la revisión exhaustiva de los procesos de contratación, la actualización de la información en los sistemas de seguimiento y la implementación de medidas correctivas necesarias para asegurar el avance adecuado de los proyectos. Se ha puesto un énfasis especial en mejorar los procesos, con miras a obtener mejoras en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y, por ende, en la eficiencia y efectividad global de la gestión municipal. Es fundamental abordar cualquier irregularidad de manera proactiva y tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito de los proyectos ejecutados por el municipio.

Durante el transcurso del mes de febrero, tuvimos la tarea de recopilar y analizar minuciosamente la información suministrada por la administración municipal. Este proceso no solo tiene como objetivo generar un reporte eficiente de la información, sino también contribuir significativamente a mejorar los índices de Gestión de Proyectos (IGPR) para el municipio de Apartadó. Esta labor no solo implica la recolección de datos, sino también un análisis detallado de los mismos, identificando actas, pólizas o cualquier información que hasta el momento no se hubiese reportado, para de esta forma subsanar cualquier falta de información.


Nuestra meta es no solo cumplir con los requisitos contractuales, sino también brindar un servicio de calidad que tenga un impacto positivo en la eficiencia y transparencia de la gestión pública en Apartadó

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
20211301011050	Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó	$ 28.234.394.168	$ 28.234.394.168	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301012048	Construcción De Unidades Sanitarias Del Sector Rural En El Municipio De Apartadó Departamento De Antioquia	$ 2.377.161.738	$ 2.377.161.738	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301011128	Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó	$ 13.176.723.456	$ 13.176.723.456	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

20201301010064	Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia	$ 11.765.449.630	$ 11.281.488.350	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20191301010197	Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó	$ 5.702.726.968	$ 5.098.957.370	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

1.3.1. Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó BPIN. 20191301010197.


Durante el mes de febrero, se ha observado que el proyecto ha generado una alerta identificada como EJ-1-24. Según el detalle proporcionado, esta alerta indica que el proyecto está registrado como terminado, pero no ha sido cerrado oficialmente desde hace más de seis meses. Esta situación se debe a que nos encontramos a la espera de la liquidación de los contratos de obra e interventoría para proceder con el cierre del proyecto.


Alertas para el proyecto 20191301010197

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 377	$377			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se reportan actas de terminación y acta de recibo a satisfacción del contrato de obra


Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	20/08/2020	se da inicio al contrato de obra N° 349	0,00	28/08/2020		
01	Acta de suspensión	07/10/2021	Inconvenientes en la estabilización de taludes, traslado de poste de energía y la presencia de anchos variables.	0,00	07/10/2021	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
01	Acta de reinicio	19/04/2022	se reinicia el proyecto , superando los inconvenientes presentados	0,00	14/09/2022		
SN	Acta de Terminación	09/02/2023		0,00	14/02/2024		
SN	Recibo a satisfacción de bienes y servicios	05/09/2023	Que la supervisora y apoyo a la supervisión recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista	0,00	27/02/2024		

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

- ✓ Se reporta acta de terminación del contrato de interventoría

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
		sin número	Acta de inicio	20/08/2020	SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°354	0,00	21/08/2020		
		sin número	Acta de suspensión	07/10/2021	QUE AÚN NO SE HA SUPERADO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TRASLADO DE POSTE DE ENERGIA Y LA PRESENCIA DE ANCHOS VARIABLES	0,00	20/12/2021	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
		01	Acta de reinicio	19/04/2022	SE REINICIA EL PROYECTO SUPERANDO LOS INCONVENIENTES QUE DIERON CON LA SUSPENSIÓN	0,00	15/06/2022		
		01	Acta de Terminación	09/02/2023	SE TERMINA EL CONTRATO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	0,00	27/12/2023		

- ✓ Se realiza el registro fotográfico del proyecto terminado y se pasa a estado terminado del proyecto.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

Mejorar la intercomunicación de la vía en el corregimiento de San José de Apartadó que la comunica al municipio de Apartadó en el Departamento de Antioquia.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
24/02/2020	28/02/2023	TERMINADO

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 5.702.726.968	$ 5.098.957.370	No

*Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



- ✓ Se aprueba le mes de febrero de 2024, con la información suministrada por la secretaria de infraestructura.

MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Febrero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	11/03/2024			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com


1.3.2. Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia BPIN. 20201301010064.




Tras abordar las situaciones identificadas en el informe del mes anterior, al revisar el estado del proyecto para el mes de febrero, observamos una alerta específica, identificada con el código EJ-1-24. Dicha alerta señala la presencia de proyectos concluidos, pero aún no cerrados, con un plazo de 256 días. Esta situación se atribuye al hecho de que el pago total del contrato de interventoría aún no se ha realizado, lo que ha impedido la liquidación correspondiente.

ACCIONES REALIZADAS:


- ✓ Se realiza registro visual del proyecto terminado

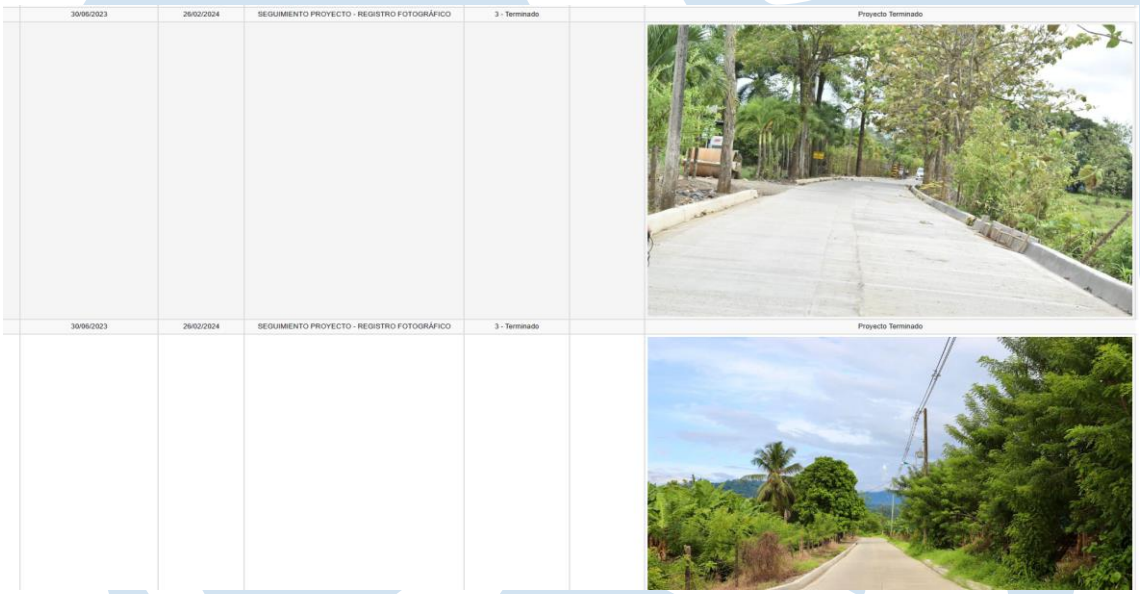


- Se actualizan metas e indicadores de productos

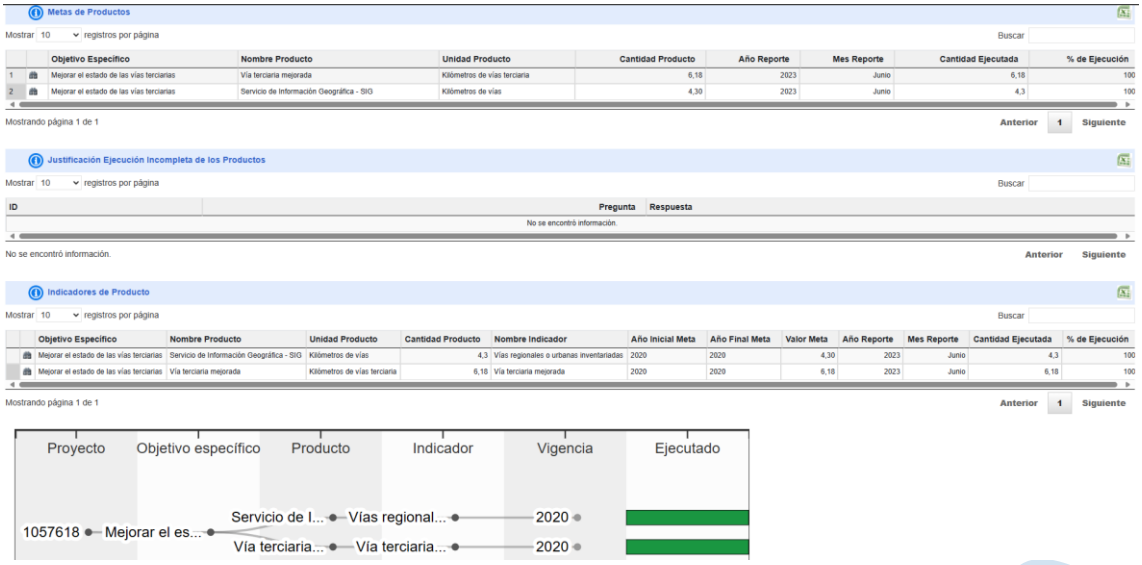


- Se actualiza proyecto a estado terminado

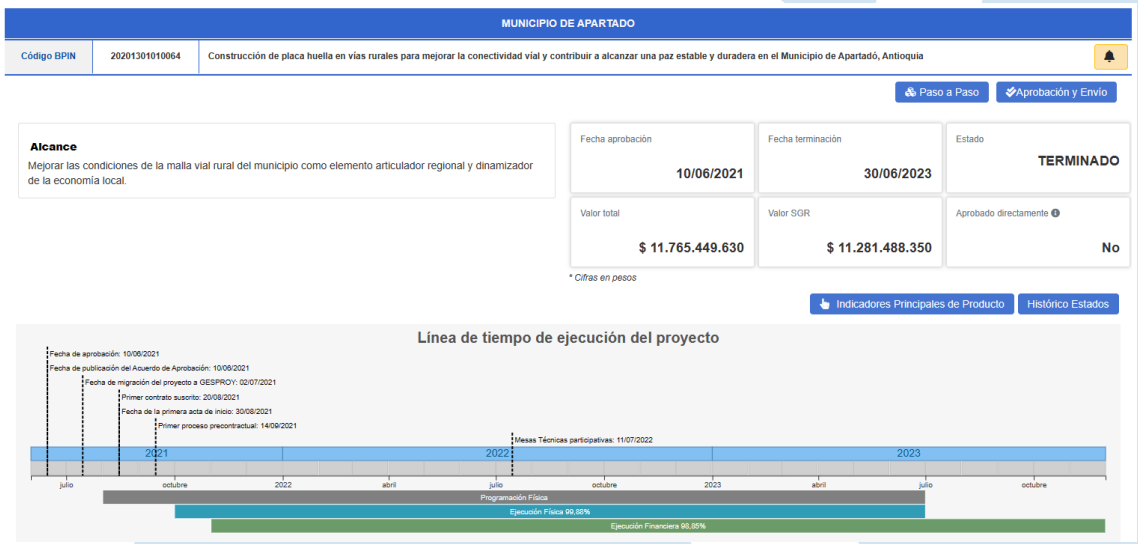


- Se registra población beneficiaria, sostenibilidad y funcionamiento además del concepto del supervisor.

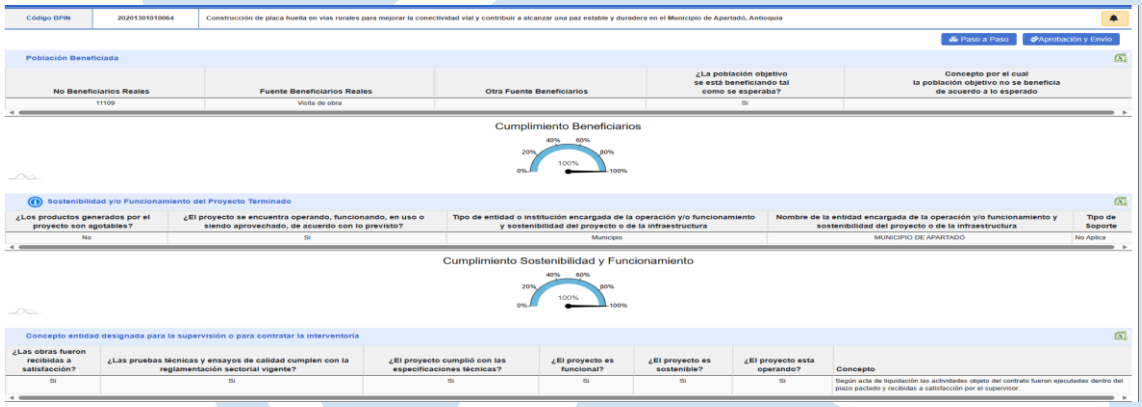

- Se aprueba mes de febrero justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



1.3.3. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó BPIN. 20201301011128.

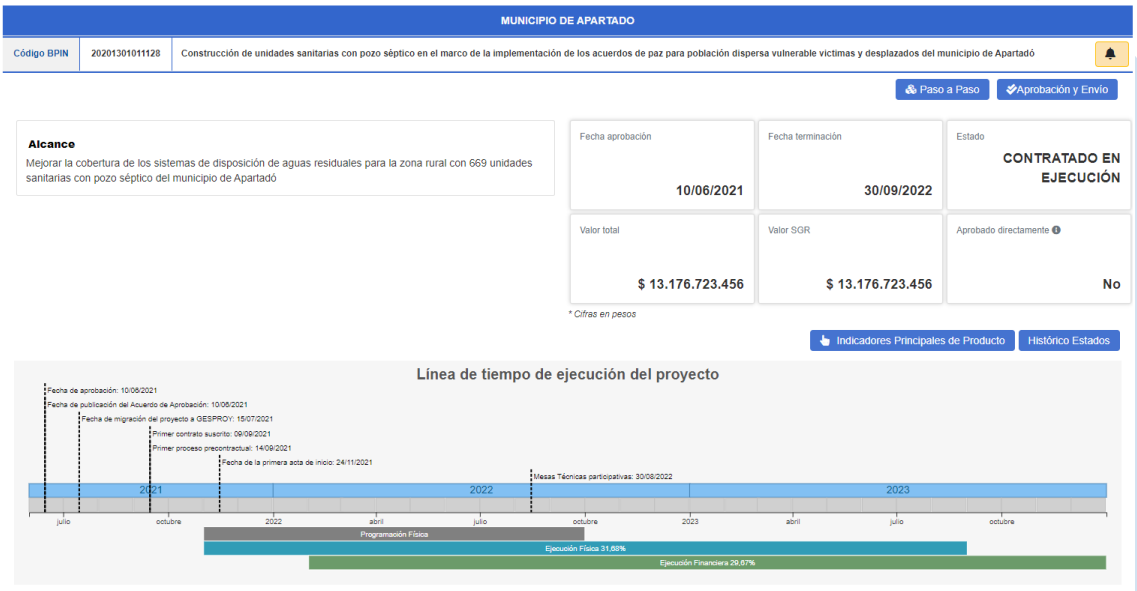

El proyecto se ha recibido con una ejecución física del 31.68% y así continua, presenta una alerta con código EJ-1-29 cuyo detalle es Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :43, esto se debe a que el proyecto se encuentra suspendido a espera de acta de reanudación.

Evidencia reporte de suspensión:




ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se aprueba le mes de febrero de 2024.



1.3.4. Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia BPIN. 20201301012048.

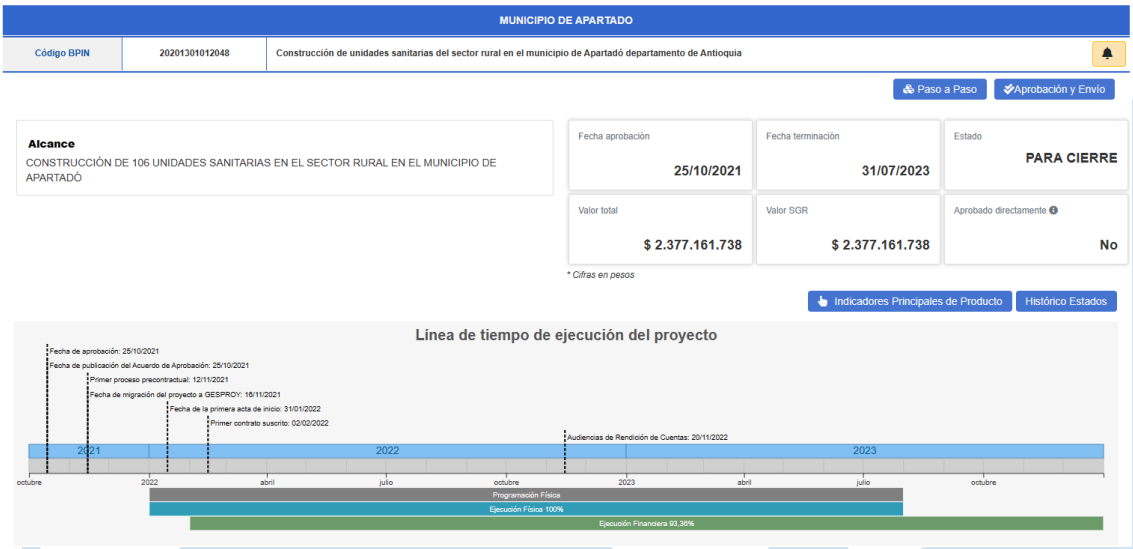

Después de corregir todas las irregularidades con las que inicialmente se recibió el proyecto, en el mes de febrero se ha registrado una abundante cantidad de información proporcionada por la administración municipal. Esto resalta la negligencia del individuo encargado del reporte de información en años anteriores. Sin embargo, gracias a esta información adicional, se logró llevar a cabo el cierre del proyecto.

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se realiza ajuste en el valor ejecutado de la interventoría de tal forma que coincida con los reportes y con el valor real ejecutado.



- ✓ Se reporta acta de liquidación del contrato de obra.

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	31/01/2022	se deja constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente.	0,00	14/02/2022		
N°1	Acta de suspensión	16/11/2022	constantes lluvias en el sector la cual dificulta la entrada de materiales de construcción	0,00	15/12/2022	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
01	Acta de reinicio	16/05/2023	se superan los inconvenientes que generaron la suspensión	0,00	24/05/2023		
N/A	Acta de Terminación	30/07/2023		0,00	13/02/2024		
SN	Acta de liquidación no requiere	23/01/2024	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor. Dar por liquidado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 341 de 2021, cuyo objeto es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." por un valor total de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($2.156.409.957), y plazo de DOCE (12) MESES. El saldo sin ejecutar por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($139.612.187), deberán ser reintegrados al presupuesto a favor del municipio	1.974.515.222,00	26/02/2024		

- ✓ Se realiza registro visual de la terminación del proyecto.

24/10/2022	26/02/2024	SEGUIMIENTO PROYECTO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	3 - Terminado	PROYECTO TERMINADO



- ✓ Se actualiza el estado del proyecto a terminado y se verifican requisitos de cierre, cosa que pasa el estado del proyecto a PARA CIERRE.


Requisitos Para Cierre del Proyecto

Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	✓	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	✓	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	NA	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	✓	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	✓	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	NA	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	NA	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	✓	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	NA	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

- ✓ Se cumplen todos los requisitos para cierre y se genera la proforma para acto de cierre.

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

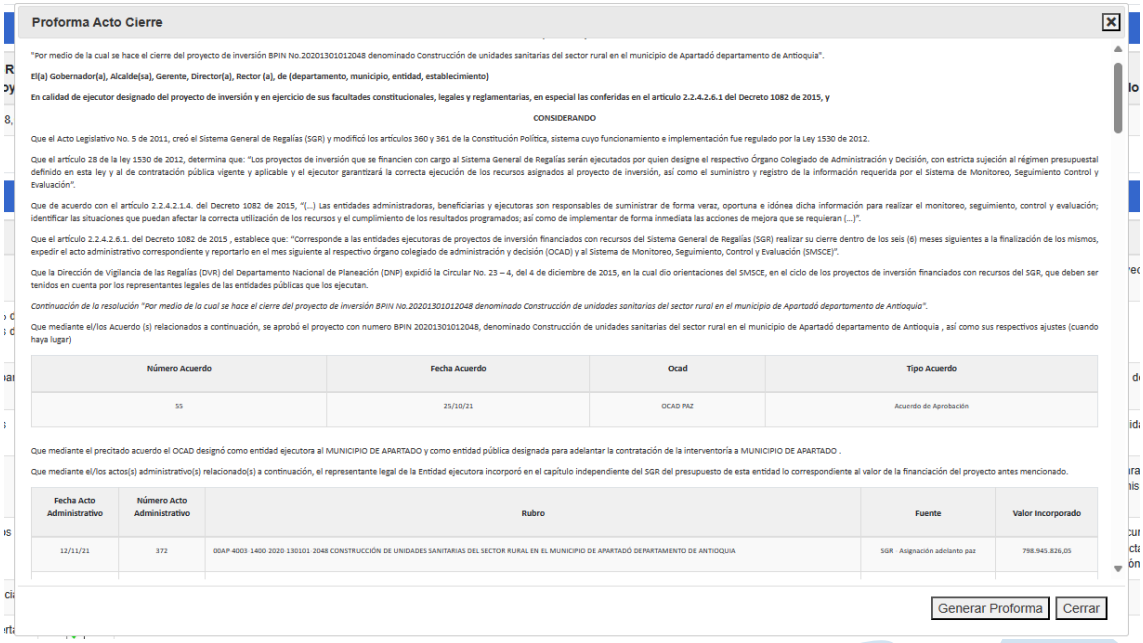

Proforma Acto Cierre

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

El(a) Gobernador(a), Alcalde(sa), Gerente, Director(a), Rector (a), de (departamento, municipio, entidad, establecimiento)

En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015 , establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

Que mediante el/los Acuerdo (s) relacionados a continuación, se aprobó el proyecto con numero BPIN 20201301012048, denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia , así como sus respectivos ajustes (cuando haya lugar)

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	Ocad	Tipo Acuerdo
55	25/10/21	OCAD PAZ	Acuerdo de Aprobación


Que mediante el precitado acuerdo el OCAD designó como entidad ejecutora al MUNICIPIO DE APARTADO y como entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría a MUNICIPIO DE APARTADO .

Que mediante el/los actos(s) administrativo(s) relacionado(s) a continuación, el representante legal de la Entidad ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Fecha Acto Administrativo	Número Acto Administrativo	Rubro	Fuente	Valor Incorporado
12/11/21	372	00AP 4003 1400 2020 130101 2048 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SGR - Asignación adelanto paz	798.945.826,05

Generar Proforma | Cerrar

✓ Se envía la administración municipal para realizar acto de cierre del proyecto.

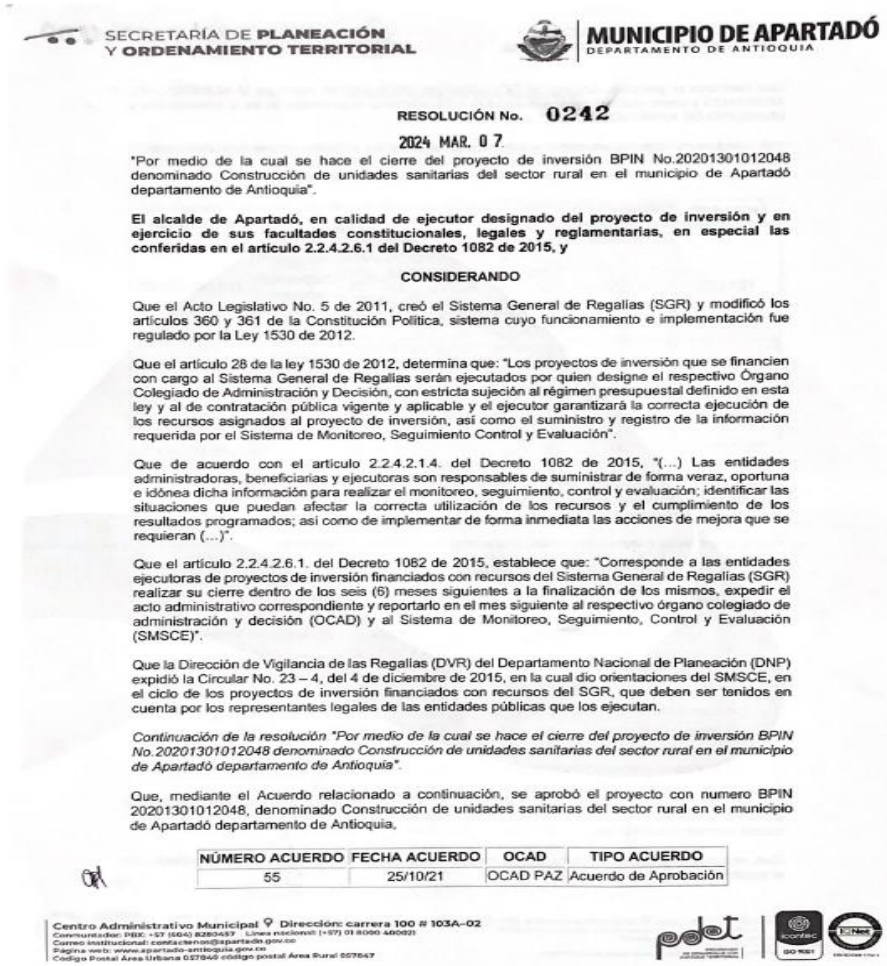

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN No. 0242

2024 MAR. 07

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

El alcalde de Apartadó, en calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301012048 denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia".

Que, mediante el Acuerdo relacionado a continuación, se aprobó el proyecto con numero BPIN 20201301012048, denominado Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia,

NÚMERO ACUERDO	FECHA ACUERDO	OCAD	TIPO ACUERDO
55	25/10/21	OCAD PAZ	Acuerdo de Aprobación

Centro Administrativo Municipal Dirección: carrera 100 # 103A-02

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com


✓ Se registra la resolución de cierre en el sistema.




✓ Se aprueba mes de febrero de 2024.



1.3.5. Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó BPIN. 20211301011050.

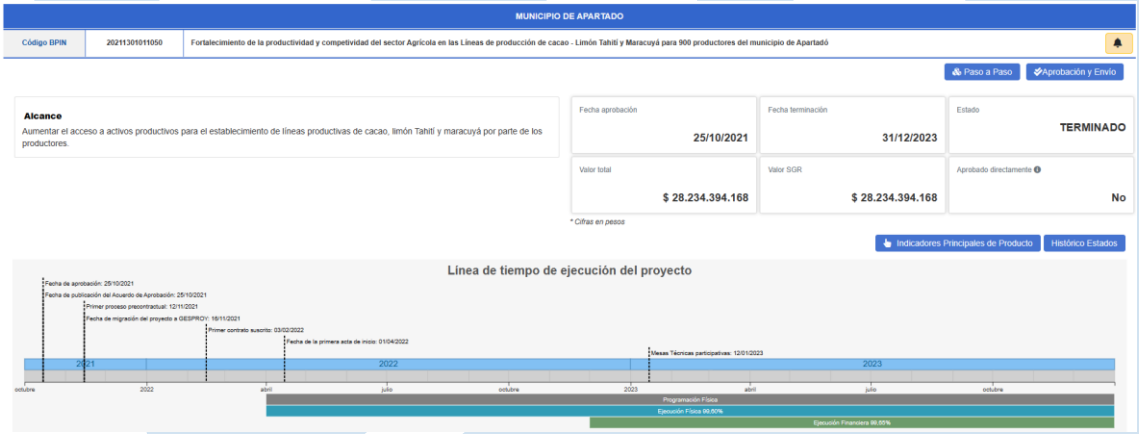

Después de corregir las irregularidades detectadas en el periodo anterior, notamos que en el presente mes surge una alerta con código EJ-1-24, la cual detalla "Proyectos terminados sin cerrar" con un periodo de 72 días. Esta situación persiste debido a que, hasta la fecha, los contratos del proyecto aún no han sido liquidados.



ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se realiza el reporte de los últimos meses de ejecución, la diferencia en valor se debe a una actividad no realizada que no afecta la realización del producto principal.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	2021130101l050	Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Pasos Reporte de Ejecución | Ejecución Periodos


Cargue de Ejecución del Proyecto — Eliminar Ejecución

Detalle Información Actividad Proyecto	
Valor Total del Proyecto a Programar	$ 28.234.394.168,00
Valor Actividades Programadas	$ 28.234.394.168,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 28.136.584.576,85


Actividad MGA: Implementar el Protocolo Bioseguridad COVID 19

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Implementar el Protocolo Bioseguridad COVID 19	und	.4	0	No		Inicial			
							Prog	1	97.809.590	97.809.590
							Eje		0	0

- ✓ Se realiza registro fotográfico de terminación.

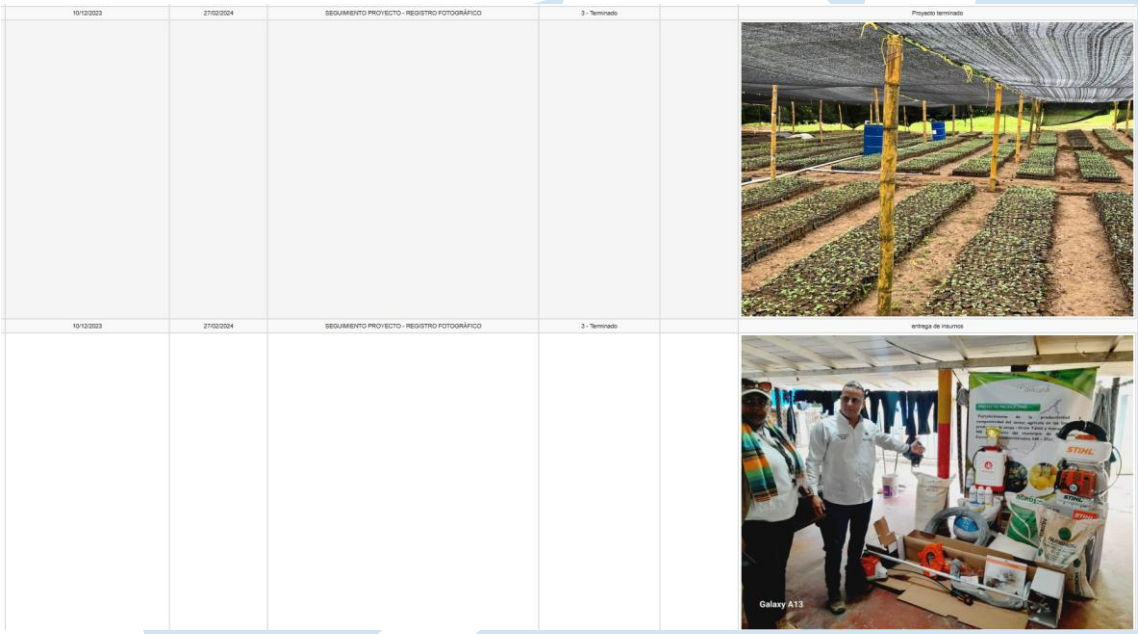


- ✓ Se actualiza estado del proyecto a terminado.

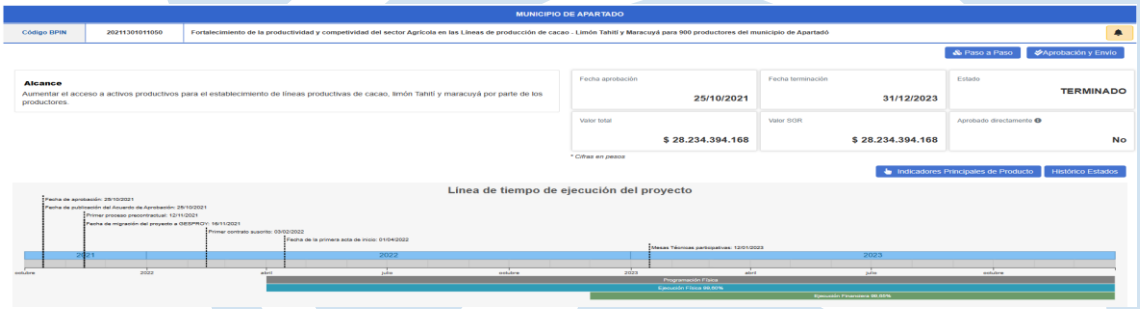


Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

- ✓ Se actualiza información de beneficiarios y sostenibilidad.

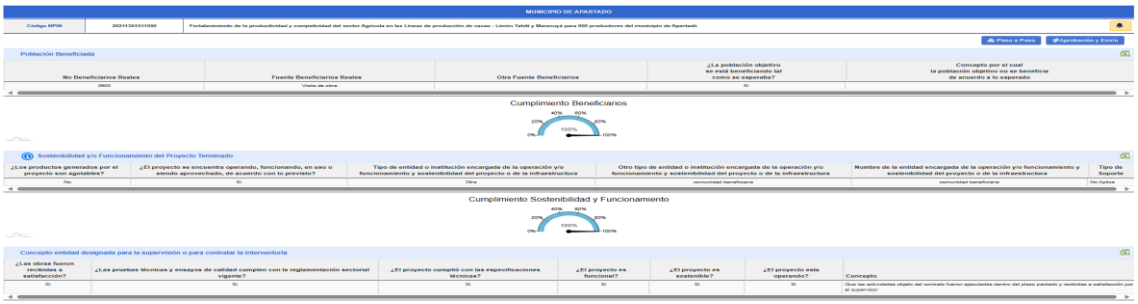

- ✓ Se verifican requisitos de cierre, solo a espera de liquidación de contrato de interventoría para proceder con el cierre

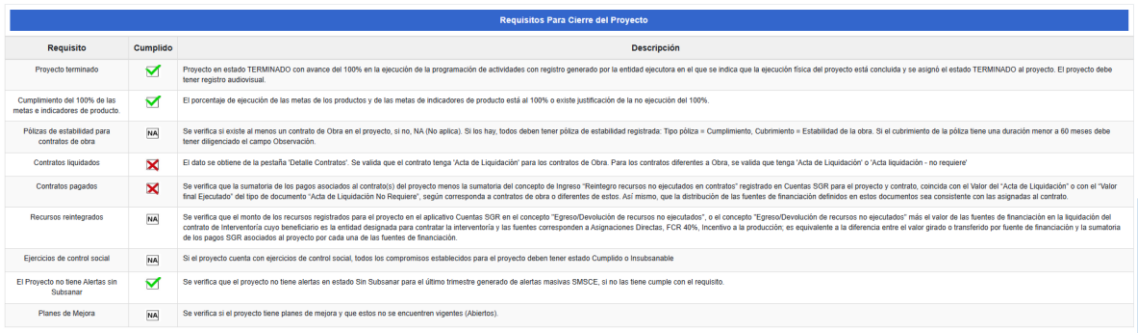

Requisitos Para Cierre del Proyecto

Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	✓	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	✓	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	NA	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	✗	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	✗	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	NA	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción, es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	NA	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	✓	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	NA	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

- Se aprueba mes de febrero 2024 justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN 20211301011050 Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: MUNICIPIO DE APARTADO — NIT: 890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Febrero	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	12/03/2024			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.

El presente informe ha llevado a cabo un análisis minucioso de la gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el municipio de Apartadó. La evaluación abarcó diversos aspectos cruciales, tales como el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), el histórico de resultados, la cobertura de información, el estado de los proyectos, y las alertas y riesgos de inversión.

Resumen de Hallazgos puntuales:

1. El municipio se recibe con una calificación que lo posiciona en un rango medio, con un puntaje de 65.60, ocupando el lugar 106 de 175 entidades ejecutoras evaluadas, nuestra labor como contratista es mejorar esos puntajes y posicionar al municipio de Apartadó como uno de los mejores en el reporte de información.

2. La puntualidad en el reporte de información destaca como un punto fuerte, con calificaciones elevadas en este aspecto y como contratista estamos comprometidos a mantenerlo así.

Estado de los Proyectos:

- Terminados: Se identificó una falta de cierre efectivo en algunos proyectos, con puntajes que no alcanzan los 90, nuestro compromiso es darle un cierre oportuno a todos los proyectos que se encuentran en estado terminado cumpliendo con cada uno de los requisitos para cierre.

- En Ejecución: Fluctuaciones en los puntajes, con proyectos que no cumplen los estándares esperados en programación, costos y tiempos, nuestra labor se enfocara en mejorar la calidad de los reportes de la mano con la secretaria de planeación y hacienda, recolectando toda la información de los proyectos en ejecución y reportando de manera correcta y veraz toda esa información.

Alertas y Riesgos de Inversión: Se han identificado alertas, incluyendo riesgo alto de desaprobación del proyecto y riesgo bajo de posibles retrasos en la ejecución, nos centraremos en subsanar todas las alertas provenientes del periodo pasado para evitar riesgos de inversión.

En conclusión, podemos decir que la gestión de proyectos de SGR en Apartadó presenta áreas de mejora, especialmente en eficiencia de ejecución, cierre de proyectos y subsanación de alertas. Se requiere una intervención estratégica para mejorar el IGPR del municipio y ese será nuestro compromiso con el municipio. Implementando estrategias para mejorar la eficiencia en la obtención de la información de los proyectos, incluyendo mayor seguimiento y supervisión, así como el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa del municipio.

Establecer un protocolo para el cierre efectivo de proyectos, garantizando el reporte oportuno de información y el cumplimiento de requisitos legales y técnicos; Subsanar las alertas y riesgos de inversión de manera oportuna y eficaz.

Como Compromiso, La Fundación FAMUNDO se compromete a colaborar con el municipio de Apartadó para implementar las recomendaciones del presente informe y mejorar la gestión de proyectos de SGR.

HAMILTON BURITICA MANCO
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com
