ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

ENTIDAD CONTRATANTE

ENTerritorio

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

DIRECCION
CRA 16 # 183- 43 APTO 203 TORRE 3
BOGOTA D.C
EMAIL
proyectosdeingenieria.caee@gmail.com
TELEFONO
3028271612

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTENIDO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3
ORIGINAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COPIA No.	AUTORIZADA POR:	EMITIDA PARA:	RESPONSABLE:
1	Representante Legal	Cliente	Director de Interventoría

PREPARÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Fabio Osorio Osorio **Residente de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Director de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Representante Legal**

INFORME MENSUAL No. 3
01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023
Versión No. 0
Lugar y fecha de elaboración:
Bogotá D.C, noviembre de 2023

REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

INFORME MENSUAL 3 (noviembre 2023) INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN No.	No. PAGINAS	FECHA	ELABORÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
0	37	30-11-2023	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Creación del documento

CONTROL DE COPIAS

COPIA No.	AUTORIZADA POR:	EMITIDA PARA:	RESPONSABLE:
1	Representante Legal	Cliente	Director de Interventoría

PREPARÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Fabio Osorio Osorio **Residente de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Director de Interventoría**	**Oscar Mauricio Almario F.** **Representante Legal**

RECIBIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

CLIENTE: **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** **ORDEN DE SERVICIO No.:** 2230219 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio** **FIRMA:** **NOMBRE**: MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA **CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO **FECHA**:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **6**
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS **7**
1.1. Antecedentes 7
1.2. Localización 7
Figura 1. Localización Municipio Rio Iro **8**
1.3. Descripción 8
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO **11**
2.1. Información General del Contrato 11
2.1.1 Aspectos Contractuales 12
2.1.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas 13
2.1.3 Aspectos Financieros 13
2.2. Aspectos Técnicos Contrato 14
2.2.1. Personal Aprobado del Contratista de obra Actividad 1 y 2 14
2.2.2. Personal Aprobado de Interventoría Actividad 1 y 2 15
2.2.3. Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros 15
2.2.4. Control de Inspección y Ensayo 16
2.2.5. Gestión de comités de seguimiento y/o aprobación. 16
2.2.6. Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría 17
2.2.6.1 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo 20
2.3 Seguimiento plan de Gestión y Calidad 20
Responsabilidades 20
Plan de materiales sin certificado de conformidad 21
Plan de materiales con certificado de conformidad 21
2.3.1 Plan de Gestión Social 21
2.3.2 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo - SST 26
2.3.3 Plan de Gestión Ambiental 29
Figura 3. Punto Ecológico **30**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localización Municipio Rio Iro 8
Figura 2. Punto Ecológico 33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Actividades contractuales 12
Tabla 2. Información general del contrato de Interventoría 13
Tabla 3. Aspectos Contractuales del Contrato de Interventoría 13
Tabla 4. Relación de Pólizas 14
Tabla 5. Valores ejecutados en el periodo por frente de obra 14
Tabla 6. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2 15
Tabla 7. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1 y 2 15
Tabla 8. Maquinaria y equipos 16
Tabla 9. Comités de Aprobación 17
Tabla 10. Comités de seguimientos 17
Tabla 11. Actividades ejecutadas en el periodo 20
Tabla 12. Personal presente en obra (Etapa de Diagnósticos) 19
Tabla 13. Inspecciones realizadas 29
Tabla 14. Personal Administrativo 30
Tabla 15. Personal operativo 31
Tabla 16. Personal administrativo y operativo de Interventoría en sitio 31

ANEXOS

1. Informe ejecutivo del proyecto
2. Actas de inicio del proyecto
3. Actas de concertación
4. Actas de vecindad del proyecto
5. Avance de cada una de las actividades realizadas
6. Relación de planos, del proyecto
7. Registros fotográficos, del proyecto
8. Fotocopia de la bitácora o libro de obra
9. Relación de personal empleado en la ejecución
10. Informes semanales presentados y aprobados del proyecto
11. Informe de Gestión Social
12. Conclusiones y recomendaciones
13. Relación de correspondencia del proyecto
14. Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones
15. Actas de aprobación de diagnósticos
16. Actualización del programa de ejecución de obra.
17. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
18. Trazabilidad de las Garantías aprobadas con sus respectivos soportes
19. A.P.U. Aprobados

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades Técnicas, Ambientales, Sociales, financieras y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo de la orden de Servicio No. 2230223 dentro del tercer mes del contrato, entre los días 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023.

En el presente informe se describe los componentes que conforman la ejecución de las actividades que se estipulan en las reglas de participación actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10, actividad 2: Diagnostico, Validación preliminar concertación y planeación de la intervención de esta manera intervenimos dentro del presente periodo adelantando las intervenciones para luego ejecutar la actividad 3: ejecución de las obras de las conexiones de agua potable y saneamiento básico, acta de entrega y recibo de las obras y así cumplir con el objetivo del contrato y la ejecución de la obra brindado al municipio desarrollo y calidad de vida.

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS

1.1.Antecedentes

El Programa de Conexiones se encuentra reglamentado mediante el Decreto 1077 de 2015, Capítulo 4 (modificado parcialmente por el Decreto 1275 de 2021) que establece el alcance del programa y los criterios de priorización y focalización para la identificación de inmuebles potenciales beneficiarios; así como la Resolución 574 de 2022, que establece los lineamientos para su implementación, adicional a esto los proyectos que se estructuren conforme a lo dispuesto en este alcance deberán cumplir con los requisitos y contenidos, establecidos en los siguientes documentos:

- Ley 373 de 1997 "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua."
- Información técnica de los proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregada a ENTerritorio, tales como: Certificaciones de Servicios Públicos, Planeación Municipal, matriz de encuestas tabuladas, cantidad de inmuebles potenciales a ser beneficiados, orden de barrios priorizados y análisis de la información de la ciudad, relativa a la identificación de las necesidades relacionadas con el déficit de conexiones intradomiciliarias.
- La demás normatividad que aplique para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Trabajo.

1.2.Localización

"El Municipio de Rio Iró se encuentra localizado al sur-este del departamento del Chocó, en medio de una vegetación selvática tropical. El territorio se encuentra surcado por los ríos Iró y Condoto. Limita por el norte con Tadó; por el oriente con Condoto; por el sur con los municipios de Condoto y San José del Palmar; y por el occidente con Istmina."



Figura 1. Localización Municipio Río Iró
Fuente: Google Maps

1.3.Descripción

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS		
REDES HIDROSANITARIAS		
2.1	Redes intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
2.2	Redes intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M
PUNTOS HIDROSANITARIOS		
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UND
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UND
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de **SANITARIO (INODORO)**, incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UND
2.10	Suministro e instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	UND
2.11	Suministro e instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero	UND
2.12	Suministro e instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) CON POCETA** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UND
	CAJAS DE INSPECCIÓN	
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m. Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	M
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (**No incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (**No incluye**: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UND
3.5	Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con tanque (incluye cubierta en fibrocemento) - incluye manija de agarre (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos).	UND
3.6	Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - sin cubierta **(**no incluye: sanitario, ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre.	UND
	CIMENTACIÓN	
3.7	Relleno compactado con material de sitio	M3
3.8	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3.9	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3
3.10	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG
3.11	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2
3.12	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2
3.13	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3
	MAMPOSTERIA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.14	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2
3.15	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UND
	MORTEROS	
3.16	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2
3.17	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2
3.18	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2
	ELEMENTOS	
3.19	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético (0,70 x 2,00 m)	UND
3.20	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)	UND
3.21	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	UND
3.22	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UND
3.23	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	UND
3.24	Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	UND
3.25	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	M2
3.26	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M
3.27	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria y/o intradomiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UND
	ACABADOS	
3.28	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2
3.29	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2
3.30	Recuperación de piso esmaltado	M2
3.31	Enchape pared blanco corona o similar	M2
3.32	Enchape piso antideslizante blanco corona o similar	M2
3.33	Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)	M2
	CONEXIONES	
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UND
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UND
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UND
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UND
INTERVENCIONES VARIAS		
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2
CAJAS DE INSPECCIÓN		
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	M
4.10	Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para **DOMICILIARIA.**	UND

Tabla 1. Actividades contractuales

Fuente: Contrato contratista de obra

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1.Información General de la Orden de Trabajo

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	2230223
CONTRATISTA	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS RADA RAYO
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE RÍO IRO CHOCO
PLAZO INICIAL	210 DÌAS
VALOR INICIAL	$ 4.164.944.717,87
VALOR ANTICIPO	NO SE HA TRAMITADO
FECHA DE INICIO	24/08/2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2024

Tabla 2. Información general de la orden de trabajo

Fuente: Autor

2.2 Información General de la Orden de Servicio

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
No. CONTRATO	2230219
FECHA DE INICIO	24 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA	C&E ENGINEERING SAS
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO ALMARIO
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL	225 DÌAS
VALOR INICIAL	$ 396.843.968,13
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO	24/08/2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	08/04/2024

Tabla 3. Información general de la orden de Servicio

Fuente: Autor

2.1.1 Aspectos Contractuales

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan en la Tabla 3. Aspectos Contractuales del Contrato de Interventoría

DOCUMENTO	FECHA
ORDEN DE TRABAJO No.	2230223
ACTA DE INICIO	24 de agosto de 2023

Tabla 4. Aspectos Contractuales de la orden de Trabajo

Fuente: Autor

2.1.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas

La orden de servicio se encuentra amparado por las siguientes pólizas, las cuales han sido presentadas por la firma interventora y aprobadas por ENTerritorio. Se hace aclaración que todas las pólizas son expedidas por la misma compañía (Seguros del Estado S.A.).

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTIA No. 21-45-101415928			
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	12/12/2024	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	11/04/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/04/2023	11/04/2027	$ 119.053.191,00
GARANTIA No. 21-40-101214825			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00

Tabla 5. Relación de Pólizas

Fuente: Autor

2.1.3 Aspectos Financieros

El contrato No. 2230223 tiene un valor de $ 4.164.944.717,87, el cual hace parte del contrato suscrito entre CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL y ENTerritorio. A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente resumen financiero:

Acta No.	FRENTE	PERIODO	VALOR ACTA	ACUMULADO
1	BARRIOS: LA REAL LA UNION EL ROSARIO	24/08/2023 AL 30/11/2023	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL OBRA			**$ 0,00**	**$ 0,00**

Tabla 6. Valores ejecutados en el periodo por frente de obra

Fuente: Autor

El contrato No. 2230219 tiene un valor de $ 396.843.968,13, el cual hace parte del contrato suscrito entre C&E ENGINEERING SAS y ENTerritorio. A la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente resumen financiero:

Acta No.	PERIODO	VALOR ACTA	ACUMULADO
1	24/08/2023 AL 24/10/2023	$ 42.330.023,26	$ 42.330.023,26
TOTAL OBRA		**$ 42.330.023,26**	**$ 42.330.023,26**

Tabla 7. Valores ejecutados en el periodo y pagados

Fuente: Autor

1.1.Aspectos Técnicos Contrato

1.1.1. Personal Aprobado del Contratista de obra Actividad 1 y 2

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Obra	50%	Miguel Ángel Martínez Amórtegui
Residente de Obra	100%	Eifer Yesid Ruiz Aponte
Profesional técnico en Diagnóstico	100%	Aníbal José Ruiz Avilez
Profesional Hidráulico	50%	Diego Fernando García Borrero
Especialista Estructural	50%	Álvaro Rafael Caballero Guerreo
Trabajadora Social	100%	Diana Marcela Payares Flerez
Trabajadora Social	100%	Saddy Sofia Beltrán García

Tabla 8. Personal aprobado del contratista Actividad 1 y 2

Fuente: Consorcio Grupo Empresarial

1.1.2. Personal Aprobado de Interventoría

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de Interventoría	40%	Oscar Mauricio Almario Fernández
Residente de Interventoría	100%	Fabio Alberto Osorio Osorio
Especialista estructural	3%	David Leonardo Rozo
Especialista HSEQ	20%	Cristian David Galvis Najar
Especialista Hidrosanitario	3%	José Luis Salaiman Lamadrid
Profesional de Costos y Presupuestos	15%	Oscar Mauricio Almario Fernández
Inspector de Interventoría	100%	Víctor Luis Murillo Ramírez
Inspector de Interventoría	100%	Jairo Cornelio Palacios
Profesional Social	100%	Candelaria González Medina
Técnico PGIO 1	100%	Cristian Alejandro Otalora
Técnico PGIO 1	100%	Duvan Felipe Mosquera Mosquera

Tabla 9. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1 y 2
Fuente: Autor

1.1.3. Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros

Dentro del periodo de la Etapa de DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, utilizó la siguiente maquinaria y/o equipos para el desarrollo de la misma.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y Equipo digital	Se han requerido de los flexómetros para la medición y el levantamiento de las viviendas.
Equipo Fotográfico	Cámaras	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipo de Computo	Portátiles	Para lograr la recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega periódica de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua con el contratante e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones con el contratista e interventoría para facilitar la información y mantener informados a los mismos.
Equipos de Comunicación	Celulares	Tener continua comunicación con el contratante, interventoría y personal administrativo y en campo del consorcio.

Tabla 10. Maquinaria y/o equipos ofimáticos

Fuente: Autor

Durante este periodo no se realiza actividad con maquinaria, debido a que no se realizan actividades constructivas.

1.1.4. Control de Inspección y Ensayo

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se realizan ensayos de laboratorio, debido a que a la fecha no se han realizado actividades constructivas.

1.1.5. Gestión de comités de seguimiento y/o aprobación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023 se realizan comités de seguimiento y aprobación los cuales se relacionan en la Tabla 11 y Tabla 12.

REUNION	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE APROBACIÓN No. 7	03/11/2023	• Presentación de diagnóstico por parte del contratista a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación • Aprobación de diagnostico • Recomendaciones generales
COMITÉ DE APROBACIÓN No. 8	10/11/2023	• Presentación de diagnóstico por parte del contratista a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación • Aprobación de diagnostico • Recomendaciones generales

REUNION	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE APROBACIÓN No. 9	17/11/2023	• Presentación de diagnóstico por parte del contratista a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación • Aprobación de diagnostico • Recomendaciones generales

Tabla 11. Comités de Aprobación

Fuente: Autor

REUNIÓN	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 7	03/11/2023	Seguimiento a la actividad 1, 2 y 3. Compromisos de la reunión cero.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 8	10/11/2023	Seguimiento a la actividad 1, 2 y 3. Compromisos.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 9	20/11/2023	Seguimiento a la actividad 1, 2 y 3. Compromisos.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 10	23/11/2023	Seguimiento a la actividad 1, 2 y 3. Compromisos.

Tabla 12. Comités de seguimientos

Fuente: Autor

1.1.6. Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría

Las actividades desarrolladas para el periodo son las siguientes:

Actividad 1: Se da respuesta al sistema estructural propuesto por el contratista de obra y se remite a la entidad para que sea aprobados.

Actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

El contratista Consorcio grupo Empresarial realiza 33 Diagnóstico efectivos de las condiciones actuales y reales de cada una de las viviendas beneficiadas programa de conexiones intradomiciliarias, en los barrios Nuevo, Real, La Unión Y el Rosario de acuerdo con información anterior suministrada por ENTerritorio (encuestas de estructuración) y levantamientos técnicos minuciosos para una buena planificación y formulación de las intervenciones de las viviendas.

Esta actividad se inicia con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socialización sectorizada, socializaciones casa a casa, entrega de volantes y folletos informativos con los requisitos documentales del proyecto, perifoneos, instalación de la valla publicitaria, instalación de los buzones de sugerencias en los dos primeros barrios priorizados y demás estrategias de divulgación del proyecto.

La elaboración de los diagnósticos en el municipio de Rio Iró, se viene realizando por manzanas visitando todas las que se encuentran en la matriz inicial, consiste en identificar las viviendas con el sticker aprobado por la Entidad contratante y la codificación correspondiente a cada vivienda diagnosticada cambiando solamente los últimos números perteneciente a cada una de estas viviendas beneficiadas. A la fecha se han realizado 515 visitas en los barrios priorizados (Barrio Nuevo, la Real, la Unión y el Rosario) de las cuales se han verificado, revisado y aprobado 326 diagnósticos; quedando así, 1 viviendas por visitar y 26 viviendas por aprobar, 110 viviendas que no son efectivas y 28 renuncias por los potenciales beneficiarios, conforme a las 458 viviendas que se encuentran en la matriz general,

Esta actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- Revisar la matriz principal, para la verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, siendo este el punto de partida para categorizar las unidades de vivienda como efectivas o no efectivas.
- Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- Registrar fotográficamente el antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.
- Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales.
- Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado el formato PCI 005.
- Instalar los sticker en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación aprobada.

- Se realiza informe individual para los Diagnósticos aprobados en los Formatos PCI establecidos en el PCI-001 Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico.

A continuación, resumen de las actividades ejecutadas:

BARRIO:	**NUEVO, LA REAL, LA UNION, EL ROSARIO**	
1	**Número de viviendas potencial inicial:**	**459**
2	Total de visitas realizadas por el contratista:	515
3	Total de diagnósticos efectivos:	326
4	Número de Diagnósticos No Efectivos (En revisión):	136
5	**Total de diagnósticos aprobados por la interventoría**	**326**

Tabla 13. Actividades ejecutadas en el periodo

Fuente: Autor

En el periodo del presente informe, la Interventoría reporta que el contratista de obra cuenta con el siguiente personal en obra:

RELACION DE PERSONAL EN OBRA (CONTRATISTA DE OBRA)

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Eifer Yesid	Ruiz Aponte	1049373139	Residente de Obra
Aníbal José	Ruiz Avilez	1066182660	Profesional técnico de diagnósticos
Alicia Patricia	Vergara Tuiran	1100692892	Inspector
Ángel Yesid	Avendaño Barón	1049373887	Inspector
Juan David	Torres Dávila	1076335432	Inspector
Pablo Alejandro	Viancha Saavedra	1014284788	Inspector
Diana Marcela	Payares Flerez	1045729630	Profesional social
Saddy Sofia	Beltrán García	1100693213	Profesional social

Tabla 14. Personal presente en obra (Etapa de Diagnósticos)

Fuente: Autor

2.2.6.1 Situaciones Especiales Ocurridas durante el periodo

Durante el mes de noviembre se evidencia los siguientes inconvenientes los cuales han afectado el normal desarrollo del Proyecto. La falta de vías de acceso para el inicio de la actividad número 3, lo cual genera incertidumbre en la comunidad frente al inicio de las obras.

- Se han identificado varias viviendas en el barrio Rosario que se encuentra en zona de riesgos (deslizamientos).
- Se han encontrado viviendas que se encuentra en la matriz inicial de beneficiarios que han rechazado porque no cuenta con los espacios para la realización de la actividad 3.
- Se ha contado con el acompañamiento del secretario de planeación para la verificación de las viviendas que se encuentra en zona de riesgo y que pueda emitir su validación y posible intervención.
- Se cuenta con el acompañamiento del gerente de la empresa prestadora de servicio público para la validación de las redes de acueducto y alcantarillado existente en los barrios priorizados.
- Por otra parte, la falta del fluido eléctrico, fallas en la cobertura del internet y la falta de señal en la gran mayoría de los días.
- Las constantes lluvias presentadas en esta zona, las cuales son intermitentes y afectan el cronograma de actividades del contratista de obra.

2.3 Seguimiento plan de Gestión y Calidad

Las actividades desarrolladas del plan de calidad del proyecto para el periodo fueron las siguientes:

Responsabilidades

Se ha designado al Profesional de Calidad y/o HSEQ como responsable de formular, implementar, mantener y mejorar el Plan de Gestión de Calidad.

El Director de Interventoría del Proyecto tiene la responsabilidad total del éxito en la ejecución de este, incluyendo la conformidad con el Sistema y en el cumplimiento de los Objetivos. Igualmente es responsable de gestionar las relaciones contractuales, efectuar la planeación, organización de los trabajos de construcción y elaboración y presentación de informes y productos establecidos por la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio.

Control de documentos y datos

Los documentos de Gestión de Calidad son elaborados de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y están estructurados por niveles de tal forma que se ejerce un control sobre las actividades que afectan la calidad del producto y servicio.

Los procedimientos descritos son emitidos, controlados y de cumplimiento obligatorio por cada una de las personas en todos los procesos de la firma CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS y no deben alterarse ni omitir sin la aprobación directa del responsable del Sistema de gestión de calidad.

La creación y control de los documentos requeridos por el Plan de Gestión, necesarios para la eficaz planificación, operación y control de los procesos, están soportados por los responsables de cada proceso, quienes solicitan su elaboración, modificación y/o anulación.

Todas las copias del Plan de Gestión de Calidad y los documentos que hacen parte del mismo son editados, distribuidos y controlados por el responsable del Plan y Especialista de Calidad.

Plan de materiales sin certificado de conformidad

Para el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023 no se realizaron actividades de obra, por tal motivo no se cuenta con materiales sin certificado de conformidad. Cabe señalar que durante el primer mes de ejecución se adelantó actividades de diagnóstico y concertación.

Plan de materiales con certificado de conformidad

Para el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023 no se realizaron actividades de obra, por tal motivo no se cuenta con materiales con certificado de conformidad. Cabe señalar que durante el primer mes de ejecución se adelantó actividades de diagnóstico y concertación.

2.3.1 Plan de Gestión Social

El Proyecto conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico del municipio de Rio Iró -CHOCO, firma Acta de inicio el 24 de agosto de 2023, con el apoyo y/o

acompañamiento de algunas entidades del Municipio involucradas en la ejecución del Proyecto; entre ellas, indispensable el apoyo y acompañamiento de la Alcaldía municipal de Rio Iró, con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar los impactos directos potenciales derivados de la ejecución del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico PCI, las cuales deberán implementarse de manera articulada entre las entidades involucradas, Alcaldía municipal, Prestador de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Rio Iró, Contratista de Obra e Interventoría, según correspondan sus obligaciones.

El PCI, se convierte en un instrumento de planificación que promueve la participación activa de la comunidad en gestión integral de los procesos; a la vez fomenta el compromiso y corresponsabilidad de la comunidad para la sostenibilidad de las obras, con el fin de establecer canales de participación ciudadana, de comunicación e información comunitaria antes, durante y después del desarrollo del Proyecto. Por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades reuniones de apertura de los barrios la Unión y el Rosario liderada por la Alcaldía municipal, socialización sectorizada en el barrio el Rosario, visitas de socialización casa a casa en los tres últimos barrios priorizados, recorrido de barrio con los miembros de la veeduría, distribución de material publicitario, instalación de la valla publicitaria, instalación de los buzones de sugerencias en los dos primeros barrios priorizados, atención a la comunidad y de recepción de PQRS, entre otras actividades.

El 02 de octubre del 2023 se da continuidad a la fase I de diagnósticos; para la cual se socializó casa a casa las generalidades del Proyecto e inicio de aplicación de encuesta potenciales beneficiarios a las personas registradas en la matriz línea base en los barrios la Real, la Unión y el Rosario.

Las actividades realizadas a corte de este informe son las siguientes:

Línea de Comunicación

- **Socializaciones (Masivas y Sectorizadas) y reuniones de acercamiento con líderes:**

El contratista de obra con el apoyo y acompañamiento de la Interventoría realizo reunión de socialización sectorizada en el barrio el Rosario, visitas de socialización casa a casa en los tres últimos barrios priorizados, con el objetivo de explicarles a los potenciales beneficiarios las generalidades del Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico dejando claridad del beneficio que llegará a las viviendas

según su necesidad y alcance del proyecto. Se hace énfasis en que el beneficio no es un mejoramiento de vivienda como algunas personas quisieron manifestar. Así mismo, se les recuerda las recomendaciones de bioseguridad por la pandemia, como el mantener el distanciamiento, lavado o desinfección de manos y que solo una persona del hogar sea quien atienda la visita.

- **Visita Casa a Casa**

Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Proyecto, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre e inquietudes de los potenciales beneficiarios. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda. Además, durante estas visitas, el equipo social hizo hincapié en la importancia de concertar con el equipo técnico el espacio para la intervención, no dejar los menores de edad solos en las viviendas durante la ejecución de las obras, mantener los materiales recibidos bajo custodia, para poder intervenir la vivienda sin dificultades y no dejar los trabajadores solos en las viviendas durante la ejecución de las obras.

La comunidad manifestó sus dudas referentes al Proyecto, las cuales fueron el proceso de inclusión, tiempo de inicio de las obras, falta de red de alcantarillado, las cuales fueron resueltas por el equipo social y entendidas por los potenciales beneficiarios.

Durante este periodo se informa que se han realizado visitas de socialización casa a casa para un total hasta la fecha de 515 visitas, en los 4 barrios priorizados del PCI, en barrio nuevo se han llevado a cabo 232 visitas de la cuales 173 son efectivas 57 no efectivas y 2 renuncias; en el segundo barrio priorizado (barrio la real) se lleva un total de 71 visitas casa a casa de las cuales 49 son efectivas, 14 no efectivas y 7 renuncias, el tercer barrio priorizado (barrio la unión) se llevan 89 visitas casa a casa, de las cuales 58 son efectivas, 24 no efectivas y 4 renuncias y por último, el cuarto barrio priorizado (barrio el rosario) se lleva un total de 123 visitas casa a casa a la fecha, siendo 83 efectivas, 28 no efectivas y 12 renuncias.

.

- **Creación del link**

Se realizó envió de la información para la actualización del Link informativo a la Entidad contrastante, para su revisión y/o aprobación con el fin de poder hacer entrega oficial a la Alcaldía municipal, para la debida actualización del mismo.
https://www.rioiro-choco.gov.co/noticias/programa-conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potable

Diseño y distribución de material publicitario

La interventoría hace seguimiento y participa activamente en todas las actividades contempladas en las diferentes líneas de intervención del plan de gestión social en los barrios priorizados, (Barrio Nuevo, la Real, la Unión y el Rosario) se da inicio al proceso de divulgación correspondiente en la línea de comunicación como son perifoneos locales sobre el inicio de actividades, entrega de folletos y volantes informativos, perifoneos de apertura de la oferta de empleo.

- El 14 de noviembre se realizó perifoneo en el barrio el Rosario con el fin de informarle a la comunidad de la apertura del proceso de inclusión al Proyecto
- El 15 y 16 de noviembre de 2023 se realizó perifoneo local en barrio Nuevo y la Unión para informarle a la comunidad la apertura de la oferta de empleo con el fin de ampliar la información para que todas las personas interesadas puedan ir al Punto de atención a llevar su hoja de vida y aclarar dudas e inquietudes. Asimismo, se realizó entrega de volantes e instalación de carteleras informativas
- El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo perifoneo local en los barrios la Real y el Rosario para informarle a la comunidad sobre la apertura de la oferta de empleo. con el fin de ampliar la información para que todas las personas interesadas puedan ir al Punto de atención a llevar su hoja de vida y aclarar dudas e inquietudes. Asimismo, se realizó entrega de volantes e instalación de carteleras informativas

- **Línea de Participación Comunitaria**

El Proyecto de Conexiones Intradomiciliaria de agua potable y saneamiento Básico en el municipio de Rio Iró - CHOCO, el contratista de obra instaló el punto de atención a la comunidad en el Barro la Unión diagonal a la cancha de futbol, como lugar estratégico, para mejor ubicación de la comunidad los horarios de atención 2:00pm a 4:00pm de lunes a viernes, con el fin de facilitarle a comunidad que trabaja en el campo por fuera del municipio y regresan días después a sus hogares.

- **Actividades con la veeduría**

El 01 de noviembre se realizó la instalación de los buzones de sugerencias de barrio la Unión y el Rosario con el acompañamiento de dos miembros de la veeduría del Proyecto, Se ubicaron en lugares estratégicos para mayor identificación por parte de la comunidad el buzón del barrio la Unión se instaló en el punto de atención el cual se encuentra ubicado en el mismo barrio.

El buzón de sugerencia del barrio el Rosario se instaló en un local comercial ubicado en la manzana cinco del mismos como lugar estratégico recomendado por la veeduría.

- **Recepción y trámite de las PQRS**

Durante el periodo reportado de este informe, se recepcionaron treinta y dos PQR por solicitud de inclusión de las cuales (4) de barrio Nuevo, la Real (2) la Unión (8) el Rosario (18) de las cuales (24) PQR, cuentan con respuesta por parte del Operador de servicios públicos y de la Alcaldía Municipal. De igual forma, el equipo social estará realizando la entrega de la respuesta de cierre a los solicitantes.

No. de PQR recepcionadas en el mes	No. de PQR totales	No. de PQR pendiente de respuesta	No. de PQR cerradas
32	100	8	68

Tabla 16. PQR Recepcionadas

Fuente: Autor

Buzón de sugerencias

El 01 de noviembre se instaló el buzón de sugerencias del barrio la Unión se ubicó en la oficina del contratista de obra, la cual se encuentra en dicho barrio se seleccionó este sitio debido a que es un lugar estratégico de fácil ubicación para la comunidad y por recomendación de la veeduría.

De igual forma, se realizó la instalación de buzón de sugerencias del barrio el Rosario se realizó el 01 de noviembre de 2023, en un local comercial el cual se encuentra ubicado en un lugar estratégico para mayor ubicación de la comunidad

- **Línea de Capacitación**

Los contratistas de obra no se han realizado jornadas de capacitación en educación sanitaria. Una vez se inicie la actividad 3 se comenzará a desarrollar las diferentes jornadas de capacitación según lo estipulado en el Pan de Gestión Social. NO APLICA

- **Capacitación Casa a Casa**

Una vez se inicie la etapa de ejecución se comenzará a desarrollar esta actividad. NO APLICA

2.3.2 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo - SST

Subprograma seguridad industrial

Actividades

Cumplir y hacer cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Cumplir y hacer cumplir al contratista los protocolos de bioseguridad.

Actividades realizadas enfocadas en prevención

- ***Entrega de elementos de protección personal***

A la hora de combatir los riesgos de accidentes y perjuicios para la salud, es necesario utilizar la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar riesgo en su origen o proteger a los empleados mediante las disposiciones de protección colectiva.

Cuando las medidas son insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección personal (EEP), con el fin de prevenir los riesgos laborales. Desde el punto de vista técnico, los EPP actúan disminuyendo algunos de los componentes factoriales de riesgo.

Por lo anterior, el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, durante el mes de noviembre de 2023 ha suministrado a los trabajadores que hacen parte de la Actividad 2 en el momento de su vinculación laboral y/o antes de su ingreso al puesto de trabajo asignado los elementos de protección personal requeridos para la labor a efectuar en este caso la fase de diagnósticos.

- ***Accidentalidad en obra***

Durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2023, el contratista no presento ningún accidente de trabajo dentro de sus actividades desarrolladas en el periodo descrito.

- ***Indicadores***

Teniendo en cuenta que durante el periodo del mes de octubre el contratista no presento accidentes de trabajo, los indicadores del IF estuvo en 00, el IS se mantuvo en 0 (cero), el ILI se mantuvo en 0 (cero).

- **Inspecciones realizadas.**

En el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se realizó inspecciones en obra, pues durante el periodo no se efectuaron actividades constructivas.

IDENTIFICACION Y FACTORES DE RIESGO

La interventoría verificó que dentro de la matriz de riesgos suministrada dentro del plan de calidad y durante el periodo del 01 de noviembre al 31 de noviembre de 2023 no ha sido modificada ni se ha incluido valor o dato alguno por el contratista y por ende esta interventoría continua con el seguimiento y revisión para identificar si se presenta algún cambio.

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

Teniendo en cuenta que el contratista no ha iniciado desarrollado la actividad No. 3 por el momento no se presenta accidentalidad dentro del CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL, lo cual indica que el índice de accidentalidad durante este periodo es cero. Ahora bien, dentro del periodo específicamente en la Actividad 1 y 2 no se han generado accidentes laborales.

AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta planillas y pagos de aportes a la seguridad social ante esta interventoría.

RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se describe el personal que labora con el Consorcio Grupo Empresarial durante este periodo.

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Eifer Yesid	Ruiz Aponte	1049373139	Residente de Obra
Aníbal José	Ruiz Avilez	1066182660	Profesional técnico de diagnósticos
Alicia Patricia	Vergara Tuiran	1100692892	Inspector de obra
Ángel Yesid	Avendaño Barón	1049373887	Inspector de obra
Juan David	Torres Dávila	1076335432	Inspector de obra

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Pablo Alejandro	Viancha Saavedra	1014284788	Inspector de obra
Diana Marcela	Payares Flerez	1045729630	Profesional social
Saddy Sofia	Beltrán García	1100693213	Profesional social

Tabla 17. Personal Administrativo Contratista de Obra

Fuente: Autor

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Eifer Yesid	Ruiz Aponte	1049373139	Residente de Obra
Aníbal José	Ruiz Avilez	1066182660	Profesional técnico de diagnósticos
Alicia Patricia	Vergara Tuiran	1100692892	Inspector de obra
Ángel Yesid	Avendaño Barón	1049373887	Inspector de obra
Juan David	Torres Dávila	1076335432	Inspector de obra
Pablo Alejandro	Viancha Saavedra	1014284788	Inspector de obra
Diana Marcela	Payares Flerez	1045729630	Profesional social
Jhonatan Greydin	López Roa	1006879121	Almacenista

Tabla 18. Personal operativo contratista de obra

Fuente: C&E Engineering SAS

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Oscar Mauricio	Almario Fernández	1077862072	Director de interventoría y Profesional de Costos y Presupuestos
Fabio Alberto	Osorio Osorio	10818160222	Residente interventoría
Jairo	Palacio		Inspector Interventoría
Candelaria	Gonzales Medina	26883989	Profesional Social
David Leonardo	Rozo Gasca	1121199334	Especialista Estructural
Jorge Luis	Salaiman Lamadrid	79.214.426	Especialista Hidrosanitario
Cristian David	Galvis Najar	1.049.630.656	Especialista HSEQ
Víctor Luis	Murillo Ramírez	1.076.385.068	Inspector de Interventoría

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Jairo Cornelio	Palacios Fuelagan	1.085.908.492	Inspector de Interventoría
Cristian Alejandro	Otalora Castillo	1.051.240.481	Técnico PGIO
Duvan Felipe	Mosquera Mosquera	1.007.448.719	Técnico PGIO

Tabla 19. Personal administrativo y operativo de Interventoría en sitio
Fuente: C&E Engineering SAS

MANEJO DE MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTA MENOR Y/O PAPELERIA

Para realizar la actividad de diagnósticos, se utilizaron las siguientes herramientas menores: cinta métrica, lápices, lapiceros, hojas de papel, computadores, impresora y escáner.

2.3.3 Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de acción socio - ambiental - PASAO y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Rio Iró realizado actividades y gestiones en el mes de noviembre del 2023 con el fin al plan de manejo ambiental.

Medidas de Manejo

- El contratista hasta el momento no ha entregado certificado por parte de algún operador o alcaldía para el acopio de los escombros y residuos sólidos, la interventoría realizara seguimiento a la entrega de este documento una vez se dé inicio a la actividad No. 3 (Obra)

- Gestión de residuos:
  Los residuos ordinarios deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra, Todos los residuos no reciclables como empaques de mecato, papel carbón, servilletas, equipo de protección personal usado, y residuos orgánicos como restos de comida, serán entregados al carro recolector de residuos del municipio.



Figura 3. Punto Ecológico
Autor: Autor

- La interventoría verificará que el contratista lleve a las personas o empresas que están interesadas en recibir materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que éstas se encarguen de su recolección semanal, transporte y gestión.

La interventoría verificará que el contratista cuente con una cuadrilla de limpieza del proyecto dotada de utensilios como palas escobas, y tendrán bajo su responsabilidad mantener los sitios de la obra en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho. Lo anterior aplicara una vez se cuente con la ejecución de actividades constructivas.

Medidas de Manejo Para Demarcación y aislamiento

La interventoría verificará y comprobará una vez se dé inicio a la actividad No. 3 que el contratista esté cumpliendo con las medidas descritas a continuación

- Los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se estén almacenando en la bodega, en forma separada, identificándolos y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.

- El material lo estén acopiando de tal manera que no se contamine o mezcle y que a cada frente de trabajo sea transportado con los materiales necesarios durante la jornada diaria, evitando así la acumulación de materiales.
- Los materiales deberán permanecer tanto en su sitio de almacenamiento, como en el frente de trabajo, debidamente cubiertos con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.

Actividades de capacitación y divulgación

La interventoría solicitara al contratista una vez se dé inicio a la actividad No. 3 realizar capacitaciones a su personal de trabajo con el fin de divulgar y dar a conocer cómo se implementara el plan de manejo ambiental tanto en obra como en las instalaciones de la oficina.

Manejo de residuos sólidos diferentes a RCD

La limpieza general del área administrativa se deberá realizar cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.

Los residuos sólidos generados en la oficina, deberán ser depositados en las canecas ubicadas para tal fin, como se detalla en la Figura 3. Punto Ecológico.

ANEXOS

NOTA ACLARATORIA; Se aclara que todos los anexos que cuentan con separador y documento que señala NO APLICA, se debe a que durante el periodo no se ejecutaron actividades u obras que hacen parte de la Etapa u actividad de Obra, pues al no contarse con actividades en obra, no se cuenta con anexos correspondientes. Por lo anterior, se aclara que una vez se cuente con actividades en obra, se procederá a anexar los documentos o insumos que apliquen al periodo.



El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, Min Vivienda, ENTerritorio, realizo recorrido de barrio en los cuatro barrios del Municipio de Rio Iro, viendo las novedades que se han presentado en viviendas específicas de los diferentes barrios.



En las oficinas del contratista de obra se recibe a la comunidad, aclarando y despejando sus inquietudes respecto al proyecto



Visita de socialización casa a casa a los potenciales beneficiarios para explicar la construcción de las unidades sanitarias y concertar el lugar de la posible intervención en sus viviendas.



Acopio de materiales pétreos por parte del contratista



Acopio de cerámica en bodega.



Realización de visitas casa a casa del proceso de inclusión en el barrio La Unión, actividad cuenta con el acompañamiento de interventoría.

 Realización de lavaderos	 Recorrido de barrio con el supervisor técnico delegado por parte PDA para la supervisión del proyecto, contratista de obra e interventoría
 Divulgación de la oferta de empleo, instalación de cartelera y entrega de volantes	 Recorrido de barrio con los Actores del Proyecto
 Instalación del buzón de sugerencias en el barrio la Unión	 Actividad de visitas casa a casa para la realización de diagnósticos en el barrio El Rosario

 Instalación del buzón de sugerencias en el barrio el Rosario	 Visita técnica a los potenciales beneficiarios para explicar la posible construcción de las unidades sanitarias
 Socializaciones casa a casa en el barrio el Rosario, con el acompañamiento del secretario de planeación y social de ESP	 Instalación de carteleras para la divulgación de la oferta de empleo

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Informe ejecutivo del proyecto

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-08**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	Y EL	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
ALCANCE	EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE RIO IRÓ				
LOCALIZACIÓN	RIO IRÓ - CHOCÓ				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2230219	CONTRATO No.:	2230223
CONTRATISTA:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
PLAZO INICIAL (En meses)	7,5 MESES	PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE AGOSTO DE 2023
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIO:	N/A	*FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	08 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 DE MARZO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7,5 MESES	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7 MESES
VALOR INICIAL :	$ 396.843.968,13	VALOR INICIAL :	$ 4.164.944.717,87
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00	VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR REDUCCION(ES):	$ 0,00	VALOR REDUCCION(ES):	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 396.843.968,13	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.164.944.717,87
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 396.843.968,13	VALOR POR PAGAR:	$ 4.164.944.717,87

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AMPARO(S)	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/09/2023	24/04/2023	12/12/2024	$ 119.053.191,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2027	$ 39.684.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/09/2023	11/04/2024	11/04/207	$ 119.053.191,00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/09/2023	24/08/2023	11/04/2024	$ 290.000.000,00

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/09/2023	24/08/2023	24/11/2024	$ 1.249.483.415,36
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/09/2023	24/08/2023	24/11/2024	$ 805.225.665,88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/09/2023	26/03/2024	27/03/2025	$ 416.494.471,79
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/09/2023	24/08/2023	27/03/2027	$ 208.247.235,89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/09/2023	26/03/2024	27/03/2027	$ 1.249.483.415,36
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 832.988.943,57
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 832.988.943,57
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471,79
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471,79
GASTOS MEDICOS	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471,79
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471,79
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/09/2023	24/08/2023	26/03/2024	$ 416.494.471,79

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N/A	N/A	N/A

CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>


ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	%	VALOR AMORTIZADO	%	PENDIENTE POR AMORTIZAR	%
$ 805.225.665,88	20	0	0	$ 805.225.665,88	20

PAGOS POR AVANCE o HITOS

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N/A	N/A	N/A

4. CURVA "S"

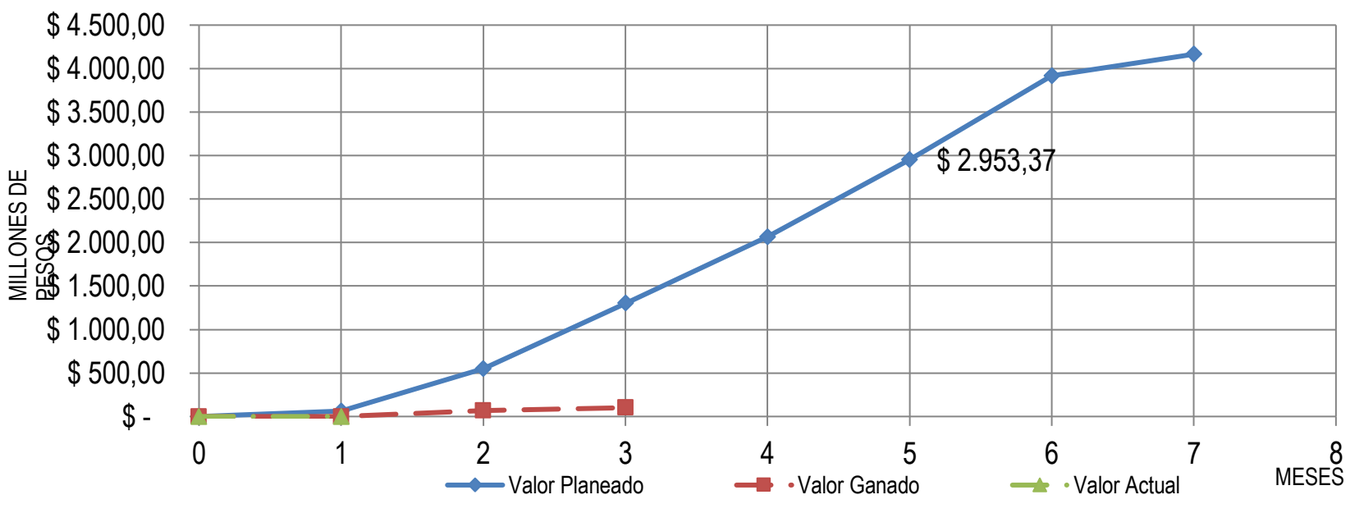

PV (Valor Planeado)	$	1.302
EV (Valor Ganado)	$	101
SV (Variación del Cronograma)	-$	1.201
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)		0,08
Avance Financiero	$	101
Pendiente por cancelar	$	-
Índice de avance financiero		100,00%

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):

Valor acumulado conforme a la programación vigente.

VALOR GANADO:

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

AVANCE FINANCIERO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

DURANTE EL PERIODO SE REALIZA LABORES DE LA ACTIVIDAD No. 2 CONCERNIENTES A LOS DIAGNÓSTICOS Y CONCERTACIÓN VIVIENDA A VIVIENDA LOGRANDO ADELANTAR ENCUESTAS EN 4 DE LOS 4 BARRIOS QUE SE TIENEN PREVISTOS. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CULMINANDO LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS Y RECEPCIONANDO PQR PARA LA INCLUSION DE NUEVAS INTERVENCIONES; CABE SEÑALAR QUE EL SEGUIMIENTO QUE SE VIENE ADELANTANDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE EFECTUA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO (PLAN DE CONTINGENCIA) PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. PARA EL CASO DE LA ACTIVIDAD No. 3 SE CUENTA CON UN ATRASO DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS, PUES A LA CORET DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA INICIADO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN OBRA, DEBIDO A QUE AL NO CONTARSE CON EL AVAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA REALIZAR CAMBIO DE METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN, SE PRESENTÓ UN ATRASO EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE CEMENTO Y GARANTIZAR LA RESISTECIA DE LOS MISMOS.CABE SEÑALAR QUE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE HA EFECTUADO LA REVISIÓN DE LA FABRICACIÓN DE LOS BLOQUES DE CEMENTO Y SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA DE OBRA ATENDER A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE ESTOS ELEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN OBRA.

DURANTE EL PERIODO SE REALIZA VISITA AL MUNICIPIO DE RIO IRÓ POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ENTERRITORIO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA CON EL FIN DE VALIDAR AVANCES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ASÍ MISMO SE REALIZAN VISITAS A ALGUNAS VIVIENDAS QUE SERÁN INTERVENIDAS.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A LA FECHA NO SE HA ADELANTADO TRAMITE DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y/O MAYORES Y MENORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

ES IMPORTANTE QUE SE TENGA PRESENTE QUE DURANTE EL PERIODO SOLO FUE POSIBLE ADELANTAR ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SOLO HASTA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2023 FUE POSIBLE CONTAR CON LA APERTURA DEL PUENTE VEHICULAR Y SOLO HASTA EL DÍA 30 DE OCTUBRE FUE POSIBLE CONTAR CON ACCESO VEHICULAR, Y POR ENDE ACCESO A METERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL QUE SE REQUERIA PARA LA ACTIVIDAD No. 3; POR TAL MOTIVO ES IMPORTANTE Y RECOMENDABLE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE VALIDE ESTOS TIEMPOS QUE SE PERDIERON POR SITUACIONES AJENAS A LOS CONTRATISTAS, LOS CUALES VAN A SER REQUERIDOS UNA VEZ SE EVIDENCIE QUE EL TIEMPO NO ES SUFICIENTE PARA CULMINAR EL PROYECTO. POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA Y PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, SIN EMBARGO COMO YA SE HA MENCIONADO EL ATRASO A LA FECHA ES CONSIDERABLE Y PREOCUPANTE PARA EL PROYECTO.

Durante el periodo (29 y 30 de noviembre de 2023) se presentan situaciones de orden publico e inseguridad para el personal del contratista de obra e interventoría, pues en el periodo se reciben panfletos con amenazas al contratista de obra e interventoría, situación que conllevó a las partes a retirar el personal del Municipio a fin de garantziar la seguridad del personal hasta tanto se brinde la seguridad suficiente. Cabe señalar que esta situación es informada a la Entidad Contratante a fin de que sea informado al Ministerio de Vivienda y se cuente con la trazabilidad correspondiente.

FIRMA DIRECTOR INTERVENTORÍA
Nombre Director de Interventoría: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Documento Director de Interventoría: 1.077.862.072

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Acta parcial y balance presupuestal

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Actas de inicio del proyecto

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

CONTRATO	2230219
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
LINEA DE NEGOCIO	ORDEN DE SERVICIO No. 2230219 (INTERVENTORÍA), DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO No. ICM-009-2023. LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE RIO IRÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	El alcance de LA INTERVENTORÍA para la orden de servicio es el seguimiento, control y la vigilancia de la ejecución a las acciones realizadas por el contratista de obra en el Municipio de Rio Iró, en el Departamento de Chocó, según lo que se detalla en el contrato de obra y sus anexos, los cuales se resumen a continuación: 1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. 2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3.
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 396.843,968,13)
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
CONTRATISTA:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
PLAZO:	SIETE (7) MESES Y MEDIO

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías: 21-45-101415928 Y 21-40-101214825 (Seguros del Estado)

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
21-45-101415928	14/07/2023	CUMPLIMIENTO	Desde 14/07/2023 hasta 01/11/2024	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 119.053.191,00
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Desde 14/07/2023 hasta 01/03/2027			$ 39.684.397,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 01/03/2024 hasta 01/03/2027			$ 119.053.191,00
21-40-101214825	14/07/2023	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 14/07/2023 hasta 01/03/2024	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 290.000.000,00
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES				$ 290.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL				$ 290.000.000,00
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS				$ 290.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				$ 290.000.000,00
		RESPONSABILIDA CIVIL CRUZADA				$ 290.000.000,00

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ORDEN DE SERVICIO el día 24 del mes agosto del año 2023, el cual debe concluir el día 08 de Abril del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
NOMBRE: MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO **SUPERVISOR** **ENTerritorio**	**NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO F.** **REPRESENTANTE LEGAL** **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS** **INTERVENTORIA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por el Supervisor	2023220033351 del 24 de agosto de 2023
2	Aprobación de Personal	Radicado por el Supervisor	0232200118801 del 01 de agosto de 2023
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

eterritorio	**ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS**	CÓDIGO:	**F-GG-56**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-26**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO	2230223
TIPO DE CONTRATO	OBRA
LINEA DE NEGOCIO	QUINTA ORDEN DE TRABAJO (ORDEN DE TRABAJO No. 2230223 - OBRA), DEL INSTRUMENTO COMERCIAL MARCO No. ICM-005-2023. LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE RIO IRÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ALCANCE	En el marco de la Quinta Orden de Trabajo se desarrollarán en el Municipio de Rio Iró, en el Departamento de Chocó las siguientes actividades: 1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10. 2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 y 3. El alcance contempla los componentes señalados en el DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA NECESIDAD del proceso de selección ICM-005-2023.
VALOR:	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.164.944.717,87) M/CTE
CONTRATANTE	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
PLAZO:	SIETE (7) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

Garantías: 96-45-1010-81330 Y 96-40-101064649 (Seguros del Estado)

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
96-45-1010-81330	10/08/2023	CUMPLIMIENTO	Desde 27/07/2023 hasta 27/10/2024	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 1.249.483.415,36
		BUEN MANEJO DE ANTICIPO				$ 805.225.665,88
		PRESTACIONES SOCIALES	Desde 27/07/2023 hasta 27/02/2027			$ 208.247.235,89
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Desde 27/02/2024 hasta 27/02/2025			$ 416.494.471,79
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Desde 27/02/2024 hasta 27/02/2027			$ 1.249.483.415,36
96-40-101064649	11/08/2023	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 27/07/2023 hasta 27/02/2024	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio	$ 832.988.943,57
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES				$ 832.988.943,57
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL				$ 416.494.471,79
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				$ 416.494.471,79
		RESPONSABILIDA CIVIL CRUZADA				$ 416.494.471,79
		GASTOS MEDICOS				$ 416.494.471,79
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	Desde 09/08/2023 hasta 27/02/2024			$ 416.494.471,79

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ORDEN DE TRABAJO el día 24 del mes agosto del año 2023, el cual debe concluir el día 24 del mes Marzo del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	**Firma**
NOMBRE: OSCAR MAURICIO ALMARIO F. **REPRESENTANTE LEGAL** **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS** **INTERVENTORIA**	**NOMBRE: JOSE LUIS RADA RAYO** **REPRESENTANTE LEGAL** **CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL** **CONTRATISTA**

Nota Generales:

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

N°	COMPONENTE	ESTADO / OBSERVACIÓN	RADICADO
1	Concepto productos etapa previa	Radicado por interventoría	20234300278022 del 24 del agosto de 2023
2	Aprobación de Personal	Radicado Por Interventoría	20234300278152 del 24 de agosto de 2023.
3	Permisos y licencias: • Construcción • Ambientales • Disponibilidad servicios públicos • Otros que apliquen: _____		

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

SALVEDAD DEL CONTRATISTA AL ACTA DE OBRA:
Se firma el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 2230223 para iniciar las actividades 1 y 2 correspondientes a:
••Actividad 1: Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
••Actividad 2: Diagnóstico, concertación y plan de intervención.
Si a los treinta (30) días de iniciado el Contrato de Obra No. 2230223, el puente del Corregimiento de La Encharcazon que atraviesa el Rio Iro no se encuentra en operación; el CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL manifiesta que de ser así, se imposibilita el suministro de materiales para el inicio de la Actividad 3 "Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias acta de entrega y recibo de las obras", por lo cual, se deberá proceder a dar la suspensión del Contrato de Obra No. 2230223.

JOSE LUIS RADA RAYO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

OBSERVACIONES Y SALVEDADES DE LA INTERVENTORÍA:
La Interventoría se regirá de acuerdo a a las disposiciones y/o acuerdos y/o condiciones establecidas en la Orden de Trabajo No. 2230223 y/o documento de caracterización y/o Análisis o Matriz de Riesgos, Especificaciones Técnicas, y demás requisitos establecidos en el Proceso de selección No. ICM-005-2023 y demás documentos que hagan parte de la Orden de trabajo o proceso de selección y /o normatividad vigente aplicable al proyecto. Así mismo efectuará el respectivo seguimiento y control a la orden de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio No. 2230219 y/o Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio y/o normatividad vigente aplicable.

OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C&E ENGINEERING SAS

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Actas de concertación

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Angelino Rodriguez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11937712 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Real, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830830000083700., identificado con el código No. CH-RI-LR -M 9 -VE-055 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 13 mes octubre del año 2023.

José Angelino R.
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Rodriguez
C.C. 11937712.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Erler Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Carlos Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 8826 788 de San Pablo con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 4026, identificado con el código No. CH-RI-20 -M3 -VE-040 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 24 mes 10 del año 2023.

Carlos Perea Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Carlos Perea M
C.C. 8826 788

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Efer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ana Patricia Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 32142279 de Medellín con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 530-830000 19216, identificado con el código No. CH-RI-LU -M3 -VE-075 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 23 mes 10 del año 2023.

Ana Patricia H M.
NOMBRE BENEFICIARIO: Ana Patricia H
C.C. 32142279.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Efer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Maria Nales Mosquera Hurtado identificado con cédula de ciudadania No 43520261 de Medellin con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Union, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3983, identificado con el código No. CH-RI-20 -M3 -VE-076 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 24 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Maria Nalis M
C.C. 43520261

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Hobes Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Doralina Mosquera Hurtado identificado con cédula de ciudadanía No 1030420002 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3988, identificado con el código No. CH-RI-10 -M3 -VE-077 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 23 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Doralina M
C.C. 1030 420 002

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Cifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ana Dolores Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030420764 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 0000 6300, identificado con el código No. CH-RI-LU -M5 -VE- 070 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 18 mes 10 del año 2023.

ANA DOLORES MOSQUERA
NOMBRE BENEFICIARIO: Ana Dolores M
C.C. 1030 420 764

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz B

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Horacio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Martha Elenis Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 1030420760 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003963; identificado con el código No. CH-RI-U -M 6 -VE-049 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 18 mes octubre del año 2023:

Martha Elenis Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Martha Mosquera.
C.C. 1030420760

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Erfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Hogio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Carmen Leonilda Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1133699020 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3959, identificado con el código No. CH-RI-10 -M6 -VE-050 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 24 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Carmen Leonilda M
C.C. 1133699020

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Juvo Palumos.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Jorge Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ensa Bolivar Perea Hurtado. identificado con cédula de ciudadanía No 43.103.496 de Bello con domicilio en la ciudad de Rio Pro en el barrio la UNIÓN, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000393O, identificado con el código No. CH-RI-10 -M 6 -VE-056 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 23 mes 10 del año 2023.

EnsaBolivar P.H
NOMBRE BENEFICIARIO: Ensa Perea
C.C. 43.103.496

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Juvo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Armando Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1590262 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005- 0000 3800, identificado con el código No. CH-RI- LU -M 7 -VE- 066, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 20 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Armando Hurtado
C.C. 1590262.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL ROJAS A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: JAIRO PALOMO

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Erfer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Berto Moreno Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 11936936 de Candelaria con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3810, identificado con el código No. CH-RI-4U -M 7 -VE-0167 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 24 mes 10 del año 2023.

Berto Hurtado

NOMBRE BENEFICIARIO: Berto Moreno H
C.C. 11936936

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Edier Yesid Ruiz D.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Oner Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 82384093 de Condoto con domicilio en la ciudad de Bio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000008980, identificado con el código No. CH-RI-ER -M2 -VE-015, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Oner M.
C.C. 82384093.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Exber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Valentina Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26320220 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000081C, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 2 -VE-073 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Valentina M.
C.C. 26320228

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elder Yesid Ruiz D.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Abelina Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.320.229 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Pro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002630, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 2 -VE-080 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María M.
C.C. 26.320.229

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Alzate

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Eris Sanchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 82.360.217 de Tado con domicilio en la ciudad de Rio iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002640, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 2 -VE-082 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

José Eris Sanchez
NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Sanchez
C.C. 82.360.217

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Marina Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26 320 143 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004 - 00002670, identificado con el código No. CH-RI-ER-MZ -VE-056, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Marina
C.C. 26 320 143.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiker Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ciris Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26320207 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección UOS-0000 3400, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 2 -VE- 093, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Maria Ciris P
C.C. 26320207

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María De los Santos Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26320265 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3450, identificado con el código No. CH-RI- ER -MZ -VE- 103, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María De los Santos
C.C. 26 320 265.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Erika Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Gildardo Antonio Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4829940 de Condoto con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3530, identificado con el código No. CH-RI- ER -MZ -VE- 111, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

Gildardo

NOMBRE BENEFICIARIO: Gildardo Antonio P.
C.C. 4829940

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esther Yesica Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Silveria Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 26.317.013 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio iRO en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00000880, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 3 -VE-069, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

Silveria Perea
NOMBRE BENEFICIARIO María Perea
C.C. 26.317.013

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Juro palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eder Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Robinson Ramirez Hurtado identificado con cédula de ciudadanía No 1.017.123.028 de Medellin con domicilio en la ciudad de Rio Pio en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00000840, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 3 -VE-071, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

Robinson Ramirez
NOMBRE BENEFICIARIO Robinson Ramirez
C.C. 1.017.123.028

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elder Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Ospina

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Juan Antonio Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 7133068 de Puerto Boyacá con domicilio en la ciudad de Bolívar en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 1120, identificado con el código No. CH-RI-6R-M3 -VE- 097, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Juan Perea P.
C.C. 7.133.068

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Pulido.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Tilson Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 11995101 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000 12940, identificado con el código No. CH-RI- ER-M 3 -VE- 083, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 29 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Tilson M
C.C. 11995101

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Mailyn Patricia Mosquera Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía No 1076816694 de Bolivar con domicilio en la ciudad de Bolivar en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002 - 0000 0610, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4 -VE-045, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

Maylin patricia Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Mailyn Patricia
C.C. 1076816694

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palmisol

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Juan Socorro Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.865.081 de Tado con domicilio en la ciudad de Pioipo en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000590, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4 -VE-047, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Juan Perea M
C.C. 4.865.081

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Baos

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Antonia Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.319.702 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000580, identificado con el código No. CH-RI-ER-M4 -VE-058 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO María Mosquera
C.C. 26.319.702

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Edwer Residente Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito José Nimio Mosquera Copete. identificado con cédula de ciudadanía No 1190511 de Tado. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000530; identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE-061, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: José Mosquera
C.C. 1190511

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Miguelina Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 26320246 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830830000013760, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE- 065 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Miguelina Perea.
C.C. 26320246

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiter Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Crispin Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 18508666 de Dosquebradas con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000460, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE-066, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Crispin Mosquera
C.C. 18508666

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito José Bianney Mosqueva Perea identificado con cédula de ciudadanía No 11637005 de Istmina con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000013820, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE-068, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Bianney M
C.C. 11637005.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ermelina Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 35.880.075 de Río Pío con domicilio en la ciudad de Río Pío en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300001340 identificado con el código No. CH-RI-ER-M 5 -VE-036 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María M
C.C. 35.880.075

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palumo

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz D

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Aulio Antonio Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4827723 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300013490, identificado con el código No. CH-RI- -M -VE-, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Aulio Mosquera
C.C. 4827723

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: AMBAR RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Clementina Mosquera Ibargüen identificado con cédula de ciudadanía No 54230009 de Tado con domicilio en la ciudad de Bio Bio en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000660, identificado con el código No. CH-RI-ER -M5 -VE-040, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Clementina
C.C. 54230009

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiler Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ana Martina Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26391729 de Tado con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-000006SO, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 5 -VE-042. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Ana Mosquera
C.C. 26391729.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yerid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Ocampo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Balbino Mosquera Ibarguen identificado con cédula de ciudadanía No 1190507 de Tado. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-000000630, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 5 -VE-043. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Mosquera
C.C. 1190507

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ebilia Perea Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No 26320251 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 1190, identificado con el código No. CH-RI-EB-M 6 -VE- 028, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Ebilia Perea R
C.C. 26320251

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Valerio Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 4-827-949. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario. , en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000770. , identificado con el código No. CH-RI-ER-M 6 -VE-032. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre. del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Valerio Mosquera.
C.C. 4.827949.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: AMBAR RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Abadía

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Yasiris Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 35820952 de Tado. con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00000760, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 6 -VE-033, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Mosquera
C.C. 3582095-2

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Deysi Rodríguez Córdoba identificado con cédula de ciudadanía No 43901796 de Bello con domicilio en la ciudad de Bello en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 1394, identificado con el código No. CH-RI-ER -M7 -VE-005, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

DEYSI
NOMBRE BENEFICIARIO: Deysi Rodríguez
C.C. 43901796

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacio

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Acosta

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Eulogia Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 35586252. de Tado. con domicilio en la ciudad de Bojaó. en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 1380., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 7 -VE-009. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes octubre. del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Eulogia Mosquera.
C.C. 35 586 252

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esther Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Rubis Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1030420762 de Bello con domicilio en la ciudad de Bello en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001350, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 7 -VE-013, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

María Rubis M.
NOMBRE BENEFICIARIO: María Rubis M.
C.C. 1030420762.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esther Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Heriberto Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 10.160.338 de La Dorada con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (+) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001280, identificado con el código No. CH-RI-ER -M7 -VE-022 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes octubre del año 2023.

Eriberto Perea

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Perea
C.C. 10.160.388

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz D

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Carmen Gloria Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 1030421017 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 000 12610, identificado con el código No. CH-RI-EB -M7 -VE-023, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

Carmen Gloria
NOMBRE BENEFICIARIO: Carmen Gloria P
C.C. 1030421017

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Segundo Maria Perea Perea. identificado con cédula de ciudadania No 4-827946- de Condoto- con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario-, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001210-, identificado con el código No. CH-RI-ER-M7-VE-027, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre- del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Segundo Perea.
C.C. 4-827-946.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jesus Domingo Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1199503 de Rio Iro con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830 830000091170, identificado con el código No. CH-RI- ER -M 8 -VE- 002, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Mosquera
C.C. 1199503

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elkin Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Baudilia Sánchez Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 35851049 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Río Iró. en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X). o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00002462., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 8 -VE-04, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Sánchez.
C.C. 35851049.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eyder Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Digno Antonio Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 14.451.028. de Argelia. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X). o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002500., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 8 -VE- 008 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes Octubre. del año 2023.

Digno Antonio
NOMBRE BENEFICIARIO: Digno Mosquera.
C.C. 14.451.028

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiller Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Melitina Sanchez De Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26319845 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3360, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 9 -VE- 096 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Melitina Sánchez
C.C. 26319845

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osaio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Martha Isabel Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030420968 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 3322, identificado con el código No. CH-RI- ER -M 9 -VE- 100, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

Martha Isabel M
NOMBRE BENEFICIARIO: Martha Isabel M
C.C. 1030420968

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Ruben Dario Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 11936726 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003 - 00000 332, identificado con el código No. CH-RI- ER -M 9 -VE- 102, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

RUBEN D M M
NOMBRE BENEFICIARIO: Ruben Dario M
C.C. 11936726

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eder Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Eifania Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26319809 de Condoto con domicilio en la ciudad de Pto Inírida en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830 0000 7840, identificado con el código No. CH-RI- EB -M 9 -VE- 105, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Maria Eifania P
C.C. 26319809

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jesus palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Abaunza

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Yaimer Andres Mosquera Perea. identificado con cédula de ciudadania No 1030421360 de Istmina con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000311O, identificado con el código No. CH-RI-LU-M2-VE-010 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 20 mes Octubre del año 2023.

Yaimer Andres Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Yaimer Mosquera
C.C. 1030421360

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Ocoro

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Frank Perea Agualimpia. identificado con cédula de ciudadanía No 1076820297 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 3551, identificado con el código No. CH-RI-ERM 1 -VE- 108 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre. del año 2023.

Frank Perea A.
NOMBRE BENEFICIARIO: Frank Perea
C.C. 1076820297

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiker Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Ocoro

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Dioselina Perea Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 29091865. de Cali con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003570, identificado con el código No. CH-RI-ER-M1 -VE-113, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Maria Perea
C.C. 29091865

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Euripides Mosquera Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.926. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 3582., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 1 -VE-114, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Mosquera.
C.C. 4.827.926.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Mosquera

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Francisca Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1030421707 de Rio Iró con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000360 1, identificado con el código No. CH-RI-ER-M1 -VE-115, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Mosquera.
C.C. 1030421707.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabián Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose del Carmen Hurtado Aspnlla. identificado con cédula de ciudadanía No 1.590.383 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003610, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 1 -VE- 116. recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Hurtado
C.C. 1- 590.383

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Jorge Alberto Rosero

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Audilia Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26320155 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 001-0000146., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 1 -VE- 117, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes Octubre del año 2023.

Audilia
NOMBRE BENEFICIARIO: Audilia Perea.
C.C. 26320155.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esther Yesica Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Carlino Benitez Hurtado. identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.967. de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003640., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 1 -VE-118, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 26 mes octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Benitez.
C.C. 4.827.967

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Jorge Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Arley Hurtado Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 1030420355 de Tado con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-830000006806., identificado con el código No. CH-RI-ER-M1 -VE-119, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 02 mes Noviembre del año 2023.

x Luis ARLEY H.M.
NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Hurtado
C.C. 1030 420 355

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jaison Hurtado Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 11.995.116 de Rio Pro con domicilio en la ciudad de Rio Pro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002650, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 2 -VE-084 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 28 mes 10 del año 2023.

Jaison Hurtado
NOMBRE BENEFICIARIO: 11.995.116
C.C. Jaison Hurtado

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiver Yerid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Luis Edier Mosquera Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No 1030420431 de Istmina con domicilio en la ciudad de Pio 12o en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003460, identificado con el código No. CH-RI-ER-M2 -VE-106, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes noviembre del año 2023.

Luis Edier mosquera S
NOMBRE BENEFICIARIO: Luis Mosquera
C.C. 1030420431

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jovo pulunol

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Magno Antonio Mosquera Perea. identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.803. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000 3471., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 2 -VE-, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Magno Mosquera.
C.C. 4 827 803.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Juro Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiler Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jorge Elias Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 11938382. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-00003490, identificado con el código No. CH-RI- ER-M 2 -VE-109, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre. del año 2023.

Jorge Elias mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Jorge Mosquera.
C.C. 11938382.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Obando

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Carmen Julia Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 1030420618 de Rio Iro con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio La Unión, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830830000 16960, identificado con el código No. CH-RI-Lu -M 3 -VE-030 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 19 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Carmen Mosquera
C.C. 1030420618

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Arvibe Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palumo.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Cain

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Leonor Sara Perca Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 35.587.735 de Tado con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X), o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00001130, identificado con el código No. CH-RI-ER-M3 -VE-095 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Leonor Perca.
C.C. 35.587.735.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Pulido.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Romulo Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.867 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000110, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 3 -VE-079, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 03 mes noviembre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Mosquera
C.C. 4.827.867

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Esther Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Leonor Sara Mosquera Mosquera. identificado con cédula de ciudadanía No 26320209 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000100, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 3 -VE-081, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Leonor Mosquera.
C.C. 26320209

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palumo

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiler Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osoria

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Lucila Mosquera de Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26319553 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-0000108D., identificado con el código No. CH-RI-ER-M3 -VE-085, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 02 mes Noviembre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: María Mosquera.
C.C. 26319553.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palumo.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Bravo

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Jose Monares Perea Perea identificado con cédula de ciudadanía No 4.827.672 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830 830000 13056, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 3 -VE-089, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 03 mes noviembre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Jose Perea
C.C. 4.827.672.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palumo.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eifer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Francisco Gabriel Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 4.826.277. de Condoto. con domicilio en la ciudad de Riosucio en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000490., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE-063, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre. del año 2023 .

NOMBRE BENEFICIARIO: Francisco Mosquera.
C.C. 4.826.277.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUA A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacio!

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Ernis Perea Mosquera. identificado con cédula de ciudadania No 26320294 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-0000450, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 4 -VE-067, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 27 mes Octubre. del año 2023.

Mariaernis

NOMBRE BENEFICIARIO: María Perea.
C.C. 26320294

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Felipe Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Flor Mary Mosquera Ramirez. identificado con cédula de ciudadanía No 1.030.420.775 de Rio Iro con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 002-00000690, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 5 -VE-038 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Flor Mosquera
C.C. 1.030.420.775

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Julio Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elfer Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Petronio Paufilo Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1.133.699.066 de Rio ino con domicilio en la ciudad de Rio ino en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-00002540, identificado con el código No. CH-RI-ER-M 7 -VE-007 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Petronio Perea.
C.C. 1.133.699.066

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palumo.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Ing. Yeriel Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Tarcy Estela Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 26.318.857 de Condoto con domicilio en la ciudad de Río Pío en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300001 2530, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 7 -VE-019, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

Tarcy Mosquera
NOMBRE BENEFICIARIO: Tarcy Mosquera
C.C. 26.318.857

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Manuel avidio Mosquera Perea identificado con cédula de ciudadanía No 16.214.178 de Cartago con domicilio en la ciudad de Pto Tro. en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 004-0000 2490, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 8 -VE-006, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 25 mes 10 del año 2023.

Manuel avidio
NOMBRE BENEFICIARIO: Manuel avidio.
C.C. 16.214.178

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palomo.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elber Yesid Ruiz D

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Moreno

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito María Yomaira Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadanía No 1133699009 de Río Iró con domicilio en la ciudad de Río Iró en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (x) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 005-0000 3430, identificado con el código No. CH-RI-ER-MZ -VE-099, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 03 mes 11 del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO:
C.C. 1133699009

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Polanco

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabian Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Marcelino Hurtado Asprilla. identificado con cédula de ciudadania No 4.827.692 de Condoto. con domicilio en la ciudad de Rio Iró en el barrio El Rosario., en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300007290., identificado con el código No. CH-RI-ER-M 2 -VE-110, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 09 mes Noviembre del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Marcelino Hurtado.
C.C. 4.827.692.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: Anibal Ruiz A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Sara María Mosquera Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 26.320.162 de Condoto con domicilio en la ciudad de Rio Iro en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 003-00000851, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 3 -VE-070 recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 03 mes NOV del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO: Sara Mosquera.
C.C. 26.320.162

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo Palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Eiffer Yesid Ruiz A

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

enterritorio

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN

El suscrito Glady Perea Mosquera identificado con cédula de ciudadania No 26.320.271 de Condoto con domicilio en la ciudad de Pio Pio en el barrio El Rosario, en su calidad de propietario (✓) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección 830-8300000 7820, identificado con el código No. CH-RI-ER -M 9 -VE-104, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener despejado los espacios para la intervención de su vivienda por parte del PCI (desmontar cubierta, demolición).**
2. **El beneficiario se compromete a NO realizar mejoramiento y/o construcciones en su vivienda durante la intervención del PCI por parte del consorcio Grupo Empresarial.**
3. **El beneficiario se compromete a recibir y mantener bajo custodia los materiales provenientes del contratista de obra Consorcio Grupo Empresarial hasta finalizar la obra, de igual forma los materiales recibidos NO pueden ser utilizados para otra actividad que no se encuentre contemplado en el diagnóstico.**
4. **El beneficiario se compromete a regresar el material restante proveniente del contratista de obra.**
5. **El beneficiario se compromete a recibir, cuidar y mantener las intervenciones realizadas por el contratista de obra, de igual forma firmar el formato de recibido a satisfacción. (PCI 014).**
6. **El beneficiario se compromete a aplicar autocuidado durante la intervención de su vivienda, Asi mismo a NO dejar menores de edad solos en la vivienda.**
7. **El beneficiario se compromete a desmontar el espacio del baño existente y/0 taza campesina, inodoro sin tanqueal momento de recibir la intervención.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día 08 mes Nov del año 2023.

NOMBRE BENEFICIARIO Glady Perea
C.C. 26.320.271

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: ANIBAL RUIZ A.

Vo.Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Jairo palacios

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Elber Yesid Ruiz A.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: Fabio Alberto Osorio

Se anexa registro fotográfico.

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Actas de vecindad del proyecto

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:		2230223		CONVENIO Nº:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	13	10	23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Angelino Rodriguez Mosquera		
DIRECCIÓN	J830-83000008370		
TELÉFONO	3148675929	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3,5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto con pañete y pintada, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Jose Angelino R.
Nombre: Jose Rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11937712

Firma
Nombre: Ejer. Yesid Ruiz Ante.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	24	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carlos Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 4026		
TELÉFONO	320 346 1050	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.6m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto sin pañete, puerta de aluminio en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado presenta grietas, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Carlos Perea Mosquera
Nombre: Carlos Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 8 826 788

Firma mam
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	23	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ana Patricia Hvitado Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830 000 17216		
TELÉFONO	311 347 0742	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.41	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, piso en concreto esmaltado en buen estado , cubierta en láminas de zinc en regular estado.

Firma Ana Patricio H M.
Nombre: Ana Patricia Hvitado Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 32142279

Firma mam
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223			CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	24	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Nalis Mosquera Hurtado		
DIRECCIÓN	005 - 00003983		
TELÉFONO	3233698202	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.5m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	1	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto con pañete y pintada, puerta de aluminio en mal estado, ventana de aluminio con vidrio en regular estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: María Nalis Mosquera Hurtado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 43520261

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223						
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL						
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS						
REGISTRO No.	FECHA 2023 10 23	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Doralina Mosquera Hurtado		
DIRECCIÓN	005 - 00003988		
TELÉFONO	NA	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, ventana de madera en mal estado, puerta de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en buen estado , cubierta en láminas de zinc en regular estado.

Firma

Nombre: María Doralina Mosquera Hurtado
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1030420002

Firma

Nombre: Elfer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:			2230223		CONVENIO Nº:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	18	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ana Dolores Mosquera Mosquera.		
DIRECCIÓN	830-830 0000 6300		
TELÉFONO	312 322 1236	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.7m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso en tierra , cubierta en láminas de zinc en mal estado.

Firma: ANA DOLORES MOSQUERA
Nombre: Ana Dolores Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030420764

Firma:
Nombre: Edier Yesid Ruiz Aponte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabio Alexis Ochoa
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	18 10 23	**ELABORÓ**	Saddy Batran.	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

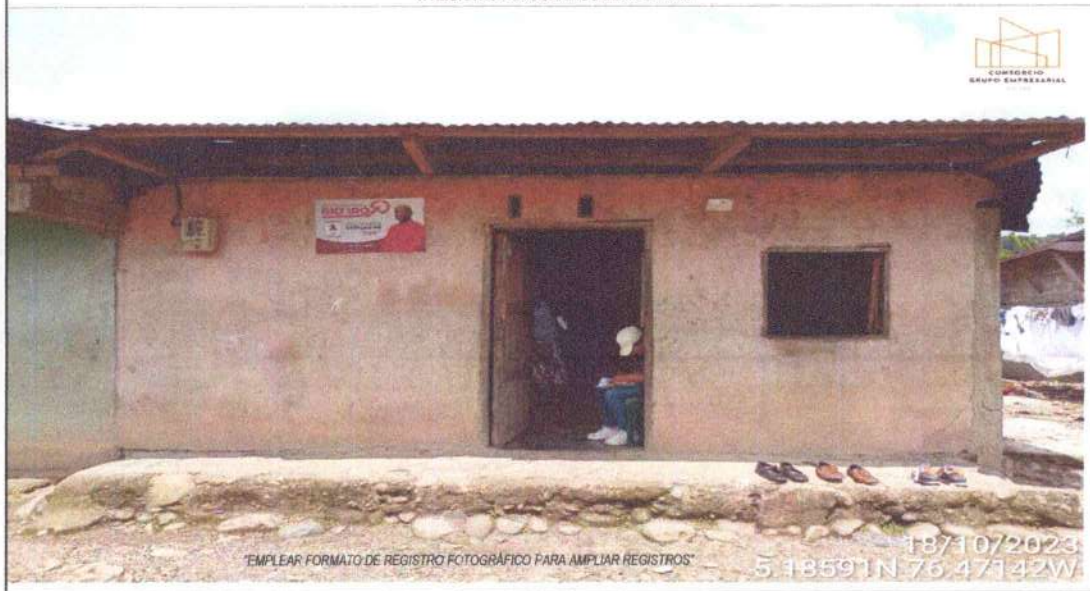

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Martha Elenis Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000396 3		
TELÉFONO	3128409455	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5 40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado en buen estado, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto en regular estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado.

Firma Martha Elenis Mosquera
Nombre: Martha Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030420760.

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	24	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Leonilda Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3959		
TELÉFONO	3215176049	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.2 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto con pañete y pintada, puerta de aluminio en mal estado, ventana de aluminio con vidrio en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma

Nombre: Carmen Leonilda Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1133699020

Firma

Nombre: Efren Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de

OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

INTERVENTOR: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

REGISTRO No. FECHA 2023 10 23 ELABORÓ Diana Reyares F. REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ensa Bolivar Perea Hurtado.		
DIRECCIÓN	005-00003930		
TELÉFONO	3108423638	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.70 mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÀL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en tablón rojo en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma Ensa Bolivar Perea H
Nombre: Ensa Bolivar Perea Hurtado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 43.103.496

Firma
Nombre: Ester Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fredy Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223			CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223													
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL													
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS													
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	20	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ						

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Armando Hurtado Mosquera		
DIRECCIÓN	005-00003800		
TELÉFONO	3219511696	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.6 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	A	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en buen estado , cubierta en láminas de zinc en regular estado.

Firma Armando Hurtado

Nombre: Armando Hurtado Perea

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1590262

Firma mam

Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio


Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 24	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

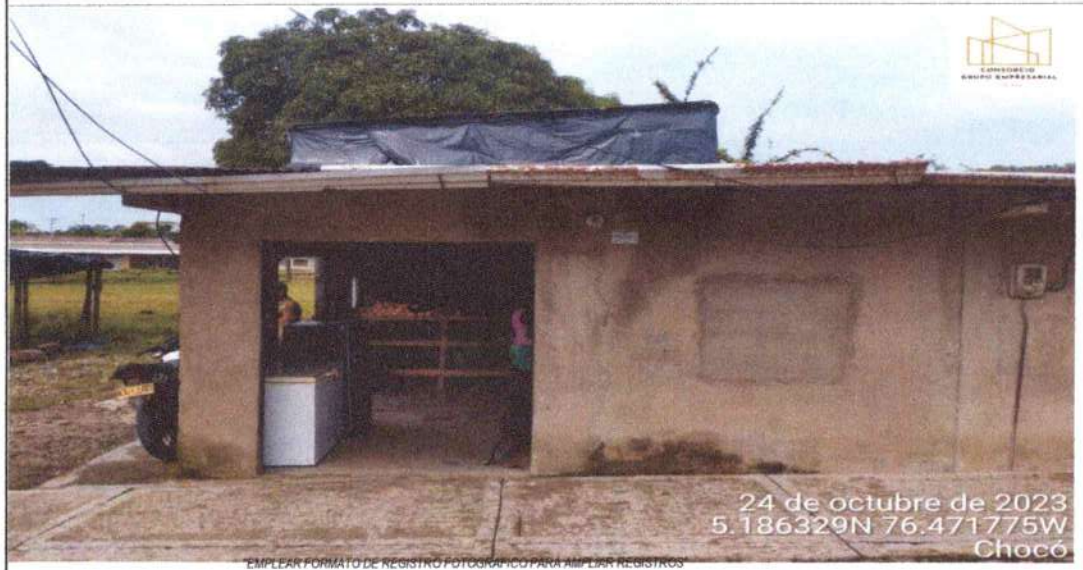

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Berto Moreno Hurtado Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3810		
TELÉFONO	3228154685	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.5 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto con pañete, puerta de aluminio en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma: Berto Hurtado

Nombre: Berto Moreno Hurtado Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 11936 936

Firma: mam

Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Hector Alberto Ocampo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	25	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



COMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Oner Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830 0000 8980		
TELÉFONO	311 794 2574	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5-7m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de metal en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Luis Oner Mosquera Mosquera

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 82384093

Firma

Nombre: Eiber Yosid Ruiz Abonte

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Baio

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	26	ELABORÓ	Angel Arenchino		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Valentina Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003 - 00000810		
TELÉFONO	3208615397	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: VALENTINA MOSQUERA MOSQUERA

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26 320 228

Firma

Nombre: Eiber Yesid Ruiz Aponte

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Bocanegra

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	27	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

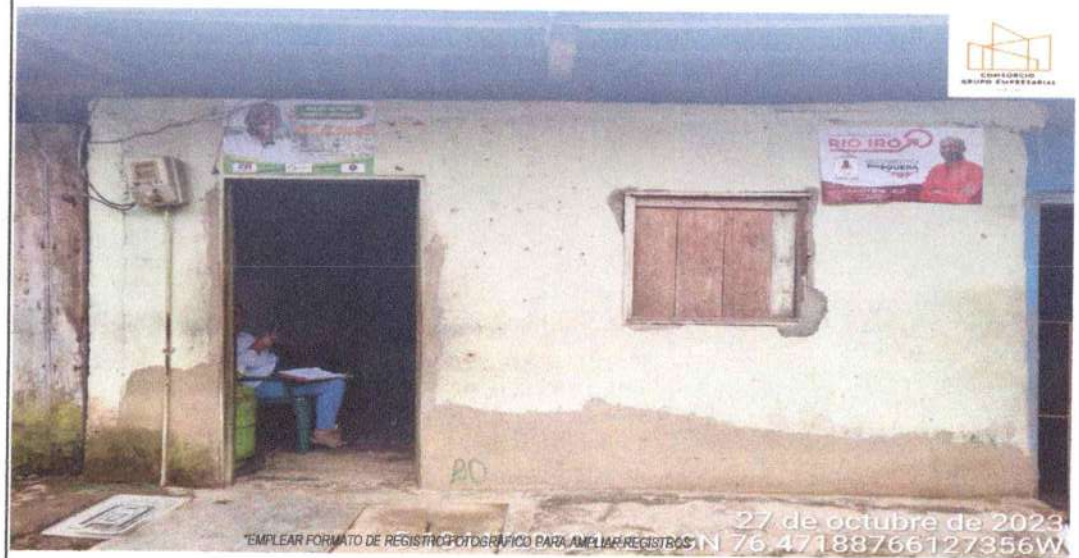

*EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Abelina Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	004-0000 2630		
TELÉFONO	314 580 0812	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto, puerta de aluminio en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma

Nombre: María Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26.320.229

Firma

Nombre: Eiver Yesid Ruiz Aponte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 27	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Eris Sanchez Mosquera		
DIRECCIÓN	0004-0000 2640		
TELÉFONO	320 419 3457	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	360 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto con pañete y pintada, puerta de aluminio en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma José Eris Sanchez
Nombre: Jose Eris Sanchez.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 82.360.217

Firma
Nombre: Elver Hesid Diaz Apaute
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	27	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Marina Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	004-0000 2690		
TELÉFONO	NA	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.4m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma
Nombre: Maria Marina Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320143

Firma
Nombre: Rita Maria Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	28	ELABORÓ	Angel Avendaño		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Ciris Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3400		
TELÉFONO	3128194630	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.8mg	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: María Ciris Perea Mosquera

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26320207

Firma

Nombre: Eiber Yesid Ruiz Aponte.

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Arboleda

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	27	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria De los Santos Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3450		
TELÉFONO	N A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.2m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mampostería de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Maria De los Santos Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26 320 265

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	25	ELABORÓ	Angel Avendaño		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Gildardo Antonio Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	005 – 0000 3530		
TELÉFONO	321 739 7482	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.2m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma Gildardo
Nombre: Gildardo Antonio Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4827940

Firma
Nombre: Yeiber Yesid [illegible] Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alonso [illegible]
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	27	ELABORÓ	Diana Payares F		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Silveria Perea Perea		
DIRECCIÓN	003-000000880		
TELÉFONO	320 5169125	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.30 MTS	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto sin pañete, puerta de aluminio en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma: María Silveria Perea
Nombre: María Silveria Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26.317.013

Firma:
Nombre: Elber Medical Diaz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabio Alberto Bravo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

071

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:	2230223	**CONVENIO Nº:**	222006		Hoja	1	de				
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023 10 26	**ELABORÓ**	Dicinia Payares F			**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Robinson Ramirez Hurtado		
DIRECCIÓN	003-00000840		
TELÉFONO	323 585 6583	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.10 MTS.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria en bloque de concreto sin pañete, puerta de aluminio en regular estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Robinson ramirez
Nombre: Robinson Ramirez.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.017.123.028

Firma
Nombre: Elfer Yesid Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	28	**ELABORÓ**	Angel Buendiña		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan Antonio Perea Perea		
DIRECCIÓN	003 - 0000 1120		
TELÉFONO	321 352 6686	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.9m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma
Nombre: Juan Antonio Perea Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 7133068

Firma
Nombre: Eifer Yesid Ruiz Arcute
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Hiberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 27	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Tilson Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830 000 12940		
TELÉFONO	NA	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.8 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en buen estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Jose Tilson Mosquera Mosquera

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 11945101

Firma

Nombre: Eifer Yesid Rate Aponte

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fredy Alberto Osorio

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023 10 26	**ELABORÓ**	Angel Avendaño		**REVISÓ**				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Mailyn Patricia Mosquera Rodriguez		
DIRECCIÓN	002-0000610		
TELÉFONO	3132794790	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.3 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma Marlin patricia Mosquera
Nombre: Mailyn Patricia Mosquera Rodriguez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1076816694

Firma
Nombre: Eiber Yesid Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Ricardo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

047

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 26	ELABORÓ	Diana Reyes F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Juan Socorro Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000590		
TELÉFONO	310 543 0720	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.20 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto sin pañete, puerta de aluminio en buen estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Juan Socorro Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.865.081

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 26	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria ANTONIA Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000580		
TELÉFONO	3117808584	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.70 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?	N	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida de madera en mal estado, puerta de madera en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de tierra, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma

Nombre: Maria ANTONIA Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26.319.702

Firma

Nombre: Eifer Yesid Apunte R.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fosio Alberto Obando
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

061

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.	FECHA 26 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Nimio Mosquera Copete		
DIRECCIÓN	J062-00000530.		
TELÉFONO	3217169191.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISIÓN - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de azul, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Jose Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1190511

Firma
Nombre: Eiber Yesid Diaz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fasco Alberto Alegria
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	26 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Migueling Perea Perea		
DIRECCIÓN	830-8300013760		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	2.90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puertas y ventanas en madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: Migueling Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320246

Firma
Nombre: Eiler Hesid Ramos Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	2023 10 27	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Crispin Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000460		
TELÉFONO	320 4156439	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.7m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de metal en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Crispin Mosquera

Firma
Nombre: Crispin Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 18508666

Firma
Nombre: Elver Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223												
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL												
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS												
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	27	ELABORÓ	Angel Avendaño		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Branney Mosquera Perea		
DIRECCIÓN	830-830 000 13820		
TELÉFONO	3133208191	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.2m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mampostería de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Jose Branney Mosquera Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11637005

Firma

Nombre: Eiler Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

036

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.	FECHA	2023 10 26	ELABORÓ	Diana Reyares F	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Ermelina Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830000 13440		
TELÉFONO	320 832 6138	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÀL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto sin pañete, puerta de madera en mal estado, ventana de lamina de zinc en mal estado, piso de concreto esmaltado presenta grietas, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: María Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 35.880.075

Firma
Nombre: Eiber Yesid [illegible] Apunte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto [illegible]
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

039.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.	FECHA 26 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Aulio Antonio Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830 83000013490		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	S.O.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÀL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: Aulio Antonio Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4827723

Firma
Nombre: Elfer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alonso Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	25	ELABORÓ	Angel Avendaño		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria clementina Mosquera Ibargüen		
DIRECCIÓN	002-00000660		
TELÉFONO	3107237904	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.3 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Maria clementina Mosquera Ibargüen

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 54230009

Firma

Nombre: Esther Yesid Ruiz Aponte

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Bonilla

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.	FECHA	26 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ana Martina Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000650		
TELÉFONO	3137989837	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado con resanes a la visa, puerta de acero en buen estado, ventanas en vidrio y metálicas con corrosión, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma

Nombre: Ana Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26391729

Firma

Nombre: Elder Yesid Ruiz Apunte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Chacón
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

043

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	26	10	23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Balbino Mosquera Ibargüen		
DIRECCIÓN	002-0000630		
TELÉFONO	3127337567	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: Jose Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1105007

Firma
Nombre: Eyter Mesa Ruiz A. Aponte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	25	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ebilia Perea Ramirez		
DIRECCIÓN	003-0000 1190		
TELÉFONO	3113520323	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.2m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma
Nombre: Ebilia Perea Ramirez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320251

Firma
Nombre: Edder Yesid Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

032.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de				
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	25	10	23	ELABORÓ	Soddy Bertrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Valerio Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00000770.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.60.	ESTRATO	1.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SIN	
ALCANTARILLADO	SIN	
ENERGÍA	SIN	
TELÉFONO	SIN	
GAS	SIN	
TELEVISIÓN - CABLE	SIN	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta y ventana de madera en mal estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta de laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Valerio Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.949.

Firma
Nombre: Exter Yesid Ruiz Apunte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Jorge Alberto Rincón
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

033

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	25 10 23	**ELABORÓ**	Soddy Beltran	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Yasmin Mosquera Pena		
DIRECCIÓN	003-0000760		
TELÉFONO	3225445086	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta de laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Maria Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 35820952

Firma
Nombre: Elder Yesid Ruiz Apoute
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabian Alberto Tobaco
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:			2230223		CONVENIO Nº:	222006			Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223												
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL												
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS												
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	25	ELABORÓ	Angel Avendaño		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



*EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIACIÓN DE DATOS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Deysi Rodríguez Córdoba		
DIRECCIÓN	003-0000 1394		
TELÉFONO	3122092465	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	9 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÀL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque arcilla, puerta de metal en regular estado, ventana de metal en buen estado, piso de cerámica en buen estado.

Firma DEYSI
Nombre: Deysi Rodríguez Córdoba
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 43901796

Firma
Nombre: Eyker Yexid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Bonilla
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

09.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	25 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Eulogia Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00001380.		
TELÉFONO	3225931220.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.60.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO			NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL			RURAL	
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de madera pintada de verde, puerta y ventana de madera en buen estado, piso en concreto esmaltado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: Eulogia Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 35586252

Firma
Nombre: Edwer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Tascon
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006			Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223												
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL												
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS												
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	27	**ELABORÓ**	Angel Avendaño		**REVISÓ**				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Rubis Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-0001350		
TELÉFONO	3118313025	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.8 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de metal en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma Maria Rubis M.
Nombre: Maria Rubis Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030420762.

Firma
Nombre: Eiber Ariel Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	25 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Heriberto Perea Perea		
DIRECCIÓN	003-00001280		
TELÉFONO	3234966175	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,30 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado y pintada de verde, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto en regular estado, cubierta de lamina de zinc en en buen estado.

Firma: Heriberto Perea.
Nombre: Jose Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 10160338

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabio Alberto Bono
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023 10 25	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Gloria Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830 000 12610		
TELÉFONO	321 735 1207	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma carmen gloria
Nombre: Carmen Gloria Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030421017

Firma
Nombre: Eiber Yesid Ruiz Apunte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Bravo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	25	10	23	ELABORÓ	Saddy Beltrán		REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Segundo María Perea Perea		
DIRECCIÓN	003-00001210		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sinpañetar, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de lamina de zinc en en buen estado.

Firma
Nombre: Segundo Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.946.

Firma
Nombre: Ester Yesid Ruiz Aponte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Cossio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

02.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	25 10 23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jesus Domingo Mosquera Mosquera.		
DIRECCIÓN	830-8300009170.		
TELÉFONO	3107159263.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.70	ESTRATO	1.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	NN	
GAS	NN	
TELEVISIÓN - CABLE	NN	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de azul, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma

Nombre: Jesus Mosquera. PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 11995053.

Firma

Nombre: Esther Maria Rueda Aponte REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Pacho Alberto Osorio REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Página 1 de 2

04

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:		2230223		CONVENIO Nº:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	25 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

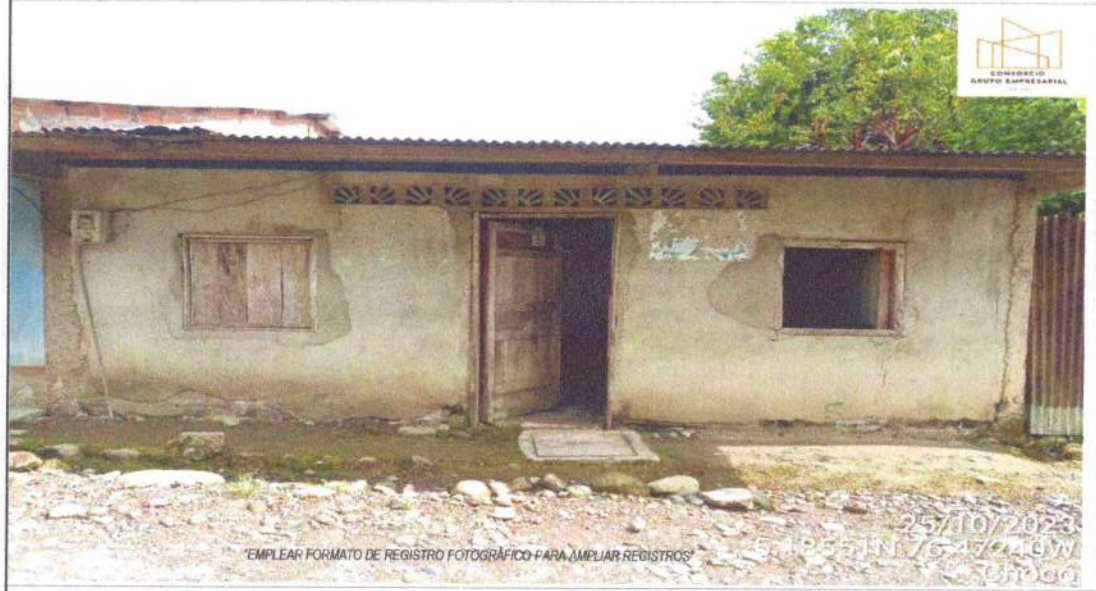

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Badilla Sanchez Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00002462.		
TELÉFONO	3107821762.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6.70	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta y ventana de madera en buen estado, piso en tierra, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Maria Sanchez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 35851049

Firma
Nombre: Eder Yesid [illegible] Apunte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto [illegible]
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Página 1 de 2

08

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.	FECHA	25 10 23	ELABORÓ	Siddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

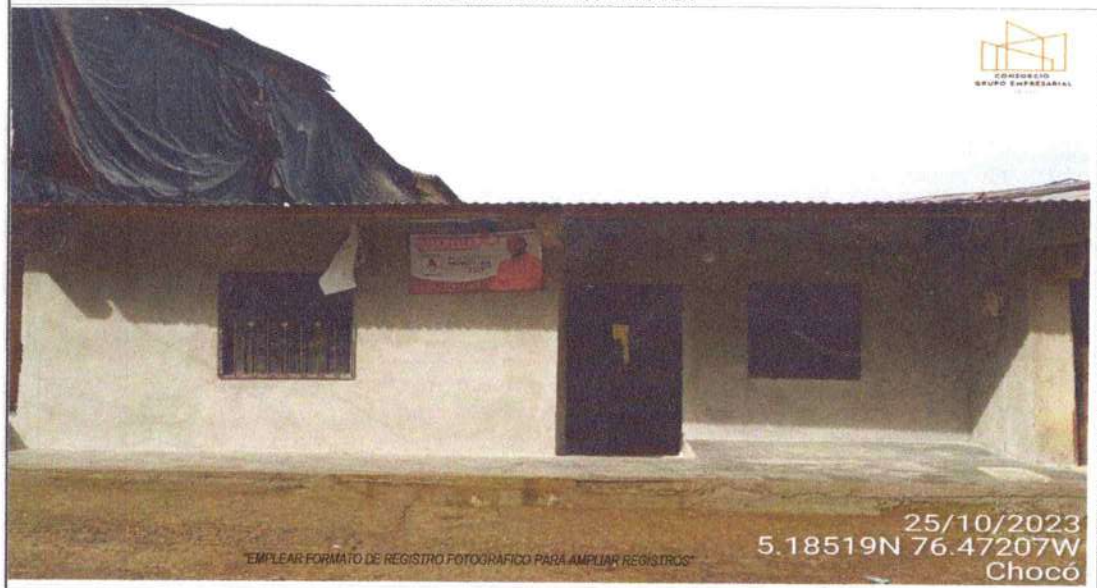

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Digno Antonio Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	004-0000 2500		
TELÉFONO	3122323143	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.40	ESTRATO	1.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma Digno Antonio
Nombre: Digno Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 14.451.028

Firma
Nombre: Elfer Yesid Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	28	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

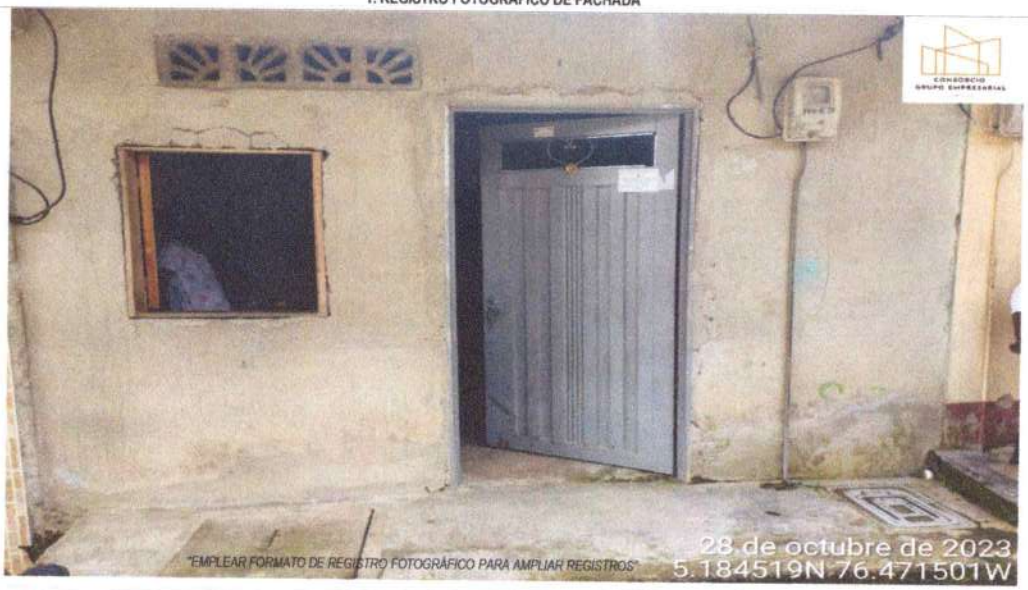

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Melilina Sánchez De Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0187033601		
TELÉFONO	N/A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.5.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma

Nombre: Melilina Sanchez De Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26319845.

Firma

Nombre: Elfer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de

OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

INTERVENTOR: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

REGISTRO No. **FECHA** 2023 10 27 **ELABORÓ** Angel Avendaño **REVISÓ**

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Martha Isabel Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003 – 0000 3322		
TELÉFONO	320 464 2580	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.8 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma Martha Isabel M
Nombre: Martha Isabel Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030 420 768

Firma
Nombre: Edper Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006			Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223											
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL											
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS											
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	27	**ELABORÓ**	Angel Avendaño		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Ruben Dario Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-0000332		
TELÉFONO	314 7249151	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.6 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de madera en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma Ruben Dmm
Nombre: Ruben Dario Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11936726

Firma
Nombre: Edes Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Hasbleidy Alberto Bravo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	27	**ELABORÓ**	Angel Avendaño	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Eufamia Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	830-830 0000 7840		
TELÉFONO	3126086531	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.4m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de medtal en regular estado, ventana de metal en regular estado, piso de cerámica en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma
Nombre: María Eufamia Perea Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26319809

Firma
Nombre: Ester Yesid Ruiz Monte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223												
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL												
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS												
REGISTRO No.		FECHA	20	10	23	ELABORÓ	Saddy Batrán		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yoimes Andres Mosquera Perea		
DIRECCIÓN	005-0000311O		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de azul, puerta de acero y ventana de madera en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma Yoimer Andres Mosquera

Nombre: Yoimer Mosquera

PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1030421360.

Firma mam

Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabián Alberto Bayo

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

108

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	27 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Frank Perea Aguilimpia		
DIRECCIÓN	003-00003551		
TELÉFONO	3216485011	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de losa entrepiso en concreto en buen estado.

Firma
Nombre: Frank Perea Aguadimpia
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1076820297

Firma
Nombre: Elver Jesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Página 1 de 2

113

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	27 / 10 / 23	**ELABORÓ**	Saddy Bertrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

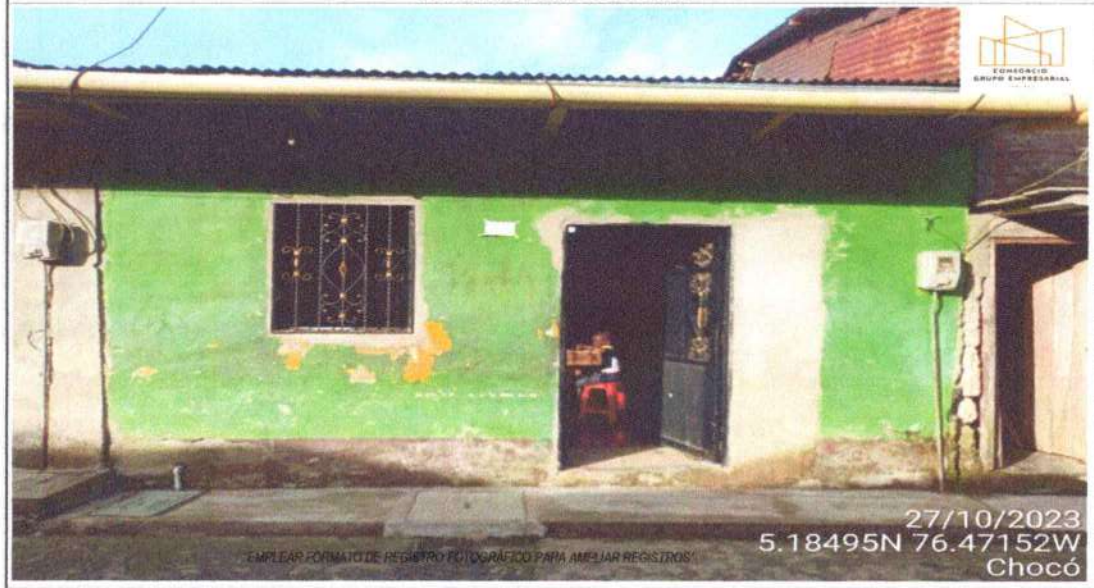

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Diselina Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000370		
TELÉFONO	3146922365	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías delinidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mampostería en bloque pañetado pintada de verde, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: María Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 29091865.

Firma
Nombre: Elfer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alfonso Obregón
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario


Página 1 de 2

114.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	27 10 23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

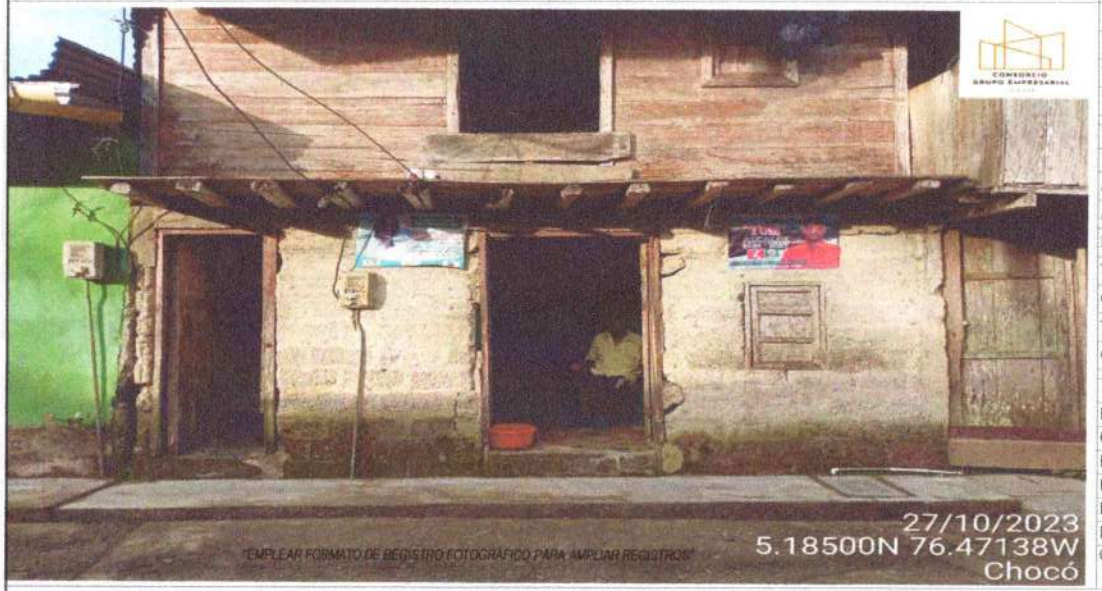

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Euripides Mosquera Sanchez		
DIRECCIÓN	003-0003582		
TELÉFONO	3224964514	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de losa entrepiso en madera en regular estado.

Firma
Nombre: Luis Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.976.

Firma
Nombre: Efer. Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabian Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

115.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.	FECHA 27 10 23	ELABORÓ Saddy Bettoán		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Francisca Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-0000360l		
TELÉFONO	3147277522.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puertas y ventana de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: María Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030421.707

Firma
Nombre: Elber Yesid Rojas Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fredy Alberto Olaya
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

116.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	27 10 23	**ELABORÓ**	Soddy Beltrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose del Carmen Hurtado Aspnlla		
DIRECCIÓN	005-0000 3610.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.20.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puertas y ventanas en acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de losa entrepiso en buen estado.

Firma
Nombre: Jose Hurtado.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.590.383

Firma
Nombre: Diler Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

117

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.		FECHA	28 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltran	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

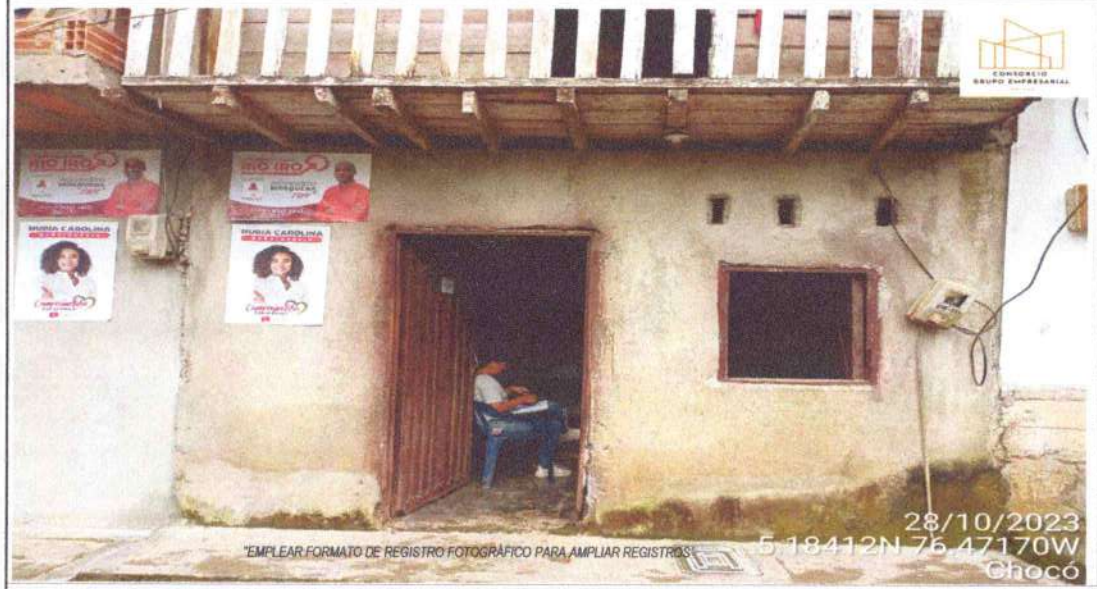

"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Audilia Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	001-00000146.		
TELÉFONO	3207446361	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta de acero en buen estado y ventana de madera en regular estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de losa entrepiso en madera en buen estado.

Firma Audilia
Nombre: Audilia Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320155

Firma
Nombre: Elver Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

118

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	28 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Carlino Benitez Hurtado		
DIRECCIÓN	605-0000 3640.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	N	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de azul, puerta de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Jose Benitez.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.967

Firma
Nombre: Edes Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

119.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:			2230223		CONVENIO N°:	222006			Hoja	1	de
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	02 11 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán		REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2/11/2023

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Arley Hurtado Mosquera		
DIRECCIÓN	830-8300006800.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.50.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de verde, puerta de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de losa entrepiso en madera en regular estado.

Firma: Luis ARLEY H.M.
Nombre: Luis Hurtado.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030420355

Firma:
Nombre: Elfer Yesid Diaz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de				
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	28	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jaison Hurtado Mosquera		
DIRECCIÓN	004-00002650		
TELÉFONO	322 520 4990	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3,20mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	22	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto sin pañete, puerta de aluminio en mal estado, ventana de aluminio con vidrio en regular estado, piso de concreto esmaltado presenta grietas, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Jaison Hurtado
Nombre: Jaison Hurtado
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11995.116

Firma
Nombre: Ofer. Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fredy Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

106

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		**FECHA**	27 10 23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis Edier Mosquera Sanchez.		
DIRECCIÓN	005-0000 3460		
TELÉFONO	3103979493	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.75	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de madera pintada de verde, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto en mal estado, cubierta de laminas de zinc en regular estado.

Firma
Nombre: Luis Edier Mosquera S.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1030420431

Firma
Nombre: Edgar Hesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario


Página 1 de 2

107

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	27 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

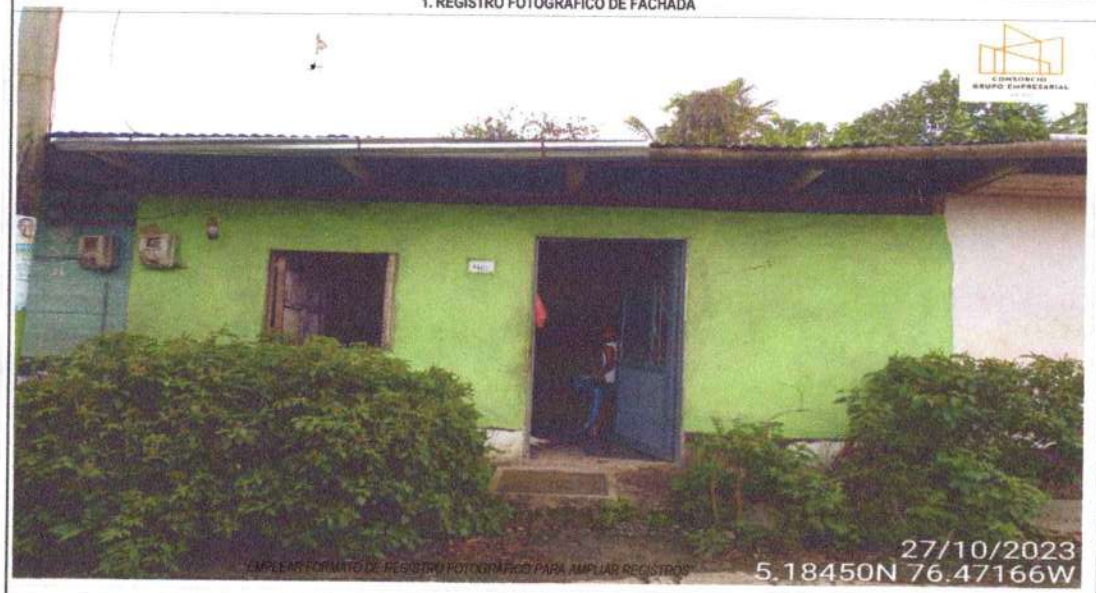

EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Mago Antonio Mosquera Perea.		
DIRECCIÓN	003-0003471.		
TELÉFONO	N/A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.10.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetada y pintada de verde, puerta de acero y ventana de madera en buen estado, piso en tierra, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Mago Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.803.

Firma
Nombre: Elfer Mesid Ruiz Aponte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Ardila
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	27 10 23	ELABORÓ	Seddy Beltran	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jorge Elias Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3490.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetada y pintada de verde, puerta de madera en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma Jorge Elias Mosquera
Nombre: Jorge Mosquera.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 11.938.382.

Firma
Nombre: Edier Yesid Ruiz Apunte.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

030

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		FECHA	19 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Julia Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830-8300016960.		
TELÉFONO	N/A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,20.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de losa entrepiso en madera en regular estado.

Firma

Nombre: Carmen Mosquera M.
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1030420618

Firma

Nombre: Elfer Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Página 1 de 2

075.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	27 10 23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Leonor Sara Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	003-0000130		
TELÉFONO	N/A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetada y pintada de verde, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma Leonor P.
Nombre: Leonor Perea.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 35.587.735.

Firma
Nombre: Fiber Yesid Beltran Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

79.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		**FECHA**	03	11	23	**ELABORÓ**	Saddy Beltran	**REVISÓ**		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Romulo Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00001110		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado sin pintar, puerta y ventana de madera en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Jose Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.867.

Firma
Nombre: Ester Yesid Ruiz Upate.
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osain
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Página 1 de 2

081

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		**FECHA**	27/10/23	**ELABORÓ**	Sodley Beltrán	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

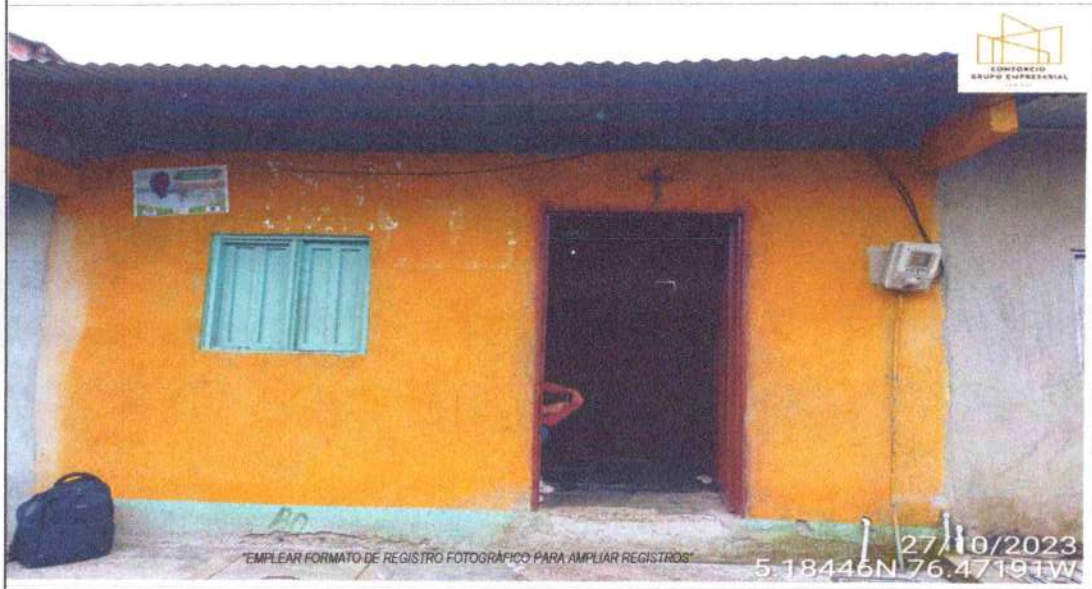

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Leonor Sara Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00001100 .		
TELÉFONO	3134516543	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetada y pintada de amarillo, puerta de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en regular estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma

Nombre: Leonor Mosquera .
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26320209

Firma

Nombre: Ever Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	02 | 11 | 23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	María Lucila Mosquera de Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00001080		
TELÉFONO	3107634906.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,80 m.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto con pañete y enchape en buen estado, puerta de aluminio en regular estado, ventana de aluminio con vidrio en regular estado, piso de concreto en antejardin, piso de la sala en ceramica en buen estado. cubierta de losa entre piso en concreto en buen estado.

Firma
Nombre: María Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26319553

Firma
Nombre: MIGUEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

089

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	03	11	23	ELABORÓ	Saddy Bertran	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Monares Perea Perea		
DIRECCIÓN	830-8300013050		
TELÉFONO	N/A	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado pintada de azul, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de madera en buen estado.

Firma

Nombre: Jose Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 4.827.672

Firma

Nombre: Eiber Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

063.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de			
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223									
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL									
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS									
REGISTRO No.		**FECHA**	27	10	23	**ELABORÓ**	Saddy Beltrán	**REVISÓ**		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Francisco Gabriel Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000490		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque sin pañetar, puerta y ventana de madera en regular estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Francisco Mosquera .
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4826.277

Firma
Nombre: Ever Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

067

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	27	10	23	ELABORÓ	Saddy Beltrán	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Ennis Perea Mosquera		
DIRECCIÓN	002-00000430		
TELÉFONO	3116019578	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3.70	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetada y pintada de verde, puerta y ventana de madera en buen estado, piso en concreto en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma mariaennis
Nombre: Maria Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320294

Firma mam
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL							
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS							
REGISTRO No.	FECHA 2023 10 25	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Flor mary Mosquera Ramirez.		
DIRECCIÓN	002-00000690		
TELÉFONO	3103797167	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.10mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto sin pañete, puerta de madera en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma

Nombre: Flor mary Mosquera Ramirez.
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1.030.420.775

Firma

Nombre: Elder Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Hasbi Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría, Propietario


Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:			2230223		**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	25	**ELABORÓ**	Diana Payares F	**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

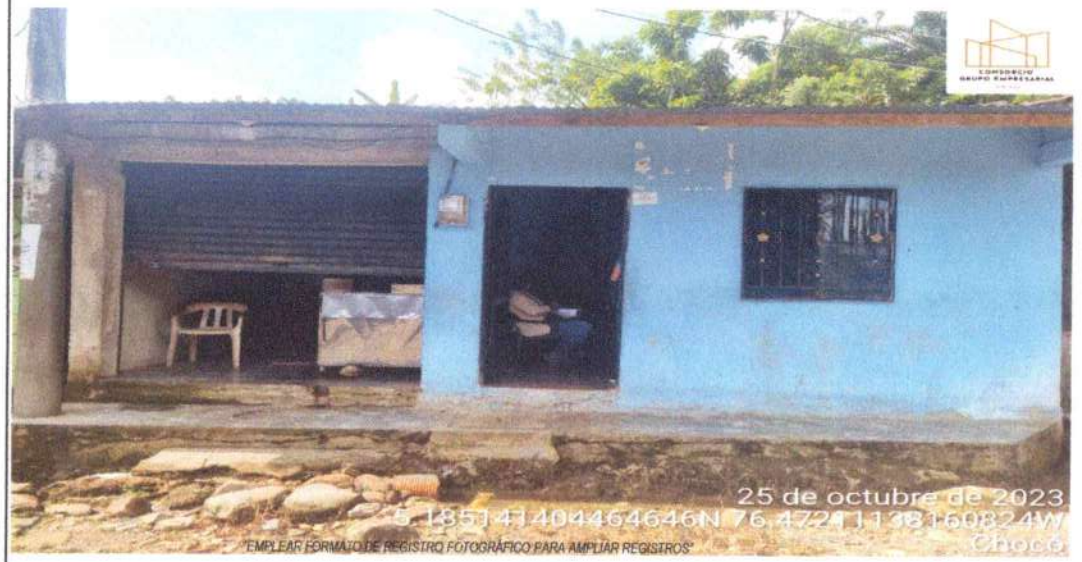

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Petronio Panfilo Pelea Mosquera		
DIRECCIÓN	004-0000 2540		
TELÉFONO	314 412 7042	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,80mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto con pañete y pintura, puerta de aluminio en buen estado, ventana de aluminio con vidrio en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma
Nombre: Petronio Pelea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.133.699.066

Firma
Nombre: Ever Yesid Ruiz Apunte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Mauricio Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO Nº:		2230223		CONVENIO Nº:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	10	25	ELABORÓ	Diana Payares F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Tarcy Estela Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	830-8300001 2530		
TELÉFONO	3146267233	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5 mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto con pañete y pintura, puerta con lamina de zinc en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Tarcy mosquera
Nombre: Tarcy Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26.318.857

Firma
Nombre: Elfer Reid Ruiz Apante
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

006

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONTRATO N°:	2230223	**CONVENIO N°:**	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		**FECHA**	2023	10	25	**ELABORÓ**		**REVISÓ**			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Manuel Avidio Mosquera Perea		
DIRECCIÓN	004-00002490		
TELÉFONO	3136409871	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.20mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto con pañete y pintura, puerta de aluminio en buen estado, ventanas de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en regular estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma Manuel Avidio
Nombre: Manuel Avidio Mosquera Perea
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 16.214.178

Firma
Nombre: Eiver Mesid Baza Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	2023	11	03	ELABORÓ	Angel Avendaño	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

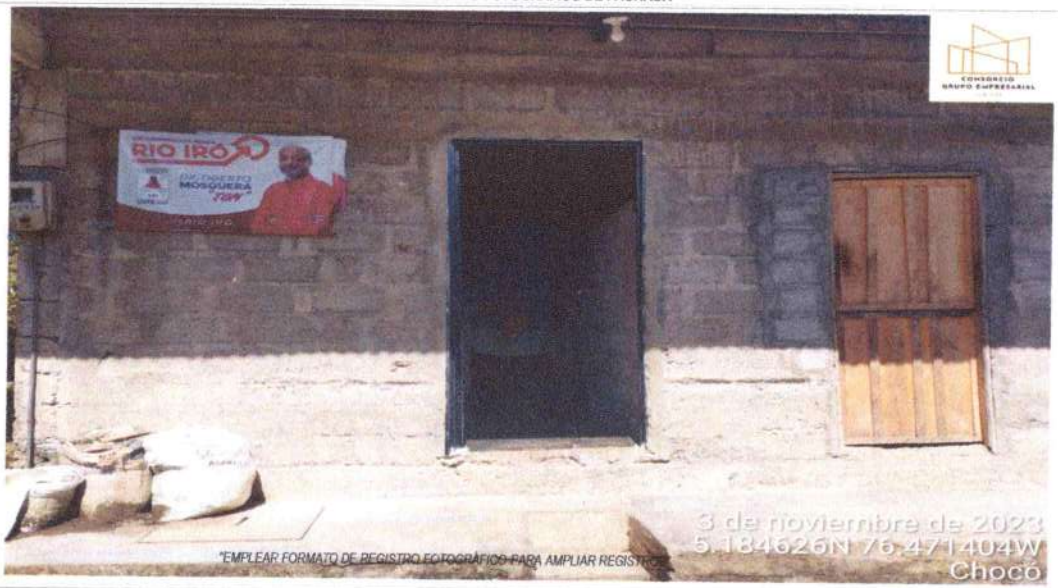

*EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTRO

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Maria Yomaira Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	005-0000 3430		
TELÉFONO	3119350364	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.9m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque concreto, puerta de metal en regular estado, ventana de madera en regular estado, piso de concreto esmaltado en buen estado, cubierta en láminas de zinc en regular estado

Firma yomaira MM
Nombre: Maria Yomaira Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1133699009

Firma
Nombre: Exber Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.


Página 1 de 2

110

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:		2230223		CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL										
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS										
REGISTRO No.		FECHA	09	11	23	ELABORÓ	Saddy Beltran	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

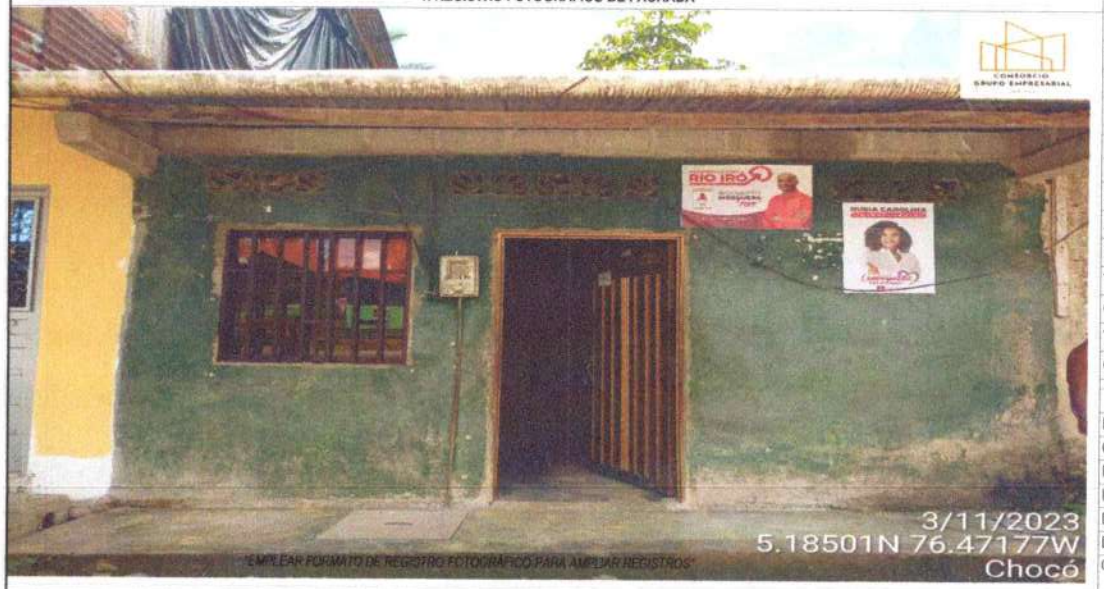

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Marcelino Hurtado Asprilla		
DIRECCIÓN	530-8300007290.		
TELÉFONO	3206473642.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en muros de mamposteria en bloque pañetado y pintada de verde, puerta y ventana de acero en buen estado, piso en concreto esmaltado en buen estado, cubierta de laminas de zinc en buen estado.

Firma
Nombre: Marcelino Hurtado.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.827.692.

Firma
Nombre: Elber Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de	
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	2023 11 03	ELABORÓ	Diana Reyares F	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Sara Maria Mosquera Mosquera		
DIRECCIÓN	003-00000851		
TELÉFONO	3107634406	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	2,90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto sin pañete, puerta de madera en mal estado, ventanas de madera en mal estado, piso de concreto esmaltado en mal estado, cubierta en laminas de zinc en mal estado.

Firma: Sara Maria M. M.
Nombre: Sara Maria Mosquera Mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320162

Firma:
Nombre: Diver Yesid Ramos Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fredy Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Página 1 de 2

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP

CONTRATO N°:	2230223	CONVENIO N°:	222006		Hoja	1	de		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL								
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS								
REGISTRO No.		FECHA	2023 11 08	ELABORÓ	Diana Rayares F.	REVISÓ			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Glady Perea mosquera		
DIRECCIÓN	830-8300007820		
TELÉFONO	3114872792	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,3	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	✓	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Vivienda construida en mamposteria de bloque de concreto con pañete, puerta de madera con lamina de zinc en mal estado, ventana de madera en mal estado, piso de concreto en regular estado, cubierta en laminas de zinc en regular estado.

Firma: Glady Perea
Nombre: Glady Perea mosquera
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 26320271

Firma:
Nombre: Eider Yesid Ruiz Aponte
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fabio Alberto Osorio
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Página 1 de 2

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Memoria de cálculo de actividades ejecutadas

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Relación de planos

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

enterritorio	**RELACIÓN DE PLANOS**	CÓDIGO	**F-GG-20**
		VERSIÓN	**02**
		VIGENCIA	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

CONVENIO MARCO No. :	222006
CONTRATO No. :	2230223
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
SUPERVISOR:	MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA

N°	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1	10/04/2023	TIPOLOGIA I-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
2	CASETA	1		TIPOLOGIA II-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
3	CASETA	1		TIPOLOGIA III-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
4	CASETA	1		TIPOLOGIA IV-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
5	CASETA	1		TIPOLOGIA V-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005
6	CASETA	1		TIPOLOGIA VI-ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL			Oscar Almario	Planos proceso ICM-005

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023

ENTREGA
Firma
OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ
Fecha:08/08/2023

RECIBE
Firma
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Fecha:08/08/2023

Original: ENTerritorio
Copia: Contratista, Interventoría

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Relacion de documentos

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

ANEXO 1
INVENTARIO DE DOCUMENTOS

N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° VERSIÓN	N° TOMO	FECHA DE DOCUMENTO	APROBADO POR	ORIGINAL	N° COPIAS	MEDIO MAGNETICO	OBSERVACIONES
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO		X	X	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE RIO IROCHOCO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
3	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
4	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
5	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
6	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		OSCAR ALMARIO			X	
7	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	Especificaciones técnicas generales, Capítulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV
8	PLANOS	1	1		OSCAR ALMARIO			X	• Ubicación de barrios y alcantarillado Rio iro • Prototipos arquitectónicos y estructurales
9	FORMATOS PCI				OSCAR ALMARIO			X	PCI-001 hasta PCI-024

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C a los 08 días del mes Agosto del año 2023.

ENTREGA		**RECIBE**	
Firma	Firmado digitalmente por OSCAR M. ALMARIO FERNANDEZ	Firma	
NOMBRE	OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	**NOMBRE**	JOSE LUIS RADA RAYO
Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023	Fecha:	Martes, 08 de agosto de 2023

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Registros fotográficos del proyecto

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de pedestales marca ROMA en las bodega del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de cerámica 20X20 marca ALFA en las bodega del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de lavamanos marca ROMA en las bodega del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de batería sanitaria marca ROMA en las bodega del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/11/2023

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de puertas metálicas en las bodegas del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/11/2023

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de lavaplatos marca FERMETAL en las bodegas del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/11/2023

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de cemento en las bodegas del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	10/11/2023

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía: acopio de granito y marmolina en las bodegas del contratista.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	24/11/2023

FOTOGRAFÍA (9)



Texto explicativo de la fotografía: Acopio de los tanques sanitarios en las bodegas del contratista.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: Prueba de estanqueidad a lavaderos para ser aprobados por la interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: Lavaderos aprobados por interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de lavaderos.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	27/11/2023

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: Lavaderos aprobados por interventoría.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: En las oficinas del contratista de obra se recibe a la comunidad, aclarando y despejando sus inquietudes respecto al proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: En las oficinas del contratista de obra se recibe a la comunidad, aclarando y despejando sus inquietudes respecto al proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio El Rosario.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio El Rosario.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio La Real.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio La Real.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio La Unión.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en el Barrio La Unión.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en Barrio Nuevo.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	22/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 22 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo revisión de buzones de sugerencias en Barrio Nuevo.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en la alcaldía municipal, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en la alcaldía municipal, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en Barrio La unión, en las instalaciones de las oficinas del contratista de obra, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en Barrio La unión, en las instalaciones de las oficinas del contratista de obra, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en Barrio Nuevo, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo la instalación de una cartelera informativa en Barrio Nuevo, con el fin de comunicar a la comunidad de la convocatoria laboral de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El contratista de obra realizo entrega de las respuestas de solicitud de PQR recepcionadas en el barrio La unión.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El contratista de obra realizo entrega de las respuestas de solicitud de PQR recepcionadas en el barrio La unión.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 01 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo instalación de buzones de sugerencias en el Barrio El Rosario.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 01 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo instalación de buzones de sugerencias en el Barrio El Rosario.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 01 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo instalación de buzones de sugerencias en el Barrio La Unión.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	01/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 01 de noviembre El equipo de contratista de obra, realizo instalación de buzones de sugerencias en el Barrio La Unión.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio El Rosario, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio El Rosario, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio El Rosario, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La Real, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La Real, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La Real, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La unión, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La unión, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el Barrio La unión, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en Barrio Nuevo, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en Barrio Nuevo, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en Barrio Nuevo, informando a la comunidad la convocatoria para seleccionar personal de mano de obra no calificada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 14 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el barrio El Rosario, informando a la comunidad la apertura del proceso de inclusión.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 14 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el barrio El Rosario, informando a la comunidad la apertura del proceso de inclusión.
.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	14/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 14 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo perifoneo en el barrio El Rosario, informando a la comunidad la apertura del proceso de inclusión.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	17/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	18/11/2023

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	24/11/2023

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía: Realización de bloque estructural, actividad con cuenta con revisión de esta interventoría.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 23 de noviembre El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, Min Vivienda, ENTerritorio, realizo recorrido de barrio en los cuatro barrios del Municipio de Rio Iro, viendo las novedades que se han presentado en viviendas especificas de los diferentes barrios.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 23 de noviembre El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, Min Vivienda, ENTerritorio, realizo recorrido de barrio en los cuatro barrios del Municipio de Rio Iro, viendo las novedades que se han presentado en viviendas específicas de los diferentes barrios.

enterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	23/11/2023

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía: el 23 de noviembre El equipo de contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría, Min Vivienda, ENTerritorio, realizo recorrido de barrio en los cuatro barrios del Municipio de Rio Iro, viendo las novedades que se han presentado en viviendas específicas de los diferentes barrios.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio El Rosario, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio El Rosario, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio La unión, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en el Barrio La unión, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en Barrio Nuevo, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	28/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: El equipo de contratista de obra realizo socialización casa a casa en Barrio Nuevo, explicándole a los potenciales beneficiarios acerca del proyecto.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de volantes informativos en el Barrio El Rosario, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de volantes informativos en el Barrio El Rosario, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de folletos informativos en el Barrio La Real, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	16/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 16 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de folletos informativos en el Barrio La Real, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de volantes informativos en el Barrio La Unión, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	20/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 20 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de volantes informativos en el Barrio La Unión, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (1)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de folletos informativos en Barrio Nuevo, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

eterritorio	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**F-GG-25**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-07-21**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ORDEN DE TRABAJO No. 2230223
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	RIO IRO – CHOCÓ
N° CONVENIO:	222006
N° CONTRATO DE OBRA:	2230223
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
INTERVENTOR:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
N° CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2230219
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	15/11/2023

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía: el 15 de noviembre El equipo de contratista de obra realizo entrega de folletos informativos en Barrio Nuevo, con información sobre la convocatoria para escoger el personal de mano de obra no calificada.

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Videos del avance del proyecto

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Resultados de los ensayos de materiales

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Calibración y control de equipos

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Fotocopia de la bitácora

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

Martes 31 de Octubre 2023

. El Contratista de obra continua realizando actividades administrativas, organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en la semana anterior.
En horas de la tarde se realiza diagnostico en barrio Nuevo proceso de inclusión, Actividad que estuvo acompañada por profesionales de Interventoría y trabajadora social de la empresa de servicios públicos.
Así mismo, el residente de obra en acompañamiento del residente de interventoría realizan visitas a viviendas que cuentan con casos especiales en barrio La Unión y el Rosario. y se realiza comite de aprobación No 6. donde se aprueban 37 diagnosticos

ing residente de obra CGE ing. Residente interventoria CAEE

Miercoles 01 de Noviembre 2023.

Contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados la semana anterior, adicionalmente el contratista de obra remite a interventoria (11) once diagnosticos subsanados para su revisión y posterior aprobación.
Asi mismo el contratista de obra realiza actividades de informes mensuales de las diferentes areas, de acuerdo a las actividades adelantadas correspondientes al mes de octubre.
- Contratista de obra realiza visita a viviendas con casos especiales en el barrio el Rosario para definir y concertar con los beneficiarios la posible intervención, actividad que estuvo a cargo por el residente de obra y contó con el acompañamiento del residente de interventoría.
En horas de la tarde se presentan lluvias, lo cual impide al contratista de obra adelantar actividades en campo

Powered by CamScanner

Lluvias desde las 2:30 pm a 5:30 pm.
En horas de la tarde esta interventoria procede a la revisión de carpetas de diagnosticos subsanados, entregada por el contratista para ver si cumple con los requisitos minimos y programar comité de aprobación.
Horas de lluvia: 3 horas.

Ing. residente de obra.

Ing. Residente interventoria CAEE

Jueves 02 de Noviembre 2023.

El contratista de obra continua socialización casa a casa y realiza diagnosticos en el barrio el Rosario en acompañamiento de los profesionales de Interventoría.
En esta jornada se realizaron 5 diagnosticos efectivos y 5 diagnosticos no efectivos. Estos ultimos debido a que no cuentan con disponibilidad de la red de alcantarillado.
Por otra parte en horas de la tarde el contratista realiza actividades administrativas, para realizar entrega de los informes mensuales de las diferentes areas correspondientes al mes de octubre.
En horas de la tarde se presentaron lluvias desde las 3:00 pm - a 5:00 pm, motivo por el cual los equipos tecnicos y sociales no pudieron continuar con las actividades de campo programadas.
En horas de la tarde esta interventoria continua en la revisión de la carpeta de diagnosticos subsanados por el contratista y se procede a dar respuesta para realizar dicha aprobación.
Horas de lluvia: 2 horas.

Ing. residente de obra.

Ing. Residente interventoria CAEE

Viernes 03 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da continuidad a socialización caso a caso y realización de diagnosticos del barrio El Rosario, en esta jornada se lograron realizar 24 diagnosticos, de los cuales 8 viviendas fueron efectivas, 14 viviendas no efectivas y se presentaron 2 renuncias.
Adicionalmente el contratista de obra remitió 40 carpetas de diagnosticos a interventoría para su previa revisión y posterior aprobación.
En horas de la tarde esta interventoría da inicio a la Revisión de la carpeta de diagnosticos entregada por el contratista de obras y se participa en el comité de seguimiento No. 7 de forma virtual y se cuenta con la asistencia de la directora por parte de obra e interventoría, Residentes y profesionales sociales de obra como de interventoría como también por parte de la entidad y se realiza comité de aprobación No. 7 donde se aprueban 11 diagnosticos.
Cabe resaltar que en este dia no se cuenta con servicio de energia electrica. lo cual dificulta las actividades administrativas del contratista de obra, como las actividades administrativas de interventoría

Ing. residente de obra

Ing Residente interventoría CAEE

Sabado 04 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza actividades administrativas. organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en el transcurso de la semana.
A la fecha se han visitado 487 viviendas, de las cuales se han diagnosticado 342 viviendas efectivas, 122 viviendas no efectivas, se han aprobado 257 viviendas y se han presentado. 23 renuncias.

Powered by CamScanner

Por otra parte. a la fecha no se ha podido dar inicio Con la actividad No 3, en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso constructivo, el contratista de obra se encuentra a espera por parte del ministerio de vivienda que se dé el VoBo de los diseños estructurales para poder realizar pedido del acero figurado. cabe aclarar que el proveedor del acero requiere de 12 dias habiles para hacer entrega de este pedido, una vez se le realice la confirmación y validación de las cartillas de acero suministradas.
Esta interventoria continua con la revisión de la carpeta de diagnosticos entregada por el contratista para ver si cumple con la documentación requerida para su aprobación.

Ing residente de obra.

Ing residente interventoria CAEE

Domingo 05 de Noviembre 2023.

No se laboró, dia festivo!

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoria CAEE

Lunes 06 de Noviembre 2023

No se laboró. dia festivo.

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoria CAEE

Powered by CamScanner

Marte 07 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos y carpetas de diagnosticos realizadas en la semana anterior.
Adicionalmente se adelanta el informe semanal por parte del contratista de obra
En horas de la tarde se da respuesta al contratista con las observaciones encontradas en la carpeta de diagnosticos para la respectiva subsanación y posterior a su aprobación.

Ing. Residente de Obra

Ing. Residente interventoria

Miercoles 08 de Noviembre 2023

- El contratista de obra da continuidad a la actividad de socialización casa a casa en barrio El Rosario. actividad que contó con el acompañamiento de Interventoria. en esta jornada se lograron realizar 6 diagnosticos efectivos y 5 diagnosticos no efectivos Cabe resaltar que en horas de la mañana se presentaron fuertes lluvias desde las 7:00 am a 9:00 am, tampoco se contó con servicio de energia electrica durante todo el dia.
Adicionalmente por parte del contratista de obra, se remitieron 40 diagnosticos subsanados para revisión y previa aprobación Asi mismo se remitio carpeta adicional con 25 diagnostico para revisión.
En este dia llegaron 10 Toneladas de cemento para el desarrollo del proyecto.
En horas de la tarde se da inicio a la revisión de la carpeta de diagnosticos entregado por el contratista para validar si cumple o no con los requisitos mínimo y posteriormente su aprobación.
Horas de lluvia: 2 horas.

Powered by CamScanner

Ing residente de obra

Ing residente interventoria CAEE

Jueves 09 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da continuidad de la socialización casa a casa en el barrio El Rosario, esta actividad contó con el acompañamiento de Interventoria, en esta jornada se lograron identificar 2 viviendas como efectivas ts importante resaltar que ala fecha el contratista de obra ha visitado el 99% de las viviendas de la matriz inicial, motivo por el cual no se le pueden imputar cargos de incumplimiento. que llegasen a presentarse por presuntos atrasos en esta actividad.
En horas de la tarde el contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos de los diagnosticos realizados.
en horas de la tarde esta interventoria continua con la revisión de la carpeta de diagnosticos para verificar si cumple con la documentación minima para su aprobación.

Ing residente de obra.

Ing residente interventoria CAEE

Viernes 10 de Noviembre 2023.

El contratista de obra adelanta actividades administrativas durante todo el dia. En horas de la tarde el Contratista de Obra participó en el comite de seguimiento N°8 y comité de aprobación N°8 donde se aprobaron 40 diagnosticos
Esta interventoria continua con la revisión de la carpeta de diagnosticos para verificar si cumple con la documentación minima para su aprobación y darle respuesta al contratista de obras.

Powered by CamScanner

En horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias
de 3:00 PM - 6:00 PM.
Horas de lluvia: 3 horas

Ing. residente de obra.

Ing. Residente & interventoria

Sabado 11 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en el transcurso de la semana, a la fecha se han visitado 499 viviendas, de las cuales 350 viviendas efectivas, 125 viviendas como no efectivas, se han aprobado 297 viviendas y se han presentado 24 renuncias.
En el periodo de corte a esta fecha no se ha dado inicio a las actividades de construcion en intervenciones de los barrios priorizados, debido a que el contratista de obra se encontraba a la espera por parte del ministerio de Vivienda se diera el VoBo de los diseños estructurales para proceder a realizar el Pedido del acero figurado, VoBo que fue confirmado el día viernes 10 de Noviembre al finalizar la tarde en el comité de seguimiento.
Cabe aclarar que el proveedor del acero requiere de 12 dias habiles para hacer entrega del pedido, una vez se le sea confirmada y validada las cartillas de acero por parte del contratista para realizar su respectiva figuración.
El contratista de obra da inicio a las actividades preliminares para la elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la remisión de la interventoria ya que no se ha remitido a esta interventoria los diseños de mezclas, documentación de calidad de materiales, ensayos de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la Responsabilidad del contratista de obra.

Powered by CamScanner

En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias lo cual afecta las actividades de campo. Lluvias presentadas entre las 2:30 PM- 5:30 PM.
Horas de lluvia: 3 horas

ing. residente de Obra.

ing Residente interventoria

Domingo 12 de Noviembre 2023

El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de elaboración de placa estructural y cunetas, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que no se ha remitido los diseños de mezclas, temas de documentación de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y estas actividades se realizan bajo la responsabilidad del contratista de obra

ing. residente de Obra

ing Residente interventoria

Lunes 13 de Noviembre 2023

No se laboró dia festivo.

ing. residente de Obra

ing Residente interventoria CAOC

Martes 14 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza actividades administrativas, organiza documentos y anexos de diagnosticos del barrio El Rosario. se subsanan diagnosticos.

Powered by CamScanner

Adicionalmente se realiza informe semanal.
El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de elaboración de bloques estructurales y cabezotes, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoría ya que no se ha remitido los diseños de mezclas, toma de documentación de calidad de materiales, Resultados de laboratorios y demás obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la Responsabilidad del contratista de obra.
El Contratista de obra solicita comedidamente tener en cuenta la fabricación de la mampostería estructural no puede ser evaluada como una actividad contratual. Esta actividad se encuentra desarrollando por parte externo a la firma contratista Cabe resaltar que como firma contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en los cuales se evidencie el cumplimiento de los materiales con los estándares de calidad requeridos para la ejecución del presente proyecto.
El contratista de obra se compromete mediante oficio en la realización del bloque ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregado así a esta interventoría la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.
El contratista de obra en horas de la tarde realiza perifoneo de apertura del proceso de inclusión en el barrio El Rosario.
Se Presentaron fuertes lluvias desde 2:30 PM - 3:30 PM.
Horas de lluvia: 1 hora

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoría CNEE

Miercoles 15 de Noviembre 2023

En horas de la mañana se presentan fuertes lluvias desde las 7:00 am - 9:00 am.
Asi mismo, se realiza por parte del contratista de obra el perifoneo en el barrio el Rosarro y en barrio Nuevo divulgación de las convocatorias laborales de mano de obra no calificada.
Adicionalmente se remite carpeta con 14 diagnosticos para revisión en interventoria y posterior aprobación.
El contratista de obra sigue ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que aún no se ha remitido a esta interventoría los diseños de mezcla, ficha de documentación de calidad de materiales, Resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la Responsabilidad del contratista de obra.
En vista a lo anterior es necesario resaltar que esta actividad de fabricación de bloque estructural en sitio se ejecuta por personal externo a la firma contratista. Su fabricacion no hace parte de las obligaciones contractuales, reiteramos la fabricación en sitio corresponde a una Ventaja en la implementación de este material. Se expresa como firma contratista que el material utilizado en la ejecución del proyecto cumplirá con todos los aspectos de calidad exigidos por la Norma.
En horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias desde la 1:00 PM - a 4:30 PM.
Horas de lluvia: 5 horas y media

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CMCC

Jueves 16 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da respuesta de PQRS del proceso de inclusión en Barrio la Unión, adicionalmente continúa con socialización Casa a casa en barrio la unión, actividad que contó con el acompañamiento de esta interventoría en esta jornada se realizaron 5 diagnosticos efectivos.
En horas de la tarde se realiza actividades administrativas organizando los documentos de la información recapilada en sitio en la mañana de hoy.
El contratista de obra sigue ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la remisión de esta interventoria los diseños de mezclas, ficha de documentación de calidad de materiales, resultados de Laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista de obra, tambien se evidencia realizar oficio en la realización de bloque ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando asi a esta interventoría la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.
La actividad de fabricación de bloque estructural en sitio se ejecuta por personal externo a la firma contratista. Su fabricación no hace parte de las obligaciones contractuales, reiteramos la fabricación en sitio corresponde a una ventaja en la implementación de este material. Se expresa como firma contratista que el material utilizado en la ejecución del proyecto cumplirá con todos los aspectos de calidad exigidos por la norma.

Ing. residente de obra.

Ing. Residente interventoria CTEE

Viernes 17 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza un diagnostico efectivo del proceso de inclusión. Adicionalmente realiza actividades administrativas de los diagnosticos que se estan subsanando. y se remiten nuevamente a interventoria para su previa revisión.
Adicionalmente se realiza comité de aprobación No 9 donde se aprobaron 29 diagnosticos.
El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoría ya que aún no se ha remitido a esta interventoría los diseños de mezclas, ficha de calidad de materiales, resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, pasando no se acepte estos materiales y esta actividad se realice bajo la responsabilidad del contratista, tambien se evidencias mediante oficio la realización por pate de ellos, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que contiene el suministro de este producto, entregando así a esta interventoria la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo
El contratista de obra solicita comedidamente tener en cuenta que la fabricación de bloque en mamposteria estructural al igual que la fabricación de lavaderos, no pueden ser evaluadas como actividades contractuales. Estas actividades se encuentran desarrollando por parte externo a la firma contratista, claro está que como firma contratista serán entregadas todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridas por la norma, en las cuales se evidencie el cumplimiento de las materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del presente proyecto.
Asi mismo en horas de la tarde se presentan fuertes lluvias desde la 1:00 PM a 5:30 PM.

Powered by CamScanner

Horas de lluvia: 4 horas y media.

Ing. residente de obra

Ing residente interventoría CAEG

Sabado 18 de Noviembre 2023.

Por parte del contratista de obra se realiza actividades administrativas. a corte de esta fecha. se han realizado 505 visitas en las viviendas de los 4 barrios, de las cuales fueron diagnosticadas 356 como viviendas efectivas, 125 viviendas como no efectivas, se tienen aprobadas 326 viviendas y se han presentado 24 renuncias.
El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos; dicha actividad no cuenta con la remisión y aprobación de esta interventoría, ya que aún no se ha remitido los diseños de mezclas, toma de calidad de materiales, resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, también se evidencia mediante oficio remitido por el contratista la realización por parte de estos, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva el suministro de este insumo, entregando asi la documentación necesaria para garantizar la calidad de este producto.
El contratista de obra reitera comedidamente tener en cuenta que la fabricación de bloque en mamposteria estructual al igual que la fabricación de lavaderos, no pueden ser evaluados como actividades contractuales. Estas actividades se encuentran desarrollando por parte externa a la firma Contratista. Claro está que como firma contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en las cuales se evidencie el cumplimiento y calidad de los materiales

Ing. residente de obra

Ing Residente interventoria CAEG

Domingo 19 de Noviembre 2023

No se laboró, Día festivo.

Ing residente de Obra.

Ing Asistente interventoría

Lunes 20 de Noviembre 2023

Se Continua por parte del contratista de obra en las actividades de socialización casa a caso en el barrio La Unión del proceso de Inclusión, actividad que contó con el acompañamiento de Interventoría. En esta jornada se realizaron 3 diagnosticos efectivos y 1 diagnostico como no efectivo.

El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoría, ya que aún no se remite los diseños de mezclas, temas de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista, también se manifiesta mediante oficio la realización de esta actividad por parte de ellos la elaboración de bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando así la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.

El Contratista de obra reitera que la fabricación de lavaderos y de mamposteria estructural no puedan ser evaluadas como actividades contractuales. Esta actividad se encuentran desarrollando por parte externo a la firma Contratista. Claro está que como firma Contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma,

Powered by CamScanner

en los cuales se evidencie el cumplimiento de los materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del presente Proyecto.

Ing. residente de Obra.

Ing. Residente interventoría CAG

Martes 21 de Noviembre 2023.

El Contratista de obra realiza actividades administrativas con el fin de cerrar listado de Matriz inicial, revisando y documentando las viviendas en las que se presentaron los rechazos, adicionalmente se organizan diagnosticos con sus respectivos soportes del proceso de Inclusión de Barrio la Unión.

El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuentan con la revisión de la interventoría, ya que aún no se remite los diseños de mezclas, temas de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista, también se manifestó mediante oficios, por parte del contratista de obra, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando así la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.

El Contratista de obra solicita comedidamente a esta interventora en tener en cuenta que la fabricación de la mamposteria estructural no puede ser evaluada como actividad contractual al igual que la fabricación de los lavaderos. Estas actividades se encuentran desarrollando por parte externo a la firma contratista. Claro esta que como firma contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en los cuales se evidencie

el cumplimiento de los materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del Presente Proyecto.

ing. residente de Obra.

Ing. residente interventoria CAEC

Miercoles 22 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza socialización casa en barrio La Unión con el fin de dar cierre al listado de la matriz inicial, actividad que contó con el acompañamiento de Interventoria. En esta jornada se lograron diagnosticar dos (2) viviendas como efectivas, se presentó una renuncia y se diagnostico una Vivienda como no efectiva.
Esta interventoría recomienda al contratista hacer llegar los resultados de ensayos de Laboratorio, toma de muestra y certificados de conformidad de los productos para asi garantizar la calidad de los ensumos realizados en sitio (bloque estructural y lavaderos) ya que si no se garantiza la calidad del producto no se tendrá en cuenta por parte de esta interventoría
El Contratista de obra realiza recorrido en compañía del director de obra donde inspecciona bodegas, fabrica de lavaderos y sitio de producción de bloque.

ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CAEC

Jueves 23 de Noviembre 2023.

Se realiza comite de Seguimiento No 10, el Cual se realiza de manera presencial en el municipio de Rio Iró y donde se contó con el acompañamiento de los profesionales de MVCT, ENTerritorio, profesionales por parte del contratista

de obra e interventoria, adicionalmente se contó con el acompañamiento del secretario de planeación y el gerente de la Empresa de Servicios Públicos.
Posteriormente se hizo recorrido en los barrios que se van a intervenir, se realiza visita a bodegas del contratista de obra con el fin de validar los materiales que han llegado a sitio, adicionalmente se validan la producción de lavaderos, se continua con recorrido de obra visitando las viviendas que requieren red domiciliaria de alcantarillado mayor a 10 metros, se visita punto de instalación de la Valla siguiendo el recorrido de obra se visita sector que no cuenta con alcantarillado en el barrio El Rosario, se visita sector de el barrio La Real el cual las viviendas estan construidas en palafito y no cuentan con elementos que garanticen la estabilidad de la Vivienda. y por ultimo se visita punto de fabricación de bloque estructural donde los profesionales de MVCT, ENTerritorio e interventoria hacen las respectivas recomendaciones al contratista de obra para garantizar la calidad de la producción de este material. donde el contratista de obra recibe de buena manera estas recomendaciones

Ing. residente de obra

Ing Residente interventoria CAEE

Viernes 24 de Noviembre 2023.

Desde el dia Jueves 23 de Noviembre se mantiene la via cerrada en el sector de Pereira a Istmina y se presenta cierre de la via Quibdo - Medellin. lo cual dificulta el ingreso de materiales que el Contratista de obra requiere para el buen funcionamiento y desarrollo de la obra.
Adicionalmente en la Noche anterior en el sector

de Chapizal en la Vía Istmina - Río Iro, se pierde la banca de la vía a causa de las fuertes lluvias presentadas, ocacionando que no haya paso para ningun tipo de vehiculo. lo cual hace que tambien se presenten atrasos en la programación de obra al contratista de obra. Cargos que no puedan ser imputables a la firma contratista debido a que son factores ajenos al CGE.

Estas interventoría recomiendo al contratista hacer llegar los resultados de ensayos de laboratorio y Cono de muestra, Certificados de conformidad de los productos para así garantizar la calidad de los insumos realizados en sitio (bloque estructural y Canaderas) ya que si no se garantiza la calidad del producto no se tendra en cuenta por parte de esta interventoría. Esta interventoría realiza recorrido de barrio para verificar las viviendas que se han diagnosticado como no efectivas en barrio nuevo.

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoría CAEE

Sabado 25 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza recorrido en compañía de interventoria, Visitando viviendas que fueron diagnosticadas y cuentan con casos especiales en el barrio la Unión y Barrio Nuevo

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoría CAEE

Domingo 26 de Noviembre 2023.

No se laboró, dia festivo.

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CACC

Lunes 27 de Noviembre 2023.

Continuan Vias cerradas en la via Quibdo - Medellin y en la Via Pereira - Istmina, lo cual obstaculiza que ingrese cualquie vehiculo de carga al departamento donde esta llega a occisionar atrasos en la pregramacion de obra al contratista de obra, cargos que no pueden ser imputados al contratista de obra.

En horas de la mañana el Residente de obra en compañia del residente de interventoria realizan prueba de estanqueidad a los lavaderos que se fabricaron. Adicionalmente se da VoBo del acabado de los lavaderos por parte del residente de interventoria.

En horas de la tarde el residente de obra en compañia del residente de Interventoria realizan acercamiento al sector de Santa Barbara para validar desvio que actualmente construyen para desviar los vehiculos debido a pavimentacion vial en Vias Principales de este sector, donde se pudo evidenciar que no hay garantias ni vias de acceso para transito de vehiculos de carga lo que llega a causar afectaciones al contratista del PCI ya que no tendria vias de acceso para poder hacer llegar los materiales que requiere el proyecto.

Esta interventoria Recomienda al contratista hacer llega, los Resultados de ensayos de cilindros, toma de muestra y Certificados de

conformidad de los productos para así garantizar la calidad de los insumos realizados en sitio (bloque estructural y canaletas) ya que si no se cuenta con la calidad, no se tendrá en cuenta por parte de esta interventoría.

Ing residente de Obra

Ing residente interventoría CAE

Martes 28 de Noviembre 2023.

Contratista de obra e interventoría suspenden actividades a causa de amenazas recibidas en horas de la madrugada por presunta organización al margen de la ley.

Residente de obra e interventoría realizan acercamiento al secretario de planeación en compañía de trabajadora social de interventoría para ponerlo en conocimiento y contextualizar la problemática presentada.

Desde la firma contratista e interventoría ratificamos y solicitamos garantías y seguridad para el personal y colaboradores del proyecto para que este se desarrolle en los plazos establecidos sin llegar a causar perjuicio o poner en riesgo a algún integrante del equipo de trabajo.

ing. residente de Obra.

ing residente interventoría CAE

Miercoles 29 de Noviembre 2023.

Contratista de obra e interventoria continuan con la suspension de actividades. hasta que se brinden las garantias y la seguridad de todos sus colaboradores.

ing. residente de obra.

ing Residente interventoria CAEE

Jueves 30 de Noviembre 2023.

Contratista de obra e interventoria continuan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la Entidad Contratante solicite a los entes territoriales y demas Entidades. donde se garantice la seguridad y se de las garantias de tranquilidad de todos los colabores. Hasta la fecha no se tiene certeza de los individuos que quieren intimidar a los profesionales que laboran el proyecto.

ing residente de obra.

ing Residente interventoria CAEE

Powered by CamScanner

Martes, 31 de octubre de 2023.

Río Iró - Chocó.

En horas de la mañana se realizaron actividades administrativas para la elaboración del informe mensual del mes de octubre.
En horas de la tarde se realizó visita de socialización casa a casa de inclusión en Barrio nuevo. Visita la cual no se había podido realizar antes debido a que no se había podido contactar con la potencial beneficiaria.
Se realizo 1 diagnostico.

Diana Patricia Profesional Social Contratista de obra

Miercoles, 01 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

Se realizaron actividades administrativas desde la interventoría y del contratista de obra, con el fin de diligenciar formatos de diagnosticos realizados la semana anterior.
Asi mismo, se realizó la instalación delos buzones de sugerencias en los dos segundos barrios priorizados. (La unión - El Rosario). Los lugares escogidos fueron estrategicos y recomendados por los miembros del comité veedor, se contó con el acompañamiento de 2 miembros del comite veedor y la profesional social de la empresa prestadora de servicios publicos.
Se realizó Reunion de seguimiento con el Min de vivienda, Territorio y el equipo social de contratista de obra e interventoría. Con el fin de socializar las actividades realizadas en este periodo.

Escaneado con CamScanner

Diana Payares F
T. Social
Contratista.

Jueves, 02 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana el equpo del contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría realizaron actividades administrativas casa a casa. en el Barrio el Rosario. Se realizó un total de 10 diagnosticos, de los cuales 5 fueron efectivos y 5 no efectivos. En horas de la tarde Se realizaron actividades administrativas

Diana Payares F
T. Social
contratista de obra

Viernes, 03 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra en acompañamiento de la interventoría llevaron a cabo la realización de la Socialización casa a casa en el barrio El Rosario, Se realizaron un total de 24 Diagnosticos, de los cuales 8 fueron efectivos, 14 no efectivos y 2 rechazos En horas de la tarde Se realizaron actividades administrativas y se llevo a cabo el comite de Seguimiento Semanal.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra.

Escaneado con CamScanner

Sabado, 04 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

Se llevó a cabo desde el contratista de obra e interventoria actividades administrativas.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra.

Martes, 07 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana y tarde el contratista de Obra estuvo realizando actividades administrativas en el diligenciamiento de formatos de diagnostico.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra

Miercoles, 08 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana y tarde Se llevó a cabo Socialización casa a casa en el barrio el Rosario, realizando el barrido de casas que habian quedado pendiente por visitar. Se realizó un total de 11 diagnosticos de los cuales 5 Son no efectivos y 6 efectivos.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra

Escaneado con CamScanner

Jueves, 09 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

Se llevó a cabo Socialización casa a casa en el barrio El Rosario, para un total de 2 diagnosticos efectuos. Así mismo, Se recibio respuesta por parte del Operador de Servicios publicos a las 14 PQR de Inclusión del barrio La unión, para un total de 13 Solicitudes y 1 de Barrio Nuevo, y Se emitió un nuevo Concepto a la PQR 045 del barrio la Real.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra.

Viernes, 10 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana y tarde el contratista de obra estuvo realizando actividades administrativas en el diligenciamiento de formatos de diagnostico.

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra.

Sabado, 11 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

Se realizaron actividades administrativas desde el Contratista de obra e interventoria.

Diana Payares F.
T. Social
Contratista de obra

Escaneado con CamScanner

Martes, 14 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Choco.

El Contratista de obra realizó actividad de perifoneo en el Barrio El Rosario, informando a la Comunidad la apertura del proceso de Inclusión al proyecto, el cual Se realizó en todo el barrio, esto en acompañamiento de la interventoria. Asi mismo Se recepcionaron POR por solicitud de inclusión.

Social de Interventoría

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra

Miercoles, 15 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Choco.

El Contratista de obra realizó actividad de perifoneo en el barrio El Rosario y entrega de volantes, informando a la comunidad la convocatoria laboral de personal de mano de obra no calificada, en acompañamiento de la interventoria, la profesional Social de la empresa prestadora de los Servicios publicos y una integrante del comite veedor. El perifoneo Se realizó en todo el barrio. y por ultimo Se realizó instalación de Cartelera informativa. Asi mismo, Se hizó perifoneo en Barrio Nuevo advirtiendo a la comunidad de la presencia de menores de edad en los Frentes de trabajo, el cual Se hizo en todo el barrio. Asi mismo Se recepcionaron POR por Solicitud de inclusión.

Social de Interventoría

Diana Payares F
T. Social
Contratista de obra

Escaneado con CamScanner

Jueves, 16 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

En horas de la mañana el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría realizó entrega de las respuestas de PQR de inclusión recepcionadas del barrio la unión y Se realizó Socialización casa a casa. En horas de la tarde Se realizó perifoneo y entrega de volantes en el barrio la Real, informando a la comunidad la convocatoria laboral de personal de mano de obra no calificada, Se realizó en todo el barrio y Se realizó instalación de la cartelera informativa en el alcaldía municipal. Así mismo, Se hizo perifoneo en el Barrio la Real advirtiendo a la comunidad de la presencia de menores de edad en los frentes de trabajo Se hizó en todo el barrio.

T. Social de Interventoría

Diana Payares F.
T. Social
Contratista de obra

Viernes, 17 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

En horas de la mañana el contratista de obra en acompañamiento de la interventoría realizó Socialización casa a casa de inclusión en el Barrio la unión.
En horas de la tarde Se realizó trabajo administrativo.

T. Social de Interventoría.

Diana Payares.
T. Social.
Contratista de obra.

Escaneado con CamScanner

Sabado, 18 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

El contratista de obra realizó trabajo administrativo.

Diana Reyares F
T. Social
Contratista de obra.

Lunes, 20 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Chocó.

En horas de la mañana el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoria realizó Socialización casa a casa. En horas de la tarde realizó perifoneo y entrega de volantes en los barrios la unión y el Rosario informando a la Comunidad la convocatoria laboral de personal de mano de obra no calificada, el cual Se realizó en todo el barrio. y Se hizo la instalación de la cartelera informativa en las instalaciones de las oficinas del contratista de obra. Asi mismo, Se hizo perifoneo en los barrios la Unión y el Rosario advirtiendo a la comunidad de la presencia de menores de edad en los frentes de trabajo, el cual Se hizo en todo el barrio.


Diana Reyares F.
T. Social.
Contratista de obra.

Escaneado con CamScanner

Martes, 21 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

Se realizó trabajo administrativo desde las oficinas del contratista de obra.




Diana Reyes F
Profesional Social
Contratista de obra

Miercoles, 22 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

El contratista de obra, en acompañamiento de la Interventoria, realizó Socialización casa a casa de inclusión en el barrio la unión, realizando 1 diagnostico efectivo.
En horas de la tarde Se realizó recorrido de barrios, donde Se hizo revisión de los 4 buzones de Sugerencias instalados, los cuales Se encontraban vacios.



Diana Reyes F
P. Social
contratista de obra

Jueves, 23 de Noviembre de 2023.

Río Iró - Chocó.

En horas de la mañana en las instalaciones de la oficina de interventoria, Se llevó a cabo comite de Seguimiento tecnico-Social #10, el cual estuvo liderado por Minvivienda y ENTerritorio y Se contó con la participación del equipo-tecnico social del Contratista de obra e interventoria, Secretaria de

Escaneado con CamScanner

Planeación, el gerente de la empresa prestadora de los Servicios publicos, para un total de 17 asistentes; la interventoria realizó la retroalimentación de los avances Generales del proyecto, asi mismo, la Supervisión Social de la entidad contratante realizó la recomendación de reforzar los perfiles de la oferta de empleo de la mano de obra no calificada, la inclusión de la mujer en actividades de obra y la información detallada de cuantas mujeres cabeza de familia han Sido beneficiadas en el proyecto.
Seguido Se dio inicio al recorrido en los 4 barrios priorizados del Municipio, en donde Se visitaron Sectores especificos y la vivienda priorizada por el MinVivienda y Ettitorio, la cual Sera la primera en intervenir, desde el area Social, Se realizo visita a los 4 lugares en donde Se encuentran ubicados los buzones de Sugerencia y la valla publicitaria.

Diana Paypes F.
Profesional Social
Contratista de obra.

Viernes, 24 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Choco.

Se realizaron actividades administrativas desde la oficina del contratista de obra.

Diana Paypes F.
Profesional Social
C

Sabado, 25 de Noviembre de 2023.

Rio Iró - Choco.

Escaneado con CamScanner

Se realizó Socialización casa a casa en Barrio Nuevo, en acompañamiento de la interventoria, realizando un diagnostico.

Diana Payares F
Profesional Social
Contratista de obra.

Lunes, 27 de Noviembre de 2023

Rio Iro- Chocó

En horas de la Mañana el Contratista de obra en acompañamiento de la Interventoria Realizaron recorrido de barrio con el fin de Realizar un barrido y Verificar que las Viviendas del barrio Nuevo Se encontraran visitadas en su totalidad, Se identificaron 2 Viviendas que no se encontraron en Matriz Por lo cual Se le realizo una Ficha de inclusión, en horas de la tarde Se realizaron actividades Administrativas.

Candelaria Gonzalez.
P. Social
Interventoria

Diana Payares F.
Profesional Social
Contratista de obra

Martes, 28 de Noviembre de 2023

Rio Iro, Chocó.

En horas de la mañana el Contratista de obra e Interventoria Realizó Socialización Casa a Casa para un total de 1 diagnostico en el barrio Nuevo.
El Contratista de obra e interventoria desde el area Tecnico-Social Suspendieron Actividades de Campo a Causa de una amenaza que llegó en horas de la madrugada por

Escaneado con CamScanner

Una Presunta organización al margen de la ley, Se realizó acercamiento con los entes Territoriales y la Supervisión del Contrato y Poner en Conocimiento lo Sucedido, desde el Contratista de obra e Interventoría Se realizaron Actividades administrativas en horas de la tarde debido a lo Sucedido, Por ende todo lo relacionado al Cronograma de Actividades Se Reprogramó con el Fin de Salvaguardar la integridad Física y mental de todo el equipo de trabajo; Se está a la espera de poder solucionar el altercado y Seguir el Curso del Proyecto.

Candelaria Gonzalez
P. Social
Interventoría

Diana Reyes F
Profesional Social
Contratista de obra

Miércoles, 29 de Noviembre del 2023.

Río Pro - Chocó.

El Contratista de obra e Interventoría realizaron Actividades Administrativas hasta que se brinden las garantías y Seguridad a todo el equipo de trabajo en obra a raíz de los Problemas Sucedidos

Candelaria Gonzalez
P. Social
Interventoría

Diana Reyes F
P. Social
Contratista de obra

Escaneado con CamScanner

Jueves, 30 de Noviembre de 2023

Rio Ipo - Chocó.

Se Realizaron actividades administrativas desde el area Social en el diligenciamiento del Informe mensual junto Con Sus Anexos; los equipos Tecnico - Social Siguen a la espera de que se brinden las garantias y Seguridad Para Continuar en labores de Campo.

Candelaria Gonzalez
P. Social
Interventoria

//

Diana Reyes f
P. Social
Contratista de obra.

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Informes semanales presentados

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTerritorio** | Semana del **30/10/2023** al **5/11/2023** | Fecha **5/11/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2230223
Contratista			CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Valor inicial	$		4.164.944.717,87
Valor actual	$		4.164.944.717,87
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			24/08/2023
Plazo inicial (Días)			210 Días
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			24/03/2024
Tiempo Transcurrido (días)	74	35,24%	
Días remanentes del Contrato	140	66,67%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta			

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.			2220219
Interventor			CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
Valor inicial	$		396.843.968,13
Valor actual	$		396.843.968,13
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			24/08/2023
Plazo inicial			225 Días
Plazo actual	225 Días	100,00%	
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			8/04/2024
Ejecución del Contrato	74	32,89%	
Días remanentes del Contrato	155	68,89%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 321.429.578,91	7,72%	$ 67.279.256,42	1,62%	-$ 254.150.322,50	-6,10%
Durante el Periodo	$ 157.582.603,96	3,78%	$ 13.735.129,35	0,33%	-$ 143.847.474,60	-3,45%
Acumulado a la Fecha	**$ 479.012.182,87**	**11,50%**	**$ 81.014.385,77**	**1,95%**	**-$ 397.997.797,10**	**-9,56%**

Semaforo

Desviación en días

-20 Días

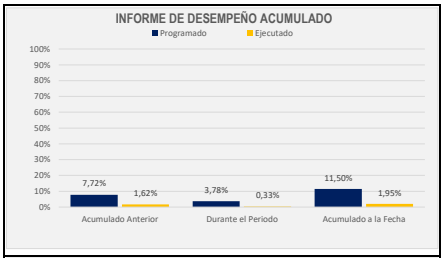

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

Durante el periodo los diseños arquitectonicos y estructurales Aprobados por la Interventoria, sin embargo se está a la espera que el Ministerio de Vivienda de una respuesta al cambio de Metodologia.

ACTIVIDAD No. 2

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico y para realizar entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. La interventoría efectua devolución de carpetas entregadas por el contratista; lo anterior para su subsanación correspondiente. Así mismo, por tal motivo se procede a reportar una ejecución de 257 diagnósticos aprobados. Se espera que el contratista de obra subsane las carpetas que fueron devueltas con el ánimo de proceder a aprobar nuevas intervenciones. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad.

ACTIVIDAD No. 3


A la fecha no se ha iniciado la actividad No. 3. Se aclara que esta actividad debia iniciar a partir del 09 de octubre de 2023 de acuerdo a lo informado por el contratista de obra. Cabe señalar que el día 30 de octubre de 2023 se da apertura al puente vehicular el cual fue culminado y entregado por parte de la Gobernación de Chocó. De acuerdo a lo anterior se da instrucción al contratista para que inicie con el acopio de materiales, contratación del personal y demás temas adicionales que se requieran para el inicio de las obras.


OBSERVACION GENERAL DE DESEMPEÑO:

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 9,56% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 11,5% , sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 1,95% de ejecución.

Es importante aclarar que el atraso presentado se debe a que a la fecha se deben estar ejecucando actividades en obra sin embargo por situación ajenas y no imputables al contratista de obra no se habia podido avanzar en esta actividad. Cabe señalar que a la fecha nos encontramosa la espera que el Ministerio de Viveinda apruebe el cambio de metodología propuesta, pues si no se cuenta con esta aprobación el contratista no podrá iniciar actividades en obra. por lo anterior se insiste a ENTerritorio la necesidad de contar de manera oportuan con esta aprobación ya que se esta ocasionando perdidas de tiempos no imputables al contratista de obra

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

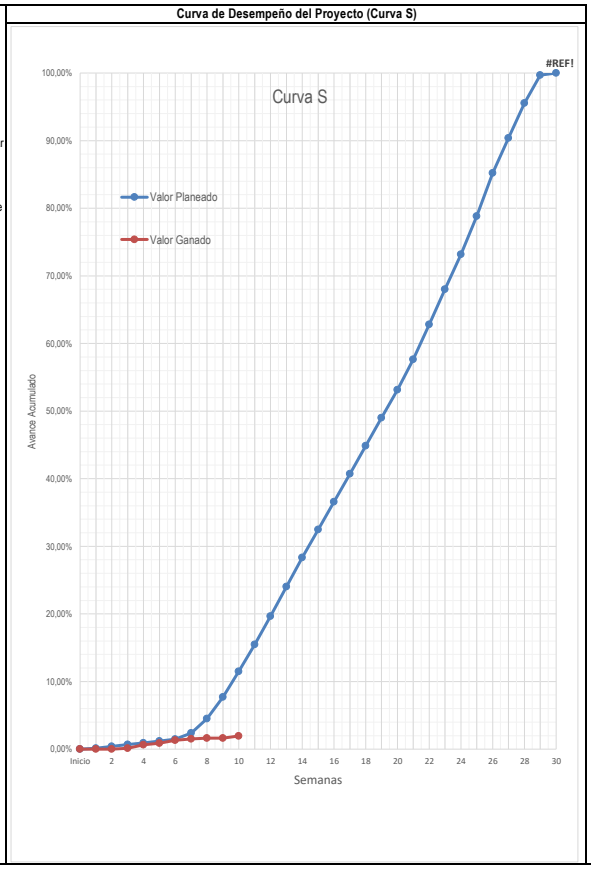

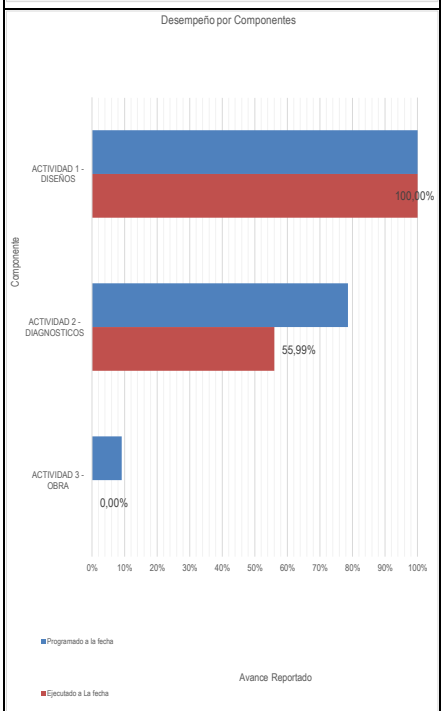

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Durante el periodo no se efectuó cambios sobre el plan de trabajo, ni se contó con cambios en tiempos, tampoco hay modificaciones en los valores económicos del contrato de obra e interventoría.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	IP


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **30/10/2023** al **5/11/2023** Fecha **5/11/2023**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	7,72%	1,62%	-6,10%	
Durante el Periodo	3,78%	0,33%	-3,45%	
Acumulado a la Fecha	**11,50%**	**1,95%**	**-9,56%**	

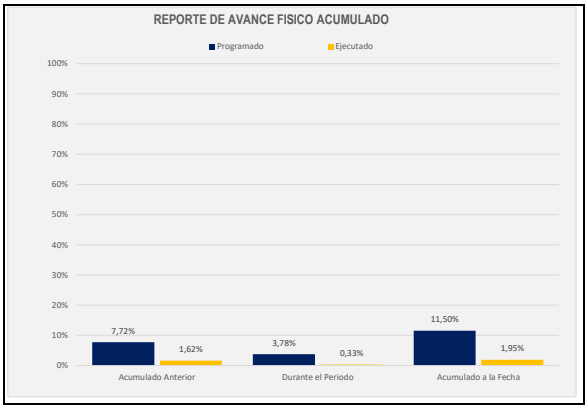



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 396.843.968,13	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico para despues realizar la entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad. Adicionalmente se espera por parte de Ministerio y la entidad contratante aprobación de las viviendas que requieren conexión domiciliaria con tramos de tuberias superiores a los 10 metros.

Durante el periodo se realiza comité de seguimiento No. 7 el dia 03 de noviembre del 2023 y se realiza comite de aprobacion No. 6 el dia 31 de octubre del 2023 y No. 7 el dia 03 de noviembre del 2023

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la Semana comprendida del 30 de octubre al 05 de noviembre se realizó lo siguiente:

Lunes 30 de octubre del 2023: Esta interventoría se encuentra realizando labores administrativas y organizando informe mensual. En horas de la tarde se presentan lluvias desde las 2:00 pm hasta las 5:00 pm lo cual dificulta para que el contratista de obra realice actividades de campo.

Martes 31 de octubre del 2023: Esta interventoría continúa realizando actividades administrativas, adicionalmente en horas de la mañana se realiza comité de aprobación No 6, donde se aprueban 37 diagnósticos. Por otra parte se adelantan informes mensuales de las diferentes áreas correspondientes al mes de octubre. En horas de la tarde se realiza 1 diagnostico en Barrio Nuevo del proceso de inclusión. Así mismo, el residente de obra en acompañamiento de interventoría realiza visitas a viviendas con casos especiales en Barrio La Unión y barrio El Rosario.

Miércoles 01 de noviembre del 2023: Esta interventoría continúa realizando actividades administrativas, se recibe por parte del contratista 11 diagnósticos subsanados para su previa revisión y aprobación. Así mismo, se continúa trabajando en la complementación de los informes mensuales de las diferentes áreas, de acuerdo a las actividades realizadas en el mes de octubre. En horas de la tarde se presentan lluvias desde las 2:30 pm hasta las 5:30 pm lo cual impide al contratista de obra adelantar actividades de campo.

Jueves 02 de noviembre del 2023: El contratista de obra da continuidad de la socialización casa a casa en barrio El Rosario, en esta actividad cuenta con el acompañamiento de interventoría, en esta jornada se lograron diagnosticar 5 viviendas efectivas y 5 viviendas no efectivas. En horas de la tarde el contratista de obra realiza actividades administrativas debido a que se presentaron fuertes lluvias desde las 3:00 pm hasta las 5:00 pm, motivo por el cual los equipos técnicos y sociales no pudieron continuar con las actividades de campo programadas.

Viernes 03 de noviembre del 2023: El contratista de obra da continuidad de la socialización casa a casa en barrio El Rosario, en esta actividad cuenta con el acompañamiento de interventoría, en esta jornada se lograron diagnosticar 24 viviendas, de las cuales 8 viviendas como efectivas, 14 viviendas como no efectiva y se presentó 2 rechazos. Actividad que se desarrolló en todo el día. Adicionalmente se recibe 40 diagnósticos por parte del contratista para su previa revisión y posterior aprobación. En horas de la tarde se participó en el comité de seguimiento No 7 y comité de aprobación No 7.

Sábado 04 de noviembre del 2023: Esta interventoría realiza actividades administrativas, realizando revisión de los diagnósticos entregados por el contratista de obra, a la fecha se han visitado 487 viviendas, de las cuales se han diagnosticado 342 viviendas efectivas, se han aprobado 257 viviendas, y se han presentado 23 renuncias.

Domingo 05 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:
CAEE-RI-2023-112 Entrega informe semanal Social No. 8 y 9 20234300364312
CAEE-RI-2023-113 Informacion sobre la solicitud de suspension orden de tr20234300364232
CAEE-RI-2023-114 Respuesta comunicado No, 107 Daignosticos 20234300364882
CAEE-RI-2023-117 Solicitud de informacion sobre proceso mamposteria 20234300366072
CAEE-RI-2023-119 Respuesta a comunicado No, 112 Revision disgnósticos 20234300369252

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **30/10/2023** al **5/11/2023** Fecha **5/11/2023**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra empezará socialización casa a casa en el tercer barrio priorizado, una vez se realice la socialización sectorizada del PCI por parte de los entes Territoriales.
2. Nivelar actividad No 2. acorde a la programación de actividades presentada y aprobada.
3. Se espesra dar inicio a las actividades de ejecución de obra toda vez que ya se cuenta con el puente vehicular en funcionamiento y habilitado
4, Se espera contar con el aval del cambio de metodología para el bloque estructural y aprobación de viveindas con situaciones particulares de las conexiones domiciliarias


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	30	8	38	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**30**	**8**	**38**	**100,00%**



Durante el periodo no se presentan accidentes o incidentes de trabajo.
Por otra parte el día Lunes 30 de Octubre se presentan fuertes lluvias desde las 2:00 pm - 5:00 pm
el día Miercoles 01 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 2:30 pm - 5:30 pm
el día Jueves 02 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 3:00 pm - 5:00 pm

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Actividades realizadas	Responsable	Fecha
N/A	30/10/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se realizaron actividades administrativas y elaboracion de informes	Contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	31/10/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se ralizaron actividades administrativas y elaboracion de informes	Contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	1/11/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se realiza actividades administrativas, Instalacion de los buzones de sugerencias de los Barrios la Union y el Rosario, de igual forma, se participa del comité de seguimiento liderado por el Ministerio, para la socializacion de las actividades realizadas	contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	2/11/2023	barrio el Rosario	10,00	Se realizaron visitas de socializacion casa a casa a 10 potenciales beneficiarios, con el acompañamiento de esta Interventoria y un miembro de la veeduria del Proyecto. Se radican las 14 solicitudes de inclusion ante los Entes Territoriales.	Contratista de obra	NA
N/A	3/11/2023	barrio el Rosario	24,00	Se realiza visitas de socializacion casa a casa a 24 potenciales beneficiarios, con el acompañamiento de esta Interventoria y un miembro de la veeduria del Proyecto.	contratista de obra	NA
N/A	4/11/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se realiza actividades administrativas	contratista de obra	NA
N/A	5/11/2023	Oficina de Interventoria	N/A	Se realiza elaboracion de informes semanales	Interventoria	NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **30/10/2023** al **5/11/2023** Fecha **5/11/2023**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

		
Fotografia 1. Visita tecnica a los potenciales beneficiarios para explicar la construcción de las unidades sanitarias	Fotografia 2. Atencion a los potenciales beneficiarios en el PAC	Fotografia 3. Socializaciones casa a casa en el barrio el Rosario, con el acompañamiento del secretario de planeacion y social de ESP
		
Fotografia 4. Instalacion del buzon de suregerencias en el barrio el Rosario	Fotografia 5. Instalacion del buzon de sugerencias en el barrio la Union	Fotografia 6. Realizacion de visitas casa a casa para la realizacion de diagnósticos en el barrio El Rosario

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Durante el periodo el contratista de obra adelanta actividades de soclialización y diagnósticos casa a casa, así mismo remite carpetas de diagnósticos a la interventoría para su revisión y/u observación o aprobación.

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 9,56% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 11,5% , sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 1,95% de ejecución.

Es importante aclarar que el atraso presentado se debe a que a la fecha se deben estar ejecucando actividades en obra sin embargo por situación ajenas y no imputables al contratista de obra no se habia podido avanzar en esta actividad. Cabe señalar que a la fecha nos encontramosa a la espera que el Ministerio de Viveinda apruebe el cambio de metodología propuesta, pues si no se cuenta con esta aprobación el contratista no podrá iniciar actividades en obra. por lo anterior se insiste a ENTerritorio la necesidad de contar de manera oportuan con esta aprobación ya que se esta ocasionando perdidas de tiempos no imputables al contratista de obra

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.


Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.256.352,00	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.064,99	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.777,99	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.490,99	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.203,98	1,32%	$ 55.042.663,84
7	2,37%	$ 98.678.614,97	1,52%	$ 63.208.333,75
8	4,51%	$ 187.968.658,95	1,62%	$ 67.279.256,42
9	7,72%	$ 321.429.578,91	1,62%	$ 67.279.256,42
10	11,50%	$ 479.012.182,87	1,95%	$ 81.014.385,77
11	15,47%	$ 644.113.233,83		$ -
12	19,65%	$ 818.299.074,78		$ -
13	24,03%	$ 1.000.629.899,73		$ -
14	28,32%	$ 1.179.494.750,68		$ -
15	32,46%	$ 1.351.792.492,63		$ -
16	36,59%	$ 1.524.090.234,59		$ -
17	40,73%	$ 1.696.387.976,54		$ -
18	44,87%	$ 1.868.685.718,49		$ -
19	49,00%	$ 2.040.983.460,45		$ -
20	53,14%	$ 2.213.281.202,40		$ -
21	57,65%	$ 2.401.242.375,35		$ -
22	62,82%	$ 2.616.614.553,29		$ -
23	68,00%	$ 2.831.986.731,23		$ -
24	73,17%	$ 3.047.358.909,17		$ -
25	78,82%	$ 3.282.780.278,11		$ -
26	85,19%	$ 3.548.275.435,04		$ -
27	90,36%	$ 3.763.647.612,98		$ -
28	95,54%	$ 3.979.019.790,92		$ -
29	99,67%	$ 4.151.160.898,87		$ -
30	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	$ 4.164.944.718,00	1,95%	$ 81.014.385,77


$ 157.582.603,96

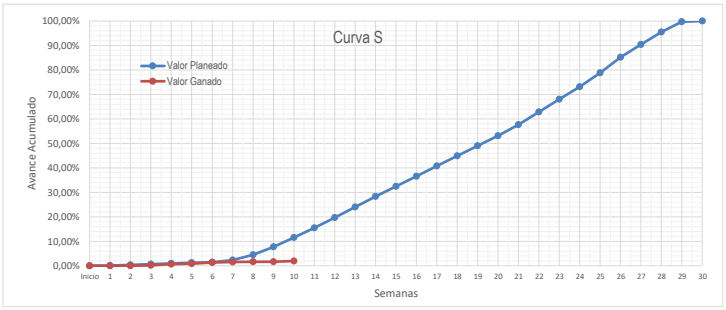

NOTA: Los porcentajes y valores económicos antes señalados corresponden a los establecidos en el Flujo de Inversión semanal allegado por el contratista de obra.

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$ 4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1 - DISEÑOS	0,18%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2 - DIAGNOSTICOS	3,15%	$ 131.342.174,45	78,65%	$ 103.299.618,69	55,99%	$ 73.540.171,75
3	ACTIVIDAD 3 - OBRA	96,67%	$ 4.026.128.329,40	9,15%	$ 368.403.899,42	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**11,51%**	**$ 479.177.732,13**	**1,95%**	**$ 81.014.385,77**

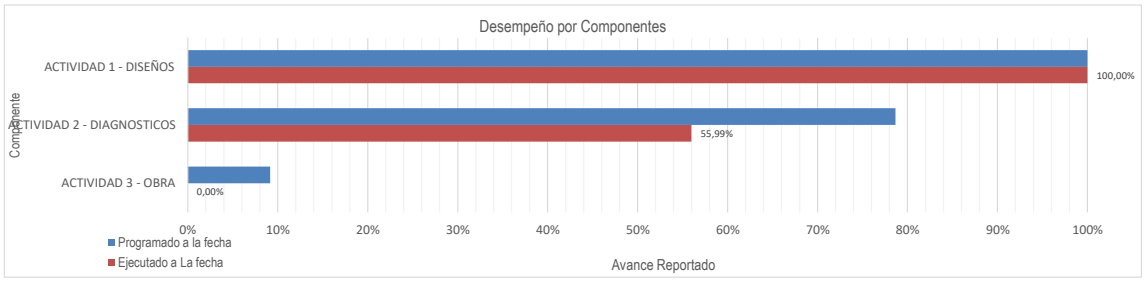

NOTA: Los valores antes señalados son aproximados, pues dependen del Flujo de inversión aportado por el contratista de obra

103 viviendas como no efectivas, se han presentado 21 renuncias y se tienen aprobados 209 diagnosticos

Ing. residente de obra. — ing residente interventoria CAEE

Domingo 29 de octubre 2023

No se laboró, dia festivo.

Ing residente de obra. — ing residente interventoria CAEE

Lunes 30 de octubre 2023.

- El contratista de obra realiza actividades administrativas organizando documentos y carpetas de diagnosticos realizados en la semana anterior.
Asi mismo el residente de obra organiza logistica para el suministro de materiales de ferreteria en el municipio de Istmina. Adicionalmente realiza visita al puente de la Encharcazon para validar avances de la construccion del puente.
En horas de la tarde se presentan lluvias de 2:00 pm a 5:00 PM. Adicionalmente no se cuenta con servicio de energia electrica. lo cual dificultó las actividades administrativas tanto de contratista de obra, como de interventoria.
En hora de la tarde se continua con la revision de la carpeta de diagnosticos y se da respuesta de las observaciones encontradas al contratista de obra, cabe aclarar que por falta de fluido electrico no se pudo realizar el comite de seguimiento.

Ing residente de Obra — Ing residente interventoria CAEE

Martes 31 de octubre 2023.

El contratista de obra continua realizando actividades administrativas, organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en la semana anterior.
En horas de la tarde se realiza diagnostico en barrio Nuevo proceso de inclusión, Actividad que estuvo acompañada por profesionales de Interventoría y trabajadora social de la empresa de servicios públicos.
Así mismo, el residente de obra en acompañamiento del residente de interventoría realizan visitas a viviendas que cuentan con casos especiales en barrio La Unión y el Rosario. y se realiza comite de aprobación No 6. donde se aprueban 37 diagnosticos

ing residente de obra CGE — ing. Residente interventoria CAEE

Miercoles 01 de Noviembre 2023.

Contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados la semana anterior, adicionalmente el contratista de obra remite a interventoria (11) once diagnosticos subsanados para su revisión y posterior aprobación.
Asi mismo el contratista de obra realiza actividades de informes mensuales de las diferentes areas, de acuerdo a las actividades adelantadas correspondientes al mes de octubre.
- Contratista de Obra realiza visita a viviendas con casos especiales en el barrio el Rosario para definir y concertar con los beneficiarios la posible intervención, actividad que estuvo a cargo por el residente de obra y contó con el acompañamiento del residente de interventoría.
En horas de la tarde se presentan lluvias, lo cual impide al contratista de obra adelantar actividades en campo

Powered by CamScanner

lluvias desde las 2:30 pm a 5:30 pm.
En horas de la tarde esta interventoria procede a la revisión de carpetas de diagnosticos subsanados, entrega por el contratista para ver si cumple con los requisitos minimos y programar comite de aprobación.
Horas de lluvia: 3 horas.

ing. residente de obra.

ing residente interventoria CAEC

Jueves 02 de Noviembre 2023.

El contratista de obra continua socialización casa a casa y realiza diagnosticos en el barrio el Rosario en acompañamiento de los profesionales de Interventoría.
En esta jornada se realizaron 5 diagnosticos efectivos y 5 diagnosticos no efectivos. Estos ultimos debido a que no cuentan con disponibilidad de la red de alcantarillado.
Por otra parte en horas de la tarde el contratista realiza actividades administrativas, para realizar entrega de los informes mensuales de las diferentes areas correspondientes al mes de octubre.
En horas de la tarde se presentaron lluvias desde las 3:00 pm - a 5:00 pm, motivo por el cual los equipos tecnicos y sociales no pudieron continuar con las actividades de campo programadas.
En horas de la tarde esta interventoria continua en la revisión de la carpeta de diagnosticos subsanados por el contratista y se procede a dar respuesta para realizar dicha aprobación.
Horas de lluvia: 2 horas.

ing. residente de obra.

ing residente interventoria CAEC

Powered by CamScanner

Viernes 03 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da continuidad a socialización caso a casa y realización de diagnosticos del barrio El Rosario, en esta jornada se lograron realizar 24 diagnosticos, de los cuales 8 viviendas fueron efectivas, 14 viviendas no efectivas y se presentaron 2 renuncias.
Adicionalmente el contratista de obra remitió 40 carpetas de diagnosticos a interventoría para su previa revisión y posterior aprobación.
En hora de la tarde esta interventoria da inicio a la revisión de la carpeta de diagnostico entregada por el contratista de obras y se participa en el comité de seguimiento No. 7 de forma virtual y se cuenta con la asistencia de los directos por parte de obra e interventoría, residentes y profesionales sociales de obra como de interventoria como también por parte de la entidad y se realiza comité de aprobación No. 7 donde se aprueban 41 diagnosticos.
Cabe resaltar que en este dia no se conto con servicio de energia electrica. lo cual dificulta las actividades administrativas del contratista de obra, como las actividades administrativas de interventoría

Ing. residente de obra

Ing Residente interventoria CAEE

Sabado 04 de Noviembre 2023.

El Contratista de obra realiza actividades administrativas. organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en el transcurso de la semana.
A la fecha se han visitado 487 viviendas. de las cuales se han diagnosticado 342 viviendas efectivas, 122 viviendas no efectivas, se han aprobado 257 viviendas y se han presentado. 23 renuncias.

Powered by CamScanner

Por otra parte. a la fecha no se ha podido dar inicio Con la actividad No 3, en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso constructivo, el contratista de obra se encuentra a espera por parte del ministerio de vivienda que se dé el VoBo de los diseños estructurales para poder realizar pedido del acero figurado. Cabe aclarar que el proveedor del acero requiere de 12 días hábiles para hacer entrega de este pedido, una vez se le realice la confirmación y validación de las cartillas de acero suministradas.
Esta interventoría continua con la revisión de la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para ver si cumple con la documentación requerida para su aprobación.

Ing residente de obra.

Ing residente interventoría CAEE

Domingo 05 de Noviembre 2023.

. No se laboró, día festivo.

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoría CAEE

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **6/11/2023** al **12/11/2023** Fecha **12/11/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2230223	
Contratista	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	
Valor inicial	$ 4.164.944.717,87	
Valor actual	$ 4.164.944.717,87	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	24/03/2024	
Tiempo Transcurrido (días)	81	38,57%
Días remanentes del Contrato	133	63,33%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220219	
Interventor	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	
Valor inicial	$ 396.843.968,13	
Valor actual	$ 396.843.968,13	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	8/04/2024	
Ejecución del Contrato	81	36,00%
Días remanentes del Contrato	148	65,78%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 102.150.031,02	2,45%	$ 81.014.385,77	1,95%	-$ 21.135.645,25	-0,51%
Durante el Periodo	$ 10.033.083,00	0,24%	$ 11.445.941,13	0,27%	$ 1.412.858,13	0,03%
Acumulado a la Fecha	**$ 112.183.114,02**	**2,69%**	**$ 92.460.326,90**	**2,22%**	**-$ 19.722.787,12**	**-0,47%**

Semaforo

Desviación en días

-1 Días

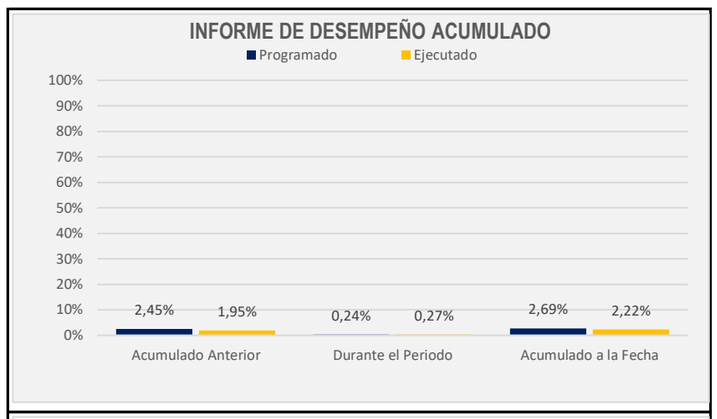

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

Durante el periodo los diseños arquitectonicos y estructurales se encuentran avalados por la interventoría

ACTIVIDAD No. 2

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico y para realizar entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. La interventoría efectua devolución de carpetas entregadas por el contratista; lo anterior para su subsanación correspondiente. Así mismo, por tal motivo se procede a reportar una ejecución de 297 diagnósticos aprobados. Se espera que el contratista de obra subsane las carpetas que fueron devueltas con el ánimo de proceder a aprobar nuevas intervenciones. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad.


ACTIVIDAD No. 3


A la fecha no se ha dado inicio a la actividad No. 3. Se aclara que para esta actividad se encuentan en los tiempos de acopio de materiales para su ejecución.

OBSERVACION GENERAL DE DESEMPEÑO:

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 0,47% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 2,69%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,22% de ejecución.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

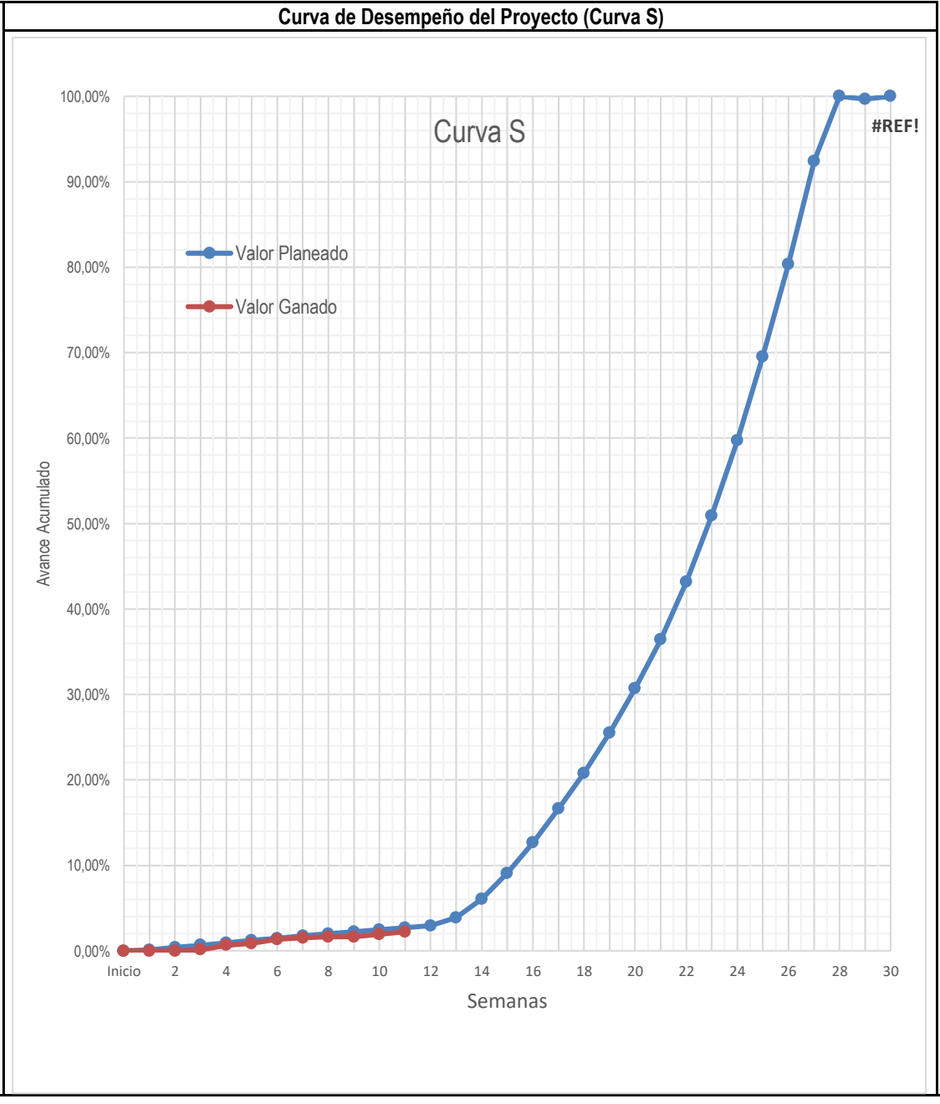

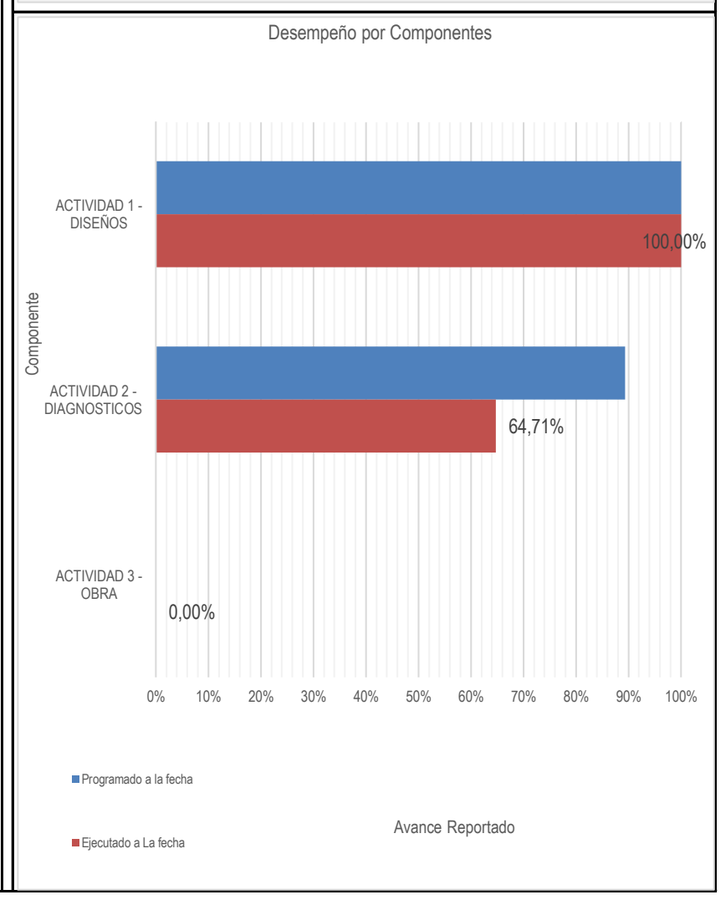

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

Durante el periodo se efectuó cambios sobre el plan de trabajo ya que se aprueba el plan de contingencia V2 remitido por el contratista, no se contó con cambios en tiempos, tampoco hay modificaciones en los valores económicos del contrato de obra e interventoría.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **6/11/2023** al **12/11/2023** Fecha **12/11/2023**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	2,45%	1,95%	-0,51%	
Durante el Periodo	0,24%	0,27%	0,03%	
Acumulado a la Fecha	**2,69%**	**2,22%**	**-0,47%**	

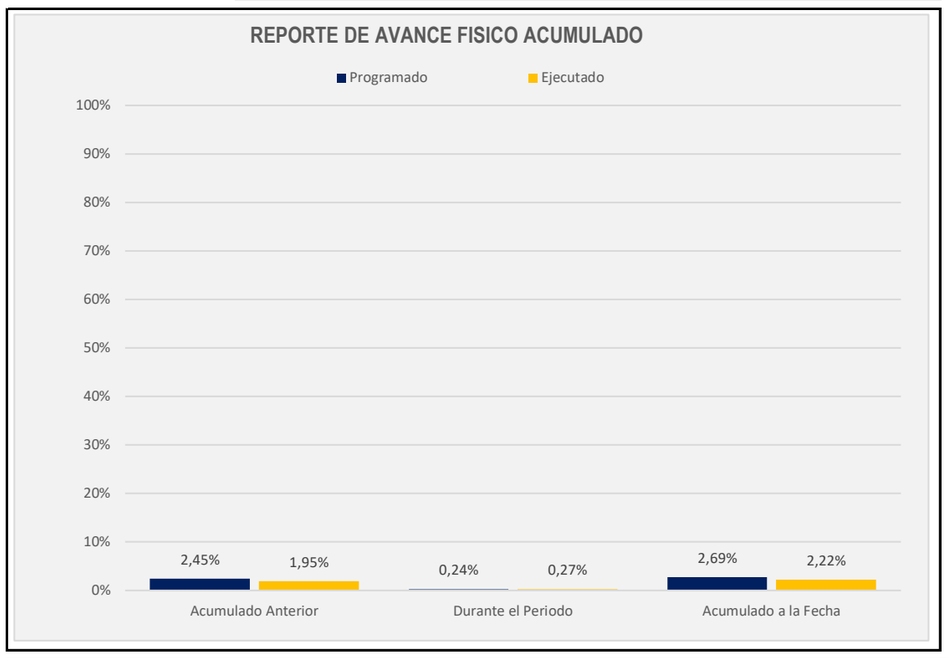



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 396.843.968,13	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -



OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico para despues realizar la entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad. Adicionalmente se espera por parte de Ministerio y la entidad contratante aprobación de las viviendas que requieren conexión domiciliaria con tramos de tuberias superiores a los 10 metros.

Durante el periodo se realiza comité de seguimiento No. 8 el dia 10 de noviembre del 2023 y se realiza comite de aprobacion No. 8 el dia 10 de noviembre del 2023

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la Semana comprendida del 06 de noviembre al 12 de noviembre se realizó lo siguiente:

Lunes 06 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Martes 07 de noviembre del 2023: Esta interventoría realiza actividades administrativas, se revisa la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con la mínima documentación para su respectiva aprobación.

Miércoles 08 de noviembre del 2023: En horas de la mañana se presentan fuertes lluvias desde las 7:00 am a 9 am, lo cual dificulta al contratista de obra realizar las actividades de campo que tiene programadas, de igual manera el contratista de obra continua en la realización de diagnósticos en el barrio El Rosario, actividad que se cuenta con el acompañamiento de esta interventoría, en donde se logra diagnosticar 6 viviendas efectivas y 5 viviendas cómo no efectivas. Así mismo se recibe por parte del contratista de obra el oficio con 40 carpetas de diagnósticos subsanadas y 25 diagnósticos para su previa revisión y posterior aprobación.

Jueves 09 de noviembre del 2023: El contratista de obra da continuidad de la socialización casa a casa en barrio El Rosario, en esta actividad se cuenta con el acompañamiento de esta interventoría, en esta jornada se logra diagnosticar 2 viviendas efectivas. En horas de la tarde se da inicio a la revisión de la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con los requisitos mínimos requeridos para su aprobación.

Viernes 10 de noviembre del 2023: Esta interventoría continua con la revisión de las carpetas de diagnósticos entregadas por el contratista de obra. En horas de la tarde se participa en el comité de seguimiento No 8 y comité de aprobación No 8.

Sábado 11 de noviembre del 2023: Esta interventoría continua con la revisión de las carpetas de diagnósticos entregadas por el contratista de obra, a la fecha se han visitado 499 viviendas, de las cuales se han diagnosticado 350 viviendas efectivas, 125 viviendas cómo no efectivas, se han aprobado 297 viviendas, y se han presentado 24 renuncias.

Domingo 12 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2023-120 Respuesta comunicado No. 118 Observaciones Diagnosticos 20234300375082
CAEE-RI-2023-121 Entrega Informe semanales No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 20234300375222
CAEE-RI-2023-122 Respuesta a comunicado No. 114 - Plan de Contingencia 20234300377772
CAEE-RI-2023-123 Respuesta comunicado 115 Anticipo 20234300378192

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **6/11/2023** al **12/11/2023** Fecha **12/11/2023**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra empezará socialización casa a casa en el tercer barrio priorizado, una vez se realice la socialización sectorizada del PCI por parte de los entes Territoriales.
2. Nivelar actividad No 2. acorde a la programación de actividades presentada y aprobada.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

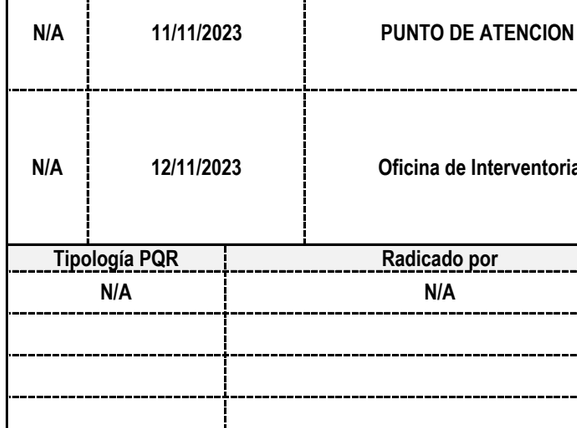

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	38	8	46	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**38**	**8**	**46**	**100,00%**

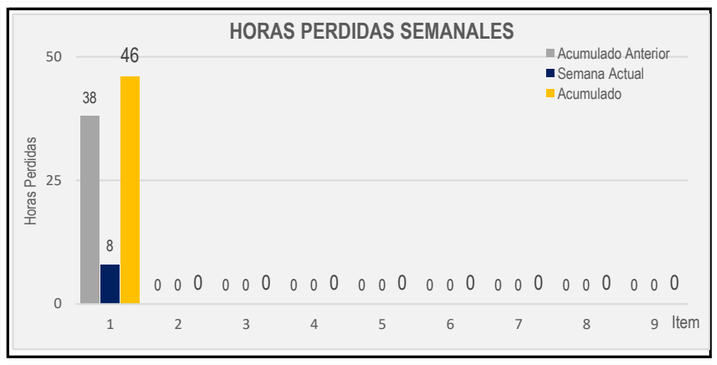

Durante el periodo no se presentan accidentes o incidentes de trabajo.
Por otra parte el día Miercoles 08 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 7:00 am - 9:00 am
el día viernes 10 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 3:00 pm - 6:00 pm
el día sábado 11 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 2:30 pm - 5:30 pm

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Actividades realizadas	Responsable	Fecha
N/A	6/11/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	No se realizaron actividades dia festivo	Contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	7/11/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se ralizaron actividades administrativas y elaboracion de informes	Contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	8/11/2023	barrio el Rosario	7,00	Se realizaron visitas de socializacion casa a casa en el barrio el Rosario a 7 potenciales beneficiarios	contratista de obra	NA
N/A	9/11/2023	barrio el Rosario	2,00	se realizaron visitas de socializacion casa a casa a 2 potenciales beneficiarios, con el acompañamiento de esta Interventoria y un miembro de la veeduria del Proyecto. Se recibio respuesta de las 14 PQR, por solicitud de inclusion por parte del operador del servicios publicos.	Contratista de obra	NA
N/A	10/11/2023	PUNTO DE ATENCION	0,00	Se realizaron actividades abministrativas	contratista de obra e interventoria	NA
N/A	11/11/2023	PUNTO DE ATENCION	N/A	Se realizaron actividades abministrativas	Contratista de obra e Interventoria	NA
N/A	12/11/2023	Oficina de Interventoria	N/A	Se realizo elaboracion de informes semanales	Interventoria	NA

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **6/11/2023** al **12/11/2023** Fecha **12/11/2023**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografia 1. Visita de socializacion casa a casa a los potenciales beneficiarios para explicar la construcción de las unidades sanitarias y concertar el lugar de la posible intervencion en sus viviendas.



Fotografia 2. Formaletas y moldes para la realizacion de lavaderos



Fotografia 3. Socializaciones casa a casa en el barrio el Rosario, con el acompañamiento del secretario de planeacion, interventoría y social de ESP



Fotografia 4. Socializaciones casa a casa en el barrio el Rosario, con el acompañamiento del secretario de planeacion, interventoría y social de ESP



Fotografia 5. Acopio de materiales petreos por parte del contratista



Fotografia 6. Socializaciones casa a casa en el barrio el Rosario, con el acompañamiento del secretario de planeacion, interventoría y social de ESP

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se da inicio el día 24 de agosto de 2023 con la actividad No. 1 (Diseños Estructurales y arquitectónicos) y Actividad No. 2 (Diagnostico y concertación). Cabe señalar que durante el periodo el contratista de obra adelanta actividades de soclialización y diagnósticos casa a casa, así mismo remite carpetas de diagnósticos a la interventoría para su revisión y/u observación o aprobación.

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 0,47% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 2,69%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,22% de ejecución.

Es importante aclarar que el atraso presentado se debe a que a la fecha se deben estar ejecucando actividades en obra sin embargo por situación ajenas y no imputables al contratista de obra no se habia podido avanzar en esta actividad. Cabe señalar que a la fecha nos encontramosa a la espera que el Ministerio de Viveinda apruebe el cambio de metodología propuesta, pues si no se cuenta con esta aprobación el contratista no podrá iniciar actividades en obra. por lo anterior se insiste a ENTerritorio la necesidad de contar de manera oportuan con esta aprobación ya que se esta ocasionando perdidas de tiempos no imputables al contratista de obra


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventorí

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87


Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.256.352,00	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.065,01	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.778,01	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.491,01	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.204,01	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.782,02	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.865,02	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.948,02	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.031,02	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.114,02	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.197,03		$ -
13	3,89%	$ 162.009.799,03		$ -
14	6,06%	$ 252.219.630,05		$ -
15	9,08%	$ 378.153.616,08		$ -
16	12,65%	$ 526.956.211,11		$ -
17	16,63%	$ 692.675.312,14		$ -
18	20,77%	$ 864.973.054,18		$ -
19	25,51%	$ 1.062.332.286,22		$ -
20	30,68%	$ 1.277.704.464,27		$ -
21	36,41%	$ 1.516.571.788,32		$ -
22	43,16%	$ 1.797.730.376,38		$ -
23	50,93%	$ 2.121.180.228,44		$ -
24	59,71%	$ 2.486.921.344,52		$ -
25	69,51%	$ 2.894.953.724,60		$ -
26	80,32%	$ 3.345.277.368,70		$ -
27	92,42%	$ 3.849.169.946,80		$ -
28	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
29	99,67%	$ 4.151.160.898,87		$ -
30	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	**$ 4.164.944.718,00**	**2,22%**	**$ 92.460.326,90**

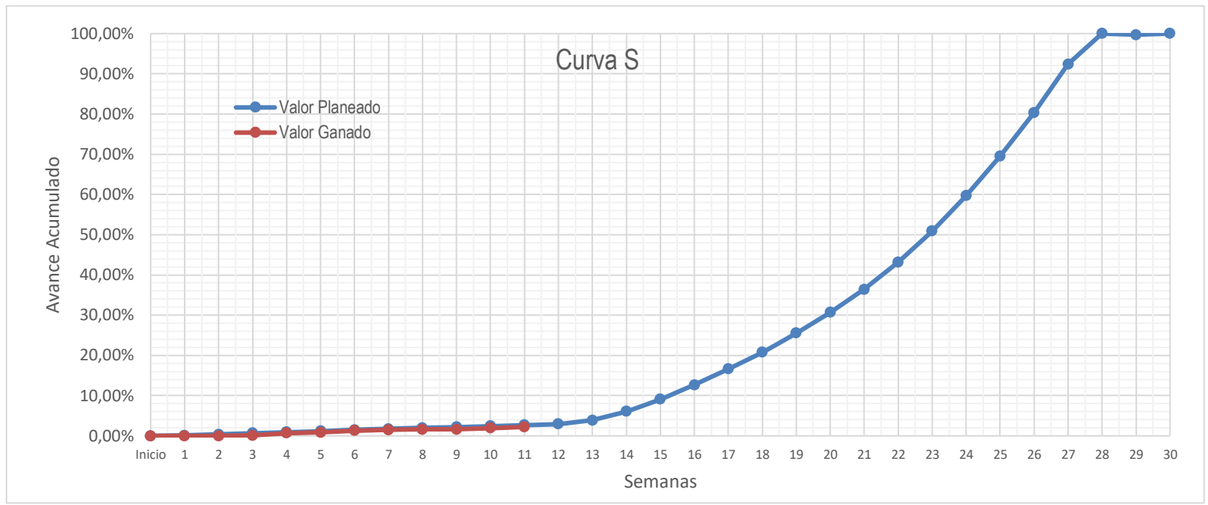

NOTA: Los porcentajes y valores económicos antes señalados corresponden a los establecidos en el Flujo de Inversión semanal allegado por el contratista de obra.

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1 - DISEÑOS	0,18%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2 - DIAGNOSTICOS	3,15%	$ 131.342.174,45	89,32%	$ 117.320.896,57	64,71%	$ 84.986.112,88
3	ACTIVIDAD 3 - OBRA	96,67%	$ 4.026.128.329,40	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**3,00%**	**$ 124.795.110,59**	**2,22%**	**$ 92.460.326,90**

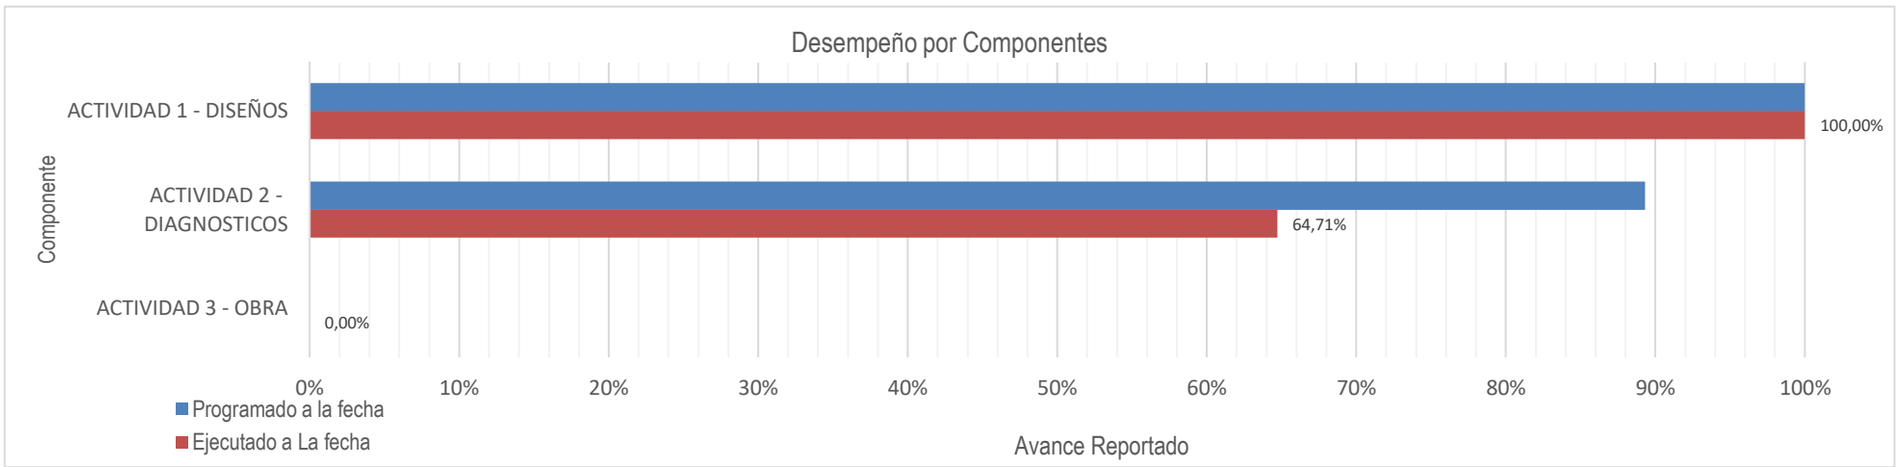

NOTA: Los valores antes señalados son aproximados, pues dependen del Flujo de inversión aportado por el contratista de obra

Por otra parte. a la fecha no se ha podido dar inicio Con la actividad No 3, en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso constructivo, el contratista de obra se encuentra a espera por parte del ministerio de Vivienda que se dé el VoBo. de los diseños estructurales para poder realizar pedido del acero figurado. Cabe aclarar que el proveedor del acero requiere de 12 dias habiles para hacer entrega de este pedido, una vez se le realice la confirmación y validación de las certillas de acero suministradas.

Esta interventoría continua con la Revisión de la carpeta de diagnosticos entregada por el contratista para ver si cumple con la documentación requerida para su aprobación.

Ing residente de Obra.

Ing residente interventoría CAEE

Domingo 05 de Noviembre 2023.

. No se laboró, día festivo.

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoría CAEE

Lunes 06 de Noviembre 2023

No se laboró. día festivo

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoría CAEE

Powered by CamScanner

Marte 07 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos y carpetas de diagnosticos realizados en la semana anterior
Adicionalmente se adelanta el informe semanal por parte del contratista de obra
En horas de la tarde se le da respuesta al contratista con las observaciones encontradas en la carpeta de diagnosticos para la respectiva subsanación y posterior a su aprobación.

Ing. residente de Obra

Ing. Residente Interventoria CRE

Miercoles 08 de Noviembre 2023

- El contratista de obra da continuidad a la actividad de socialización casa a casa en barrio El Rosario. actividad que contó con el acompañamiento de Interventoria. en esta jornada se lograron realizar 6 diagnosticos efectivos y 5 diagnosticos no efectivos. Cabe resaltar que en horas de la mañana se presentaron fuertes lluvias desde las 7:00 am a 9:00 am, tampoco se contó con servicio de energia electrica durante todo el dia.
Adicionalmente por parte del contratista de obra se remitieron 40 diagnosticos subsanados para revisión y previa aprobación
Asi mismo se remitio carpeta adicional con 25 diagnostico para revisión.
En este dia llegaron 10 toneladas de cemento para el desarrollo del proyecto.
En horas de la tarde se da inicio a la revisión de la carpeta de diagnosticos entregado por el contratista para validar se cumple o no con los requisitos mínimos y posteriormente su aprobacion.
Horas de lluvia: 2 horas.

Powered by CamScanner

Ing residente de obra

Ing residente interventoria CM

Jueves 09 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da continuidad de la socialización casa a casa en el barrio El Rosario, esta actividad contó con el acompañamiento de Interventoria, en esta jornada se lograron identificar 2 viviendas como efectivas ts importante resaltar que ala fecha el contratista de obra ha visitado el 99% de las viviendas de la matriz inicial, motivo por el cual no se le pueden imputar cargos de incumplimiento. que llegasen a presentarse por presuntos atrasos en esta actividad.
En horas de la tarde el contratista de obra realiza actividades administrativas, organizando documentos de los diagnosticos realizados.
en horas de la tarde esta interventoria continua con la revisión de la carpeta de diagnosticos para verificar si cumple con la documentacion minima para su aprobacion.

Ing residente de obra.

Ing residente interventoria CM

Viernes 10 de Noviembre 2023.

El contratista de obra adelanta actividades administrativas durante todo el dia. En horas de la tarde el contratista de obra participó en el comite de seguimiento N°8 y comité de aprobación N°8 donde se aprobaron 40 diagnosticos
Esta interventoria continua con la revisión de la carpeta de diagnosticos para verificar si cumple con la documentacion minima para su aprobación y darle respuesta al contratista de obras.

Powered by CamScanner

En horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias de 3:00 PM - 6:00 PM.
Horas de lluvia: 3 horas

Ing. residente de obra

Ing. Residente de interventoría

Sabado 11 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza actividades administrativas, Organizando documentos y anexos de los diagnosticos realizados en el transcurso de la semana, a la fecha se han visitado 499 viviendas, de las cuales 350 viviendas efectivas, 125 viviendas como no efectivas, se han aprobado 297 viviendas y se han presentado 24 renuncias.
En el periodo de corte a esta fecha no se ha dado inicio a las actividades de construcion en intervenciones delosbarrios priorizados, debido a que el contratista de Obra se encontraba a la espera por parte del ministerio de Vivienda se diera el VoBo de los diseños estructurales para proceder a realizar el Pedido del acero figurado, VoBo que fue confirmado el día viernes 10 de Noviembre al finalizar la tarde en el comité de seguimiento.
Cabe aclarar que el proveedor del acero requiere de 12 dias habiles para hacer entrega del pedido, una vez se le sea confirmada y validada las cartillas de acero por parte del contratista para realizar su respectiva figuración.
El contratista de obra da inicio a las actividades preliminares para la elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la Revisión de la interventoria ya que no se ha remitido a esta interventoria los diseños de mezclas, documentación de calidad de materiales, ensayos de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la Responsabilidad del contratista

En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias lo cual afecta las actividades de campo. Lluvias presentadas entre las 2:30 PM- 5:30 PM.
Horas de lluvia: 3 horas

ing. residente de obra.

ing residente interventoria

Domingo 12 de Noviembre 2023

El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que no se ha remitido los diseños de mezclas, temas de documentación de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y estas actividades se realiza bajo la Responsabilidad del contratista

ingr residente de obra.

ing residente interventoria

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **13/11/2023** al **19/11/2023** Fecha **19/11/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2230223	
Contratista	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	
Valor inicial	$ 4.164.944.717,87	
Valor actual	$ 4.164.944.717,87	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	24/03/2024	
Tiempo Transcurrido (días)	88	41,90%
Días remanentes del Contrato	126	60,00%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220219	
Interventor	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	
Valor inicial	$ 396.843.968,13	
Valor actual	$ 396.843.968,13	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	8/04/2024	
Ejecución del Contrato	88	39,11%
Días remanentes del Contrato	141	62,67%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

Semaforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 112.183.114,02	2,69%	$ 92.460.326,90	2,22%	-$ 19.722.787,12	-0,47%
Durante el Periodo	$ 10.033.083,00	0,24%	$ 8.298.307,32	0,20%	-$ 1.734.775,68	-0,04%
Acumulado a la Fecha	**$ 122.216.197,03**	**2,93%**	**$ 100.758.634,22**	**2,42%**	**-$ 21.457.562,81**	**-0,52%**

Desviación en días

-1 Días

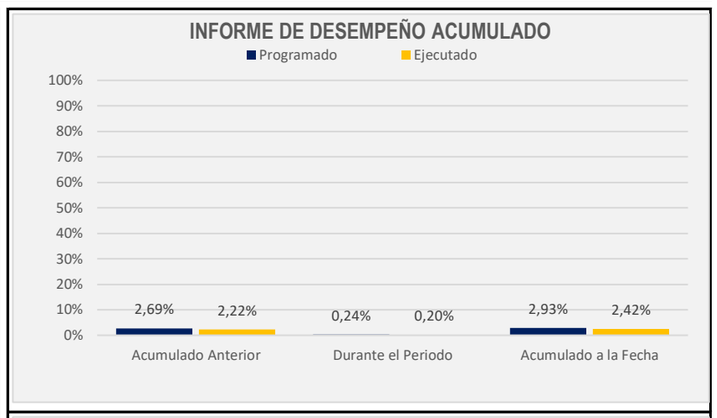

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

Durante el periodo los diseños arquitectonicos y estructurales se encuentran avalados por la interventoría

ACTIVIDAD No. 2

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico y para realizar entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. La interventoría efectua devolución de carpetas entregadas por el contratista; lo anterior para su subsanación correspondiente. Así mismo, por tal motivo se procede a reportar una ejecución de 326 diagnósticos aprobados. Se espera que el contratista de obra subsane las carpetas que fueron devueltas con el ánimo de proceder a aprobar nuevas intervenciones. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad.


ACTIVIDAD No. 3


A la fecha no se ha dado inicio a la actividad No. 3. Se aclara que para esta actividad se encuentan en los tiempos de acopio de materiales para su ejecución segun plan de contingencia V2.

OBSERVACION GENERAL DE DESEMPEÑO:

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 0,52% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 2,93%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

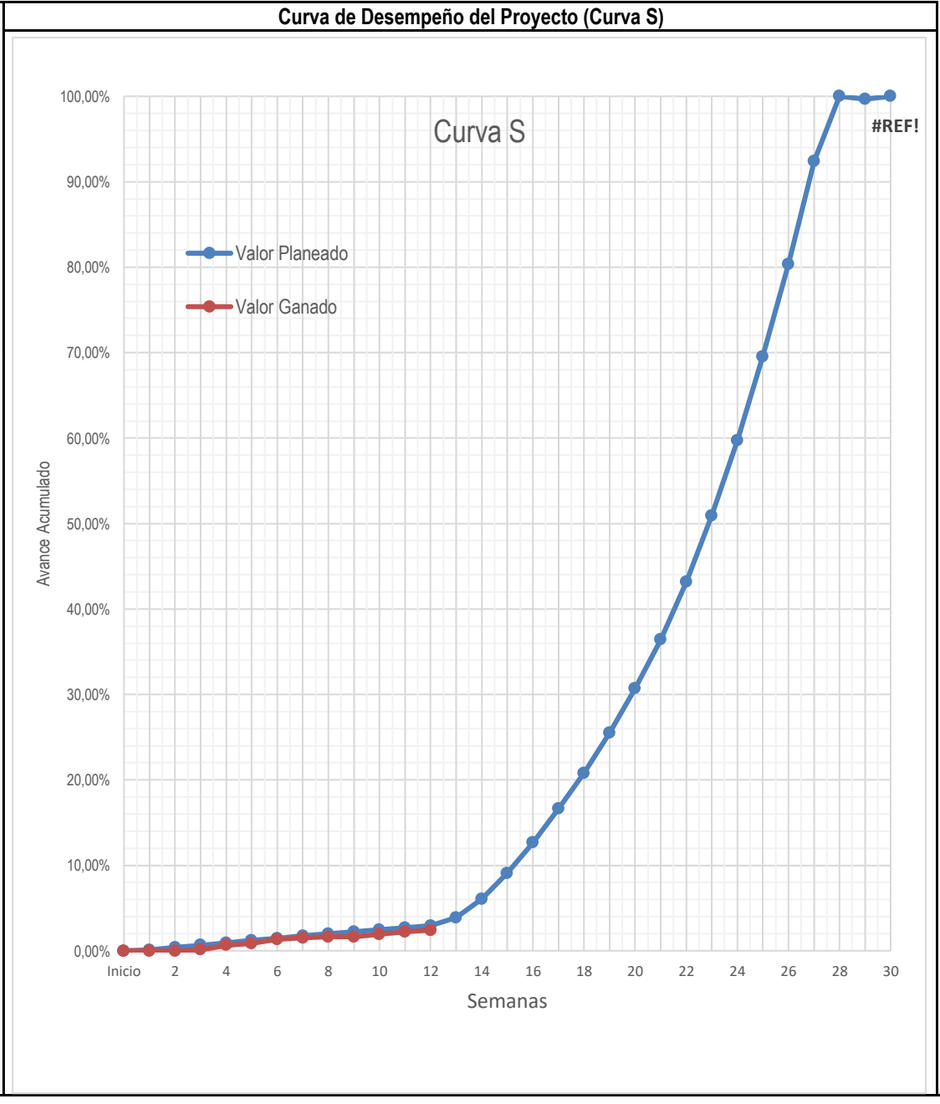

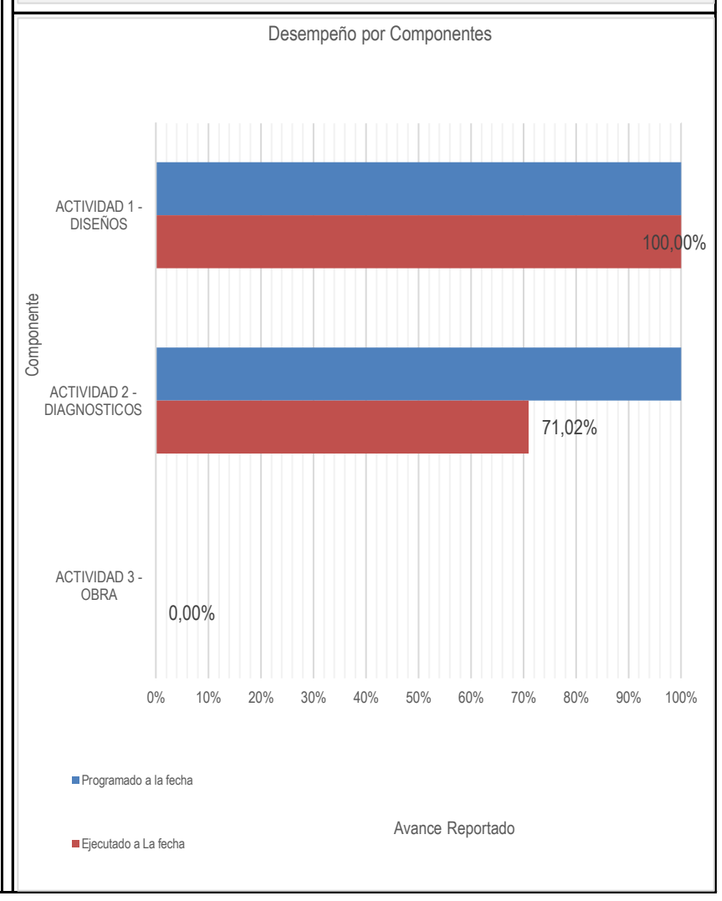

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

Durante el periodo se efectuó cambios sobre el plan de trabajo ya que se aprueba el plan de contingencia V2 remitido por el contratista, no se contó con cambios en tiempos, tampoco hay modificaciones en los valores económicos del contrato de obra e interventoría.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **13/11/2023** al **19/11/2023** Fecha **19/11/2023**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	2,69%	2,22%	-0,47%	
Durante el Periodo	0,24%	0,20%	-0,04%	
Acumulado a la Fecha	**2,93%**	**2,42%**	**-0,52%**	

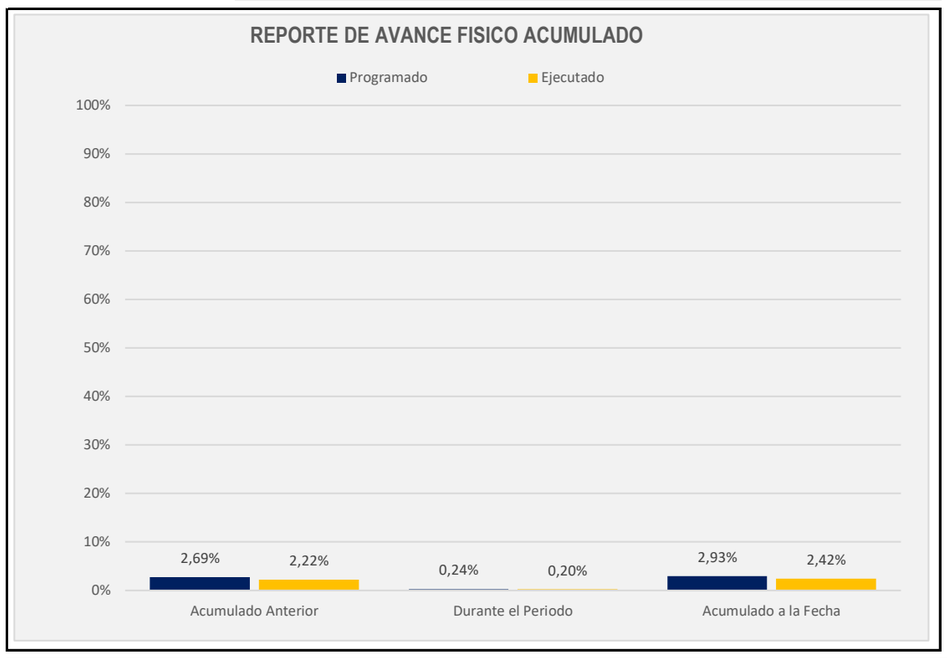



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 396.843.968,13	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 42.330.023,26	10,67%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico para despues realizar la entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad. Adicionalmente se espera por parte de Ministerio y la entidad contratante aprobación de las viviendas que requieren conexión domiciliaria con tramos de tuberias superiores a los 10 metros.

Durante el periodo no se realiza comité de seguimiento y se realiza comite de aprobacion No. 9 el dia 17 de noviembre del 2023

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la Semana comprendida del 13 de noviembre al 19 de noviembre se realizó lo siguiente:

Lunes 13 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Martes 14 de noviembre del 2023: Esta interventoría realiza actividades administrativas, se revisa la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con la mínima documentación para su respectiva aprobación. En horas de la tarde se presenta lluvias desde las 02:30 pm hasta las 03:30 pm.

Miércoles 15 de noviembre del 2023: En horas de la mañana se presentan lluvias imtermitentes desde las 07:00 am hasta las 09:00 am y desde las 01:00 pm hasta las 04:30 pm, lo cual dificulta al contratista de obra realizar las actividades de campo que tiene programadas, de igual manera se realiza inspeccion en los diferentes centros de acopio de materiales que tiene el contratista para verificar el estado de estos. se recibe por parte del contratista una carpeta de diagnocticos con 25 diagnosticos subsanados y otra carpeta con 14 diagnosticos para su revision y posteriormente su aprobacion.

Jueves 16 de noviembre del 2023: El contratista de obra da continuidad con el proceso de inclusion y la socialización casa a casa en barrio La Unión, en esta actividad se cuenta con el acompañamiento de esta interventoría, en esta jornada se logra diagnosticar 6 viviendas efectivas. En horas de la tarde se da inicio a la revisión de la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con los requisitos mínimos requeridos para su aprobación.

Viernes 17 de noviembre del 2023: Esta interventoría continua con la revisión de las carpetas de diagnósticos entregadas por el contratista de obra. En horas de la tarde se participa en el comité de aprobación No 9. se presentan lluvias intermitentes en horas de la tarde desde las 1:00pm hasta las 05:30pm

Sábado 18 de noviembre del 2023: Esta interventoría continua con la revisión de las carpetas de diagnósticos entregadas por el contratista de obra, a la fecha se han visitado 505 viviendas, de las cuales se han diagnosticado 356 viviendas efectivas, 125 viviendas cómo no efectivas, se han aprobado 326 viviendas, y se han presentado 24 renuncias.

Domingo 19 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2023-124 Llamado de atencion - ejecución de actividades, autorizacion 20234300379852
CAEE-RI-2023-125 Entrega informe semanal social 10 y 11 20234300379872
CAEE-RI-2023-126 Entrega Informe mensual social No. 2 20234300380032
CAEE-RI-2023-127 Solicitud de cronograma de actividades social 20234300380022
CAEE-RI-2023-128 Respuestas comunicado No. 112 Observaciones diagnosticos 20234300380072
CAEE-RI-2023-129 Solciitud documentación del barrido de la matriz 20234300382192
CAEE-RI-2023-129 Solicitud de documentacion del barrido matriz inicial 20234300382192
CAEE-RI-2023-130 Notificacion presunto incumplimiento 20234300383942
CAEE-RI-2023-132 Notificacion presunto incumplimiento 20234300384022
CAEE-RI-2023-133 Informe presunto incumplimeinto 20234300384742
CAEE-RI-2023-134 Entrega Informe mensual No. 2 20234300386522
CAEE-RI-2023-135 Notifiaccion presunto incumplimiento 20234300386012
CAEE-RI-2023-136 Respuesta comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-074 Obs. Inform 20234300388572
CAEE-RI-2023-139 Respuesta Comunicado No. 123 - Diagnósticos 20234300385912
CAEE-RI-2023-140 Respuesta comunicado No. 124 Diagnosticos 20234300385702
CAEE-RI-2023-141 Solciitud cambio Tecnico PGIO 2 20234300385932
CAEE-RI-2023-142 Respuesta a comunicadO no. PPDI-OF-CGE-23-125 20234300388692

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **13/11/2023** al **19/11/2023** Fecha **19/11/2023**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra empezará socialización casa a casa en el tercer barrio priorizado, una vez se realice la socialización sectorizada del PCI por parte de los entes Territoriales.
2. Nivelar actividad No 2. acorde a la programación de actividades presentada y aprobada.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

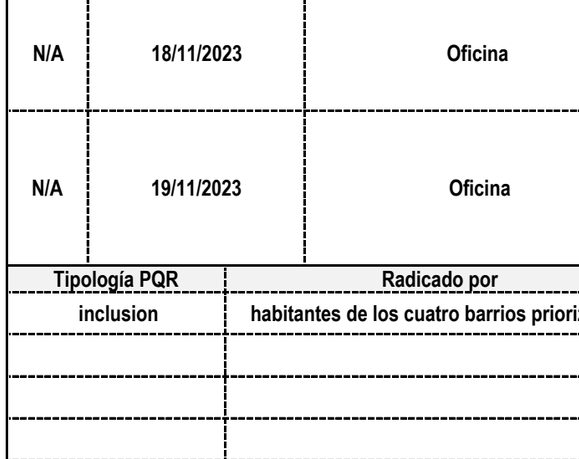

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	46	11	57	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**46**	**11**	**57**	**100,00%**

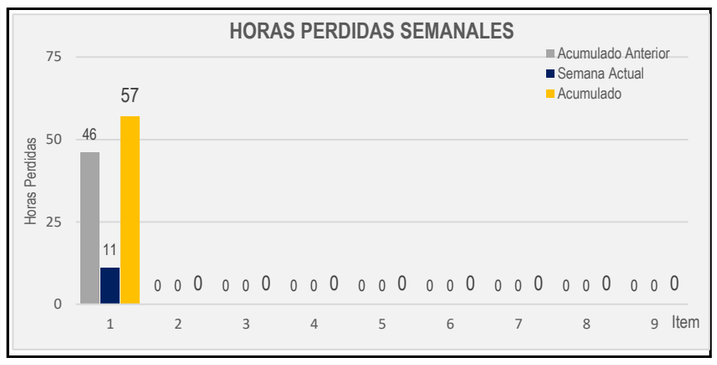

Durante el periodo no se presentan accidentes o incidentes de trabajo.
El día martes 14 de noviembre del 2023 se presenta lluvias desde las 2:30pm hasta las 3:30 pm
El día Miercoles 15 de Noviembre se presentan fuertes lluvias desde las 07:00 am hasta las 09:00 am y desde las 01:00 pm hasta las 04:30 pm
El día viernes 17 de Noviembre se presentan lluvias desde las 01:00 pm - 5:30 pm

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Actividades realizadas	Responsable	Fecha
N/A	13/11/2023	N/A	N/A	No se realizaron actividades dia festivo	N/A	N/A
N/A	14/11/2023	PAC	6,00	Se realizaron actividades abministrativa	contratista de obra e Interventoria	N/A
N/A	15/11/2023	Barrios Nuevo y la Union	14,00	Se realizo cierre de las 14 PQR por solicitud de barrio Nuevo y la Union, de igual forma, se reaizo perifoneo para la oferta de empleo en barrio nuevo, instalacion de cartelera y entrga de volante. Asi mismo, se realizaron 5 visitas de socializacion casa a casa	contratista de obra	N/A
N/A	16/11/2023	Barrio Nuevo y la Real, la union y el Rosario	24,00	Se recepcionaron 24 PQR por solicitud de barrio Nuevo y la Union, de igual forma, se reaizo perifoneo para la oferta de empleo en barrio la real , instalacion de cartelera y entrega de volante.	contratista de obra	N/A
N/A	17/11/2023	PAC	22,00	Se atendieron 22 personas para la recepcion de hojas de vida e informacion de la Oferta de empleo, se realizaron 2 visitas de socializacion casa a casa	contratista de obra	N/A
N/A	18/11/2023	Oficina	N/A	Se realizaron actividades administraivas	contratistas de obra e Interventoria	N/A
N/A	19/11/2023	Oficina	N/A	No se realizo actividades administrativas	Interventoria	N/A

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
inclusion	habitantes de los cuatro barrios priorizados	14 y 15 denoviembre	PQR por solicitud de inclusion al Proyecto	contratista de obra e Interventoria

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **13/11/2023** al **19/11/2023** Fecha **19/11/2023**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía 1. Realización de lavaderos, actividad no cuenta con la supervisión y aprobación de esta interventoría.



Fotografía 2. Acopio de ceramica en bodega.



Fotografía 3. Realización de visitas casa a casa del proceso de inclusión en el barrio La Unión, actividad cuenta con el acompañamiento de interventoría.



Fotografía 4. Atención a la comunidad por parte del área social



Fotografía 5. Realización de perifoneo para la oferta de empleo del personal MONC



Fotografía 6. Instalación de carteleras para la divulgación de la oferta de empleo

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se da inicio el día 24 de agosto de 2023 con la actividad No. 1 (Diseños Estructurales y arquitectónicos) y Actividad No. 2 (Diagnostico y concertación). Cabe señalar que durante el periodo el contratista de obra adelanta actividades de soclialización y diagnósticos casa a casa, así mismo remite carpetas de diagnósticos a la interventoría para su revisión y/u observación o aprobación.

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 0,52% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 2,93%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Durante el periodo se presentan lluvias los dias martes 14 de noviembre, miercoles 15 de noviembre y viernes 17 de noviembre de 2023.

Es importante aclarar que el atraso presentado se debe a que a la fecha se deben estar ejecucando actividades en obra sin embargo por situación ajenas y no imputables al contratista de obra no se habia podido avanzar en esta actividad. Cabe señalar que a la fecha nos encontramosa a la espera que el Ministerio de Viveinda apruebe el cambio de metodología propuesta, pues si no se cuenta con esta aprobación el contratista no podrá iniciar actividades en obra. por lo anterior se insiste a ENTerritorio la necesidad de contar de manera oportuan con esta aprobación ya que se esta ocasionando perdidas de tiempos no imputables al contratista de obra


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventorí

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87


Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.256.352,00	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.065,01	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.778,01	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.491,01	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.204,01	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.782,02	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.865,02	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.948,02	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.031,02	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.114,02	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.197,03	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,89%	$ 162.009.799,03		$ -
14	6,06%	$ 252.219.630,05		$ -
15	9,08%	$ 378.153.616,08		$ -
16	12,65%	$ 526.956.211,11		$ -
17	16,63%	$ 692.675.312,14		$ -
18	20,77%	$ 864.973.054,18		$ -
19	25,51%	$ 1.062.332.286,22		$ -
20	30,68%	$ 1.277.704.464,27		$ -
21	36,41%	$ 1.516.571.788,32		$ -
22	43,16%	$ 1.797.730.376,38		$ -
23	50,93%	$ 2.121.180.228,44		$ -
24	59,71%	$ 2.486.921.344,52		$ -
25	69,51%	$ 2.894.953.724,60		$ -
26	80,32%	$ 3.345.277.368,70		$ -
27	92,42%	$ 3.849.169.946,80		$ -
28	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
29	99,67%	$ 4.151.160.898,87		$ -
30	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	**$ 4.164.944.718,00**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

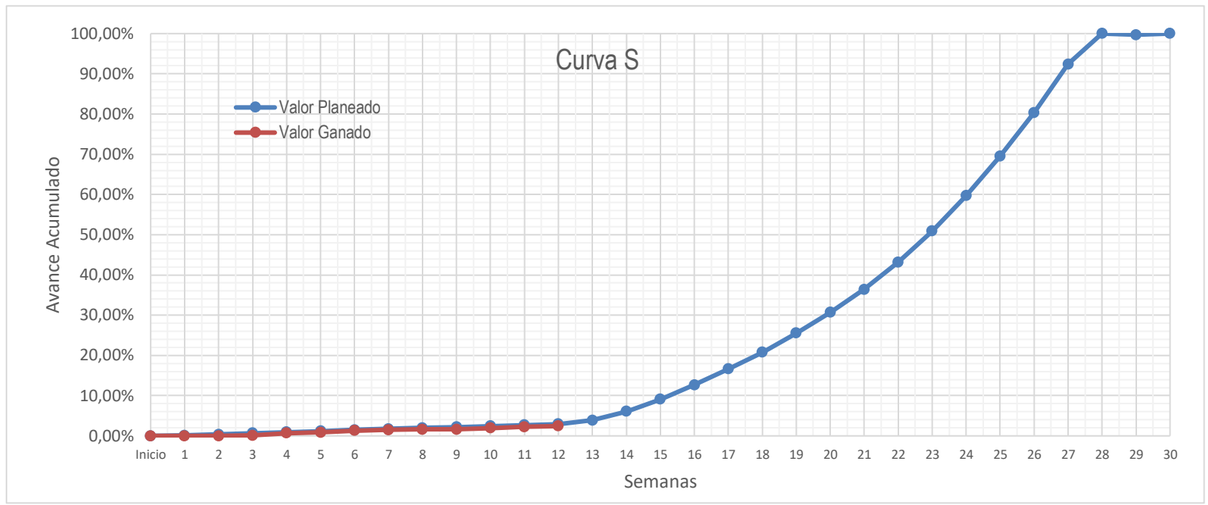

NOTA: Los porcentajes y valores económicos antes señalados corresponden a los establecidos en el Flujo de Inversión semanal allegado por el contratista de obra.

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1 - DISEÑOS	0,18%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2 - DIAGNOSTICOS	3,15%	$ 131.342.174,45	100,00%	$ 131.342.174,45	71,02%	$ 93.284.420,20
3	ACTIVIDAD 3 - OBRA	96,67%	$ 4.026.128.329,40	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**3,33%**	**$ 138.816.388,47**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

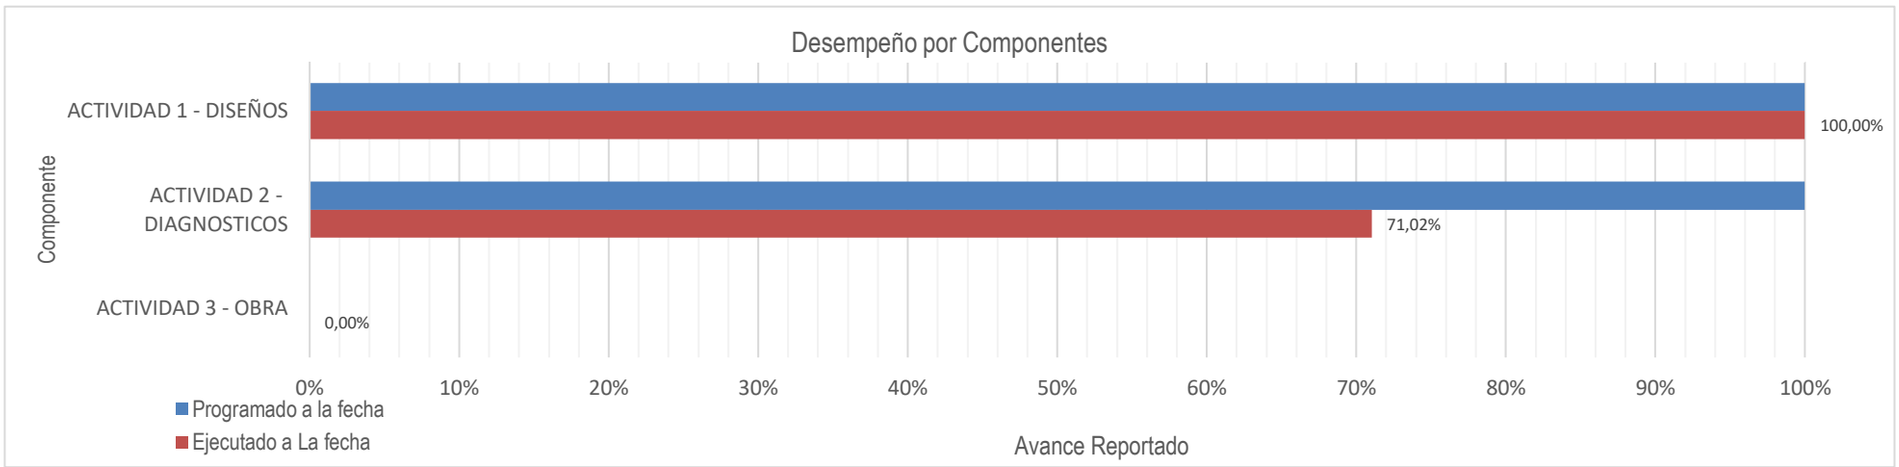

NOTA: Los valores antes señalados son aproximados, pues dependen del Flujo de inversión aportado por el contratista de obra

En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias lo cual afecta las actividades de campo. Lluvias Presentadas entre las 2:30 PM- 5:30 PM.
Horas de lluvia: 3 horas

ing. residente de obra.

ing. residente interventoria CA

Domingo 12 de Noviembre 2023

El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de elaboración de ploque estructural y tableros, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que no se ha remitido los diseños de mezclas, temas de documentación de calidad de materiales, Resultados de Laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y estas actividades se realizan bajo la Responsabilidad del contratista de obra

ing. residente de obra

ing. residente interventoria

Lunes 13 de Noviembre 2023

No se laboró dia festivo.

ing. residente de Obra.

ing residente interventoria CAEE

Martes 14 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza actividades administrativas, organiza documentos y anexos de diagnosticos del barrio El Rosario. Se subsanan diagnosticos.

Powered by CamScanner

Adicionalmente se realiza informe semanal.
El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades de elaboración de bloques estructurales y borderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoría ya que no se ha remitido los diseños de mezclas, toma de documentación de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la Responsabilidad del contratista de obra.
El Contratista de obra solicita comedidamente tener en cuenta la fabricación de la mamposteria estructural no puede ser evaluada como una actividad contratual. Esta actividad se encuentra desarrollando por parte externo a la firma contratista. Cabe resaltar que como firma contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en los cuales se evidencie el cumplimiento de los materiales con los estándares de calidad requeridos para la ejecución del presente proyecto.
El contratista de obra se compromete mediante oficio en la realización del bloque ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregado asi a esta interventoría la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo
El contratista de obra en horas de la tarde realiza perifoneo de apertura del proceso de inclusión en el barrio El Rosario.
Se Presentaron fuertes lluvias desde 2:30 PM - 3:30 PM.
Horas de lluvia: 1 hora.

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CNEE

Miercoles 15 de Noviembre 2023

En horas de la mañana se presentan fuertes lluvias desde las 7:00 am - 9:00 am.
Asi mismo, se realiza por parte del contratista de obra el perifoneo en el barrio el Rosarro y en barrio Nuevo divulgación de las convocatorias laborales de mano de obra no calificada.
Adicionalmente se remite carpeta con 14 diagnosticos para revisión en interventoria y posterior aprobación.
El contratista de obra sigue ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que aún no se ha remitido a esta interventoria los diseños de mezcla, toma de documentación de calidad de materiales, Resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista de obra.
En vista a lo anterior es necesario resaltar que esta actividad de fabricación de bloque estructural en sitio se ejecuta por personal externo a la firma contratista. Su fabricacion no hace parte de las obligaciones contractuales reiteramos la fabricación en sitio corresponde a una ventaja en la implementación de este material. Se expresa como firma contratista que el material utilizado en la ejecución del proyecto cumplirá con todos los aspectos de calidad exigidas por la Norma.
En horas de la tarde se presentaron fuertes lluvias desde la 1:00 PM - a 4:30 PM.
Horas de lluvia: 5 horas y media

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CAE

Jueves 16 de Noviembre 2023.

El contratista de obra da respuesta de PQRS del proceso de inclusión en Barrio La Unión, adicionalmente continua con socialización Caso a caso en barrio la unión, actividad que contó con el acompañamiento de esta interventoría, en esta jornada se realizaron 5 diagnosticos efectivos.
En horas de la tarde se realiza actividades administrativas organizando los documentos de la información recopilada en sitio en la mañana de hoy.
El contratista de obra sigue ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural, dicha actividad no cuenta con la remisión de esta interventoria los diseños de mezclas, temo de documentación de calidad de materiales, resultados de Laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista de obra, tambien se emplaza mediante oficio en la realización de bloque ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando asi a esta interventoría la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.
La actividad de fabricación de bloque estructural en sitio se ejecuta por personal externo a la firma contratista. Su fabricación no hace parte de las obligaciones contractuales, reiteramos la fabricación en sitio corresponde a una ventaja en la implementación de este material. Se expresa como firma contratista que el material utilizado en la ejecución del proyecto cumplirá con todos los aspectos de calidad exigidos por la norma.

Ing residente de obra.

Ing Residente interventoria CTES

Viernes 17 de Noviembre 2023

El contratista de obra realiza un diagnostico efectivo del proceso de inclusión. Adicionalmente realiza actividades administrativas de los diagnosticos que se estan subsanando. y se remiten nuevamente a interventoria para su previa revisión.
Adicionalmente se realiza comité de aprobación No 9 donde se aprobaron 29 diagnosticos.
El Contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoria ya que aún no se ha remitido a esta interventoria los diseños de mezclas, ficha de calidad de materiales, resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, para asi se acepte estos materiales y esta actividad se realice bajo la responsabilidad del contratista, tambien se evidencia mediante oficio la realización por parte de ellos, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando así a esta interventoria la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo
El contratista de obra solicita comedidamente tener en cuenta que la fabricación de bloque en mampostería estructural al igual que la fabricación de lavaderos, no pueden ser evaluadas como actividades contractuales. Estas actividades se encuentran desarrollando por parte externa a la firma contratista, claro está que como firma contratista serán entregadas todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en las cuales se evidencie el cumplimiento de los materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del presente proyecto.
Asi mismo en horas de la tarde se presentan fuertes lluvias desde la 1:00 PM a 5:30 PM.

Powered by CamScanner

Horas de lluvia: 4 horas y media.

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoría CAEG

Sabado 18 de Noviembre 2023.

Por parte del contratista de obra se realiza actividades administrativas. a corte de esta fecha. se han realizado. 505 visitas en las viviendas de los 4 barrios, de las cuales fueron diagnosticadas 356 como viviendas efectivas, 125 viviendas como no efectivas, se tienen aprobadas 326 vviendas. y se han presentado 24 renuncias.
El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la remisión y aprobación de esta interventoría, ya que aún no se ha remitido los diseños de mezclas, toma de calidad de materiales, resultados de laboratorio y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, también se evidencia mediante oficio remitido por el contratista la realización por parte de estos, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este insumo, entregando asi la documentación necesario para garantizar la calidad de este producto.
El contratista de obra reitera comedidamente tener en cuenta que la fabricación de bloque en mamposteria estructual al igual que la fabricación de lavaderos, no pueden ser evaluados como actividades contractuales. Estas actividades se encuentran desarollando por parte externa a la firma contratista. Claro está que como firma contratista, serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en las cuales se evidencie el cumplimiento y calidad de los materiales

Ing. residente de obra.

Ing residente interventoría CAEG

Domingo 19 de Noviembre 2023

No se laboró, día festivo.

Ing residente de Obra.

Ing residente interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **20/11/2023** al **26/11/2023** Fecha **26/11/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2230223	
Contratista	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	
Valor inicial	$ 4.164.944.717,87	
Valor actual	$ 4.164.944.717,87	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	24/03/2024	
Tiempo Transcurrido (días)	95	45,24%
Días remanentes del Contrato	119	56,67%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220219	
Interventor	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	
Valor inicial	$ 396.843.968,13	
Valor actual	$ 396.843.968,13	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	8/04/2024	
Ejecución del Contrato	95	42,22%
Días remanentes del Contrato	134	59,56%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 122.216.197,03	2,93%	$ 100.758.634,22	2,42%	-$ 21.457.562,81	-0,52%
Durante el Periodo	$ 39.793.602,01	0,96%	$ -	0,00%	-$ 39.793.602,01	-0,96%
Acumulado a la Fecha	**$ 162.009.799,03**	**3,89%**	**$ 100.758.634,22**	**2,42%**	**-$ 61.251.164,82**	**-1,47%**

Semaforo

Desviación en días

-3 Días

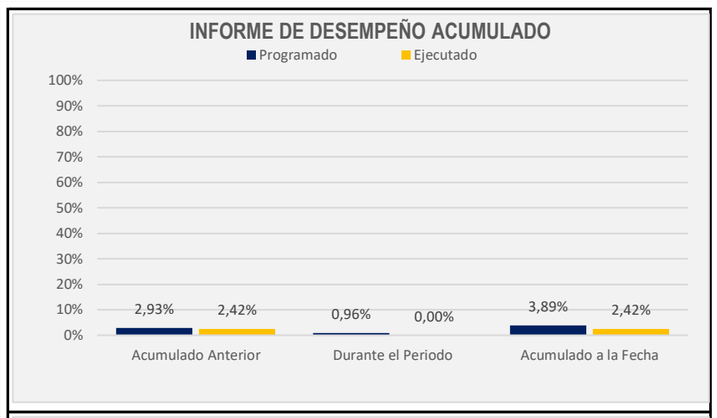

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

Durante el periodo los diseños arquitectonicos y estructurales se encuentran avalados por la interventoría

ACTIVIDAD No. 2

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico y para realizar entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. La interventoría efectua devolución de carpetas entregadas por el contratista; lo anterior para su subsanación correspondiente. Así mismo, por tal motivo se procede a reportar una ejecución de 326 diagnósticos aprobados. Se espera que el contratista de obra subsane las carpetas que fueron devueltas con el ánimo de proceder a aprobar nuevas intervenciones. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad.

ACTIVIDAD No. 3


A la fecha no se ha dado inicio a la actividad No. 3. Se aclara que para esta actividad se encuentan en los tiempos de acopio de materiales para su ejecución segun plan de contingencia V2. Cabe señalar que el contratista se encuentra adelantando actividades de fabricación de bloques y lavaderos de acuerdo a la aprobación por parte del Ministerio de VIvienda.


OBSERVACION GENERAL DE DESEMPEÑO:

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 1,47% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 3,89%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Durante el periodo se realiza visita en obra por paret del Ministerio de Vivienda, ENTerritorio, Interventoría y obra en obra con el fin de validar el avance de cada una de las actividades establecidas en el proyecto. En esta visita se pudo evidenciar que el contratista se encontraba adleantando actividades de fabricación de bloques estructurales, sin embargo se realizan observaciones por parte de la Interventoría y Ministerio de Vivienda en lo que respecta a la calidad estos bloques y la correcta fabricación y acopio de materiales.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

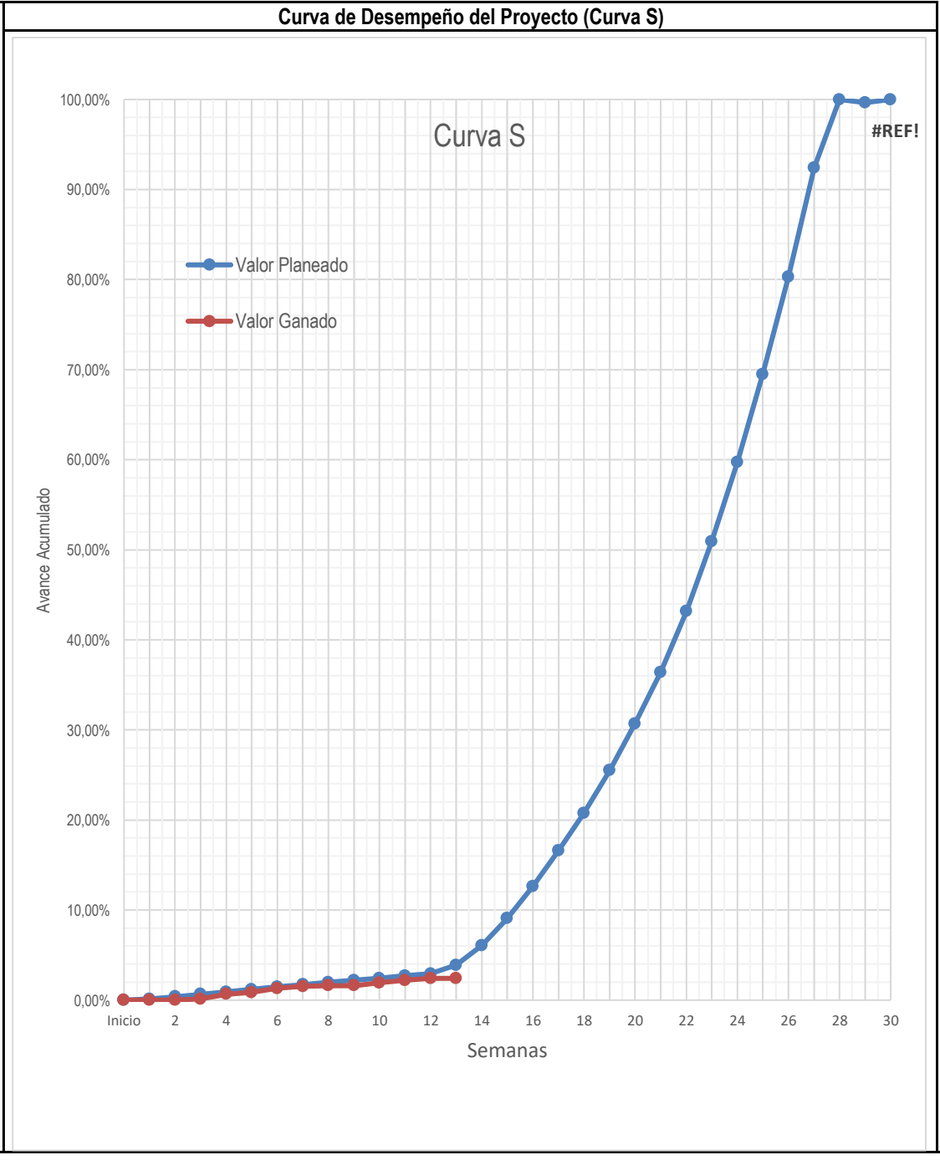

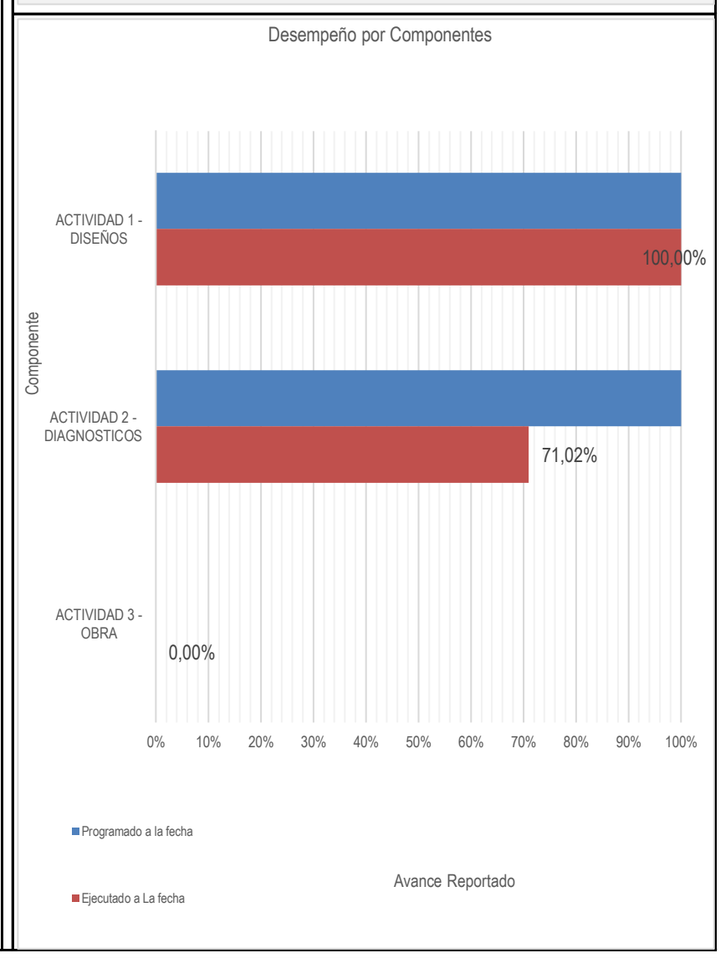

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

Durante el periodo no se efectuó cambios sobre el plan de trabajo, no se contó con cambios en tiempos, tampoco hay modificaciones en los valores económicos del contrato de obra e interventoría.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **20/11/2023** al **26/11/2023** Fecha **26/11/2023**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	2,93%	2,42%	-0,52%	
Durante el Periodo	0,96%	0,00%	-0,96%	
Acumulado a la Fecha	**3,89%**	**2,42%**	**-1,47%**	

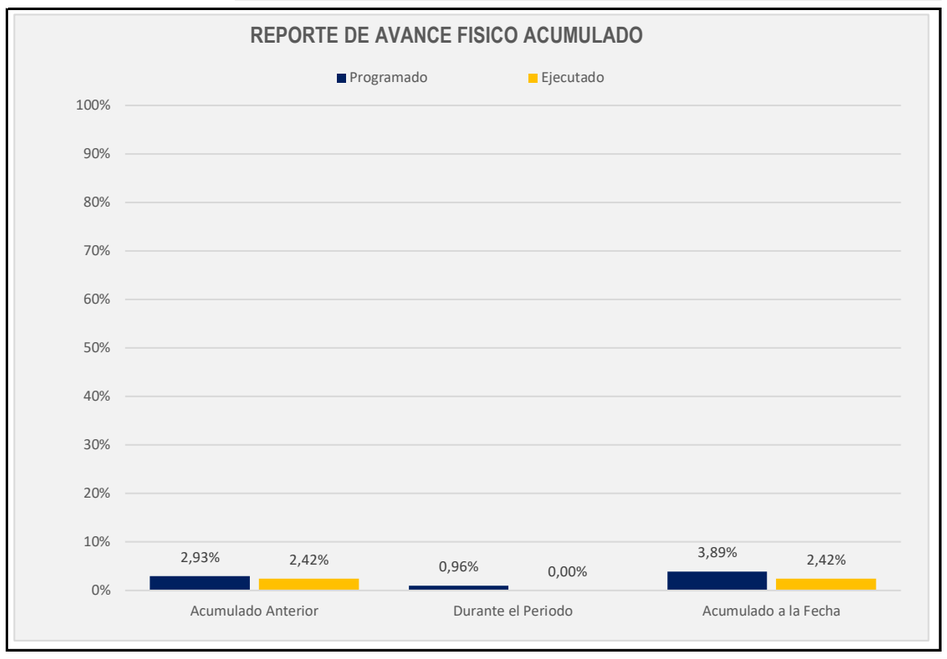



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ -	$ 805.225.665,88

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 805.225.665,88	19,33%	1	$ 805.225.665,88	19,33%	24/11/2023	$ 805.225.665,88








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 396.843.968,13	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 42.330.023,26	10,67%	1	$ 42.330.023,26	10,67%	24/11/2023	$ 42.330.023,26



OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico para despues realizar la entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad. Adicionalmente se espera por parte de Ministerio y la entidad contratante aprobación de las viviendas que requieren conexión domiciliaria con tramos de tuberias superiores a los 10 metros.

Durante el periodo no se realiza comité de seguimiento No. 10 presencial el dia 23 de noviembre del 2023 y no se realiza comite de aprobacion.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la Semana comprendida del 20 de noviembre al 26 de noviembre se realizó lo siguiente:

Lunes 20 de noviembre del 2023: Se realiza acompañamiento al contratista de obra para la elaboración de visitas casa a casa y diagnosticos en el barrio El Rosario.

Martes 21 de noviembre del 2023: Esta interventoría realiza actividades administrativas, se revisa la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con la mínima documentación para su respectiva aprobación.

Miércoles 22 de noviembre del 2023: Se realiza recorrido de barrios para la implementacion de ruta que se llevara a cabo el dia jueves 23 de noviembre con los entes del ministerio de vivienda ciudad y territorio, ENTerritorio, contratista de obra e interventoría.

Jueves 23 de noviembre del 2023: Se realiza comite de seguimiento No. 10 presencial, se cuenta con la presencia del Ministerio de viviendas ciudad y territorio, profesionales designados por ENTerritorio contratista de obra, interventoría, secretario de planeación y gerente de la empresa de servicios publicos, a su vez se realiza recorrido de barrios y licalizacion de casos especiales para la intervencion del proyecto.

Viernes 24 de noviembre del 2023: Esta interventoría realiza barrido de matriz del primer barrio priorizado para identificar y verificar las viviendas que no son efectivas, se revisa la carpeta de diagnósticos entregada por el contratista para verificar si cumple con la mínima documentación para su respectiva aprobación.

Sábado 25 de noviembre del 2023: Esta interventoría continua con el barrido de matriz del primer barrio priorizado para identificar y verificar las viviendas que no son efectivas, a la fecha se han visitado 515 viviendas, de las cuales se han diagnosticado 363 viviendas efectivas, 123 viviendas cómo no efectivas, se han aprobado 326 viviendas, y se han presentado 28 renuncias.

Domingo 26 de noviembre del 2023: No se labora por ser día festivo.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2023-142 Respuesta a comunicadO no. PPDI-OF-CGE-23-125 20234300388692
CAEE-RI-2023-143 Respuesta comunicado No. 116 Informe mensual No. 2 20234300391072
CAEE-RI-2023-144 Aprobación cuenta de ocbro anticipo 20234300391102
CAEE-RI-2023-145 Observaciones y solicitud de cumplimiennto PGIO 20234300393702
CAEE-RI-2023-146 Atención comunicados No. 126, 131, 132 mod personal 20234300396362
CAEE-RI-2023-147 Atención comunicado No. 134 Respuesta social 20234300395632
CAEE-RI-2023-148 Atención a comunicado No. 136 20234300395772
CAEE-RI-2023-149 Respuesta entrega diagnosticos 20234300396162
CAEE-RI-2023-150 Atención a comunicado No. 130 20234300399422
CAEE-RI-2023-151 Atención a comunicado No. 151 20234300399462
CAEE-RI-2023-152 Atencion a comunicado No. 140 20234300399472
CAEE-RI-2023-153 Atencion a comunicado No. 139 20234300399492
CAEE-RI-2023-154 Respuesta Comunicado No. 137 Diagnosticos 20234300401452
CAEE-RI-2023-155 Solcicitud de visita PQRS 20234300401692
CAEE-RI-2023-156 Reiteracion comunicado No. PPDI-OF-CGE-129 20234300401972
CAEE-RI-2023-157 Notificacion de presunto incumplimeinto 20234300401872
CAEE-RI-2023-158 Traslado PQRs 20234300402282
CAEE-RI-2023-159 Entrega Informe semanal Social No. 12 20234300402342
CAEE-RI-2023-160 Aprobacion informes semanales No. 1,2, 3, 4, 5, 6 y 9 20234300402292
CAEE-RI-2023-161 Observaciones informes semanales 7, 8 y 10 20234300402302
CAEE-RI-2023-162 Problematicas presentadas en la zona 20234300403132

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **20/11/2023** al **26/11/2023** Fecha **26/11/2023**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra empezará socialización casa a casa en el tercer barrio priorizado, una vez se realice la socialización sectorizada del PCI por parte de los entes Territoriales.
2. Nivelar actividad No 2. acorde a la programación de actividades presentada y aprobada.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

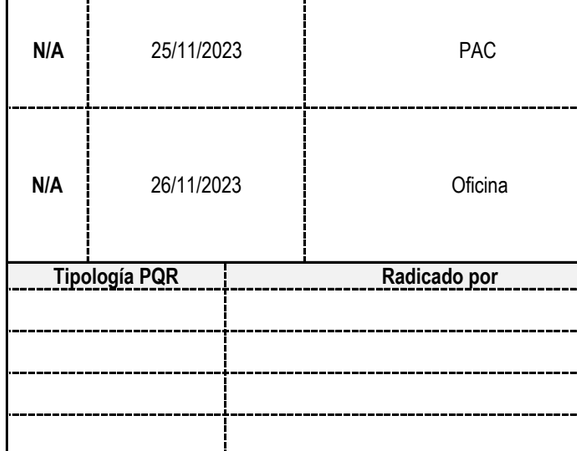

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	57	0	57	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**57**	**0**	**57**	**100,00%**

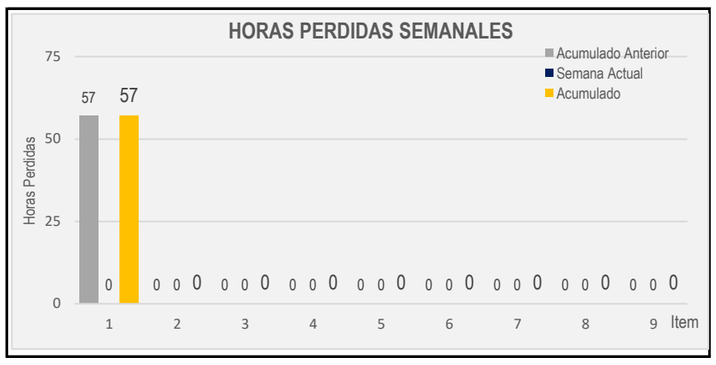

Durante el periodo no se presentan accidentes o incidentes de trabajo. Así mismo no se presentan lluvias durante el periodo.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Actividades realizadas	Responsable	Fecha
N/A	20/11/2023	BARRIO LA REAL Y EL ROSARIO	2,00	Se realizaron dos visitas de socializacion casa a casa, se realizo perifoneo para la divulgacion de la oferta de empleo en el barrio la Real y el Rosario, De igual forma, la instalcion de carteleras informativas y entrega de volantes.	Contratista de obra	N/A
N/A	21/11/2023	PAC	0,00	Se realizaron actividades administrativas	Contratista de obra e interventoría	N/A
N/A	22/11/2023	BARRIOS PRIORIZADOS	4,00	Se realizaron 4 visitas de socializacion casa a casa y revisión de los cuatro buzones de sugerencias los cuales se encontraron vacio	Contratista de obra	N/A
N/A	23/11/2023	BARRIOS PRIORIZADOS	13,00	Se realizo comité de seguimiento presencial y recorrido de barrio en diferentes sectores, se conto con la participacion de la supervision tecnica del Ministerio de Vivienda, la supervision tecnica y social de la Entidad Contratante, secretario de planeacion municipal, Gerente del Operador de los servicios publicos.	Contrataista de obra e Interventoria	N/A
N/A	24/11/2023	BARRIO NUEVO	35,00	Esta Interventoria realizo un recorrido el barrio nuevo con el fin de validar el barrido de la matriz inicial y la respectiva codificacion de todas las viviendas visitadas. Del mismo modo. Se identificaron 3 viviendas que aun no ha solicitado inclusion al Proyecto, se les dio la informacion a los jefes de los hogares para realizar dicha solictud.	Interventoría	N/A
N/A	25/11/2023	PAC	0,00	Se realizaron actividades administrativas y se continuo con el recorrido en barrio Nuevo, para verificacion del barrido de la matriz inicial .		
N/A	26/11/2023	Oficina	0,00	se realizaron actividades administrativas	Interventoría	N/A

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **20/11/2023** al **26/11/2023** Fecha **26/11/2023**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía 1. Realización de visita casa a casa en el barrio El Rosario, actividad cuenta con el acompañamiento de esta interventoría.



Fotografía 2. Recorrido de barrio con la supervision tecnica del Ministerio y supervision tecnica y social de ENterritorio.



Fotografía 3.Recorrido de barrio con los Actores del Proyecto



Fotografía 4. Divulgacion de la oferta de empleo, instalcion de cartelera y entrega de volantes



Fotografía 5. Recorrido de barrio con el supervisor tecnido delegado por parte PDA para la supervision del proyecto, contratista de obra e interventoría



Fotografía 6. Realizacion de bloque estructural, actividad realizada sin la autorización y aprobación del contratista

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se da inicio el día 24 de agosto de 2023 con la actividad No. 1 (Diseños Estructurales y arquitectónicos) y Actividad No. 2 (Diagnostico y concertación). Cabe señalar que durante el periodo el contratista de obra adelanta actividades de soclialización y diagnósticos casa a casa, así mismo remite carpetas de diagnósticos a la interventoría para su revisión y/u observación o aprobación.

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 1,47% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 3,89%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Durante el periodo se presenta atraso en actividad 2 y 3, pues a la poca realizacion y aprobación de diagnósticos, y no contar con los materiales en sito el contratista de obra presenta un atraso del 1,47%. Cabe señalar que en la visita adelantada por el MInisterio de Viveinda, ENTerritorio e Interventoría a la zona se realizaron observaciones de calidad a los bloques fabricados por el contratista de obra y se efectuan requerimientos.

Durante el periodo no se presentaron lluvias que afectaran la correcta ejecución de las actividades programadas. A la fecha se está a la espera que la entidad contratante adelante la audiencia de presunto incumplimiento de acuerdo al informe de presunto incumplimiento remitido por parte de la interventoría.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventorí

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87


Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.256.352,00	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.065,01	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.778,01	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.491,01	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.204,01	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.782,02	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.865,02	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.948,02	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.031,02	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.114,02	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.197,03	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,89%	$ 162.009.799,03	2,42%	$ 100.758.634,22
14	6,06%	$ 252.219.630,05		$ -
15	9,08%	$ 378.153.616,08		$ -
16	12,65%	$ 526.956.211,11		$ -
17	16,63%	$ 692.675.312,14		$ -
18	20,77%	$ 864.973.054,18		$ -
19	25,51%	$ 1.062.332.286,22		$ -
20	30,68%	$ 1.277.704.464,27		$ -
21	36,41%	$ 1.516.571.788,32		$ -
22	43,16%	$ 1.797.730.376,38		$ -
23	50,93%	$ 2.121.180.228,44		$ -
24	59,71%	$ 2.486.921.344,52		$ -
25	69,51%	$ 2.894.953.724,60		$ -
26	80,32%	$ 3.345.277.368,70		$ -
27	92,42%	$ 3.849.169.946,80		$ -
28	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
29	99,67%	$ 4.151.160.898,87		$ -
30	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	**$ 4.164.944.718,00**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

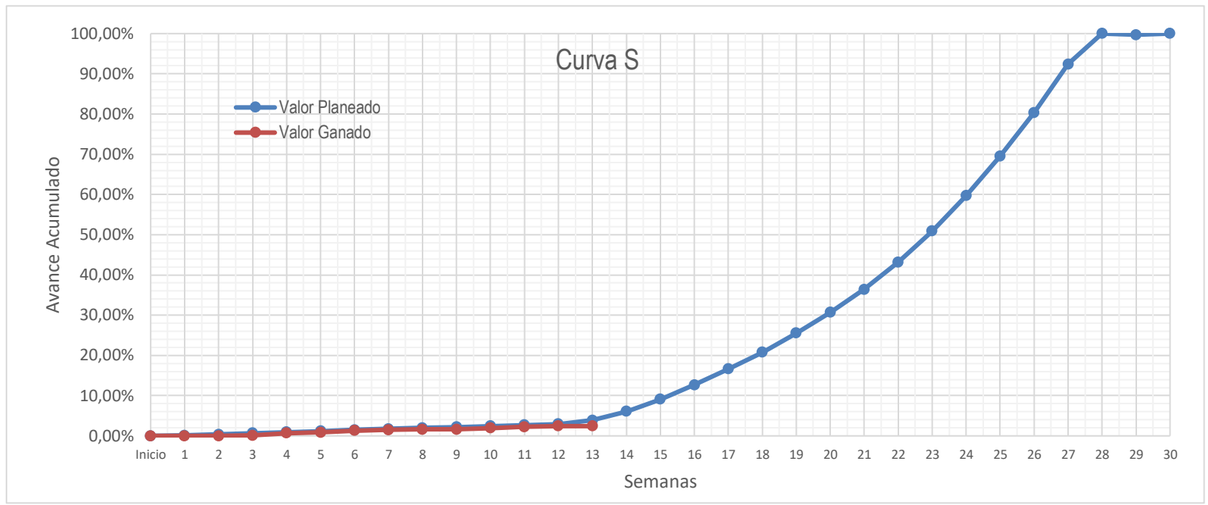

NOTA: Los porcentajes y valores económicos antes señalados corresponden a los establecidos en el Flujo de Inversión semanal allegado por el contratista de obra.

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1 - DISEÑOS	0,18%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2 - DIAGNOSTICOS	3,15%	$ 131.342.174,45	100,00%	$ 131.342.174,45	71,02%	$ 93.284.420,20
3	ACTIVIDAD 3 - OBRA	96,67%	$ 4.026.128.329,40	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**3,33%**	**$ 138.816.388,47**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

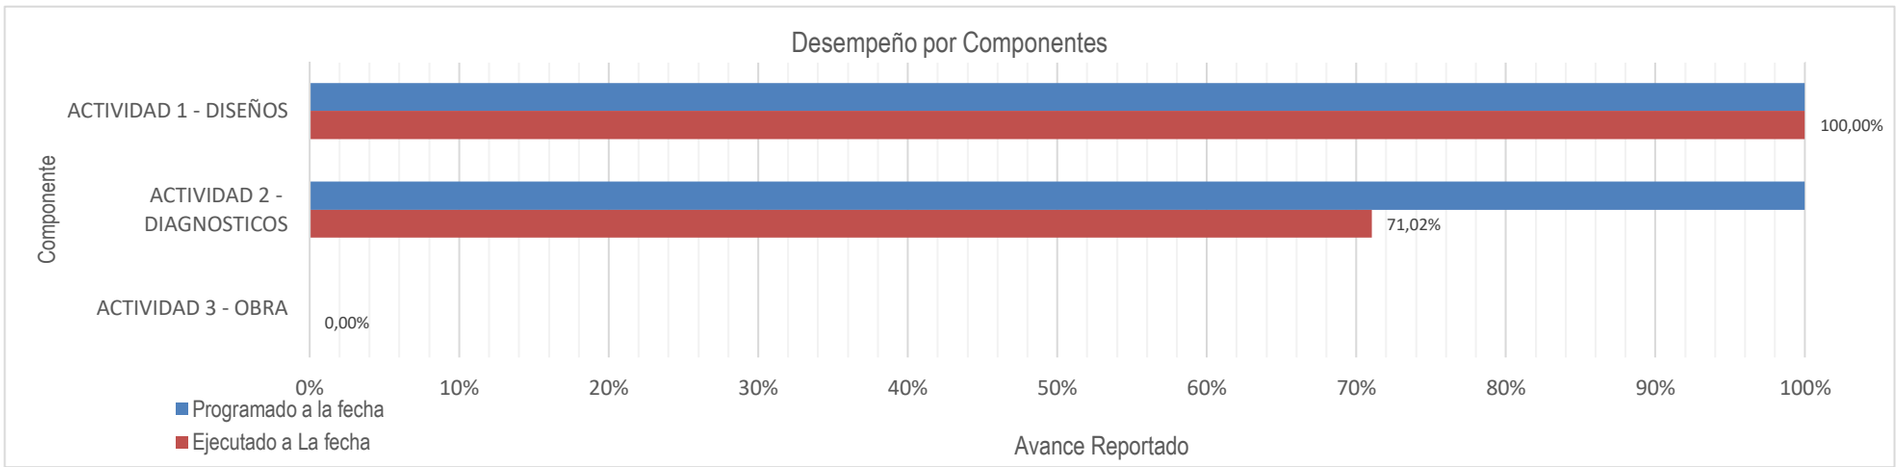

NOTA: Los valores antes señalados son aproximados, pues dependen del Flujo de inversión aportado por el contratista de obra

Domingo 19 de Noviembre 2023

No se laboró, Día Festivo.

Ing. Residente de Obra

Ing. Residente Interventoría

Lunes 20 de Noviembre 2023

Se continua por parte del contratista de obra en las actividades de socialización casa a casa en el barrio La Unión del proceso de inclusión, actividad que contó con el acompañamiento de Interventoría. En esta jornada se realizaron 3 diagnosticos efectivos y 1 diagnostico como no efectivo.

El contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dichas actividades no cuenta con la revisión de la interventoría, ya que aún no se remite los diseños de mezclas, temas de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por ende no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista, también se manifiesta mediante oficio la realización de esta actividades por parte de ellos la elaboración de bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando así la documentación necesaria para garantizar la calidad de este insumo.

El Contratista de obra reitera que la fabricación de lavaderos y de mamposteria estructural no puedan ser evaluadas como actividades contractuales. Esta actividad se encuentran desarrollando por parte externo a la firma Contratista. Claro está que como firma Contratista serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma,

Powered by CamScanner

en los cuales se evidencie el cumplimiento de los materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del presente Proyecto

Ing. residente de Obra

Ing. Residente interventoría CMGG

Martes 21 de Noviembre 2023

El Contratista de obra realiza actividades administrativas con el fin de cerrar listado de Matriz inicial, revisando y documentando las viviendas en las que se presentaron los rechazos, adicionalmente se organizan diagnosticos con sus respectivos soportes del proceso de Inclusión de Barrio La Unión.

El Contratista de obra continua ejecutando actividades de elaboración de bloque estructural y lavaderos, dicha actividad no cuenta con la revisión de la interventoría, ya que aún no se remite los diseños de mezclas, temas de calidad de materiales, resultados de laboratorios y demas obligaciones contractuales por parte del contratista, por cual no se acepta estos materiales y esta actividad se realiza bajo la responsabilidad del contratista, también se manifestó mediante oficios, por parte del contratista de obra, la elaboración del bloque estructural, ya que deben garantizar y responder por dicha actividad que conlleva al suministro de este producto, entregando así la documentación necesarios para garantizar la calidad de este insumo.

El Contratista de obra solicita comedidamente a esta interventoría en tener en cuenta que la fabricación de la mamposteria estructural no puede ser evaluada como actividad contractual al igual que la fabricación de los lavaderos. Estas actividades se encuentran desarrollando por parte externo a la firma contratista. Claro esta que como firma contratista Serán entregados todos los soportes y ensayos de laboratorio requeridos por la norma, en los cuales se evidencie

el cumplimiento de los materiales con los estandares de calidad requeridos para la ejecución del Presente Proyecto.

ing. residente de Obra.

Ing. residente interventoria CMC

Mercoles 22 de Noviembre 2023.

El contratista de obra realiza socialización casa en barrio La Unión con el fin de dar cierre al listado de la matriz inicial, actividad que contó con el acompañamiento de Interventoria. En esta jornada se lograron diagnosticar dos (2) viviendas como efectivas, se presentó una renuncia y se diagnostico una Vivienda como no efectiva

Esta interventoría recomienda al contratista hacer llegar los resultados de ensayos de Laboratorio, toma de muestra y certificados de conformidad de los productos para asi garantizar la calidad de los insumos realizados en sitio (bloque estructural y lavaderos) ya que si no se garantiza la calidad del producto no se tendra en cuenta por parte de esta interventoría

El Contratista de obra realiza recorrido en compañia del director de obra donde inspecciona bodegas, fabrica de lavaderos y sitio de producción de bloque.

ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CMC

Jueves 23 de Noviembre 2023.

Se realiza comite de Seguimiento No 10, el Cual se realiza de manera presencial en el municipio de Rio Iró y donde se contó con el acompañamiento de los profesionales de MVCT, ENTerritorio, profesionales por parte del contratista

Powered by CamScanner

de obra e interventoria, adicionalmente se contó con el acompañamiento del secretario de planeación y el gerente de la Empresa de Servicios Públicos.
Posteriormente se hizo recorrido en los barrios que se van a intervenir, se realiza visita a bodegas del contratista de obra con el fin de validar los materiales que han llegado a sitio, adicionalmente se validan la producción de lavaderos, se continua con recorrido de obra visitando las viviendas que requieren red domiciliaria de alcantarillado mayor a 10 metros, se visita punto de instalación de la valla siguiendo el recorrido de obra se visita sector que no cuenta con alcantarillado en el barrio El Rosario, se visita sector de el barrio La Real el cual las viviendas estan construidas en palafito y no cuentan con elementos que garanticen la estabilidad de la Vivienda. y por ultimo se visita punto de fabricación de bloque estructural donde los profesionales de MVCT, ENTerritorio e interventoria hacen las respectivas recomendaciones al contratista de obra para garantizar la calidad de la producción de este material. donde el contratista de obra recibe de buena manera estas recomendaciones

Ing. residente de obra

Ing. Residente interventoria CAEC

Viernes 24 de Noviembre 2023.

Desde el dia jueves 23 de Noviembre se mantiene la via cerrada en el sector de Pereira a Istmina y se presenta cierre de la via Quibdo - Medellin. lo cual dificulta el ingreso de materiales que el Contratista de obra requiere para el buen funcionamiento y desarrollo de la obra.
Adicionalmente en la Noche anterior en el sector

Powered by CamScanner

de Chapizal en la Vía Istmina- Río Iro, se pierde la banca de la vía a causa de las fuertes lluvias presentadas, ocacionando que no haya paso para ningun tipo de vehiculo. Lo cual hace que tambien se presenten atrasos en la programación de obra al contratista de obra. Cargos que no pueden ser imputables a la firma contratista debido a que son factores ajenos. al CGE.

Esta interventoría recomienda al contratista hacer llegar los resultados de ensayos de laboratorio y como de muestra, certificados de conformidad de los productos para así garantizar la calidad de los ensayos realizados en sitio (bloque estructural y tuberia) ya que si no se garantiza la calidad del producto no se tendra en cuenta por parte de esta interventoría.

Esta interventoría realiza recorrido de barrio para verificar las viviendas que se han diagnosticado como no efectivas en barrio nuevo.

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoría CAGE

Sabado 25 de Noviembre 2023.

El Contratista de obra realiza recorrido en compañía de Interventoria, Visitando viviendas que fueron diagnosticadas y cuentan con casos especiales en el barrio La Unión y Barrio Nuevo

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoría CAGE

Domingo 26 de Noviembre 2023.

No se laboró, dic Festivo.

Ing. Residente de Obra.

Ing. Residente Interventoría CMCC

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **27/11/2023** al **3/12/2023** Fecha **3/12/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2230223	**NOMBRE DEL PROYECTO**	INTRADOMICILIARIAS RIO IRÓ
OBJETO DEL PROYECTO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	RIO IRÓ
GERENCIA A CARGO	GERENCIA DE UNIDAD 1	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2230223	
Contratista	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	
Valor inicial	$ 4.164.944.717,87	
Valor actual	$ 4.164.944.717,87	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial (Días)	210 Días	
Plazo actual (Días)	210 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	24/03/2024	
Tiempo Transcurrido (días)	102	48,57%
Días remanentes del Contrato	112	53,33%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220219	
Interventor	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	
Valor inicial	$ 396.843.968,13	
Valor actual	$ 396.843.968,13	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/08/2023	
Plazo inicial	225 Días	
Plazo actual	225 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	8/04/2024	
Ejecución del Contrato	102	45,33%
Días remanentes del Contrato	127	56,44%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 4.164.944.717,87

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 162.009.799,03	3,89%	$ 100.758.634,22	2,42%	-$ 61.251.164,82	-1,47%
Durante el Periodo	$ 90.209.831,02	2,17%	$ -	0,00%	-$ 90.209.831,02	-2,17%
Acumulado a la Fecha	**$ 252.219.630,05**	**6,06%**	**$ 100.758.634,22**	**2,42%**	**-$ 151.460.995,84**	**-3,64%**

Semaforo

Desviación en días

-8 Días

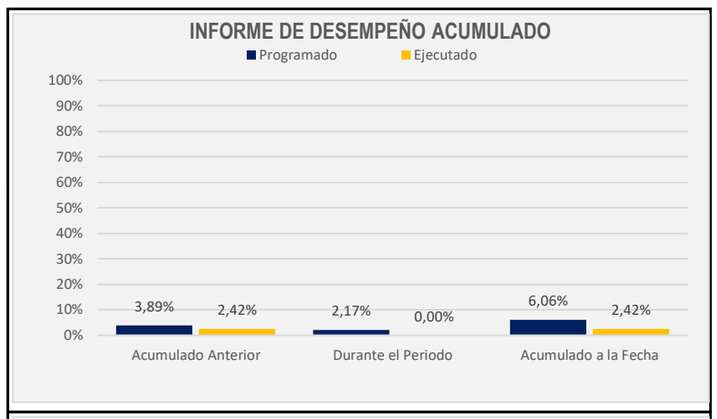

Observaciones al desempeño del proyecto

ACTIVIDAD No. 1

Durante el periodo los diseños arquitectonicos y estructurales se encuentran avalados por la interventoría.

ACTIVIDAD No. 2

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico y para realizar entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. La interventoría efectua devolución de carpetas entregadas por el contratista; lo anterior para su subsanación correspondiente. Así mismo, por tal motivo se procede a reportar una ejecución de 326 diagnósticos aprobados. Se espera que el contratista de obra subsane las carpetas que fueron devueltas con el ánimo de proceder a aprobar nuevas intervenciones. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad.

ACTIVIDAD No. 3


A la fecha no se ha dado inicio a la actividad No. 3. Se aclara que para esta actividad se encuentan en los tiempos de acopio de materiales para su ejecución segun plan de contingencia V2. Cabe señalar que el contratista se encuentra adelantando actividades de fabricación de bloques y lavaderos de acuerdo a la aprobación por parte del Ministerio de VIvienda.


OBSERVACION GENERAL DE DESEMPEÑO:

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 3,64% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 6,06%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Durante el periodo se presentan situaciones de orden publico e inseguridad para el personal del contratista de obra e interventoría, pues en el periodo se reciben panfletos con amenazas al contratista de obra e interventoría, situación que conllevó a las partes a retirar el personal del Municipio a fin de garantziar la seguridad del personal hasta atnto se brinden la seguridad suficiente. Cabe señalar que esta situación es informada a la Entidad Contratante a fin de que sea informado al Ministerio de Vivienda.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

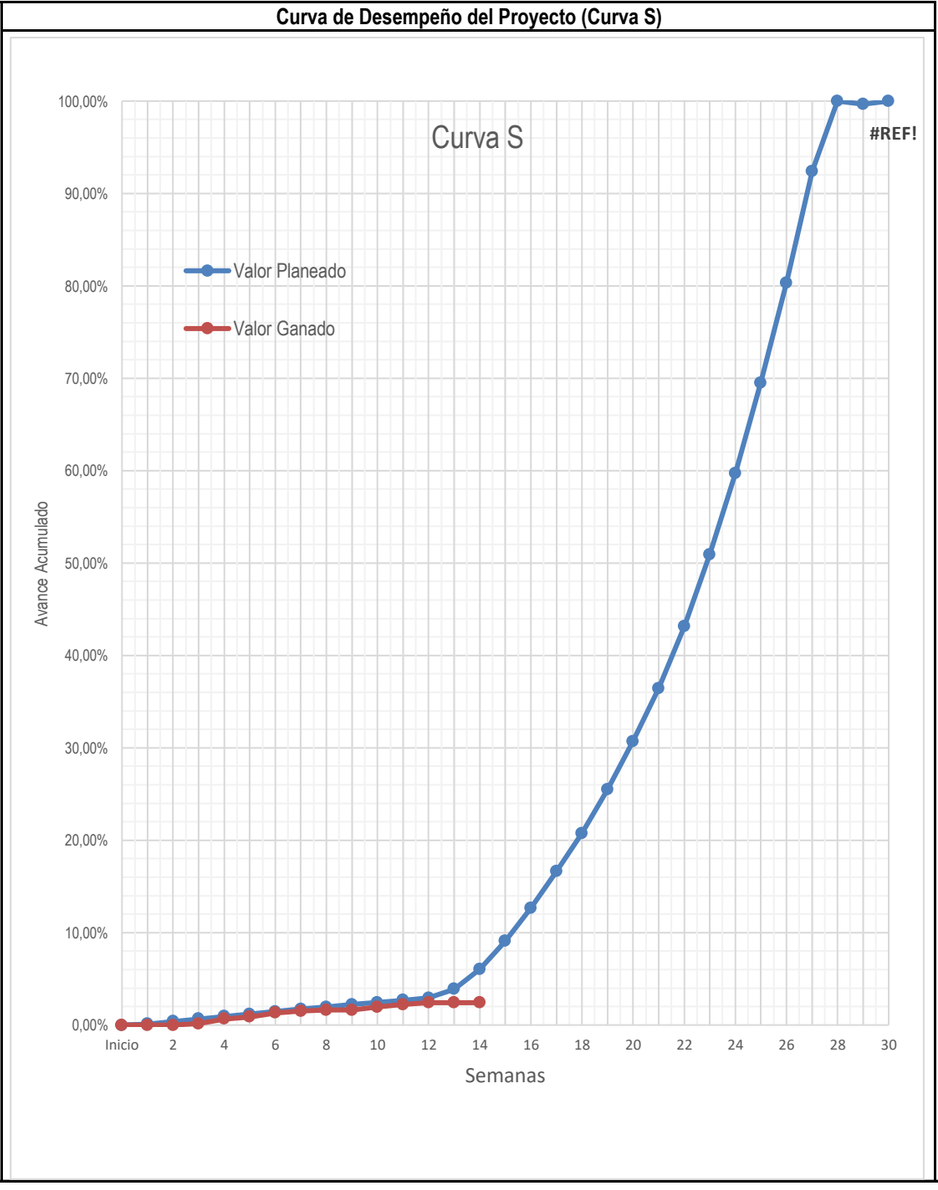

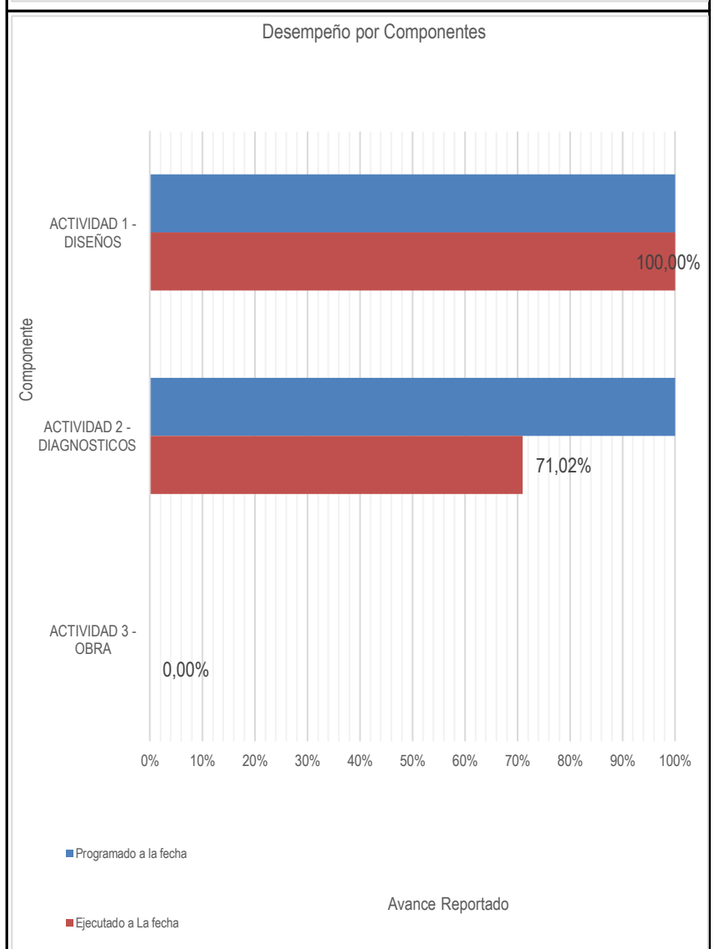

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

Durante el periodo no se efectuó cambios sobre el plan de trabajo, no se contó con cambios en tiempos, tampoco hay modificaciones en los valores económicos del contrato de obra e interventoría.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **27/11/2023** al **3/12/2023** Fecha **3/12/2023**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	3,89%	2,42%	-1,47%	
Durante el Periodo	2,17%	0,00%	-2,17%	
Acumulado a la Fecha	**6,06%**	**2,42%**	**-3,64%**	

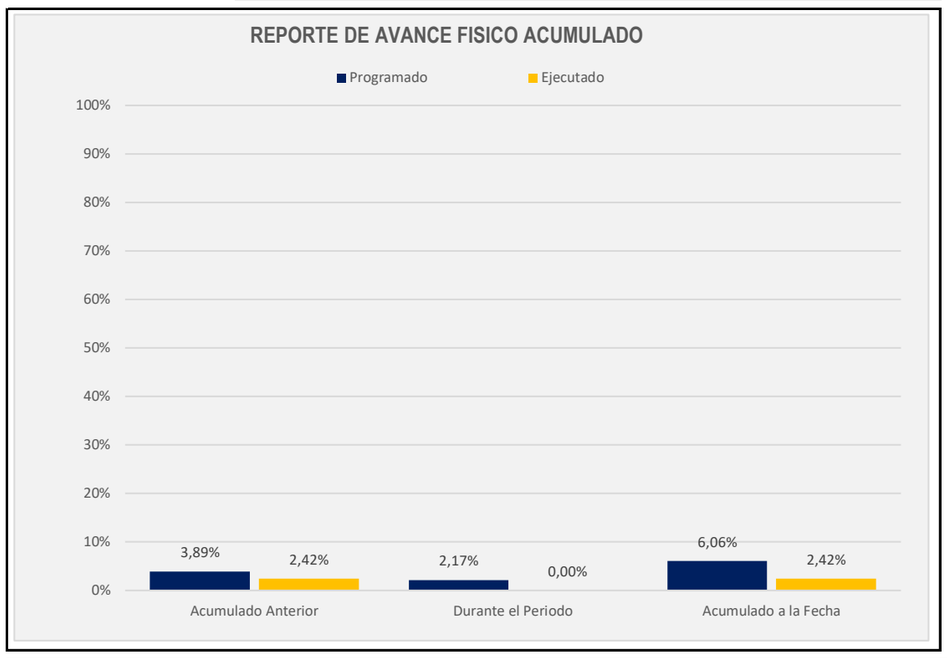



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 4.164.944.717,87	$ 4.164.944.717,87	$ -	$ 805.225.665,88	$ -	$ 805.225.665,88

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 805.225.665,88	19,33%	1	$ 805.225.665,88	19,33%	24/11/2023	$ 805.225.665,88










AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 396.843.968,13	$ 396.843.968,13	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 42.330.023,26	10,67%	1	$ 42.330.023,26	10,67%	24/11/2023	$ 42.330.023,26







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el contratista adelanta actividades de diagnóstico para despues realizar la entrega de carpetas de viviendas diagosticadas para la revisión y/u observación o aprobacion por parte de la Interventoría. Cabe señalar que a la fecha se presenta un atraso en esta actividad. Adicionalmente se espera por parte de Ministerio y la entidad contratante aprobación de las viviendas que requieren conexión domiciliaria con tramos de tuberias superiores a los 10 metros.

Durante el periodo no se realiza comité de seguimiento y no se realiza comite de aprobacion.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Durante la Semana comprendida del 27 de noviembre al 03 de noviembre se realizó lo siguiente:

Lunes 27 de noviembre del 2023: En horas de la mañana el residente de obra en compañía del residente de interventoría realiza pruebas de estanqueidad a los lavaderos que se han fabricado, donde por parte del residente de Interventoría se da el VoBo de aprobación de los mismos. En horas de la tarde el residente de obra en compañía del residente de interventoría realizan acercamiento al sector de santa Barbara para verificar desvió que actualmente construyen para desviar los vehículos debido a pavimentación vial que van a realizar por las vías principales de este sector, donde se pudo evidenciar que no hay garantías ni vías de acceso para el tránsito de vehículos de carga, lo cual afecta gravemente al contratista de PCI ya que no tendría vías de acceso para poder hacer llegar los materiales que requiere el proyecto. Por otra el contratista de obra ratifica que se mantienen cerradas las vías Quibdó - Medellín y la vía Pereira Istmina, lo cual obstaculiza que ingresen los vehículos de carga al departamento donde llega a ocasionar atrasos en la programación de obra al contratista de obra, cargos que no pueden ser imputados al contratista de obra.

Martes 28 de noviembre del 2023: El contratista de obra e Interventoría suspenden actividades a causa de amenazas recibidas en horas de la madrugada en vivienda de Interventoría por presuntos grupos al margen de ley. Los residentes de obra e interventoría realizan acercamiento a la oficina del secretario de planeación en compañía de la trabajadora social de interventoría para ponerlo en conocimiento y contextualizar la problemática. Desde la firma contratista e interventoría ratificamos y solicitamos garantías de seguridad para el personal administrativo y los colaboradores del proyecto.

Miércoles 29 de noviembre del 2023: El contratista de obra e interventoría continúan con la suspensión de actividades hasta que se brinden las garantías y la seguridad de todos sus colaboradores.

Jueves 30 de noviembre del 2023: El contratista de obra e interventoría continúan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la entidad contratante solicite a los entes territoriales y demás entidades donde se garantice la seguridad y se de las garantías de tranquilidad de todos los colaboradores. Por otra parte este día en horas de la madrugada, La Interventoría toma la decisión de retirar su personal del sitio de trabajo al municipio de Istmina para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Viernes 01 de diciembre del 2023: El contratista de obra e interventoría continúan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la entidad contratante solicite a los entes territoriales y demás entidades donde se garantice la seguridad y se de las garantías de tranquilidad de todos los colaboradores. Contratista de obra espera a que se realice el comité de seguimiento No 11, el cual se encontraba programado para el día 01 de diciembre y fue aplazado por el supervisor del contrato. El contratista de obra está a la espera que desde la Supervisión del contrato y desde la Interventoría le definan cual es el procedimiento a seguir con el personal del contratista y de las actividades, puesto que Interventoría retiró su personal al municipio de Istmina para garantizar la seguridad de su personal.

Sábado 2 de diciembre del 2023: El contratista de obra e interventoría continúan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la entidad contratante solicite a los entes territoriales y demás entidades donde se garantice la seguridad y se de las garantías de tranquilidad de todos los colaboradores.

Domingo 3 de diciembre del 2023: El contratista de obra e interventoría continúan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la entidad contratante solicite a los entes territoriales y demás entidades donde se garantice la seguridad y se de las garantías de tranquilidad de todos los colaboradores.

Durante el periodo la interventoría remite los siguientes comunicados al Contratista de obra y/o ENTerritorio y/o Municipio de Rio Iró y/o Empresa de Servicios Publicos:

CAEE-RI-2023-154 Respuesta Comunicado No. 137 Diagnosticos 20234300401452
CAEE-RI-2023-155 Solcicitud de visita PQRS 20234300401692
CAEE-RI-2023-156 Reiteracion comunicado No. PPDI-OF-CGE-129 20234300401972
CAEE-RI-2023-157 Notificacion de presunto incumplimeinto 20234300401872
CAEE-RI-2023-158 Traslado PQRs 20234300402282
CAEE-RI-2023-159 Entrega Informe semanal Social No. 12 20234300402342
CAEE-RI-2023-160 Aprobacion informes semanales No. 1,2, 3, 4, 5, 6 y 9 20234300402292
CAEE-RI-2023-161 Observaciones informes semanales 7, 8 y 10 20234300402302
CAEE-RI-2023-162 Problematicas presentadas en la zona 20234300403132
CAEE-RI-2023-163 Aprobacion informes semanales 11 y 12 20234300406852
CAEE-RI-2023-164 Notificacion presunto incumplimiento de obligaciones con20234300411542

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **27/11/2023** al **3/12/2023** Fecha **3/12/2023**

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Se tiene previsto que para la semana siguiente el contratista y/o interventoría realice las siguientes actividades:

1. Contratista de obra empezará socialización casa a casa en el tercer barrio priorizado, una vez se realice la socialización sectorizada del PCI por parte de los entes Territoriales.
2. Nivelar actividad No 2. acorde a la programación de actividades presentada y aprobada.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

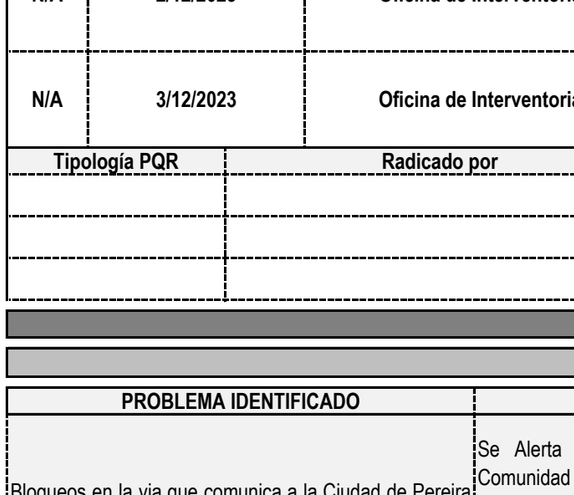

Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	57	0	57	55,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden publico	0	45	45	44,1%
	Total	**57**	**45**	**102**	**100,00%**

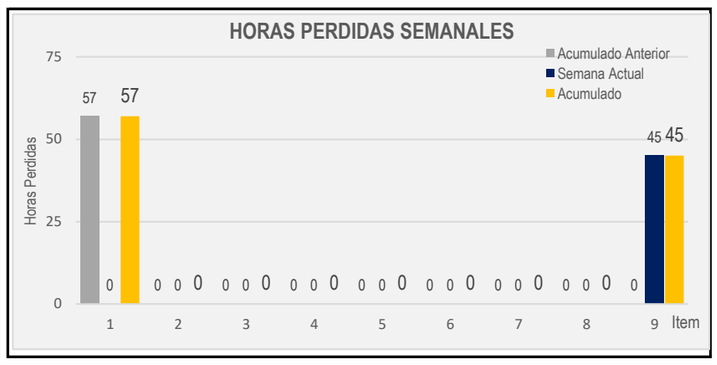

Durante el periodo no se presentan accidentes o incidentes de trabajo.
Desde el 28 de Noviembre contratista de obra e interventoría suspenden (cese de actividades) actividades hasta que se brinden las garantias de seguridad de todos los colaboradores del proyecto.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Actividades realizadas	Responsable	Fecha
N/A	27/11/2023	La union/El Rosario	0,00	El Contratista de obra en acompañamiento de la interventoria, realizaron recorrido de barrio, con el fin de realizar un barido y Verificar que las viviendas del barrio nuevo Se encontraran visitadas en Su totalidad, se lograron identificar dos viviendas, a las cuales se les tomo la solicitud de PQR de inclusion	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	28/11/2023	Oficinas de secretaria de planeación	4,00	Se realiza reunion con el secretario de planeación para velar por a seguridad del equipo de trabajo de interventoria y contratista de obra	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	29/11/2023	Oficina de Interventoria	0,00	se realizo trabajo administrativo, en las oficinas del contratista de obra, hasta que se garantice la seguridad del equipo de trabajo.	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	30/11/2023	Oficina de Interventoria	0,00	se realizo trabajo administrativo, en las oficinas del contratista de obra, hasta que se garantice la seguridad del equipo de trabajo.	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	1/12/2023	Oficina de Interventoria	0,00	se realizo trabajo administrativo, en las oficinas del contratista de obra, hasta que se garantice la seguridad del equipo de trabajo.	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	2/12/2023	Oficina de Interventoria	0,00	se realizo trabajo administrativo, en las oficinas del contratista de obra, hasta que se garantice la seguridad del equipo de trabajo.	contratista de obra e interventoria	N/A
N/A	3/12/2023	Oficina de Interventoria	0,00	se realizo trabajo administrativo, en las oficinas del contratista de obra, hasta que se garantice la seguridad del equipo de trabajo.	contratista de obra e interventoria	N/A

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Bloqueos en la via que comunica a la Ciudad de Pereira con el Municipio de Istmina y Medellin - Istmina	Se Alerta por posibles Bloqueos por parte de la Comunidad Indigena en forma de protesta en el transcurso del corredor vial que comunica a la Ciudad de Pereira con el Municipio de Istmina. Y la Ciudad de Medellin y el Municipio de Istmina	La firma Contratista alerta sobre los bloqueos Presentados en las vias que comunican al Municipio de Istmina con la cidad de Pereira y Medellin. A corte del presente informe es necesario detallar que los bloqueos efectivamnete se presentaron en los corredores viales mencionados, y fue imposible para la firma contratista adelatar el transporte de materiales para proveer la obra.	Alcaldía/Gobernación		23/11/2023
Orden Público	Se alerta sobre la situacion de orden publico acontecida el dia 28 de noviembre de 2023, fecha en la cual es recibido comunicado intimidatorio presuntamnete por organizaciones al margen de la ley. Suspensión de actividades hasta que se den las garantias de seguridad para los colaboradores del Proyecto	La firma Contratista alerta sobre la situacion acontecida en el lugar de la obra el dia 28 de noviembre de 2023. En el lugar de residencia del personal de interventoria fue recibido un comunicado intimidatorio y amenazante presuntamente elevado por organizaciones al margen de la ley. Se procede con la mayor precausion del caso para garantizar la seguridad del todo el personal Por ende en horas de la tarde del dia 28 de noviembre se suspenden todas las labor en campo, accion tomada con el animo de salvaguardar la integridad de los equipos de trabajo. Adicionalmente se alerta de la situacion que todo el departamento del Choco se encuentra afectado por un paro aramado decretado por organizacion al margen de la Ley de nombre ELN. Cabe señalar que,	Alcaldía/Gobernación/ENTerritorio		29/11/2023
Orden Público	Se pretende solicitar Suspension de la orden de trabajo de manera inmediata hasta que se den las garantias de seguridad para los colaboradores del Proyecto	La firma Contratista en vista de la gravedad de la situacion de orden publico en el Municipio de Rio Iro y en todo el departamento del Choco, procede a elevar la posibilidad de suspension de la orden de trabajo. Es prioridad que los equipos de trabajo de obra e interventoria cuenten con las garantias minimas sobre su bienestar	ENTerritorio		1/12/2023

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**02**
		VIGENCIA:	**2023-06-02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN	**IP**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14

Entidad Contratante: **ENTerritorio** Semana del **27/11/2023** al **3/12/2023** Fecha **3/12/2023**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

De acuerdo a las situaciones presentadas en el transcurso de la semana (orden público), no se cuenta con registro fotografico		

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contrato se da inicio el día 24 de agosto de 2023 con la actividad No. 1 (Diseños Estructurales y arquitectónicos) y Actividad No. 2 (Diagnostico y concertación). Cabe señalar que durante el periodo el contratista de obra adelanta actividades de soclialización y diagnósticos casa a casa, así mismo remite carpetas de diagnósticos a la interventoría para su revisión y/u observación o aprobación.

A la fecha el contratista de obra cuenta con un atraso del 3,64% de acuerdo al plan de trabajo avalado por la interventoría. Durante el periodo se tiene un porcentaje programado de ejecución acumulado del 6,06%, sin embargo de acuerdo al avance que se tiene a la fecha en las actividades de diseños y diagnósticos aprobados el contratista contó con 2,42% de ejecución.

Durante el periodo se presenta atraso en actividad 2 y 3, pues a la poca realizacion y aprobación de diagnósticos, y no contar con los materiales en sito el contratista de obra presenta un atraso del 3,64%.

Durante el periodo se presentan situaciones de orden publico e inseguridad para el personal del contratista de obra e interventoría, pues en el periodo se reciben panfletos con amenazas al contratista de obra e interventoría, situación que conllevó a las partes a retirar el personal del Municipio a fin de garantziar la seguridad del personal hasta atnto se brinden la seguridad suficiente. Cabe señalar que esta situación es informada a la Entidad Contratante a fin de que sea informado al Ministerio de Vivienda.


Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ	Nombre MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Director de Interventoría	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventorí

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 4.164.944.717,87


Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,12%	$ 4.938.639,00	0,00%	$ -
2	0,39%	$ 16.256.352,00	0,00%	$ -
3	0,66%	$ 27.574.065,01	0,13%	$ 5.443.779,94
4	0,93%	$ 38.891.778,01	0,66%	$ 27.521.331,92
5	1,21%	$ 50.209.491,01	0,88%	$ 36.594.298,49
6	1,48%	$ 61.527.204,01	1,32%	$ 55.042.663,84
7	1,73%	$ 72.050.782,02	1,52%	$ 63.208.333,75
8	1,97%	$ 82.083.865,02	1,62%	$ 67.279.256,42
9	2,21%	$ 92.116.948,02	1,62%	$ 67.279.256,42
10	2,45%	$ 102.150.031,02	1,95%	$ 81.014.385,77
11	2,69%	$ 112.183.114,02	2,22%	$ 92.460.326,90
12	2,93%	$ 122.216.197,03	2,42%	$ 100.758.634,22
13	3,89%	$ 162.009.799,03	2,42%	$ 100.758.634,22
14	6,06%	$ 252.219.630,05	2,42%	$ 100.758.634,22
15	9,08%	$ 378.153.616,08		$ -
16	12,65%	$ 526.956.211,11		$ -
17	16,63%	$ 692.675.312,14		$ -
18	20,77%	$ 864.973.054,18		$ -
19	25,51%	$ 1.062.332.286,22		$ -
20	30,68%	$ 1.277.704.464,27		$ -
21	36,41%	$ 1.516.571.788,32		$ -
22	43,16%	$ 1.797.730.376,38		$ -
23	50,93%	$ 2.121.180.228,44		$ -
24	59,71%	$ 2.486.921.344,52		$ -
25	69,51%	$ 2.894.953.724,60		$ -
26	80,32%	$ 3.345.277.368,70		$ -
27	92,42%	$ 3.849.169.946,80		$ -
28	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
29	99,67%	$ 4.151.160.898,87		$ -
30	100,00%	$ 4.164.944.717,87		$ -
	100,00%	**$ 4.164.944.718,00**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

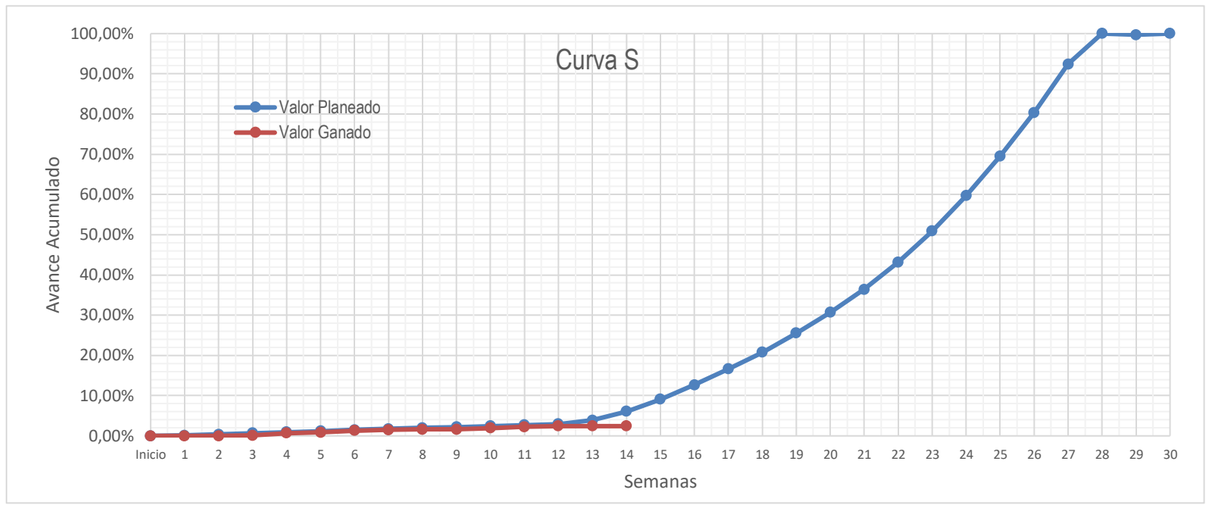

NOTA: Los porcentajes y valores económicos antes señalados corresponden a los establecidos en el Flujo de Inversión semanal allegado por el contratista de obra.

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC)	$	4.164.944.717,87

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACTIVIDAD 1 - DISEÑOS	0,18%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02	100,00%	$ 7.474.214,02
2	ACTIVIDAD 2 - DIAGNOSTICOS	3,15%	$ 131.342.174,45	100,00%	$ 131.342.174,45	71,02%	$ 93.284.420,20
3	ACTIVIDAD 3 - OBRA	96,67%	$ 4.026.128.329,40	0,00%	$ -	0,00%	$ -
		100,00%	**$ 4.164.944.717,87**	**3,33%**	**$ 138.816.388,47**	**2,42%**	**$ 100.758.634,22**

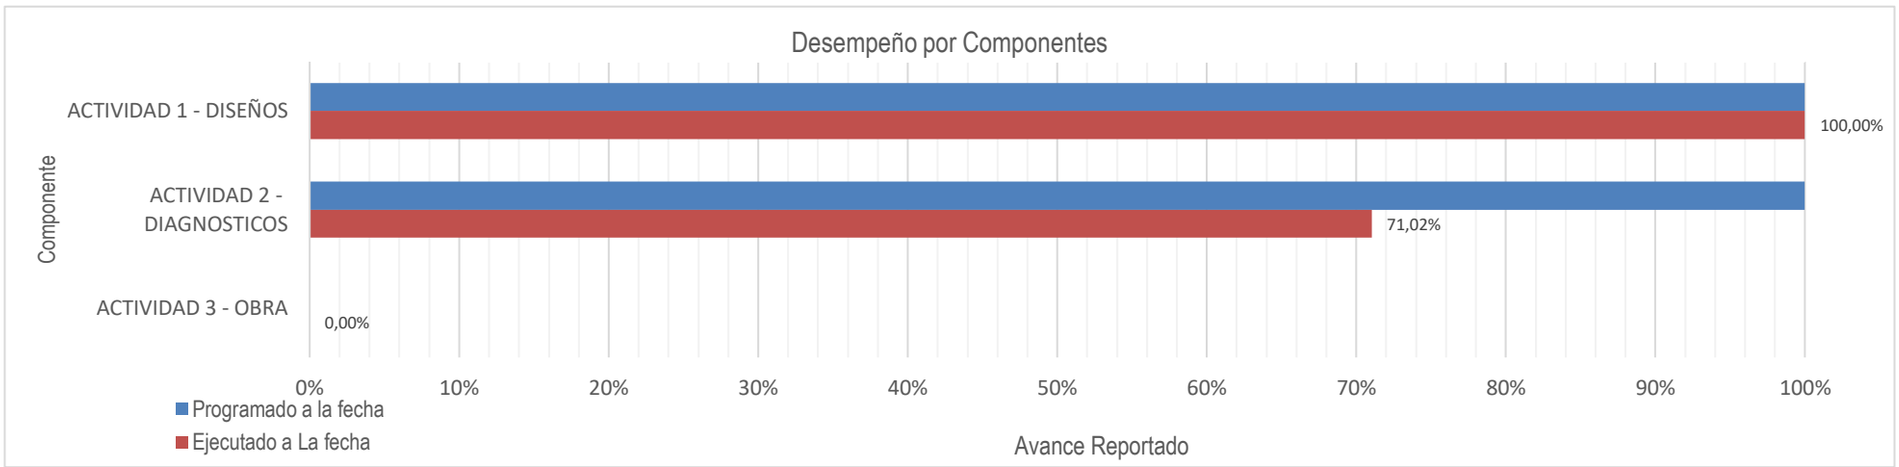

NOTA: Los valores antes señalados son aproximados, pues dependen del Flujo de inversión aportado por el contratista de obra

Domingo 26 de Noviembre 2023.

No se laboró, dia festivo.

Ing. residente de Obra.

Ing residente interventoria CAGS

Lunes 27 de Noviembre 2023.

Continuan Vias cerradas en la via Quibdo - Medellin y en la via Pereira - Istmina, lo cual obstaculiza que ingrese cualquie vehiculo de carga al departamento donde esta llega a ocasionar atrasos en la programación de obra al contratista de obra, cargos que no pueden ser imputados al contratista de obra.

En horas de la mañana el Residente de obra en compañia del residente de interventoria realizan prueba de estanqueidad a los lavaderos que se fabricaron. Adicionalmente se da VoBo del acabado de los lavaderos por parte del residente de interventoria.

En horas de la tarde el residente de obra en compañia del residente de interventoria realizan acercamiento al sector de Santa Barbara para validar desvio que actualmente construyen para desviar los vehiculos debido a pavimentación vial en vias principales de este sector, donde se pudo evidenciar que no hay garantias ni vias de acceso para transito de vehiculos de carga lo que llega a causar afectaciones al contratista del PCI ya que no tendria vias de acceso para poder hacer llegar los materiales que requiere el proyecto.

Esta interventoria Recomienda al contratista hacer llegar los Resultados de ensayos de laboratorio, toma de muestra y certificados de

conformidad de los productos para así garantizar l
calidad de los insumos realizados en sitio (bloque
estructural y cimientos) ya que si no se cuenta con la
calidad, no se tendrá en cuenta por parte de esta
interventoría.

Ing residente de obra

Ing residente interventoría

Martes 28 de Noviembre 2023.

Contratista de obra e interventoría suspenden actividad
a causa de amenazas recibidas en horas de la
madrugada por presunta organización al margen de
la ley.
Residente de obra e interventoría realizan acercami
al secretario de planeación en compañía de
trabajadora social de interventoría para ponerlo
en conocimiento y contextualizar la problemática
presentada.
Desde la firma contratista e interventoría ratificam
y solicitamos garantías y seguridad para el personal
y colaboradores del proyecto para que este se
desarrolle en los plazos establecidos sin llegar
a causar perjuicio o poner en riesgo a algún
integrante del equipo de trabajo.

ing. residente de obra.

ing residente interventoría CA

Miercoles 29 de Noviembre 2023

Contratista de obra e interventoria continuan con la suspensión de actividades hasta que se brinden las garantias y la seguridad de todos sus colaboradores.

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoria CAEE

Jueves 30 de Noviembres 2023.

Contratista de obra e interventoria continuan con la suspensión de actividades hasta que por parte de la Entidad Contratante solicite a los entes territoriales y demas Entidades donde se garantice la seguridad y se de las garantias de tranquilidad de todos los colabores. Hasta la fecha no se tiene certeza de los individuos que quieren intimidar a los profesionales que laboran el proyecto.

Ing. residente de Obra.

Ing Residente interventoria CAEE

Viernes, 01 de diciembre 2023

El contratista de obra e interventoria continuan con las actividades suspendidas hasta que no se garantice la seguridad e integridad de todos los colaboradores del proyecto a causa de las amenazas recibidas por grupos al margen de la ley.

Ing. residente de Obra.

Ing. residente interventoria CAEE

Sabado 02 de Diciembre de 2023.

El Contratista de obra e interventoria continuan con las actividades suspendidas hasta que no se garantic la seguridad e integridad de todos los colaboradore del proyecto a causa de las amenazas recibidas por grupos al margen de la ley.

Ing. residente de Obra CGE

Ing. residente de Interventoria

Domingo 03 de Diciembre de 2023.

El Contratista de obra e Interventoria continuan con las actividades suspendidas hasta que no se garantice la seguridad e integridad de todos los colaboradore del proyecto a causa de las amenazas recibidas por grupos al margen de la ley.

Ing. residente de Obra CGE

Ing. residente de Interventoria

Powered by CamScanner

INFORME SEMANAL SOCIAL # 10 COMPRENDIDO DEL 30 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

Durante este periodo se realizó reunión con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Asimismo, realizaron visitas de socialización casa a casa en el cuarto barrio priorizado (Barrio el Rosario) Esta interventoria realizó acompañamiento y/u apoyo técnico y social al contratista de obra en todas las viviendas visitadas. De igual forma, se contó con el acompañamiento de las profesionales sociales de los Entes Territoriales.

Lunes 30 octubre: Se realizaron actividades administrativas y elaboración de informes.

Martes 31 de octubre: Se realizaron actividades administrativas y elaboración de informes. Atención a la comunidad en horas de la tarde.

Miércoles 01 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas y elaboración de informes y se realizó presentación y socialización al Ministerio de manera virtual de las actividades sociales realizada durante el mes de octubre del año en curso. Asimismo, se realizó la instalación de los buzones de sugerencias de los barrios la Unión y el Rosario, con el acompañamiento de la veeduría y social de la Empresa de servicios públicos.

Jueves 02 de noviembre: Se realizaron (10) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, profesional social de la Empresa prestadora y en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas, para la organización de documentos

Viernes 03 de noviembre: Se realizaron (24) visitas de socialización casa a casa, en el barrio el Rosario, con el acompañamiento de la Interventoria, profesional social de la Empresa prestadora.

<u>Sábado 04 de noviembre:</u> Se realizaron actividades administrativas

Registro fotográfico de las actividades realizadas

Visitas de socialización casa a casa





Atención a la comunidad





Instalación de buzones de sugerencias

Buzón en el barrio el Rosario



Buzón del barrio la Unión



Total: PQRS 68

Inclusiones Totales: 68

Quejas: 0

TOTAL, DE PQRS	68
Barrio Nuevo	38
BARRIO LA REAL	17
Barrio la Unión	13
Barrio el Rosario	0

TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	54
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	14
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	54
TOTAL, DE PQRS CON RESPUESTA AVALADAS, POR QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DE FOCALIZACION DEL PCI	40
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	14
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	54
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	0
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	0



Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 11 COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Durante este periodo se realizaron visitas de socialización casa a casa en el cuarto barrio priorizado (Barrio el Rosario) Esta interventoria realizó acompañamiento y/u apoyo técnico y social al contratista de obra en todas las viviendas visitadas. De igual forma, se contó con el acompañamiento del presidente del comité veedor.

Lunes 06 noviembre: no se realizaron actividades día festivo

Martes 07 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas y organización de formatos.

Miércoles 08 de noviembre: Se realizaron (7) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, presidente de la veeduría, en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas, para la organización de documentos

Jueves 09 de noviembre: Se realizaron (2) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas. Se recibió respuesta de las 14 PQR por parte del operador de servicios públicos, Asimismo, se emitió un nuevo concepto de la PQR 045 del barrio la Real, como alcance a la respuesta anterior.

Viernes 10 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas y organización de formatos.

Sábado 11 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas.

Registro fotográfico de las actividades realizadas

Visitas de socialización casa a casa









Total: PQRS 68

Inclusiones Totales: 68

Quejas: 0

TOTAL, DE PQRS	68
Barrio Nuevo	38
BARRIO LA REAL	17
Barrio la Unión	13
Barrio el Rosario	0
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	54
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	14
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	68
TOTAL, DE PQRS CON RESPUESTA AVALADAS, POR QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DE FOCALIZACION DEL PCI	40
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	14
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	54
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	0
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	0



Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 12 COMPRENDIDO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

Durante este periodo se realizaron visitas de socialización casa a casa en los barrio priorizado para cierre de PQR por solicitud de inclusión. Esta interventoria realizó acompañamiento y/u apoyo técnico y social al contratista de obra en todas las viviendas visitadas. De igual forma, se contó con el acompañamiento de la profesional social de la Empresa de servicios públicos.

Lunes 13 noviembre: No se realizaron actividades día festivo.

Martes 14 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas y organización de formatos.

Miércoles 15 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas, para la organización de documentos y se realizó perifoneo de divulgación de la oferta de empleo en barrio Nuevo, con la instalación de carteleras y entrega de volantes.

Jueves 16 de noviembre: Se realizaron (5) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas. Se dio respuesta de cierre a las 14 por solicitud de inclusión PQR. se realizó perifoneo de divulgación de la oferta de empleo en barrio la Real, con la instalación de carteleras y entrega de volantes.

Viernes 17 de noviembre: Se realizaron (1) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas.

Sábado 18 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas.

Registro fotográfico de las actividades realizadas

Visitas de socialización casa a casa



Entrega de volantes informativos







Perifoneo para la oferta de empleo








Instalación de carteleras



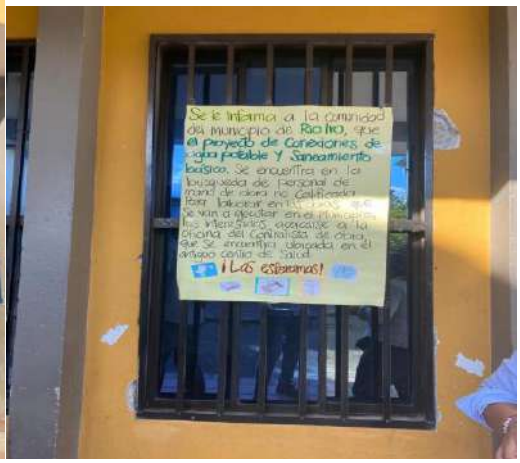

Atención al ciudadano





Total: PQRS 92

Inclusiones Totales: 92

Quejas: 0

TOTAL, DE PQRS	92
Barrio Nuevo	40
BARRIO LA REAL	19
Barrio la Unión	17
Barrio el Rosario	16
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	68
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	24
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	68
TOTAL, DE PQRS CON RESPUESTA AVALADAS, POR QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DE FOCALIZACION DEL PCI	58
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	24
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	68
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	0
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	0



Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 13 COMPRENDIDO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

Durante este periodo se realizaron visitas de socialización casa a casa en los barrio priorizado para cierre de PQR por solicitud de inclusión. Esta interventoria realizó acompañamiento y/u apoyo técnico y social al contratista de obra en todas las viviendas visitadas, perifoneos para la divulgación de la oferta de empleo. De igual forma, se contó con el acompañamiento de la profesional social de la Empresa de servicios públicos.

Lunes 20 noviembre: se realizaron dos visitas de socialización casa a casa para diagnósticos de inclusión en horas de la tarde se realizó perifoneo para la divulgación de la oferta de empleo en los barrios la Real y el Rosario. Asimismo, se realizó la instalación de carteleras informativas y entrega de volantes

Martes 21 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas y organización de formatos.

Miércoles 22 de noviembre: Se realizaron (4) visitas de socialización casa a casa, con el acompañamiento de la Interventoria, en horas de la tarde se realizaron actividades administrativas y revisión de los buzones de sugerencias los cuales se encontraron vacío.

Jueves 23 de noviembre: Se realizó comité de seguimiento presencial con la participación de la supervisión técnica del Ministerio de Vivienda y la supervisión técnica y social de la Entidad contratante, los profesionales técnicos y sociales de los contratistas de obra e interventoria, secretario de planeación municipal y Gerente de la empresa de servicios públicos. La interventoria realizó la retroalimentación del avance del Proyecto. Asimismo, la supervisión les dio la palabra a los participantes, para que manifestaran situaciones particulares en

otros temas. Posteriormente se realizó un recorrido de barrio en diferentes sectores de los cuatro barrios priorizados en donde los equipos técnicos y sociales realizaron una retroalimentación de cada sector visitado. De igual forma, se visitó la vivienda priorizada y los cuatro lugares donde se encuentran instalados los buzones de sugerencia y la valla informativa. Finalmente, el área técnica valido la calidad de los materiales.

Viernes 24 de noviembre: Esta Interventoria realizó un recorrido en barrio Nuevo para validación del barrido de la matriz inicial, revisión de codificación e identificación de 3 viviendas que aún no han solicitado inclusión al proyecto, De igual forma se le dio la información a los jefes de los hogares para la solicitud de inclusión.

Sábado 25 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas.

Registro fotográfico de las actividades realizadas

Revisión de los buzones de sugerencias





Recorrido de barrio



Visitas de socialización casa a casa



divulgación de la oferta de empleo





Atención al ciudadano





Total: PQRS 92

Inclusiones Totales: 92

Quejas: 0

TOTAL, DE PQRS	92
Barrio Nuevo	40
BARRIO LA REAL	19
Barrio la Unión	17
Barrio el Rosario	16
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	68
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	24
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	68
TOTAL, DE PQRS CON RESPUESTA AVALADAS, POR QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DE FOCALIZACION DEL PCI	58
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	24
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	68
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	0
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	0



Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

INFORME SEMANAL SOCIAL # 14 COMPRENDIDO DEL 27 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023

Durante este periodo se realizaron actividades administrativas debido a las amenazas recibidas en horas de la madrugada del martes 28 de noviembre del año en curso, situación que fue puesta en conocimiento de la Entidad Contratante y de los Entes Territoriales.

Lunes 27 noviembre: se realizó recorrido social en barrio nuevo con el fin de hacer un barrido de las viviendas que no cuentan con codificación y poder socializar el proceso de inclusión a los jefes de los hogares se identificaron dos viviendas y se realizó recepción ocho PQR, por solicitud de inclusión al Proyecto, del mismo modo, se realizó revisión de los strikes y subsanación de los mismo, para el caso de los que se veían borrosos o no se encontraban en buen estado.

Martes 28 de noviembre: El equipo social y técnico de los contratistas de obra e Interventoria suspendieron actividades a cusa de amenazas recibidas en horas de la madrugada por presuntos grupos al margen de la ley, se realizó acercamiento con el secretario de planeación para poner en conocimiento lo sucedido, se realizaron actividades administrativas y se tuvo que reprogramar las actividades del cronograma debido a que; con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de todos los profesionales vinculados al Proyecto, acercamiento con secretaria de planeación para poner en conocimiento lo sucedió. Cabe resaltar que desde la Alcaldía Municipal ven con preocupación lo sucedido se está a la espera de poder solucionar dicha novedad, para poder continuar con el normal desarrollo de las actividades en campo. Asimismo, los equipos de trabajo no se abstienen de desarrollar cualquier actividad en campo hasta que se brinde las garantías y seguridad de todo los profesionales y personal vinculado al proyecto a raíz de lo sucedido.

Miércoles 29 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas hasta que se brinden las garantías de seguridad y condiciones, para la correcta ejecución de las mismas, toda vez que; hay mucha incertidumbre a raíz del sucedido.

Jueves 30 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas hasta que se brinden las garantías de seguridad y condiciones, para la correcta ejecución de las mismas, toda vez que; hay mucha incertidumbre a raíz del

Viernes 01 de diciembre: Se realizaron actividades administrativas hasta que se brinden las garantías de seguridad y condiciones, para la correcta ejecución de las mismas, toda vez que; hay mucha incertidumbre a raíz de lo sucedido

Sábado 02 de diciembre: Se realizaron actividades administrativas hasta que se brinden las garantías de seguridad y condiciones, para la correcta ejecución de las mismas, toda vez que; hay mucha incertidumbre a raíz de lo sucedido

Domingo 03 de noviembre: Se realizaron actividades administrativas para la elaboración informes

Registro fotográfico de las actividades realizadas

Reunión con secretario de planeación municipal


C&E ENGINEERING SAS
Residente de interventoría


C&E ENGINEERING SAS
27/11/2023 9:39:53 a. m.

Total: PQRS 100

Inclusiones Totales: 92

Quejas: 0

TOTAL, DE PQRS	100
Barrio Nuevo	42
BARRIO LA REAL	19
Barrio la Unión	21
Barrio el Rosario	18
TOTAL, DE PQRS APROBADAS POR LA ALCALDIA	68
TOTAL DE PQRS SIN RESPUESTA POR LA ALCALDIA	0
TPTAL DE PQRS CON RESPUESTA DEL OPERADOR	92
TOTAL, DE PQRS CON RESPUESTA AVALADAS, POR QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DE FOCALIZACION DEL PCI	79
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X INCLUSIÓN	8
TOTAL DE PQRS CERRADAS X INCLUSIÓN	68
TOTAL DE PQRS POR QUEJAS	0
TOTAL DE PQRS ABIERTAS X QUEJAS	0



Candelaria González Medina

Profesional Social de Interventoria

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Informe de seguridad y salud en el trabajo

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Informe ambiental

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

NO APLICA

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Informe de Gestión Social

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

INFORME MENSUAL NUMERO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

1. Línea de comunicación

Visitas casa a casa

Con el objetivo de brindar información detallada sobre el Proyecto, el equipo social realizó visitas domiciliarias para responder preguntas y aclarar dudas sobre e inquietudes de los potenciales beneficiarios. Durante estas visitas, se explicaron a los residentes los criterios de selección del proyecto, así como los detalles de las actividades de diagnóstico llevadas a cabo en cada vivienda. Además,

Durante estas visitas, el equipo social hizo hincapié en la importancia de concertar con el equipo técnico el espacio para la intervención, no dejar los menores de edad solos en las viviendas durante la ejecución de las obras, mantener los materiales recibidos bajo custodia, para poder intervenir la vivienda sin dificultades y no dejar los trabajadores solos en las viviendas durante la ejecución de las obras.

La comunidad manifestó sus dudas referentes al Proyecto, las cuales fueron el proceso de inclusión, tiempo de inicio de las obras, falta de red de alcantarillado, las cuales fueron resueltas por el equipo social y entendidas por los potenciales beneficiarios.

Durante este periodo se informa que se han realizado visitas de socialización casa a casa para un total hasta la fecha de 515 visitas, en los 4 barrios priorizados del PCI, en barrio nuevo se han llevado a cabo 232 visitas de la cuales 173 son efectivas 57 no efectivas y 2 renuncias; en el segundo barrio priorizado (barrio la real) se lleva un total de 71 visitas casa a casa de las cuales 49 son efectivas, 14 no efectivas y 7 renuncias, el tercer barrio priorizado (barrio la unión) se llevan 89 visitas casa a casa, de las cuales 58 son efectivas, 24 no efectivas y 4 renuncias y por último, el cuarto barrio priorizado (barrio el rosario) se lleva un total de 123 visitas casa a casa a la fecha, siendo 83 efectivas, 28 no efectivas y 12 renuncias.

Material de divulgación

El 14 de noviembre se realizó perifoneo en el barrio el Rosario con el fin de informarle a la comunidad de la apertura del proceso de inclusión al Proyecto

El 15 y 16 de noviembre de 2023 se realizó perifoneo local en barrio Nuevo y la Unión para informarle a la comunidad la apertura de la oferta de empleo con el fin de ampliar la información para que todas las personas interesadas puedan ir al Punto de atención a llevar su hoja de vida y aclarar dudas e inquietudes. Asimismo, se realizó entrega de volantes e instalación de carteleras informativas

.

El 20 de noviembre del 2023 se llevó a cabo perifoneo local en los barrios la Real y el Rosario para informarle a la comunidad sobre la apertura de la oferta de empleo. con el fin de ampliar la información para que todas las personas interesadas puedan ir al Punto de atención a llevar su hoja de vida y aclarar dudas e inquietudes. Asimismo, se realizó entrega de volantes e instalación de carteleras informativas

Link informativo:

Se realizó envió de la información para la actualización del Link informativo a la Entidad contrastante, para su revisión y/o aprobación con el fin de poder hacer entrega oficial a la Alcaldía municipal, para la debida actualización del mismo.

https://www.rioiro-choco.gov.co/noticias/programa-conexiones-intradomiciliarias-de-agua-potable

2. Línea de participación comunitaria:

Actividades del comité veedor:

El 01 de noviembre se realizó la instalación de los buzones de sugerencias de barrio la Unión y el Rosario con el acompañamiento de dos miembros de la veeduría del Proyecto, Se ubicaron en lugares estratégicos para mayor identificación por parte d ela comunidad el buzón del barrio la Unión se instaló en el punto de atención el cual se encuentra ubicado en el mismo barrio.

El buzón de sugerencia del barrio el Rosario se instaló en un local comercial ubicado en la manzana cinco del mismos como lugar estratégico recomendado por la veeduría

Punto de atención

El contratista de obra realizó la atención a la comunidad en el punto de atención principal el cual se encuentra identificado mediante un pendol ilustrativo la atención se realiza de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5;00 p.m. al cual durante el periodo de este reporte se acercaron 32 personas a consultar información sobre la oferta de empleo y la recepción de hojas de vida, a solicitar inclusión al proyecto. Cabe resaltar que; el equipo social y técnico de obra han realizado atención personalizada a las 32 personas que se han acercado al punto de atención para obtener mayor información sobre la oferta de empleo. Del mismo modo, le brindan información clara sobre el proceso de selección del personal al momento de dar inicio a las actividades en obra.

Buzón de sugerencias

El 01 de noviembre se instaló el buzón de sugerencias del barrio la Unión se ubicó en la oficina del contratista de obra, la cual se encuentra en dicho barrio se seleccionó este sitio debido a que es un lugar estratégico de fácil ubicación para la comunidad y por recomendación de la veeduría.

De igual forma, se realizó la instalación de buzón de sugerencias del barrio el Rosario se realizó el 01 de noviembre de 2023, en un local comercial el cual se encuentra ubicado en un lugar estratégico para mayor ubicación de la comunidad

Se realizó la revisión de los mismos los días 3, 17, 22 de noviembre los cuales se encontraron vació. Para esta actividad se contó con el acompañamiento de la Interventoria

PQR

Durante el periodo reportado de este informe, se recepcionaron treinta y dos PQR por solicitud de inclusión de las cuales (4) de barrio Nuevo, la Real (2) la Unión (8) el Rosario (18) de las cuales (24) PQR, cuentan con respuesta por parte del Operador de servicios públicos y de la Alcaldía Municipal. De igual forma, el equipo social estará realizando la entrega de la respuesta de cierre a los solicitantes.

No. de PQR recepcionadas en el mes	No. de PQR totales	No. de PQR pendiente de respuesta	No. de PQR cerradas
32	100	8	68

Recorridos de obra

El 23 de noviembre del 2023 se realizó un recorrido de barrio en los cuatro barrios priorizados, en cabeza del Ministerio de Vivienda y ENTerritorio, el cual contó con la participación de 17 asistentes entre los que se encontraba, en representación del Ministerio de vivienda el Ingeniero Álvaro Cañizares, desde ENTerritorio el Ingeniero Maikol Quevedo, Lina Otàlvaro supervisora social, por parte de la Alcaldía municipal la el secretario de Planeación Municipal, de la empresa prestadora de servicio público estuvo presente el Gerente, Directores de obra e Interventoria, por parte de los contratistas de obra e interventoria los profesionales residentes técnicos y sociales; se dio inicio a la reunión preliminar en las instalaciones de la Interventoria liderada por por la Interventoria, quien solicito a los asistentes realizan la presentación y su rol en el proyecto, seguidamente tomo la palabra para socializa la agenda de la actividad. Asimismo, la interventoria realizar una retroalimentación de las actividades desarrolladas en cada componente según el avance del proyecto, seguido tomo la palabra el Director de obra de obra y dio a conocer el plan de contingencia, para nivelar la programación entre otros temas tratados, la supervisión social de la Entidad Contratante realizo recomendaciones sobre la contratación y divulgación de la oferta en cada barrio y la inclusión femenina, se dio inicio al recorrido en el barrio nuevo donde se realizó la visita a las 5 viviendas con casos específicos las cuales fueron validadas técnicamente con el fin de unificar criterios y al lugar de ubicación de los buzones de sugerencias de los cuatro priorizados

en el recorrido se llegó a una vivienda donde se hizo énfasis al contratista de obra en darle prioridad en la ejecución de la obra ya que la beneficiaria es una adulta mayor y vive en precarias condiciones, lo siguiente fue sugerido por el Ingeniero Álvaro Cañizares, el ingeniero Maikol Quevedo y Lina Otalvaro como representantes del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y ENTerritorio al finalizar el recorrido por el barrio nuevo, el equipo se dirigió hacia el Rosario en donde se visitaron dos sectores sin Red de alcantarillado en donde se encuentran ubicadas diez viviendas que están en matriz inicial, un sector en zona de riesgo y el lugar donde está ubicada la valla informativa del Proyecto. Posteriormente se visitó la Real un sector donde no se va a intervenir porque las viviendas se encuentran construidas palafíticamente (madera en estado crítico) y los espacios no dan para poder realizar la intervención, por ende el equipo técnico social de los contratistas de obra e interventoria en las visitas casa a casa las diagnosticaron como viviendas no efectivas, dándole a conocer al Ministerio y ENTerritorio la problemática de la zona, quienes avalaran la decisión de los contratistas de no intervenir dicho sector, nos dirigimos para que vieran de cerca las viviendas e inspeccionar la zona, donde se ratificó que no se puede intervenir por el riesgo en que se encuentran las mismas. Del mismo modo, se visitó un sector del barrio la Unión que está en zona de riesgo y se encuentran más de quince viviendas en matriz inicial, finalmente se visitó la oficina del contratista de obra, para revisión de planos y programación los cuales se encontraron visible y legible.

.

Barrio	Fecha	No. de asistentes	Objetivo del recorrido
Barrio nuevo	23/11/23	17	Recorrido de barrio
Barrio el real	23/11/23	17	Recorrido de barrio
La Unión	23/11/23	17	Recorrido de barrio
El Rosario	23/11/23	17	Recorrido de barrio

3 Actividades complementarias

Se realizó comité de seguimiento presencial con la participación de la supervisión técnica del Ministerio de Vivienda y la supervisión técnica y social de la Entidad contratante, los profesionales técnicos y sociales de los contratistas de obra e interventoria, secretario de planeación municipal y Gerente de la empresa de servicios públicos. La interventoria realizó la retroalimentación del avance del Proyecto. Asimismo, la supervisión les dio la palabra a los participantes, para que manifestaran situaciones particulares en otros temas. Posteriormente se realizó un recorrido de barrio en diferentes sectores de los cuatro barrios priorizados en donde los equipos técnicos y sociales realizaron una retroalimentación de cada sector visitado. De igual forma, se visitó la vivienda priorizada y los cuatro lugares donde se encuentran instalados los buzones de sugerencia y la valla informativa. Finalmente, el área técnica valido la calidad de los materiales.

NOTA: Cabe informar que acorte del presente informe se tiene un total de 198 mujeres beneficiaria del Poyecto de las cuales 116 son madre cabeza de familia con un gran número de hijos de todas las edades dichas mujeres realizan actividades en el campo y el barequeo para poder llevar el sustento a sus hijos que se quedan en casa acompañados de un familiar mayor de edad o con un vecino

Dificultades: Cabe informar que; el 28 de noviembre se recibieron amenazas de presuntos grupos al margen de la ley en donde expresaban que le daban 24 horas a los profesionales de los equipos de trabajo de obra e interventoria, para que se pusieran en contacto con dicho grupo de los contrario harían volar con explosivos los lugares de

residencia, puesto que todos estaban identificados que no se podían adelantar actividades en campo hasta tanto no se realizara dicha concertación de la vacuna, esta situación afecta contra la integridad física y mental de los profesionales encargados de ejecutar las actividades del Proyecto, debido a esto el personal de la Interventoria se vio en la obligación de salir del municipio hasta que se pueda lograr dar solución a esta novedad que afecta en gran manera la correcta ejecución del Proyecto.



Candelaria González Medina

Residente social de Interventoria

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Conclusiones y recomendaciones

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

RECOMENDACIONES GENERALES, CONCLUSIONES Y DIFICULTADES DEL PROYECTO

Se logró realizar las actividades correspondientes al componente técnico y social programadas por el contratista de obra, a corte del presente informe. Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del año 2023, en donde se evidenció la satisfacción de la comunidad toda vez que, en el recorrido de barrio realizado el 23 de noviembre del año en curso, liderado por el Ministerio de Vivienda y ENterritorio acompañamiento de la Interventoria, Gerente de la Empresa de servicios públicos y secretario de Planeación Municipal se evidencio la satisfacción y buena comprensión de la comunidad frente al Proyecto.

RECONDACIONES:

- Se le recomienda al contratista de obra remitir a esta Interventoria los diagnósticos faltantes de los dos últimos barrios priorizados.

- Dar celeridad a la entrega de la documentación del barrio del barrido de la matriz inicial de los cuatro barrios priorizados la cual se ha requerido oficialmente mediante comunicados, debido a que la actividad número dos ya fue concluida.

- Entregar a tiempo la información solicitada por la Interventoria, para la elaboración de informes, para poder cumplir con la entrega oportuna a la Entidad Contratante

- Se le recomienda al contratista de obra reforzar la divulgación de la oferta de empleo y la divulgación para que los padres de familia colaboren con los niños y niñas, para que no se acerquen a las maquinarias y actividades de obra.

- Es importante que la Supervisión del contrato y entidad contratante en general tenga en cuenta los tiempos que se han perdido por las situaciones de orden publico y amenazas presentadas en el periodo, pues al presentarse esta situación se ocasionó una perdida de tiempos no imputable a las partes. Cabe señalar que todas las situaciones presentadas durante el periodo fueron informadas en debida forma a la Supervisión.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que para este periodo se ha culminado con las actividades técnicas y sociales programadas por el contratistas de obra en los dos cuatro barrios priorizados, por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y las actividades

programadas en la línea de Comunicación, para la implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad y los contratistas de obra e Interventoría, El empoderamiento, agradecimiento de los beneficiarios al momento de permitir el ingreso de los equipos de trabajo a sus viviendas.

- Se logró realizar un buen proceso de divulgación previo al inicio de las actividades y en buen proceso en las socializaciones correspondientes en la línea de comunicación del Pan de Gestión Social. Las cuales han permitido una buena comprensión del Proyecto por parte de loa comunidad.

- Debido a la problemática presentada en el periodo, el contratista de obra e interventoría solicitaron a la Supervisión del contrato adelantar la suspension de los contratos toda vez que no se podían ejecutar obras o actividades; y al no poder ejecutar obras se podían ocasionar perdidas de tiempos contractuales, los cuales fueron advertidos a la Entidad que de no suspenderse de forma inmediata y oportuna, se debía reponer este tiempo al proyecto.

DIFICULTADES Y NOVEDADES

.

- Cabe informar que; el 28 de noviembre se recibieron amenazas de presuntos grupos al margen de la ley en donde expresaban que le daban 24 horas a los profesionales de los equipos de trabajo de obra e interventoria, para que se pusieran en contacto con dicho grupo de los contrario harían volar con explosivos los lugares de residencia. Cabe señalar que desde el 28 de noviembre se efectúo un cese de actividades toda vez que esta fue la instrucción del grupo armado hasta tanto no se realizada la concertación entre contratista de obra, interventoría y Grupo armado. Es importante que esta situación afecta la integridad física y mental de los profesionales encargados de ejecutar las actividades del Proyecto, debido a esto el personal de la Interventoria se vio en la obligación de salir del municipio hasta que se pueda lograr dar solución a esta novedad que afecta en gran manera la correcta ejecución del Proyecto. Dicha problemática fue informada de forma inmediata a la Entidad contratante a fin de que estuviera al tanto de la problemática que se venia presentando en obra y que impedían ejecutar actividades constructivas.

- No se realizarán actividades en campo hasta que se brinden las garantías de seguridad y condiciones, para la correcta ejecución de las mismas, toda vez que; hay mucha incertidumbre a raíz de lo sucedido

CONTRATISTA

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

Relación de correspondencia

ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DECONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL YAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOSY DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓNSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ENTIDAD CONTRATANTE:

ENTerritorio

Bogotá D.C, 31 de octubre de 2023

CAEE- RI-2023-117
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 1/11/2023
HORA: 9:34:33 a. m.
20234300366072

Ingeniero
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Supervisor Técnico
ENTerritorio
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co
Calle 26 # 13-19
Bogotá, D.C. – Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

Respetado Ingeniero,

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos dar traslado del requerimiento realizado por el contratista de obra mediante comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-109 del día 31 de octubre de 2023 referente al estado actual del proceso de aprobación del sistema de mampostería estructural propuesto por este y aprobado por la Interventoría. Lo anterior se remite para su conocimiento y respuesta respectiva.

Cabe señalar que la aprobación y recomendación de dicho sistema se efectuó desde el pasado 18 de octubre de 2023, sin embargo, a la fecha no se cuenta con respuesta alguna. Es importante contar con una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, pues de no contarse con la respuesta, no será posible adelantar intervenciones que requieran de este insumo. Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a ENTerritorio, otorgar una respuesta lo antes posible y así brindar

las garantías suficientes para el correcto inicio y ejecución de las actividades constructivas.

Quedamos atentos a sus comentarios y pronta respuesta.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Representante Legal
C&E Engineering SAS

Elaboró: Jorge Hernandez
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C. 31 de octubre de 2023

PPDI-OF-CGE-23-109

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO

Señores
Ing. Oscar Mauricio Almario Fernández
C&E Engineering SAS.
Email: proyectosdeingenieria.caee@gmail.com
interventoría.

REFERENCIA: ORDEN DE TRABAJO 2230223.

OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

ASUNTO: Solicitud de información sobre el proceso de aprobación del sistema de mampostería estructural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo amablemente con el animo de solicitar se nos informe sobre el estado de aprobación por parte de la Entidad contratante sobre el sistema de mampostería estructural propuesto para el desarrollo del presente proyecto.

Si bien el concepto emitido por la presente interventoría fue favorable, y que mediante comunicación CAEE- RI-2023-098 de fecha 18 de octubre de 2023, se aprobó la Actividad No. 1 dando la correspondiente recomendación sobre el cambio de metodología, a la fecha no contamos con la correspondiente autorización por parte de la Entidad Contratante. Por lo anterior solicitamos comedidamente se nos informe si la mampostería en bloque estructural ya se encuentra autorizada, para así, proceder con todas las actividades previas para iniciar esta actividad.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Director de obra
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

Bogotá D.C, 02 de noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-119
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 3/11/2023
HORA: 10:33:36 a. m.
20234300369252

Ingeniero
MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Director de Obra
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 125 No. 60-65
Bogotá, D.C. – Colombia

REFERENCIA: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO No. PPDI-OF-CGE-23-112 (1 de noviembre de 2023)

Respetado Ingeniero Martínez,

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a su comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-112, mediante el cual se allegan subsanación de diagnósticos para su validación, nos permitimos remitir el resumen del cuadro de diagnósticos entregados el día 1 de noviembre de 2023 la cual se encuentra todo en orden y cumple para su respectiva aprobación, dicha información se encuentra relacionada de la siguiente forma:

CODIGO VIVIENDA	CONCEPTO FINAL
CH-RI-LU-M3-VE-040	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M6-VE-047	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M3-VE-050	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M6-VE-056	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M7-VE-066	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M3-VE-067	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M5-VE-070	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M3-VE-075	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M3-VE-076	**CUMPLE**
CH-RI-LU-M3-VE-077	**CUMPLE**
CH-RI-LR-M3-IN-VE-005	**CUMPLE**

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos informar al contratista de obra que una vez evaluada la documentación aportada por el contratista se determina que la misma CUMPLE con todos los requisitos establecidos, por tal motivo se procederá a programar comité de aprobación para el próximo **viernes 3 de noviembre de 2023**.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Director de Interventoría
C&E Engineering SAS

Elaboró: Ing. Fabio Osorio
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C, 08 noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-120
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

Ingeniero
MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Director de Obra
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 125 No. 60-65
Bogotá, D.C. – Colombia

enterritorio FECHA 9/11/2023
HORA: 9:17:21 a. m.
20234300375082

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO No. PPDI-OF-CGE-23-118 - OBSERVACIONES ENTREGA DE DIAGNOSTICOS (03 de noviembre de 2023)

Respetado Ingeniero Martínez,

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a su comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-118, nos permitimos remitir el cuadro de diagnósticos entregados el día 03 de noviembre de 2023 relacionada de la siguiente forma:

- BARRIO El ROSARIO

CÓDIGO DE VIVIENDA
CH-RI-ER-M8-VE-002
CH-RI-ER-M8-VE-004
CH-RI-ER-M7-VE-005
CH-RI-ER-M8-VE-008
CH-RI-ER-M7-VE-009
CH-RI-ER-M7-VE-013
CH-RI-ER-M2-VE-018
CH-RI-ER-M7-VE-022

CH-RI-ER-M7-VE-023
CH-RI-ER-M7-VE-027
CH-RI-ER-M6-VE-028
CH-RI-ER-M6-VE-032
CH-RI-ER-M6-VE-033
CH-RI-ER-M5-VE-036
CH-RI-ER-M5-VE-039
CH-RI-ER-M5-VE-040
CH-RI-ER-M5-VE-042
CH-RI-ER-M5-VE-043
CH-RI-ER-M4-VE-045
CH-RI-ER-M4-VE-047
CH-RI-ER-M4-VE-058
CH-RI-ER-M4-VE-061
CH-RI-ER-M4-VE-065
CH-RI-ER-M4-VE-066
CH-RI-ER-M4-VE-068
CH-RI-ER-M3-VE-069
CH-RI-ER-M3-VE-071
CH-RI-ER-M2-VE-073
CH-RI-ER-M3-VE-077
CH-RI-ER-M2-VE-080
CH-RI-ER-M2-VE-082
CH-RI-ER-M3-VE-083
CH-RI-ER-M2-VE-086
CH-RI-ER-M2-VE-093
CH-RI-ER-M9-VE-096
CH-RI-ER-M9-VE-100
CH-RI-ER-M9-VE-102
CH-RI-ER-M2-VE-103
CH-RI-ER-M9-VE-105
CH-RI-ER-M2-VE-111

A continuación, se realiza revisión y/u observación de cada diagnóstico de forma individual de acuerdo a los requisitos de cada formato:

- **BARRIO EL ROSARIO**

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M8-VE-002

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Aclarar fotografía 2	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M8-VE-004

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Aclarar fotografía 3	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-005

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M8-VE-008

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Ítem 2,2 y 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
PCI-008	NO CUMPLE	Ítem 2,2 y 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-009

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	NO CUMPLE	Tubería de 2” y 4” no coinciden con el cuadro resumen	
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-013

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Cambiar fotografía 2 por una donde se pueda observar los elementos	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-018

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Ítem 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
PCI-008	NO CUMPLE	Ítem 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-022

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	NO CUMPLE	Diligenciar ítem 20 y 22	
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Ítem 2,2 y 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
PCI-008	NO CUMPLE	Ítem 2,2 y 2,3 no coincide con el plano arquitectónico	
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 5 aclarar	
F-GG-04	NO CUMPLE	Corregir descripción	
PCI-009	NO CUMPLE	Diligenciar nombre y cedula del beneficiario	
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-023

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 2, complementar descripción técnicamente	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M7-VE-027

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE	Tomar fotografía desde un ángulo donde se pueda observar completamente la fachada	
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M6-VE-028

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Diligenciar ítem 2,6	
PCI-008	NO CUMPLE	Diligenciar ítem 2,6	
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 1 cambiar; fotografía 2 complementar descripción técnicamente	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M6-VE-032

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	NO CUMPLE	Ítem 34 no coincide con el tipo de intervención	
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M6-VE-033

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	NO CUMPLE	Tubería de ½" y 2" no coincide con el cuadro resumen.	
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M5-VE-036

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M5-VE-039

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Ítem 3,27 no es necesario; ítem 4,5 es necesario contemplarlo	
PCI-008	NO CUMPLE	Ítem 3,27 no es necesario; ítem 4,5 es necesario contemplarlo	
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M5-VE-040

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 2 complementar descripción técnicamente	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M5-VE-042

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Aclarar fotografía 5	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M5-VE-043

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	NO CUMPLE	Número del formulario	
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-045

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	NO CUMPLE	Fecha no coincide con la de elaboración del diagnostico	
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	NO CUMPLE	Firma del director de obra faltante	
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	NO CUMPLE	Diligenciar código	
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-047

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-058

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Describir técnicamente porque ni incluyeron el lavaplatos y el lavadero	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-061

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-065

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Ítem 2,13 no es legible	
PCI-008	NO CUMPLE	Ítem 2,13 no es legible	
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	NO CUMPLE	Tubería de 4” no coincide con el cuadro resumen	
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-066

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	NO CUMPLE	Contemplar lavadero	
PCI-008	NO CUMPLE	Contemplar lavadero	
F-GG-25	NO CUMPLE	Contemplar descripción técnicamente fotografía 2	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M4-VE-068

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 2 contemplar descripción según lo evidenciado en la fotografía	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M3-VE-069

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	NO CUMPLE	Mal escrito el segundo nombre del beneficiario	
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M3-VE-071

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-073

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M3-VE-077

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-080

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-082

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M3-VE-083

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Fotografía 2 complementar técnicamente la descripción	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-086

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Complementar técnicamente descripción de la fotografía 3	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-093

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M9-VE-096

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	CUMPLE		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M9-VE-100

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M9-VE-102

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Complementar técnicamente la descripción de la fotografía 2	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-103

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	NO CUMPLE	Describir técnicamente el cambio del elemento de la fotografía 3	
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**	Se requiere se atienda a las observaciones y recomendaciones señaladas.	

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M9-VE-105

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

CODIGO VIVIENDA: CH-RI-ER-M2-VE-111

DOCUMENTO	CONCEPTO CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	RECOMENDACIÓN
PCI-003	CUMPLE		
PCI-004	CUMPLE		
PCI-005	CUMPLE		
PCI-007	CUMPLE		
PCI-008	CUMPLE		
F-GG-25	CUMPLE		
F-GG-04	CUMPLE		
PCI-009	CUMPLE		
Plano arquitectónico	CUMPLE		
Copia de cedula	CUMPLE		
Acreditación de la vivienda	CUMPLE		
Copia de la factura de servicio	CUMPLE		
CONCEPTO FINAL	**CUMPLE**		

RESULTADO FINAL

CODIGO VIVIENDA	CONCEPTO FINAL
CH-RI-ER-M8-VE-002	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M8-VE-004	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-005	CUMPLE
CH-RI-ER-M8-VE-008	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-009	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-013	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-018	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-022	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-023	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M7-VE-027	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M6-VE-028	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M6-VE-032	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M6-VE-033	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M5-VE-036	CUMPLE
CH-RI-ER-M5-VE-039	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M5-VE-040	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M5-VE-042	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M5-VE-043	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-045	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-047	CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-058	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-061	CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-065	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-066	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M4-VE-068	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M3-VE-069	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M3-VE-071	CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-073	CUMPLE
CH-RI-ER-M3-VE-077	CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-080	CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-082	CUMPLE
CH-RI-ER-M3-VE-083	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-086	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-093	CUMPLE
CH-RI-ER-M9-VE-096	CUMPLE
CH-RI-ER-M9-VE-100	CUMPLE
CH-RI-ER-M9-VE-102	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-103	NO CUMPLE
CH-RI-ER-M9-VE-105	CUMPLE
CH-RI-ER-M2-VE-111	CUMPLE

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos informar al contratista de obra que una vez evaluada la documentación aportada por el contratista se determina que la misma NO CUMPLE con todos los requisitos establecidos, por tal motivo se procede a efectuar la devolución de aquellos que no cumplen para su complemento y ajuste; ahora bien, se procederá a programar comité de aprobación para el día 10 de noviembre de 2023 a las 10:00 am para aquellas viviendas que **CUMPLE** con todos los requisitos.

Nota: Se solicita y recomienda al contratista de obra recoger las carpetas físicas en las oficinas de la interventoría en obra, con el fin de que se realicen las correcciones sobre estas.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Director de Interventoría
C&E Engineering SAS

Elaboró: Ing. Fabio Osorio
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C, 08 de noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-121
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

Ingeniero
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Supervisor Técnico
ENTerritorio
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co
Calle 26 # 13-19
Bogotá, D.C. – Colombia

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 9/11/2023
HORA: 10:03:53 a. m.
20234300375222

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE SERVICIO No. 2230219

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES SEMANALES No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.

Respetado Ingeniero,

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir Informes semanales No. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 con corte del 18 de septiembre de 2023 al 05 de noviembre de 2023. Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Representante Legal
C&E Engineering SAS

Elaboró: Jorge Hernandez
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C, 09 de noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-122
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

eterritorio FECHA 10/11/2023
HORA: 10:18:51 a. m.
20234300377772

Ingeniero
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 44 B No. 59-89
Bogotá, D.C. – Colombia

REFERENCIA: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO No. PPDI-OF-CGE-23-114 – PLAN DE CONTINGENCIA

Respetado Ingeniero,

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta al comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-114 mediante el cual se remite Plan de Contingencia; de acuerdo a lo señalado por el contratista nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Como quiera que el contratista remite el Plan de Contingencia para la ejecución del contrato de la referencia, esta interventoría se permite aclarar al contratista que mediante comunicado No. CAEE-RI-2023-113 señaló y/o requirió lo siguiente:

   "*Es importante que el contratista de obra desde ya adelante el acercamiento con los proveedores y realice el plan de compras para que en la fecha en la que sea habilitado el puente vehicular se ingrese de forma inmediata los insumos respectivos, por tal motivo, se requiere que el contratista adelante este tipo de actividades preliminares que conlleven a contar con el suministro de materiales en un tiempo no mayor de 4 días calendario desde la fecha de apertura del puente, tiempo suficiente para que los proveedores realicen el cargue, transporte y suministro de materiales a Rio Iró*

   Elaborar y allegar a esta interventoría un plan de contingencia a partir de la fecha real de apertura del puente hasta la fecha de culminación del contrato relacionando de forma

detallada y especifica la correcta ejecución de la Actividad No. 2 y No. 3, el cual deberá contemplar el inicio, ejecución y entrega a satisfacción de cada intervención, consignando en el mismo las observaciones, aclaraciones y/o salvedades a que haya lugar. Es importante que el contratista tenga presente dentro de la elaboración de este plan de contingencia el correcto compra, suministro, transporte y acopio de materiales al Municipio y a cada vivienda especifica, contratación y afiliación del personal (Profesional, Técnico y/u operativo), plan de compras, y demás recursos o actividades necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Cabe señalar que este plan de contingencia será revisado y evaluado por la interventoría para su respectiva aprobación. De acuerdo a lo anterior, se requiere que el contratista de obra allegar a esta interventoría antes de las 02:00 pm del día 01 de noviembre de 2023 el plan de contingencia y flujo de inversión semanal y mensual propuesto para su respectiva validación y/u observación o aprobación, con fecha de inicio de la Actividad No. 3 el día 01 de noviembre de 2023; cabe señalar que una vez se cuente con la fecha real de apertura del puente, será necesario que se actualicen las fechas y plazos de entrega de cada intervención"

De acuerdo a lo anterior, y a lo evidenciado a través de las redes sociales tal y como lo manifiesta el contratista en su comunicado, el puente vehicular fue habilitado para paso vehicular a partir del día 31 de octubre de 2023, por tal motivo, es claro que el contratista debió adelantar las actividades necesarias para contar con el material máximo el día 7 de noviembre de 2023, tal y como se había informado por parte del Director de Interventoría.

Si bien, el contratista manifiesta en su comunicado una serie de observaciones, salvedades, alertas y/o requerimientos, se aclara que las mismas ya han sido atendidas por esta interventoría en sendos comunicados remitidos al contratista de obra. Ahora bien, se reitera lo señalado por parte de la Entidad Contratante a la solicitud de contar con 15 días para la adquisición, transporte y disposición de insumos, mano de obra y/o equipos necesarios para la ejecución del contrato: *"(…) nos permitimos manifestar que se estableció previamente un plazo específico para que el contratista asegurara la adquisición de materiales y la contratación de personal operativo y mano de obra no calificada. El contratista estaba plenamente consciente de los tiempos y las condiciones geográficas en las que se llevaría a cabo el proyecto, por lo tanto, es su responsabilidad cumplir con los plazos acordados y asegurarse de que todos los recursos necesarios estén disponibles de manera oportuna".* Por lo anterior, se establece que el contratista contó con el tiempo suficiente para la compra de materiales y consecución de mano de obra no calificada, pues durante el primer mes de ejecución debió prever esta situación y efectuar la logística necesaria previa habilitación del puente. Por último, es importante que el contratista analice y revise la Matriz de riesgos del proyecto la cual fue previsible desde el proceso licitatorio.

2. Si bien el contratista de obra remite un plan de contingencia y contempla una ejecución de obra a partir del día 14 de noviembre de 2023, es importante que se tenga presente que el requerimiento de esta interventoría fue contemplar suministro de materiales entre el 30 de octubre de 2023 hasta el día 06 de noviembre de 2023 y el inicio de ejecución de obra a partir del 07 de noviembre de 2023, por tal motivo los días adicionales que el contratista haya contemplado para el suministro de materiales no serán objeto de reconocimiento en una posible solicitud de prórroga. Ahora bien, al ser el plan de contingencia una medida o tratamiento para mitigar y corregir el riesgo presentado y que fue previsible, esta interventoría se permite aceptar el plan de trabajo

del contratista de obra, aclarando que el mismo deberá cumplirse en su totalidad incluido el flujo de inversión y cronograma de entregables establecido por el contratista hasta el día 24 de marzo de 2024. De acuerdo a lo anterior, se invita al contratista a tomar las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución y terminación de la orden de trabajo de acuerdo al plan de contingencia propuesto.

De acuerdo a lo anterior, se procede a partir del presente comunicado a remitir a la Supervisión del contrato el Plan de trabajo o cronograma de obra y Flujo de Inversión propuesto por el contratista. Así mismo, se aclara al contratista de obra que el presente plan de contingencia será tenido en cuenta para la elaboración de informes semanales y/o mensuales de la interventoría y por ende para realizar el respectivo seguimiento del proyecto (Actividad 1, 2 y 3) por parte de la Interventoría.

SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OBRA (SOLICITUD DE CORRECCIÓN): Se solicita al contratista de obra efectuar ajuste o corrección al cronograma de entregables de la Actividad No. 1, 2 y 3; pues se evidencia que el contratista contempla que la semana 14 corresponde al inicio de la Actividad No. 3 (Obra); sin embargo, de acuerdo a la propuesta remitida por el contratista de dar inicio a la Actividad No. 3 a partir del día 14 de noviembre de 2023, la semana correcta de acuerdo a lo que se establece en los informes semanales el día 14 de noviembre de 2023 inicia o corresponde a la semana No. 12. Por lo anterior, se requiere se realice el ajuste correspondiente antes de las **04:00 pm del día 10 de noviembre de 2023,** con el fin de complementar la documentación que es remitida a la Supervisión Técnica.

NOTA: Cualquier observación adicional que sea efectuada por la Entidad Contratante, interventoría y partes interesadas se procederá a remitir al contratista para su respectivo ajuste y/o complemento.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Representante Legal
C&E Engineering SAS

Con Copia:
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Supervisor
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co

Elaboró: Jorge Hernández
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C, 09 de noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-123
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 10/11/2023
HORA: 12:05:42 p. m.
20234300378192

Ingeniero
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 44 B No. 59-89
Bogotá, D.C. – Colombia

REFERENCIA: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO No. PPDI-OF-CGE-23-115 – DEVOLUCION DOCUMENTACIÓN PARA COBRO DE ANTICIPO DE LA ORDEN DE TRABAJO

Respetado Ingeniero,

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta al comunicado No. PPDI-OF-CGE-23-115 mediante el cual se remite documentación para el cobro del Anticipo de la Orden de Trabajo

1. **OFICIO APROBACIÓN INTERVENTORIA.** PENDIENTE. Este comunicado únicamente se realizará por parte de la interventoría una vez se cuente con toda la documentación revisada, subsanada por el contratista y aprobada por la Interventoría y se cumpla con todos los lineamientos necesarios para aprobar cuenta de cobro.

2. **LISTA DE CHEQUEO PARA DESEMBOLSOS SUSCRITA POR LA INTERVENTORÍA (Cuanto Aplique).** PENDIENTE. Este comunicado únicamente se realizará por parte de la interventoría una vez se cuente con toda

la documentación revisada, subsanada y aprobada por la Interventoría y se cumpla con todos los lineamientos necesarios para aprobar cuenta de cobro

3. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO (F-RI-06).** PENDIENTE. La certificación será suscrita únicamente cuando se cuente con toda la documentación revisada, subsanada y aprobada por la Interventoría y se cumpla con todos los lineamientos necesarios para aprobar cuenta de cobro

4. **PRE-FACTURA O CUENTA DE COBRO**. CUMPLE PARCIALMENTE, si bien se remite cuenta de cobro, es importante que se relaciones en la cuenta de cobro la cuenta y numero de cuenta bancaria; lo anterior de acuerdo a una aclaración que fue efectuada por la Entidad Contratante.

5. **CERTIFICACION BANCARIA**. CUMPLE.

6. **PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.** CUMPLE

7. **CRONOGRAMA DE OBRA**. NO CUMPLE. No se remite cronograma vigente de acuerdo al plan de contingencia (vigente) aportado por el contratista de obra. Se debe remitir de igual manera cronograma de entregables vigente y actualizado y debidamente aprobado por la Interventoría.

   REVISION 1: NO CUMPLE

8. **RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**. CUMPLE

9. **RUT DEL CONSORCIO Y SUS INTEGRANTES**. CUMPLE

10. **DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO.** CUMPLE

11. **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.** CUMPLE

12. **CEDULA DE CIUDADANIA.** CUMPLE

13. **ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE TRABAJO.** CUMPLE

14. **GARANTIAS APROBADAS.** CUMPLE

15. **CERTIFICACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES**. NO CUMPLE. Si bien el contratista subsana los requerimientos de certificación de pago de seguridad social ARL, y parafiscales, no es posible validar el respectivo cumplimiento toda vez que al no haberse atendido a las planillas de seguridad social en debida forma no es posible corroborar que lo señalado en la certificación se encuentra correcta.

16. **DOCUMENTOS DEL CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL (SEGÚN APLIQUE).** CUMPLE

17. **PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES.** NO CUMPLE.

17.1 No se allega seguridad social del consorcio de los siguientes periodos: Salud: 2023-09, PENSION: 2023-08. Se debe aportar seguridad social del consorcio.

Salud: 2023-10; PENSION: 2023-09. Se debe aportar seguridad social del consorcio.

Salud: 2023-11; PENSION: 2023-010. Se debe aportar seguridad social del consorcio.

REVISIÓN 1: NO CUMPLE.

17.2 Una vez validada la seguridad Social del personal contractual de obra se concluye lo siguiente:

REVISIÓN 1: NO CUMPLE. Una vez revisada las planillas aportadas se concluye lo siguiente:

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFICALES - AGOSTO 2023									
NOMBRE PERSONAL	CARGO	SOPORTE DE EXAMEN DE INGRESO	CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, ARL, CAJA DE COMPENSACION	AGOSTO 2023				OBSERVACION GENERAL	CONCLUSION
				SALUD (2023-09)	PENSION (2023-08)	ARL	PARAFISCALES		
ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	NO CUMPLE
ANIBAL JOSE RUIZ AVILEZ	PROFESIONAL TÉCNICO DE DIAGNÓSTICOS.	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	NO CUMPLE
DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	NO CUMPLE
JUAN CAMILO GUEVARA MARTINEZ	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	NO CUMPLE

SADDY SOFIA BELTRAN GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI	DIRECTOR DE OBRA	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
EIFER YESID RUIZ APONTE	RESIDENTE DE OBRA	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
DIANA MARCELA PAYARES FLEREZ	PROFESIONAL SOCIAL	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ	PROFESIONAL HSEQ	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
JOHN JAIRO MARIN LOPEZ	TÉCNICO PGIO No. 1	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
CAROLINA GARCIA URIBE	TÉCNICO PGIO No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
OMAR DANIEL MANRIQUE CADENA	MAESTRO DE OBRA No. 1	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
CRISTIAN CAMILO NARVAEZ ROCHA	MAESTRO DE OBRA No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**NO APLICA**
								CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFICALES - SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE PERSONAL	**CARGO**	**SOPORTE DE EXAMEN DE INGRESO**	**CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, ARL, CAJA DE COMPENSACION**	**SEPTIEMBRE 2023**				**OBSERVACION GENERAL**	**CONCLUSION**
				SALUD (2023-10)	**PENSION (2023-09)**	**ARL**	**PARAFISCALES**		
ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo. Se allega de Julio 2023	**NO CUMPLE**
ANIBAL JOSE RUIZ AVILEZ	PROFESIONAL TÉCNICO DE DIAGNÓSTICOS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	NO APORTA	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación completa del periodo.	**NO CUMPLE**
JUAN CAMILO GUEVARA MARTINEZ	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
SADDY SOFIA BELTRAN GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

ACTIVIDAD 3 (DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023) - HACE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN POR 6 MESES									
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI	DIRECTOR DE OBRA	NO APORTA	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
EIFER YESID RUIZ APONTE	RESIDENTE DE OBRA	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
DIANA MARCELA PAYARES FLEREZ	PROFESIONAL SOCIAL	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ	PROFESIONAL HSEQ	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
JOHN JAIRO MARIN LOPEZ	TÉCNICO PGIO No. 1	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
CAROLINA GARCIA URIBE	TÉCNICO PGIO No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
OMAR DANIEL MANRIQUE CADENA	MAESTRO DE OBRA No. 1	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
CRISTIAN CAMILO NARVAEZ ROCHA	MAESTRO DE OBRA No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
								CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFICALES - OCTUBRE 2023									
NOMBRE PERSONAL	**CARGO**	**SOPORTE DE EXAMEN DE INGRESO**	**CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, ARL, CAJA DE COMPENSACION**	**OCTUBRE 2023**				**OBSERVACION GENERAL**	**CONCLUSION**
				SALUD (2023-11)	**PENSION (2023-11)**	**ARL**	**PARAFISCALES**		
ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
ANIBAL JOSE RUIZ AVILEZ	PROFESIONAL TÉCNICO DE DIAGNÓSTICOS.	CUMPLE	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
JUAN CAMILO GUEVARA MARTINEZ	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**

SADDY SOFIA BELTRAN GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL	CUMPLE	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
ACTIVIDAD 3 (DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023) - HACE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN POR 6 MESES									
MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI	DIRECTOR DE OBRA	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
EIFER YESID RUIZ APONTE	RESIDENTE DE OBRA	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
DIANA MARCELA PAYARES FLEREZ	PROFESIONAL SOCIAL	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo.	**NO CUMPLE**
EVA DEL PILAR DIAZ IBAÑEZ	PROFESIONAL HSEQ	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
JOHN JAIRO MARIN LOPEZ	TÉCNICO PGIO No. 1	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
CAROLINA GARCIA URIBE	TÉCNICO PGIO No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
OMAR DANIEL MANRIQUE CADENA	MAESTRO DE OBRA No. 1	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
CRISTIAN CAMILO NARVAEZ ROCHA	MAESTRO DE OBRA No. 2	NO APORTA	NO APORTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se aporta documentación del periodo	**NO CUMPLE**
								CONCEPTO FINAL	**NO CUMPLE**

17.3 Si bien el contratista allega seguridad social, se evidencia que la misma corresponde al periodo del mes de julio de 2023. De igual manera, se evidencia que el contratista aporta seguridad social a nombre de uno de los consorciados, por tal motivo es importante que se aporte el sustento Jurídico correspondiente que respalde la alternativa de soportar la seguridad social, arl y parafiscales por parte de los consorciados.

REVISIÓN 1: NO CUMPLE. No se allega en debida forma; así mismo no se soporta jurídicamente.

17.4 No fue posible validar certificado de Salud, Pensión, ARL, caja de compensación de todo el personal contractual. Así mismo no fue posible validar planillas del mes de agosto, septiembre y octubre de 2023 a nombre

del consorcio. Se recuerda al contratista que al ser el presente proyecto catalogado Riesgo 5 se deberá allegar pago de ARL en dicho Riesgo. No se aceptará un riesgo inferior.

NOTA: Como quiera que el contratista cuenta con un personal mínimo para la ejecución del contrato de obra, se requiere al contratista de obra allegar los documentos soportes de afiliación (Salud, pension, arl, caja de compensación, entre otros) de todo del personal operativo y adicional dispuesto en obra y allegar relación del mismo. Esta documentación será validada o corroborada por la Interventoría en obra, por tal motivo se recomienda realizar la entrega en debida forma con el fin de evitar reprocesos o no aprobación de la cuenta. Lo anterior aplicará para el periodo del mes de agosto, septiembre y octubre de 2023.

REVISIÓN 2: NO CUMPLE. Una vez validada la documentación aportada por el contratista, se concluye que la misma no cumple.

17.5 Es importante que el contratista tenga presente lo siguiente de acuerdo a lo señalado en las condiciones adicionales del proceso de selección No. ICM-005-2023:

"6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE Y JUSTIFICACIÓN
6.1. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE

Para la estimación del presupuesto de las ACTIVIDADES 1 y 2, se adoptó la metodología de estimación de sueldos reales del recurso humano necesario para el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, afectados por un factor multiplicador, estableciendo de esta metodología un valor real a pagar.

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de sus diversos componentes y se dan pautas para su cuantificación. Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador (FM), el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación del servicio, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado en el proyecto. En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:

1. Costos de personal.
2. Prestaciones sociales.
3. Costos indirectos, (costos de perfeccionamiento e impuestos del contrato).
4. Honorarios

ara la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 3, el presupuesto estimado en costo directo fue elaborado por el Grupo de Planeación Contractual, y avalado por la Gerencia Integral del Contrato Interadministrativo No 222006 y la Gerencia del Grupo de Desarrollo Proyectos 1.

Para la estimación de los costos indirectos se tiene en cuenta la incidencia de los costos de:

ara la estimación del presupuesto de la ACTIVIDAD 3, el presupuesto estimado en costo directo fue elaborado por el Grupo de Planeación Contractual, y avalado por la Gerencia

Integral del Contrato Interadministrativo No 222006 y la Gerencia del Grupo de Desarrollo Proyectos 1.

Para la estimación de los costos indirectos se tiene en cuenta la incidencia de los costos de:

4) Costos de las pólizas incluidas en el anexo "Esquema de Garantías y Seguros".
5) Impuestos y tributos aplicables: El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción ejecución y liquidación de la orden de trabajo.

Los anteriores costos deberán ser tenidos en cuenta por el oferente en la elaboración de su oferta económica (cálculo de la administración) y los demás que consideren procedentes para la correcta ejecución de la obra. En ese sentido ENTerritorio no reconocerá pagos adicionales por conceptos de gastos indirectos.
Los oferentes deberán realizar sus cálculos para la determinación del valor de la administración ofertada. De igual manera, el porcentaje de administración deberá ser calculado por el oferente en función del presupuesto a precios unitarios sin fórmula de reajuste."

Como se puede evidenciar, la oferta económica del proceso de selección No. ICM-005-2023 fue estructurada a partir de la Metodología de Factor Multiplicador y por dedicación mensual de profesionales; (Actividad 1 y 2); en tal sentido, es deber del contratista allegar a esta interventoría la constancia que permita validar de manera mensual y de acuerdo a su dedicación, el salario, prestaciones sociales tal y como se encuentra establecido en la Metodología de Factor Multiplicador de cada profesional establecido en su propuesta económica y según lo pactado con el Cliente.

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos aclarar al contratista que de acuerdo al alcance del contrato se contó con personal que fue requerido y es reconocido con la misma metodología de Factor Multiplicador y dedicación mensual; en tal sentido es deber del contratista allegar a esta interventoría la seguridad social de TODO el personal requerido y utilizado para el proyecto de acuerdo a su **dedicación MENSUAL,** y a la intervención que haya adelantado de acuerdo al alcance inicial o complemento que se haya efectuado en el proyecto; es decir el contratista deberá allegar la seguridad social (**de manera mensual y de acuerdo a su dedicación**) por el tiempo laborado a la fecha.

Ahora bien, es importante que el contratista tenga presente que al ser un proyecto estructurado por la Metodología por Factor Multiplicador, se deberá garantizar los sueldos, seguridad social y demás conceptos que hacen parte del FACTOR MULTIPLICADOR (FM) establecido por el Contratista en su oferta económica y que fue acordado con el cliente, por tal motivo es deber de esta interventoría validar que el contratista cumplió con cada uno de los conceptos establecidos en el FM y se efectuaron los pagos o contribuciones pactados en su oferta económica.

Si bien el contratista tiene la total libertad de efectuar la contratación del personal según los tipos de contratos establecidos en la normatividad vigente Colombiana, también es cierto que éste deberá demostrar que cumplió con las condiciones pactadas con la Entidad Contratante y de acuerdo al Factor Multiplicador establecido en su oferta el cual contiene una serie de conceptos que este debe cumplir, tales como:

- Costos de personal: Salarios acordados con el cliente
- Prestaciones sociales: Prima anual, Cesantía anual (Retroactividad cesantías), Intereses a las cesantías, Vacaciones anuales, EPS (ATEP, IVM, EGM), Subsidio familiar, SENA, ICBF, Seguros de ley, Indemnización de ley, Otros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, Dotación, Auxilios varios, Prestaciones extralegales)

- Costos indirectos de la compañía, impuestos y timbres del contrato: Gastos legales y de administración, Gastos directos no reembolsables, Arrendamiento oficinas, Servicios públicos, Mantenimiento y operación oficinas, útiles y papelería, Gastos legales y bancarios, Capacitación personal (cursos, congresos, seminarios), Vigilancia y aseo, Jubilaciones, Gastos de transporte y vehículos, Revistas y publicaciones técnicas, Actualización tecnológica (software, equipos, etc.), Afiliación a asociaciones profesionales, Sistematización administración, Salarios y prestaciones no reembolsables, personal administrativo, Personal técnico no facturable, Personal técnico con sueldo por encima de topes, preparación de propuestas, Otros gastos no reembolsables, Costos capital de trabajo, Seguros, Relaciones públicas y gastos de representación, Depreciación instalaciones y equipos oficina, Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.)

- Honorarios

De igual manera, se aclara al contratista que, es deber y obligación de esta interventoría corroborar que el contratista haya efectuado los pagos de los conceptos establecidos en la Metodología de Factor Multiplicador, por tal motivo es obligación del contratista demostrar *"el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo"* tal y como lo señaló Colombia Compra Eficiente el 27 de septiembre de 2017 en la *"Respuesta a consulta #4201714000006240, Tipo de asunto consultado: Cómo se aplica y evalúa el factor multiplicador"* y señalado y/o ratificado por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de Medellín, el cual señala lo siguiente:

*"En los concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido a que no existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma de pago de los contratos de consultoría y/o interventoría. Pero es viable jurídicamente utilizar el factor multiplicador como fórmula para la determinación de los costos del contrato, caso en el cual "**el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo**".* (Subrayado y/o en Negrilla fuera de texto).

Agrega el concepto de tal agencia que:

*"En el caso de los salarios y prestaciones sociales, **si el contratista no debe asumir tal costo** por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, **se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato o en el acta de liquidación del mismo**. (…). SNFT.*

Si el contratista no debe asumir el costo por concepto de salarios y prestaciones sociales porque no tiene trabajadores vinculados por contrato laboral, este costo no debe ser reconocido por la Entidad Estatal y lo que procede es la reducción del valor del factor multiplicador a través de una modificación del contrato o en la liquidación del mismo. SNFT." (Subrayado y/o en Negrilla fuera de texto).

RESPUESTA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

"Estimado señor,

Colombia Compra Eficiente responde su consulta de 27 de septiembre de 2017 en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.

PROBLEMA PLANTEADO
"¿Qué normatividad regula lo atinente al Factor Multiplicador, o en su defecto existe algún pronunciamiento por parte de Colombia Compra Eficiente, sobre su cálculo y aplicación? ¿El factor multiplicador se aplicaría únicamente a los trabajadores con vínculo laboral con el contratista, o de igual forma se puede aplicar a los profesionales contratados mediante prestación de servicios por el contratista para la ejecución del contrato?"

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
En los concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido a que no existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma de pago de los contratos de consultoría y/o interventoría.

Ahora bien, cuando se usa el factor multiplicador como fórmula para la determinación de los costos del contrato, ***el contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo****.* ***En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato o en el acta de liquidación del mismo****."*

De acuerdo a lo anterior "*Resulta claro para la agencia estatal que en la medida en que el contratista no asuma total o parcialmente determinados costos laborales, la entidad estatal no está obligada a pagarlos. Lo anterior como veremos, resulta como una consecuencia de la conmutatividad del contrato estatal."*

Así mismo el contratista debe: *"1) demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo en la oferta; 2) Demostrar su causación al momento del pago en la etapa de ejecución, sin perjuicio de los ajustes que se hagan en la fase liquidación."*

"Es de observar que la entidad contratante en la etapa precontractual deberá verificar los precios de mercado antes de aceptar la oferta, así como los soportes respectivos al momento de hacer los pagos, pues de lo contrario estaríamos en presencia de un daño patrimonial al Estado, por violación a los principios de economía, eficiencia y legalidad.

Según el artículo 1498 del Código Civil "El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; (…)". Por tanto en la medida en que el contratista traslada costos no reales a la entidad pública, y esta los acepta o paga, aquel se está enriqueciendo sin justa causa, ya que está haciendo más costosos los bienes y servicios adquiridos y está realizando una gestión fiscal contraria a los principios que rigen la misma, sin perjuicio de la violación de normas penales, disciplinarias y tributarias." (Subrayado y/o en Negrilla fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, y una vez revisada la información en referencia a las planillas de seguridad social de los profesionales mínimo exigidos y requerido para el desarrollo del contrato, la Interventoría solicita respetuosamente al contratista se allegue el contrato laboral suscrito con los profesionales, así como las certificaciones que soporten las afiliaciones y pagos a (EPS, ARL, PENSION, Caja de Compensación, Cesantías, SENA, ICBF (Según aplique)); y se presente el desglose del Factor Multiplicador; esto con el fin de validar y soportar el pago solicitado por el contratista y contar con la trazabilidad respectiva.

Es importante recordar, que de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades Estatales y/o Interventoría están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de ejercer una oportuna y permanente vigilancia, a fin de realizar una adecuada auditoría de los costos del contrato para pagar sólo aquellos que se hayan causado efectivamente, con lo cual se respetan los principios de economía y eficiencia en la gestión fiscal. Por lo anterior, previa aceptación de la cuenta de cobro remitida por el contratista, esta interventoría requiere validar detalladamente los costos causados efectivamente de acuerdo a la propuesta económica del contratista y obligaciones contractuales pactadas con la Entidad Contratante.

Se recuerda al contratista de obra que dentro de sus obligaciones contractuales se establece entre otras las siguiente:

"Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra."

"Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio la información que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución de la obra; y las que estén consignadas en el Manual de Contratación de la entidad."

"El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a ENTerritorio, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente"

Por todo lo anterior, se solicita al contratista allegar toda la documentación debidamente subsanada antes del plazo establecido en el presente comunicado.

18. **APROBACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA.** CUMPLE
19. **CONTRATO DE FIDUCIA.** CUMPLE
20. **FORMATO DE VINCULACIÓN F-RI-01. (CONSORCIO Y CONSORCIADOS).** CUMPLE
21. **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y REDAM DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA**

JURIDICA PERSONAL NATURAL, CONSORCIO, Y DE CONSORCIADOS. CUMPLE

22. **ORDEN DE TRABAJO Y NOVEDADES CONTRACTUALES.** CUMPLE

Por todo lo anterior, una vez validada toda la documentación aportada por el contratista de obra se concluye que la misma NO CUMPLE; por lo anterior, nos permitimos manifestar al contratista de obra que no es posible aprobar y por ende dar trámite a la Entidad Contratante para el respectivo desembolso; por tal motivo se requiere que el contratista de obra subsane la documentación que se establece como NO CUMPLE o CUMPLE PARCIALMENTE dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega del presente comunicado.

Nota Aclaratoria 1: SE DEBERÁ REMITIR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA E INTEGRAL PARA LA EFECTUAR UNA NUEVA REVISIÓN. Por tal motivo es importante que el contratista no remita la documentación de manera parcial, sino Total.
Nota Aclaratoria 2: Cualquier otro requerimiento que fuera necesario realizar por parte de la Interventoría o Supervisión o equipo de trabajo de contabilidad o pagaduría u otra área de ENTerritorio sería informado al contratista a fin de que adelante las subsanaciones respectivas.
Nota Aclaratoria 3: Se aclara al contratista al contratista de obra que, en caso de presentarse el contrato suspendido (En caso de presentarse tal situación) no se podrá adelantar cobro de cuenta alguna. Por tal motivo esta interventoría se abstendrá de realizar revisiones y aprobaciones de cuentas o actas parciales o anticipos con un contrato suspendido.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Oscar Mauricio Almario Fernández
Representante Legal
C&E Engineering SAS

Con Copia:
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA
Supervisor
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co

Elaboró: Jorge Hernández
Elaboró: Diana Ramírez
Revisó: Ing. Cristian Galvis
Aprobó: Ing. Oscar Almario
Copias: ARCHIVO

Bogotá D.C, 13 de noviembre de 2023

CAEE- RI-2023-124
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO

enterritorio FECHA 14/11/2023
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial HORA: 10:17:52 a. m.
20234300379852

Ingeniero
JOSÉ LUIS RADA RAYO
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 44 B No. 59-89
Bogotá, D.C. – Colombia

Ingeniero
MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Director de Obra
CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL
Contratista de Obra
Email: consorciogrupoempresarial005@gmail.com
Calle 125 No. 60-65
Bogotá, D.C. – Colombia

REFERENCIA: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE TRABAJO No. 2230223

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN – EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN. REQUERIMIENTO A CONTRATISTA DE OBRA

Respetado Ingeniero,

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir con suma preocupación y con gran molestia, toda vez que a la fecha el contratista de obra viene adelantando actividades sin la respectiva autorización de la interventoría y se ha evidenciado desde el pasado sábado 11 de noviembre de 2023 que se vienen adelantando actividades de fabricación de bloques estructurales con personal que no cuenta con los respectivos elementos de protección personal, afiliaciones al sistema de seguridad social y ARL, concepto de
