SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Rad 80

Neiva, 08 de marzo de 2024 **Int-Nechí-063**

Rad 20240101 52355
del 09/04/2024

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCURA FÍSICA
VANESSA BETANCUR MARTINEZ
Supervisora del contrato
Medellín, Antioquia

Referencia: Contrato de obra No. 4600016558 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoría No. 4600016527 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: Informes mensuales de interventoría.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de manera atenta, nos permitimos hacer entrega de los informes mensuales de interventoría No. 1, 2 y 3, correspondientes a los meses de noviembre-2023, diciembre-2023 y enero-2024, para su respectiva revisión y eventual aprobación.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS.
Representante legal
Sociedad Técnica Sota Ltda.

ARCHIVO SIF
2024 ABR 10 9:25:04

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600016527 de 2023
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA"





NECHÍ, ANTIOQUIA
2024

ARCHIVO SIF
2024 ABR 10 9:26:13

Oficina Principal: Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (8) 871 04 81 – Fax: (8) 871 19 10
Email: gobernacionantioquia.sota@gmail.com

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Firma			
Nombre	**JAIR SIERRA HERNANDEZ**	**JUAN CARLOS LEÓN**	**VANESSA BETANCOUR**
Cargo	Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Supervisora
	Elaboró	Revisó	Aprobó

El presente informe fue elaborado para cumplir con las disposiciones establecidas en el Proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, ETAPA 1 EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. LOCALIZACIÓN. 6
2.1. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 7
2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 10
2.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS EN CORREDORES VIALES 14

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 16
3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 16
3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 19
4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. 19
4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 19
4.3. DIFICULTADES PREVISTAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS 20
4.4. CUADRO RELACIONANDO LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR 20
4.5. CONTROL DEL PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL 21
4.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS 23
4.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 23
4.8. CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 24
4.9. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 24
4.10. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL 25
4.11. CONTROL DE APORTES LEGALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 26
4.12. RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 26
4.13. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS 26
4.14. SEGUIMIENTO GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 26
4.15. PRE-ACTAS Y ACTAS DE PAGO 26
4.16. CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA CUMULADAS 27
4.17. ESTADO AMBIENTAL 27
4.18. ESTADO SOCIAL 28
4.19. ESTADO SST 28
4.20. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÚA 29
4.21. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES 29
4.22. INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA 30
4.23. REGISTRO FOTOGRÁFICO 30
4.24. ACTAS DE COMITÉS DE OBRA 30

4.25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 30
4.26. BITÁCORA 30

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31
5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO 31
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 31
5.3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 32
5.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
5.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 33
5.7. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA 34

6. CONCLUSIONES GENERALES 35
6.1. ANÁLISIS, COMENTARIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS 35
6.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS 35

7. ANEXOS 36

1. INTRODUCCIÓN

Considerando que el Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física, realizó la firma del contrato de obra 4600016558 de 2023, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) – COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" y, paralelamente, la Secretaría de Infraestructura física, también suscribe con SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA el contrato de Interventoría 4600016527 de 2023, cuyo objeto es realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", en el presente informe se establece toda la gestión realizada para dichos contratos, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2024.

A su vez, vale la pena resaltar que el pasado 18 de octubre de 2023, se designa a la Ing. Vanessa Betancur Martínez de la oficina de Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, como supervisora del contrato No. 4600016527 de 2023 para ejercer seguimiento, control y vigilancia.

Este informe resumirá las actividades que se realizaron durante el mes de enero de 2024, en el marco del respectivo contrato y en cumplimiento de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, regulada por el Contrato 4600016527 de 2023.

2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Antioquia, en la zona rural del municipio de Nechí. Tramo de vía colorado – Nechí en el Bajo Cauca. La vía comunica el casco urbano del municipio de Nechí con el corregimiento de Colorado. Esta sirve como vía de acceso y comunicación para los productos y la población de este sector.

La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18, vía que comunica los municipios de Caucasia y Nechí, catalogada como vía de segundo orden, tiene una longitud aproximada a los 65,8 km, de los cuales, de acuerdo al informe de transitabilidad de la red vial a cargo del departamento, la vía se encuentra en tramos pavimentados y tramos de afirmado, en algunos tramos deteriorados y desgastados.

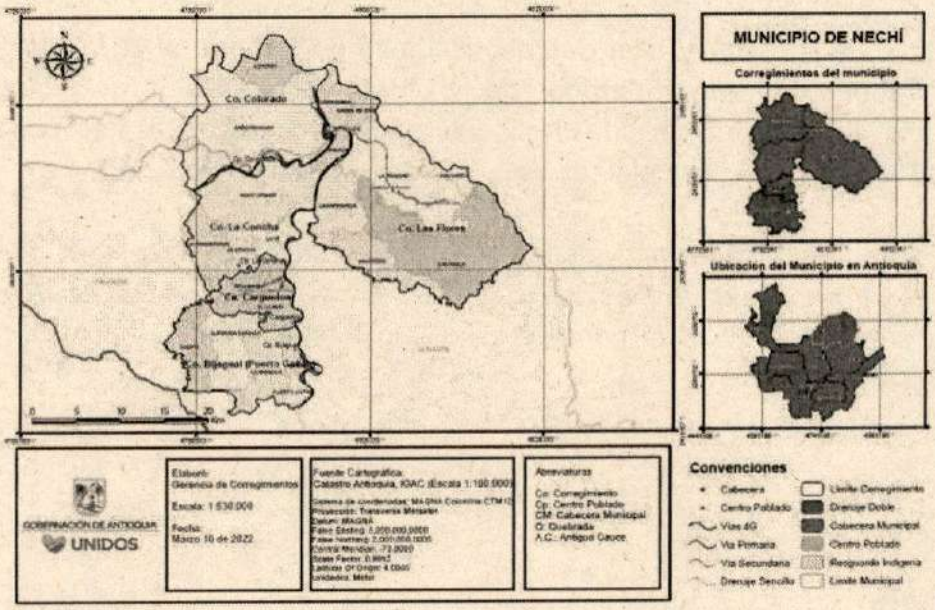


Ilustración 1. Mapa de Nechí
Fuente: Gerencia de Corregimientos – Departamento de Antioquia-Anexo técnico

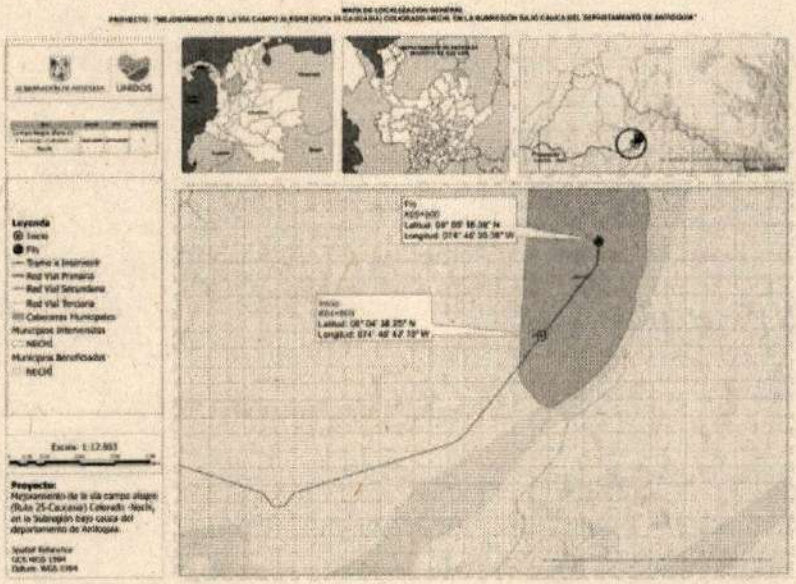


Ilustración 2. Localización de la vía – CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

A continuación, se relaciona la vía priorizada para intervención durante el desarrollo del contrato del Bajo Cauca:

Tabla 1. Vía a Intervenir en Bajo Cauca

Código	Nombre vía	Total (km)
25AN18	CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ.	Abscisas K64+800 (Latitud: 08° 04´ 38.25´´ N, Longitud: 74° 46´ 47.10´´ W) al K65+800 (Latitud: 08° 05´ 15.38´´ N, Longitud: 74° 46´ 30.38´´ W)

2.1. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, con código 25AN18, vía que comunica los municipios de Caucasia y Nechí, catalogada como vía de segundo orden, tiene una longitud aproximada a los 65,8 km, de los cuales, de acuerdo al informe de transitabilidad de la red vial a cargo del departamento, la vía se encuentra en tramos pavimentados y tramos de afirmado, en algunos tramos deteriorados y desgastados.

Los diseños usados para el presente proceso fueron realizados por ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S., en desarrollo del contrato 4600007991 de 2018 y contaron con la interventoría de JARQ URBAN ARCHITECTURAL DESIGN S.A.S. conforme al contrato 4600008531 DE 2018, , los cuales hacen parte integral del presente proyecto y se encuentran publicados como anexos del proceso licitatorio, por lo tanto, podrán ser consultados en el portal SECOP II y en la Secretaría de Infraestructura Física – Dirección de Estructuración de Proyectos, ubicada en el Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra, Calle 42B Número 52- 106, Piso 9, Oficina 910, Medellín – Antioquia.

Como consecuencia de los estudios y diseños mencionados anteriormente, a continuación, se indican los principales aspectos relacionados con las obras actuales y zonas a intervenir:

"El corredor vial entre en corregimiento de Colorado y el municipio de Nechí se desarrolla sobre la llanura inundable, en el que fue necesario, la construcción de grandes terraplenes para levantar la cota de la rasante y así garantizar la funcionalidad de la vía, sin embargo, estos rellenos se encuentran susceptibles a la erosión de la base, debido a la fluctuación de la cota inundable y la falta de estructuras hidráulicas que disminuya la acción de los procesos erosivos sobre la estructura."

"De acuerdo a los análisis de resultados de laboratorio y los apiques y sondeos, se definió que el corredor vial no presenta zonificación y está compuesto principalmente por tres (3) materiales, el superior corresponde al afirmado de la vía, seguido por un limo arcilloso y unas arcillas arenosas de consistencia blanda."


"Dentro de la zona de estudio no se presentan taludes de corte en los costados de la vía, dada la condición topográfica donde se localiza el corredor vial, sin embargo, en la revisión secundaría y durante la visita de campo se identificaron en los rellenos de conformación, sectores críticos que pueden estar afectando la funcionalidad de la vía debido a los procesos erosivos que se presentan en la base de las estructuras de terraplén, ocasionada por la fluctuación de los niveles del rio Cauca."

"El estado general de la mayoría de estructuras no es bueno y/o requiere de mantenimiento, algunas se encuentran colmatadas con material de arrastre o vegetación y otras que estructuralmente se encuentran en malas condiciones..."

"De igual forma, los box Coulvert, identificados en campo, en general no presentan daños estructurales considerables que afecten su funcionamiento, ni tampoco la pérdida de alguno de sus elementos de captación y/o descarga. A pesar de encontrarse vegetación y sedimentos en el fondo de su sección, estas no presentan una cantidad considerable de material por lo que una adecuada limpieza y mantenimiento en general mejoraría su funcionamiento. Basado en lo anterior, este tipo de sección para las condiciones actuales y propuestas para la vía es bastante viable".

El tramo que se pretende mejorar se encuentra en material de afirmado, en regular estado, la vía muestra baches a causa del lavado de la superficie ante la inexistencia de cunetas laterales para la conducción de aguas superficiales dificultando un buen drenaje de la vía, igualmente existen diferentes obras de drenaje las cuales no cumplen con la evacuación de las aguas en razón a que no están funcionando correctamente ya sea por insuficiencia hidráulica, por colmatación o falta de mantenimiento. Igualmente se presenta socavación en algunas partes del terreno. En este tramo de vía no se identifica puntos críticos que dificulten el normal desarrollo de las actividades.

La situación anteriormente mencionada genera aumento en los tiempos de viaje y en los costos de transporte, ocasionando menor oferta y demanda en los productos de la región; así como también, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público.

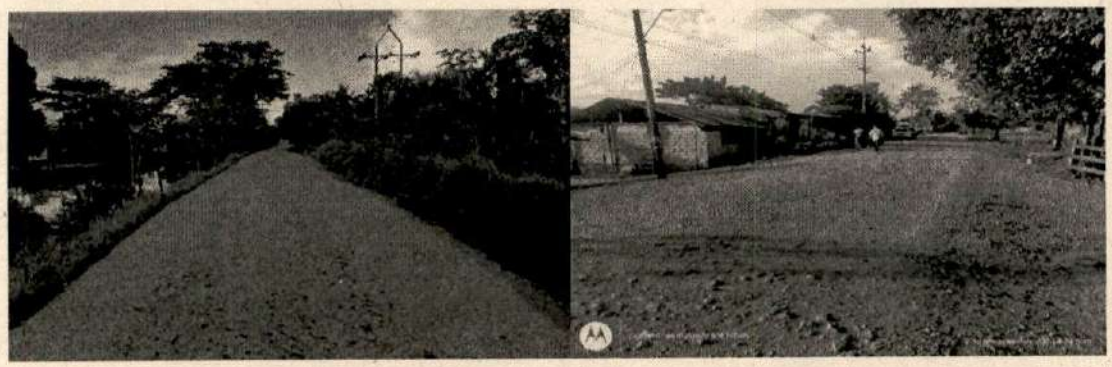

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

A continuación, se describen las actividades constructivas a realizar:

Se va a intervenir por medio de un mejoramiento que consta de la excavación, conformación, colocación de una capa de base, con colocación de una geocelda, y una carpeta asfáltica; se construirán estructuras de drenaje longitudinal y transversal como cunetas y box culverts, limpieza y mantenimiento a obras de drenaje seleccionadas, adicionalmente, se realizará la instalación de señalización vial horizontal y vertical, principalmente sobre el corredor vial.

El Constructor es el CONSORCIO IC-ING15027 integrado por ICPB S.A con el 90% Y INGAP S.A.S. con el 10 %, cuyo representante Legal es el Ing. Jorge Iván López.

- **Dimensionamiento y refuerzo del pavimento en asfalto**

Para el proyecto de La vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, se utilizará el pavimento en asfalto de acuerdo a los diseños.

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento c.r.l.- 1 o c.r.l. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del invias. incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. incluye limpieza de superficie y riego inicial con carrotanque.

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 411-22 (Suministro de emulsión asfáltica catiónica) de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. Esta especificación no tiene modificaciones

- **Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa mdc 19 que cumpla con el artículo 450-13 de la norma invias 2013. incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. no incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.**

para esta actividad rige lo estipulado en los artículos 400-13 (disposiciones generales para la ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena asfalto, lechadas asfálticas, mezclas asfálticas en frío y en caliente y reciclado de pavimentos asfalticos) y 450-13 (mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (concreto asfáltico)), de las especificaciones generales de construcción de carretera 2013 del invias.

- **Concreto clase f (14 mpa). solados de e=0.05 m**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630-13 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto simple para solado tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 14 MPa. Este solado de limpieza tendrá un espesor de cinco centímetros (5 cm) y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños.

- **Concreto clase d (21 mpa). cunetas.**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630-13 (Concreto estructural) y el Artículo 671-22 (Cunetas revestidas en concreto) de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 y 2022 del INVIAS. El concreto para cuentas tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 21 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). muros, disipadores y aletas**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). box coulvert-losa inferior**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El

concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Concreto clase d (28 mpa). box coulvert-losa superior y muros laterales**

Para esta actividad rige lo estipulado en el Artículo 630 (Concreto estructural), de las Especificaciones Generales de Construcción de Carretera 2013 del INVIAS. El concreto reforzado para la los muros, disipadores, aletas y estribos tendrá una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 28 MPa.

- **Clases de base granular**

Se definen tres clases de base granular en función de la calidad de los agregados (clases A, B y C), como se indica en la Tabla 330 ł 2. Los documentos del proyecto deben defnir la clase de base granular por utilizar, así mismo, defnir el tipo de granulometría que se debe emplear. Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las clases de base granular se deben usar como se indica en la Tabla 330 — 1, en función del nivel de tránsito del proyecto.

Tabla 330-1

Tabla 330 — 1. Uso típico de las diferentes clases de base granular

Clase de base granular	Nivel de tránsito
Clase A	NT3
Clase B	NT2
Clase C	NT1

- **Requisitos de calidad para los agregados Los agregados**

para la construcción de la base granular deben satisfacer los requisitos de calidad indicados en la Tabla 330 · 2. Además, se deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 330 · 3; salvo que los documentos del proyecto indiquen otra cosa, para niveles de tránsito NT3 se deben usar bases granulares de gradación gruesa. Cuando los materiales de base no cumplan los requisitos de la Tabla 330 · 2, estos pueden ser tratados con cemento para mejorar sus propiedades. Las recomendaciones de construcción para tener en cuenta son las establecidas en el artículo 350, Materiales granulares tratados con cemento como capa estructural.

Tabla 330-2

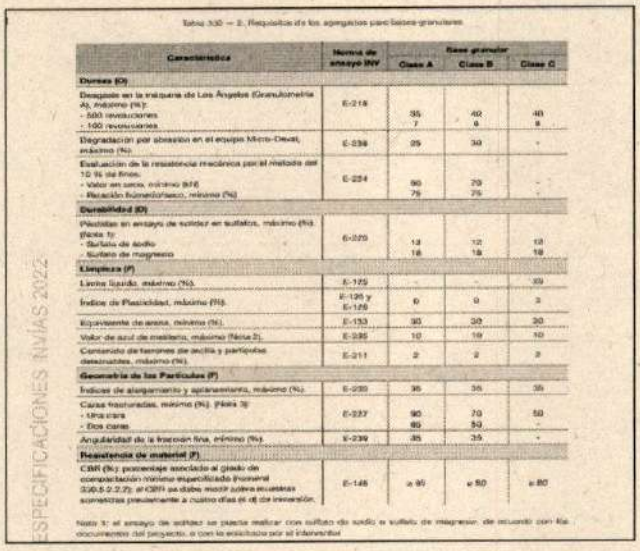


Tabla 330 – 2. Requisitos de los agregados para bases granulares

Característica	Norma de ensayo INV	Base granular Clase A	Clase B	Clase C
Dureza (D)				
Desgaste en la máquina de Los Ángeles (Granulometría A), máximo (%): - 500 revoluciones - 100 revoluciones	E-218	35 7	40 8	40 8
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%)	E-238	25	30	-
Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos: - Valor en seco, mínimo (kN) - Relación húmedo/seco, mínimo (%)	E-224	90 75	70 75	- -
Durabilidad (D)				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%). (Nota 1): - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	18 18
Limpieza (P)				
Límite líquido, máximo (%)	E-125	-	-	30
Índice de Plasticidad, máximo (%)	E-126 y E-125	0	0	3
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	30	30	30
Valor de azul de metileno, máximo (Nota 2)	E-235	10	10	10
Contenido de terrones de arcilla y partículas desmenuzables, máximo (%)	E-211	2	2	3
Geometría de las Partículas (P)				
Índices de aplanamiento y alargamiento, máximo (%)	E-230	35	35	35
Caras fracturadas, mínimo (%). (Nota 3): - Una cara - Dos caras	E-227	90 80	70 50	50 -
Angularidad de la fracción fina, mínimo (%)	E-239	35	35	-
Resistencia de material (P)				
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 330.5.2.2.2); el CBR ya debe estar sobre muestras sometidas previamente a cuatro días de inmersión.	E-148	≥ 95	≥ 80	≥ 80

Nota 1: el ensayo de solidez se puede realizar con sulfato de sodio o sulfato de magnesio, de acuerdo con los documentos del proyecto, o con lo establecido por el Interventor.

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022


Tabla 330-3


Tabla 330 – 3. Franjas granulométricas del material de base granular

Tipo de gradación	Tamiz (mm / U.S. *Standard*)							
	37,5	25,0	19,0	9,5	4,75	2,00	0,425	0,075
	1½ Pulgadas	1 Pulgada	3/4 Pulgada	3/8 Pulgada	Nro. 4	Nro. 10	Nro. 40	Nro. 200
	Pasa tamiz (%)							
Bases granulares de gradación gruesa								
BG-40	100	75 – 100	65 – 90	45 – 68	30 – 50	15 – 32	7 – 20	0 – 9
BG-27	-	100	75 – 100	52 – 78	35 – 59	20 – 40	8 – 22	0 – 9
Bases granulares de gradación fina								
BG-38	100	70 – 100	60 – 90	45 – 75	30 – 60	20 – 45	10 – 30	5 – 15
BG-25	-	100	70 – 100	50 – 80	35 – 65	20 – 45	10 – 30	5 – 15
Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo (a)	0 %	7 %			6 %			3 %

- **Drenajes**

Las obras de drenaje se construirán usando la guía de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, programa de Colombia Rural, donde se especifica la siguiente sección transversal tipo:
Se conformarán mediante la construcción de cunetas con sección en "V" y/o semicirculares en los bordes de la vía.

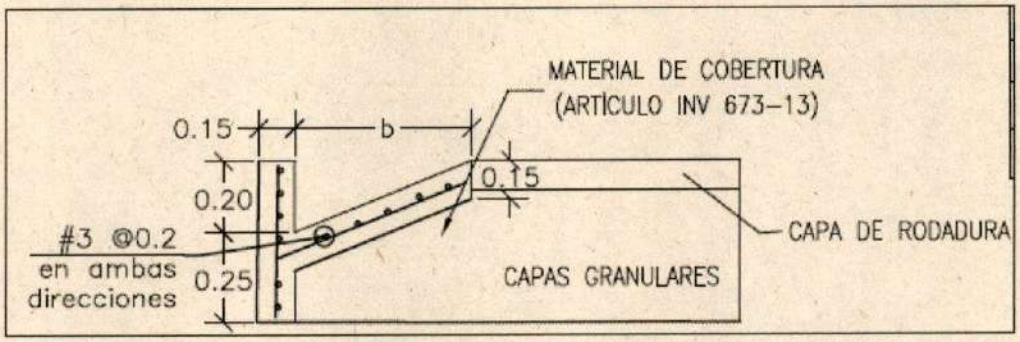

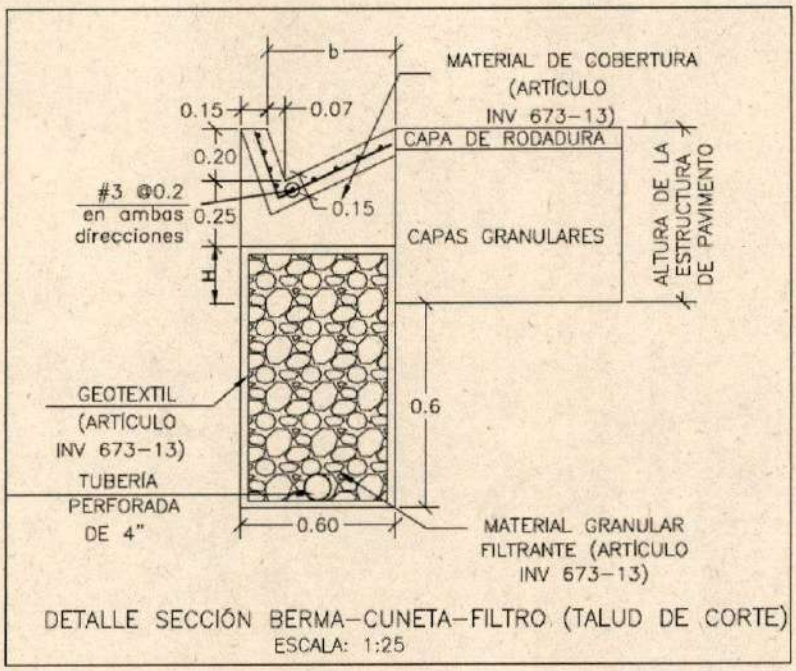

Fuente: cartilla obras menores de drenaje estructuras viales Colombia Rural pag. 16.

2.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS EN CORREDORES VIALES

La movilidad de la población rural de los municipios del Bajo Cauca, es restringida debido a que algunas vías están en regular estado, con restricciones de tránsito y deficiente mantenimiento. Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje y aumento en los costos de operación vehicular, lo que incrementa los costos de transporte y de pasajeros. En cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los productos de la subregión.

De acuerdo a la Resolución 0001917 RVS, por el cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Antioquia del 15 de junio de 2018, las 101 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 2.671.10, de la cual 1.508.8 km (56.5%) se encuentra en afirmado.

El mejoramiento de la superficie de rodadura constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de las vías y que buscan preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, conservando y mejorándola con el fin de garantizar transitabilidad fluida y segura para los usuarios. En esta vía las actividades principales a realizar son: Construcción de obras de drenaje, limpieza de obras transversales, limpieza de cunetas, suministro y colocación de material de afirmado, mejoramiento de la rodadura, colocación y recuperación de señales de tránsito, pavimentación, entre otras.

Para lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física con el fin de satisfacer la necesidad planteada adelantó el proceso de selección cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

8

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA No.	Licitación Pública LIC 15027
CONTRATO DE OBRA No.	4600016558 de 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$3.056.491.448
VALOR ADICIÓN No	N/A
VALOR TOTAL	$3.056.491.448
ANTICIPO	$458.473.717
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	47 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No.1	22 DE DICIEMBRE DE 2023 (27 DÍAS)
PRÓRROGA No.2	19 DE ENERO DE 2024 (2 MESES)
PLAZO ACUMULADO	135 DÍAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	21 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC-ING15027 integrado por ICPB S.A con el 90% Y INGAP S.A.S. con el 10 %. NIT: 901.756.732-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVAN LOPEZ
DIRECCIÓN CONTRATISTA:	MEDELLIN-ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING VANESSA BETANCUR

	MARTINEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	NECHI-ANTIOQUIA
UNIDAD EJECUTORA:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA

3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CON-15365
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4600016527 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	$257.054.643
VALOR ADICIÓN No	$278.265.919
VALOR TOTAL	$535.320.562
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No.1	22 DE DICIEMBRE DE 2023 (36 DÍAS)
PRÓRROGA No.2	19 DE ENERO DE 2024 (2 MESES)
PLAZO ACUMULADO	144 DÍAS
FECHA DE TERMINACION	30 DE MARZO DE 2024

ACTUAL	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING VANESSA BETANCUR MARTINEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BARRERO MOSSOS
MUNICIPIOS BENEFICIADOS:	NECHI-ANTIOQUIA
UNIDAD EJECUTORA:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA

4. SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA.

4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Durante el mes de enero de 2024, aun se evidencia la no ejecución de actividades de obra, generando así mayores retrasos en la programación.

- Se continua con la realización de actividades de chequeo mediante topografía.
- El contratista realizó actividades de suministro y acopio de material seleccionado (Base)
- Se realizan el comité técnico con personal contratista e interventoría.
- Se realiza una reunión en las instalaciones de la gobernación de Antioquia, con el personal de supervisión del contrato.

4.2. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Actividades en la semana 09, del 01 de enero al 07 de enero del 2024.

- Aun se evidencia que no inician actividades de obra. Se realiza comité virtual donde se trataron temas técnicos con personal del contratista de obra, interventoría y la supervisora del proyecto. El contratista llegó al compromiso (según acta comité de obra No 4 del 29 de diciembre del 2023), de ejecutar actividades a partir del 2 de enero del 2024, sin embargo, se incumple dicho compromiso.

Actividades en la semana 10, del 08 de enero al 14 de enero del 2024.

- Aun se evidencia que no inician actividades de obra. El día sábado 13 de enero llega maquinaria a sitio: vibro compactador, volquetas para suministro de material y a su vez llega la geocelda.
  Interventoría realiza actividades topográficas en campo, con el fin de chequear los diseños originales de la Gobernación de Antioquia.

Actividades en la semana 11, del 15 de enero al 21 de enero del 2024.

- Se evidencia que aún se está suministrando el material de base granular en sitio, sin embargo, no hay inicio de actividades de obra por parte del contratista.

Se realiza un chequeo con el topógrafo de la interventoría con respecto a los niveles pasados por la Gobernación, y se evidencia en campo que tenemos un promedio de 150 metros a partir del MDR actual de la calle hacia Colorado, con poca variable en cuanto a cotas, sin embargo, a partir de esta distancia se empiezan a generar llenos en la vía, que, finalizando el kilómetro a pavimentar, llega con llenos promedios de 2.60 a 2.80 metros

Actividades en la semana 12, del 22 de enero al 28 de enero del 2024.

- Se evidencia que aún se está suministrando el material de base granular en sitio, pero no hay inicio de actividades de obra por parte del contratista.
  La interventoría continúa realizando actividades topográficas en campo juntamente con el contratista.
  El contratista entrega el certificado de suministro de material en sitio, y a su vez entrega las respectivas licencias ambientales.

4.3. DIFICULTADES PREVISTAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Durante el mes de enero de 2024 no se presentaron dificultades previstas en la matriz de riesgos.

4.4. CUADRO RELACIONANDO LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR

A continuación, se presenta el cuadro relacionando las actas de pago parciales, acumulados y saldos por ejecutar hasta el 31 de enero de 2024.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:			$ 3,056,491,448.00						
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA									
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo del Contrato	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ 458,473,717.00	-$ 458,473,717	$ 3,056,491,448	El contratista no entrega preacta parcial de obra del mes de noviembre de 2023
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ 458,473,717.00	-$ 458,473,717	$ 3,056,491,448	El contratista no entrega preacta parcial de obra del mes de diciembre de 2023
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ 458,473,717.00	-$ 458,473,717	$ 3,056,491,448	El contratista no entrega preacta parcial de obra del mes de enero de 2024
4									
5									
TOTALES					$ -	$ 458,473,717.00	-$ 458,473,717	$ 3,056,491,448	
Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.									
NOTA: EL CONTRATISTA NO ENTREGA PREACTA DE OBRA EN EL MES DE ENERO DE 2024									

A la fecha, el contratista hizo entrega de un acta de obra en la que se cobran costos de "PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES", sin embargo, no se presenta ningún tipo de soporte ni justificación, por tanto, se da respuesta mediante oficio Int-Nechí-043, pero al no subsanarse no se da tramite a la misma.

4.5. CONTROL DEL PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO Y TOTAL

En el presente mes no se realizaron actividades de ejecución de obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro de seguimiento:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA				SALDO POR EJECUTAR	
							PRESENTA ACTA DE OBRA N 1		EJECUTADO ACUMULADO			
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		PRODUCTO 1 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO										
1	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	300.00	$ 16,349	$ 4,904,700	0.00				300.00	
2	4.3.2	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	9,500.00	$ 1,531	$ 14,544,500	0.00				9,500.00	
3	5.1.4	Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1,900.00	$ 142,068	$ 269,929,200	0.00				1,900.00	
4	5.1.9	Suministro, transporte e instalación de geoceldá para refuerzo de terraplén y capas granulares	m2	7100	$ 68,152	$ 483,879,200	0.00				7100	
5	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque	m2	7100	$ 4,738.00	$ 33,639,800	0.00				7100	
6	7.1.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.	m3	781	$ 1,184,732.00	$ 925,275,692	0.00				781	
7	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	214480	$ 1,629.00	$ 349,387,920	0.00				214480	
8	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3000	$ 1,629.00	$ 4,887,000	0.00				3000	
		PRODUCTO 2 CONSTRUCCION DE CUNETAS										
9	6.2.5	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.	m3	300	$ 856,903.00	$ 257,070,900	0.00				300	
10	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14,560.00000	$ 8,488.00	$ 123,585,280	0.00				14,560.00000	
11	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	3,600.00000	$ 1,253.00	$ 4,510,800	0.00				3,600.00000	

		PRODUCTO 3 CONSTRUCCION DE PONCHLLVERT											
12	4.1.6	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	280.00000	$ 27,398.00	$ 7,671,440	0.00				280.00000		
13	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	13.00000	$ 180,051.00	$ 2,340,663	0.00				13.00000		
14	7.2.9	Suministro e instalación de dintas señaladoras para muros	m	92.00000	$ 67,324.00	$ 6,193,808	0.00				92.00000		
15	8.3	Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	un	2.00000	$ 114,305.00	$ 228,610	0.00				2.00000		
16	6.1.15	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05m	m3	5.00000	$ 670,051.00	$ 3,350,305	0.00				5.00000		
17	6.2.25	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa inferior	m3	28.00000	$ 1,078,554.00	$ 30,199,512	0.00				28.00000		
18	6.2.26	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	m3	67.00000	$ 1,206,972.00	$ 80,867,124	0.00				67.00000		
19	6.2.24	Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, dientes	m3	34.00000	$ 1,174,340.00	$ 39,927,560	0.00				34.00000		
20	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 (Grado 60)	kg	10,363.00000	$ 8,466.00	$ 87,761,144	0.00				10,363.00000		
21	4.2.1	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	132.00000	$ 12,172.00	$ 1,606,704	0.00				132.00000		
22	13.6	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación entre 100m y 1000 m. Material compacto (incluye 30% de expansión) para distancias que superen el acarreo libre (100m)	m3	2,745.00000	$ 3,026.00	$ 8,306,370	0.00				2,745.00000		
23	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100m. Material medido en planta	m3-km	1,543.00000	$ 1,253.00	$ 1,933,379	0.00				1,543.00000		
		PRODUCTO 4 SEÑALIZACION VIAL											
24	12.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	28.00000	$ 77,006.00	$ 2,156,168	0.00				28.00000		
25	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento	m	4,000.00000	$ 3,009.00	$ 12,036,000	0.00				4,000.00000		
26	12.3	Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento	un	167.00000	$ 11,690.00	$ 1,952,230	0.00				167.00000		
27	12.5	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cm x 75cm más lámina inferior, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un perfil en ángulo de 2"x2"x 1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".	un	2.00000	$ 617,351.00	$ 1,234,702	0.00				2.00000		
28	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cm x 75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un perfil en ángulo de	un	17.00000	$ 853,479.00	$ 14,509,143	0.00				17.00000		
29	12.9.2	Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia SI-04 doble en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un perfil en ángulo de	un	1.00000	$ 843,659.00	$ 843,659	0.00				1.00000		
30	12.25	Suministro, transporte y colocación de panel estructura para señales verticales de tránsito informativas SI-05 Y SI-06, en H, liberia reflectorizada de 2" (espesor 3 mm), relleno en concreto hasta 1m arriba del nivel de piso acabado. Incluye excavación, concreto y acabado final. Según diseño.	Un	1.00000	$ 239,828.00	$ 239,828	0.00				1.00000		

		PRODUCTO 5 MANTENIMIENTO MECANICO											
31	5.1.13	Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	475.00000	$ 60,426.00	$ 28,703,300	0.00				475.00000		
32	4.3.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de la vía.	m2	4,750.00000	$ 3,477.00	$ 16,515,750	0.00				4,750.00000		
33	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye	m3-Km	38,000.00000	$ 1,640.00	$ 62,320,000	0.00				38,000.00000		
Subtotal													
					SUBTOTAL OBRAS	$ 1,495,125,721							
		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)				$ 39,673,320.00							
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)				$ 31,605,920.00							
		PRIMA DE LOCALIZACION Y HORAS EXTRA PERSONAL OPERATIVO (Incluye IVA)				$ 17,115,968.00							
		PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA)				$ 18,212,504.00							
		AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA)				$ 55,021,047.00							
		ACTUALIZACION DE PRECIOS OBRA (Incluye IVA)				$ 15,039,455.00							
		CARACTERIZACION VIAL (Incluye IVA)	Km	1.000.0	$ 1,197,891.00	$ 1,197,891.00							
		VALOR TOTAL DE OBRAS				$ 1,668,964,777.00							
NOTA: LOS VALORES SALEN EN CERO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO EJECUTA ACTIVIDADES EN EL MES DE NOV													

4.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y RECURSOS

El contratista de obra presentó la reprogramación de obra, según la prórroga No. 2 al contrato, la cual extiende el plazo hasta el 21 de marzo de 2024.

En el presente mes tenían que adelantarse trabajos de transporte de materiales, excavaciones, conformación de calzada, instalación de base, de geocelda y de emulsión asfáltica, para el producto No. 1 – Estructura del pavimento.

Por otra parte, también se tenían programadas actividades de mantenimiento mecánico como afirmado y mejoramiento de la subrasante, sin embargo, no se evidenció avance.

4.7. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En el marco del Contrato 4600016558 de 2023 se contempla anticipo por el 15% del valor total del contrato de obra. El contratista presentó para revisión de

interventoría el plan de inversión del anticipo y este fue aprobado en el mes de noviembre de 2023, tal como se muestra a continuación:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24		VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	COSTOS DE PERSONAL (NOMINA Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL)	$ 16.900.000	$ 44.000.000		$ -	$ -	$ -	$ 60.900.000	15%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 229.900.000	$ 50.000.000		$ -	$ -	$ -	$ 279.900.000	69%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$ 42.000.000	$ 11.000.000		$ -	$ -	$ -	$ 54.000.000	13%
4	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 19.900.000	$ 19.473.717		$ -	$ -	$ -	$ 39.473.717	10%
	TOTAL	$ 308.500.000	$ 119.573.717	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 458.873.717	100%

(Firma)
JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE
Apoderado Representante Legal
Contratista
CONSORCIO IO-ING 19027

(Firma)
JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal
Interventoria
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

En el mes de enero de 2024 el contratista no presentó documentación o soportes para el desembolso del anticipo.

El contratista de obra solicita una documentación a la interventoría requerida por la Fiducia. Interventoría envía lo solicitado el 16 de enero de 2024.

4.8. CONTROL DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El Registro del Estado General del tiempo se toma en el sector de ejecución del proyecto en el Municipio de Nechí. En el apartado de anexos se adjunta el formato se seguimiento al clima en el mes de enero de 2024.

4.9. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

A la fecha, el contratista de obra no ha hecho entrega de los certificados de calibración de equipos de topografía y laboratorio. En el apartado de anexos se adjunta el formato de seguimiento al uso de equipos y maquinaria en el mes de enero de 2024.

4.10. INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

A continuación, se presenta la información del personal que laboró durante el mes de enero de 2024 para el contratista de obra.

NOMBRE	CEDULA	INGRESO	SALARIO	EMPRESA
Juan Esteban Mazo Martínez	1045080417	01/11/2023	$1.600.000	VYR TOPOGRAFIA SAS
Wilmar Eduardo correa morales	1045078946	19/11/2023	$1.250.000	VYR TOPOGRAFIA SAS

Personal de topografía.

No.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	FECHA DE INGRESO ARL (AAAA/MM/DD)	CARGO
1	1038435177	Natalia Henriquez Zabala	$ 2.000.000	15/12/2023	AUXILIAR SOCIAL Y SST
2	1038436033	Fabio Manuel Jimenez Anaya	$ 2.000.000	1/12/2023	ENCARGADO
3	1152710444	Isabel Mejia Hernandez	$ 2.000.000	1/12/2023	RESIDENTE SOCIAL
4	98610966	Dayman Edyl Sanchez Cordoba	$ 1.300.000	1/12/2023	AYUDANTE
5	70554636	Jorge Jairo Zapata Velez	$ 5.000.000	1/12/2023	ING. DIRECTOR
6	71645555	Jhon Jairo Rojas Monsalve	$ 5.000.000	1/12/2023	Residente Civil
7	1017174160	Sirlis Paola Valdes Zabala	$ 1.300.000	1/12/2023	AUXILIAR DE TRANSITO
8	8051780	Jader Estrada Castro	$ 1.300.000	1/12/2023	AYUDANTE
9	8371997	Jenner Antonio Cardenas Castillo	$ 1.300.000	1/12/2023	AYUDANTE
10	8373315	Franc Alberto Pastrana Montes	$ 1.300.000	1/12/2023	AYUDANTE
11	8373751	Edgar Humberto Montalvo Cabrera	$ 1.300.000	1/12/2023	AYUDANTE
12	1001549258	Luisa Fernanda Pantoja Ravelo	$ 1.300.000	1/12/2023	AUXILIAR DE TRANSITO
13	1038436039	Diana Marcela Morales Vergara	$ 1.600.000	1/12/2023	SOCIAL AUX
16	71721266	Wldeman Fredy Giraldo Durango	$ 3.500.000	30/01/2024	ING. AMBIENTAL
17	52.499.486	Paola almanzar Henao	$ 3.800.000	22/01/2024	SST

4.11. CONTROL DE APORTES LEGALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjunta la planilla de seguridad social del mes de enero de 2024, entregada por el contratista de obra.

4.12. RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES

Durante el mes de enero de 2024 no se realizaron modificaciones de cantidades de obra y especificaciones

4.13. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Durante el mes enero de 2024, el contratista de obra no realizó ensayos de laboratorio.

4.14. SEGUIMIENTO GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjuntan las pólizas del Contrato de obra en el mes de enero de 2024. Se realiza una observación en cuanto a la póliza de cumplimiento, la cual no presenta el amparo por estudios y diseños.

- **Póliza de cumplimiento No. M-100213018**
  - Según firma del contrato (expedida el 19 de octubre de 2023, anexo 0).
  - Según acta de inicio (expedida el 16 de noviembre de 2023, anexo 2)
  - Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 3)

- **Póliza de cumplimiento No. M-100048060**
  - Según firma del contrato (expedida el 19 de octubre de 2023, anexo 0)
  - Según acta de inicio (expedida el 15 de noviembre de 2023, anexo 2)
  - Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 3)

4.15. PRE-ACTAS Y ACTAS DE PAGO

En el mes de enero de 2024, el contratista hizo entrega de un acta de obra en la que se cobran costos de "PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES", sin embargo, no se presenta ningún tipo de soporte ni justificación, por tanto, se da respuesta mediante oficio Int-Nechí-043, pero al no subsanarse no se da tramite a la misma.

4.16. CUADRO DE CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA CUMULADAS

Durante los 3 últimos días del mes de enero de 2024, se adelantó suministro de material y se daba inicio a la conformación de la calzada.

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						27,17%
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	0,00				0,00%	0,17%
CONFORMACION DE LA CALZADA	1968,00				0,10%	0,50%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	410,06				2,02%	4,68%
INSTALACIÓN DE GEOCELDA	1755,00				4,15%	8,39%
EMULSION ASFALTICA	0,00				0,00%	0,58%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00				0,00%	12,84%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS						7,13%
CONCRETO CUNETA	0,00				0,00%	7,13%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT						5,35%
CONCRETO SOLADO	0,00				0,00%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00				0,00%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00				0,00%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00				0,00%	1,39%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL						0,00%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00				0,00%	0,00%
SEÑALES VERTICALES	0,00				0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO						1,07%
AFIRMADO	0,00				0,00%	0,50%
MEJORAMIENTO SUB RASANTE	0,00				0,00%	0,57%

Cuadro de seguimiento semana del 29 de enero al 04 de febrero de 2024

4.17. ESTADO AMBIENTAL

Una vez analizada la información, suministrada mediante correo electrónico con fecha del 29 de diciembre del 2023, en el cual, se presenta por parte del contratista el PMA del proyecto de la referencia, esta Interventoría, se permite hacer la respectiva revisión del mismo, se procede a informar de manera verbal al contratista las observaciones encontradas en el documento, posteriormente, en vista de no obtener respuesta por parte del contratista, se procede a realizar dicha solicitud mediante comité de obra realizado el día 15 de enero del 2024, en las instalaciones de la SIF, adicionalmente, se reitera al contratista mediante comunicado Int-Nechí-045, con fecha del 25 de enero de 2024, finalmente el día 26 de enero del 2024, se realiza mesa de trabajo entre profesionales ambientales de obre e Interventoría, en el cual se realizan los ajustes del documento final.

Finalmente, se procede con la aprobación del PMA, lo anterior mediante comunicado Int-Nechí-046, con fecha del 26 de enero de 2024.

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.18. ESTADO SOCIAL

Durante el periodo de enero de 2024 el contratista de obra no hizo entrega de la subsanación a las observaciones del Plan de gestión social. En este sentido, no ha sido posible proceder con la aprobación del mismo.

Nuevamente, se manifiesta que el contratista deberá dar cumplimiento al PGS, el cual deberá contemplar los programas de manejo descritos a continuación, de acuerdo a la guía de manejo socio ambiental y sst de la Secretaria de Infraestructura Física y en el cual se describirán las actividades realizadas bajo la supervisión de la Interventoría, la cual emitirá recomendaciones y verifica el cumplimiento respectivo.

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.19. ESTADO SST

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 enero de 2024 el contratista recibió las siguientes solicitudes y recomendaciones por parte de la interventoría, Sociedad Técnica SOTA LTDA.

N°	FECHA	TIPO	ASUNTO
1	15/01/2024	Oficio: Int-Nechí-036	Requerimiento de documentos en seguridad y salud en el trabajo, así como la entrega de la hoja de vida del profesional SST
2	18/01/2024	Oficio: Int-Nechí-040	Se informa que el plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo queda con observaciones y se debe subsanar
3	19/01/2024	Oficio: Int-Nechí-041	Solicitud de entrega de presupuestos y solicitud de insumos en materia SST
4	19/01/2024	Oficio: Int-Nechí-042	Solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales – entrega de la documentación completa en materia de SST
5	19/01/2024	Oficio: Int-Nechí-043	Solicitud de entrega de presupuestos en materia SST y demás componentes para entrega de acta
6	19/01/2024	Oficio: Int-Nechí-044	Concepto hoja de vida personal – No aceptación HV del Profesional SST
7	27/01/2024	Oficio: Int-Nechí-047	Concepto hoja de vida personal – aceptación HV del Profesional SST

(Se entrega a parte en el informe mensual de este componente)

4.20. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÚA

Se presentan los siguientes datos de avance según el último informe semanal de interventoría del 29 de enero al 04 de febrero de 2024, de acuerdo con la nueva reprogramación según la prórroga No. 2. así:

	Semana	Acumulado
Avance Programado	8,81%	46,81%
Avance Ejecutado	6,27%	6,27%
Desviación	2,53%	40,50%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	21/3/2024

La Interventoría continuará con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato, solicitando al contratista de obra mes a mes:

- Afiliaciones del personal.
- Reprogramación de obra.
- Plan de contingencia.
- Pólizas actualizadas.
- Procesos constructivos de calidad.
- Ensayos de laboratorio.
- Certificado de calibración de los equipos de topografía a utilizar.
- Informe ejecutivo
- Insumos para el seguimiento al Plan de manejo de tránsito. PMT.
- Insumos para el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
- Insumos para el seguimiento al Plan de manejo ambiental PMA
- Insumos para el seguimiento al Plan de gestión social PGS.

4.21. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES

No se presenta reporte de multas y sanciones durante el mes de enero de 2024.

4.22. INFORME EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

En el apartado de anexos se adjunta el informe ejecutivo de obra elaborado por la dirección de interventoría.

4.23. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el apartado de anexos se adjunta el registro fotográfico para el mes de enero de 2024.

4.24. ACTAS DE COMITÉS DE OBRA

En el apartado de anexos se adjuntan las actas de comité realizadas en el mes de enero de 2024.

4.25. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

En el apartado de anexos se adjuntan los informes semanales de interventoría para el mes de enero de 2024.

4.26. BITÁCORA

En el apartado de anexos de adjunta la bitácora de obra para el mes de enero de 2024.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato se encuentra en revisión de estudios y diseños. Interventoría realiza los requerimientos pertinentes al contratista de obra, en términos de gestión administrativa y técnica. A su vez, interventoría avance en el seguimiento a los componentes de gestión social, ambiental y SST.

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el mes de enero de 2024 la Interventoría realizó los requerimientos pertinentes al contratista de obra, así como también hizo presencia en el lugar de ejecución y en los comités programados.

En cumplimiento con las obligaciones de la interventoría se contempla en el presente período mensual:

- Supervisión de los trabajos por parte de la dirección de la interventoría mediante el seguimiento de las obligaciones contraídas por el contratista de obra.
- Seguimiento del avance físico de las obras en el tiempo, teniendo en cuenta el programa de trabajo presentado por el contratista de obra.
- Participar en reuniones con el contratista de obra, municipio de Nechi, Gobernación de Antioquia.
- Supervisión de las diferentes actividades de recolección de documentación para el cumplimiento de diseños, programas de trabajo (general y semanal).
- Inspección de las actividades Ambientales y Sociales que realiza el contratista de obra.
- Elaboración y revisión de comunicaciones y demás documentos enviados al Contratista y a la Gobernación de Antioquia.

- Atención a consultas y requerimientos de todos los interesados en el Proyecto (Contratista de obra, comunidad, autoridades civiles, Alcaldía y oficina central Gobernación de Antioquia, etc.).

- Seguimiento y control financiero del Proyecto, con énfasis en las cantidades del Presupuesto oficial del Contrato.

- Seguimiento y control del avance físico del proyecto de los cuales se evidencia que no hay actividades

- Elaboración de informe mensual e informes semanales.

- Revisión de los ajustes a los Estudios y Diseños del Proyecto, realizados por el contratista de obra.

- Aun se continua con el seguimiento y control a unas novedades encontradas en los puntos a construir los boxcuvert, de los cuales según diseño se evidencia que la ubicación de estos puntos no coincide, se procede a una posible reubicación de estas abscisas mediante topografía en campo, pero desafortunadamente los propietarios de estos lotes no dan acceso a construir los boxculvert.

5.3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación se muestra el listado de personal de interventoría que laboró durante el mes de enero de 2024.

Nombre	Cargo	C.C
Juan Carlos León Lara	Director de interventoría	3.805.748
Jair Erith Hernández Sierra	Residente de interventoría	92.535.392
Kiara Beatriz Maza	Profesional social	1.102.581.304
Luis Alfonso Higuita	Profesional ambiental	1.152.186.533
Erica Milena López	Profesional SST	43.204.163

Para el mes de enero de 2024, interventoría contaba con la aprobación de las hojas de vida de todos los profesionales mencionados anteriormente.

5.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, esta interventoría se encuentra al día con el pago de aportes legales y de seguridad social al personal en el mes de enero de 2024. En al apartado de anexos se adjunta la planilla de pago de seguridad social.

5.5. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
Recursos iniciales comprometidos	$257.054.643,00	N/A	N/A	$257.054.643,00
Adiciones	$278.256.919,00	N/A	N/A	$278.256.919,00
Total recursos comprometidos	$535.311.562,00	N/A	N/A	$535.311.562,00

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
Recursos iniciales comprometidos	$257.054.643,00	N/A	N/A	$257.054.643,00
Adiciones	$278.256.919,00	N/A	N/A	$278.256.919,00
Total recursos comprometidos	$535.311.562,00	N/A	N/A	$535.311.562,00
Anticipos	N/A	N/A	N/A	
Recursos pagados/desembolsados	$0,00	N/A	N/A	$0,00
Total recursos entregados	$0,00	N/A	N/A	$0,00
Recursos ejecutados	$80.104.286,00	N/A	N/A	$80.104.286,00
Recursos no ejecutados	$455.216.276,00	N/A	N/A	$455.216.276,00

5.6. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el apartado de anexos se adjuntan las pólizas del Contrato de interventoría según firma del contrato y acta de inicio.

- **Póliza de cumplimiento No. 61-44-101051578**
  Según firma del contrato (expedida el 26 de octubre de 2023, anexo 0).

Según acta de inicio (expedida el 16 de noviembre de 2023, anexo 3)
Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 4)

- **Póliza de cumplimiento No. 61-40-101018765**
  Según firma del contrato (expedida el 26 de octubre de 2023, anexo 0)
  Según acta de inicio (expedida el 16 de noviembre de 2023, anexo 3)
  Según Prorroga No. 1 (expedida el 04 de enero de 2024, anexo 4)

5.7. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA

En el apartado de anexos se adjunta la relación de la correspondencia durante el mes de enero de 2024.

6. CONCLUSIONES GENERALES

6.1. ANÁLISIS, COMENTARIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Se concluye que en la vía CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO - NECHÍ, apenas en los últimos 3 días del mes de enero de 2024 inició el acarreo de materiales al sitio de ejecución, evidenciando así un retraso significativo en la programación.
- Avanza el trabajo administrativo de los componentes ambiental y SST. Se aprueba el PMA del contratista de obra

6.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS

- Implementar un plan de contingencia, incrementando los frentes de trabajo con personal maquinaria y equipos, teniendo en cuenta que se está afectando el rendimiento y programación de obra.
- Vincular al personal necesario para realizar actividades de obra
- En general dar estricto cumplimiento al programa de obra y programa de inversión.

7. ANEXOS

A continuación, se establece el listado de anexos al presente informe:

Anexo 1. Control de equipos y maquinaria
Anexo 2. Estado general del tiempo
Anexo 3 Certificación pago de seguridad social contratista de obra
Anexo 4. Proyecto de acta de obra
Anexo 5 Informe ejecutivo
Anexo 6 Pólizas contrato de obra
Anexo 7 Actas de comité
Anexo 8 Informes semanales de interventoría
Anexo 9 Bitácora de obra
Anexo 10 Planilla de ss contratista de obra
Anexo 11 Pólizas de interventoría
Anexo 12 Relación de correspondencia
Anexo 13 Topografía obra
Anexo 14 Topografía interventoría
Anexo 15 Registro fotográfico

ANEXOS

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA EQUIPO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-22-2		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	1
			31	12	2023

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: DICIEMBRE DE 2023 | CONTRATO No. 4600016558 | SECTOR VIA CAMPOALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) COLORADO - NECHÍ

CONTRATISTA: CONSORCIO IC-ING16027

MAQUINA / DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulldozer Caterpillar D5K2 LGP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bulldozer Caterpillar D6T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Excavadora Yanmar VIO36-6b	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Excavadora Hitachi ZX200	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Excavadora Caterpillar 312E	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Minicargador Case SR250	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora Caterpillar 120k	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora Caterpillar 420F2IT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora Caterpillar 416F2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompactador Superpac 8420	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta Kenworth T800	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volqueta Internacional 7600 SBA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
Volqueta Kenworth T8000	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volqueta Internacional Durastar 4300 SBA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volqueta Internacional 7600 SBA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volqueta Freightliner M2-112	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACIÓN = R
INACTIVO = I

FIRMA
NOMBRE JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA
NOMBRE JUAN CARLOS LEÓN LARA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MSE-FR-22-2		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	1
			31	1	2024

MES: ENERO DE 2024 **CONTRATO No.** 4600016558 **SECTOR** **VIA CAMPOALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) COLORADO - NECHÍ**

CONTRATISTA CONSORCIO IC-ING16027

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	X	X	X			X	X	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lluvias moderadas				X	X					X	X			X	X																
Lluvias intensas																															

FIRMA

NOMBRE JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NOMBRE JUAN CARLOS LEÓN LARA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

23

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES OBRA

CONSORCIO IC-ING

Medellín, 07 de febrero de 2024

Oficio Nº 002-29112023

Asunto:

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

LUCELLY CIRO ALZATE identificado con 43.765.709, y con tarjeta profesional No. 168149-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **ICPB S.A.** identificada con NIT **811015828-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellin, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 07 días del mes de febrero de 2024.

LUCELLY CIRO ALZATE

C.C 43.765.709

T.P No. 168149-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.765.709
CIRO ALZATE
APELLIDOS
LUCELLY
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 22-OCT-1979
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-ENE-1998 ABEJORRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

168149-T



LUCELLY
CIRO ALZATE
C.C. 43765709
RES. INSCRIPCION 207 DEL 19/07/2012
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

230156 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 178249
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la DAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 31 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 7 B 1 B 5 B C F 7 6 5 9 2 E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCELLY CIRO ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43765709 de ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168149-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO IC-ING

Medellín, 07 de febrero de 2024

Asunto:

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GLORIA LUCÍA MARÍN CARVAJAL identificado con 21.409.904, y con tarjeta profesional No. 124638-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de **INGAP S.A.S** identificada con NIT **811047188-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 07 días del mes de febrero de 2024.

GLORIA LUCÍA MARÍN CARVAJAL
C.C 21.409.904
T.P No. 124638-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124638-T



GLORIA LUCIA
MARIN CARVAJAL
C.C. 21409904
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 B 2 9 5 C 1 9 4 2 8 0 9 9 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA LUCIA MARIN CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21409904 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 124638-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




72491-T

VIANNEY UBITER
VALENCIA JARAMILLO
C.C. 43059343
RESOLUCION INSCRIPCION 55 **FECHA 11/05/2000**
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

80592

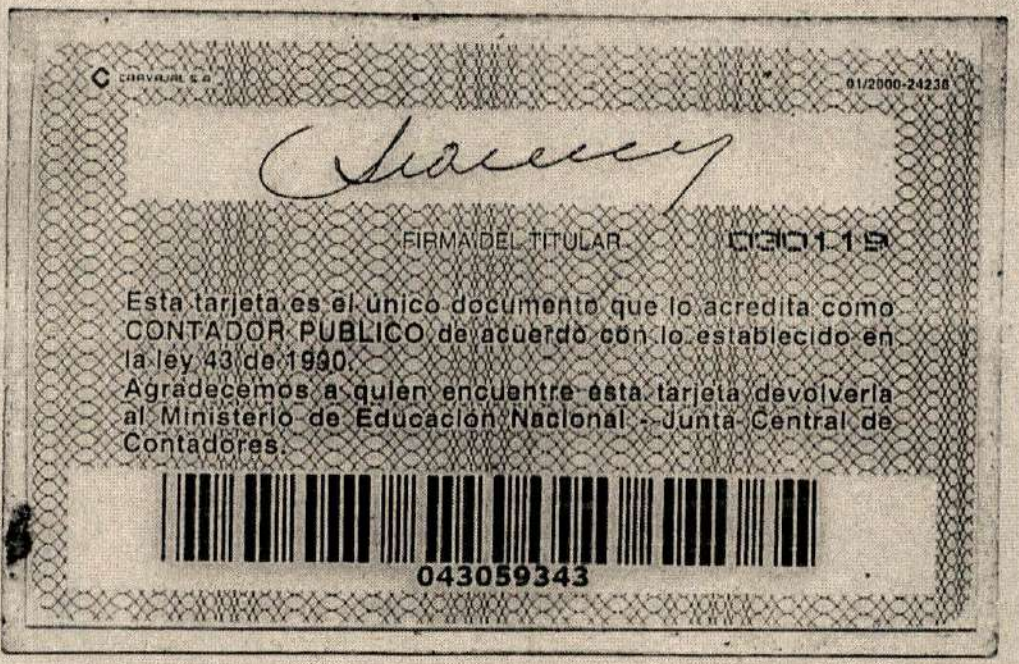

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

997620919F81BE9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIANNEY UBITER VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43059343 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 72491-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-05, 12:05:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67991520

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 05/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO IC ING 15027		
Documento	NI901756732	**Dirección**	CL 43B #30 - 23
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3530993
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOPEZ ELEJALDE JORGE IVAN	**Identificación**	CC 1036396810
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001546595	LUIS FERNANDO CASTILLO BALDOVINO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001549258	LUISA FERNANDA PANTOJA RAVELO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1017174160	SIRLIS PAOLA VALDEZ ZABALA	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038435177	NATALIA HENRIQUEZ ZABALA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 853.334	$ 136.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 853.334	$ 34.200	6,960	$ 853.334	$ 59.400	(CCF04) COMFAMA	$ 853.334	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400
CC 1038436033	FABIO MANUEL JIMENEZ ANAYA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038436039	DIANA MARCELA MORALES VERGARA	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.600.000	$ 256.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1152710444	ISABEL MEJIA HERNANDEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 71045555	JOHN JAIRO ROJAS MONSALVE	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 8051780	JADER ESTRADA CASTRO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8371563	PLUTARCO PALADIN HERRERA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 8371997	JENNER ANTONIO CARDENAS CASTILLO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8373315	FRANC ALBERTO PASTRANA MONTES	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8373751	EDGAR HUMBERTO MONTALVO CABRERA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 9851096	DAYMAN EDYL SANCHEZ CORDOBA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.932.001	$ 19.932.001	$ 19.932.001	$ 19.932.001	$ 3.239.200	$ 797.400	$ 1.387.900	$ 797.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.221.900	$ 0	$ 6.221.900

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-01-05, 11:50:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	CONSORCIO IC ING 15027
NIT	NI 901756732
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	67991520
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	380465694
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.221.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 2.055.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 556.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 441.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	10	$ 458.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 46.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 292.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	14	$ 1.387.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	14	$ 797.400	$ 0
		SubTotales:		$ 6.221.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.221.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PROYECTO ACTA DE OBRA

Medellín, enero 05 de 2024

ICING-012-2024

Señores:
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT 891.101.100-5
Email: gobernacionantioquia.sota@gmail.com
Nechi - Antioquia

REFERENCIA. "MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) – COLORADO – NECHI EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

ASUNTO. Acta de obra No. 1 del contrato No. 4600016588 DE 2023

Cordial saludo,

Adjunto estamos remitiendo para su revisión y aprobación el acta de obra No. 1 que corresponde al periodo del inicio del contrato al 30 de diciembre de 2023, para su revisión y aprobación, para la continuación del trámite ante la Entidad.

Por lo anterior solicitamos, una vez aprobada, continuar con el trámite ante la gobernación de Antioquia.

Atentamente,

JORGE JAIRO ZAPATA VÉLEZ
Ingeniero Civil
Director de Obra
Consorcio IC -ING 15027
Tel: 3217781513

Anexos:
Se adjunta el Acta de obra No. 1

Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | ACTA No.: 1 | VALOR TOTAL ACTA: $93.806.768,00 | PERIODO MES: 08/01/2025 - 30/01/2025 (31 / 12 / 2024)

CONTRATO No.: 4600013848 DE 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLOMBIA – MEDIA, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO IC-INS 15027
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4600014556 DE 2023
INTERVENTOR: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

PLAZO INICIAL: DOS MESES Y MEDIO (2.5 MESES)
FECHA DE INICIACIÓN: OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA - N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA): $3.058.491.448,00
VALOR TOTAL ACUMULADO: $3.058.491.448,00

PLAZO ACUMULADO: UN MES Y MEDIO (1.5 MESES)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA - N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 DE ENERO DE 2024
VALOR ADICIÓN (INCLUIDO IVA): $ -
VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				SALDO POR EJECUTAR	
									PARA ACTA 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS S ACTA DE MODIFICACIÓN No.		PRESENTE ACTA DE OBRA No. 1		EJECUTADO ACUMULADO			
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								**$2.000.448.912,00**				**$2.000.448.912,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$7.394.448.912,00**
1	4.1.1	INVIAS 210-13	N.A	Excavación en material común de la explanación, cunetas y pretiles. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte	m3	3000.0	$90.349,00	$4.804.700,00			300,00	$4.804.700,00		$0,00	0,00	$0,00	300,00	$4.804.700,00
2	4.3.2	INVIAS 310-22	N.A	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconformación de cunetas y/obras necesarias para la correcta ejecución de la actividad	m2	9600.0	$1.531,00	$14.688.500,00			9.500,00	$14.544.500,00		$0,00	0,00	$0,00	9.500,00	$14.544.500,00
3	5.1.4	INVIAS 330-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1900.0	$142.966,00	$269.829.200,00			1.900,00	$269.829.200,00		$0,00	0,00	$0,00	1.900,00	$269.829.200,00
4	5.1.9	INVIAS 325-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de geocelda para refuerzo de terraplén y capas granulares	m2	7100.0	$68.162,00	$483.879.200,00			7.100,00	$483.879.200,00		$0,00	0,00	$0,00	7.100,00	$483.879.200,00
5	7.1.1	INVIAS 451-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. - 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie y pavimentar según normas para la construcción de pavimentos de INVIAS. Incluye todo lo necesario para la correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con cantidades	m2	7100.0	$4.736,00	$33.630.600,00			7.100,00	$33.630.600,00		$0,00	0,00	$0,00	7.100,00	$33.630.600,00
6	7.1.2	INVIAS 450-13	N.A	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo denso MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de Invias. INVIAS 2013. (Incluye transporte)	m3	781.6	$1.184.757,00	$925.275.692,00			781,60	$925.275.692,00		$0,00	0,00	$0,00	781,60	$925.275.692,00
7	13.1	INVIAS 900-13	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m	m3-Km	214480.0	$1.629,00	$349.397.829,00			214.480,00	$349.397.829,00		$0,00	0,00	$0,00	214.480,00	$349.397.829,00
8	13.2	INVIAS 900-13	N.A	Transporte de subrasantes provenientes de la excavación, canales, pretiles para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	3000.0	$1.629,00	$4.887.000,00			3.000,00	$4.887.000,00		$0,00	0,00	$0,00	3.000,00	$4.887.000,00
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS								**$395.184.960,00**				**$395.184.960,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$395.184.960,00**
9	5.2.1	ESP. 15-XXXX	N.A	Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas	m3	300.0	$856.961,00	$257.088.300,00			300,00	$257.088.300,00		$0,00	0,00	$0,00	300,00	$257.088.300,00
10	10.1	INVIAS 960-13	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14580.0	$8.468,00	$123.480.268,00			14.580,00	$123.480.268,00		$0,00	0,00	$0,00	14.580,00	$123.480.268,00
11	13.9	INVIAS 900-13	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material triturado sin gravilla	m3-Km	3600.0	$1.263,00	$4.510.800,00			3.600,00	$4.510.800,00		$0,00	0,00	$0,00	3.600,00	$4.510.800,00
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT								**$270.980.615,00**				**$270.980.615,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$270.980.615,00**
12	4.1.6	INVIAS 600-13	N.A	Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales	m3	280.0	37399.0	$7.671.440,00			280,00	$7.671.440,00		$0,00	0,00	$0,00	280,00	$7.671.440,00
13	2.8	INVIAS 205-13	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	13.0	180091.0	$2.340.983,00			13,00	$2.340.983,00		$0,00	0,00	$0,00	13,00	$2.340.983,00
14	7.2.8	N.A	N.A	Suministro e instalación de obra sanitaria para marca alfa PVC V15	un	82.0	97334.0	$8.183.808,00			82,00	$8.183.808,00		$0,00	0,00	$0,00	82,00	$8.183.808,00
15	6.5	N.A	3A-08-05- Tyfor b	Limpieza de obras transversales. Incluye sacado interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren dentro de la obra.	un	2.0	114308.9	$228.618,00			2,00	$228.618,00		$0,00	0,00	$0,00	2,00	$228.618,00
16	8.1.16	INVIAS 630-13	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=40.00 m	m3	5.0	670001.8	$3.350.365,00			5,00	$3.350.365,00		$0,00	0,00	$0,00	5,00	$3.350.365,00
17	8.2.25	INVIAS 630-13	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa inferior	m3	28.0	1678554.0	$50.199.512,00			28,00	$50.199.512,00		$0,00	0,00	$0,00	28,00	$50.199.512,00
18	8.2.26	INVIAS 630-13	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa aéreas y muros laterales	m3	67.0	1206972.0	$80.867.124,00			67,00	$80.867.124,00		$0,00	0,00	$0,00	67,00	$80.867.124,00
19	8.2.24	INVIAS 630-13	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores varios	m3	34.0	1174549.0	$39.927.566,00			34,00	$39.927.566,00		$0,00	0,00	$0,00	34,00	$39.927.566,00
20	10.1	INVIAS 960-13	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	10363.0	8468.0	$87.761.144,00			10.363,00	$87.761.144,00		$0,00	0,00	$0,00	10.363,00	$87.761.144,00
21	4.2.1	INVIAS 610-13	N.A	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y conformación de rellenos	m3	132.0	13177.0	$1.808.764,00			132,00	$1.808.764,00		$0,00	0,00	$0,00	132,00	$1.808.764,00
22	13.6	INVIAS 900-13	N.A	Transporte de subrasantes provenientes de la excavación entre 100 m y 1000 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento para distancias que superen el rango entre 100 m	m3	2745.0	3029.0	$8.308.376,00			2.745,00	$8.308.376,00		$0,00	0,00	$0,00	2.745,00	$8.308.376,00
23	13.9	INVIAS 900-13	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material triturado sin gravilla	m3-Km	1540.0	1253.0	$1.933.379,00			1.543,00	$1.933.379,00		$0,00	0,00	$0,00	1.543,00	$1.933.379,00
PRODUCTO 4. SEÑALIZACIÓN VIAL								**$92.571.720,00**				**$92.571.720,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$92.571.720,00**
24	12.2	INVIAS 730-13	N.A	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en tipo reflectorizada con microesferas de vidrio para rayados, zonas escolares y cruces viales. Incluye tinte, pintogreno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	28.0	77004.0	$2.156.184,00			28,00	$2.156.184,00		$0,00	0,00	$0,00	28,00	$2.156.184,00
25	12.1	INVIAS 730-13	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en tipo reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en el pavimento.	m	4000.0	3029.0	$12.036.000,00			4.000,00	$12.036.000,00		$0,00	0,00	$0,00	4.000,00	$12.036.000,00
26	12.3	INVIAS 701-13	N.A	Suministro, transporte y colocación de ojos reflectivos en la superficie del pavimento.	un	167.0	11690.0	$1.952.230,00			167,00	$1.952.230,00		$0,00	0,00	$0,00	167,00	$1.952.230,00
27	12.6	INVIAS 710-13	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm nivel lamina inferior en lamina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un poral en angulo de 2"x2"1/4" y brazos en angulo 2"x2"1/4"	un	2.0	617351.8	$1.234.702,00			2,00	$1.234.702,00		$0,00	0,00	$0,00	2,00	$1.234.702,00
28	12.9	INVIAS 710-13	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de Pare/Ceda/Aviso (OPCIÓN 02), en lamina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un poral en angulo de 2"x2"1/4" y brazos en angulo 2"x2"1/4"	un	17.0	853479.9	$14.509.143,00			17,00	$14.509.143,00		$0,00	0,00	$0,00	17,00	$14.509.143,00
29	12.9.2	INVIAS 710-13	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia SI-04 doble en lamina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un poral en angulo de 2"x2"1/4" y brazo en angulo de 2"x2"1/4"	un	1.0	843659.0	$843.659,00			1,00	$843.659,00		$0,00	0,00	$0,00	1,00	$843.659,00
30	12.28	INVIAS 741-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de panel estructura para señales verticales de tránsito informativas SI-05 Y SI-06, en H, tubería redonda de 2" interna empernar 3 man, ribera en concreto hasta 1 m arriba del nivel de piso acabado. Incluye excavación, concreto y acabado final. Según diseño	Un	1.0	239828.0	$239.828,00			1,00	$239.828,00		$0,00	0,00	$0,00	1,00	$239.828,00
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECANICO								**$197.519.050,00**				**$147.538.950,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$197.519.050,00**
31	5.1.13	INVIAS 710-13	N.A	Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación limpieza y transporte del material. Se cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	475.0	59429.0	$28.703.300,00			475,00	$28.703.300,00		$0,00	0,00	$0,00	475,00	$28.703.300,00
32	4.3.6	INVIAS 741-22	N.A	Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente. Incluye la degradación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la conformación, nivelación final, de acuerdo a los	m2	4750.0	3477.0	$16.515.750,00			4.750,00	$16.515.750,00		$0,00	0,00	$0,00	4.750,00	$16.515.750,00
33	13.1	INVIAS 741-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	38000.0	1640.0	$62.320.000,00			38.000,00	$62.320.000,00		$0,00	0,00	$0,00	38.000,00	$62.320.000,00
SUBTOTAL OBRAS								**$2.882.712.391,00**				**$2.882.712.391,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$2.882.712.391,00**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								**$0,00**				**$0,00**				**$0,00**		**$0,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)							estimado	$59.623.370,00	estimado	$0,00	estimado	$59.623.370,00		$0,00	estimado	$0,00	estimado	$59.623.370,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)							estimado	$31.695.932,00	estimado	$0,00	estimado	$31.695.932,00	estimado	$31.695.932,00	estimado	$31.695.932,00	estimado	$0,00
PRIMA DE LOCALIZACION Y HORA EXTRA PERSONAL OPERATIVO (Incluye IVA)							estimado	$12.118.858,00	estimado	$0,00	estimado	$12.118.858,00	estimado	$0,00	estimado	$0,00	estimado	$12.118.858,00
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS							estimado	$18.212.504,00	estimado	$0,00	estimado	$18.212.504,00	estimado	$18.212.504,00	estimado	$18.212.504,00	estimado	$0,00
AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA)							estimado	$55.921.047,00	estimado	$0,00	estimado	$55.921.047,00	estimado	$55.921.047,00	estimado	$55.921.047,00	estimado	$0,00
ACTUALIZACION DE PRECIOS OBRA (Incluye IVA)							estimado	$15.099.455,00	estimado	$0,00	estimado	$15.099.455,00	estimado	$0,00	estimado	$0,00	estimado	$15.099.455,00
CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA)							estimado	$1.197.891,00	estimado	$0,00	estimado	$1.197.891,00	estimado	$1.197.891,00	estimado	$1.197.891,00	estimado	$0,00
VALOR TOTAL								$3.056.491.448,00		$0,00		$3.056.491.448,00		$106.807.374,00		$106.807.374,00		$2.949.684.074,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO							15,00%	$458.473.717,00	15,00%	$0,00		$458.473.717,00	15,00%	$16.040.606,00		$16.040.606,00		$442.433.111,00
COSTO A FACTURAR ACTA PARCIAL DE OBRA								$2.598.017.731,00		$0,00		$2.598.017.731,00		$90.696.768,00		$90.696.768,00		$2.507.320.963,00

PARA SU CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON:

JORGE JORGE ZAPATA VELEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO IC-INS 15027

JUAN CARLOS LEÓN LARA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

Neiva, 19 de enero de 2024

Int-Nechí-043

Señores
CONSORCIO IC-ING 15027
JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE
Representante legal
Nechí

Referencia: Contrato de obra No. 4600016558 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoría No. 4600016527 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Asunto: Revisión acta parcial de obra No. 1.

Cordial saludo,

Esta interventoría, en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, ambientales, financieras y legales, se permite informar, que una vez se recibe el acta parcial de obra No. 1 vía correo electrónico, se comunica por medios telefónicos que esta no cumple con los requisitos, pues no se adjunta ningún tipo de soporte como presupuesto del plan de manejo de tránsito con las facturas, registro fotográfico, informe y demás documentos que justifiquen su implementación en campo, a su vez, no se adjunta soporte respecto al valor de ajuste a estudios y diseños, pago de primas de garantías y ejecución de la caracterización vial.

En este sentido, solicitamos se presente a interventoría, en un término no superior a 3 días hábiles, el acta parcial de obra No. 1 acorde con las actividades ejecutadas en obra, junto con todos los soportes a que haya lugar, para que, conforme a lo verificado en campo por esta supervisión, se emita concepto y eventualmente se de trámite a la misma.

Vale la pena recordar que, para futuras actas deberán presentarse las memorias de cálculo y los presupuestos de los componentes (ambiental, social, SST) junto con los respectivos soportes, todo lo anterior en formato Excel y PDF.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS.
Representante legal
Sociedad Técnica Sota Ltda.

INFORME EJECUTIVO ENERO 2024

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

INTERVENTORÍA A EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA

31 DE ENERO DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Con base en el Contrato, el cual tuvo por Objeto "Realizar la INTERVENTORIA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"; el cual fue adjudicado a SOTA Ltda., se hace informe ejecutivo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría se presenta este Informe ejecutivo, el cual contiene las revisiones al Estado de la ejecución de la obra, realizada por el Contratista, CONSORCIO IC-ING 15027 en el mes de enero de 2024.

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**		4600016558	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		20/10/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				LICITACIÓN PÚBLICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				LIC-15027 SECOP II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/11/2023	
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		CONSORCIO IC-ING 15027 (INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALACIO BAENA S.A - ICPB SA 90% e INGAP S.A.S SAS (10%)	
		NIT		**901756732-6**	
VALOR [$]:		INICIAL:		TRES MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML (**$3.056.491.448**), INCLUIDO AIU	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	"N/A"
		VALOR TOTAL:		TRES MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML (**$3.056.491.448**), INCLUIDO AIU	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500061498	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		11/10/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETESIENTOS DICISIETE PESOS ML ($458.473.717)	
PLAZO:		INICIAL		DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES contados a partir de la suscripción de acta de inicio, sin superar el 25 de diciembre de 2023	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				08/11/2023	25/12/2023
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	27 días	23/01/2024

		02	60 dias	21/03/2024	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		NA	NA	NA	NA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		21/03/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				NO	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600016527			
% DE EJECUCION FISICA		3.5% de acuerdo a lo evaluado en el presente informe			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		0%			

3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTAS

Se ha realizado el seguimiento y control al contrato de obra en los siguientes frentes:

Se realiza reprogramación de obra N°2, con fecha de finalización 21 de marzo de 2024, de acuerdo a la prórroga 02 del contrato;

Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	% completado
MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE	**144,38 días?**	**$3.056.491.448,00**	**mié 8/11/23**	**jue 21/03/24**			**45%**
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT	**76,81 días**	**$270.586.619,00**	**sáb 9/12/23**	**mar 20/02/24**		**16;17;18**	**38%**
Excavaciones para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	10 días	$7.671.440,00	sáb 9/12/23	lun 18/12/23		13CC;6CC;4CC+1 día;12FC-4 días;14CC;41CC;42CC;43CC;44CC;45CC;46CC;47CC	100%

Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	2 días	$2.340.663,00	lun 11/12/23	mar 12/12/23	3CC+1 día		100%
Suministro e instalación de cinta selladora para muros sika PVC V15	3 días	$6.193.808,00	mié 7/02/24	vie 9/02/24	8CC+50%		0%
Limpieza de obras transversales, incluye acarreo interno de todos los sedimentos, escombros, material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra.	2 días	$228.610,00	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	3CC		100%
Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	8 días	$3.350.305,00	mié 31/01/24	mié 7/02/24	12FC-2 días	11CC+2 días;8CC+3 días	11%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa Inferior	9 días	$30.199.512,00	vie 2/02/24	sáb 10/02/24	7CC+3 días	10CC+5 días;5CC+50%;9FC-4 días	0%
Concreto Clase C (28 MPa). Box Coulvert - Losa superior y muros laterales	9 días	$80.867.124,00	mié 7/02/24	jue 15/02/24	8FC-4 días		0%
Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.	4 días	$39.927.560,00	mié 7/02/24	sáb 10/02/24	8CC+5 días		0%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	12 días	$87.961.144,00	jue 1/02/24	mar 13/02/24	7CC+2 días		0%
Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima	10 días	$1.606.704,00	mié 24/01/24	jue 1/02/24	3FC-4 días	7FC-2 días	89%

del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.							
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación entre 100 m y 1000 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión) para distancias que superen el acarreo libre (100 m)	10 días	$8.306.370,00	mié 24/01/24	jue 1/02/24	3CC		89%
Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	30 días	$1.933.379,00	mié 24/01/24	mar 20/02/24	3CC	22;23	30%
MANTEMIENTO MECANICO	**6 días**	**$107.539.050,00**	**mar 20/02/24**	**sáb 24/02/24**		**20;21**	**0%**
Suministro material de afirmado, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza y transporte del material, los cuales seran pagados en su respectivo item.	6 días	$28.703.300,00	mar 20/02/24	sáb 24/02/24	2		0%
Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente. Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo a las dimensiones, alineamientos y pendientes de	6 días	$16.515.750,00	mar 20/02/24	sáb 24/02/24	2		0%

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	6 días	$62.320.000,00	mar 20/02/24	sáb 24/02/24	2		0%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**29 días**	**$2.086.448.012,00**	**mar 20/02/24**	**sáb 16/03/24**			**0%**
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	4 días	$4.904.700,00	sáb 24/02/24	mié 28/02/24	15		0%
Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	7 días	$14.544.500,00	sáb 24/02/24	sáb 2/03/24	15		0%
Suministro, colocación, conformación y compactación de Base, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	15 días	$269.929.200,00	mar 20/02/24	lun 4/03/24	14	26CC;24	0%
Suministro, transporte e instalación de geocelda para refuerzo de terraplén y capas granulares	11 días	$483.879.200,00	mar 20/02/24	jue 29/02/24	14		0%

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. -0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su corre	9 días	$33.639.800,00	lun 4/03/24	mar 12/03/24	22	25FC+1 día	0%
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se	3 días	$925.275.692,00	mié 13/03/24	vie 15/03/24	24FC+1 día	33FC+1 día;34FC+1 día;27;31CC+2 días	0%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	16 días	$349.387.920,00	mar 20/02/24	mar 5/03/24	22CC		0%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	1 día	$4.887.000,00	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	25		0%

CONSTRUCCION DE CUNETAS	**7 días**	**$385.166.980,00**	**jue 14/03/24**	**jue 21/03/24**			**0%**
Concreto Clase D (21 Mpa). Cunetas.	6 días	$257.070.900,00	vie 15/03/24	jue 21/03/24	30CC+1 día		0%
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	6 días	$123.585.280,00	jue 14/03/24	mié 20/03/24	31CC	29CC+1 día	0%
Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	5 días	$4.510.800,00	jue 14/03/24	mar 19/03/24	25CC+2 días	30CC	0%
SEÑALIZACION VIAL	**5 días**	**$32.971.730,00**	**sáb 16/03/24**	**jue 21/03/24**			**0%**
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.	1 día	$2.156.168,00	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	25FC+1 día	35FC+1 día	0%
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	1 día	$12.036.000,00	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	25FC+1 día		0%
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del pavimento.	1 día	$1.952.230,00	mar 19/03/24	mar 19/03/24	33FC+1 día	36;37	0%
Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm más	2 días	$1.234.702,00	mar 19/03/24	jue 21/03/24	35		0%

lámina inferior, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX amarillo limón, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en							
Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	1 día	$14.509.143,00	mar 19/03/24	mié 20/03/24	35	38;39	0%
Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia SI-04 doble en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	1 día	$843.659,00	mié 20/03/24	jue 21/03/24	37		0%
Suministro, transporte y colocación de paral estructura para señales verticales de transito informativas SI-05 Y SI-06, en H, tubería redonda de 2" (interna)espesor 3 mm, rellena en concreto hasta 1 m arriba del nivel de piso acabado.	1 día	$239.828,00	mié 20/03/24	jue 21/03/24	37		0%

Incluye excavación,							
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	**1 día?**	**$173.779.057,00**	**mié 8/11/23**	**mié 8/11/23**			**100%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	15 días	$39.623.370,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	15 días	$31.605.932,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
PRIMA DE LOCALIZACION Y HORAS EXTRA PERSONAL OPERATIVO (Incluye IVA)	15 días	$12.111.858,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA)	15 días	$18.212.504,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA)	15 días	$55.921.047,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
ACTUALIZACION DE PRECIOS OBRA (Incluye IVA)	15 días	$15.099.455,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%
CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA)	15 días	$1.204.891,00	sáb 9/12/23	vie 22/12/23	3CC		100%

El avance en obra continua con un panorama desalentador, con un programado del 45% y un ejecutado de solo el 3.5% en lo que compete a la revisión y ajuste de los estudios y diseños.

Aun se continúan con inconvenientes en los diseños presentados por la entidad, donde el presupuesto de la obra no esta acorde a las obras que se proyectan en este presupuesto.

Financieramente estamos en el retraso idéntico a la ejecución.

A continuación, se verifica cada uno de los ítems que se tienen programado a la fecha de corte de este informe.

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Se verifica topografía de la zona, se verifica diseño geométrico y se replantea la vía. Se tiene un avance ejecutado del 80% y programado del 100%.

CONSTRUCCION DE BOX COULVERT.

No se ha iniciado actividad. Se tiene un avance ejecutado del 0% y programado del 100%. Aun no se tiene programa de obra

MANTEMIENTO MECANICO.

No se ha iniciado actividad. Se tiene un avance ejecutado del 0% y programado del 100%. Aun no se tiene programa de obra.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

No se ha iniciado actividad. Se tiene un avance ejecutado del 0% y programado del 36%. Aun no se tiene programa de obra.

A la fecha no se ha podido iniciar obra física, se tiene preocupación en parte por la revisión hidráulica realizada, debido a que la cota de inundación que muestra el diseño y congruente con el diseño geométrico, se deberán realizar llenos de hasta 2 metros de alto, esto genera una modificación al presupuesto y una preocupación debido a que no se tenía contemplado dicho lleno y se necesitaría adición para completar el alcance del contrato.

CONSTRUCCION DE BOX: A la fecha aún se continúan los trabajos de ubicación de las abscisas correspondientes para la construcción de los box culvert mediante topografía, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los box culvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

Se evidencia que aún se está suministrando el material sub base granular en sitio, pero no hay inicio de actividades de obra por parte del contratista.

la interventoría realiza actividades topográficas en campo, sé hace un chequeo con el topógrafo de la interventoría con respecto a los niveles pasados por la gobernación, se evidencia en campo que tenemos un promedio de 150 metros a partir del MDR actual de la calle hacia colorado con poca variable en cuanto a cotas, pero a partir de esta distancia se empiezan a generar llenos en la vía, el cual terminando el kilómetro a pavimentar llega con llenos promedios de 2.60 a 2.80 metros

Debido a lo comentado en la ejecución del proyecto, se solicita prorroga por 60 días, la cual es concedida y se tiene fecha de finalización nueva el 21 de marzo de 2024.

4. CONCLUSIONES

- ✓ Al cierre de este informe ejecutivo, la interventoría se encuentra a la espera de una definición en cuanto a las propuestas de reubicación del Box, para poder dar inicio a las actividades de campo.

- ✓ En cuanto al diseño geométrico, se tienen dudas las cuales deberán ser aclaradas por el contratista, si este no lo realiza se deberá realizar consulta a consultor original

- ✓ La interventoría como cumplimiento de los requerimientos contractuales, programa las siguientes actividades:

  - Revisión de topografía y planteamiento de soluciones constructivas para las obras que se presenta dificulta.
  - Aprobación de prorroga 02 al contrato.
  - Revisión del cumplimiento del Cronograma de obra, en cuanto a inicio de trabajos de campo, se tiene un retraso considerado.
  - Entrega de Informes semanales de Interventoría

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.19 15:52:39 -05:00

Código de Seguridad: jqKqJVS1QSzE6CwSGZF8SA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14838229	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	409900
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	409900

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4600016558 , CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/10/2023	24:00 Horas Del 25/06/2024	611.298.289,60	756.670,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 18/10/2023	24:00 Horas Del 25/06/2024	458.473.717,20	567.503,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/10/2023	24:00 Horas Del 25/12/2026	305.649.144,80	1.462.092,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 25/12/2023	24:00 Horas Del 25/12/2028	305.649.144,80	2.753.857,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/12/2023	24:00 Horas Del 25/12/2028	611.298.289,60	5.507.714,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.292.368.586,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	11.047.836,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	11.047.836,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.100.039,00
TOTAL A PAGAR	$	13.152.875,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAV

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100213018** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO IC-ING 15027** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** , expedida por la Compañía en **19/10/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **19** días del mes **OCTUBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.19 16:57:33 -05:00

Código de Seguridad: dsKe/6NqSMapq38TnMGFYQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14838274	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	No. DOC. IDENTIDAD	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	TELÉFONO	3104576323
ASEGURADO	CONSORCIO IC-ING 15027	No. DOC. IDENTIDAD	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	TELÉFONO	3104576323
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4600016558 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO IC-ING 15027, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	172.888,00
PATRONAL	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 464.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	172.888,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	172.888,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	33.799,00
TOTAL A PAGAR	$	211.687,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAS

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14838274	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 2BAoDo1f5B61hVDOW11lsg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS38000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14844375	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
ASEGURADO	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 4600016558 DE 2023, SE DEJA CONSTANCIA DE:
-FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 20/10/2023.
-FECHA DE INICIO: 08/11/2023.
-FECHA DE TERMINACIÓN: 25/12/2023.
.
SE DEJA CONSTANCIA DE:
-NÚMERO DE CONTRATO 4600016558 DE 2023.
-EL CONSORCIO ESTÁ CONFORMADO POR:
INTEGRANTE 1 NIT: 811047188 (PART. 10,0%) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 NIT: 811015828 (PART. 90,0%) INGENEIRIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00
PATRONAL	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 464.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14844375	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

-SE INCLUYEN LOS AMPAROS DE: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQ COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO IC-ING 15027, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQ BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQ COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - A

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: OBjkuLj+sTTcT8PwzmWQKA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14844571	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	409900
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	409900

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 4600016558 DE 2023, SE DEJA CONSTANCIA DE:
-FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 20/10/2023.
-FECHA DE INICIO: 08/11/2023.
-FECHA DE TERMINACIÓN: 25/12/2023.
.
SE DEJA CONSTANCIA DE:
-NÚMERO DE CONTRATO 4600016558 DE 2023.
-EL CONSORCIO ESTÁ CONFORMADO POR:
INTEGRANTE 1 NIT: 811047188 (PART. 10,0%) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 NIT: 811015828 (PART. 90,0%) INGENEIRIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 25/06/2024	611.298.289,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 25/06/2024	458.473.717,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 25/12/2026	305.649.144,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 25/12/2023	24:00 Horas Del 25/12/2028	305.649.144,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/12/2023	24:00 Horas Del 25/12/2028	611.298.289,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.292.368.586,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14844571	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	25/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA AI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100213018** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO IC-ING 15027** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** , expedida por la Compañía en **16/11/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **16** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

PÓLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 1

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.04 15:33:51 -05:00

Código de Seguridad: wVzmWtq+Pp3HiHYpse+JTg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSR0000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100048060	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	14857071	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/01/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	21/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
ASEGURADO	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN MODIFICACION CONTRACTUAL PRÓRROGA 1, SE PRÓRROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 21 ENERO 2024
SE DEJA CONSTANCIA DE:
- SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO NÚMERO 4600016558 DEL 2023, SE DEJA CONSTANCIA DE:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20/10/2023
FECHA DE INICIO: 08/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN 25/12/2023
- NÚMERO DE CONTRATO 4600016558 DEL 2023
- EL CONSORCIO ESTÁ CONFORMADO POR
INTEGRANTE 1 NIT 811047188 (PART 10%) INGAP SAS
INTEGRANTE 2 NIT 811015828 (PART 90%) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA SA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	68.647,00
PATRONAL	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 464.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	68.647,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	68.647,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	13.043,00
TOTAL A PAGAR	$	81.690,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100048060	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14857071	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	21/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- SE INCLUYEN LOS AMPAROS DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO IC-ING 15027, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - A

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.04 13:43:44 -05:00

Código de Seguridad: emoyBVUeC2XBUkFZCZcTMg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14857008	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO IC-ING 15027	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.756.732-6
DIRECCIÓN	CL 43 B 30 23	**TELÉFONO**	3104576323
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	8522082
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.900.286-0
DIRECCIÓN	CALLE 42 B NO. 52 - 106	**TELÉFONO**	8522082

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN MODIFICACION CONTRACTUAL PRÓRROGA 1, SE PRÓRROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 21 ENERO 2024.

SE DEJA CONSTANCIA DE:

SEGÚN ACTA DE INICIO AL CONTRATO NÚMERO 4600016558 DEL 2023, SE DEJA CONSTANCIA DE:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20/10/2023
FECHA DE INICIO: 08/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN 25/12/2023
NÚMERO DE CONTRATO 4600016558 DEL 2023
EL CONSORCIO ESTÁ CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	611.298.289,60	78.380,16
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	458.473.717,20	58.785,12
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 21/01/2027	305.649.144,80	33.914,49
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	305.649.144,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	611.298.289,60	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.292.368.586,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	171.079,77
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	171.079,77
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	32.505,16
TOTAL A PAGAR	$	203.584,93

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100213018	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14857008	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	18/10/2023	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 NIT 811047188 (PART 10%) INGAP SAS
INTEGRANTE 2 NIT 811015828 (PART 90%) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA SA
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.4600016558 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 - CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 811047188 (PART. 10,0 %) INGAP S.A.S
INTEGRANTE 2 - NIT: 811015828 (PART. 90,0 %) INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO IC-ING 15027)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100213018** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO IC-ING 15027** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** , expedida por la Compañía en **04/01/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **04** días del mes **ENERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ACTAS DE COMITÉ ENERO 2024

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité Nº4	**Fecha de reunión:** 15-424
Organismo, Dependencia o Proceso:	**Fecha de elaboración:**
Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

3. Temas tratados

1. Se deben entregar la documentacion inicial, en fisico y firmado, el contratista se compromete hacer entrega el Miercoles 17 de enero ya subsanado todas las observaciones realizadas por interventoria
2. Si se va hacer uso del anticipo, debe hacerse de manera rapida, ya que la amortizacion debe hacerse 1 mes Antes de finalizar el contrato
3. Social y ambiental - Pendiente subsanacion PMA, son temas de forma y se debe subsanar la hoja de vida del Ambiental Contratista.
4. Area hidraulica debe hacer propuesta para movu Box y la interventoria debe revisar y avalar, asi como el area Social debera hacer socializaciones con los propietarios.
5. Se debe entregar Plan de Contingencia a la nueva Programacion
6. Se esta en revision de la topografia, se verificara el asunto de llenos, estan por encima de los 3 metros en Algunos Casos.

4. Proposiciones y varios

Hacer reuniones de Para Para entregas - Social- SST y Ambiental

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

5 Compromisos pactados

- 17. Enero entrega información inicial Subsanada
- 18 Enero se compromete el Contratista a entregar Subsanado el PMA y los Informes de interventoría se deben entregar impresos.
- 17 enero se debe entregar de parte de Contratista plan de Contingencia a reprogramación
- 18 Enero verificación topográfica

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

Firma de quien elabora

Juan C. León
Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Vanessa Betancur
Nombre de quien revisa y aprueba

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 15-01-2024 | HORA: 11:00 AM | LUGAR EVENTO:

ASUNTO: Comité Nº 5 | RESPONSABLE EVENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Vanessa Betancur M	1037601851	Supervisora SIP	Medellín	3103623740	Vanessa.betancur@antioquia.gov.co	
JORGE J. ZAPATA V.	70557463	CONSORCIO ICING	Nechí	3217781313	cons.icing@gmail.com	
ARIEL PARRA	71781106	CONSULTORÍA	NECHÍ	3004316441	Cons.icing@Gmail.com	
JUAN E. LÓPEZ C	71388521	CONSORCIO ICING	Nechí	3117277042	cons.icing@gmail.com	
Javier Barrero Mejía	7685896	Sotacha	Nechí	3186081555		

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión**: 02 **Fecha de aprobación: 25/06/2018**

Tipo de reunión: Comité Técnico	**Fecha de reunión: 19 enero 2024**
Organismo, Dependencia o Proceso: Interventoría - contratista de obra	**Fecha de elaboración:**

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
Ing Jair Sierra Residente interventoría	**Ingeniero residente de obra contratista** **Director de obra contratista**

Orden del Dia:

1. Temas tratados
2. Proposiciones y varios
3. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Se informa a través de esta acta de reunión de obra que el residente de obra y el director de obra del contratista no hace presencia en el comité, teniendo en cuenta que a la fecha no hay ingeniero encargado de la obra, por lo tanto, es imposible realizar el comité de obra en la zona

1. Lectura del acta anterior

No Aplica

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
	NO se realiza			
	Comite			

3. Temas tratados

Ninguno

1- Compromisos pactados N/A

No.	Compromisos	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
	N/A			
	N/A			

Ing. Jair Sierra Residente interventoría

Firma de quien aprueba

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S9-2024 Del 1/1/2024 al 7/1/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) - COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÒN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	21/01/2024	30/01/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	100,00%
ADICIÓN 1						
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**257.054.643**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	64,00%	8/11/2023	48	57,14%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	36,00%	22/12/2023	36	42,86%
PLAZO TOTAL	**75 DIAS**		**100,00%**	**84 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
TOTAL		0			0	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO-NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S9-2024	Del	1/1/2024	al	7/1/2024

RESUMEN GRAFICO AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	20,32%	97,11%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%
Desviación	20,32%	97,10%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	21/1/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

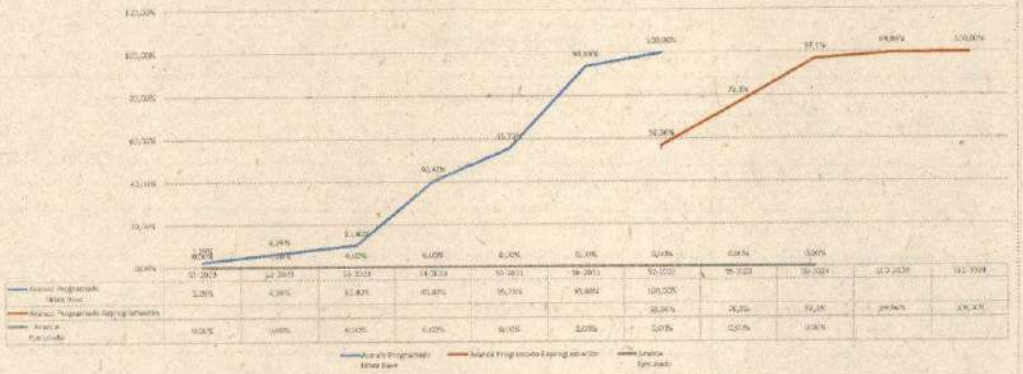

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	0%		0%	15%	15,00%
Ocupación de cauce	0%		0%	15%	15,00%
PMT	0%		0%	15%	15,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					33,26%	
EMULSION ASFALTICA	0,00			0,00%	1,17%	1,17%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00			0,00%	32,10%	32,10%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				0,00%	6,69%	6,69%
CONCRETO CUNETA	0,00			0,00%	6,69%	6,69%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT				0,00%	5,36%	5,36%
CONCRETO SOLADO	0,00			0,00%	0,12%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00			0,00%	1,05%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00			0,00%	2,81%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00			0,00%	1,36%	1,36%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL				0,00%	0,07%	0,07%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00			0,00%	0,07%	0,07%
SEÑALES VERTICALES	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO					1,57%	1,57%
AFIRMADO	0,00			0,00%	1,00%	1,00%
MEJORAMIENTO SUB RASANTE	0,00			0,00%	0,57%	0,57%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL			
Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Línea Base	Avance Programado Reprogramación	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%		0,00%
S2-2023	6,36%		0,00%
S3-2023	10,40%		0,00%
S4-2023	40,47%		0,00%
S5-2023	55,73%		0,00%
S6-2023	93,88%		0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%	0,00%
S8-2023		76,8%	0,00%
S9-2024		97,1%	0,00%
S10-2024		99,96%	
S11-2024		100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S9-2024 Del 1/1/2024 al 7/1/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

EMULSION: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

BASE GRANULAR: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBBSASE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBRASANTE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CONSTRUCCION DE BOX. A la fecha aun se continuan los trabajos de ubicacion de las absizas correspondientes para la construccion de los boxculvert mediante topografia, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los boxculvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

OTROS:
Aun se evidencia que no inician actividades de obra, se realiza comite tecnico virtual, donde se trataron temas tecnicos de obra con personal conratista de obra, interventoria y la supervisora del proyecto. en ell cual se manifiesta por parte de la interventoria la preocupacion por los retrasos considerados en las actividades de obra y el atraso en la porgtamacion de obra. el cual el contratista llegó a un compromiso bajo acta de comite de obra No 4 con fecha 29 de diciembre del 2023, en ejecutar actividades apartir del 2 de enero del 2024, pero se evidencia que aun no se da inicio a las actividades de obra.





UBICACIÓN DE ABZISAS PARA LOS BOXCULVERT



ACTIVIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR
ACTIVIDADES AREA SST
A la fecha, el contratista de obra aún no ha entregado información respecto a la implementación del plan de SST.
ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL
terventoría trabaja en la revisión del Plan de Manejo Ambiental volúmen 2, entregado por el contratista de obra.
ACTIVIDADES AREA FORESTAL
No se realizaron actividades del área forestal.
ACTIVIDADES AREA SOCIAL
Interventoría trabaja en la revisión del Plan de Gestón Social entregado por el contratista.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S9-2024	Del	1/1/2024	al	7/01/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	2.799.361.934	97,11%
Avance Financiero Ejecutado	$	-	0,00%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	$	-	

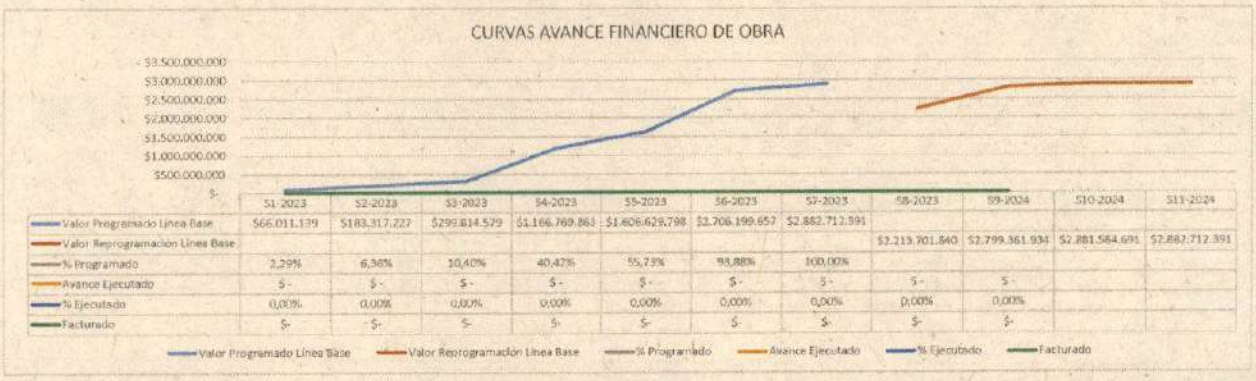

	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Valor Programado Linea Base	$66.011.139	$183.317.227	$299.814.579	$1.166.769.863	$1.606.629.798	$2.706.199.657	$2.882.712.391				
Valor Reprogramación Linea Base								$2.213.701.840	$2.799.361.934	$2.881.584.691	$2.882.712.391
% Programado	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
Avance Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Facturado	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-		

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139		2,29%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227		6,36%		$ -	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579		10,40%		$ -	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.863		40,47%		$ -	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.798		55,73%		$ -	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.657		93,88%		$ -	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391		100,00%		$ -	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.840		76,79%	$ -	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934		97,11%	$ -	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691		99,96%			
S11-2024		$ 2.882.712.391		100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

ÓBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S9-2024	Del	1/1/2024	al	7/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	102.821.857	40,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	48.506.617	18,87%
Anticipo	$	-	0,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	48.506.617	

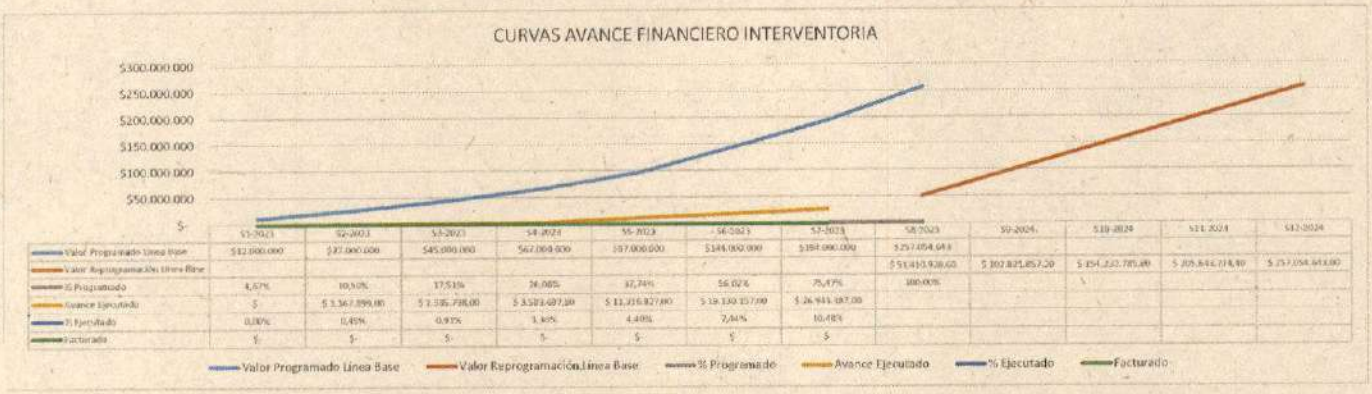

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**257.054.643**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%	Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000		4,67%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000		10,50%		$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000		17,51%		$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000		26,06%		$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000		37,74%		$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000		56,02%		$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000		75,47%		$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60	100,00%	20,00%	$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20		40,00%	$ 48.506.617	18,87%	
S10-2024		$ 154.232.785,80		60,00%			
S11-2024		$ 205.643.714,40		80,00%			
S12-2024		$ 257.054.643,00		100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S9-2024	Del	1/1/2024	al	7/1/2024

	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	0	6	3	0	9	
Profesionales		4	1		5	55,6%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		2	2		4	44,4%
Retiros	0	0	0	0	0	
Profesionales		0	0		0	
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		0	0		0	
Activos	0	6	3	0	9	
Profesionales		4	1		5	55,6%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		2	2		4	44,4%
Caracterización						
Hombres		4	3		7	77,8%
Mujeres		2	0		2	22,2%
Primer Empleo		0	0		0	
Discapacitado		0	0		0	
Indígenas		0	0		0	
LGTBI		0	0		0	
Afrodescendiente		0	0		0	
Localización		6	3			
De la Subregión		2	0		2	22,2%
De Antioquia		2	3		5	55,6%
Fuera de Antioquia		2	0		2	22,2%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana: S9-2024 Del: 1/1/2024 al: 7/1/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL



	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Avance Programado Línea Base	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
Avance Programado Reprogramación							56,96%	76,8%	97,1%	99,96%	100,00%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

CURVAS AVANCE FINANCIERO DE OBRA

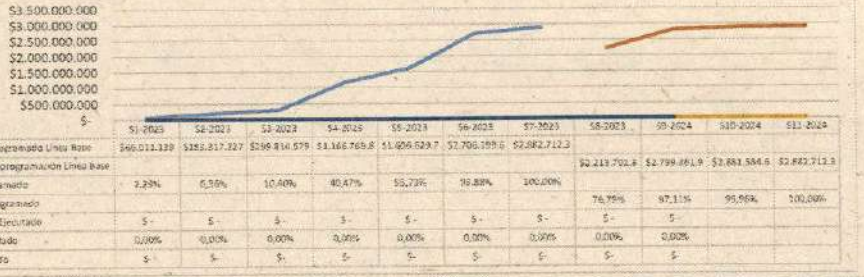

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	20,32%	97,11%	-97,11%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	
Plazo transcurrido	8,00%	60 días	
Fin Proyectado	21/1/2024		

Estructura Pavimento K13+725-K12+630		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	15	1,00 Km	0,000 Km	0%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Alcantarillas	0	0,0	
Box Coulverts	3	0,0	0%
Puentes	0	0,0	
Muros	0	0,0	

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	2.799.361.934	97,11%
Avance Financ. Ejecut.	$	-	0,00%
Desviación	-$	2.799.361.934	-97,11%
Facturado	$	-	0,0%
Balance Financiero			Año suscripción


Valor Inicial	$	3.056.491.448,00	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SM				
Gran total a adicionar	**$**	**1.528.245.724,00**	1.317,45	0,5
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S9-2024 Del 1/1/2024 al 7/1/2024

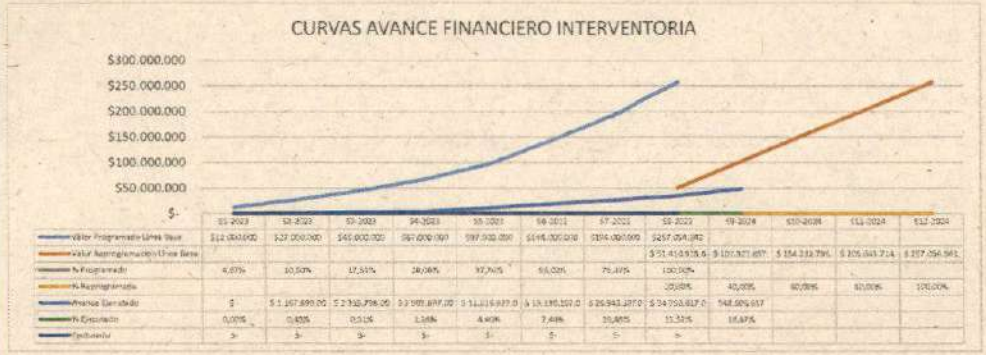



Avance Financiero			
Avance Financ. Program.	$	102.821.857	40,00%
Avance Financ. Ejecut.	$	48.506.617	18,87%
Desviación	-$	54.315.240	-21,13%
Facturado	$	-	0,00%
Plazo transcurrido	71,43%	60 días	
Fin Proyectado	30/1/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	-	0,00 SMMLV	2024
Valor Total	$	257.054.643	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	257.054.643		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	-	0,00 SMMLV	0,00%







GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S10-2024 Del 8/1/2024 al 14/1/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) - COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027**	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.**
	ICPB S.A. 90%	REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
	INGAP S.A.S. 10 %	
	REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	21/01/2024	30/01/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	100,00%
ADICIÓN 1						
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
VALOR TOTAL	$	**3.056.491.448**	**100,00%**	$	**257.054.643**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	64,00%	8/11/2023	48	57,14%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	36,00%	22/12/2023	36	42,86%
PLAZO TOTAL	75 DIAS		100,00%	84 DIAS		100%

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
TOTAL	0			0		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S10-2024	Del	8/1/2024	al	14/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	2,85%	99,96%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%
Desviación	2,85%	100,00%

Desviación (días)	0
Fin Proyectado	21/1/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

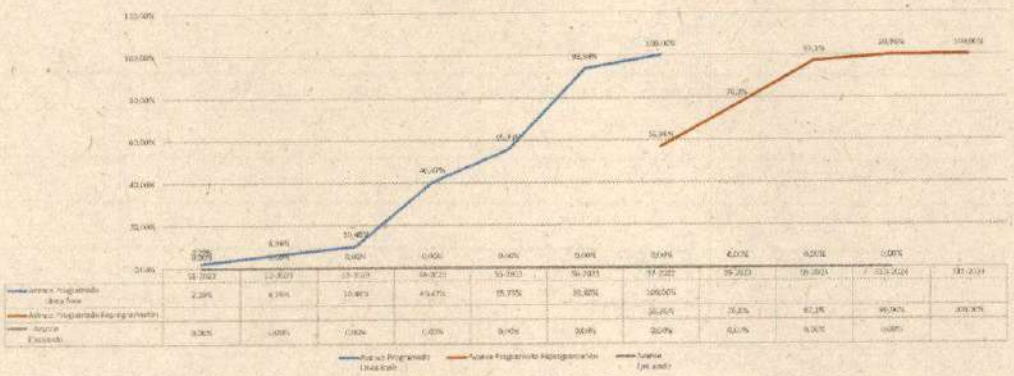

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	0%		0%	15%	15,00%
Ocupación de cauce	0%		0%	15%	15,00%
PMT	0%		0%	15%	15,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					33,20%	
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN	0,00				0,17%	0,17%
CONFORMACION DE LA CALZADA	0,00				0,50%	0,50%
BASE	0,00				9,36%	9,36%
GEOCELDA	0,00				16,79%	16,79%
EMULSION ASFALTICA	0,00			0,00%	1,17%	1,17%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00			0,00%	32,10%	32,10%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				0,00%	8,92%	8,92%
CONCRETO CUNETA	0,00			0,00%	8,92%	8,92%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT				0,00%	5,35%	5,35%
CONCRETO SOLADO	0,00			0,00%	0,12%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00			0,00%	1,05%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00			0,00%	2,81%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00			0,00%	1,39%	1,39%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL				0,00%	0,65%	0,65%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00			0,00%	0,07%	0,07%
SEÑALES VERTICALES	0,00			0,00%	0,58%	0,58%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO					1,57%	1,57%
AFIRMADO	0,00			0,00%	1,00%	1,00%
MEJORAMIENTO SUB RASANTE	0,00			0,00%	0,57%	0,57%

SEGUIMIENTO CURVAS

GENERAL			
Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Línea Base	Avance Programado Reprogramación	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%		0,00%
S2-2023	6,36%		0,00%
S3-2023	10,40%		0,00%
S4-2023	40,47%		0,00%
S5-2023	55,73%		0,00%
S6-2023	93,88%		0,00%
S7-2023	100,00%	56,98%	0,00%
S8-2023		76,8%	0,00%
S9-2024		97,1%	0,00%
S10-2024		99,96%	0,00%
S11-2024		100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S10-2024 Del 8/1/2024 al 14/1/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

EMULSION: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

BASE GRANULAR: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBBSASE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBRASANTE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CONSTRUCCION DE BOX. : A la fecha aun se continuan los trabajos de ubicacion de las absizas correspondientes para la construccion de los boxculvert mediante topografia, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los boxculvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

OTROS:
Aun se evidencia que no inician actividades de obra, esta interventoria manifiesta su preocupacion por el no incio de actividades de obra, considerando que el contratista llegó a un compromiso bajo acta de comite de obra No 4 con fecha 29 de diciembre del 2023, de iniciar la ejecución de actividades apartir del 2 de enero del 2024.
El dia sabado 13 de enero llega maquinaria a sitio: vibro compactador, volquetas para suministro de material sub base y asu vez llega el material geocelda a sitio.
la interventoria realiza actividades topograficas en campo, con el fin de cheuqar los diseños originales de la Gobernacion de Antioquia.





ACOPIO DE MATERIAL SUB BASE EN SITIO
