



MATERIAL GEOCELDA EN CENTRO DE ACOPIO



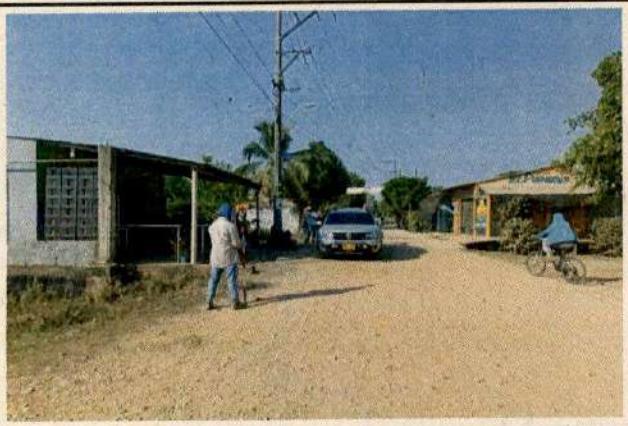

ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

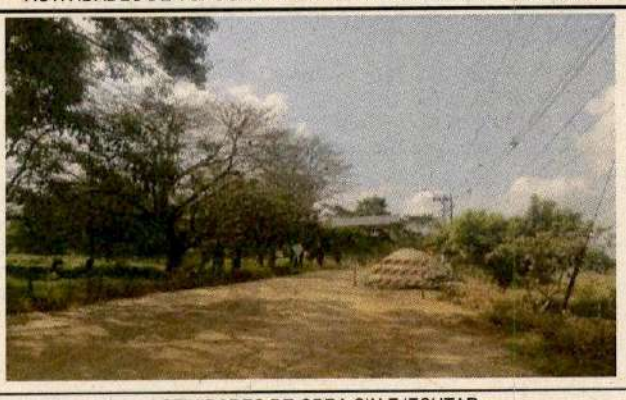

ACTIVIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR

ACTIVIDADES AREA SST

A la fecha, el contratista de obra aún no ha entregado información respecto a la implementación del plan de SST.

ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

Interventoria trabaja en la revisión del Plan de Manejo Ambiental volúmen 2, entregado por el contratista de obra.

ACTIVIDADES AREA FORESTAL

No se realizaron actividades del área forestal.

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

El 12 de enero de 2024 mediante oficio Int-Nechí-035 interventoría solicita los insumos respecto a las actividades de gestión social.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S10-2024	Del	8/1/2024	al	14/01/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	2.881.584.691	99,96%
Avance Financiero Ejecutado	$	342.090	0,01%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	342.090	

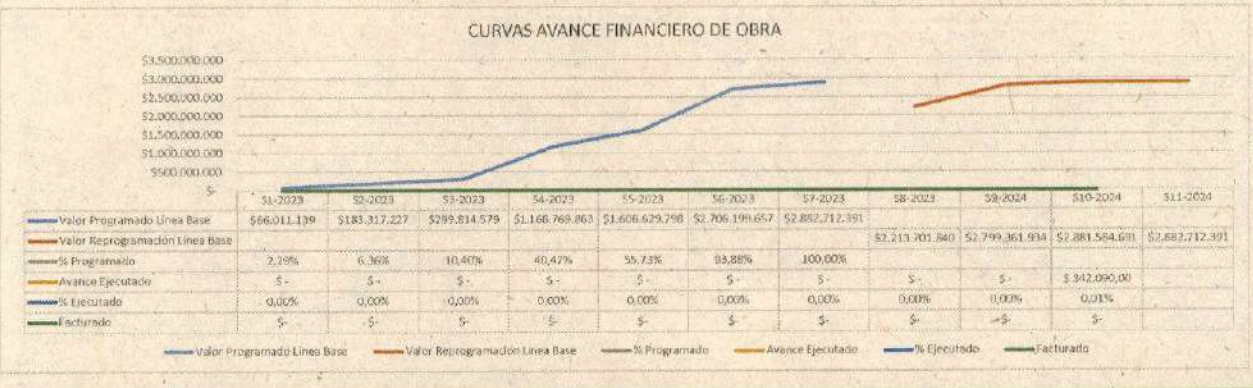

	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Valor Programado Linea Base	$66.011.139	$183.317.227	$299.814.579	$1.166.769.863	$1.606.629.798	$2.706.199.657	$2.882.712.391				
Valor Reprogramación Linea Base								$2.213.701.840	$2.799.361.934	$2.881.584.691	$2.882.712.391
% Programado	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
Avance Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 342.090,00	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
Facturado	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139		2,29%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227		6,36%		$ -	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579		10,40%		$ -	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.863		40,47%		$ -	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.798		55,73%		$ -	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.657		93,88%		$ -	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391		100,00%		$ -	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.840		76,79%	$ -	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934		97,11%	$ -	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691		99,96%	$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391		100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S10-2024	Del	8/1/2024	al	14/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	154.232.786	60,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	62.256.617	24,22%
Anticipo	$	-	0,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	62.256.617	

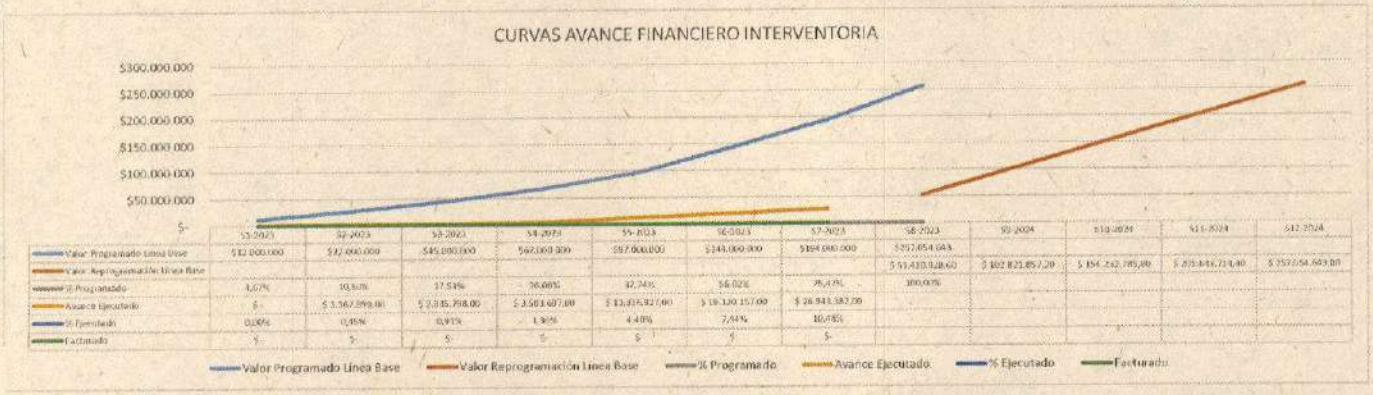

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**257.054.643**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%	Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000		4,67%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000		10,50%		$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000		17,51%		$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000		26,06%		$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000		37,74%		$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000		56,02%		$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000		75,47%		$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60	100,00%	20,00%	$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20		40,00%	$ 48.506.617	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80		60,00%	$ 62.256.617	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40		80,00%			
S12-2024		$ 257.054.643,00		100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S10-2024	Del	8/1/2024	al	14/1/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	0	6	7	0	13	
Profesionales		4	1		5	38,5%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	4		4	30,8%
Administrativos		2	2		4	30,8%
Retiros	0	0	0	0	0	
Profesionales		0	0		0	
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		0	0		0	
Activos	0	6	7	0	13	
Profesionales		4	1		5	38,5%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	4		4	30,8%
Administrativos		2	2		4	30,8%
Caracterización						
Hombres		4	7		11	84,6%
Mujeres		2	0		2	15,4%
Primer Empleo		0	0		0	
Discapacitado		0	0		0	
Indigenas		0	0		0	
LGTBI		0	0		0	
Afrodescendiente		0	0		0	
Localización		6	7			
De la Subregión		2	4		6	46,2%
De Antioquia		2	3		5	38,5%
Fuera de Antioquia		2	0		2	15,4%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana: S10-2024 | Del: 8/1/2024 | al: 14/1/2024

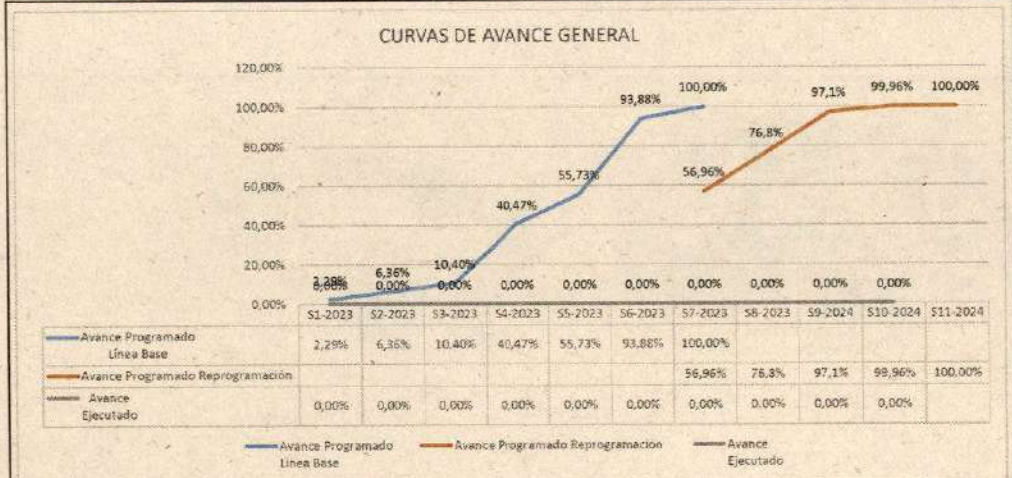

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	2,85%	99,96%	
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	-99,96%
Plazo transcurrido	8,00%	67 días	
Fin Proyectado	21/1/2024		

Estructura Pavimento K13+725-K12+630		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10	3,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	15	3,00 Km	0,000 Km	0%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Alcantarillas	0	0,0	
Box Coulverts	3	0,0	0%
Puentes	0	0,0	
Muros	0	0,0	

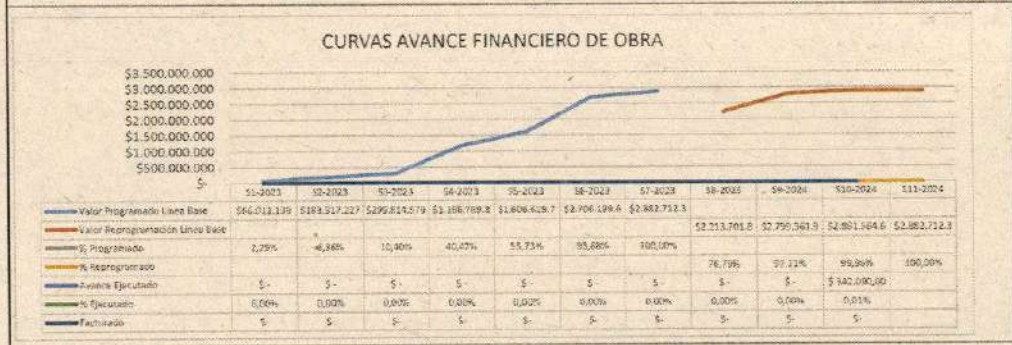

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	2.881.584.691	99,96%
Avance Financ. Ejecut.	$	342.090	0,01%
Desviación	-$	2.881.242.601	-99,95%
Facturado	$	-	0,0%
Balance Financiero			Año suscripción


Valor Inicial	$	3.056.491.448,00	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SM				
Gran total a adicionar	**$**	**1.528.245.724,00**	1.317,45	0,5
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana S10-2024 Del 8/1/2024 al 14/1/2024

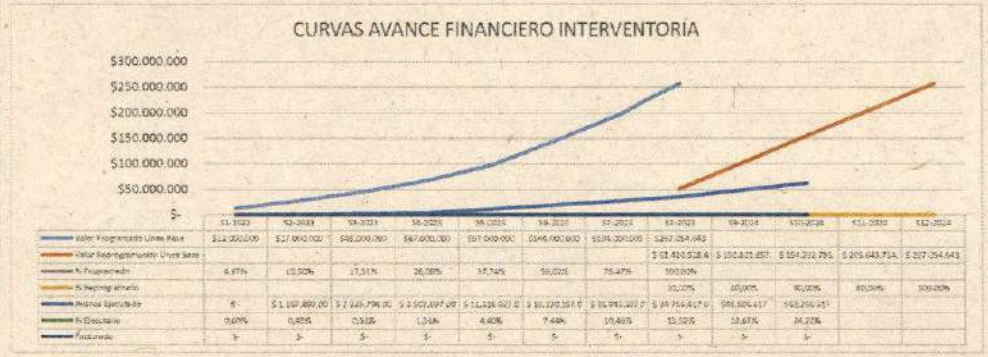



Avance Financiero				
Avance Financ. Program.	$		154.232.786	60,00%
Avance Financ. Ejecut.	$		62.256.617	24,22%
Desviación	-$		91.976.169	-35,78%
Facturado	$		-	0,00%
Plazo transcurrido		79,76%	67 días	
Fin Proyectado		30/1/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	-	0,00 SMMLV	2024
Valor Total	$	257.054.643	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	257.054.643		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	-	0,00 SMMLV	0,00%

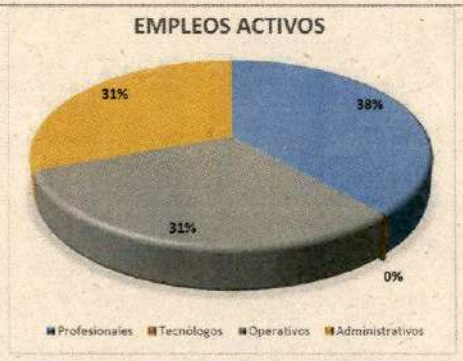

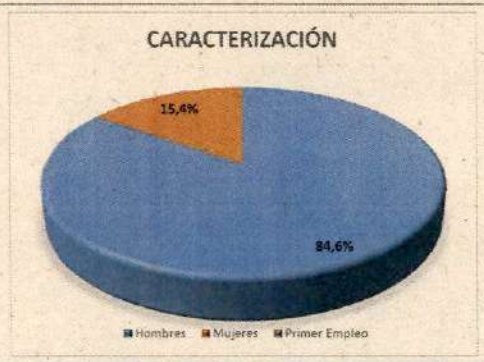

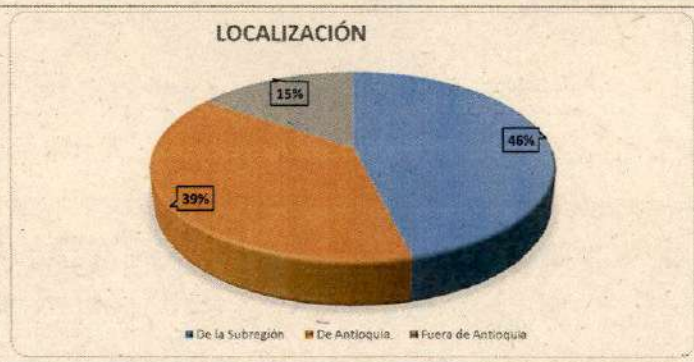

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S11-2024 Del 15/1/2024 al 21/1/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) - COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	21/03/2024	30/03/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
VALOR TOTAL	$	3.056.491.448	100,00%	$	535.320.562	100,00%

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	35,56%	8/11/2023	48	33,33%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	20,00%	22/12/2023	36	25,00%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	44,44%	19/01/2024	60	41,67%
PLAZO TOTAL	135 DIAS		100,00%	144 DIAS		100%

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
TOTAL	0			0		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGION DEL BAJO CAUCA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana	S11-2024	Del	15/1/2024	al	21/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	0,04%	100,00%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%
Desviación	0,04%	100,00%

Desviacion (días)	0
Fin Proyectado	21/3/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL

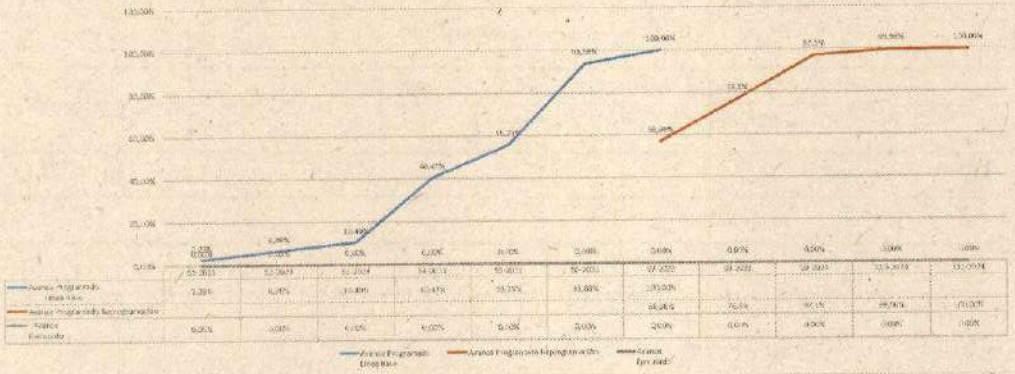

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	0%		0%	15%	15,00%
Ocupación de cauce	0%		0%	15%	15,00%
PMT	0%		0%	15%	15,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR		% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					33,26%	
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	0,00			0,00%	0,17%	0,17%
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA	0,00			0,00%	0,50%	0,50%
BASE	0,00			0,00%	9,36%	9,36%
GEOCELDA	0,00			0,00%	16,79%	16,79%
EMULSION ASFALTICA	0,00			0,00%	1,17%	1,17%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00			0,00%	32,10%	32,10%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS					8,92%	8,92%
CONCRETO CUNETA	0,00			0,00%	8,92%	8,92%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT					5,35%	5,35%
CONCRETO SOLADO	0,00			0,00%	0,12%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00			0,00%	1,05%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00			0,00%	2,81%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00			0,00%	1,39%	1,39%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL					0,65%	0,65%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00			0,00%	0,07%	0,07%
SEÑALES VERTICALES	0,00			0,00%	0,58%	0,58%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO					1,57%	1,57%
AFIRMADO	0,00			0,00%	1,00%	1,00%
MEJORAMIENTO SUB RASANTE	0,00			0,00%	0,57%	0,57%

SEGUIMIENTO CURVA S

GENERAL			
Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Linea Base	Avance Programado Reprogramación	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%		0,00%
S2-2023	6,36%		0,00%
S3-2023	10,40%		0,00%
S4-2023	40,47%		0,00%
S5-2023	55,73%		0,00%
S6-2023	93,88%		0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%	0,00%
S8-2023		26,8%	0,00%
S9-2024		97,1%	0,00%
S10-2024		99,96%	0,00%
S11-2024		100,00%	0,00%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S11-2024 Del 15/1/2024 al 21/1/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

EMULSION: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

BASE GRANULAR: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBBSASE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBRASANTE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CONSTRUCCION DE BOX. : A la fecha aun se continuan los trabajos de ubicacion de las absizas correspondientes para la construccion de los boxculvert mediante topografia, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los boxculvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

OTROS:
Se evidencia que aun se esta suministrando el material sub base granular en sitio, pero no hay inicio de actividades de obra porparte del contratista.
la interventoria realiza actividades topograficas en campo,se hace un chequeo con el topógrafo de la interventoría con respecto a los niveles pasados por la gobernación, se evidencia en campo que tenemos un promedio de 150 metros a partir del MDR actual de la calle hacia colorado con poca variable en cuanto a cotas, pero a partir de esta distancia se empiezan a generar llenos en la via , el cual terminando el kilómetro a pavimentar llega con llenos promedios de 2.60 a 2.80 metros





ACOPIO DE MATERIAL SUB BASE EN SITIO



ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA



EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SIN EJECUTAR

ACTIVIDADES AREA SST

A la fecha, el contratista de obra aún no ha entregado información respecto a la implementación del plan de SST.
- El 15 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-036, interventoría realiza requerimiento al contratista de obra, respecto al plan de SST (Planillas, hoja de vida profesional SST, Programas de implementación, entre otros).
- El 19 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-041, interventoría solicita los insumos correspondientes de los componentes de gestión social, ambiental y SST.

ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

Interventoría trabaja en la revisión del Plan de Manejo Ambiental volúmen 2, entregado por el contratista de obra.
- El 19 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-041, interventoría solicita los insumos correspondientes de los componentes de gestión social, ambiental y SST.

ACTIVIDADES AREA FORESTAL

No se realizaron actividades del área forestal.

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

17 de enero de 2024 mediante oficio Int-Nechí-037, interventoría realiza observaciones al Plan de Gestión Social entregado por el contratista de obra.- El 19 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-041, interventoría solicita los insumos correspondientes de los componentes de gestión social, ambiental y SST.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S11-2024	Del	15/1/2024	al	21/01/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	2.882.712.391	100,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	684.180	0,02%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	684.180	

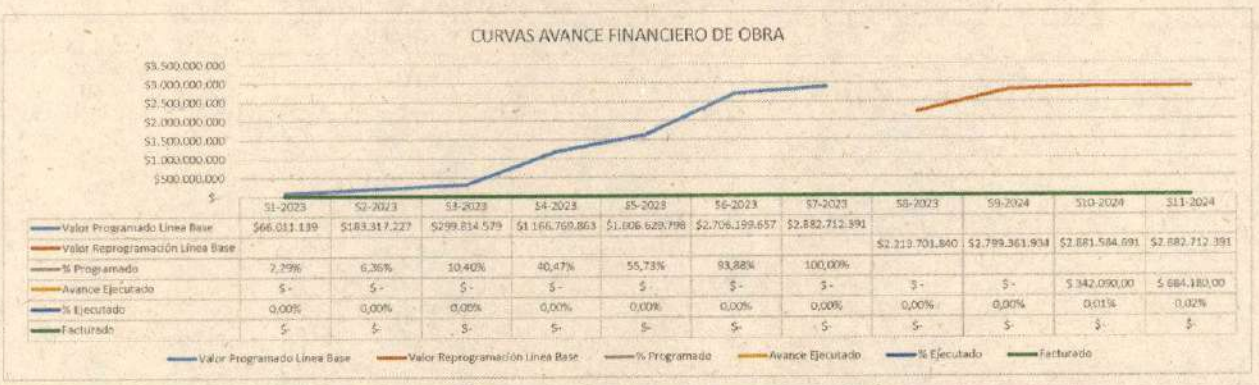

	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Valor Programado Linea Base	$66.011.139	$183.317.227	$299.814.579	$1.166.769.863	$1.606.629.798	$2.706.199.657	$2.882.712.391				
Valor Reprogramación Linea Base								$2.213.701.840	$2.799.361.934	$2.881.584.691	$2.882.712.391
% Programado	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
Avance Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 342.090,00	$ 684.180,00
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Facturado	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-	$-

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139		2,29%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227		6,36%		$ -	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579		10,40%		$ -	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.863		40,47%		$ -	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.798		55,73%		$ -	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.657		93,88%		$ -	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391		100,00%		$ -	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.840		76,79%	$ -	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934		97,11%	$ -	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691		99,96%	$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391		100,00%	$ 684.180,00	0,02%	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S11-2024	Del	15/1/2024	al	21/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	205.643.714	38,42%
Avance Financiero Ejecutado	$	76.006.617	14,20%
Anticipo	$	-	0,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	76.006.617	

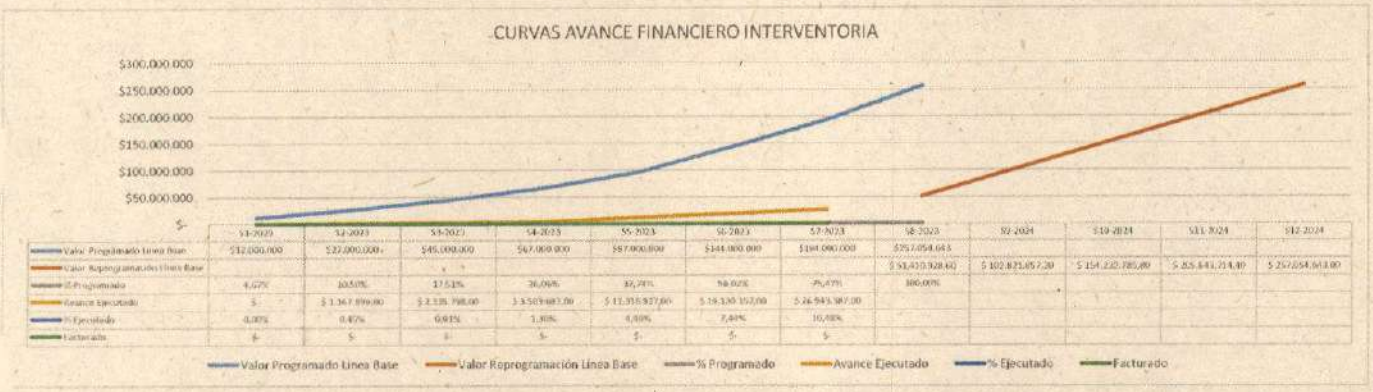

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

			Atraso >= 5%	Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base	% Programado	% Reprogramado	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000		4,67%		$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000		10,50%		$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000		17,51%		$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000		26,06%		$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000		37,74%		$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000		56,02%		$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000		75,47%		$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60	100,00%	9,60%	$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20		19,21%	$ 48.506.617	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80		28,81%	$ 62.256.617	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40		38,42%	$ 76.006.617	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00		48,02%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S11-2024	Del	15/1/2024	al	21/1/2024


	Gobernación	Contratista Interventoria	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	0	6	7	0	13	
Profesionales		4	1		5	38,5%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	4		4	30,8%
Administrativos		2	2		4	30,8%
Retiros	0	0	0	0	0	
Profesionales		0	0		0	
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		0	0		0	
Activos	0	6	7	0	13	
Profesionales		4	1		5	38,5%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	4		4	30,8%
Administrativos		2	2		4	30,8%
Caracterización						
Hombres		4	7		11	84,6%
Mujeres		2	0		2	15,4%
Primer Empleo		0	0		0	
Discapacitado		0	0		0	
Indigenas		0	0		0	
LGTBI		0	0		0	
Afrodescendiente		0	0		0	
Localización		6	7			
De la Subregión		2	4		6	46,2%
De Antioquia		2	3		5	38,5%
Fuera de Antioquia		2	0		2	15,4%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S11-2024 Del 15/1/2024 al 21/1/2024

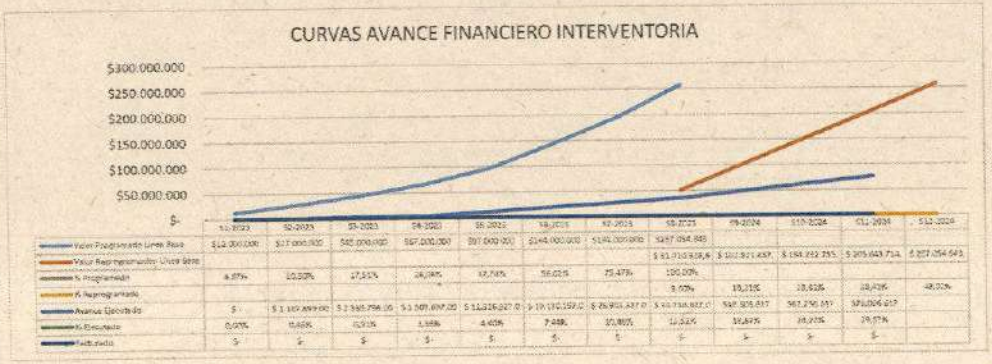



Avance Financiero				
Avance Financ. Program.	$		205.643.714	38,42%
Avance Financ. Ejecut.	$		76.006.617	14,20%
Desviación	-$		129.637.097	-24,22%
Facturado	$		-	0,00%
Plazo transcurrido		51,39%	74 dias	
Fin Proyectado		30/3/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	-	0,00 SMMLV	2024
Valor Total	$	257.054.643	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	257.054.643		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	-	0,00 SMMLV	0,00%





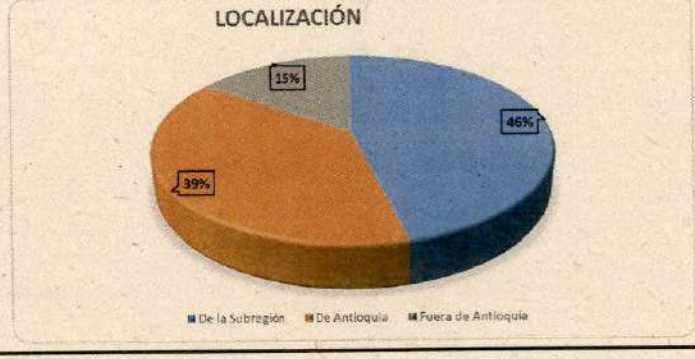

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S11-2024 Del 15/1/2024 al 21/1/2024

CURVAS DE AVANCE GENERAL



	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Avance Programado Línea Base	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
Avance Programado Reprogramación							56,96%	76,8%	97,1%	99,96%	100,00%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	0,04%	100,00%	-100,00%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	
Plazo transcurrido	4,44%	74 días	
Fin Proyectado	21/3/2024		

Estructura Pavimento K13+725-K12+630		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	15	1,00 Km	0,000 Km	0%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Alcantarillas	0	0,0	
Box Coulverts	3	0,0	0%
Puentes	0	0,0	
Muros	0	0,0	

CURVAS AVANCE FINANCIERO DE OBRA



	S1-2023	S2-2023	S3-2023	S4-2023	S5-2023	S6-2023	S7-2023	S8-2023	S9-2024	S10-2024	S11-2024
Valor Programado Línea Base	$66.011.529	$182.317.227	$299.814.579	$1.166.769,8	$1.606.629,7	$2.706.199,6	$2.882.712,3				
Valor Reprogramacion Línea Base								$2.213.701,8	$2.799.861,9	$2.883.584,6	$2.882.712,3
% Programado	2,29%	6,36%	10,40%	40,47%	55,73%	93,88%	100,00%				
% Reprogramado								76,79%	97,11%	99,96%	100,00%
Avance Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 342.090,00	$ 684.180,00
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%
Facturado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	2.882.712.391	100,00%
Avance Financ. Ejecut.	$	684.180	0,02%
Desviación	-$	2.882.028.211	-99,98%
Facturado	$	-	0,0%
Balance Financiero			Año suscripción

Valor Inicial	$	3.056.491.448,00	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SMI				
Gran total a adicionar	$	**1.528.245.724,00**	1.317,45	0,5
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S12-2024 Del 22/1/2024 al 28/1/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) - COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027** ICPB S.A. 90% INGAP S.A.S. 10 % REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.** REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	21/03/2024	30/03/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
VALOR TOTAL	$	**3.056.491.448**	**100,00%**	$	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	35,56%	8/11/2023	48	33,33%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	20,00%	22/12/2023	36	25,00%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	44,44%	19/01/2024	60	41,67%
PLAZO TOTAL	**135 DIAS**		**100,00%**	**144 DIAS**		**100%**

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
TOTAL		**0**			**0**	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA)-COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S12-2024	Del	22/1/2024	al	28/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	8.81%	38.00%
Avance Ejecutado	0.00%	0.00%
Desviación	8.81%	38.00%
Desviación (días)	0	
Fin Proyectado	21/3/2024	

CURVAS DE AVANCE GENERAL



AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	0%			0%	15%	15.00%
Ocupación de cauce	0%			0%	15%	15.00%
PMT	0%			0%	15%	15.00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						6,77%	
EXCAVACION MATERIAL COMÚN	0,00				0,00%	0,17%	0,17%
CONFORMACION DE LA CALZADA	0,00				0,00%	0,50%	0,50%
BASE	0,00				0,00%	2,81%	2,81%
GEOCELDA	0,00				0,00%	5,04%	5,04%
EMULSION ASFALTICA	0,00				0,00%	0,35%	0,35%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00				0,00%	6,42%	6,42%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS						5,35%	5,35%
CONCRETO CUNETA	0,00				0,00%	5,35%	5,35%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT						5,35%	5,35%
CONCRETO SOLADO	0,00				0,00%	0,12%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00				0,00%	1,05%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00				0,00%	2,81%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00				0,00%	1,36%	1,36%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL						0,87%	0,00%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00				0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALES VERTICALES	0,00				0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO						0,87%	0,87%
AFIRMADO	0,00				0,00%	0,30%	0,30%
MEJORAMIENTO SUB RASANTE	0,00				0,00%	0,57%	0,57%

SEGUIMIENTO CURVAS

GENERAL				
Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelante < 5%		Adelante >= 5%
Semana	Avance Programado Linea Base	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramación (Prorroga 2)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%			0,00%
S2-2023	6,36%			0,00%
S3-2023	10,40%			0,00%
S4-2023	40,47%			0,00%
S5-2023	55,73%			0,00%
S6-2023	93,88%			0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%		0,00%
S8-2023		76,8%		0,00%
S9-2024		97,1%		0,00%
S10-2024		99,96%		0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%	0,00%
S12-2024			38,00%	0,00%
S13-2024			46,81%	
S14-2024			55,61%	
S15-2024			64,42%	
S16-2024			73,22%	
S17-2024			80,71%	
S18-2024			88,18%	
S19-2024			98,80%	
S20-2024			100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S12-2024 Del 22/1/2024 al 28/1/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

EMULSION: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

BASE GRANULAR: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBBSASE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBRASANTE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CONSTRUCCION DE BOX. : A la fecha aun se continuan los trabajos de ubicacion de las absizas correspondientes para la construccion de los boxculvert mediante topografia, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los boxculvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

OTROS:
Se evidencia que aun se esta suministrando el material sub base granular en sitio, pero no hay inicio de actividades de obra porparte del contratista.
la interventoria continua realizando actividades topograficas en campo juntamente con el contratista.
El contratista entrega el certificado de suministo de material SUB BASE , en sitio y a su vez entraga las respectivas licencias ambientales.





ACOPIO DE MATERIAL SUB BASE EN SITIO





ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

ACTIVIDADES AREA SST

Interventoria y contratista de obra trabajan en la entrega de los insumos del Plan de SST y los insumos para los respectivos informes mensuales.

ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

Interventoria trabaja en la revisión del Plan de Manejo Ambiental volúmen 2, entregado por el contratista de obra.
- El 25 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-045, interventoria solicita la subsanación de los anexos del PMA.
- El 26 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-046, interventoria emite oficio de aprobación del PMA presentado por el contratista de obra.

ACTIVIDADES AREA FORESTAL

No se realizaron actividades del área forestal.

ACTIVIDADES AREA SOCIAL

El contratista de obra aún no ha hecho entrega del los insumos solicitados por interventoria el pasado 19 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-041.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S12-2024	Del	22/1/2024	al	28/01/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	1.095.500.641	38,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	1.049.076	0,04%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	1.049.076	

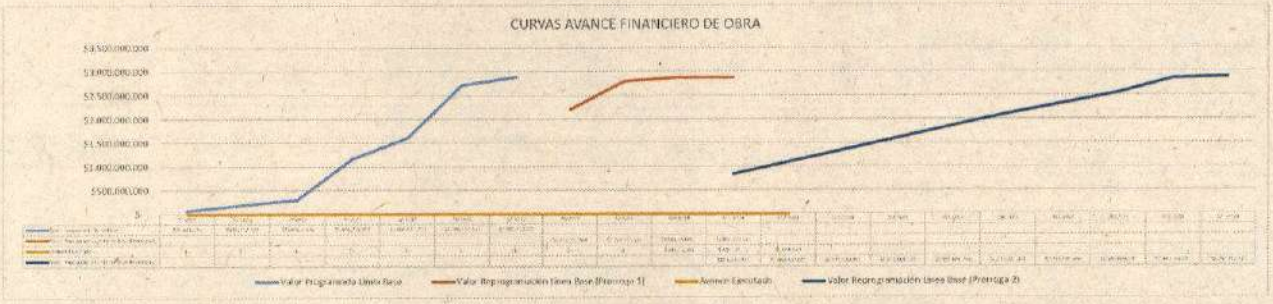

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139			2,29%			$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227			6,36%			$ -	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579			10,40%			$ -	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.166.769.863			40,47%			$ -	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.629.798			55,73%			$ -	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.657			93,88%			$ -	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391			100,00%			$ -	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.840			76,79%		$ -	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934			97,11%		$ -	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.601			99,96%		$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391	$ 841.670.432		100,00%	29,20%	$ 684.180,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641			38,00%	$ 1.049.076	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.851			46,81%			
S14-2024			$ 1.603.161.060			55,61%			
S15-2024			$ 1.856.991.269			64,42%			
S16-2024			$ 2.110.821.478			73,22%			
S17-2024			$ 2.326.586.069			80,7%			
S18-2024			$ 2.541.899.581			88,2%			
S19-2024			$ 2.849.740.661			98,9%			
S20-2024			$ 2.882.712.391			100,0%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S12-2024	Del	22/1/2024	al	28/1/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	53.532.056	10,00%
Avance Financiero Ejecutado	$	89.756.617	16,77%
Anticipo	$	-	0,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	89.756.617	

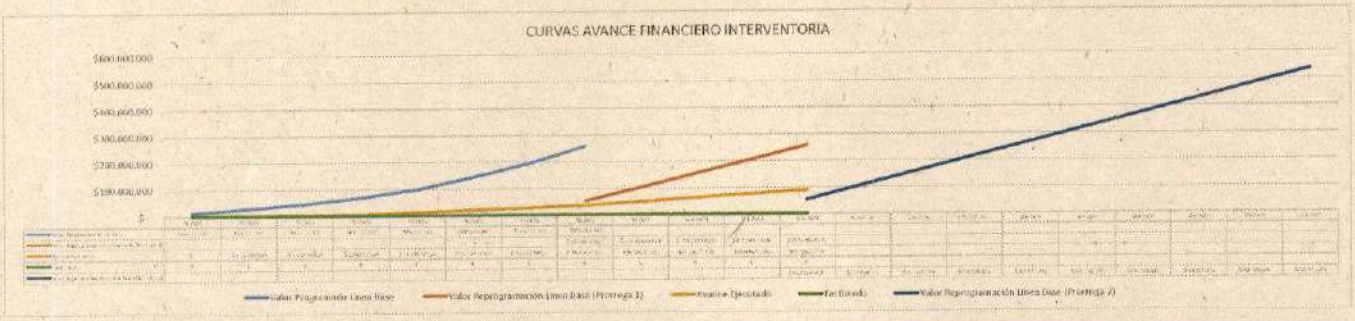

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$	-
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%	Atraso >= 5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000			4,67%			$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000			10,50%			$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000			17,51%			$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000			26,06%			$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000			37,74%			$ 11.316.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000			56,02%			$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000			75,47%			$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60		100,00%	20,00%		$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20			40,00%		$ 48.506.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80			60,00%		$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40			80,00%		$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.056,20		100,00%	10,00%	$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112			20,00%			
S14-2024			$ 160.596.169			30,00%			
S15-2024			$ 214.128.225			40,00%			
S16-2024			$ 267.660.281			50,00%			
S17-2024			$ 321.192.337			60,00%			
S18-2024			$ 374.724.393			70,00%			
S19-2024			$ 428.256.450			80,00%			
S20-2024			$ 481.788.506			90,00%			
S21-2024			$ 535.320.562			100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S12-2024	Del	22/1/2024	al	28/1/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	0	6	14	0	20	
Profesionales		4	4		8	40,0%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	8		8	40,0%
Administrativos		2	2		4	20,0%
Retiros	0	0	0	0	0	
Profesionales		0	0		0	
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		0	0		0	
Activos	0	6	14	0	20	
Profesionales		4	4		8	40,0%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	8		8	40,0%
Administrativos		2	2		4	20,0%
Caracterización						
Hombres		4	12		16	80,0%
Mujeres		2	2		4	20,0%
Primer Empleo		0	0		0	
Discapacitado		0	0		0	
Indígenas		0	0		0	
LGTBI		0	0		0	
Afrodescendiente		0	0		0	
Localización		6	14			
De la Subregión		2	11		13	65,0%
De Antioquia		2	3		5	25,0%
Fuera de Antioquia		2	0		2	10,0%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana S12-2024 Del 22/1/2024 al 28/1/2024

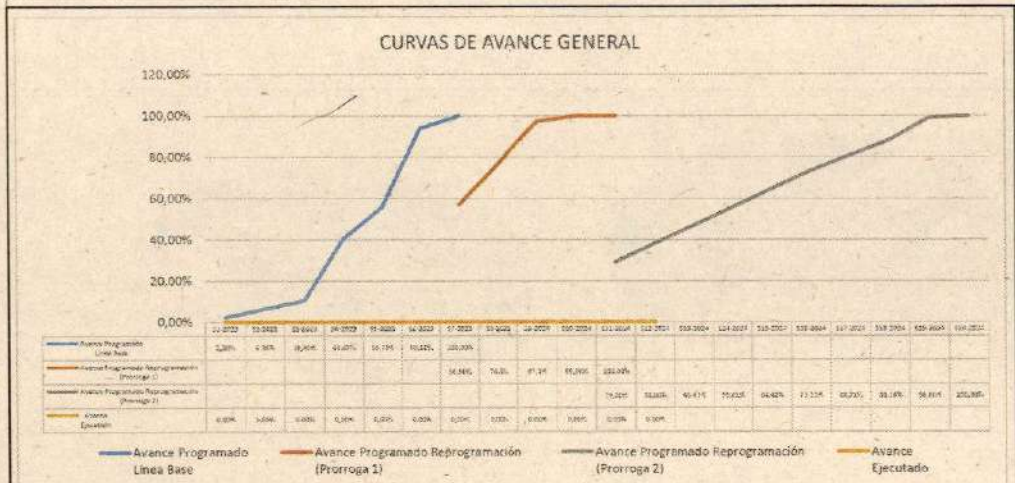

Avance Fisico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	8,81%	38,00%	-38,00%
Avance Ejecutado	0,00%	0,00%	
Plazo transcurrido	4,44%	81 dias	
Fin Proyectado	21/3/2024		

Estructura Pavimento K13+725-K12+630		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	15	1,00 Km	0,000 Km	0%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Alcantarillas	0	0,0	
Box Coulverts	3	0,0	0%
Puentes	0	0,0	
Muros	0	0,0	

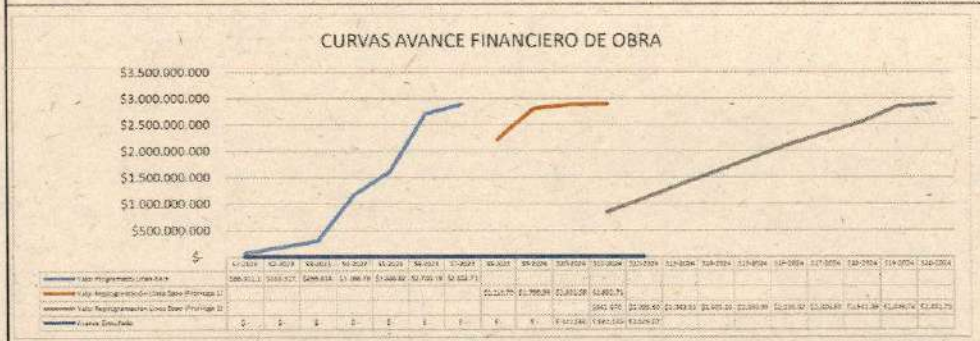

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	1.095.500.641	38,00%
Avance Financ. Ejecut.	$	1.049.076	0,04%
Desviación	-$	1.094.451.565	-37,97%
Facturado	$	-	0,0%
Balance Financiero			Año suscripción


Valor Inicial	$	3.056.491.448,00	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SM				
Gran total a adicionar	**$**	**1.528.245.724,00**	1.317,45	0,5
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S12-2024 Del 22/1/2024 al 28/1/2024

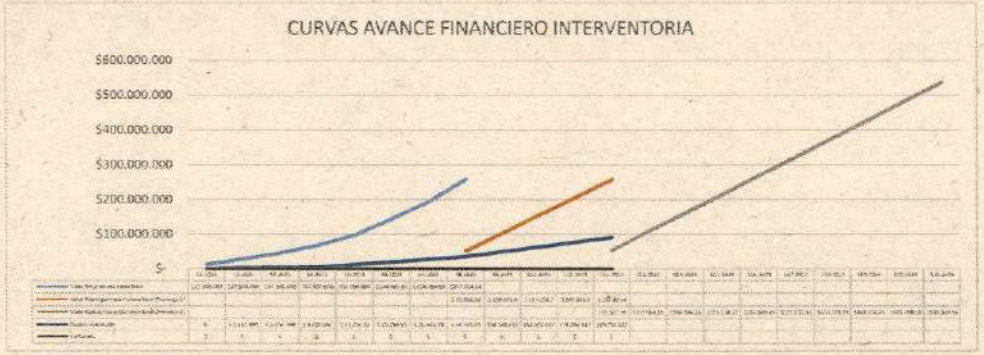


Avance Financiero				
Avance Financ. Program.	$		53.532.056	10,00%
Avance Financ. Ejecut.	$		89.756.617	16,77%
Desviación	$		36.224.561	6,77%
Facturado	$		-	0,00%
Plazo transcurrido		56,25%	81 días	
Fin Proyectado		30/3/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+ 96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%





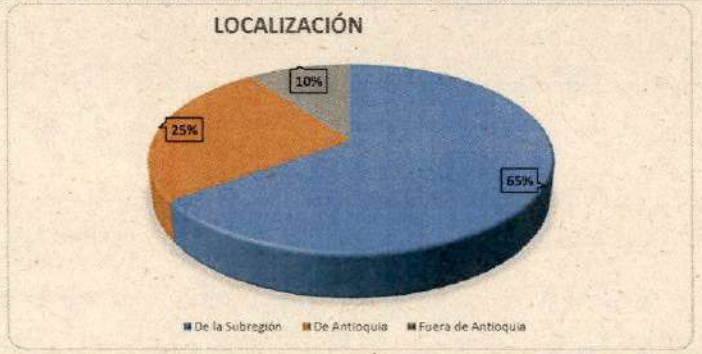

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría De Infraestructura Física Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App **INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S13-2024 Del 29/1/2024 al 4/2/2024

	Información Contractual
	Seguimiento del Avance Físico de Obra
	Actividades Ejecutadas del Proyecto
	Seguimiento del Avance Financiero de Obra
	Seguimiento a Nuevos Ítems (Obra Extra)
	Seguimiento del Avance Financiero de Interventoría
	Seguimiento Empleabilidad del Proyecto
	Varios
	Cuadro de mando

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	OBRA	INTERVENTORIA
NUMERO DE CONTRATO	4600016558 de 2023	4600016527 de 2023
PROCESO	LIC-15027	CON-15365
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) - COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	**CONSORCIO IC-ING 15027**	**SOCIEDAD TÉCNICASOTA LTDA.**
	ICPB S.A. 90%	REPRESENTANTE LEGAL - JAVIER BARRERO MOSSOS
	INGAP S.A.S. 10 %	
	REPRESENTANTE LEGAL - JORGE IVAN LOPEZ ELEJALDE	
NIT	901.756.732-6	891.101.100-5
SUBREGIÓN	BAJO CAUCA	
MUNICIPIOS IMPACTADOS	CAUCASIA - NECHI	
SUPERVISOR	VANESSA BETANCUR MARTINEZ	

ESTADO	EJECUCION	EJECUCION
VALOR	$3.056.491.448	$257.054.643
PLAZO	2,5 MESES	2 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	8/11/2023	8/11/2023
FECHA DE FIN	21/03/2024	30/03/2024

	FECHA	VALOR	%	FECHA	VALOR	%
VALOR INICIAL	8/11/2023	$ 3.056.491.448	100,00%	5/09/2022	$ 257.054.643	48,02%
ADICIÓN 1				19/01/2024	$ 278.265.919	51,98%
ADICIÓN 2						
ADICIÓN 3						
VALOR TOTAL	**$**	**3.056.491.448**	**100,00%**	**$**	**535.320.562**	**100,00%**

	FECHA	DIAS	%	FECHA	DIAS	%
PLAZO INICIAL	8/11/2023	48,00	35,56%	8/11/2023	48	33,33%
AMPLIACIÓN 1	22/12/2023	27,00	20,00%	22/12/2023	36	25,00%
AMPLIACIÓN 2	19/01/2024	60,00	44,44%	19/01/2024	60	41,67%
PLAZO TOTAL	135 DIAS		100,00%	144 DIAS		100%

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS
SUSPENSIÓN 1			0			0
TOTAL	0			0		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FISICO


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGION DEL BAJO CAUCA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana: 51-2024 Del: 29/01/2024 al: 4/02/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

	Semana	Acumulado
Avance Programado	8,81%	46,81%
Avance Ejecutado	6,27%	6,27%
Desviación	2,53%	40,50%
Desviación (días)	0	
Fin Proyectado	21/3/2024	

CURVAS DE AVANCE GENERAL

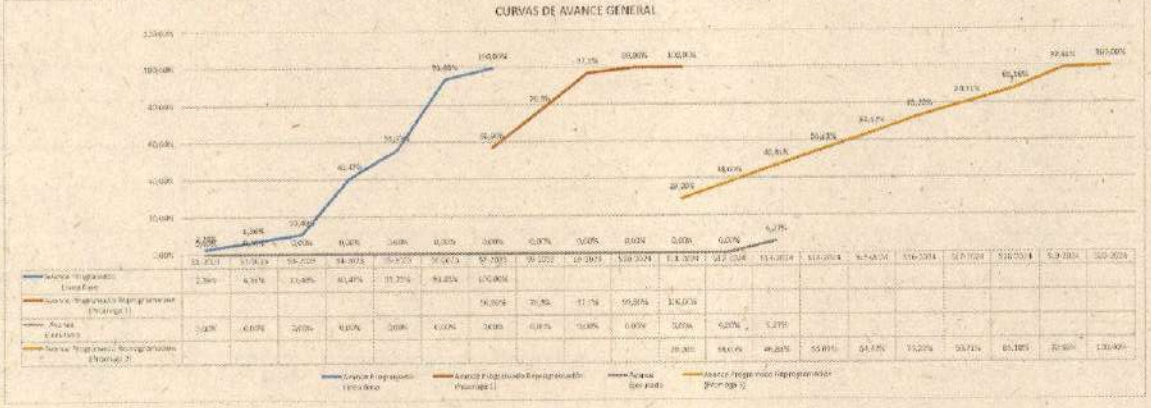

AVANCE ACTIVIDADES LICENCIAS Y PERMISOS

ACTIVIDAD	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
Aprovechamiento forestal	0%			0%	15%	15,00%
Ocupación de cauce	0%			0%	15%	15,00%
PMT	0%			0%	15%	15,00%

AVANCE ACTIVIDADES OBRAS

ACTIVIDAD	CANT. EJECUTADA ACUM.	% ANTERIOR			% ACTUAL	% PROGRAMADO	DESFASE
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						27,17%	
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN	0,00				0,00%	0,17%	0,17%
CONFORMACION DE LA CALZADA	1968,00				0,10%	0,50%	0,40%
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE	410,00				2,02%	4,68%	2,66%
INSTALACIÓN DE GEOCELDA	1755,00				4,15%	8,39%	4,24%
EMULSION ASFALTICA	0,00				0,00%	0,58%	0,58%
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0,00				0,00%	12,84%	12,84%
PRODUCTO 2. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS						7,13%	7,13%
CONCRETO CUNETA	0,00				0,00%	7,13%	7,13%
PRODUCTO 3. CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT						5,36%	5,36%
CONCRETO SOLADO	0,00				0,00%	0,12%	0,12%
CONCRETO BOXCULVERT	0,00				0,00%	1,05%	1,05%
CONCRETO MUROS BOXCULVERT	0,00				0,00%	2,81%	2,81%
CONCRETO MUROS DISIPADORES	0,00				0,00%	1,39%	1,39%
PRODUCTO 4. SEÑALIZACION VIAL						0,00%	0,00%
TACHAS REFLECTIVAS	0,00				0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALES VERTICALES	0,00				0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTO 5. MANTENIMIENTO MECÁNICO						1,07%	1,07%
AFIRMADO	0,00				0,00%	0,50%	0,50%
MEJORAMIENTO SUBRASANTE	0,00				0,00%	0,57%	0,57%

SEGUIMIENTO CURVAS

GENERAL

Atraso >= 5%	Atraso < 5%	Adelanto < 5%		Adelanto >= 5%
Semana	Avance Programado Lineb Base	Avance Programado * Reprogramación (Prorroga 1)	Avance Programado Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado
S1-2023	2,29%			0,00%
S2-2023	6,36%			0,00%
S3-2023	10,40%			0,00%
S4-2023	40,47%			0,00%
S5-2023	55,73%			0,00%
S6-2023	80,88%			0,00%
S7-2023	100,00%	56,96%		0,00%
S8-2023		76,8%		0,00%
S9-2024		97,1%		0,00%
S10-2024		99,96%		0,00%
S11-2024		100,00%	29,20%	0,00%
S12-2024			39,00%	0,00%
S13-2024			46,81%	6,27%
S14-2024			55,61%	
S15-2024			64,42%	
S16-2024			73,22%	
S17-2024			80,71%	
S18-2024			88,18%	
S19-2024			96,96%	
S20-2024			100,00%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S13-2024 Del 29/1/2024 al 4/2/2024

Observaciones Generales

Descripción de las Actividades Ejecutadas esta Semana

PAVIMENTO: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

EMULSION: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

BASE GRANULAR: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

SUBBSASE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA


SUBRASANTE: A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CUNETAS : A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN OBRA

CONSTRUCCION DE BOX. : A la fecha aun se continuan los trabajos de ubicacion de las absizas correspondientes para la construccion de los boxculvert mediante topografia, teniendo en cuenta que los propietarios de los lotes donde se realizaran los boxculvert, estos no dan acceso a realizar excavaciones.

OTROS:
Se realizan actividades de Escarificacion Con motoniveladora Para corte de rasante . Y luego proceder a la confirmación y compactacion de material seleccionado.
la interventoria continua realizando actividades topograficas en campo juntamente con el contratista. Acopio de material de crudo para llenos.



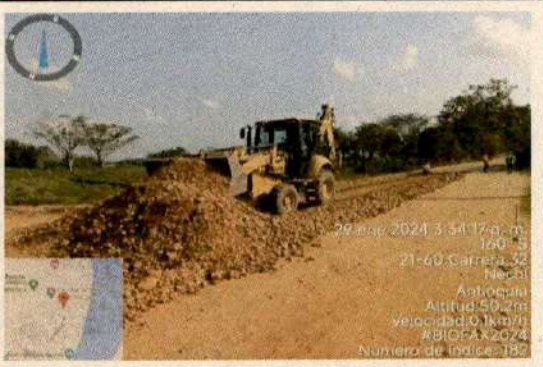

Escarificacion Con motoniveladora Para corte de rasante






Problemas de orden público en la zona

ACTIVIDADES AREA SST
Interventoria y contratista de obra trabajan en la entrega de los insumos del Plan de SST y los insumos para los respectivos informes mensuales. - El 29 de enero de 2024 el contratista entrega insumos para la elaboración de los informes de interventoría, del area SST (Noviembre). - El 01 de febrero de 2024 el contratista entrega insumos para la elaboración de los informes de interventoría, del area SST (Diciembre). - El 04 de febrero de 2024 el contratista entrega insumos para la elaboración de los informes de interventoría, del area SST (Enero).
ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL
Interventoría trabaja en la revisión del Plan de Manejo Ambiental volúmen 2, entregado por el contratista de obra. - El 25 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-045, interventoría solicita la subsanación de los anexos del PMA. - El 26 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-046, interventoría emite oficio de aprobación del PMA presentado por el contratista de obra.
ACTIVIDADES AREA FORESTAL
No se realizaron actividades del área forestal.
ACTIVIDADES AREA SOCIAL
El contratista de obra aún no ha hecho entrega del los insumos solicitados por interventoria el pasado 19 de enero de 2024, mediante oficio Int-Nechí-041.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S13-2024	Del	29/1/2024	al	4/02/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$	1.349.330.851	46,81%
Avance Financiero Ejecutado	$	182.350.038	6,33%
Anticipo	$	458.473.717	15,00%
Facturado	$	-	0,00%
Potencial de Facturación	-$	182.350.038	

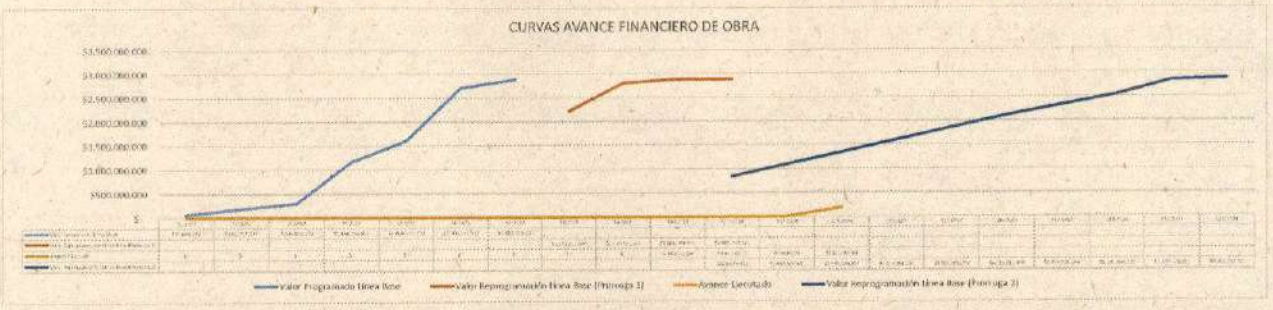

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$	3.056.491.448
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$	-
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)		
VALOR TOTAL PROYECTO	**$**	**3.056.491.448**

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%			Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 66.011.139			2,29%			$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 183.317.227			6,36%			$ -	0,00%	$ -
S3-2023	$ 299.814.579			10,40%			$ -	0,00%	$ -
S4-2023	$ 1.168.769.863			40,47%			$ -	0,00%	$ -
S5-2023	$ 1.606.829.798			55,73%			$ -	0,00%	$ -
S6-2023	$ 2.706.199.657			93,88%			$ -	0,00%	$ -
S7-2023	$ 2.882.712.391			100,00%			$ -	0,00%	$ -
S8-2023		$ 2.213.701.840			76,79%		$ -	0,00%	$ -
S9-2024		$ 2.799.361.934			97,11%		$ -	0,00%	$ -
S10-2024		$ 2.881.584.691			99,96%		$ 342.090,00	0,01%	$ -
S11-2024		$ 2.882.712.391	$ 841.670.432		100,00%	29,20%	$ 664.180,00	0,02%	$ -
S12-2024			$ 1.095.500.641			38,00%	$ 1.049.076	0,04%	$ -
S13-2024			$ 1.349.330.851			46,81%	$ 182.350.038	6,33%	$ -
S14-2024			$ 1.603.161.060			55,61%			
S15-2024			$ 1.858.991.269			64,42%			
S16-2024			$ 2.110.821.478			73,22%			
S17-2024			$ 2.326.586.069			80,7%			
S18-2024			$ 2.541.899.581			88,2%			
S19-2024			$ 2.849.740.661			98,9%			
S20-2024			$ 2.882.712.391			100,0%			


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S13-2024	Del	29/1/2024	al	4/2/2024

RESUMEN GRAFICO - AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance Financiero Programado	$ 107.064.112	20,00%
Avance Financiero Ejecutado	$ 104.756.617	19,57%
Anticipo	$ -	0,00%
Facturado	$ -	0,00%
Potencial de Facturación	$ 104.756.617	

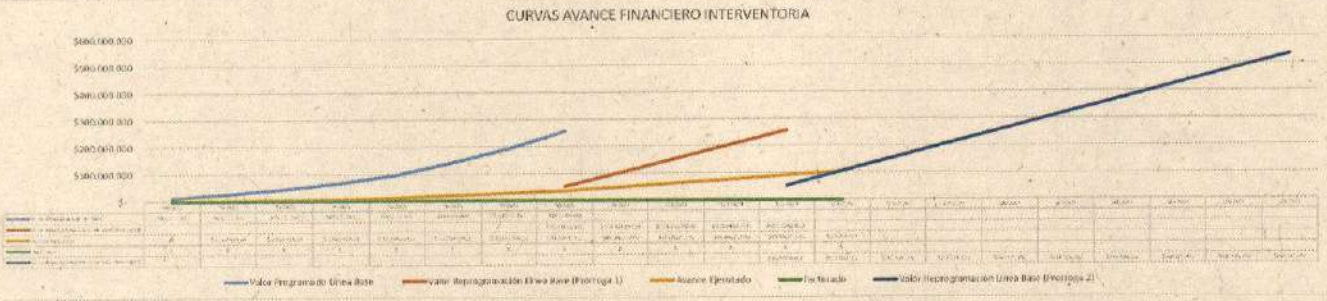

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 257.054.643
VALOR ADICIONAL POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ 278.265.919
VALOR DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O MENORES CANTIDADES EN LOS ITEMS CONTRACTUALES	$ -
VALOR POR PROYECCION DE NUEVAS OBRAS (OBRAS EXTRAS)	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 535.320.562**

SEGUIMIENTO CURVA S

				Atraso >= 5%	Atraso >=.5%		Atraso < 5%	Adelanto < 5%	Adelanto >= 5%
Semana	Valor Programado Linea Base	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 1)	Valor Reprogramación Linea Base (Prorroga 2)	% Programado	% Reprogramado (Prorroga 1)	% Reprogramado (Prorroga 2)	Avance Ejecutado	% Ejecutado	Facturado
S1-2023	$ 12.000.000			4,67%			$ -	0,00%	$ -
S2-2023	$ 27.000.000			10,50%			$ 1.167.899,00	0,45%	$ -
S3-2023	$ 45.000.000			17,51%			$ 2.335.798,00	0,91%	$ -
S4-2023	$ 67.000.000			26,06%			$ 3.503.697,00	1,36%	$ -
S5-2023	$ 97.000.000			37,74%			$ 11.318.927,00	4,40%	$ -
S6-2023	$ 144.000.000			56,02%			$ 19.130.157,00	7,44%	$ -
S7-2023	$ 194.000.000	-		75,47%			$ 26.943.387,00	10,48%	$ -
S8-2023	$ 257.054.643	$ 51.410.928,60		100,00%	20,00%		$ 34.756.617,00	13,52%	$ -
S9-2024		$ 102.821.857,20			40,00%		$ 48.506.617,00	18,87%	$ -
S10-2024		$ 154.232.785,80			60,00%		$ 62.256.617,00	24,22%	$ -
S11-2024		$ 205.643.714,40			80,00%		$ 76.006.617,00	29,57%	$ -
S12-2024		$ 257.054.643,00	$ 53.532.056,20		100,00%	10,00%	$ 89.756.617,00	16,77%	$ -
S13-2024			$ 107.064.112			20,00%	$ 104.756.617	19,57%	$ -
S14-2024			$ 160.596.169			30,00%			
S15-2024			$ 214.128.225			40,00%			
S16-2024			$ 267.660.281			50,00%			
S17-2024			$ 321.192.337			60,00%			
S18-2024			$ 374.724.393			70,00%			
S19-2024			$ 428.256.450			80,00%			
S20-2024			$ 481.788.506			90,00%			
S21-2024			$ 535.320.562			100,00%			

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - EMPLEABILIDAD

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana	S13-2024	Del	29/1/2024	al	4/2/2024


	Gobernación	Contratista Interventoría	Contratista Obra	Subcontratistas	Total	Incidencia Total
Ingresos	0	6	14	0	20	
Profesionales		4	4		8	40,0%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	8		8	40,0%
Administrativos		2	2		4	20,0%
Retiros	0	0	0	0	0	
Profesionales		0	0		0	
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	0		0	
Administrativos		0	0		0	
Activos	0	6	14	0	20	
Profesionales		4	4		8	40,0%
Tecnólogos		0	0		0	
Operativos		0	8		8	40,0%
Administrativos		2	2		4	20,0%
Caracterización						
Hombres		4	12		16	80,0%
Mujeres		2	2		4	20,0%
Primer Empleo		0	0		0	
Discapacitado		0	0		0	
Indígenas		0	0		0	
LGTBI		0	0		0	
Afrodescendiente		0	0		0	
Localización		6	14			
De la Subregión		2	11		13	65,0%
De Antioquia		2	3		5	25,0%
Fuera de Antioquia		2	0		2	10,0%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaria De Infraestructura Física
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


Semana: S13-2024 Del: 29/1/2024 al: 4/2/2024

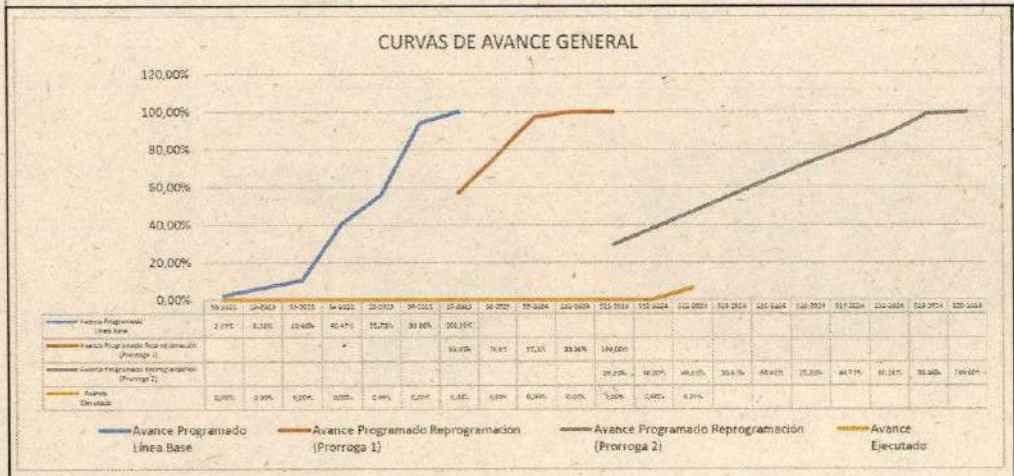

Avance Físico	Semana	Acumulado	
Avance Programado	8,81%	46,81%	
Avance Ejecutado	6,27%	6,27%	-40,53%
Plazo transcurrido	4,44%	88 días	
Fin Proyectado	21/3/2024		

Estructura Pavimento K13+725 - K12+630		Total	Ejecutado	Avance
Carpeta asfáltica	10 cm	1,00 Km	0,000 Km	0%
Base Gran.	15 cm	1,00 Km	0,000 Km	0%

Obras varias	Total	Ejecutado	Avance
Alcantarillas	0	0,0	
Box Coulverts	3	0,0	0%
Puentes	0	0,0	
Muros	0	0,0	

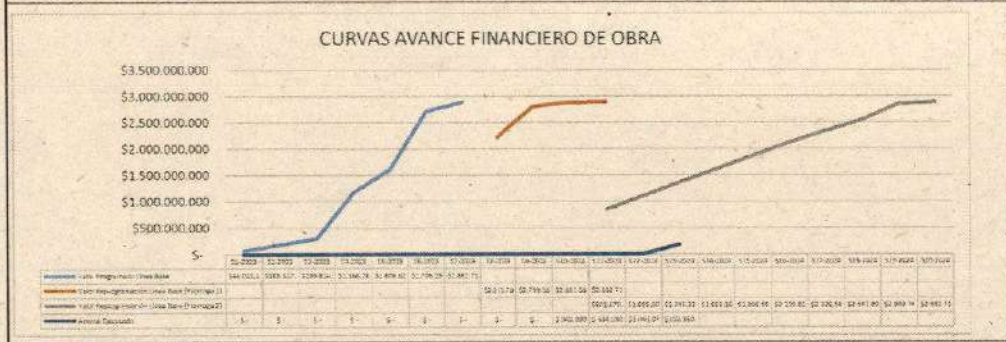

Avance Financiero Obra

Avance Financ. Program.	$	1.349.330.851	46,81%
Avance Financ. Ejecut.	$	182.350.038	6,33%
Desviación	-$	1.166.980.813	-40,48%
Facturado	$	-	0,0%
Balance Financiero			Año suscripción

Valor Inicial	$	3.056.491.448,00	2634,91	2023
Adición 1	$	-	0,00 SMMLV	2024
Adición 2			0,00 SMMLV	
Valor Total	$	3.056.491.448	+ 0 %	
Valor Proyect.	$	3.056.491.448		
Análisis financiero en SM				


Gran total a adicionar	$	1.528.245.724,00	1.317,45	0,5
Gran total adicionado	$	-	0,00 SMMLV	0,00%
Disponible para el 50% V.I.C.	$	1.528.245.724	1.175,57 SMMLV	44,62%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría De Infraestructura Física
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y App
INFORME SEMANAL - CUADRO DE MANDO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 CAUCASIA) -COLORADO NECHI EN LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Semana S13-2024 Del 29/1/2024 al 4/2/2024

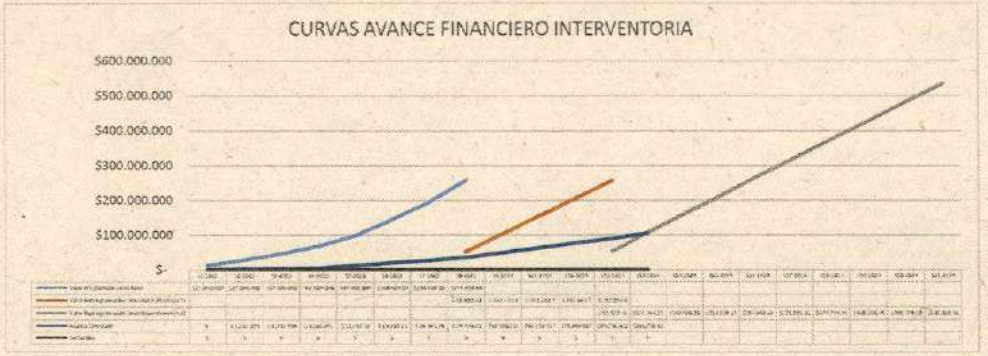



Avance Financiero				
Avance Financ. Program.	$		107.064.112	20,00%
Avance Financ. Ejecut.	$		104.756.617	19,57%
Desviación	-$		2.307.495	-0,43%
Facturado	$		-	0,00%
Plazo transcurrido		61,11%	88 días	
Fin Proyectado		30/3/2024		

Balance Financiero				Año suscripción
Valor Inicial	$	257.054.643	221,60 SMMLV	2023
Adición	$	278.265.919	214,05 SMMLV	2024
Valor Total	$	535.320.562	+ 96,59 %	
Valor Proyect.	$	535.320.562		

Análisis financiero en SMML				
Gran total a adicionar	$	-	110,80 SMMLV	50,00%
Gran total adicionado	$	278.265.919	214,05 SMMLV	96,59%
Disponible para el 50% V.I.C.	-$	278.265.919	-214,05 SMMLV	-96,59%



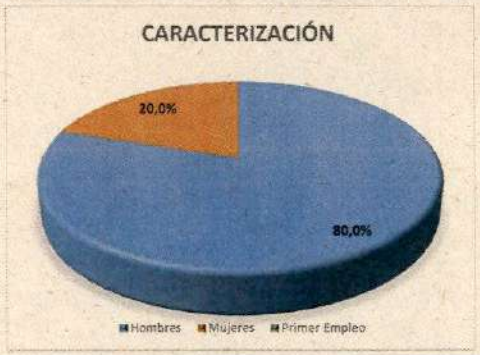

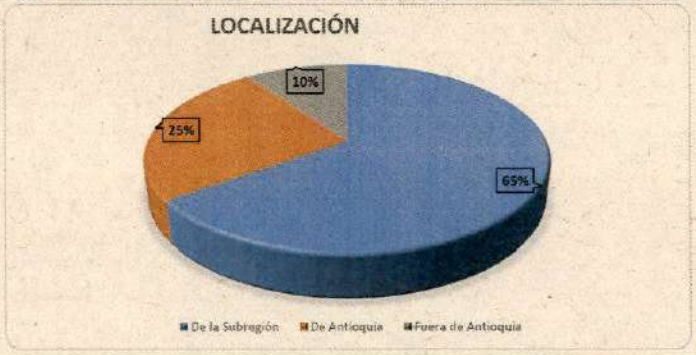

BITÁCORA ENERO 2024

· Viernes 22 dic/23.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social.
1 ayudante de obra.
1 Topógrafo, 1 cadenero.
Actividades = No hay ejecución de actividades de obra.

Juan Sanchez
Res. interventoría.

· Sábado 30 dic/23.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 Arquitecto Social.
1 ayudante de obra General.
1 Topógrafo.
Actividades = No hay ejecución de actividades
El contratista se compromete a
por medio de comité técnico
central, fecha reiniciar obras el 10
de enero con el suministro de material
faltante.

Juan Sanchez.
Res. interventoría

· Martes 2 enero /24.
Personal de obra = No hay presencia de personal
de obra
Estado del tiempo = Seco
Maquinaria y equipos = no hay maquinaria en campo
y tampoco equipos y materiales
instalados en campo.
Actividades = No hay ejecución de actividades
en la obra

Juan Sanchez
Res. interventoría

· Miércoles 3 enero /24.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social
1 ayudante General de obra
1 Topógrafo
Actividades = No hay ejecución de actividades.
Se incumple con lo pactado en comité
de obra inicio de ejecución a partir del
2 enero /24.

Juan Sanchez
Res. interventoría

· Jueves 4 enero /24.
· Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social
1 Topógrafo
1 ayudante General de obra.
Actividades = No hay ejecución de actividades de obra
Maquinaria y equipos = no hay maquinaria en funcionamiento
en obra.

Juan Sanchez.
Res. interventoría

· Viernes 5 enero /24.
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social
1 Topógrafo
1 ayudante de obra General.
Actividades = No hay ejecución de actividades
en la obra.
Estado del tiempo = Seco.
Maquinaria y equipos = No hay funcionamiento de
maquinaria y equipos en la obra

Juan Sanchez.
Res. interventoría

. Sabado 6 enero /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra.
1 trabajador Social.
1 Topógrafo
1 ayudante General de la obra.
actividades = No hubo ejecución de actividades.
en la obra
maquinaria y equipo = No hay funcionamiento de maq.
en la obra.

Juan Sanz
Res. obra intervención.

. Lunes 8 enero /24.
Estado del tiempo = Seco.
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social.
1 Topógrafo
1 ayudante de obra General.
actividades. No hay ejecución de actividades en la obra.

Juan Sanz
Res intervención.

- martes 9 enero /24.
Estado del tiempo = Seco.
Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social.
1 Topógrafo
1 ayudante de obra General.
actividades = aun no hubo ejecución de las actividades programadas para la obra.
maquinaria y equipo = No hubo funcionamiento de maquinaria y equipo en la obra

Juan Sanz
Res intervención

- miércoles 10 enero /24.
Estado del tiempo = Seco
personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trab. Social
1 ayudante obra
actividades = no hubo actividades en obra.

Juan Sanz
Res. intervención

- Jueves 11 ene /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = no hubo presencia del personal de obra
actividades = No hubo ejecución de actividades

Juan Sanz
Res. intervención

- Viernes 12 ene /24.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux técnico de obra
1 trab. Social
1 ayudante General de obra
maquinaria y equipo = 1 vibro compactador
1 volqueta
Excavadora.
actividades = Suministro de material seleccionado subbase para la obra.
actividades en conjunto con interventoría y el chofer topógrafo de los diseños incluidos de la pos. de antioquia.

Juan Sanz
Res. interventoría

- Sabado 13 ene /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador Social

1 Auxiliar de obra Geral
1 Topógrafo, 1 Cadenero.

material y efectivo = 1 vallas
1 libro comprobante
1 Pulverizador.

Actividad = Se realiza Suministro de material Sub base en Sitio.
Se continua con actividades topo. Juntas para chequear los diseños iniciales.

Jair Sant
Res Interino

- Lunes 15 enero /24
personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabaj. social
1 auxiliar de obra General
1 Topógrafo, 1 cadenero

material y efectivo = 1 libro comprobante
3 vallas
1 Pulverizador.

actividad = Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base.
- Se continua con las actividades de topografía.
- Se evidencia en campo los terrenos en promedios de 150 mts aprox. de MDL existe dicha vía mucho colorado con poca variable en cuanto a costos, teniendo en cuenta los puntos de este distrito se evidencia a Jerman Llanos en la vía, el cual el transito es bien pesado, nos daria unos promedios de 2.60 mts a 2.80 m, lo cual se hace este aumento con el fin de que se disminuya este incremento de diseños iniciales, comparados con la realidad de la vía existente.

Jair Sant
Res. Instrumentador

- Martes 16 enero /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador social
1 auxiliar de obra General
1 Topógrafo, 1 cadenero
material y efectivo = 1 libro comprobante
3 vallas
1 Pulverizador
Actividades = Se continua con el Suministro de material seleccionado Sub base en Sitio.

Jair Sant
Res Instrumentador

- Miércoles 17 enero /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabaj. social
1 auxiliar de obra General
1 Topógrafo, 1 Cadenero
material y efectivo = Se tiene 1 libro comprobante
1 Pulverizador
3 vallas
actividad = Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base en sitio.
- Se continua con las Topografías en la obra.

Jair Sant
Res Instrumentador

- Jueves 18 ene /24
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador Social
1 aparejador de obra.
1 TOP, 1 cuidadora
medios de apoyo = 1 libro contabilidad
1 pulsister.
3 calculadoras.
actividades = Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base en sitio

Jaime Sanz
Res. obra

- Viernes 19 ene /24
Estado del tiempo = Seco.
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador Social
1 aparejador de obra
1 Topógrafo, 1 cuidadora
actividades = Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base en sitio
estado del tiempo = Seco.

Jaime Sanz.
Res. obra

Sabado 20 ene /24
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador social
1 aparejador de obra
1 TOP, 1 cuidadora.
med. y aux. apoyo = 1 libro contabilidad
1 pulsister
3 calculadoras.
actividades = con Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base en el Sitio

Jaime Sanz
Res. obra

/ /

- Lunes 22 ene /24.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux técnico de obra
1 trabajador Social
1 aparejador de obra
1 Topógrafo, 1 cuidadora
Actividades = Se continua el Suministro de material Seleccionado Sub base en el Sitio.
medios y apoyo = 1 pulsister
1 libro contabilidad
3 calculadoras

Jaime Sanz.
Res. obra

- Martes 23 en /24
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador Social
1 aparejador de obra
1 TOP, 1 cuidadora
medios y apoyo = 1 pulsister
1 libro contabilidad
4 calculadoras
actividades = Se continua con el Suministro de material Seleccionado Sub base en el Sitio.

Jaime Sanz
Res. obra

miércoles 24 enero /24.
Personal de obra = 1 aux técnico de obra
1 trabajador Social
1 aparejador de obra
1 TOP, 1 cuidadora
actividades = El contratista entrega el certificado de Suministro de material Subbase

y entrega los vocales ambientales.
- Estado del tiempo = Seco.

Jaime Sánchez
Res. Interventor

- Jueves 25 ene /24.
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajad. social
1 ayudante obra fluv
2 Topógrafos
Estado del tiempo = Seco
maquinaria y equipo = 1 Pajarita
1 libro Cornelio Saltor
4 colaboradores
actividades = Se continua con el suministro y acarreo y/o acopio de material seleccionado sub base en sitio.

Jaime Sánchez
Res. Interventor

- Viernes 26 ene /24.
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador social
1 ayudante de obra fluv
1 Topógrafo, 1 cadenero
Estado del tiempo = Seco.
maquinaria y equipo = 1 Pajarita
1 libro Cornelio Saltor
1 Motoniveladora
4 colaboradores
actividades = Se continua con el suministro de material seleccionado sub base en sitio.

Jaime Sánchez
Res. Interventor

- Lunes 29 enero /24.
Estado del tiempo = Seco.
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabaj. social.
1 ayudante de obra
1 Top., 1 cadenero.
maquinaria y equipo = 1 Pajarita
1 libro Cornelio Saltor
1 motoniveladora.
3 colaboradores.
Actividades = Se procede con la escarificación del terreno con motoniveladora para corte de rasante.
Se remite el acopio de material en sitio para los llenos.

Jaime Sánchez
Res. Interv.

Martes 30 Enero /24.
Estado del tiempo = Seco
Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabaj. Social
1 ayudante de obra
1 topógrafo.
maquinaria y equipo = 1 Pajarita
1 libro Cornelio Saltor
1 Motoniveladora
3 colaboradores.
actividades = Se continua con la escarificación de material existente para corte de rasante. con motoniveladora.

Jaime Sánchez
Res. Interventor

- m/os 31 enero /24.

Estado del tiempo = Seco

Personal de obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 Trabajador Social
1 ayudante de obra General
1 TOP-GRUA.

materiales y equipos = 1 pulidora
1 vibro compactador
1 motoniveladora
3 carretas

Actividades = Se continua con el saneo m/o descapotacion de material existente en la vía para corte de rasante.

Jairo Suarez
Res. interventoría

- Jueves 1 Feb /24.

Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador social
1 ayudante de obra
1 TOP.

mat. y equipos = 1 pulidora
1 vibro compactador
1 motoniveladora
3 carretas

Actividades = Se continua con la descapotación de material existente en la vía para Corte de rasante.
- Se continua con el acopio de arenilla de cerro para llenos.

Jairo Suarez
Res. Interventoría

- Viernes 2 Feb /24

Personal de obra = 1 aux. técnico de obra
1 trabajador Social
1 ayudante de obra
1 TOPOGRAFO.

materiales y equipos = 1 pulidora
1 motoniveladora
1 vibro compactador
3 carretas

Estado del tiempo = Seco

Actividades = Se continua con la descapotacion de material existente en la vía, para corte de rasante, conformacion con material Seleccionado, Geocelda, y compactacion.

Jairo Suarez
Res. interventoría.

- Sabado 3 Feb /24

Personal en obra = 1 auxiliar técnico de obra
1 trabajador Social
1 ayudante de obra
1 TOPOGRAFO.

materiales y equipos = 1 pulidora
1 motoniveladora
1 vibro compactador
3 carretas

actividades - Se continua con la descapotacion de material existente en la vía, para corte de rasante, Conformacion con material Seleccionado, Geocelda y compactacion.

Jairo Suarez
Res. interventoría

PLANILLAS SS CONTRATISTA DE OBRA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-08, 10:58:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 68781017

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 08/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO IC ING 15027		
Documento	NI901756732	**Dirección**	CL 43B #30 - 23
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3530993
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOPEZ ELEJALDE JORGE IVAN	**Identificación**	CC 1036396810
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001546595	LUIS FERNANDO CASTILLO BALDOVINO	01	00		X																0	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1001548256	LUISA FERNANDA PANTOJA RAVELO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1017174186	SIRLIS PAOLA VALDEZ ZABALA	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038436172	NATALIA HENRIQUEZ ZABALA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1038436033	FABIO MANUEL JIMENEZ ANAYA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038436039	DIANA MARCELA MORALES VERGARA	01	00		X																0	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 53.334	$ 8.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 53.334	$ 2.200	6,960	$ 53.334	$ 3.800	(CCF04) COMFAMA	$ 53.334	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 1152210444	ISABEL MEJIA HERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 52489486	PAOLA ANDREA ALMANZAR HENAO	01	00	X																	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 1.140.000	$ 182.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.140.000	$ 45.600	6,960	$ 1.140.000	$ 79.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
CC 71845659	JOHN JAIRO ROJAS MONSALVE	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 71721266	WILDEMAN FREDY GIRALDO DURANGO	01	00	X																	0	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 8051780	JADER ESTRADA CASTRO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8371997	JENNER ANTONIO CARDENAS CASTILLO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8373315	FRANC ALBERTO PASTRANA MONTES	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8373751	EDGAR HUMBERTO MONTALVO CABRERA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 98610966	DAYMAN EDYL SANCHEZ CORDOBA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.336.668	$ 20.336.668	$ 20.336.668	$ 20.336.668	$ 3.254.000	$ 813.600	$ 1.415.900	$ 813.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.297.100	$ 0	$ 6.297.100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811015828	9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICPB	CALLE 43B 3023	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	5432100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	374154015	9461030628	E	2024/01/09	2024/01/02	BANCOLOMBIA	0	$44,922,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ICPB (46 Afiliados)						$143,950,376	$23,292,300			$145,700,376	$5,829,600			$145,600,376	$5,825,600			$145,700,376	$9,974,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,100		$0	$0
1	CC	1036394019	GARCIA ARBELAEZ VIVIANA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (45 Afiliados)						$141,450,376	$22,892,300			$143,200,376	$5,729,600			$143,100,376	$5,725,600			$143,200,376	$9,961,400		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL Depto: ANTIOQUIA (45 Afiliados)						$141,450,376	$22,892,300			$143,200,376	$5,729,600			$143,100,376	$5,725,600			$143,200,376	$9,961,400		$0	$0
2	CC	1022394152	ACOSTA MOLINA MARIA CAMILA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
3	CC	39177359	ARANGO DAVILA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
4	CC	1128416582	ARROYAVE TORO NATALY	230201	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
5	CC	1017191388	BEDOYA RESTREPO RICARDO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC	18928839	FONSECA JALKH KADIR	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
7	PT	739493	FUENMAYOR DE BAGLIERI DIOMARY LISBE		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,000	$70,000	CCF04	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
8	CC	1001725604	GARCES OSPINA JUAN JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	103698074	GARCIA HINCAPIE ARTURO EMILIO	25-14	30	$1,750,000	$280,000	EPS010	30	$1,750,000	$70,000	CCF04	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
10	CC	1036964649	GIL GARCIA ANGIE CAROLINA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
11	CE	31430623	GIRALDO AGUDELO SANDRA MILENA	230301	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
12	CC	1026155481	GOMEZ HENAO JUAN CARLOS	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
13	CC	1094897448	GOMEZ QUINTERO MONICA LORENA	230201	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
14	CC	1040034880	GONZALEZ YEPES EDWIN ARLEY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1038416785	GUARIN GARCIA DAVID STIVEN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
16	CC	1041263097	GUTIERREZ CABALLERO CARLOS ALBERTO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1152216024	HERNANDEZ POSADA VALERIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
18	CC	1017170646	HERRERA SERRANO DIANA MARCELA	231001	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
19	CC	1020450615	JARAMILLO MARQUEZ SANTIAGO	230201	30	$6,041,684	$1,027,300	EPS010	30	$6,041,684	$241,700	CCF04	30	$6,041,684	$241,700	14-11	30	$6,041,684	$420,600	30	$0	$0
20	CC	1036396810	LOPEZ ELEJALDE JORGE IVAN	230201	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
21	CC	1152188559	MALDONADO LINARES RAFAEL	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS037	30	$1,750,000	$70,000	CCF04	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
22	CC	1038414575	MARIN GIRALDO ALEJANDRA	25-14	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
23	CC	1035226685	MARIN SANCHEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
24	CC	1039446564	MEDINA VERDEZA LUIS ALEJANDRO	231001	30	$4,893,764	$832,100	EPS010	30	$4,893,764	$195,800	CCF04	30	$4,893,764	$195,800	14-11	30	$4,893,764	$340,700	30	$0	$0
25	CC	39191951	MEJIA RAMIREZ LUISA FERNANDA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0

2024/01/09 11:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	43046458	MUNERA HENAO AMALIA	25-14	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
27	CC	15441458	MUÑOZ MARTINEZ GABRIEL ANGEL	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
28	CC	1110590945	OSPINA OSPINA DANIEL	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
29	CC	1042064081	OSPINA PEREZ LEIDY ESTEFANIA	230301	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
30	CC	1090374516	OSSA JIMENEZ YESENIA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
31	CC	1036395908	PEREZ MIRA VIVIANA	230301	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
32	CC	1110590520	QUEVEDO BRIÑEZ LUISA FERNANDA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
33	CC	1036398254	QUINTERO GIRALDO MARY LUZ	230201	16	$960,000	$153,600	EPS010	16	$960,000	$38,400	CCF04	16	$960,000	$38,400	14-11	16	$960,000	$66,900	16	$0	$0
34	CC	1020478842	RAMIREZ TORRES SEBASTIANN	230201	16	$800,000	$128,000	EPS002	16	$800,000	$32,000	CCF04	16	$800,000	$32,000	14-11	16	$800,000	$55,700	16	$0	$0
35	CC	1020478842	RAMIREZ TORRES SEBASTIANN	230201	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF04	2	$0	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
36	CC	1038415998	ROBLEDO MARIN JUAN DAVID	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
37	CC	1017199571	ROJAS URAN ADRIANA	230201	30	$4,893,764	$832,100	EPS010	30	$4,893,764	$195,800	CCF04	30	$4,893,764	$195,800	14-11	30	$4,893,764	$340,700	30	$0	$0
38	CC	70414141	SANCHEZ CADAVID JULIO CESAR	25-14	30	$2,105,583	$336,900	EPS010	30	$2,105,583	$84,300	CCF04	30	$2,105,583	$84,300	14-11	30	$2,105,583	$146,600	30	$0	$0
39	CC	43201078	SOLANO ANGEL LINA MARIA	230201	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
40	CC	1214720760	SOTO HENAO JUAN SEBASTIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
41	CC	98687150	TORO COTOA LUIS ALFONSO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
42	CC	71755842	VALENCIA GARCIA RICARDO	230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF04	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
43	CC	80253466	YELA GALINDO JOHN JAIRO	230301	30	$2,718,758	$435,100	EPS010	30	$2,718,758	$108,800	CCF04	30	$2,718,758	$108,800	14-11	30	$2,718,758	$189,300	30	$0	$0
44	CC	1067917257	YELASQUEZ POVEDA GERMAN DAVID	230201	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
45	CC	79478565	VICTORIA NIÑO MAURICIO JAVIER	25-14	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
46	CC	1152446877	YILLA LLANO DANIEL ANDRES	230301	30	$4,350,012	$696,100	EPS010	30	$4,350,012	$174,100	CCF04	30	$4,350,012	$174,100	14-11	30	$4,350,012	$302,800	30	$0	$0
47	CC	70554636	ZAPATA VELEZ JORGE JAIRO	230201	16	$2,666,667	$426,700	EPS010	16	$2,666,667	$106,700	CCF04	16	$2,666,667	$106,700	14-11	16	$2,666,667	$185,700	16	$0	$0
Total	**Afiliados(46)**					**$143,950,376**	**$23,292,300**			**$145,700,376**	**$5,829,600**			**$145,600,376**	**$5,825,600**			**$145,700,376**	**$9,974,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811015828	9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BAENA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICPB	CALLE 43B 3023	EL CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA	5432100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	374154015	9461030628	E	2024/01/09	2024/01/02	BANCOLOMBIA	0	$44,922,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$23,292,300	$0	$0	$23,292,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,528,200	$0	$0	$1,528,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,217,200	$0	$0	$5,217,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$8,389,600	$0	$0	$8,389,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$8,157,300	$0	$0	$8,157,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$9,974,500	$0	$0	$9,974,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$9,974,500	$0	$0	$9,974,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$5,825,600	$0	$0	$5,825,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	46	$5,825,600	$0	$0	$5,825,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				46	$5,829,600	$0	$0	$5,829,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	$5,351,600	$0	$0	$5,351,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$262,000	$0	$0	$262,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$216,000	$0	$0	$216,000
TOTAL				46	$44,922,000	$0	$0	$44,922,000

2024/01/09 11:18 AM

PÓLIZAS DE INTERVENTORIA

PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051578	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	10	2023	13	10	2023	00:00	25	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 12 NO 5 07 OF 302		NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	NIT: 890.900.286-0

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106		MEDELLIN, ANTIOQUIA	3839761

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/10/2023	25/06/2024	$51,410,930.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/10/2023	25/12/2026	$77,116,395.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2023	25/12/2028	$51,410,930.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,134,794.00	$ ******20,000.00	$ *****219,410.00	$ *********1,374,205.00	$ ******179,938,255.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051578

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	10	2023	13	10	2023	00:00	25	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	NIT: 890.900.286-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NIT 891.101.100-5 Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,440.00	$ *******3,000.00	$ ******19,083.00	$ **********119,523.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	10	2023	13	10	2023	00:00	25	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5	
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO:	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0	
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2023	25/12/2023	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA SEGÚN ACTA DE INICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051578	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	11	2023	00:00	20	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO: 8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO 3839761

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/11/2023	21/07/2024	$51,410,930.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/11/2023	20/01/2027	$77,116,395.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2024	20/01/2029	$51,410,930.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 08/11/2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,134,794.00	$ ******20,000.00	$ *****219,410.00	$ *********1,374,205.00	$ ******179,838,255.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051578

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051578	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	11	2023	00:00	20	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5	
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO:	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0	
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	3839761

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051578

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113269A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	11	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO: 8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO 3839761
BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NIT 891.101.100-5 Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 08/11/2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,440.00	$ *******3,000.00	$ ******19,083.00	$ **********119,523.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	11	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5	
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO:	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0	
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	20/01/2024	$232,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113269A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

97

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	11	2023	00:00	20	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5	
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0	
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA SEGÚN PRORROGA No.1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	01	2024	08	11	2023	00:00	25	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	NIT: 890.900.286-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NIT 891.101.100-5 Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA NIT 890.900.286-0

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

DE ACUERDO CON LA MODIFICACION CONTRACTUAL: PRORROGA 1 DE FECHA 22/12/2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4600016527, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN TREINTA Y SEIS (36) DIAS; LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******48,052.00	$ *******3,000.00	$ *******9,699.00	$ **********60,752.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MULTISEGUROS' DEL SUR LTDA	113269	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	01	2024	08	11	2023	00:00	25	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5	CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	NIT: 890.900.286-0	CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	25/02/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

nLF113269A 2

99

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018765	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	01	2024	08	11	2023	00:00	25	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELEFONO:**	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	3839761

BENEFICIARIO: 890900286 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018765

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051578	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	01	2024	08	11	2023	00:00	20	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	NIT: 891.101.100-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NO 5 07 OF 302	NEIVA, HUILA	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	NIT: 890.900.286-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3839761

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 4600016527 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) - COLORADO - NECHI, EN LA SUBREGION BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CALIDAD DEL SERVICIO: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/11/2023	26/08/2024	$51,410,930.00	$51,410,930.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/11/2023	25/02/2027	$77,116,395.00	$77,116,395.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2024	20/01/2029	$51,410,930.00	

ACLARACIONES

DE ACUERDO CON LA MODIFICACION CONTRACTUAL: PRORROGA 1 DE FECHA 22/12/2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4600016527, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN TREINTA Y SEIS (36) DIAS; LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******26,621.00	$ *******8,000.00	$ *******6,577.00	$ **********41,198.00	$ ******179,938,255.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051578

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

100

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051578	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	01	2024	08	11	2023	00:00	20	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA		NIT: 891.101.100-5
DIRECCIÓN: CL 12 NO 5 07 OF 302	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8711910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		NIT: 890.900.286-0
DIRECCIÓN: CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL CALLE 42B NO. 52-106	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	3839761

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051578

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENERO 2024					
REMITENTE	DESTINATARIO	FECHA ENVÍO	FECHA RECIBO	ASUNTO	CONSECUTIVO
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		4/01/2024	Balance del contrato No. 4600016588 DE 2023	ICING-008-2023
CONSORCIO IC-ING 15028	SOTA		4/01/2024	Solicitud prórroga, adición de Presupuesto e inclusión de fórmula de reajuste al contrato No. 4600016588 DE 2023	ICING-009-2023
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	4/01/2024		Solicitud inicio de trámite para prórroga del contrato de obra No. 4600016558	Int-Nechí-030
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	4/01/2024		Reiteración solicitud de pólizas actualizadas contrato de obra No. 4600016558	Int-Nechí-031
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	4/12/2023		Invitación a comité de obra presencial	Int-Nechí-032
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		5/01/2024	Solicitud prórroga al contrato No. 4600016588 DE 2023	ICING-011-2024
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	5/01/2024		Concepto de interventoria a oficio ICING_011_2023 con asunto solicitud de prorroga	Int-Nechí-033
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		5/01/2024	Acta de obra No. 1 del contrato No. 4600016588 DE 2023	ICING-012-2024
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		5/01/2024	Alcance comunicado ICING-008-2024 Balance del contrato No. 4600016588 DE 2023 del 2 de enero de 2024	ICING-010-2024
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	12/01/2024		Solicitud de informacion de actividades realizadas en el componente de gestion social	Int-Nechí-035
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	15/01/2024		Requerimiento seguridad y salud en el trabajo	Int-Nechí-036
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	17/01/2024		Observaciones al Plan de Gestion Social	Int-Nechí-037
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	17/01/2024		Solicitud del certificado de consulta ICANH	Int-Nechí-038
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	18/01/2024		Respuesta a documento ICING-006-2023 – Plan de Gerencia	Int-Nechí-039
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	18/01/2024		Documentos aprobados, requeridos en físico para firma y entrega a la entidad.	Int-Nechí-040

CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		18/01/2024	Plan de contingencia a la prórroga 2 del contrato No. 4600016588 DE 2023	ICING-013-2024
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	19/01/2024		Solicitud insumos del componente de gestión ambiental, social y SST	Int-Nechí-041
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	19/01/2024		Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales	Int-Nechí-042
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	19/01/2024		Revisión acta parcial de obra No. 1	Int-Nechí-043
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	19/01/2024		Concepto hojas de vida personal contrato de obra	Int-Nechí-044
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		20/01/2024	Definición alcance de metas físicas del contrato No. 4600016588 de 2023	ICING-014-2024
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		22/01/2024	Respuesta a Oficio Int-Nechi-036	ICING-015-2024
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	25/01/2024		Solicitud subsanación anexos PMA	Int-Nechí-045
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	26/01/2024		Aprobación Plan De Manejo Ambiental – Contrato de la referencia	Int-Nechí-046
CONSORCIO IC-ING 15027	SOTA		26/01/2024	Reiteración para la definición del alcance de metas físicas del contrato No. 4600016588 de 2023	ICING-016-2024
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	27/01/2024		Concepto hojas de vida personal contrato de obra.	Int-Nechí-047
SOTA	CONSORCIO IC-ING 15027	27/01/2024		Respuesta a oficio No. 2024030017224 – Radicación insumos de obra e interventoría	Int-Nechí-048
NSORCIO IC-ING 15027	SOTA		29/12/2023	Insumos para informe correspondiente a noviembre 2023 - SST	ICING-017-2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ENERO 2024

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 de enero de 2024	a	31 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC-ING15027		
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CAMPO ALEGRE (RUTA 25-CAUCASIA) COLORADO-NECHI, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		




Acopio de material sub base en sitio



Acopio de material sub base en sitio



Material geocelda en centro de acopio

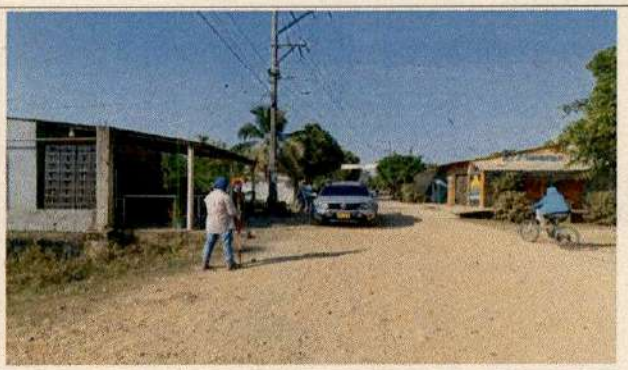

Actividades de topografia por parte de la interventoria




Acopio de material sub base en sitio



Acopio de material sub base en sitio

TOPOGRAFÍA OBRA
ENERO 2024

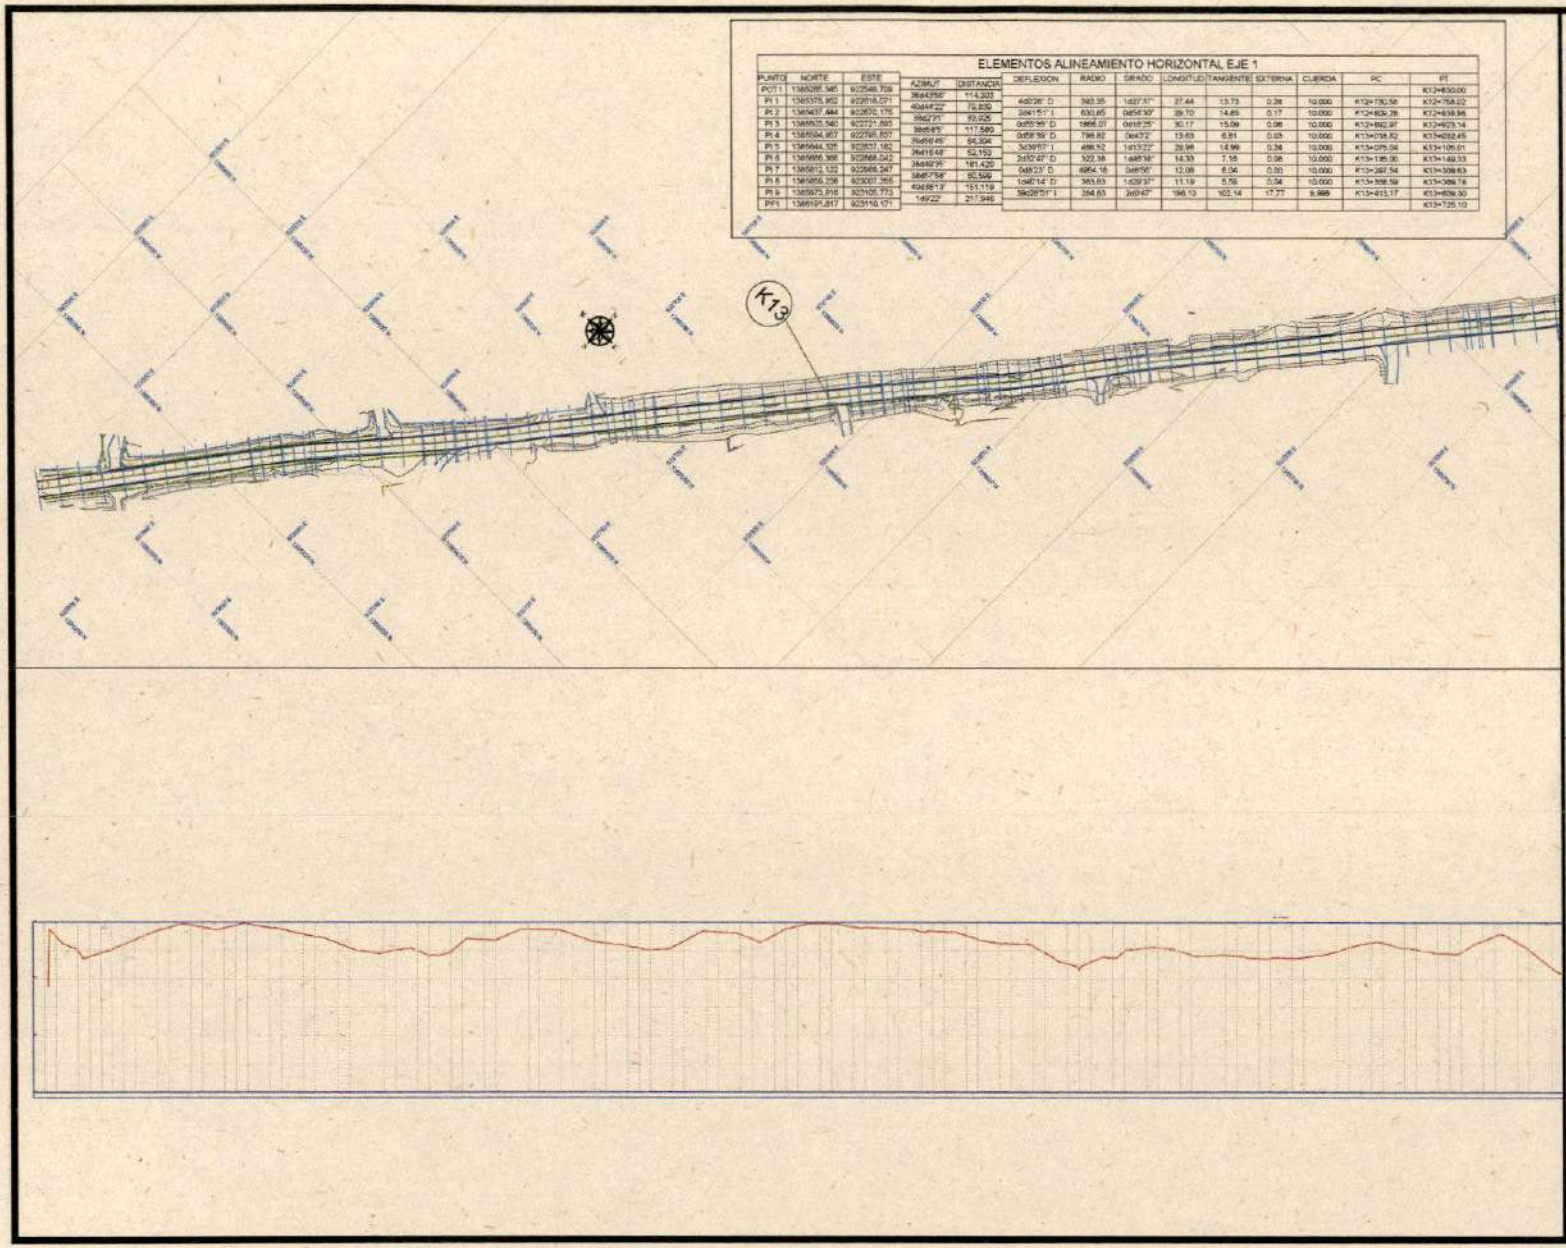

ELEMENTOS ALINEAMIENTO HORIZONTAL EJE 1

PUNTO	NORTE	ESTE	AZIMUT	DISTANCIA	DEFLEXION	RADIO	GRADO	LONGITUD	TANGENTE	EXTERNA	CUERDA	PC	PT
POT 1	1365287,345	922546,708	36d43'56"	114,203									K12+630,00
PI 1	1365375,952	922616,071	40d44'22"	79,809	4d03'26" D	582,35	1d27'37"	27,44	13,73	0,28	10,000	K12+730,58	K12+758,02
PI 2	1365437,444	922670,175	36d41'51" I	82,025	3d41'51" I	630,65	0d54'30"	29,70	14,85	0,17	10,000	K12+836,28	K12+866,98
PI 3	1365520,340	922721,595	0d55'55" D	117,580	0d55'55" D	1966,07	0d16'25"	30,17	15,09	0,06	10,000	K12+902,97	K12+933,14
PI 4	1365594,957	922781,837	0d58'39" D	95,304	0d58'39" D	798,82	0d43'2"	13,63	6,81	0,03	10,000	K13+058,82	K13+072,45
PI 5	1365644,325	922837,182	2d49'45" I	54,152	3d39'57" I	488,52	1d13'22"	29,98	14,99	0,38	10,000	K13+075,04	K13+105,01
PI 6	1365686,368	922868,042	3d44'29"	181,420	2d02'47" D	322,38	1d46'16"	14,33	7,16	0,08	10,000	K13+135,00	K13+149,33
PI 7	1365812,122	922868,247	3d46'58"	80,599	0d8'23" D	6864,16	0d6'56"	12,08	6,04	0,00	10,000	K13+287,54	K13+309,63
PI 8	1365858,258	923007,368	45d38'13"	151,119	1d46'14" D	383,63	1d29'37"	11,19	5,59	0,04	10,000	K13+358,59	K13+369,78
PI 9	1365973,816	923105,773	39d28'01" I	217,946	39d28'01" I	284,63	20d43"	196,13	102,14	17,77	9,999	K13+413,17	K13+609,30
PF1	1366191,817	923110,171	1d9'22"										K13+725,10

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- Vértice de poligonal
- Vértice de poligonal de apoyo
- Poligonal
- Poligonal de apoyo

NOTAS

- Sistema de coordenadas '(referenciadas)
- Norte '(magnetico - astronomico)
- Banco de nivel '(referenciado)
- Otras

ESCALA GRÁFICA


PARAMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICO		
Parametro	Unidad	Valor
Tipo Carretera		Secundaria
Tipo de Terreno		Plano
Velocidad Diseño	Km/h	40
Ancho Calzada	M	6.0 + sobreancho
Berma Cuneta a ambos lados	M	1
Ancho Total	M	8
Numero Carriles		2
Ancho Carril	M	3
Bombeo Normal Calzada	%	3% al centro
Radio Mínimo	M	21
Peralte Máximo	%	6
Pendiente Mínima	%	5%
Longitud Mínima Curva Vertical	M	30
K min Concava	m%	62
K min Convexa	m%	43
Distancia mínima entre PI Verticales	M	40 a 80


Plano:	Clave:
01 DE 02	NECHI

Plano: PLANTA-PERFIL
KM12+630.00 A KM13+340.00

Ubicación: DIRECCIÓN FÍSICA DE LA POLIGONAL

Dibujó:	Revisó:
ELABORÓ	REVISÓ
Fecha: 28 de noviembre de 2023	Escala: 1:1,000 - ARCH D (36x24)

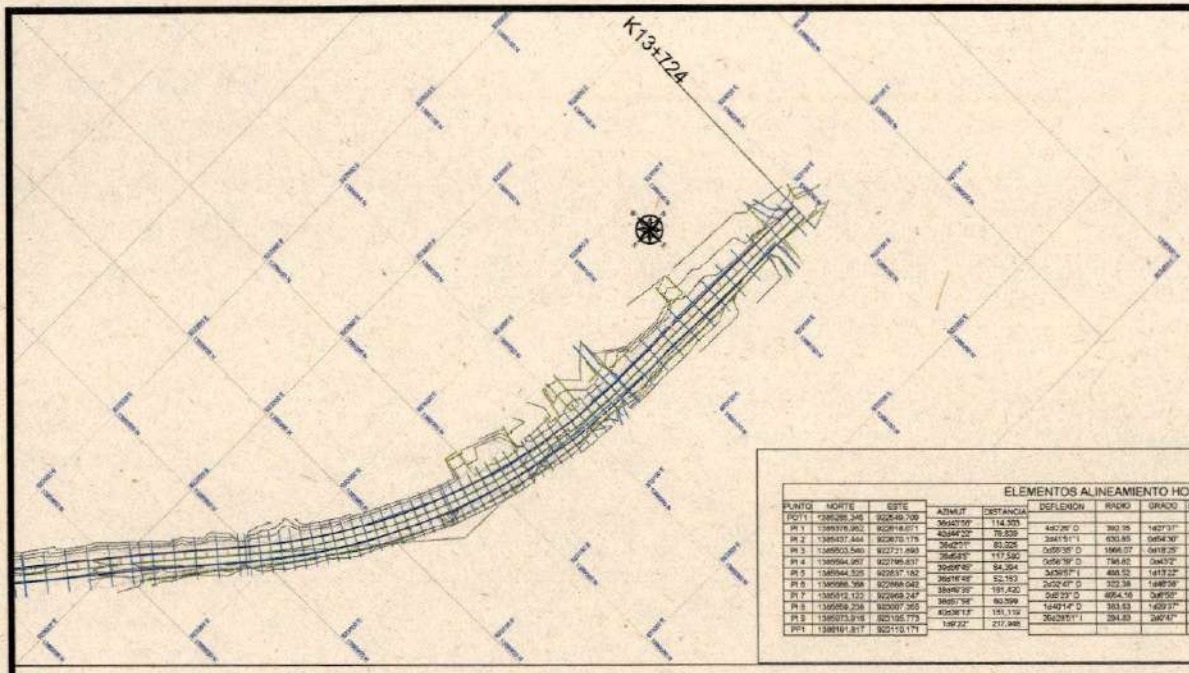



ELEMENTOS ALINEAMIENTO HORIZONTAL EJE 1

PUNTO	NORTE	ESTE	AZIMUT	DISTANCIA	DEFLEXION	RADIO	GRADO	LONGITUD	TANGENTE	EXTERNA	CUERDA		PC	PT
POT1	1385288.346	922549.709	35d42'55"	114.305										K12+630.00
PI 1	1385376.962	922616.671	40d44'29"	78.539	4d42'26" D	392.95	14d37'31"	27.44	13.73	0.26	10.000	K13+730.58	K13+758.02	
PI 2	1385457.444	922670.175	35d25'51"	83.325	5d41'51" I	630.85	9d54'30"	29.70	14.85	0.17	10.000	K13+809.26	K12+838.96	
PI 3	1385503.540	922721.893	75d58'5"	117.580	0d59'35" D	1966.07	0d18'25"	30.17	15.09	0.06	10.000	K12+892.97	K12+923.14	
PI 4	1385564.267	922795.617	30d04'45"	84.364	0d56'59" D	798.60	0d43'2"	13.60	6.81	0.05	10.000	K13+316.82	K13+330.45	
PI 5	1385644.525	922837.182	35d16'48"	52.153	3d39'57" I	466.52	1d13'22"	29.98	14.99	0.24	10.000	K13+575.04	K13+135.01	
PI 6	1385686.358	922868.042	38d46'39"	191.620	2d32'47" D	372.38	1d46'58"	14.93	7.46	0.08	10.000	K13+135.00	K13+149.93	
PI 7	1385812.123	922968.247	38d57'36"	80.599	0d8'23" D	4054.16	0d6'55"	12.06	6.04	0.00	10.000	K13+287.54	K13+299.63	
PI 8	1385859.236	923007.365	40d36'13"	151.119	1d40'14" D	383.53	1d29'37"	11.19	5.59	0.04	10.000	K13+358.50	K13+369.78	
PI 9	1385973.918	923105.773	19d7'22"	217.948	36d28'51" I	284.83	20d7'4"	196.13	102.14	17.77	9.999	K13+413.17	K13+609.30	
PF1	1386161.817	923113.173												K13+725.10

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- Vértice de poligonal
- Vértice de poligonal de apoyo
- Poligonal
- Poligonal de apoyo

NOTAS

- Sistema de coordenadas '(referenciadas)
- Norte '(megnetico - astronomico)
- Banco de nivel '(referenciado)
- Otras

ESCALA GRÁFICA


PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO		
Parámetro	Unidad	Valor
Tipo Carretera		Secundaria
Tipo de Terreno		Plano
Velocidad Diseño	Km/h	40
Ancho Calzada	M	6.0 + sobreancho
Berma Cuneta a ambos lados	M	1
Ancho Total	M	8
Numero Carriles		2
Ancho Carril	M	3
Bombeo Normal Calzada	%	3% al centro
Radio Mínimo	M	21
Peralte Maximo	%	6
Pendiente Máxima	%	5%
Longitud Mínima Curva Vertical	M	30
K min Cóncava	m%	6
K min Convexa	m%	4
Distancia mínima entre PI Verticales	M	40 a 80

Plano:	Clave:
02 DE 02	NECHI

PLANTA-PERFIL
KM13+340.00 A KM13+725.11

Ubicación:
DIRECCIÓN FÍSICA DE LA POLIGONAL

Dibujó:	Revisó:
ELABORÓ	REVISO
Fecha: 26 de noviembre de 2023	Escala: 1:1.000 - ARCH D [36x24]

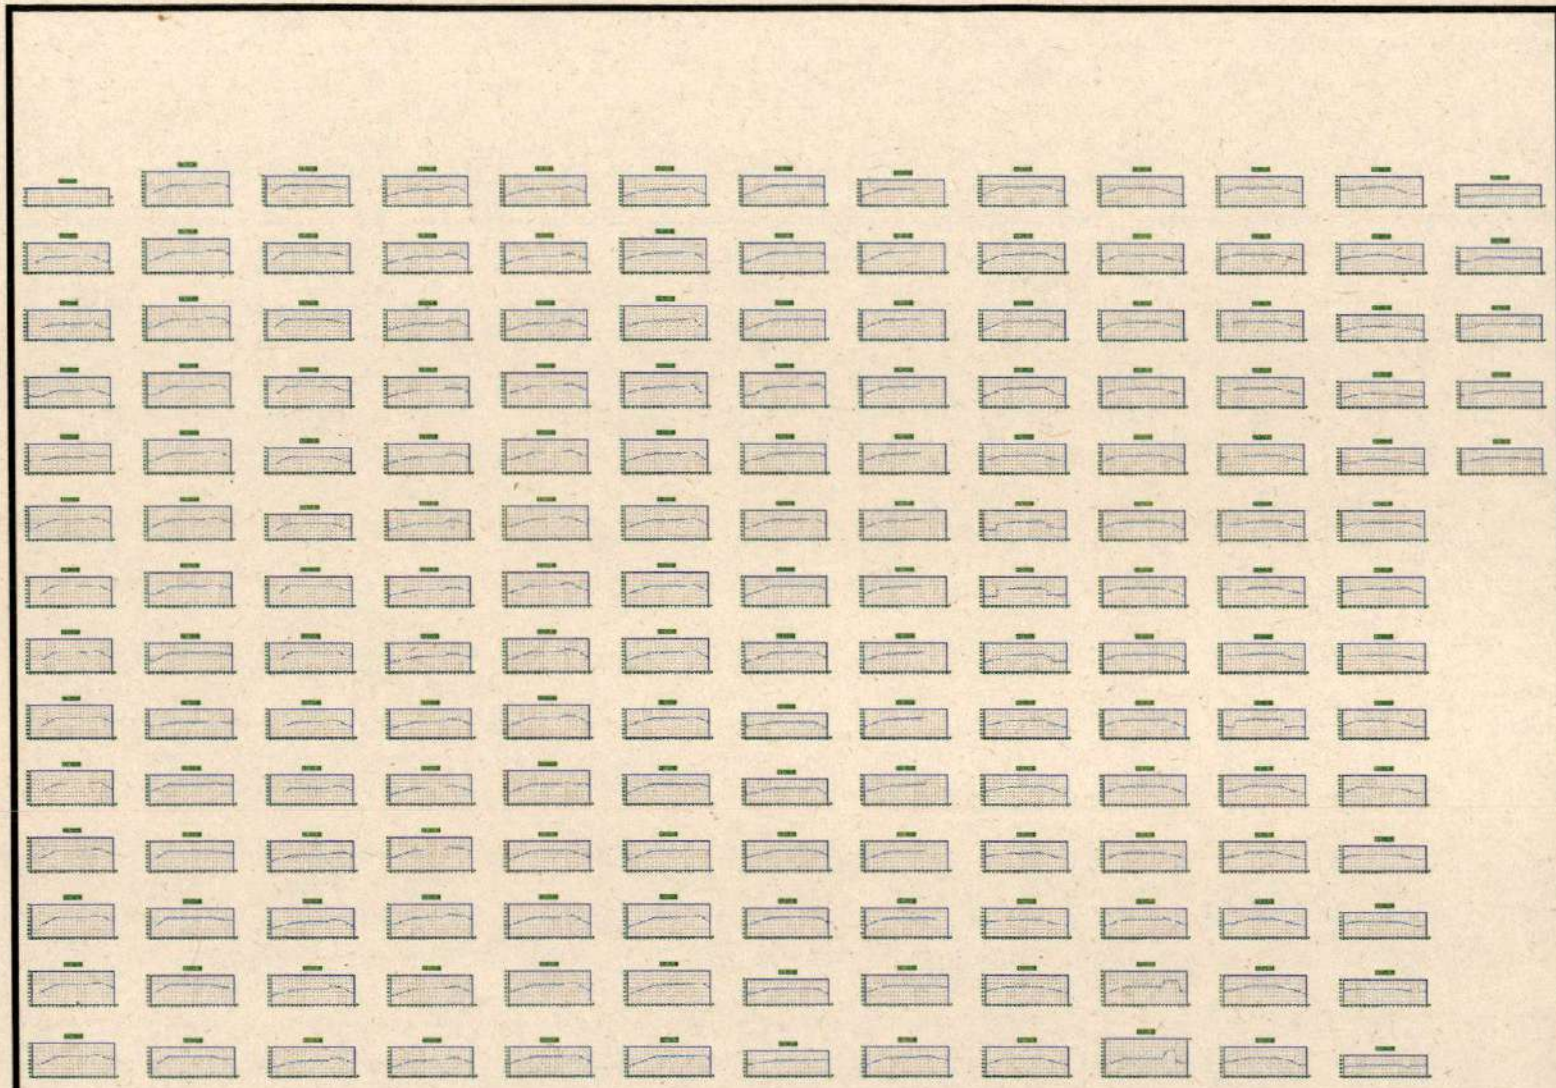

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- Vértice de poligonal
- Vértice de poligonal de apoyo
- Poligonal
- Poligonal de apoyo

NOTAS

- Sistema de coordenadas (referenciadas)
- Norte (magnetico - astronomico)
- Banco de nivel (referenciado)
- Otras

ESCALA GRÁFICA

PARAMETROS DE DISEÑO GEOMETRICO		
Parametro	Unidad	Valor
Tipo Carretera		Secundaria
Tipo de Terreno		Plano
Velocidad Diseño	Km/h	40
Ancho Calzada	M	6.0 + sobreancho
Berma Cuneta a ambos lados	M	1
Ancho Total	M	8
Numero Carriles		2
Ancho Carril	M	3
Bombeo Normal Calzada	%	2% al centro
Radio Mínimo	M	21
Peralte Máximo	%	6
Pendiente Máxima	%	5%
longitud Mínima Curva Vertical	M	30
K min Concava	m%	63
K min Convexa	m%	43
Distancia máxima entre PI Verticales	M	40 a 80

Plano	Clave
01 DE 01	NECHI

SECCIONES TRANSVERSALES
KM12+630.00 A KM13+725.11

DIRECCIÓN FÍSICA DE LA POLIGONAL

Dibujó	Revisó
ELABORÓ	REVISÓ
Fecha: 26 de noviembre de 2023	Escala: 1:1.000 - ARCH D (36x24)

TOPOGRAFÍA INTERVENTORIA
ENERO 2024

INFORME DE TOPOGRAFÍA

SOTA LTDA.

SOCIEDAD TECNICA SOTA

INGENIEROS CIVILES

PERIODO: 09DE ENERODE 2024 A 31 DE ENERO DE 2024

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25)-COLORADO-NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GLOSARIO

ALTURA: Distancia vertical entre una superficie de referencia y el punto geodésico, si la superficie de referencia es el nivel medio del mar se conoce como altitud.

ALTURA ELIPSOIDAL: Distancia vertical entre el elipsoide y un punto geodésico, medida a lo largo de la normal al elipsoide que pasa por el punto de interés.

ALTURA GEOIDAL: Distancia entre el geoide y el elipsoide medida a lo largo de la línea real de la plomada. También se denomina ondulación geoidal.

ALTURA NIVELADA: Distancia vertical medida entre dos puntos mediante observaciones ópticas de los desniveles existentes entre ellos. Puede ser geométrica o trigonométrica.

ALTURA NORMAL: Distancia vertical entre el cuasi-geoide y el punto geodésico, medida a lo largo de la línea teórica de la plomada.

ALTURA ORTOMÉTRICA: Distancia vertical entre el geoide y el punto geodésico, medida a lo largo de la línea real de la plomada (vertical al geoide).

CARTERAS: Libretas utilizadas en los levantamientos topográficos para llevar un control de la información levantada.

CARTERAS DE NIVEL: Se utilizan para el registro de las mediciones o lecturas hechas con los equipos apropiados (niveles topográficos y miras), para la determinación de las alturas de puntos con una posición definida en el terreno. Las dos páginas (izquierda y derecha) vienen divididas en columnas con un rayado horizontal más espaciado.

CARTERAS ELECTRÓNICAS: Los teodolitos modernos, estaciones totales y niveles electrónicos vienen equipados con un dispositivo recolector automático de datos, que son del tamaño de un calculadora o vienen directamente incorporados al equipo, que guardan magnéticamente los datos, tales como la identificación de puntos, distancias y ángulos horizontales y verticales y algunas anotaciones descriptivas. Estos datos pueden ser transferidos a un archivo de computador vía interfaz directa o vía módem para su posterior procesamiento. Las carteras electrónicas tienen la ventaja de eliminar las equivocaciones en la lectura y registro de ángulos y distancias y reducir el tiempo de digitación y procesamiento, pero existe siempre el riesgo del borrado accidental de los datos.

CARTERAS TOPOGRÁFICAS: Se utilizan para el registro de las operaciones de nivelación de parcelas, lotes o franjas de terreno, donde se indica la posición relativa de puntos de igual cota, puntos de quiebre del terreno o de puntos a distancias fijas medidas desde una línea de referencia y que se utilizan para

la representación gráfica de la configuración topográfica o relieve del terreno. Las dos páginas vienen cuadriculadas y en cada página se marcan cuatro columnas con líneas de división resaltadas. La columna central entre páginas representa el eje del alineamiento y las páginas izquierda y derecha se utilizan para el registro de las mediciones a lado y lado del eje.

CURVAS DE NIVEL: Son líneas que se trazan en los planos de planta con el fin de representar el relieve o configuración topográfica de un terreno. Una curva de nivel une puntos del terreno que tienen igual cota o altura, por lo tanto, representan la intersección del terreno con un plano horizontal. La separación entre las curvas de nivel en el plano de planta representa la distancia horizontal entre ellas y la distancia o intervalo vertical se deduce por diferencia de las cotas anotadas. La cota o altura de una curva de nivel es la cota o altura del plano horizontal que la contiene.

DATUM: Parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia o base para el cálculo de la posición del origen, la escala y orientación de los ejes del sistema de coordenadas.

DATUM BOGOTÁ: Sistema local de referencia para Colombia. El punto Datum (desviación vertical igual a cero) es el Observatorio Astronómico Nacional, el elipsoide asociado es el Internacional o de Hayford (a = 6 378 388 m, f = 1 / 297), su traslación con respecto al geocentro es aproximadamente ÄX = +307 m, ÄY = +304 m, ÄZ = -318 m).

DATUM GEODÉSICO: Orientación y ubicación del elipsoide asociado a un sistema coordenado (X, Y, Z), si éste es geocéntrico se tendrá un Datum Geodésico Geocéntrico o Global; si es local se tendrá un Datum Geodésico Local. Estos últimos también se conocen como Datum Horizontales, dado que la determinación de la altura (H) de los puntos es independiente de sus coordenadas horizontales. Un datum geodésico geocéntrico permite establecer las coordenadas para un punto con respecto a la misma superficie de referencia, el elipsoide. En éstos, la tercera coordenada se conoce como altura geodésica o elipsoidal (h).

GNSS: Acrónimo inglés para el Sistema Global de Navegación por Satélite.

GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM): Sistema de posicionamiento global que se basa en el principio de la medición de distancias (Pseudo distancias) desde satélites al receptor del GPS a través de la medición del tiempo. Realizando una trilateración inversa en el espacio (la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición.), conociendo las coordenadas de al menos 4 satélites lo cual permitirá obtener las coordenadas geográficas en la tierra del punto donde se encuentra el receptor GPS.

MAGNA – SIRGAS: Es la densificación de SIRGAS y por tanto del ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Si bien las estaciones que conforman el ITRF ofrecen un cubrimiento mundial, resultan insuficientes (muy distantes) para la utilización practica por lo cual surge el SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas el cual es un sistema de referencia geodésico producto

de la densificación de una red de estaciones GNSS de alta precisión en el área continental. En Colombia sus coordenadas están dadas en ITRF2014, época 2018.0.

MARCO DE REFERENCIA: Red de precisión máxima que realiza o materializa un sistema de referencia; conformado por un conjunto de puntos, cuyas coordenadas han sido definidas sobre el sistema de referencia que materializa, puede ser geométrico o físico. Red y marco de referencia son sinónimos.

MATERIALIZACIÓN: Monumento o marca que sirve de testigo físico de un punto definido mediante coordenadas determinadas sobre un sistema de referencia dado

MOJÓN: Señal permanente o monumento que materializa un punto sobren el terreno, con coordenadas definidas sobre un sistema de referencia. Se conoce también como VÉRTICE, PUNTO DE CONTROL BM, (Benchmark), punto de referencia.

NIVELACIÓN GPS: Determinación de la altura elipsoidal (h) de un punto geodésico mediante la medición de distancias o variación de distancias entre satélites y puntos terrestres. Su combinación con un geoide (N) proporciona la altura ortométrica (Ho) mediante Ho = h –N; su combinación con un cuas geoide, proporciona la altura normal (Hn) mediante Hn = h - N.

NP'S PUNTOS DE NIVELACIÓN: Son puntos a los que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, le ha determinado su cota mediante el método de nivelación geodésica.

PRECISIÓN: Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. Lo que quiere decir es que si diferentes valores de una misma medición están muy próximos unos de otros decimos que ellos tienen una alta precisión.

PUNTOS: Son utilizados para la marcación de vértices, referencias, alturas en los levantamientos topográficos.

RINEX (RECIEVER INDEPENDENT EXCHANGE FORMAT): Son las siglas de un formato de intercambio de información GPS. Es un formato estándar que permite el uso intercambiable de dato GPS. Consiste en archivos de tipo ASCII, que contiene datos de observación, mensaje de navegación de los satélites y datos meteorológicos

ROVER: En el método diferencial para los levantamientos con GPS (DGPS), corresponde al equipo que no se encuentra sobre un punto de coordenadas conocidas; es decir el equipo se utiliza para medir los puntos a partir de una base conocida.

RTK REAL TIME KINEMATIC (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): Hasta hace poco, la metodología para obtener precisión centimétrica o milimétrica, era tomando datos durante un tiempo determinado y

posteriormente realizar cálculos para obtener coordenadas finales. Sin embargo, actualmente podemos conseguir estas precisiones instantáneamente, es decir en el mismo campo al momento de la toma de la información, lo que se denomina Tiempo Real.

Uno de los receptores (denominado –base-) se coloca en un punto fijo; este receptor base realizará las oportunas operaciones y enviará una serie de datos al otro receptor (denominado –móvil-), que empleará para conseguir obtener posiciones con altas precisiones de manera instantánea.

SESIÓN: Se entiende por SESIÓN el intervalo de tiempo de una ventana de observación, es decir la duración de la observación continua de varios receptores GPS simultáneamente sobre los mismos satélites.

SISTEMA DE COORDENADAS: Conjunto de reglas matemáticas emplean números para ubicar puntos sobre un espacio de referencia.

SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS: Sistema de coordenadas que está referido al mundo real a través de un datum.

SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA: Conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente modelados que permiten definir, en cualquier momento, la orientación, ubicación y escala de tres ejes coordenados [X, Y, Z]. Si el origen de coordenadas [X=0, Y=0, Z=0] coincide con el centro de la Tierra se denomina sistema de referencia geocéntrico o global, en caso contrario se habla de sistema de referencia local.

SIRGAS, SISTEMA DE REFERENCIA GEOCÉNTRICO PARA LAS AMÉRICAS: Densificación del ITRF (Internartional Terrestrial Reference Frame) en América. El datum geodésico correspondiente está definido a partir de los parámetros del elipsoide GRS80 (Geodetic Reference System, 980), orientado según los ejes coordenados del sistema de referencia SIRGAS. En la primera campaña GPS-SIRGAS, adelantada en mayo de 1995 (SIRGAS95), se establecieron 58 estaciones en el área de América del Sur, cuyas

coordenadas corresponden con el ITRF94, época 1995.4. En mayo de 2000 se realizó una segunda campaña (SIRGAS2000) en la que se incluyeron, además de las estaciones de 1995, los mareógrafos que definen los sistemas de alturas en los países de América del Sur y nuevos puntos ubicados en América Central, Estados Unidos y Canadá. El resultado de esta nueva campaña es una red de 83 estaciones, cuyas coordenadas están calculadas en el ITRF2000, época 2000.4. Pero por resolución 715 del 2018 del IGAC estas se ajustaron a ITRF2014 época 2018.0

TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS: Cambio de coordenadas desde un sistema de referencia de coordenadas a otro sistema de referencia de coordenadas basado en un datum diferente a través de una relación uno a uno.

VELOCIDAD DE LA COORDENADA GEOCÉNTRICA X: Cambio de la coordenada X en función del tiempo.

VELOCIDAD DE LA COORDENADA GEOCÉNTRICA Y: Cambio de la coordenada Y en función del tiempo.

VELOCIDAD DE LA COORDENADA GEOCÉNTRICA Z: Cambio de la coordenada Z en función del tiempo.

WGS84: Sistema de referencia definido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es equivalente al ITRS materializado por el ITRF2000. Su acrónimo significa World Geodetic System 1984. El datum geodésico asociado es geocéntrico (ÄX = 0 m, ÄY = 0 m, ÄZ = 0 m) y su elipsoide tiene el mismo nombre (a = 6 378 137 m, f = 1 / 298,25722). En la práctica el elipsoide WGS84 es igual a GRS80 (Geodetic Reference System 1980).

INTRODUCCIÓN

En el campo de la Geomática y en particular en proyectos de ingeniería que requieren de la topografía como elemento estratégico para su desarrollo, se han presentado importantes avances que han impactado directamente la metodología para ejecutar los estudios de topografía, introduciendo con ello nuevas técnicas de captura avanzada y con mayor complejidad para su proceso y que difieren de las técnicas tradicionales como la obtención de ángulos y distancias para la generación de cartografía, estas nuevas técnicas involucran una serie de recursos tecnológicos a nivel de hardware y software, que permiten obtener resultados con mayor resolución y detalle de la zona de estudio, las cuales, en la actualidad están siendo incorporadas por las empresas y entidades, ya que reducen el tiempo de captura de datos y post-proceso, al igual que aumenta la calidad en cada uno de los insumos producidos.

La topografía inmersa dentro de cualquier proceso de ingeniería toma gran relevancia dentro de este proyecto, debido a que es la ciencia encargada de suministrar los datos básicos para el desarrollo de todos los componentes, cuyos resultados busca satisfacer las necesidades a nivel cartográfico del municipio de la Estrella, donde se proyectarán las obras de repotenciación de la estructura existente, generando un modelo continuo de alta precisión de acuerdo con cada una de las técnicas de captura, y que servirá de apoyo al equipo técnico para realizar los diferentes estudios que determinaran la mejor alternativa de diseño, para el objeto de estudio contratado.

1. ALCANCE

• Amarre geodésico

• Levantamientos topográfico del terreno natural existente, anexo en carteras.

• Se realiza el recorrido con el grupo de topografía del contratista para aclarar la reubicación de los BOX que dentro del diseño no se permiten realizar.

De acuerdo a esto encontramos que:

-El BOX ubicado en el K13+055.78 se debe reubicar, por qué se encuentra en un costado una laguna, (fotografía), el contratista en compañía de planeación de la alcaldía realiza reubicación, pero no encuentran permiso por el propietario del predio.

Siguen pendiente para encontrar punto para reubicación del anteriormente mencionado.

- EL BOX ubicado en el K13+655, también se realiza en compañía del contratista el estudio para presentar propuesta (diseño), y encontrando de manera satisfactoria la autorización por el propietario del lote, se espera pasen la propuesta para revisión por parte de interventoría.

- se realizó replanteo de alineamiento del diseño presentado por la gobernación para verificación de y rectificación de puntos.

Se le expone a el contratista que cualquier modificación que deseen realizar dentro del proyecto se debe presentar la respectiva propuesta, para que de esta manera sea avalada y verificada por la interventoría.

• Nivelación de las calzadas en las abscisas estipuladas para el desarrollo del proyecto y conformación de subrasante en la abscisa 13+724 hasta el 13+404

• Nivelación topográfica de la calzada con el material de reafirmado colocado en las abscisas 13+724 hasta el 13+404

• Se entregarán mínimo diez secciones de terreno (trasversales y longitudinales) estas incluirán terreno natural y diseño de vía estipulado por el contratista y la gobernación de Antioquia.

• Se iniciaron actividades de cortes para subrasante desde el k13+724, mientras quedó por definirse los niveles para lleno con respecto a la cota de inundación que aparece en la norma del contrato por la gobernación de Antioquia.

2. OBJETIVOS

Ejecutar el levantamiento topográfico para estudio del terreno existente y sus condiciones especificas.

Se le hace acompañamiento a el contratista para realizar las modificaciones necesarias y que se cumpla con la funcionalidad en todas y cada una de las obras transversales implantadas en el diseño.

Verificar que toda la ejecución del proyecto vaya con el cumplimiento de los diseños estipulados por la gobernación de Antioquia.

3 GENERAL

Generar cartografía base para el proyecto, y los insumos requeridos por cada área, con el fin de entregar el estado actual de la superficie directa a intervenir

4 ESPECIFICOS

- Levantamiento topográfico de acuerdo con el polígono de referencia
- Levantamiento de los niveles de vía existente
- Informe topográfico.
- Levantamiento planimétrico detallado y general del tramo de vía donde se realizará el proyecto
- Georreferenciación con sistema RTK, con coordenadas Magna-Sirgas (Bogotá) o sistema Único CTM12, con precisión mínima de 2 a 3 cm
- Amarre geodésico
- Levantamientos del material suministrado, colocado y compactado para el mejoramiento de la subrasante
- Levantamiento topográfico para el diseño de los taludes y la estabilización de la calzada izquierda.
- Verificación de cada uno de los niveles puestos en campo por la topografía del contratista.

5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la salida de la cabecera municipal sentido norte oeste, latitud 8° 05'15.6"N longitud 74°46'30.6" como punto inicial del proyecto


Google
© 2024 Google
Calle 30
DISTRACOM FLUVIAL
LAS MERCEDES
Hotel Las Palmas
Nechi
FASHION LA VIÑA DE
DIOS--FALDAS...
Caucasia-Nechi
Alegre
Mirador Nechi



8°05'15.6"N 74°46'30.6"W

6 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

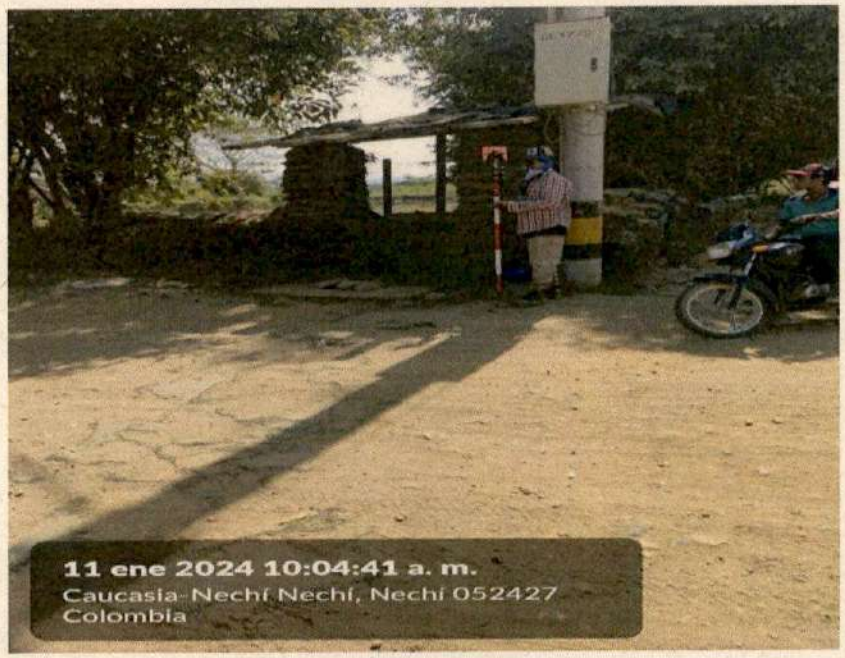


Figura 1 Amarre geodésico del proyecto, iniciamos a verificar las coordenadas de amarre y la información recibida por parte de la topografía del contratista.

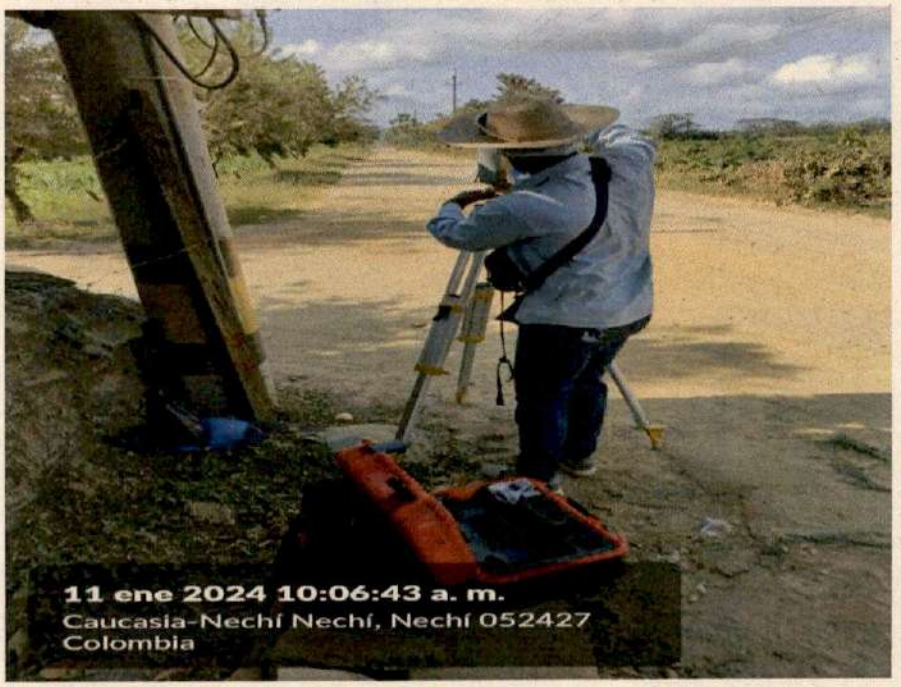


Figura 2 Amarre geodésico del proyecto, iniciamos a verificar las coordenadas de amarre y la informaciónrecibida por parte de la topografíadel contratista.

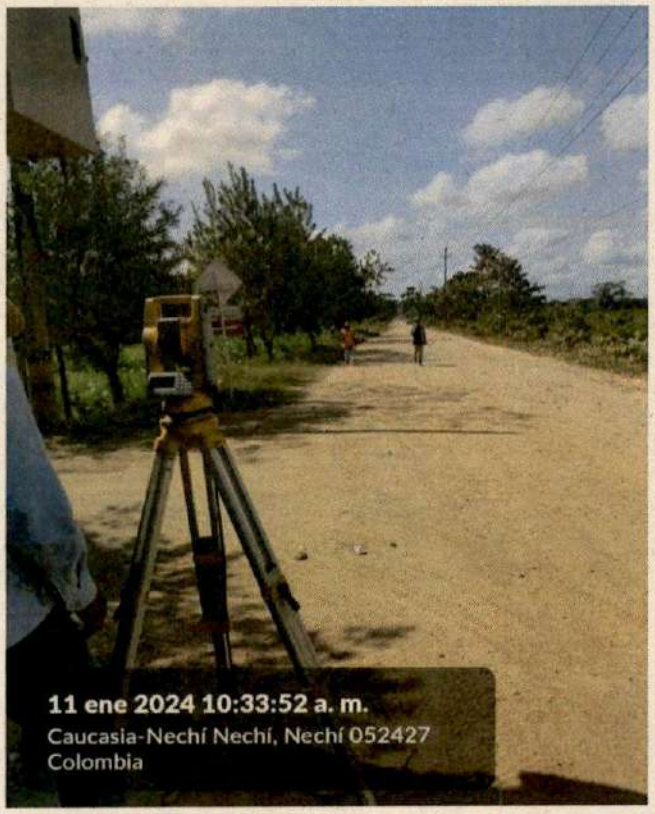


Figura 4

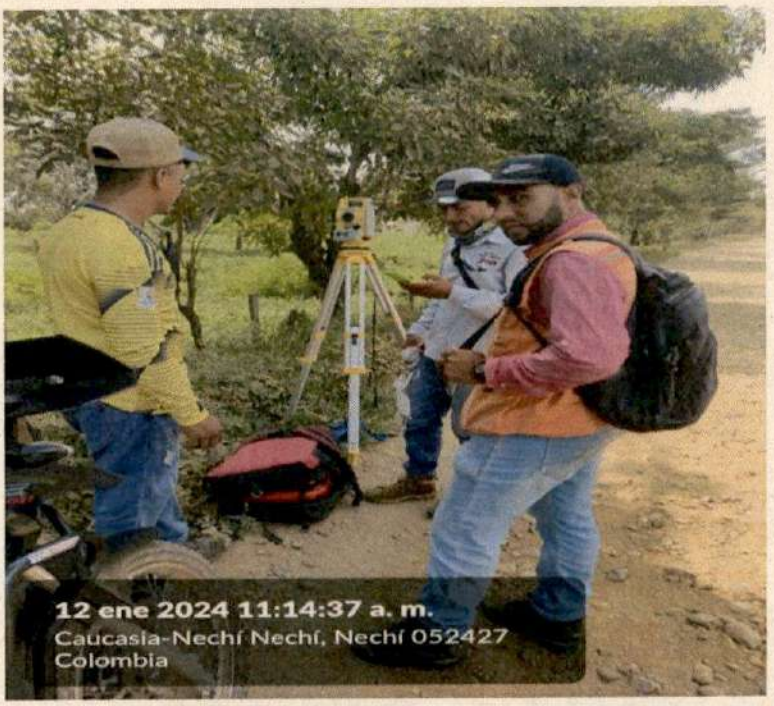


Figura 4. Verificación de la poligonal y la información de trabajo de campo recibida por parte dee la topografía del contratista.



Figura 5 Revisión en campo de el BOX CULVERT para modificación y traslado, ubicado el K13+055.78
Fuente: Elaboración Propia

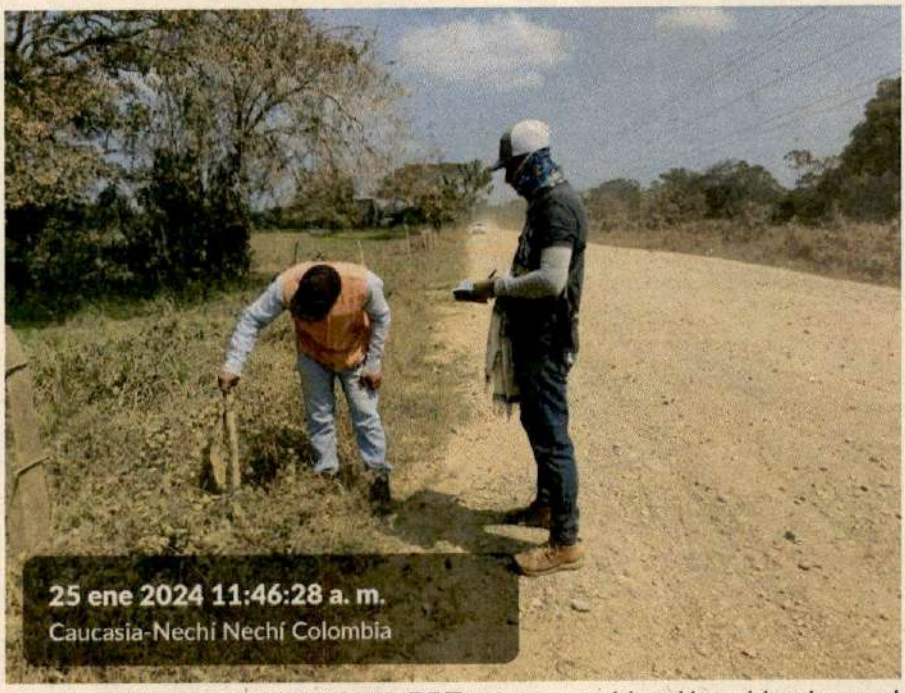


Figura 6 revisión del segundo BOX CULVERT para su reubicación, ubicado en el K13+655
Fuente: Elaboración Propia

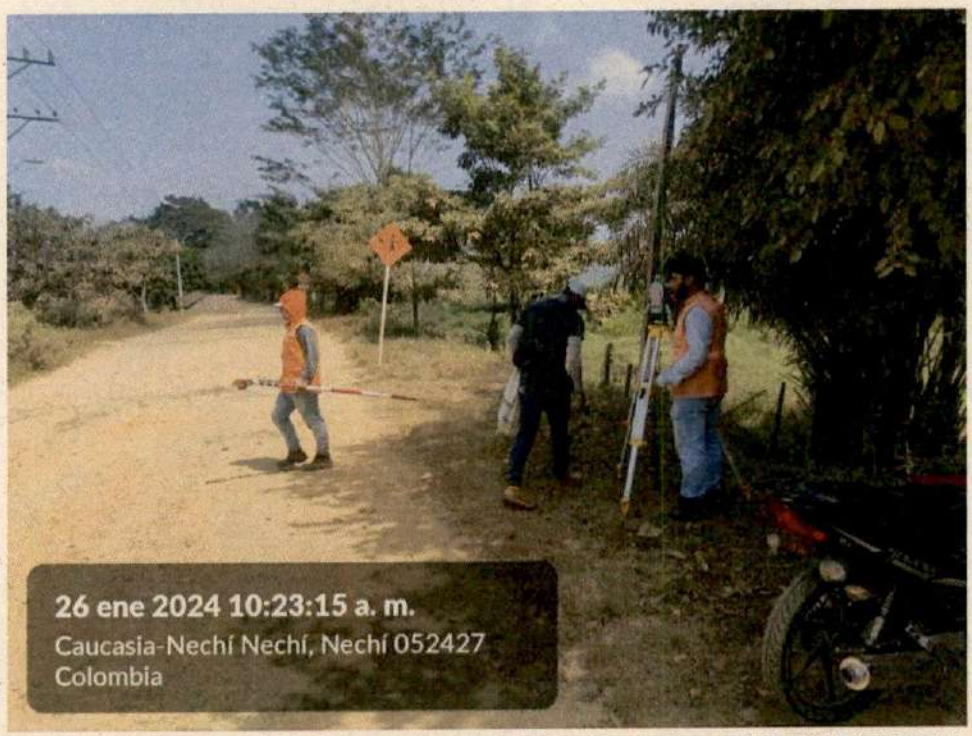


Figura 7. Se realiza el estudio topográfico para la reubicación de los BOX CULVERT ubicados en las abscisas anteriormente mencionadas. Fuente: Elaboración Propia

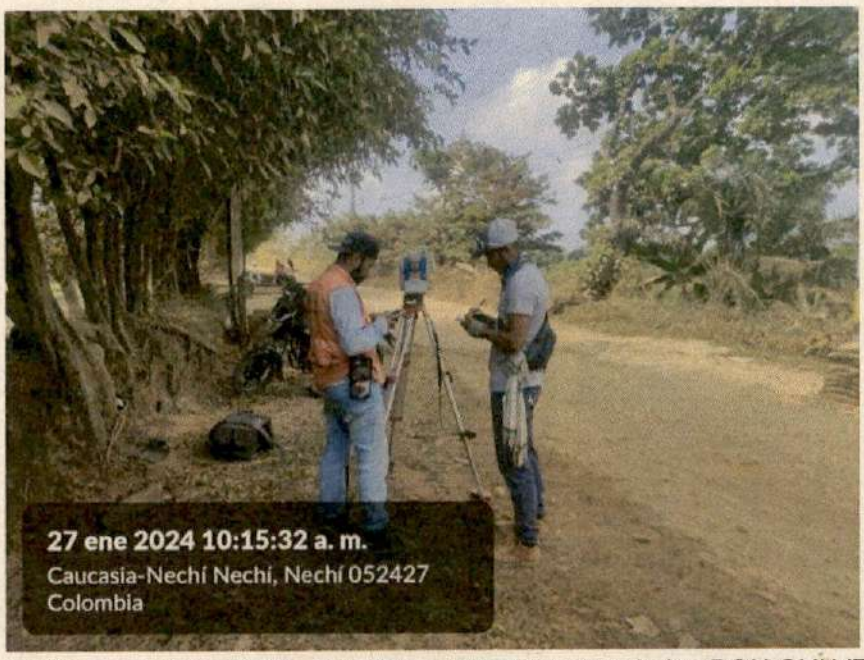


Figura 8 Se continua con los estudios previos a la reubicación de los BOX CULVERT.. Fuente: Elaboración Propia

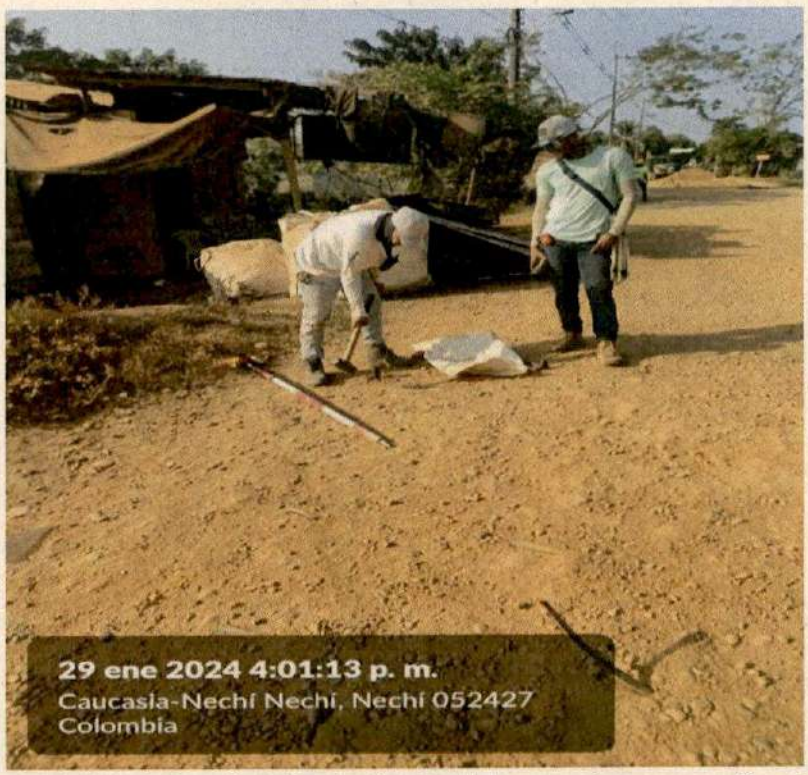


Figura 9 Se inicia actividades de localización de diseño vial, se revisa y se verifica la información con la que el contratista ejecuta. Fuente: Elaboración Propia

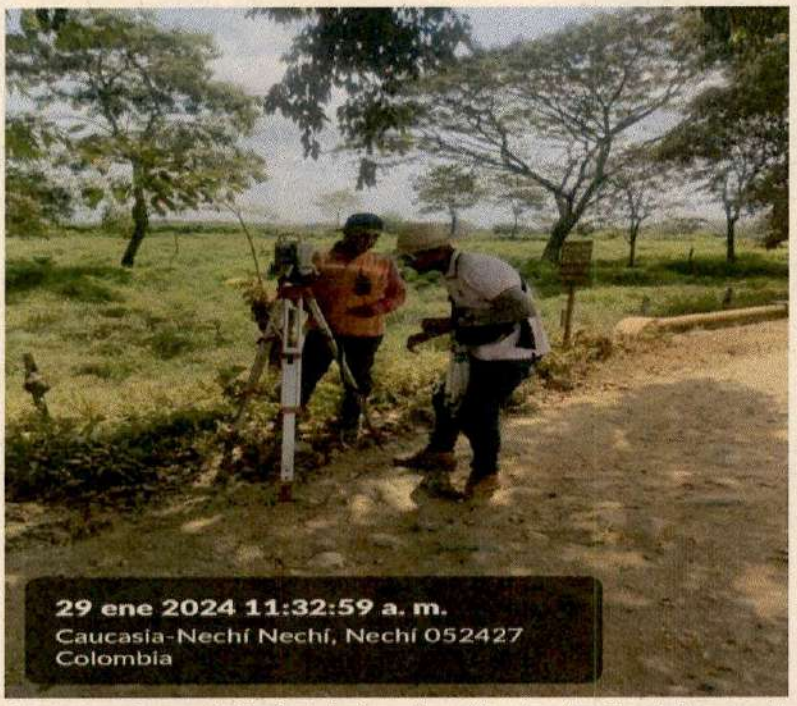


Figura 10 Se continua con las actividades de localización de diseño vial, se revisa y se verifica la información con la que el contratista ejecuta. Fuente: Elaboración Propia.

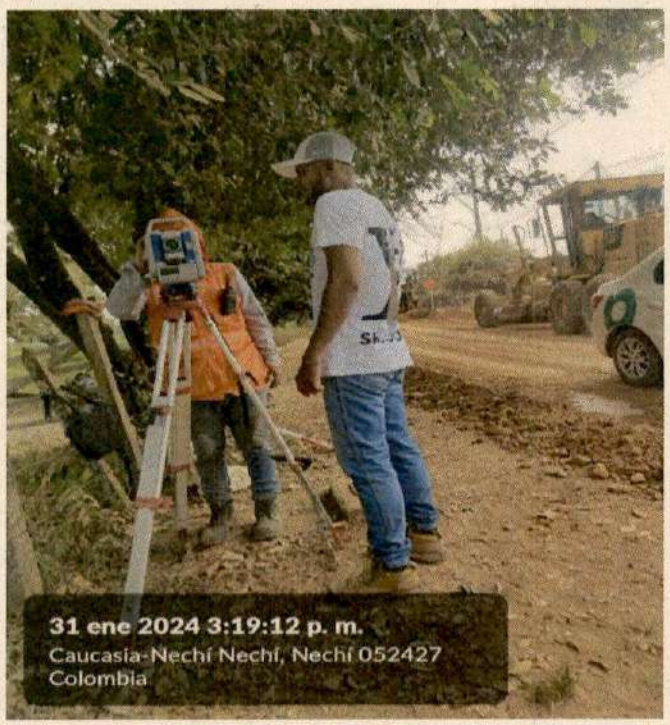


Figura 11 Se inicia actividades de localización y cortes para aproximación a la sub rasante. Fuente: Elaboración Propia

7 CARTERAS TOPOGRAFICAS (VER ANEXOS)

Todas las carteras y planos topográficos serán anexadas digitalmente

En el siguiente orden

- Cartera de levantamiento inicial

- Archi vos CAD del levantamiento realizado y comparado con la propuesta del contratista y la gobernación

-Secciones transversales de muestreo de las diferentes superficies (P DF)

- Planta del tramo donde se ejecutará el proyecto vial (PDF).

8 CUADRO CHEQUEOS

Elaborado por: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS
Cargo: TOPÓGRAFO
Firma: 
Fecha: Enero 2024


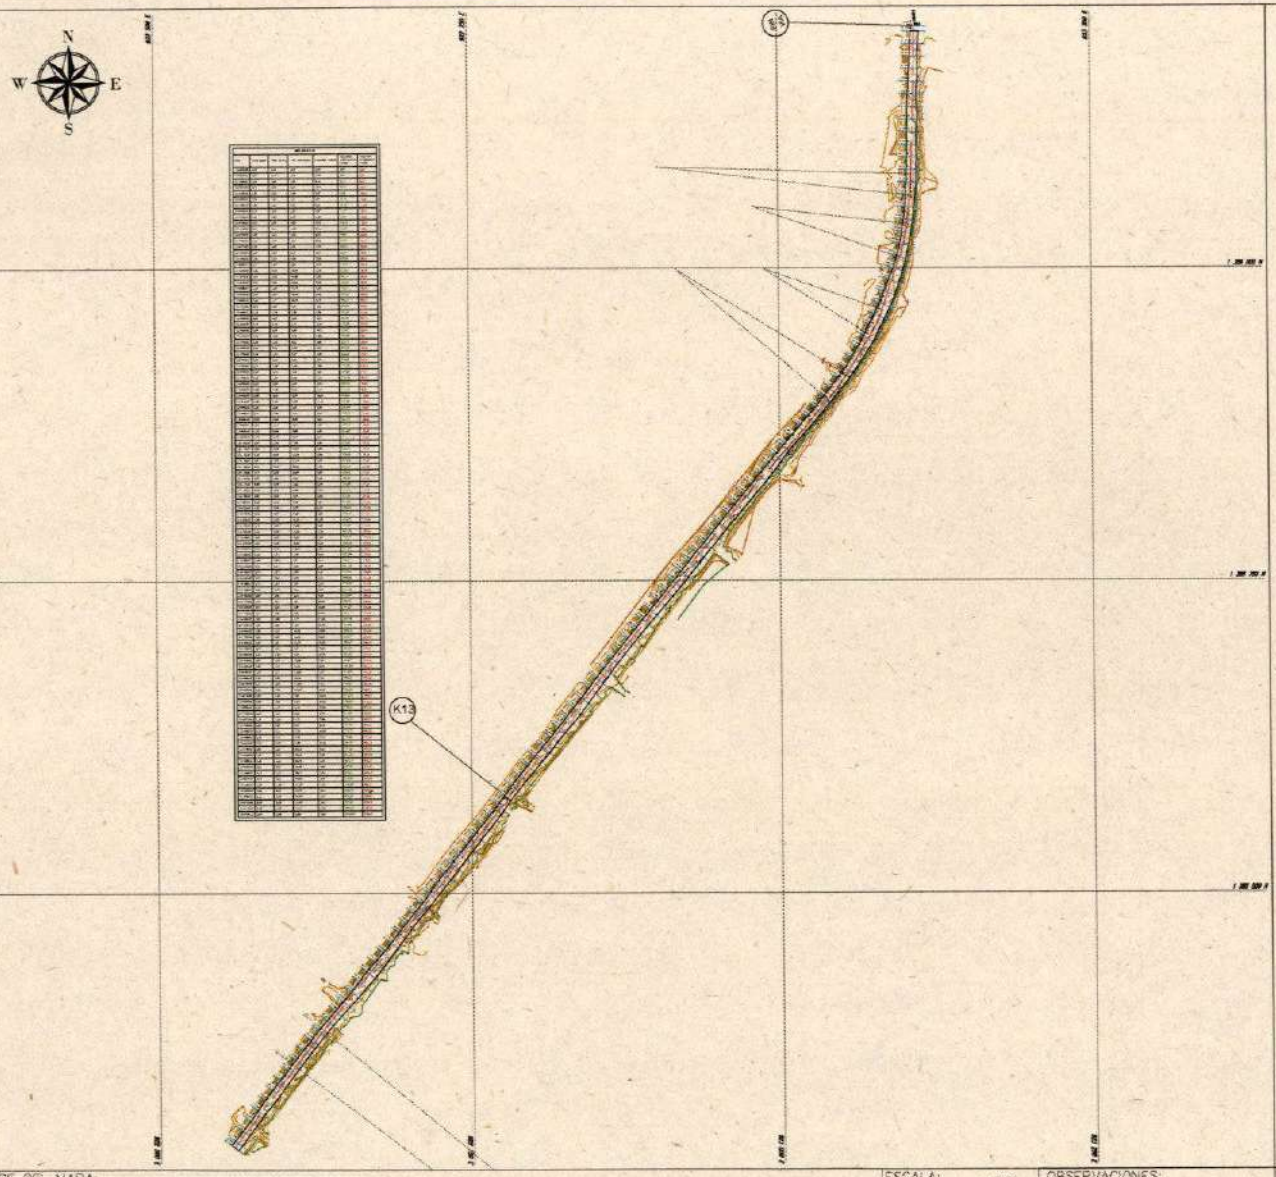


TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-6	35.782	1385468.2520	922688.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490


UBICACION GENERAL




DEPARTAMENTO



MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHI	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPÓGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024	PLANO 1/6	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	

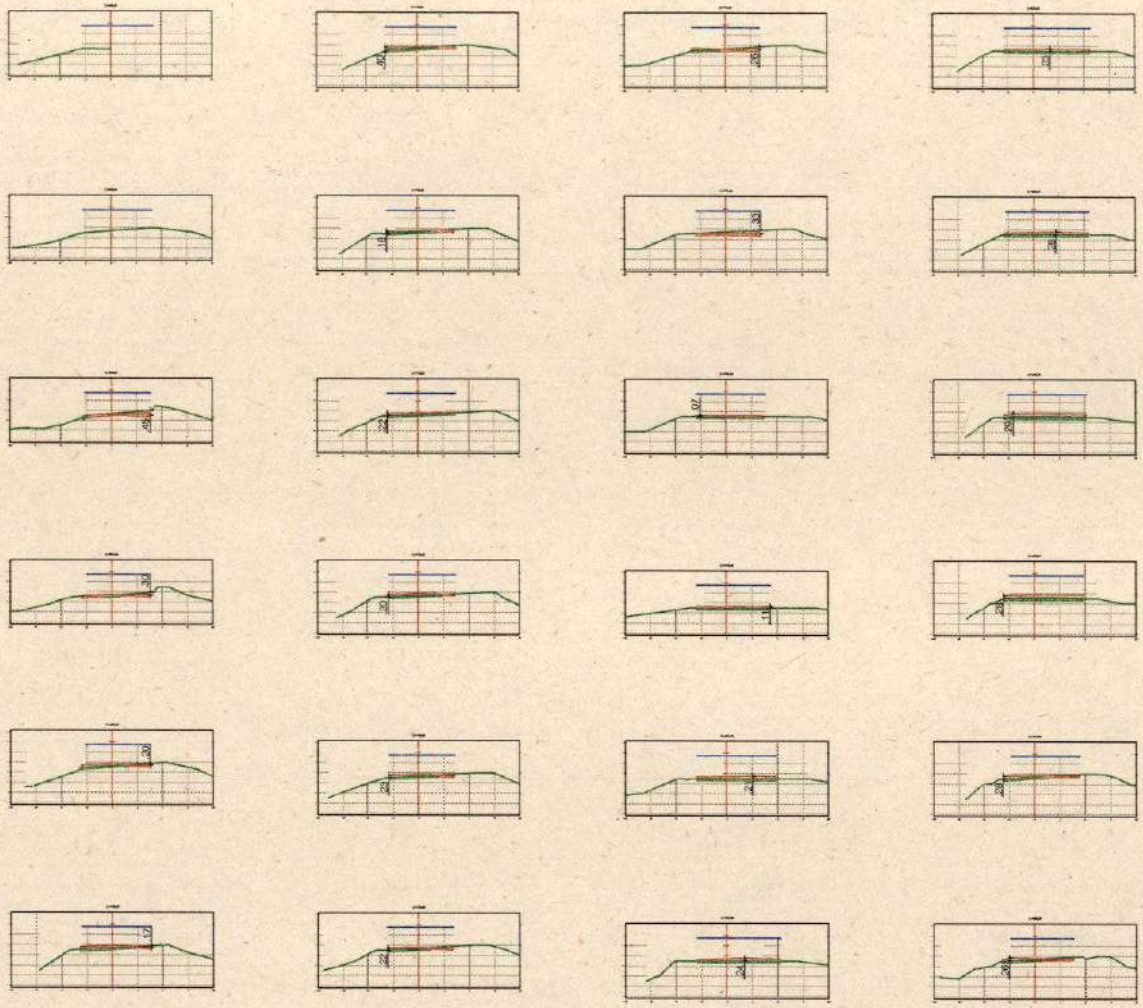

CONVENCIONES

- Topografia Gobernación
- Topografia inicial
- Topografia cota de inundación
- Cantidad de lleno
- Cantidad de corte

TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-6	35.782	1385468.2520	922688.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490


UBICACION GENERAL



DEPARTAMENTO




MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHÍ	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPÓGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024 (DD/MM/AAAA)	PLANO 2/5	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	

120

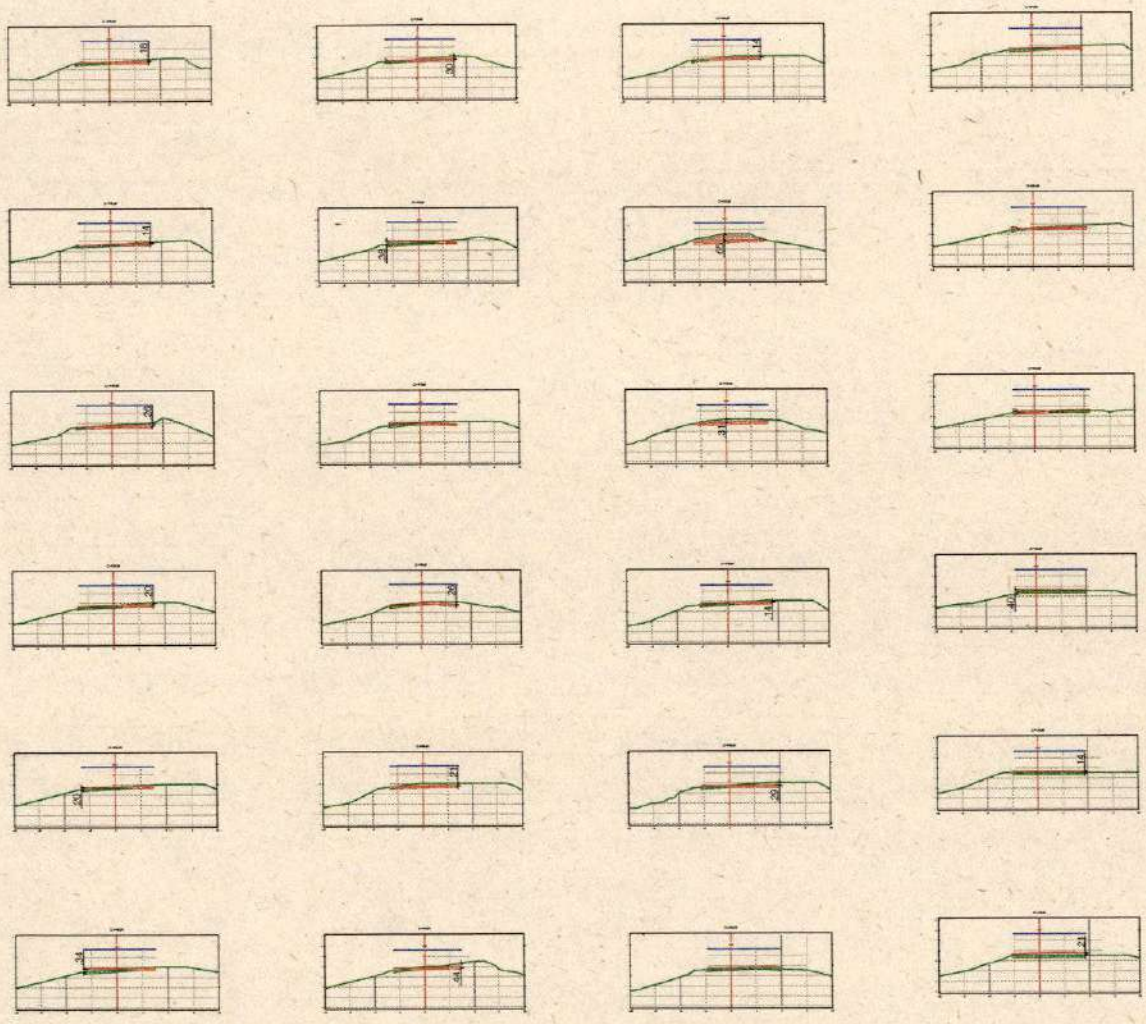

CONVENCIONES

- Topografia Gobernación
- Topografia inicial
- Topografia cota de inundación
- Cantidad de lleno
- Cantidad de corte

TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-5	35.782	1385468.2520	922688.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490


UBICACION GENERAL




DEPARTAMENTO



MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHÍ	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPÓGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024	PLANO 3/6	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	

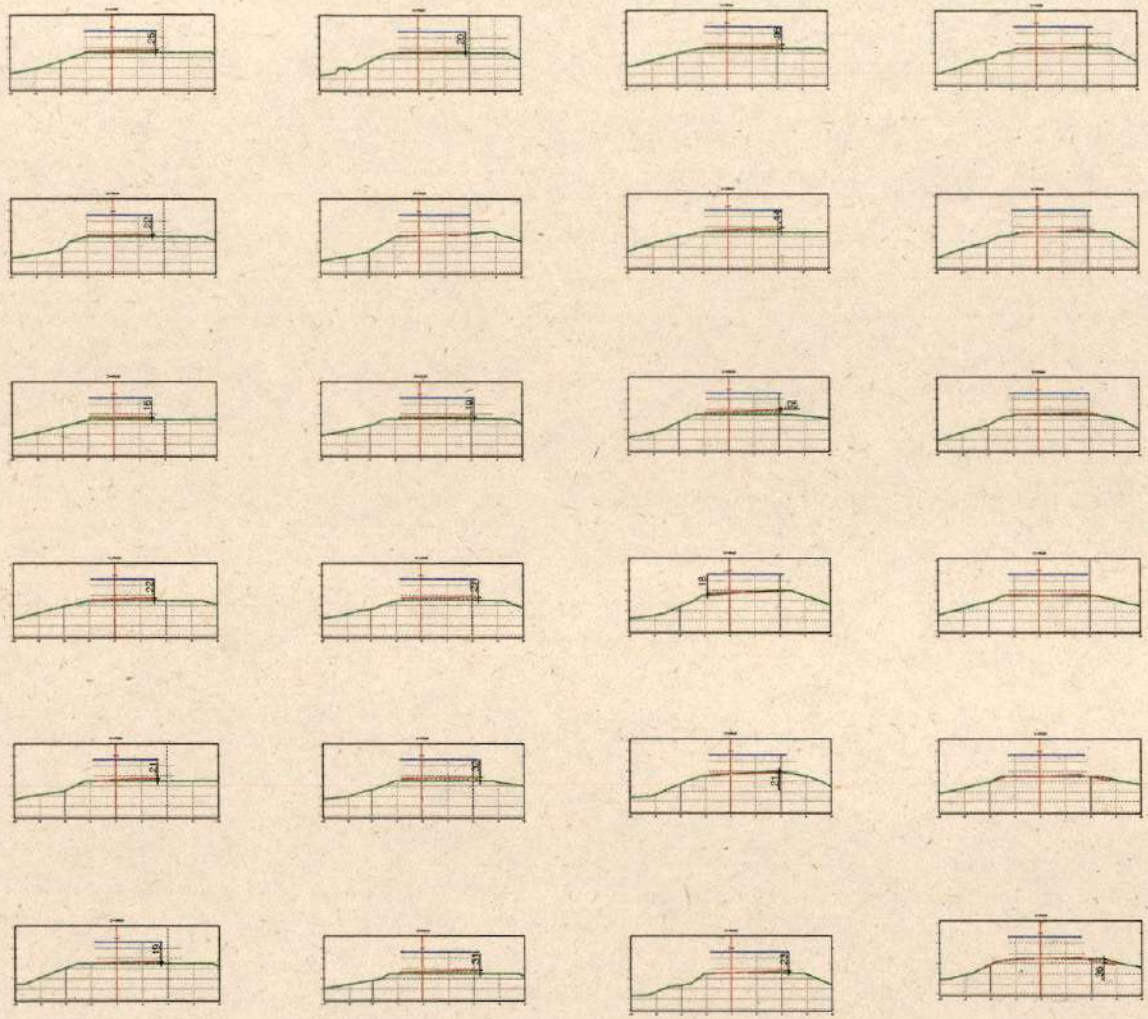

CONVENCIONES

- Topografia Gobernación
- Topografia inicial
- Topografia cota de inundación
- Cantidad de lleno
- Cantidad de corte

TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-6	35.782	1385468.2520	922688.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490


UBICACION GENERAL




DEPARTAMENTO



MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHÍ	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPÓGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024	PLANO 4/6	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	

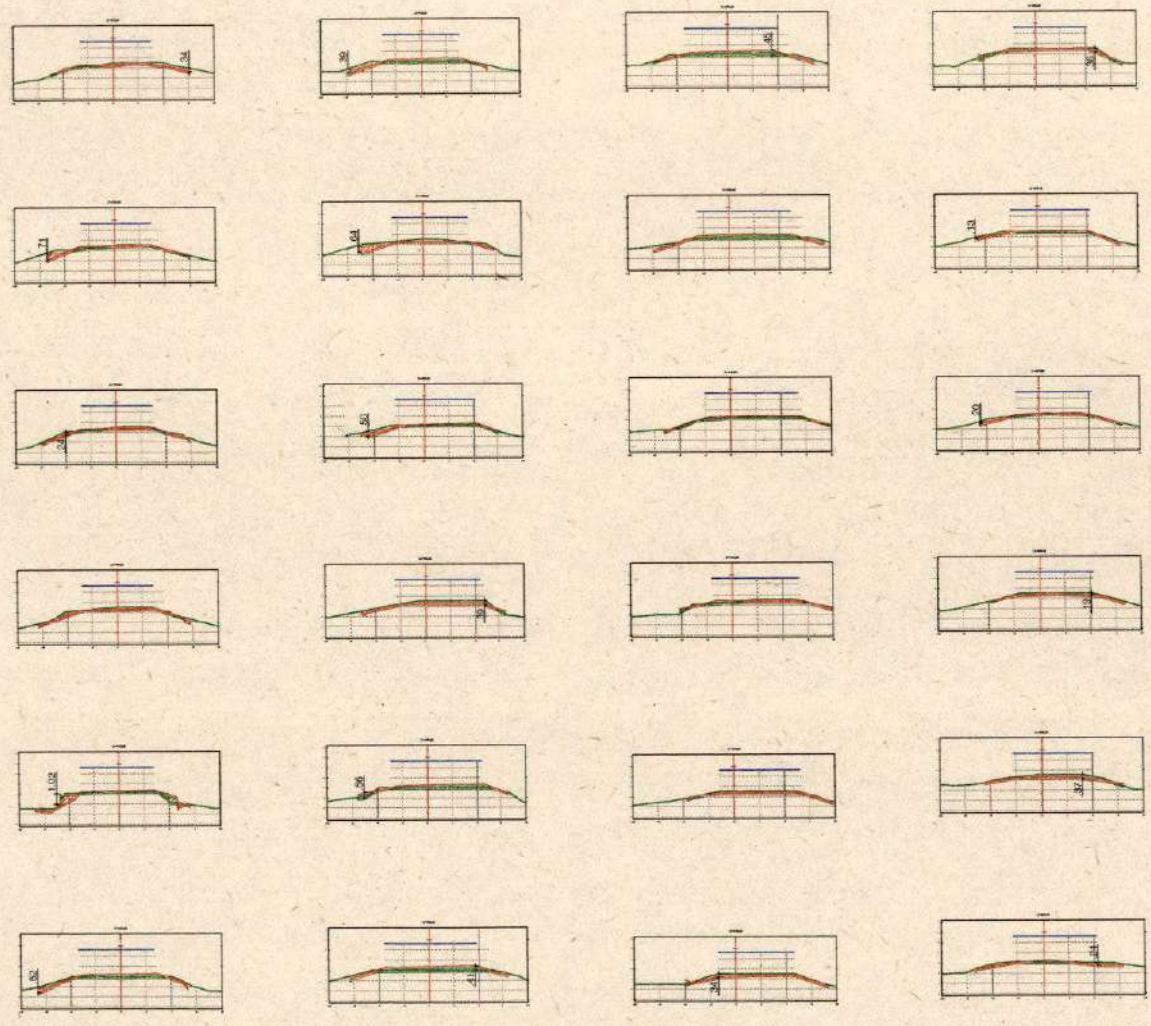

CONVENCIONES

- Topografia Gobernación
- Topografia inicial
- Topografia cota de inundación
- Cantidad de lleno
- Cantidad de corte

TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-6	35.782	1385468.2520	922988.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490

UBICACION GENERAL



DEPARTAMENTO














MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHÍ	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPOGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024 (DD/MM/AAAA)	PLANO 5/6	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	

MUNICIPIO DE NECHÍ

CONVENCIONES

- Topografia Gobernación
- Topografia inicial
- Topografia cota de inundación
- Cantidad de lleno
- Cantidad de corte

TABLA DE AMARRE			
DESCRIPCION	ELEVACION	NORTE	ESTE
M-6	35.782	1385468.2520	922668.9110
M-2	35.504	1386029.2170	923106.5490


UBICACION GENERAL



DEPARTAMENTO



MUNICIPIO



NOMBRE DEL MAPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				ESCALA: 1:500	OBSERVACIONES:
NÚMERO DEL TITULO:	TIPO DE PREDIO: URBANO	BARRIO:	MUNICIPIO: NECHÍ	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	
NOMBRE DEL TITULAR:		EQUIPO TECNICO: K L TOP TOPÓGRAFIA	FIRMA:		
FECHA: 22 01 2024	PLANO 6/6	DIBUJO: SERGIO LUIS PEREZ SANTOS		TP. No.: 01-19922	





122

CARTERA GENERAL DE LEVANTAMIENTO				
# DE PUNTO	ESTE	NORTE	NORTE	DESCRIPCIÓN
100	923106.888	1386182.47	34.791	BV-PV
101	923112.954	1386181.84	34.823	BV-PV
102	923112.246	1386175.87	34.855	BV-PV
103	923106.822	1386174.96	34.893	BV-PV
104	923106.266	1386173.31	34.838	BV
105	923112.18	1386171.66	34.579	BV
106	923112.097	1386162.63	34.552	BV
107	923105.853	1386162.68	34.691	BV
108	923105.014	1386153.46	34.559	BV
109	923112.582	1386152.79	34.578	BV
110	923111.567	1386142.93	34.62	BV
111	923104.854	1386142.96	34.589	BV
112	923103.962	1386133.77	34.833	BV
113	923111.05	1386132.9	34.648	BV
114	923112.165	1386123	34.762	BV
115	923103.707	1386122.69	34.866	BV
116	923103.876	1386113.22	34.976	BV
117	923111.955	1386112.7	34.826	BV
118	923110.988	1386103.1	35.176	BV
119	923103.532	1386103	35.131	BV
120	923103.456	1386090.07	35.108	BV
121	923111.392	1386089.38	35.048	BV
122	923110.986	1386080.32	35.16	BV
123	923103.257	1386079.86	35.139	BV
124	923102.983	1386069.22	35.024	BV
125	923111.065	1386068.45	34.792	BV
126	923109.861	1386054.92	35.171	BV
127	923106.034	1386056.19	35.338	EJE
128	923106.324	1386068.13	35.256	EJE
129	923106.706	1386079.58	35.228	EJE
130	923107.22	1386091.2	35.113	EJE
131	923107.5	1386106.86	34.978	EJE
132	923107.54	1386120.57	34.888	EJE
133	923107.908	1386132.45	34.789	EJE
134	923108.243	1386144.79	34.713	EJE
135	923108.547	1386157.69	34.638	EJE
136	923108.456	1386171.41	34.813	EJE
137	923103.477	1386163.6	34.44	TN
138	923101.781	1386151.34	34.559	TN
139	923100.638	1386139.07	34.985	TN
140	923100.33	1386121.67	34.987	TN
141	923101.887	1386114.12	34.862	TN
142	923111.656	1386042.72	34.451	TN
143	923112.733	1386053.81	34.59	TN

144	923113.104	1386071.17	34.788	TN
145	923114.555	1386083.25	34.865	TN
146	923114.706	1386092.71	34.182	TN
147	923115.435	1386102.71	33.953	TN
148	923115.661	1386111.67	34.056	TN
149	923116.104	1386122.02	33.947	TN
150	923116.075	1386131.4	34.062	TN
151	923115.752	1386142.27	34.148	TN
152	923115.215	1386153.17	34.488	TN
153	923114.82	1386163.76	34.534	TN
154	923114.325	1386172.9	34.331	TN
155	923108.656	1386042.99	35.417	BV
156	923108.529	1386042.94	35.403	BV
157	923101.291	1386044.36	35.395	BV
158	923100.905	1386040.28	35.416	BV
159	923107.747	1386038.86	35.404	BV
160	923108.058	1386038.89	35.371	PTE
161	923107.391	1386035.21	35.369	BV
162	923100.314	1386036.28	35.426	BV
163	923098.975	1386029.1	35.489	BV
164	923106.475	1386027.17	35.498	BV
165	923104.904	1386020.36	35.509	BV
166	923097.512	1386021.74	35.44	BV
167	923096.602	1386014.65	35.306	BV
168	923103.529	1386013.04	35.44	BV
169	923101.949	1386006.42	35.389	BV
170	923095.164	1386008.13	35.262	BV
171	923093.254	1386002.42	35.336	BV
172	923100.684	1386000.96	35.328	BV
173	923099.733	1385997.43	35.353	BV
174	923091.924	1385999.68	35.354	BV
175	923090.573	1385995.09	35.4	BV
176	923098.197	1385992.64	35.323	BV
177	923096.722	1385987.87	35.389	BV
178	923088.702	1385990.61	35.42	BV
179	923087.014	1385985.92	35.291	BV
180	923095.02	1385982.59	35.297	BV
181	923093.462	1385978.2	35.32	BV
182	923085.141	1385981.69	35.291	BV
183	923083.051	1385977.09	35.2	BV
184	923091.429	1385973.33	35.194	BV
185	923089.091	1385968.84	35.339	BV
186	923080.869	1385972.65	35.193	BV
187	923079.074	1385967.77	35.25	BV
188	923086.474	1385964.23	35.401	BV
189	923084.119	1385959.67	35.452	BV
190	923076.946	1385963.01	35.234	BV

191	923074.338	1385957.73	35.254	BV
192	923081.651	1385954.11	35.382	BV
193	923079.382	1385949.07	35.426	BV
194	923071.697	1385952.71	35.291	BV
195	923069.318	1385947.25	35.167	BV
196	923076.271	1385942.61	35.339	BV
197	923073.139	1385937.4	35.248	BV
198	923065.491	1385941.44	35.165	BV
199	923063.087	1385936.42	35.155	BV
200	923070.087	1385932.56	35.271	BV
201	923066.752	1385927.48	35.267	BV
202	923060.551	1385931.28	35.129	BV
203	923063.963	1385929.52	35.238	EJE
204	923067.146	1385934.81	35.262	EJE
205	923069.858	1385939.74	35.266	EJE
206	923072.413	1385944.67	35.27	EJE
207	923075.226	1385950.23	35.35	EJE
208	923078.102	1385955.97	35.386	EJE
209	923080.559	1385961.32	35.382	EJE
210	923082.873	1385966.97	35.378	EJE
211	923084.946	1385971.98	35.375	EJE
212	923087.666	1385977.23	35.371	EJE
213	923089.951	1385982.23	35.368	EJE
214	923091.945	1385987.79	35.364	EJE
215	923094.033	1385994.04	35.36	EJE
216	923095.501	1385999.36	35.404	EJE
217	923097.663	1386005.52	35.41	EJE
218	923099.332	1386012.28	35.423	EJE
219	923100.788	1386018.91	35.512	EJE
220	923101.819	1386025.56	35.552	EJE
221	923102.76	1386031.68	35.566	EJE
222	923103.835	1386038.06	35.531	EJE
223	923105.047	1386045.29	35.501	EJE
224	923109.907	1386029.79	34.516	TN
225	923109.112	1386024.19	33.971	TN
226	923108.215	1386018.39	34.062	TN
227	923106.005	1386011.33	34.497	TN
228	923105.02	1386004.92	34.23	TN
229	923102.433	1385995.7	34.337	TN
230	923099.882	1385987.56	34.509	TN
231	923095.011	1385980.31	34.997	PTE
232	923094.113	1385971.55	34.473	TN
233	923090.697	1385964.6	34.434	TN
234	923087.963	1385958.12	34.287	TN
235	923081.01	1385945.07	34.538	TN
236	923073.88	1385933.5	34.311	TN
237	923067.644	1385924.28	34.55	PTE

238	923072.601	1385957.5	35.283	PTE
239	923073.746	1385963.4	34.69	PTE
239	923073.747	1385963.46	34.664	TN
240	923076.728	1385974.18	33.687	TN
241	923079.118	1385979.81	33.577	TN
242	923083.188	1385983.11	34.743	PTE
243	923084.109	1385989.14	34.465	TN
244	923087.956	1385997.2	35.014	PTE
245	923090.503	1386004.62	34.845	TN
246	923091.804	1386007.68	34.719	PTE
247	923093.229	1386013.43	34.589	TN
248	923094.331	1386017.48	35.026	TN
249	923095.118	1386025.14	35.01	TN
250	923096.082	1386034.8	34.496	TN
251	923097.47	1386039.81	34.547	PTE
252	923098.901	1386047.97	34.75	PTE
253	923099.4	1386056	34.826	PTE
254	923099.956	1386063.9	34.69	TN
255	923098.892	1386071.54	34.208	PTE
256	923099.75	1386079.91	34.485	TN
257	923099.694	1386079.9	34.507	TN
258	923100.519	1386090.43	34.875	TN
S-1	923075.629	1385941.18	35.366	S-1
M-2	923106.549	1386029.22	35.504	M-2
259	923057.925	1385928.15	35.062	BV
260	923064.212	1385923.77	35.254	BV
261	923060.132	1385917.91	35.253	BV
262	923053.977	1385922.15	35.189	BV
263	923049.687	1385915.86	35.187	BV
264	923055.206	1385911.21	35.335	BV
265	923050.985	1385905.67	35.295	BV
266	923045.03	1385909.65	35.169	BV
267	923039.892	1385902.97	35.14	BV
268	923045.485	1385898.56	35.252	BV
269	923039.757	1385891.78	35.357	BV
270	923034.212	1385896.21	35.191	BV
271	923029.65	1385890.66	35.187	BV
272	923034.863	1385886.01	35.369	BV
273	923028.708	1385878.54	35.436	BV
274	923023.045	1385882.94	35.279	BV
275	923016.924	1385876.1	35.35	BV
276	923022.402	1385871.26	35.49	BV
277	923017.096	1385865.26	35.514	BV
278	923011.37	1385869.03	35.36	BV
279	923006.049	1385863.18	35.302	BV
280	923010.425	1385858.66	35.498	BV
281	923008.204	1385860.53	35.288	EJE

282	923014.431	1385867.67	35.407	EJE
283	923019.457	1385873.64	35.415	EJE
284	923024.62	1385879.88	35.376	EJE
285	923030.999	1385887.36	35.282	EJE
286	923036.302	1385893.74	35.252	EJE
287	923040.831	1385899.25	35.234	EJE
288	923046.213	1385905.78	35.192	EJE
289	923052.153	1385913.39	35.277	EJE
290	923057.822	1385921.82	35.176	EJE
291	923061.866	1385927.36	35.173	EJE
292	923068.534	1385936.17	35.297	EJE
293	923075.225	1385935.5	34.389	TN
294	923070.982	1385929.09	34.595	TN
295	923067.381	1385923.93	34.465	TN
296	923063.122	1385917.98	34.612	TN
297	923058.697	1385911.36	34.468	TN
298	923053.792	1385905.17	34.609	TN
299	923049.363	1385899.36	34.57	TN
300	923045.174	1385893.29	33.959	TN
301	923041.557	1385889.53	34.36	TN
302	923035.677	1385882.53	34.502	TN
303	923030.198	1385876.17	34.475	TN
304	923025.357	1385869.61	34.721	TN
305	923020.346	1385863	34.358	TN
306	923014.791	1385856.23	34.74	TN
307	923003.891	1385864.55	34.537	TN
308	923012.046	1385875.04	34.054	TN
309	923018.792	1385883.27	34.095	TN
310	923024.037	1385889.22	34.09	TN
311	923033.959	1385902.75	33.552	TN
312	923040.61	1385909.89	33.778	TN
313	923047.444	1385918.5	34.195	TN
314	923055.662	1385930.11	33.997	TN
315	923040.651	1385906.13	34.963	PTE
316	923057.139	1385932.31	34.528	PTE
317	923063.294	1385944.45	34.418	TN
318	923067.778	1385954.23	34.048	TN
319	923073.452	1385964.75	34.372	TN
320	923041.571	1385891.71	33.393	OBRA
321	923042.363	1385892.69	33.379	OBRA
322	923041.63	1385888.4	33.786	OBRA
323	923045.684	1385893.44	33.65	OBRA
324	923041.449	1385891.69	35.118	OBRA
325	923041.474	1385891.65	35.048	OBRA
326	923041.669	1385888.76	34.077	OBRA
327	923045.384	1385893.41	33.907	OBRA
328	923029.842	1385898.29	33.549	OBRA

329	923033.747	1385903.27	33.18	OBRA
330	923033.973	1385899.85	33.135	OBRA
331	923033.043	1385898.82	33.114	OBRA
332	923034.114	1385899.89	34.998	OBRA
333	923034.172	1385902.58	33.991	OBRA
334	923030.166	1385898.29	33.522	OBRA
335	923034.178	1385902.65	33.844	OBRA
S-2	923009.224	1385855.7	35.645	S-2
336	923003.675	1385849.28	35.605	BV
337	922998.09	1385853.72	35.437	BV
338	922987.133	1385840.43	35.594	BV
339	922993.723	1385835.95	35.629	BV
340	922986.392	1385826.92	35.701	BV
341	922980.192	1385831.01	35.421	BV
342	922972.149	1385820.17	35.406	BV
343	922977.38	1385815.92	35.771	BV
344	922967.794	1385804.09	35.763	BV
345	922962.047	1385808.72	35.588	BV
346	922955.06	1385800.61	35.709	BV
347	922960.585	1385795.48	35.799	BV
348	922952.882	1385786.07	36.044	BV
349	922946.907	1385790.66	35.75	BV
350	922938.733	1385780.29	35.579	BV
351	922943.478	1385774.9	35.723	BV
352	922933.924	1385763.42	35.805	BV
353	922928.913	1385767.9	35.654	BV
354	922932.467	1385765.52	35.658	EJE
355	922940.523	1385776.84	35.729	EJE
356	922947.895	1385786.09	35.765	EJE
357	922953.279	1385792.61	35.826	EJE
358	922959.995	1385800.07	35.765	EJE
359	922967.329	1385808.93	35.615	EJE
360	922973.38	1385816.63	35.499	EJE
361	922980.649	1385825.83	35.54	EJE
362	922985.541	1385832.2	35.571	EJE
363	922991.929	1385840.23	35.5	EJE
364	922997.943	1385847.96	35.475	EJE
365	923004.219	1385855.23	35.504	EJE
S-3	922948.483	1385782.18	35.921	S-3
366	922935.256	1385763.27	35.818	BV
367	922928.194	1385766.7	35.624	BV
368	922922.952	1385747.51	35.821	BV
369	922917.021	1385752.19	35.686	BV
370	922908.12	1385741.29	35.7	BV
371	922915.941	1385739.27	35.746	BV
372	922900.748	1385731.92	35.584	BV
373	922905.648	1385727.23	35.718	BV

374	922893.227	1385722.32	35.624	BV
375	922897.915	1385718.02	35.692	BV
376	922885.58	1385713.02	35.491	BV
377	922890.355	1385708.98	35.698	BV
378	922877.948	1385703.69	35.505	BV
379	922882.563	1385699.64	35.723	BV
380	922870.42	1385694.47	35.702	BV
381	922875.204	1385690.66	35.662	BV
382	922862.555	1385684.67	35.669	BV
383	922867.55	1385680.67	35.733	BV
384	922854.825	1385675.36	35.62	BV
385	922860.437	1385670.68	35.77	BV
386	922847.437	1385665.92	35.617	BV
387	922853.12	1385661.37	35.64	BV
388	922839.758	1385655.34	35.661	BV
389	922845.511	1385651.19	35.627	BV
390	922832.607	1385645.32	35.302	BV
391	922837.17	1385639.75	35.627	BV
392	922824.606	1385635.39	35.68	BV
393	922829.589	1385631.14	35.67	BV
394	922816.217	1385626.01	35.717	BV
395	922821.204	1385621.44	35.874	BV
396	922808.585	1385617.3	35.714	BV
397	922814.592	1385612.3	35.704	BV
398	922800.988	1385607.54	35.757	BV
399	922806.058	1385602.6	35.925	BV
400	922792.805	1385597.66	35.734	BV
401	922797.781	1385592.77	35.994	BV
402	922784.99	1385588.17	35.601	BV
403	922789.823	1385583.12	35.886	BV
404	922777.013	1385577.99	35.802	BV
405	922781.321	1385572.82	35.924	BV
406	922768.87	1385568.08	35.644	BV
407	922781.461	1385572.72	35.866	BV
408	922761.424	1385558.33	35.781	BV
409	922773.104	1385562.5	35.759	BV
410	922766.642	1385554.29	35.983	BV
411	922766.698	1385554.27	35.719	BV
412	922753.64	1385548.67	35.928	BV
413	922759.153	1385544.44	35.901	BV
414	922747.149	1385539.95	35.623	BV
415	922752.369	1385535.96	35.783	BV
416	922739.261	1385530.71	35.857	BV
417	922744.901	1385526.51	35.877	BV
418	922731.793	1385521.41	35.699	BV
419	922737.439	1385517.08	35.869	BV
420	922724.126	1385512.33	35.661	BV

421	922729.816	1385507.19	35.785	BV
422	922717.82	1385504.16	35.558	BV
423	922723.778	1385499.59	35.696	BV
424	922711.735	1385495.55	35.536	BV
425	922716.416	1385490.8	35.743	BV
426	922704.66	1385486.4	35.852	BV
427	922709.385	1385482.8	35.691	BV
428	922706.929	1385484.7	35.778	EJE
M-6	922688.911	1385468.25	35.782	M-6
429	922717.006	1385496.62	35.747	EJE
430	922724.707	1385506.66	35.742	EJE
431	922732.122	1385515.95	35.868	EJE
432	922739.752	1385525.34	35.864	EJE
433	922746.538	1385533.28	35.86	EJE
434	922753.522	1385542.59	35.856	EJE
435	922762.005	1385553.16	35.934	EJE
436	922769.025	1385562.01	35.974	EJE
437	922776.001	1385571.04	35.923	EJE
438	922785.4	1385582.15	35.891	EJE
439	922793.137	1385591.55	35.926	EJE
440	922800.343	1385600.68	35.898	EJE
441	922806.9	1385608.75	35.868	EJE
442	922814.015	1385617.95	35.777	EJE
443	922822.998	1385628.2	35.771	EJE
444	922829.54	1385635.77	35.654	EJE
445	922838.266	1385646.81	35.604	EJE
446	922844.713	1385655.94	35.666	EJE
447	922852.35	1385666.03	35.731	EJE
448	922859.566	1385675.12	35.774	EJE
449	922867.857	1385686.05	35.682	EJE
450	922874.641	1385694.49	35.682	EJE
451	922883.616	1385705.15	35.69	EJE
452	922890.901	1385714.19	35.648	EJE
453	922895.678	1385720.19	35.657	EJE
454	922903.284	1385729.2	35.67	EJE
455	922910.341	1385738.42	35.712	EJE
456	922917.163	1385746.49	35.772	EJE
457	922923.246	1385753.57	35.818	EJE
458	922932.433	1385765.02	35.705	EJE
459	922696.272	1385476.52	35.757	BV
460	922701.672	1385472.93	35.862	BV
461	922688.58	1385466.59	35.808	BV
462	922693.495	1385461.74	35.84	BV
463	922680.554	1385456.11	35.828	BV
464	922685.517	1385451.94	35.824	BV
465	922672.341	1385446.87	35.744	BV
466	922678.023	1385441.53	35.662	BV

467	922664.403	1385437.99	35.67	BV
468	922670.464	1385432	35.673	BV
469	922656.447	1385426.93	35.615	BV
470	922661.997	1385422.3	35.695	BV
471	922648.905	1385417.69	35.596	BV
472	922653.61	1385413.12	35.657	BV
473	922640.519	1385408.28	35.597	BV
474	922645.054	1385403.81	35.57	BV
475	922632.346	1385399	35.537	BV
476	922637.1	1385394.82	35.534	BV
477	922624.571	1385390.13	35.717	BV
478	922629.92	1385386.2	35.624	BV
479	922617.275	1385380.43	35.742	BV
480	922623.027	1385377.44	35.72	BV
481	922609.27	1385370.22	35.763	BV
482	922615.813	1385367.96	35.726	BV
483	922602.219	1385361.08	35.754	BV
484	922607.453	1385356.87	35.844	BV
485	922593.926	1385350.21	35.684	BV
486	922598.624	1385345.35	35.804	BV
487	922586.295	1385340.49	35.829	BV
488	922591.693	1385335.78	35.741	BV
489	922579.287	1385330.47	35.771	BV
490	922584.792	1385326.95	35.745	BV
491	922572.312	1385320.72	35.596	BV
492	922577.144	1385316.89	35.684	BV
493	922565.091	1385311.26	35.494	BV
494	922568.948	1385305.96	35.506	BV
495	922558.866	1385303.55	35.284	BV
496	922564.302	1385299.54	35.636	BV
497	922561.559	1385301.47	35.57	EJE
498	922570.587	1385312.4	35.729	EJE
499	922577.679	1385322.39	35.793	EJE
500	922584.638	1385331.58	35.912	EJE
501	922589.699	1385338.94	35.84	EJE
502	922596.486	1385347.17	35.787	EJE
503	922601.089	1385353.77	35.806	EJE
504	922606.906	1385361	35.88	EJE
505	922612.35	1385368.69	35.873	EJE
506	922616.393	1385373.28	35.845	EJE
507	922622.548	1385381.8	35.779	EJE
508	922627.97	1385388.16	35.588	EJE
509	922633.477	1385395.11	35.637	EJE
510	922638.143	1385400.32	35.585	EJE
511	922644.454	1385407.91	35.555	EJE
512	922652.019	1385416.11	35.726	EJE
513	922660.107	1385425.58	35.741	EJE

514	922667.556	1385434.64	35.735	EJE
515	922674.658	1385443.25	35.793	EJE
516	922681.399	1385451.55	35.853	EJE
517	922689.363	1385461.44	35.841	EJE
518	922695.415	1385469.23	35.852	EJE
519	922701.793	1385478.25	35.76	EJE
