Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO No.: GN3407-2023

Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE ENERO - FEBRERO

PERIODO: 01/01/2024 AL 29/02/2024

San Juan de Pasto, 4 de marzo de 2024

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	4/03/2024	CON CORTE :	29/02/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

LINK SECOP II CONVENIO N°3407-2023:	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Contract+Notices+Management&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4662691
CONVENIO No:	GN3407-2023
PARTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Nit. 800.103.923-8 MUNICIPIO DE IPIALES, Nit. 800.099.095-7

CDP DPTO No.:	2023060578	FECHA:	23/06/2023
REGISTRO N°:	2023061321	FECHA:	28/06/2023

VALOR CONVENIO:	$ 299.843.029,06
APORTE DEPARTAMENTO :	$ 250.000.000,00
APORTE MUNICIPIO	$ 49.843.029,06
OBJETO DEL CONVENIO TRIPARTITA:	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FECHA DE INICIACION:	18/09/2023
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE MARZO DE 2024

MODIFICATORIO N°.01:	FECHA:	02 de noviembre de 2023
MODIFICATORIO N°.02:	FECHA:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO N°02:	N/A
CONTRATISTA DE OBRA:	JUAN ESTIVEN LUNA BUESACO C.C. No.: 87.218.556
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CARLOS ANDRÉS VILLAREAL TAPIA C.C. 87.719.251
SUPERVISOR:	GABRIEL OSEJO AGUIRRE
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION:	ANDRÉS ORTIZ GUERRERO

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	4/03/2024		CON CORTE :	29/02/2024
META FISICA	7,10 Km de mantenimiento vial			
PORCENTEJE ANTICIPO	40,00%			
TOTAL ANTICIPO	$ 100.000.000,00			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ -			
GARANTIAS:	PREVISORA SEGUROS			
Póliza de Cumplimiento No.:	3000771			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	36,50%	% EJECUTADO:	35,21%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO	40,00%
META FISICA A LA FECHA:	2,50	KM		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: Una vez contratada la Obra por parte del Municpio de Ipiales, y la Interventoría por parte del Departamento, se da inicio al proyecto desde el día 5 de febrero del presente año, y dentro de la ejecución se han llevado a cabo las sigusientes actividades:

Durante la primer semana se realiza la socialización del proyecto a la comunidad en general, el día nueve (9) de febrero del 2024, en el salón comunal de la vereda El Empalme, igualmente se realiza la conformación de la veeduría ciudadana, para la posterior inscripción ante la personería del municipio de Ipiales. En la presente semana no se ha ejecutado actividades contratctuales, por lo que no se evidencia porcentaje de avance en la ejecución de la conformación de la calzada existente con adición de material, debido a que el contratista de obra, está coordinando la adquisición de maquinaria.

En la semana N°2, comprendida entre el 12 y el 18 de febrero de 2024, no se presentó ningún avance dentro del proyecto, debido a la intensidad de las lluvias en el sector, motivo que imposibilitó el transporte de la maquinaria a la obra, se evidencia un atraso del 8%, la interventoría manifiesta que, el contratista de obra, se compromete a arrancar actividades en la semena siguiente.

En la semana N°3, comprendida entre el 19 y el 25 de febrero de 2024, inician labores de conformación de la calzada existente con adición de material, en el tramo 2 Libertad Sector 1 - Brisas de Rumiyaco, con un avance ejecutado del 14,08%, respecto al porcentaje de avance programado del 16,5%, atraso del 2,42%.

En la semana N°4, comprendida entre el 26 de febero y el 03 de marzo de 2024, terminan las actividades de conformación de la calzada existente con adición de material en el tramo 2 Libertad Sector 1 - Brisas de Rumiyaco, con una longitud total intervenida de 2,5 km de los 7,10 km equivalente a la meta física del proyecto.

Hasta el momento se tiene un avance del 35,21%, del 36,50 % programado. Existe un atraso del 1,29%, debido a que los inconvenientes por las fuertes lluvias, aún persisten, afecrando el óptimo avance del proyecto.

El objeto del convenio permite la ejecución de conformación de la calzada existente con adición de material a lo largo de 4,69km, a realizar a lo largo de los siguientes tramos de intervención:Tramo Empalme - Gavilanes: 2,37 kmTramo Libertad sector 1 - Brisas de Rumiyaco 2,37 kmTramo Libertad sector 2 - Santa Lucia: 2,37 km

ASPECTOS FINANCIEROS:

Se realiza el desembolso del Anticipo del Convenio, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/Cte, quivalente al 40% del aporte de la Gobernación de Nariño, según comprobande de Egreso N° 2023018167 del 27 de diciembre de 2023.

Se tiene un avance financiero del 40%..

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

El día 28 de junio de 2023, se suscribió Convenio entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 299.843.029,06).

Con fecha 30 de septiembre de 2023, el Municipio de Ipiales, adelantó proceso de Contratación No.SA 019 DE 2023 cuyo objeto corresponde al **"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANIA–JARDINES DE SUCUMBÍOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"** a través de plataforma SECOP I.

El día 7 de noveimbre de 2023, el Departamento de Nariño carga proceso de contratación No. IMC050-2023 objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"** en plataforma SECOP II.

El día 7 de diciembre de 2023, se suscribe contrato de obra entre el Municipio de Ipiales y el Ingeniero Victor Hugo Lopez Guamantica, el cual es cesionado al Ingeniero Juan Estiven Luna Buesaco el día 12 de diciembre de 2023.

El 23 de noviembre de 2023, se publica el comunicado de aceptación de oferta del contrato de interventoría No.3887-2023 a nombre del Ingeniero Carlos Andres Villarreal Tapia.

El día 2 de noviembre de 2023, se suscribe Modificatorio No.1 al convenio interadministrativo, mediante el cual se modifican los numerales 1 y 2 de la **CLAUSULA TERCERA - VALOR Y FORMA DE GIRO DE RECURSOS y VALOR Y FORMA DE GIRO DE RECURSOS.**

El día 5 de febrero de 2024, se suscribe Acta de Inicio del Contrato deObra N°676-2023, con fecha de terminación inicial del 17 de marzo de 2024 del año en curso.

El día 5 de febrero de 2024, se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Interventoría N°GN 3887-2023, con fecha de terminación inicial del 05 de mayo del año en curso.

ASPECTOS LEGALES:

Se legaliza el presente Convenio Interadministrativo el día 6 de septiembre de 2023.

Se legaliza Modificatorio N°1 al Convenio el día 16 de noviembre de 2023.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se envía solicitud al Municipio de Ipiales por medio de correto electrónico el día 04 de marzo de 2024, con el fin de solicitar documentación para adelantar el Modificatorio al Convenio Interadministrativo No. GN3407-2023, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Ipiales (Nariño) através del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "**MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO":**

Es importante mencionar que, el convenio tiene como fecha de terminación el 17 de marzo del año en curso.

Proyectó: **ANDRÉS ORTIZ GUERRERO**
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD

Revisó: **LUIS CASTILLO JOJOA**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernacion de Nariño

Aprobó: **GABRIEL OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO N°1: EL EMPALME - GAVILANES





TRAMO N°1: EL EMPALME - GAVILANES





TRAMO N°1: EL EMPALME - GAVILANES





TRAMO N°2: LIBERTAD SECTOR 1 - BRISAS DE RUMIYACO





Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

TRAMO N°2: LIBERTAD SECTOR 1 - BRISAS DE RUMIYACO






TRAMO N°2: LIBERTAD SECTOR 1 - BRISAS DE RUMIYACO






TRAMO N°3: LIBERTAD SECTOR 2 SANTA LUCÍA



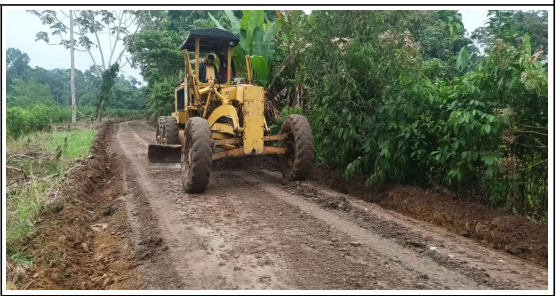

TRAMO N°3: LIBERTAD SECTOR 2 SANTA LUCÍA



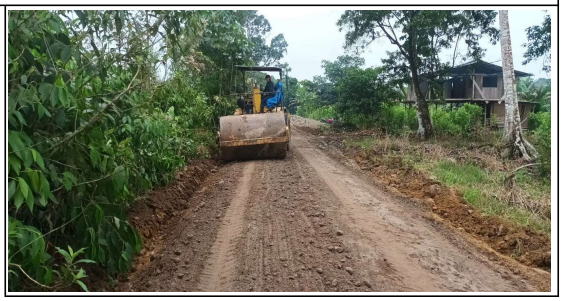

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

TRAMO N°3: LIBERTAD SECTOR 2 SANTA LUCÍA





Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**GN 3407-2023 del 28 de junio de 2023**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	FECHA PAGO	COM EGRESO
ANTICIPO		$ 100.000.000,00			$ 100.000.000,00			27 de diciembre de 2023	2023018167
TOTAL		**$ 100.000.000,00**		**$ 0,00**	**$ 100.000.000,00**				

AVANCE FISICO	35,21%
AVANCE FINANCIERO	40,00%

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No. GN3407 del 28 de junio de 2023

GARANTIAS:	Previsora Seguros

Póliza No.:	3000771

CUMPLIMIENTO - ANEXO 0	**FECHA APROBACION**	23/08/2023	**FECHA EXPEDICION**	18/08/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento del Contrato	$ 89.952.909,00	30%	16-ago-23	16-ago-24	Contrato Inicial	
Buen manejo de Anticipado	$ 100.000.000,00	40%	16-ago-23	16-ago-24	Contrato Inicial	

Póliza No.:	3000771

ACTULIZACION POLIZAS CUMPLIMIENTO - ANEXO 2 - ACTA DE INICIO	**FECHA APROBACION**	28/11/2023	**FECHA EXPEDICION**	13/10/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento del Contrato	$ 89.952.909,00	30%	18-sep-23	18-sep-24	Acta de Inicio	
Buen manejo de Anticipado	$ 100.000.000,00	40%	18-sep-23	18-sep-24	Acta de Inicio	
