MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3023 DE 2023

ACTA No. 7 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, ABRIL DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 17
5.1. Correspondencia Enviada 17
5.2. Correspondencia Recibida 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
7. ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

Teniendo en cuenta el alto deterioro de la superficie de rodadura en afirmado por la presencia de baches, la perdida de material granular a lo largo de la carretera, así como en los accesos de los puentes, se realizó la atención con suministro e instalación de material de afirmado con mano de obra de la cooperativa, por lo cual se recuperó el estado de la superficie en los tramos priorizados de la vía, contando con mejores condiciones para el tránsito vehicular.

De igual forma se reanudaron las actividades de mantenimiento rutinario, tales como: bacheo en afirmado, rocería y desmonte manual, limpieza de alcantarillas, recolección de basuras,

En referencia a las estructuras que presentan daños, se tiene: puente Guascayaco, Puente Tambor y Puente Congor, los cuales se intervienen en la ejecución del contrato de obra No.985 de 2022.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3023 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 7).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$208.938.177,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.938.177
	Valor Básico: $205.390.522
	Valor IVA: $ 3.547.655
Modificación No.2 de 2023	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.584.013
	Valor Básico: $205.042.372
	Valor IVA: $ 3.541.641
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 12.188.060.
Adicional No.2:	De fecha 29/02/2024 por valor $ 103.210.967
Valor total:	$323.983.040 M/Cte. incluido IVA.
Prórroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Prórroga No.2:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Limpieza manual de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
12/03/2024	30+300	30+330		X	60	2	SOL
14/03/2024	43+200	43+700		X	1.000	4	LLUVIA
	27+700	28+600		X	1.800	7	LLUVIA
20/03/2024	32+300	32+500		X	400	7	SOL
	47+700	48+250		X	1.100	6	SOL
21/03/2024	31+700	32+300		X	1.200	7	SOL
	47+050	47+700		X	1.300	4	SOL
23/03/2024	31+220	31+700		X	960	13	LLUVIA
	47+000	47+002		X	4	14	LLUVIA
26/03/2024	30+600	31+000		X	800	6	SOL
TOTAL					**8.624**	**70**	

Registro fotografico 14/03/2024





Registro fotografico 20/03/2024





Registro fotografico 21/03/2024





Registro fotografico 23/03/2024





Registro fotografico 26/03/2024







- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VIA	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
5/03/2024	34+530	35+450	920	6,00	552	2	SOL
20/03/2024	32+300	32+500	200	5,70	114	7	SOL
	47+700	48+250	550	5,60	308	6	SOL
21/03/2024	31+700	32+300	600	5,70	342	7	SOL
	47+050	47+700	650	5,60	364	4	SOL
26/03/2024	30+600	31+700	1.100	6,00	660	8	SOL
TOTAL					**2.340,00**	**34**	

Registro fotografico 05/03/2024 y 20/03/2024













Registro fotografico 21/03/2024





Registro fotografico 26/03/2024





- Limpieza de obras de drenaje >0.60m2

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
21/03/2024	31+900	31+950	2	2	SOL
	32+010	32+010	1	2	SOL
TOTALES			**3**	**4**	

Registro fotografico 21/03/2024



- Roceria y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
1/03/2024	31+000	32+450	1.450	2,00	2,20	6.090,00	13	SOL
2/03/2024	32+450	33+150	700	2,50	1,80	3.010,00	13	LLUVIA
4/03/2024	33+150	35+000	1.850	4,00	3,50	13.875,00	13	SOL
5/03/2024	35+000	36+700	1.700	2,50	2,00	7.650,00	11	SOL
6/03/2024	36+700	38+600	1.900	3,00	2,80	11.020,00	11	SOL
7/03/2024	38+600	39+800	1.200	2,80	2,50	6.360,00	13	LLUVIA
8/03/2024	39+800	41+000	1.200	2,30	2,00	5.160,00	13	LLUVIA
9/03/2024	41+000	42+000	1.000	2,90	2,50	5.400,00	13	LLUVIA
11/03/2024	42+000	44+020	2.020	2,50	2,00	9.090,00	13	SOL
12/03/2024	44+020	46+700	2.680	3,00	2,60	15.008,00	11	SOL
13/03/2024	46+700	49+000	2.300	2,80	1,90	10.810,00	13	SOL
15/03/2024	53+150	55+600	2.450	2,30	2,50	11.760,00	13	SOL
18/03/2024	50+800	53+150	2.350	2,50	3,00	12.925,00	13	SOL
19/03/2024	49+000	50+800	1.800	3,00	2,90	10.620,00	13	SOL
	0+	3+500	3.500	1,20	1,50	9.450,00	13	SOL
TOTAL						**138.228,00**	**189**	

Registro fotografico 01/03/2024





Registro fotografico 02/03/2024





Registro fotografico 04/03/2024





Registro fotografico 06/03/2024





Registro fotografico 08/03/2024





Registro fotografico 13/03/2024





Registro fotografico 18/03/2024





Registro fotografico 19/03/2024









- Poda de árboles y retiro de árboles caídos sobre la via

FECHA	PR		LONG (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
6/03/2024	24+500	24+900	400,00	800	2	SOL
27/03/2024	30+300	32+500	2200,00	4400	3	SECO
TOTALES				**5200**	**5**	

Registro fotografico 06/03/2024



Registro fotografico 27/03/2024





Recolección de basuras

FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
25/03/2024	24+500	55+600	31100	13	SOL
TOTAL			**31100**	**13**	

Registro fotografico 27/03/2024









Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA S.A.S - AMV2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO:1 AL 31 DE MARZO DE 2024

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																																RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza desde el PR30+0600 al PR32+0500, PR34+0530 al PR35+0450, PR47+0050 al PR48+0250
	E																																		
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Se realiza en el PR27+0700 al PR28+0600, PR30+0300 al PR30+0330, PR30+0600 al PR31+0000, PR31+0220 al PR32+0500, PR43+0200 al PR43+0700, PR47+0700 al Pr48+0250
	E																																		
Limpieza encoles y descoles	P																																			Se realiza en el PR31+0900 al PR31+0950, PR32+0010
	E																																		
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																		
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			Se realiza en el PR31+0900 al PR31+0950, PR32+0010
	E																																		
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																		
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			
	E																																		
Limpieza manual de lecho de río	P																																			
	E																																		
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																		
Despeje de derrumbes	P																																			No se presentaron derrumbes para atender duarnte este periodo
	E																																		
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			
	E																																		
Limpieza de postes de referencia	P																																			
	E																																		
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza desde el PR31+000 al PR55+0600 e intersección Puente Huitota PR47+0200
	E																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Se realiza en los PR24+0500 al PR24+0900, PR30+0300 al PR32+0500
	E																																		
Arborización	P																																			
	E																																		
Jardinería (empradización)	P																																			
	E																																		
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																		
Recolección de basuras	P																																			Se realiza desde el PR24+0500 al PR55+0600
	E																																		
Otros	P																																			Se realiza relleno en estribo No.1 en el puente Guayuyaco, PR29+0100
	E																																		
Emergencias	P																																			No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																																		
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																		

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Adicional No.2:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (13/03/2024)
Valor Contractual Final:	$563.765.699 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórroga No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024. (recursos adicional No.1)
Prórroga No.2:	Hasta el 14 de marzo de 2024 (redistribución de recursos)
Prórroga No.3:	Hasta el 20 de abril de 2024 (recursos adicional No.2)
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 20 de abril 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
En el presente periodo no se remitieron oficios			

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
En el presente periodo no se recibieron oficios			

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de abril de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 2971 DE 2023

ACTA No. 7 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ). LOTE 6.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A. NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARÁ. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, ABRIL DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 23
5.1. Correspondencia Enviada 23
5.2. Correspondencia Recibida 23
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
7. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento Corazón del Putumayo C.T.A. tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 2+0750 (EL PORVENIR) y el PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

Para el mantenimiento rutinario de la vía 6501, la Administración Vial en coordinación con el personal de la cooperativa, llevaron a cabo las actividades de bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, rocería, limpieza de obras de arte, limpieza de señales verticales y recolección de basuras, para mantener las condiciones de la infraestructura vial. El estado general de la vía es bueno, no obstante, hay tramos que necesitan de intervención de mantenimiento periódico, tal como, conformación de calzada y adición de material de afirmado.

En el mes de marzo, el contrato de mejoramiento y mantenimiento No.985 de 2022, realizó actividades en conformación de terraplenes, principalmente en el tramo entre el PR4+0000 – PR9+0000.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	2971 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicios de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. Sectores 6501, Villagarzón - San José del Fragua, PR 2+0750 (El Porvenir) - PR 24+0000 (Río Caquetá). Lote 6.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento y Conservación de Vías Corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1.
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandará. C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$126.814.310 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.814.310
	Valor Básico: $124.661.073
	Valor IVA: $ 2.153.237
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.599.351
	Valor Básico: $124.449.764
	Valor IVA: $ 2.149.587
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $7.397.501.
Adicional No.2:	De fecha 29/02/2024 por valor $62.650.697.
Valor total:	$196.647.549 M/Cte valor incluido IVA
Prórroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Prórroga No.2:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320-451 06 44
Domicilio Contratista:	Sector urbano, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		AREA (M2)	PORCENTAJE AFECTACION	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
1/03/2024	21+750	21+752	12	10%	1,2	8	SOL
26/03/2024	23+780	23+880	600	10%	60	5	SOL
TOTAL					**61,18**	**13**	

Registro fotográfico









- Limpieza manual de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
1/03/2024	19+300	20+000		X	1.400	8	SOL
	21+750	21+752		X	2	8	SOL
	22+700	22+702		X	4	8	SOL
2/03/2024	14+800	15+000		X	400	8	LLUVIA
4/03/2024	16+750	17+250		X	1.000	8	SOL
5/03/2024	16+000	16+750		X	1.500	8	LLUVIA
6/03/2024	15+000	16+000		X	2.000	8	LLUVIA
7/03/2024	14+150	15+000		X	1.700	8	LLUVIA
8/03/2024	13+450	14+150		X	1.400	7	LLUVIA
27/03/2024	13+350	20+460		X	14.220	3	SOL
TOTAL					**23.626,00**	**74**	

Registro fotográfico 01/03/2024













Registro fotográfico 02/03/2024





Registro fotográfico 04/03/2024









Registro fotográfico 05/03/2024









Registro fotográfico 07/03/2024





Registro fotográfico 08/03/2024





Registro fotográfico 27/03/2024









- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
23/03/2024	2+750	3+200	450	1,00	1,00	900	8	LLUVIA
26/03/2024	20+970	21+700	730	2,00	2,20	3066	3	SOL
27/03/2024	11+950	12+400	450	2,20	2,00	1890	3	SOL
TOTAL						**5856**	**14**	

Registro fotográfico 23/03/2024









Registro fotográfico 26/03/2024





Registro fotográfico 27/03/2024









- Limpieza de obras de drenaje >0.60 m2

FECHA	PR		UND	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
2/03/2024	14+600		1	8	LLUVIA
	14+900		1	8	LLUVIA
9/03/2024	9+350	9+800	4	7	LLUVIA
11/03/2024	9+800	10+900	6	8	NUBLADO
12/03/2024	10+900	12+900	6	8	LLUVIA
13/03/2024	12+900	15+500	11	8	SOL
14/03/2024	15+500	17+250	7	8	LLUVIA
15/03/2024	17+250	19+000	7	8	SOL
18/03/2024	19+050	20+450	7	8	SOL
19/03/2024	20+750	22+750	6	8	SOL
TOTAL			**56**	**79**	

Registro fotográfico 09/03/2024





Registro fotográfico 11/03/2024





Registro fotográfico 12/03/2024









Registro fotográfico 12/03/2024





Registro fotográfico 14/03/2024





Registro fotográfico 15/03/2024





Registro fotográfico 19/03/2024





- Mantenimiento de puentes y pontones

FECHA	PR		LONGITUD PUENTE Y/O PONTÓN (ML)	UND	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
9/03/2024	9+500	9+510	10	1	7	LLUVIA
14/03/2024	17+050	17+062	12,4	1	8	LLUVIA
21/03/2024	23+300	23+318	18,0	1	8	SOL
TOTALES			**40,4**	**3**	**23**	

Registro fotográfico 09/03/2024



Registro fotográfico 14/03/2024





Registro fotográfico 21/03/2024



- Limpieza de postes de referencia

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/03/2024	2+750	9+500	7	8	SOL
	18+200	24+000	6	8	SOL
21/03/2024	9+500	18+200	9	8	SOL
TOTALES			**22**	**24**	

Registro fotográfico 20/03/2024





Registro fotográfico 21/03/2024









- Limpieza de señales verticales

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/03/2024	18+200	24+000	32	8	SOL
21/03/2024	13+450	18+200	25	8	SOL
23/03/2024	10+250	13+450	12	8	LLUVIA
TOTALES			**69**	**24**	

Registro fotográfico 20/03/2024





Registro fotográfico 21/03/2024





Registro fotográfico 23/03/2024





- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONG. TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
20/03/2024	2+750	9+500	13500	8	SOL
21/03/2024	9+500	24+000	29000	8	SOL
TOTALES			**42500**	**16**	

Registro fotográfico 20/03/2024





Registro fotográfico 21/03/2024













Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: 1 al 31 de marzo de 2024

INDICADOR		PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)																						OBSERVACIONES
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Bacheo en Afirmado	P																								Se realizó en el PR21+0750, desde el PR23+0780 al PR23+0880
	E																								
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																								Se realizó limpieza de cunetas desde el PR13+0350 al PR20+0460, PR22+0700, PR21+0750
	E																								
Limpieza encoles y descoles	P																								Se realiza limpieza de descole cuneta PR21+0750
	E																								
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																								
	E																								
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																								Se realiza limpieza de obras sus encoles y descoles desde el PR9+0350 al PR22+0750,
	E																								
Limpieza de pequeñas obras	P																								
	E																								
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																								Limpieza puente Uchupayaco PR9+0500, puente Sardinas (se realiza limpieza de lecho de rio) PR17+0050, puente La Pajalosa PR23+0300
	E																								
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																								
	E																								
Despeje de derrumbes	P																								No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																								
Limpieza de calzada	P																								
	E																								
Rocería y desmonte	P																								Se realizó desde el PR2+0750 al PR3+0200, PR11+0950 al PR12+0400, PR20+0970 al PR21+0700
	E																								
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																								
	E																								
Arborización	P																								
	E																								
Limpieza de postes de referencia y señales verticales	P																								Se realiza desde el PR2+0750 al PR24+0000
	E																								
Pintura de mojones y reposición	P																								
	E																								
Recoleccion de basuras	P																								Se realiza desde el PR2+0750 al PR24+0000
	E																								
Otros	P																								Mantenimiento plántulas PR11+0300 al PR12+0900; Obras menores y preventivas PR20+0300; arreglo de fallo (hundimiento de banca) PR13+0650, PR15+0700, PR16+0050, PR20+0070; retiro de árboles de la banca PR13+0950, PR22+0450
	E																								
Emergencias	P																								No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																								
Vigilancia y monitoreo	P																								INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VÍA A CARGO EN HORAS DE LA MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE
	E																								

PROGRAMADO EJECUTADO PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Adicional No.2:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (13/03/2024)
Valor Contractual Final:	$563.765.699 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórroga No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024. (recursos adicional No.1)
Prórroga No.2:	Hasta el 14 de marzo de 2024 (redistribución de recursos)
Prórroga No.3:	Hasta el 20 de abril de 2024 (recursos adicional No.2)
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 20 de abril 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
21/03/2024	CTO 2585-2023-169	Cooperativa Corazón del Putumayo	Observaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo, según recorrido el día 15 de marzo 2024

5.2. Correspondencia Recibida:

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
En el presente periodo no se recibieron oficios			

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de abril de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3002 DE 2023

ACTA No. 7 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) /4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 5.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA. NIT. 800.102.361-4. R/L MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA. CC. No. 1.064.676.650 DE SOTARÁ - CAUCA**

MOCOA, ABRIL DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1. Información General 5
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 6
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 22
5.1. Correspondencia Enviada 22
5.2. Correspondencia Recibida 22
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
7. ANEXOS 23

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía tiene a cargo los sectores comprendidos entre el PR 60+0300 (Ye Urcusique) y el PR 77+1000 (Mocoa) de la Carretera 4502 Santana – Mocoa; el sector entre el PR 0+0000 y el PR 1+0600 (paso nacional por Mocoa) de la Carretera 4503 Mocoa – Pitalito; y la vía Perimetral a Mocoa, con longitud total a atender de 21.83Km.

2.2. Estado de la vía

La carretera 4502, Santa Ana – Mocoa, sector La Ye de Urcusique - El Pepino – Mocoa, se encuentra en buen estado en general, en este periodo se realizó actividad de conformación de calzada con adición de material y bacheo entre el PR60+0300 al PR67+0000, por lo cual mejora las condiciones de transitabilidad, interviniendo los sectores afectados por las lluvias y el tránsito vehicular.

Los sectores pendientes de intervención por perdida parcial de banca e inestabilidad de taludes, se tiene: PR61+0400 y PR65+0300 (instabilidad talud), PR70+0020 y PR70+0242 (perdida parcial de banca).

Entre las necesidades de la vía se requiere la demarcación horizontal y vertical para complementar la existente o en tramos de alta accidentalidad.

La carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector Paso Nacional por Mocoa, la superficie de rodadura fue intervenida en este periodo en la ejecución del contrato No. 3821 de 2023 cuyo objeto es el “Mantenimiento del paso Nacional por el municipio de Mocoa (PR 0+0000 - PR 1+0600) Departamento del Putumayo”, realizando la actividad de instalación de sobre carpeta con mezcla asfáltica sin intervención en las capas subyacentes del pavimento.

Los tramos en los que se llevó a cabo la sobre carpeta corresponden a:

Calzada Izquierda

- PR 0+0478 – PR0+0716 carril derecho.
- PR0+0716 – PR1+0292 calzada completa

Calzada derecha

- PR0+0570 – PR0+0740 carril izquierdo.
- PR0+0980 – PR1+1020 carril izquierdo.

En los tramos de mantenimiento no se realizó señalización horizontal de líneas de borde ni de eje.

Por lo anterior la vía cuenta con buen estado en los tramos intervenidos, sin embargo, en los sectores que no se ejecutó el contrato, continúa el alto desgaste del pavimento rígido por alcanzar su vida útil, presentando deterioros tipo fisuras, grietas, baches, pulimento, cabezas duras, perdida de sello en juntas, parcheo, descascaramiento, entre otros, por lo cual requieren atención por medio de actividades de mantenimiento periódico, rehabilitación o reconstrucción.

En la carretera Perimetral de Mocoa, el tramo vial cuenta con longitud 2.3Km en pavimento de concreto rígido, en general buen estado, con presencia de fisuras puntuales y algunas losas fracturadas.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3002 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. sectores 4502, Santa Ana - Mocoa, Ye Urcusique - Mocoa, PR 60+0300 - PR 77+1000 (Mocoa) /4503, Mocoa - Pitalito, Paso nacional por Mocoa, PR 0+0000 - PR 1+0600/carretera perimetral de Mocoa. lote 5.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía. NIT. 800.102.361-4
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Maira Leonela Burbano Chicangana. C.C. No. 1.064.676.650 de Sotará – Cauca.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	27 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$112.576.454 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.576.454
	Valor Básico: $110.664.968
	Valor IVA: $ 1.911.486
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.385.630
	Valor Básico: $110.477.384
	Valor IVA: $ 1.908.246
Adicional No.1:	De fecha 18/12/2023 por valor $ 4.690.686.
Adicional No.2:	De fecha 29/02/2029 por valor $ 57.663.196.
Valor total:	$174.739.512 M/Cte. incluido IVA.
Prorroga No.1:	Hasta el 31 de enero de 2024.
Prorroga No.2:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Suspensión No.1:	Desde el 29 de enero hasta 27 de febrero de 2024. Fecha de reanudación 28 de febrero de 2024.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 30 de abril de 2024.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor de Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	312-658 13 50
Domicilio Contratista:	Vereda San José del Pepino, Mocoa, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado Vía 4502 Santa Ana – Mocoa

FECHA	PR		ANCHO PROMEDIO VIA	AREA (M2)	PORCENTAJE AFECTACION	AREA BACHEO (M2)
	INICIAL	FINAL				
1/03/2024	62+200	62+700	6,00	3.000	10%	300
2/03/2024	62+700	63+000	6,00	1.800	10%	180
4/03/2024	63+000	63+800	6,00	4.800	10%	480
5/03/2024	63+800	64+500	5,80	4.060	10%	406
6/03/2024	64+500	65+350	6,00	5.100	10%	510
7/03/2024	65+350	65+800	6,00	2.700	10%	270
8/03/2024	65+800	66+300	6,00	3.000	10%	300
9/03/2024	66+300	66+500	5,70	1.140	10%	114
10/03/2024	66+300	66+500	6,70	1.340	10%	134
12/03/2024	66+500	67+000	7,70	3.850	10%	385
12/03/2024	66+300	66+500	8,70	1.740	10%	174
TOTAL				**32.530,00**		**3.253,00**

Registro fotográfico 01/03/2024





Registro fotográfico 02/03/2024





Registro fotográfico 04/03/2024





Registro fotográfico 06/03/2024





Registro fotográfico 08/03/2024





Registro fotográfico 12/03/2024





- Limpieza manual de cunetas en la vía 4502 Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
1/03/2024	62+200	62+700		X	1.000,00	7	SOL
2/03/2024	62+700	63+000		X	600,00	7	LLUVIA
4/03/2024	63+000	63+800		X	1.600,00	7	SOL
5/03/2024	63+800	64+500		X	1.400,00	7	SOL
6/03/2024	65+300	65+350		X	100,00	7	SOL
7/03/2024	65+350	65+800		X	900,00	7	SOL
8/03/2024	65+800	66+300		X	1.000,00	7	LLUVIA
9/03/2024	66+300	66+500		X	400,00	7	LLUVIA
11/03/2024	66+900	67+300	X	X	800,00	4	LLUVIA
15/03/2024	74+000	74+100	X		200,00	2	SOL
27/03/2024	76+400	78+000	X		3.200,00	7	NUBLADO
TOTAL					**11.200,00**	**69**	

Registro fotográfico 05/03/2024



Registro fotográfico 06/03/2024





Registro fotográfico 08/03/2024





Registro fotográfico 11/03/2024





Registro fotográfico 15/03/2024






Registro fotográfico 27/03/2024





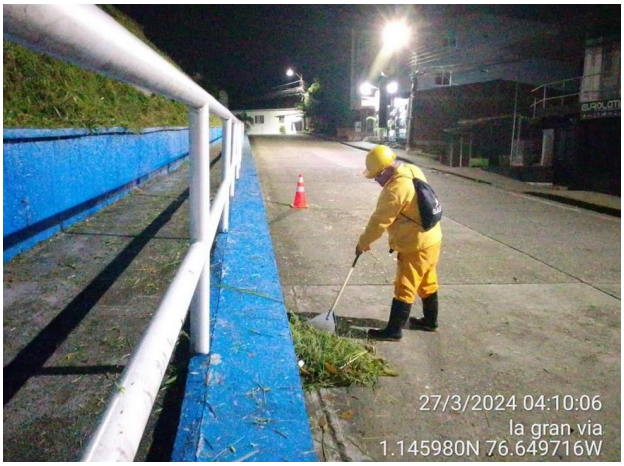



- Limpieza de obras de drenaje >0.60m2 en la vía 4502 Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
12/03/2024	66+560	67+030	7	4	LLUVIA
13/03/2024	65+050	66+560	10	4	SOL
14/03/2024	60+300	64+000	27	4	LLUVIA
15/03/2024	64+000	65+050	11	2	SOL
	67+000	67+700	6	3	SOL
TOTAL			**61**	**17**	

Registro fotográfico 12/03/2024





Registro fotográfico 13/03/2024





Registro fotográfico 14/03/2024





Registro fotográfico 15/03/2024





- Limpieza manual de cunetas en la vía 4503 Paso nacional por Mocoa.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
26/03/2024	0+	1+600	X		3.200,00	7	SOL
TOTAL					**3.200,00**	**7**	

Registro fotográfico 26/03/2024





- Limpieza manual de cunetas en la vía Perimetral de Mocoa.

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
19/03/2024	0+	1+000	X		2.000,00	7	SOL
20/03/2024	1+000	2+300	X		2.600,00	7	SOL
TOTALES					**4.600,00**	**14**	

Registro fotográfico 19/03/2024





Registro fotográfico 20/03/2024





- Rocería y desmonte manual en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
27/03/2024	76+400	78+000	1600,00	1,50	1,20	4.320,00	7	SOL
TOTALES						**4.320,00**	**7**	

Registro fotográfico 27/03/2024





- Rocería y desmonte manual en la vía 4503 Santa Ana - Mocoa

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
26/03/2024	0+	1+600	1600,00	0,80	0,80	2.560,00	7	SOL
TOTALES			**1600,00**			**2.560,00**	**7**	

Registro fotográfico 26/03/2024





- Rocería y desmonte manual en la vía Perimetral Mocoa

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
18/03/2024	0+	1+000	1000,00	1,50	1,50	3.000,00	7	SOL
19/03/2024	1+000	2+000	1000,00	1,20	1,50	2.700,00	7	SOL
20/03/2024	2+000	2+300	300,00	1,60	1,50	930,00	7	SOL
TOTALES			**2300,00**			**6.630,00**	**21**	

Registro fotográfico 18/03/2024





Registro fotográfico 19/03/2024





Registro fotográfico 20/03/2024





- Limpieza de calzada vía 4502 Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		LONG (ML)	ANCHO PROMEDIO	ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
16/03/2024	77+680	77+700	20,00	2	40,00	7	SOL
30/03/2024	77+620	77+640	20,00	1,5	30,00	7	SOL
	74+100	74+120	20,00	1,5	30,00	7	SOL
TOTALES			**60,00**		**100,00**	**21**	

Registro fotográfico 16/03/2024





Registro fotográfico 30/03/2024





- Limpieza de calzada vía 4503 Paso Nacional por Mocoa.

FECHA	PR		LONG (ML)	ANCHO PROMEDIO	ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL					
16/03/2024	0+120	0+125	5,00	4,0	20	7	SOL
	0+400	0+450	50,00	3,0	150	7	SOL
	0+600	0+800	200,00	3,0	600	7	SOL
30/03/2024	0+400	0+450	50,00	3	150	7	SOL
	0+600	0+620	20,00	2	40	7	SOL
TOTALES					**960**	**35**	

Registro fotográfico 16/03/2024





- Poda de árboles vía Perimetral de Mocoa.

FECHA	PR		LONG.TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
21/03/2024	2+000	2+300	600	7	SOL
TOTALES			**600**	**7**	

Registro fotográfico 21/03/2024





- Recolección de basuras vía 4502 Santa Ana – Mocoa

FECHA	PR		LONG (ML)	LONG. TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
23/03/2024	67+000	77+000	10.000,00	20000	7	SOL
.				**20000**	**7**	

Registro fotográfico 23/03/2024





- Recolección de basuras vía Perimetral de Mocoa.

FECHA	PR		LONG (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
21/03/2024	0+	2+300	2.300,00	4600	7	SOL





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA
PERIODO: 1 al 31 de marzo de 2024

INDICADOR		4502, SANTA ANA - MOCOA (PR 60+0300 - PR 77+1000)																		4503			PERIMETRAL MOCOA	OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	0	1	2		
Bacheo Carreteras Pavimentadas	P																							Se realiza en el PR1+0600 vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																							
Parcheo Carreteras Pavimentadas	P																							
	E																							
Bacheo en Afirmado	P																							Se realizó desde el PR62+0200 al PR66+0500, en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realizó desde el PR62+0200 al PR67+0300, PR74+0000 al PR74+0100, PR76+0400 al PR78+0000(se realizaron limpieza de desagües) en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+ al PR1+0600 en la vía 4503 Mocoa-Pitalito; PR0+ al PR2+0300 carretera Perimetral Mocoa sin código
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras >0,60 m2	P																							Se realizó desde el PR60+0300 al PR67+0700 en la vía 4502 Santa Mocoa
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (Lecho de rio)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																							
Limpieza de calzada	P																							Se realiza en el PR74+0100, PR77+0620, PR77+0700 en la via 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0120, PR0+0400. PR0+0600 en la vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realiza en el PR76+0400 al PR77+1000 en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+ al PR1+0600 en la vía 4503 Mocoa-Pitalito; PR0+ al PR2+0300 carretera Perimetral Mocoa sin código
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							Se realiza poda de árbol en derecho de vía en el PR2+0000 al PR2+0300 en la carretera Pemitral Mocoa sin código
	E																							
Recolección de Basuras	P																							Se realiza en el PR67+0000 al PR77+0000 en la vía 4502 Santa Ana -Mocoa; PR0+ al PR2+0300 en la Carretera Perimetral Mocoa sin código
	E																							
Limpieza de señales, defensas metálicas y mojones	P																							
	E																							
Pintura de resaltos (reductores de velocidad)	P																							
	E																							
Emergencias	P																							No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																							
Otros																								
Inspección y vigilancia	P																							INSPECCIÓN DE LAS VÍAS A CARGO 4502 Y 4503, Y CARRETERA PERIMETRAL MOCOA SE REALIZA EN JORNADA MAÑANA Y TARDE
	E																							

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicional No.1:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (18/12/2023)
Adicional No.2:	$93.960.950 M/Cte. incluido IVA (13/03/2024)
Valor Contractual Final:	$563.765.699 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórroga No.1:	Hasta el 29 de febrero 2024. (recursos adicional No.1)
Prórroga No.2:	Hasta el 14 de marzo de 2024 (redistribución de recursos)
Prórroga No.3:	Hasta el 20 de abril de 2024 (recursos adicional No.2)
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 20 de abril 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
En el presente periodo no se remitieron oficios			

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
En el presente periodo no se recibieron oficios			

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 05 de abril de 2024.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo 2
