CONTRATO DE OBRA No. 217 DEL 2022

INFORME DE OBRA No. 14

INFORME PARCIAL DE AVANCE DE OBRA

FINAL [ ] **PARCIAL** [X] **No. 14**

Periodo: del 01 de febrero 2024 al 29 de febrero de 2024.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	217 de 2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR INICIAL	$ 5.106.990.466
PLAZO	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
ANTICIPO 40%:	$ 2.042.796.186,40
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PMA SUAZA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
SUPERVISOR	ING. YESID ROJAS PEÑA
CONTRATANTE	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACION	28 DE MARZO 2024
INTERVENTOR:	SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S

Tabla No. 1 Relación de Pólizas de contrato de Obra inicial

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101195530	28/12/2022	28/11/2024	**$ 1.532.097.140**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101195530	28/12/2022	28/11/2024	**$ 2.042.796.187**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101195530	28/12/2022	28/03/2027	**$ 1.021.398.094**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101195530	5 AÑOS APARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 1.532.097.140**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101050935	28/12/2022	28/03/2024	**$ 500.000.000**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Este informe tiene como objetivo general dejar constancia del desarrollo de las acciones y actividades de obra que se han realizado durante el mes de febrero del 2024, de acuerdo a la ejecución del contrato de obra No. 217 de 2022.

Se detallan a continuación las actividades realizadas por la Unión Temporal PMA SUAZA, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en progreso de la ejecución de las labores realizadas para la "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Se describen los detalles de las diligencias contractuales realizadas por la Unión Temporal PMA SUAZA en cada uno de los componentes técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo, sociales y ambientales correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024. Igualmente se relacionan los hechos y sucesos más relevantes de las actividades ejecutadas durante el periodo en cuestión.

En este informe también se describe el estado y avance físico del contrato de obra y consecutivamente se relaciona la información financiera programada versus la inversión financiera ejecutada de acuerdo la programación del cronograma de obra y con el avance físico real los procesos constructivos desarrollados.

Es de resaltar que todas las actividades realizadas por la Unión Temporal PMA Suaza, se han informado y comunicado a la interventoría y a la supervisión técnica del contrato a cargo de Aguas del Huila. Por ello, se ha llevado a cabo la coordinación de todas y cada una de las actividades ejecutadas hasta la fecha, lo cual ha sido muy importante para la toma de decisiones en campo, evitando así, inconvenientes, retrasos o aplazamientos en el progreso de las actividades constructivas.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades y hechos más relevantes desarrollados en cada frente de obra durante el periodo en cuestión.

Frente de obra Planta De Tratamiento Agua Potable (Optimización):

- Desde el día 01 de febrero al 08 de febrero se recibe en situ acero, se continua con el corte y figurado del acero para continuar con el amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.
- El día 02 de febrero al 12 de febrero se inicia la actividad de localización y replanteo de niveles para empezar la excavación manual, para la instalación de la tubería que conecta la caja de salida con la caja de reparto de tanques y caja de entrada del tanque de almacenamiento.
- El 13 de febrero se instala arena para colchón y protección de la tubería biaxial de D= 8".
- Se instalan cuatro (4) pasa muros de D=6" para auto lavado de filtros y un (1) pasa muro de D = 8" para la salida del agua tratada de la planta, los cuales fueron fijados en el acero amarrado con soldadura para evitar movimiento en el momento del vaciado de concreto.
- El 14 de febrero se realizó la instalación de la cinta PVC para de retención de agua sobre los muros perimetrales del primer nivel. Con esta cinta se busca evitar las filtraciones de agua en la estructura del tanque, tal y como quedo esta especificado en el plano de diseño.
- Desde el día 15 de febrero al 26 de febrero se recibe en situ acero, se continua con el corte y figurado del acero para continuar con el amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.
- El día 27 de febrero Instalación de DISPOSITIVOS EN C los cuales funcionan para el retro lavado de los filtros.

Frente de obra Tanque de Almacenamiento de Agua:

- Durante todo el proceso constructivo se hizo la demarcación y señalización del área de trabajo para evitar el ingreso de personal no autorizado y de animales a la zona de trabajo.

- El día 01 de febrero se inician las actividades de instalación de accesorios en la caja de entrada la cual permite la conexión del agua proveniente de la planta de tratamiento de agua potable hasta el tanque existente, instalando respectivamente los elementos necesarios para controlar el ingreso del agua al tanque por medio de VÁLVULA DE COMPUERTA ÉLASTICA HD D=8" EXTREMOS BRIDA.

- El día 13 de febrero luego de realizar el corte y pulir la rebaba se procede a realizar lavado de piso y muros perimetrales internos para eliminar residuos no deseados y posteriormente aplicar el producto acordado por la entidad contratante, interventoría y contratista.

- El día 15 hasta el día 17 de febrero se realiza la instalación de 2 tubos de D=8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del tanque de almacenamiento, se procede a instalar acero de refuerzo con varilla de ½ y sus respectivos estribos.

- El día 18 de febrero se realizan resanes en la placa superior del tanque de almacenamiento por la parte interna.

- Se retira formaleta utilizada para el soporte de la placa superior de la caja de salida del tanque.

- Se toman niveles desde la caja de salida del tanque hasta donde esta proyectado realizar el pozo el cual será utilizado para recolectar el agua utilizada para lavado y/o rebose del tanque; además el agua lluvia depositada por cuneta perimetral en el tanque.

- El día 21 de febrero de se inició la instalación de los accesorios en la caja de salida, la cual permite la conexión del agua proveniente del tanque de almacenamiento hasta la conexión con la línea express, instalando respectivamente los elementos necesarios para controlar la salida del agua al tanque por medio de VÁLVULA DE COMPUERTA ÉLASTICA HD D=8" EXTREMOS BRIDA, además accesorios para lavado y rebose de tanque.
- Excavación mecánica, para la aplicación de producto para sellar la junta que permite filtración en el tanque por el costado de la vía de acceso, además la excavación mecánica y movimiento de rocas para la instalación de tubería de D=8" y D=10" de salida de agua potable y salida de agua del sistema de lavado.
- Excavación manual según diseño para la instalación de la tubería de desagüe desde el cerco hasta el pozo de descarga.

En el ***anexo 1*** del presente informe de obra, se adjunta la copia de la Bitácora de campo por cada frente de obra (planta de tratamiento de agua potable, red de distribución y estructura del tanque de almacenamiento de agua), en la cual se registraron las actividades realizadas y los hechos más relevantes durante el periodo en cuestión.

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS AL 30/12/2023	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	28/12/2022	**364 DÍAS**		28/12/2023
Socialización	28/01/2023			
Plazo adicional	28/03/2024			28/03/24

Avance físico de las Obras

En la planta de tratamiento de agua potable instalación de acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento, para la instalación de la tubería que conecta la caja de salida con la caja de reparto de tanques y caja de entrada del tanque de almacenamiento, instalación de cuatro (4) pasa muros de D=6" para auto lavado de filtros y un (1) pasa muro de D = 8" para la salida del agua tratada de la planta, Instalación de DISPOSITIVOS EN C los cuales funcionan para el retro lavado de los filtros.

En el tanque de almacenamiento instalación de accesorios en la caja de entrada la cual permite la conexión del agua proveniente de la planta de tratamiento de agua potable hasta el tanque existente, corte y pulir la rebaba, instalación de 2 tubos de D=8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del tanque de almacenamiento, instalación de los accesorios en la caja de salida, instalación de tubería de D=8" y D=10" de salida de agua potable y salida de agua del sistema de lavado.

Imagen 1. Actividades programadas mes 14 – febrero de 2024

DEPARTAMENTO DEL HUILA - MUNICIPIO DE SUAZA

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA"
CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRAS Y FLUJO DE INVERSIONES

DE FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2023

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR TOTAL	MES 9 Septiembre de 2023	MES 10 Octubre 2023	MES 11 Noviembre 2023	MES 12 Diciembre 2023	MES 13 Enero 2024	MES 14 Febrero 2024	MES 15 marzo 2024	
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
1.0	TRAMITES Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATO REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PLANEACIÓN Y PRELIMINARES DE OBRA (ENTREGA DE TUBERÍA 8")									
2.0	LINEA DE ADUCCION DESARENADOR - PTAP	$ 761.210.486	$ 63.434.207	$ 63.434.207						$ 761.210.486
3.0	OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	$ 1.295.439.698				$ 8.710.527	$ 299.365.754	$ 493.681.709	$ 493.681.709	$ 1.295.439.698
4.0	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	$ 1.679.885.886	$ 279.980.981	$ 279.980.981	$ 55.996.196	$ 55.996.196	$ 83.994.294	$ 223.984.785		$ 1.679.885.886
5.0	OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	$ 349.056.302	$ 87.264.076	$ 87.264.076	$ 87.264.076	$ 43.632.038	$ 43.632.038			$ 349.056.302
	TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS	$ 4.085.592.373.00	$ 430.679.263.67	$ 430.679.263.67	$ 143.260.271.70	$ 108.338.760.95	$ 426.992.085.95	$ 717.666.493.55	$ 493.681.708.75	$ 4.085.592.372.40
	PORCENTAJE PROGRAMADO MENSUALMENTE		10.54%	10.54%	3.51%	2.65%	10.45%	17.57%	12.08%	100.00%
	ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (20%)	$ 817.118.474.60	$ 86.135.852.73	$ 86.135.852.73	$ 28.652.054.34	$ 21.667.752.19	$ 85.398.417.19	$ 143.533.298.71	$ 98.736.341.75	$ 817.118.474.48
	IMPREVISTOS OBRA CIVIL (2%)	$ 81.711.847.46	$ 8.613.585.27	$ 8.613.585.27	$ 2.865.205.43	$ 2.166.775.22	$ 8.539.841.72	$ 14.353.329.87	$ 9.873.634.18	$ 81.711.847.45
	UTILIDAD OBRA CIVIL (3%)	$ 122.567.771.19	$ 12.920.377.91	$ 12.920.377.91	$ 4.297.808.15	$ 3.250.162.83	$ 12.809.762.58	$ 21.529.934.81	$ 14.810.451.26	$ 122.567.771.17
	AIU OBRA CIVIL (25%)	$ 1.021.398.093.00	$ 107.669.816.00	$ 107.669.816.00	$ 35.815.068.00	$ 27.084.690.00	$ 106.748.021.00	$ 179.416.623.00	$ 123.420.427.00	$ 1.021.398.093.00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA	$ 5.106.990.466.00	$ 538.349.079.67	$ 538.349.079.67	$ 179.075.339.70	$ 135.423.450.95	$ 533.740.106.95	$ 897.083.116.55	$ 617.102.135.75	$ 5.106.990.465.40
	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO MENSUALMENTE		43.20%	53.74%	57.25%	59.90%	70.35%	87.92%	100.00%	

	EN EJECUCION
	POR INTERVENIR
	SIN INTERVENCION

Según la programación de las actividades de obra y flujo de inversión, el porcentaje programado acumulado para este mes de enero era del **70,35%** el avance físico real en los otros frentes de obra ejecutado al corte del 29 de febrero de 2024 es de **62.80%.**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	01	28 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA	-	03 DE ENERO DE 2023
ACTA DE MODIFICACION (balance de mayores y menores cantidades de obra)	01	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION PRORROGA AL CONTRATO	01	13 DE DICIEMBRE DE 2023

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)


ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... **$ 5.106.990.466,00**
VALOR DEL ANTICIPO.....**$ 2.042.796.186,00**
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....**40%**

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total de Obra..... **365 días**
Tiempo Total adicional.....**90 días**
Tiempo Total Transcurrido .....:.....**429 días**
Tiempo Total Restante.....:.....**26 días**
Avance Porcentual según plazo inicial.....**94.29%**
Porcentaje restante en tiempo **5.71%**

Imagen 2. Porcentaje de avance en tiempo a 29 de febrero 2024

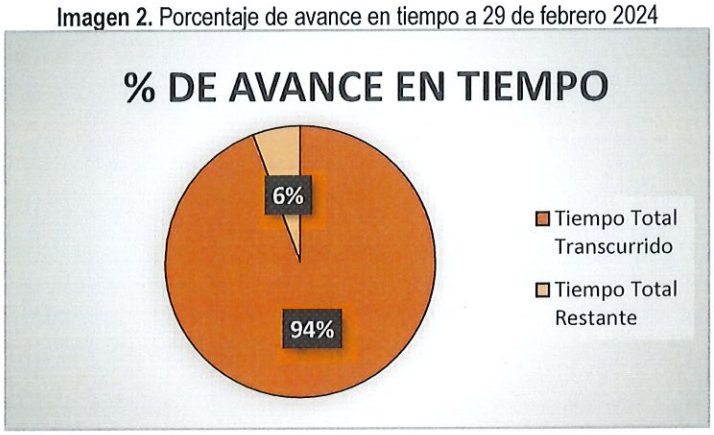

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA
Inversión Contratada..... **$ 5.106.990.466,00**

Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 14) ..... **$ 184.991.749**

Porcentaje Avance Físico Mensual Ejecutado **3.62%**

Inversión Total Ejecutada..... **$ 3.392.313.879**

Porcentaje Avance Físico Ejecutado Acumulado **66.42%**

Saldo por Ejecutar .....**$ 1.714.676.587.4**
Porcentaje por Ejecutar..... **33.58%**

De acuerdo a la programación de obra para este mes de febrero se tenía estimado un avance del **17.57%,** el avance físico ejecutado para este periodo fue del **3.62%.**.

A continuación, se indica el avance ejecutado mensualmente.

	Avance Programado vs Ejecutado Mensualmente															
% AVANCE MENSUAL	MES 1 ene-23	MES 2 feb-23	MES 3 mar-23	MES 4 abr-23	MES 5 may-23	MES 6 jun-23	MES 7 jul-23	MES 8 ago-23	MES 9 sep-23	MES 10 oct-23	MES 11 nov-23	MES 12 dic-23	MES 13 ene-24	MES 14 feb-24	MES 15 mar-24	TOTAL
PROGRAMADO	0.00%	0.00%	2.33%	2.33%	2.33%	7.47%	8.24%	9.96%	10.54%	10.54%	3.51%	2.65%	10.45%	17.57%	12.08%	100.00%
EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	4.73%	7.62%	7.73%	6.05%	2.86%	4.84%	7.71%	7.89%	9.75%	3.62%	3.62%	0.00%	66.42%

CONTROL FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se puede observar el flujo de inversión financiero mediante el seguimiento al avance programado financiero y con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en cuestión.


Tabla 3. Control de inversión programada y ejecutada a 29 de febrero de 2024.

PERIODO		INVERSIÓN FINANCIERA PROGRAMADA				INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA			
AÑO	MES	VR/ PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO MENSUAL	VR/ PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR/ EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO MENSUAL	VR/ EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
2023	Enero	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	Febrero	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	Marzo	$ 118.939.138.75	2.33%	$ 118.939.138.75	2.33%	$ -	0.00%	$ -	0.00%
	Abril	$ 118.939.138.75	2.33%	$ 237.878.277.50	4.66%	$ 241.791.699.00	4.73%	$ 241.791.699.00	4.73%
	Mayo	$ 118.939.138.75	2.33%	$ 356.817.416.25	6.99%	$ 389.230.190.00	7.62%	$ 631.021.889.00	12.36%
	Junio	$ 381.421.308.50	7.47%	$ 738.238.724.75	14.46%	$ 394.764.782.00	7.73%	$ 1.025.786.671.00	20.09%
	Julio	$ 421.067.688.08	8.24%	$ 1.159.306.412.83	22.70%	$ 309.185.283.00	6.05%	$ 1.334.971.954.00	26.14%
	Agosto	$ 508.561.744.33	9.96%	$ 1.667.868.157.17	32.66%	$ 145.906.552.00	2.86%	$ 1.480.878.506.00	29.00%
	Septiembre	$ 538.349.079.67	10.54%	$ 2.206.217.236.83	43.20%	$ 246.928.069.00	4.84%	$ 1.727.806.575.00	33.83%
	Octubre	$ 538.349.079.67	10.54%	$ 2.744.566.316.50	53.74%	$ 393.585.587.00	7.71%	$ 2.121.392.162.00	41.54%
	Noviembre	$ 179.075.339.70	3.51%	$ 2.923.641.656.20	57.25%	$ 402.951.607.00	7.89%	$ 2.524.343.769.00	49.43%
	Diciembre	$ 135.423.450.95	2.65%	$ 3.059.065.107.15	59.90%	$ 497.986.612.00	9.75%	$ 3.022.330.381.00	59.18%
2024	Enero	$ 533.740.106.95	10.45%	$ 3.592.805.214.10	70.35%	$ 184.991.749.00	3.62%	$ 3.207.322.130.00	62.80%
	Febrero	$ 897.083.116.55	17.57%	$ 4.489.888.330.65	87.92%	$ 184.991.749.00	3.62%	$ 3.392.313.879.00	66.42%
	Marzo	$ 617.102.135.75	12.08%	$ 5.106.990.466.40	100.00%		0.00%	$ 3.392.313.879.00	66.42%
	total	$ 5.106.990.466.40							

CURVA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

A continuación, se presentan las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada a 29 de febrero de 2024. En estas curvas se puede evidenciar que el valor financiero programado (línea roja) está por encima del valor financiero ejecutado (línea verde). Estas curvas indican un atraso en las actividades que hacen parte del presupuesto de obra, debido a que no se ha podido desarrollar la programación de las intervenciones porque a la fecha no se contaba con todos los diseños aprobados para la construcción del nuevo módulo de la planta de tratamiento de agua potable - PTAP.

Imagen 3. Curvas de Avance Financiero Programado vs. Valor Ejecutado Acumulado

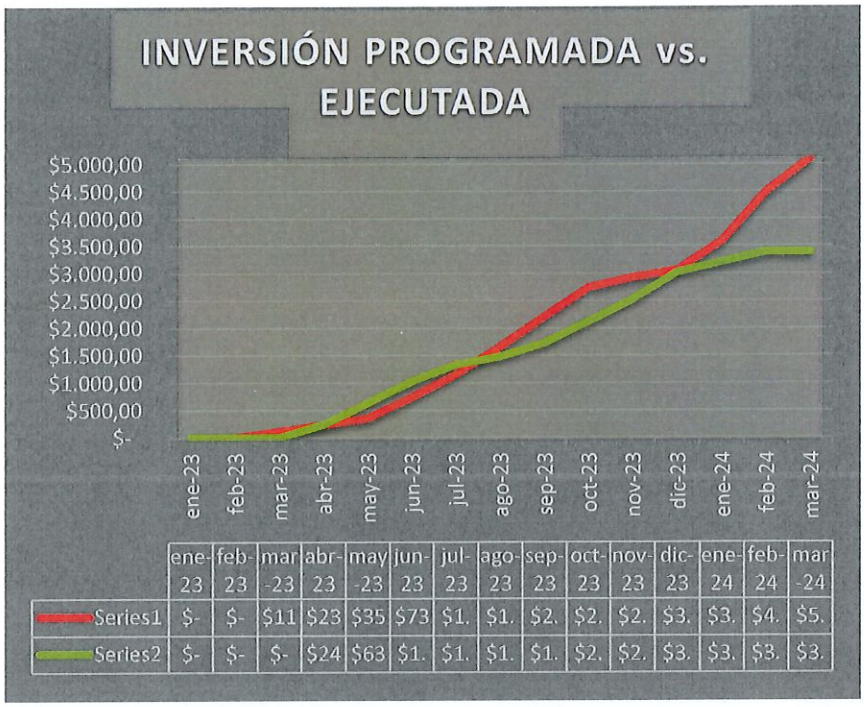

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
Series1	$-	$-	$11	$23	$35	$73	$1.	$1.	$2.	$2.	$2.	$3.	$3.	$4.	$5.
Series2	$-	$-	$-	$24	$63	$1.	$1.	$1.	$1.	$2.	$2.	$3.	$3.	$3.	$3.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Actas	Amortización	Valor
Anticipo (40%)		-	$ 2.042.796.186	$ 2.042.796.186
ACTA PARCIAL 1	15-abr-23	$ 241.791.699	$ 96.716.680	$ 145.075.019
ACTA PARCIAL 2	31-may-23	$ 389.230.190	$ 155.692.076	$ 233.538.114
ACTA PARCIAL 3	15-ago-23	$ 653.380.694	$ 261.352.278	$ 392.028.416
ACTA PARCIAL 4	31-oct-23	$ 836.989.579	$ 334.795.832	$ 502.193.747
ACTA PARCIAL 5	11-dic-23	$ 900.938.220	$ 360.375.288	$ 540.562.932
ACTA PARCIAL 6	11-mar-24	$ 184.991.749	$ 73.996.700	$ 110.995.049
TOTALES		**$ 3.207.322.130**	**$ 1.282.928.854**	**$ 1.924.393.277**

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Facturado	Valor No Facturado
$ 5.106.990.466.00	$ 0.00	$ 5.106.990.466.00	$ 3.207.322.130	$ 1.899.668.336.00

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista.

Como contratistas de obra, en los tres frente de trabajo se ha tenido disponible para la ejecución de las actividades de obra de un grupo de profesionales entre personal administrativo, personal técnico, operativo, mano de obra calificada y no calificada (maestros, oficiales tuberos, ayudantes de construcción, ayudantes de almacén y/o sub contratistas de maquinaria) de la comunidad cercana al área de influencia del proyecto y de personal externo, los cuales tienen el conocimiento y la experiencia requerida para llevar a cabo el cumplimiento de las labores administrativas y todas las actividades de coordinación y ejecución de los procesos constructivos que nos permiten desarrollar de manera ágil y segura las actividades requeridas para la "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

En la siguiente tabla, se relaciona el personal mínimo requerido que ha estado vinculado al proyecto durante el mes de enero de 2024.

Tabla 4. Relación de personal mínimo requerido dispuesto en obra

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN
Representante legal	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	-	Ingeniero Civil
Director de obra	NÉSTOR YAIR ÁVILA HERRERA	25%	Ingeniero Civil
Profesional de costos	VALENTINA VIEDA CERQUERA	50%	Ingeniera Civil
Residente de Obra	JOAQUIN ALONSO RAIGOSA BOHORQUEZ	100%	Ingeniero Civil

Auxiliar de ingeniería	LEIDY YURANY TOVAR BARRERA	100%	Ingeniera Civil
Profesional Sisoma	INGRID JOHANNA MENDOZA	100%	Administradora en salud ocupacional

En el ***anexo 2*** se adjunta la planilla de pago de seguridad social del mes de febrero de 2024 del personal de mano de obra calificada y mano de obra no calificada vinculada a la ejecución de las actividades de obra durante el periodo en cuestión.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

Frente de obra Planta De Tratamiento Agua Potable (Optimización):

- Corte y figurado del acero para continuar con el amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.
- Localización y replanteo de niveles para empezar la excavación manual, para la instalación de la tubería que conecta la caja de salida con la caja de reparto de tanques y caja de entrada del tanque de almacenamiento.
- Instalan cuatro (4) pasa muros de D=6" para auto lavado de filtros y un (1) pasa muro de D = 8" para la salida del agua tratada de la planta, los cuales fueron fijados en el acero amarrado con soldadura para evitar movimiento en el momento del vaciado de concreto.
- Instalación de la cinta PVC para de retención de agua sobre los muros perimetrales del primer nivel. Con esta cinta se busca evitar las filtraciones de agua en la estructura del tanque, tal y como quedo esta especificado en el plano de diseño.
- Instalación de DISPOSITIVOS EN C los cuales funcionan para el retro lavado de los filtros.

Frente de obra 2. Tanque de Almacenamiento de Agua:

- Instalación de accesorios en la caja de entrada.
- Corte y pulida de rebaba se procede a realizar lavado de piso y muros perimetrales internos.
- Instalación de 2 tubos de D=8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del tanque de almacenamiento, se procede a instalar acero de refuerzo con varilla de ½ y sus respectivos estribos.
- Resanes en la placa superior del tanque de almacenamiento por la parte interna.
- Se retira formaleta utilizada para el soporte de la placa superior de la caja de salida del tanque.
- Se toman niveles desde la caja de salida del tanque hasta donde está proyectado realizar el pozo.
- Instalación de los accesorios en la caja de salida.
- Excavación mecánica, para la aplicación de producto para sellar la junta que permite filtración en el tanque por el costado de la vía de acceso.
- Excavación mecánica y movimiento de rocas para la instalación de tubería de D=8" y D=10" de salida de agua potable y salida de agua del sistema de lavado.
- Excavación manual según diseño para la instalación de la tubería de desagüe desde el cerco hasta el pozo de descarga.

En el ***anexo 4*** se puede evidenciar en el registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el periodo en cuestión.

3.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

En la intervención y ejecución de las actividades no se presentaron daños ni perjuicios a terceros.

3.3 Modificaciones Realizadas en Obra

A la fecha solo se ha generado una sola modificación, la cual se llevó a cabo el día 22 de septiembre de 2023, se suscribió entre AGUAS DEL HILA S.A. E.S.P y la UNION TEMPORAR PMA SUAZA, el otro si No. 02 al contrato de obra pública No. 217 de 2022. En este documento se modificaron las mayores y menores cantidades de obra y se crearon nuevos ítems que fueron incluidos al presupuesto de obra contractual.

3.4. Comité de Obra - Actas de reunión

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité – Reunión (Describir)
08 – febrero - 2024	Empresa de Servicios Públicos de Suaza	Verificación de obra una vez pasadas las actividades de fin de año. Verificación de instalación de hidrantes en la Red de Distribución Verificación de enmalles en la Red de distribución Verificación de instalación de puntos hidráulicos Con relación a la verificación de los hidrantes fueron verificados y aprobados por eps Suaza su instalación. De igual forma fueron verificados los tres enmalles terminados total y recibidos a satisfacción de lo cual quedo pendiente un cuarto enmalle por la zona del parque principal. Con relación al tanque de almacenamiento se concretó que el 27 de febrero estará terminado en su totalidad, pendiente la aplicación del producto impermeabilizante para concreto tipo XYPEX o similar el cual debe aplicarse en una superficie limpia libre de rebaba y polvo. Se considera que el tanque de almacenamiento lleva un 98% de avance. Con relación a la planta de agua potable las actividades a la fecha son: excavación, solado, instalación de hierro y hoy la fundición de loza inferior. El total del concreto empleado fue una cantidad de mezcla de 32.5 m3 correspondiente a la placa de la planta parte inferior, tapa de caja de entrada y caja de salida, se considera un avance de la obra del 25% adelantado. El comportamiento del tanque correspondiente al aéreo del lavado también se le aplico llevando a un nivel de desagüe a pasar el compartimiento de la caja de salida. El comité conto con la presencia del señor alcalde el cual fue actualizado con relación a la obra el cual se mostró muy contento por todo lo ejecutado.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Para llevar a cabo la verificación de la resistencia del concreto de 3000 PSI y 4.000 PSI Impermeabilizado, que fue suministrado por el proveedor MASSEQ SAS, para el encofrado, se realizaron en obra las pruebas de asentamiento y el respectivo control de calidad mediante la toma de cilindros con apoyo de laboratorio del proveedor, con los cuales se hizo la verificación y comprobación de la resistencia del concreto.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Una vez cumplida la edad para los 3, 7, 14 y 28 días para llevar a cabo la verificación de la resistencia del concreto de 3000 PSI y 4.000 PSI para encofrado de tuberí, en el ***anexo 5*** se encuentra el reporte de resultados, el certificado de calidad para un CONCRETO CONVENCIONAL 3000 PSI, GRAVA DE ½", NORMAL A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 5", IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, GRAVA DE ½", NORMAL A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 5", CON INCORPORADOR DE AIRE, IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, GRAVA DE ½", ACELERADO A 3 DIAS, ASENTAMIENTO 5", CON INCORPORADOR DE AIRE.

4.3. Comentarios y Conclusiones

- Se obtuvo en el reporte de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, que todos **CUMPLEN LA RESISTENCIA** conforme a los requerimientos de las especificaciones técnicas y en cumplimiento de la norma para este tipo de estructuras.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Corte y figurado del acero para continuar con el amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.
- Localización y replanteo de niveles para empezar la excavación manual, para la instalación de la tubería que conecta la caja de salida con la caja de reparto de tanques y caja de entrada del tanque de almacenamiento.
- Instalan cuatro (4) pasa muros de D=6" para auto lavado de filtros y un (1) pasa muro de D = 8" para la salida del agua tratada de la planta, los cuales fueron fijados en el acero amarrado con soldadura para evitar movimiento en el momento del vaciado de concreto.
- Instalación de la cinta PVC para de retención de agua sobre los muros perimetrales del primer nivel. Con esta cinta se busca evitar las filtraciones de agua en la estructura del tanque, tal y como quedo esta especificado en el plano de diseño.
- Instalación de DISPOSITIVOS EN C los cuales funcionan para el retro lavado de los filtros.
- Instalación de accesorios en la caja de entrada.
- Corte y pulida de rebaba se procede a realizar lavado de piso y muros perimetrales internos.
- Instalación de 2 tubos de D=8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del tanque de almacenamiento, se procede a instalar acero de refuerzo con varilla de ½ y sus respectivos estribos.
- Resanes en la placa superior del tanque de almacenamiento por la parte interna.
- Se retira formaleta utilizada para el soporte de la placa superior de la caja de salida del tanque.
- Se toman niveles desde la caja de salida del tanque hasta donde está proyectado realizar el pozo.
- Instalación de los accesorios en la caja de salida.
- Excavación mecánica, para la aplicación de producto para sellar la junta que permite filtración en el tanque por el costado de la vía de acceso.
- Excavación mecánica y movimiento de rocas para la instalación de tubería de D=8" y D=10" de salida de agua potable y salida de agua del sistema de lavado.

- Excavación manual según diseño para la instalación de la tubería de desagüe desde el cerco hasta el pozo de descarga.

ANEXOS

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integra de este informe mensual de avance de obra No.14, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 29 de febrero de 2024.

- ✓ *Anexo 1. Bitácora de obra.pdf*
- ✓ *Anexo 2. Planilla Seguridad Social enero 2024.pdf*
- ✓ *Anexo 3. Correspondencia Enviada enero 2024.pdf*
- ✓ *Anexo 4. Registro Fotográfico enero 2024.pdf*
- ✓ *Anexo 5. Certificado Resistencias Concreto Masseq.pdf*
- ✓ *Anexo 6. Acta de comité 08 de febrero Solserving-Suaza*

Presentado por:

UNIÓN TEMPORAL PMA SUAZA
RL/ JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
Correo: utpmasuaza@gmail.com
Celular: 312 448 17 74
Dirección: Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3. Neiva – Huila

CONTROL DE REVISIÓN		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Joaquín Alonso Raigosa Bohórquez Residente de Obra **UT PMA SUAZA**	**Javier Leonardo Valderrama Gutiérrez** Representante Legal **UT PMA SUAZA**	**Adrián Rodrigo Cabezas Peña** Director de interventoría **SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.**

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

BITÁCORA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

01 de Febrero al 08 de Febrero
Personal de obra: (1) maestro (2) oficiales (5) ayudantes. Se recibe en sitio acero, se continua con el corte y figurado del acero para continuar con el amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.

Patricia Esther Cabezas P. Ing. Residente
Residente interventoría

02 de Febrero al 12 de Febrero
Personal de obra: (1) maestro (1) oficial (2) ayudantes se inicia la actividad de localización y replanteo de niveles para empezar la excavación manual. Para la instalación de la tubería que conecta la caja de salida de la PTAP con la caja de reparto de tanques y caja de entrada del tanque de almacenamiento.

Patricia Esther Cabezas P. Ing. Residente
Residente interventoría

13 de Febrero de 2024
Personal de obra: (1) maestro (2) oficiales (5) ayudantes. Se instala arena para colchón y protección de tubería banco D=18" se instala cuatro (4) pasamuros de D=6" para autolavado de filtros y un (1) pasa muro D=8" para salida de agua potable de la planta, los cuales fueron fijados con soldadura para evitar movimiento en el vaciado.

Patricia Esther Cabezas P. Ing. Residente
Residente interventoría

Powered by CamScanner

14 de Febrero del 2024.
Personal de obra: se realizo instalación de la cinta PVC para la retención de agua sobre los muros perimetrales del primer Nivel. Con esta cinta se busca evitar filtraciones de agua en la estructura del tanque tal y como quedo especificado en el plano de diseño

Patricia Esther Cabezas H. Ing. Residente
Residente interventoría.

Desde el 15 de Febrero al 26 Febrero 2024 se recibió el acero en la obra, se continua con el corte y figurado del acero para seguir amarrando el acero de refuerzo horizontal de las dos (2) parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento.
Personal de obra: (1) maestro (2) oficiales 6) ayudantes.

Patricia Esther Cabezas H. Ing. Residente
Residente interventoría

21 de Febrero 2024.
Personal de obra: (1) maestro (2) oficiales (5) ayudantes, instalación de Dispositivos en los cuales fundaran para el retrolavado de los filtros

Patricia Esther Cabezas H. Ing. Residente
Residente interventoría

Powered by CamScanner

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

BITÁCORA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

31 de enero de 2024
Personal de la obra: (1) maestro (1) oficial (4) ayudantes, Se realiza instalacion de Concreto de 4000 psi impermeabilizado de la placa superior de la caja de salida del tanque de almacenamiento con bomba estacionaria, luego fue aplicado con bomba antisol para evitar la pérdida prematura de humedad y garantizar un completo curado del concreto.

Patricia Esther Cabezas H. — Residente interventoría.
Ing. Residente

01 de febrero de 2024
Personal de Obra: (1) Maestro (1) Oficial (2) ayudante.
Se inician las actividades de instalación de accesorios en la caja de entrada la cual permite la conexión de agua proveniente de la planta de tratamiento de agua potable hasta el tanque existente, instalando respectivamente los elementos necesarios para controlar el ingreso del agua al tanque por medio de Válvula de Compuerta elastica HD D=8" Extremo brida.

Patricia Esther Cabezas H. — Residente interventoría.
Ing. Residente

El dia 13 de febrero de 2024.
Personal de Obra 1) maestro (1) oficial (2) ayudantes
Luego de realizar el corte y pulir la rebaba se procede a realizar lavado de piso y muros perimetrales internos para eliminar residuos no deseados y posteriormente aplicar el producto acordado por la entidad contratante, interventoria y contratista

Powered by CamScanner

Patricia Esther Cabezas R. Ing. Residente
Residente interventoría.

15 de Febrero de 2024.
Se realiza la instalación de 2 tubos de D= 8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del tanque de almacenamiento, se procede a instalar acero de refuerzo con Varilla de 1/2 y sus respectivos estribos.
Personal de obra: (1) maestro (1) oficial (2) ayudantes

Patricia Esther Cabezas R. Ing. Residente
Residente interventoría.
18 de Febrero de 2024
Personal de obra: (1) maestro (1) oficial / (2) ayudantes
Se realizan resanes en la placa superior de la tanque de almacenamiento por la parte interna

Patricia Esther Cabezas R. Ing. Residente
Residente interventoría.

19 de Febrero de 2024.
Personal de obra: (1) maestro / (2) oficial / (2) ayudantes
Se retira formaleta utilizada para el soporte de la placa superior de la caja de salida del tanque, se toman niveles desde la caja de salida del tanque hasta donde esta proyectado realizar el pozo el cual sera utilizado para recolectar el agua utilizada para lavado y/o rebose del tanque; ademas el agua lluvia depositada por cuneta perimetral en el tanque.

Patricia Esther Cabezas R. Ing. Residente
Residente interventoría.

Powered by CamScanner

21 de Febrero de 2024.
Personal de Obra: (1) maestro (1) oficial (2) ayudantes
Se da inicio la instalacion de accesorios en la caja de Salida, la cual permite la conexión del agua proveniente del tanque de almacenamiento hasta la conexión con la linea express, instalando respectivamente los elementos necesarios para controlar la Salida del agua al tanque por medio de Válvula de Compuerta elastica HD D=8" Extremo Brida, Ademas accesorios para lavado y rebose de tanque.

Patricia Esther Cabezas H
Residente interventoría.

Ing. Residente

26 de Febrero de 2024.
Personal de obra: (1) maestro (1) oficial (2) ayudantes
Excavacion mecanica, para la aplicacion de producto para sellar la junta que permite filtracion en el tanque por el costado de la via de acceso, ademas excavación mecanica y movimiento de rocas para instalacion de tuberia de D=8" y D=10" de salida de agua Potable y salida de agua del sistema de lavada.

Patricia Esther Cabezas H
Residente interventoría.

Ing. Residente

27 de Febrero de 2024
Personal de obra: (1) maestro (1) oficial (2) ayudante
Excavación manual segun diseño para la instalación de la tuberia de desagüe desde el cerco hasta el pozo de descargo.

Patricia Esther Cabezas H
Residente interventoría.

Ing. Residente

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664952	4	UNION TEMPORAL PMA SUAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 5 12 25 IN 3	NEIVA-HUILA	4376966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510868317	9464280413	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$5,316,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
1	CC	1075242447	MENDOZA MAYOR INGRI JOHANNA											X							230301	4	$200,000	$32,000	EPS037	4	$200,000	$8,000	CCF32	0	$0	$0	14-11	4	$200,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$40,000
2	CC	1075242447	MENDOZA MAYOR INGRI JOHANNA	X	X															X	230301	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF32	19	$997,917	$40,000	14-11	19	$950,000	6.960%	$66,200	19	$0	$0	SI	$296,200
3	CC	71577635	RAIGOSA BOHORQUEZ JOAQUIN ALONSO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
4	CC	1081517184	TOVAR BARRERA LEIDY YURANY																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA-ACQUA EXPRESS (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
Centro de Trabajo: OBRA ACQUA EXPRESS (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
Ciudad: SUAZA Depto: HUILA (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
5	CC	1003515460	ACUÑA ARTUNDUAGA BRAYAN SEBASTIAN		X															X	230301	3	$130,000	$20,800	EPS042	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$149,861	$6,000	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	SI	$41,100
6	CC	1118362660	AGUIRRE VARGAS BRAYAN STIVEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	1077874855	CUAJI AVENDAÑO YHONNIER EDUARDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	17691131	CUCHIMBA CABRERA HERNAN DARIO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1077871582	LEON RODRIGUEZ ENOVER		X															X	230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$780,000	$31,200	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$229,900
10	CC	1080363736	MUÑOZ BUITRON DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	1077849882	OLIVERA MONCAYO IVAN DARIO		X															X	25-14	10	$433,334	$69,400	EPSIC3	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$464,028	$18,600	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$135,600
12	CC	76357048	PAJOY COMETA JOSE WILFREDO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	12201258	PEREZ BARREIRO GERARDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	71265406	PRADO DORADO JUAN DAVID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	12202448	RODRIGUEZ MONCAYO JOSE LUIS		X															X	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$780,000	$31,200	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$229,900
16	CC	83093499	TRUJILLO PERDOMO YOVANY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	83239047	VASQUEZ RAMIREZ MANUEL AGUSTIN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(16)**																				$16,586,668	$2,654,000			$17,886,668	$715,600			$17,871,806	$715,000			$17,886,668		$1,231,500		$0	$0		$5,316,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664952	4	UNION TEMPORAL PMA SUAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 5 12 25 IN 3	NEIVA-HUILA	4376966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510868317	9464280413	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$5,316,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$2,654,000	$0	$0	$2,654,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$277,400	$0	$0	$277,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,544,600	$0	$0	$1,544,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,231,500	$0	$0	$1,231,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,231,500	$0	$0	$1,231,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$715,000	$0	$0	$715,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	16	$715,000	$0	$0	$715,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$715,600	$0	$0	$715,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$17,400	$0	$0	$17,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$455,500	$0	$0	$455,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$81,500	$0	$0	$81,500
TOTAL				16	$5,316,100	$0	$0	$5,316,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CIVCOL S.A.S identificado(a) con NI 900817409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ identificado(a) con CC 79957561

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9463993387	495185023	E	2024-03-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,927,040	4%	$517,100
9463993387	495185023	E	2024-03-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																		$12,927,040	16%	$2,068,400
9463993387	495185023	E	2024-03-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-02	30																		$12,927,040		$64,700
9463993387	495185023	E	2024-03-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-02	30																		$12,927,040		$64,700
9463993387	495185023	E	2024-03-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-02	30																		$0	0%	$0
9463993387	495185023	E	2024-03-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-02	30																		$0	0%	$0
9463993387	495185023	E	2024-03-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																		$12,927,040	0.522%	$67,500
9463993387	495185023	E	2024-03-05	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30																		$12,927,040	4%	$517,100

Este certificado se expide el día 2024-03-11 a las 10:58.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901516027	2	AQUA EXPRESS SOLUCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 3 7 50		8330000			ACQUAEXPRESS.VITELIO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29337460	E	2024-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.259.100	12.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29337460	2024-03-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4906015	MANJARRES ANTURI ELIAS	1.300.000			X														0			0	0	8	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	650.000	26.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	51	S	116.500	N	2433001
2	CC 12194341	GALINDO FLOREZ VITELIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2475201
3	CC 12197132	BERMEO CHAVEZ CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5422001
4	CC 12199979	BERMEO CHAVEZ ALVARO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5422001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901516027	2	AQUA EXPRESS SOLUCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 3 7 50		8330000			ACQUAEXPRESS.VITELIO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29337460	E	2024-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.259.100	12.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29337460	2024-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.900.000	3.900.000	5.200.000	4.550.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	624.000	0	6.000	0	630.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	2.000	0	210.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	2.000	0	210.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	2.000	0	210.000
EPS(Administradoras: 2)				3	156.000	0	1.500	0	157.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	1.000	0	105.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	500	0	52.500
ARP(Administradoras: 1)				4	285.100	0	2.700	0	287.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	285.100	0	2.700	0	287.800
CCF(Administradoras: 1)				4	182.000	0	1.800	0	183.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	182.000	0	1.800	0	183.800
Gran Total					1.247.100	0	12.000	0	1.259.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80525645	NESTOR YAIR AVILA HERRERA	Calle 6C # 72C-65 Barrio Castilla	3051254	navila21@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75143408	$1.268.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	502.500	0		0		0	0	0	0	502.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	643.200	0	0	0	0	0	0		643.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.000				42.000	0	0	42.000			420	42.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.400	0	0	80.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	502.500	502.500
Pensión	1	643.200	643.200
Riesgos Laborales	1	42.000	42.000
CCF	1	80.400	80.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.268.100	1.268.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80525645	NESTOR YAIR AVILA HERRERA	Calle 6C # 72C-65 Barrio Castilla	3051254	navila21@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75143408	$1.268.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TLP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80525645	AVILA HERRERA NESTOR YAIR	57	0			N																	25-14	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS008	4.020.000	502.500	14-23	4.020.000	2	42.000	CCF24	4.020.000	80.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UT PMA SUAZA
NIT 901.661.925-1

UT_AH_217_060_2024

Suaza (Huila), 05 de febrero de 2024

Ingeniero:
ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
ciudad

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Aval ajustes plano Hidráulico PTAP.

Respetado Ingeniero Castañeda:

De acuerdo con nuestra conversación del día anterior, estamos solicitando el aval de los ajustes que se plantearon para el mejor funcionamiento y labores de mantenimiento de los elementos y equipos que contiene la PTAP del citado contrato.

Sometemos a su consideración los siguientes puntos:

1. Se sugiere construir un BY PASS a la entrada del agua cruda a la planta con el fin de regular el caudal y no interrumpir la producción de agua potable en caso de una reparación del macro medidor allí instalado.
2. Se confirma la dimensión de los orificios de conexión entre los módulos del floculador de 0.26x0,26 m.
3. Se confirma la instalación de reboces para los dos sedimentadores en tubería de pvc de presión diámetro 3", desaguando en la caja N°3.
4. Las tapas de todas las cajas de desagües de la planta serán en lámina metálica de alfajor.
5. Se cambia la dirección de la inclinación de los paneles de sedimentación y se colocan las escaleras de acceso a estos tanques en el muro divisorio con los filtros.
6. Conectar las cajas de desagües de retro lavado de los filtros entre ellas y descargar en la caja N°4; se elimina el colector y sus accesorios.
7. Se propone construir un BY PASS para el macro medidor de salida y así no interrumpir la producción de agua potable en caso de una reparación.
8. Confirmar que los equipos de desinfección, según las especificaciones presentadas, se instalarán en el área donde están instalados los equipos que están actualmente en funcionamiento.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a la espera de su aprobación para continuar el proceso de legalización y financiación de estos trabajos.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

C.C. Soservig construcciones S.A.S - Interventoría

Proyectó: Joaquín Ramosa B. - Ing. Residente

O. Buena
a. cambio de solución
10" a 12"

Dirección: Calle 5 No. 12 - 25 Int. 3
Correo: utpmasuaza@gmail.com, costos@civcol.co, lvalderrama@civcol.co
Teléfono: 8666831

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_061_2024

07 de febrero de 2024

Señores:

SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS
ING ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Director de Interventoría

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Hoja de vida SISOMA

Respetados señores,

Comedidamente remitimos la hoja de vida de la Sisoma Ingri Johanna Mendoza Mayor, para su evaluación y aprobación,

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

C.C. Solserving construcciones S.A.S – Interventoría
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Proyecto:

Leidy Yurany Tovar Barrera
Auxiliar de ingeniería

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_062_2024

26 de febrero de 2024

Señores:
SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS
ING ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Director de Interventoría

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Entrega de informe mensual de avance de obra No. 13 mes de enero de 2024.

Respetados señores,

Respetados señores, Con el presente hacemos la entrega en medio físico y magnético del informe mensual de avance de obra No. 13, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024. De igual manera en los anexos del informe se encuentran los soportes y documentos de pago seguridad social del personal que estuvo vinculado durante el periodo en cuestión.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

C.C. Solserving construcciones S.A.S - Interventoría

Proyecto:
Leidy Yurany Tovar Barrera
Auxiliar de ingeniería

Dirección: Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3
Correo: utpmasuaza@gmail.com, costos@civcol.co, l.valderrama@civcol.co
Teléfono: 8666831

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4




Fotografía No. 1

corte, figurado y amarrado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento



Fotografía No. 2

corte y figurado del acero de refuerzo horizontal de las dos parrillas de los muros perimetrales en la planta de tratamiento

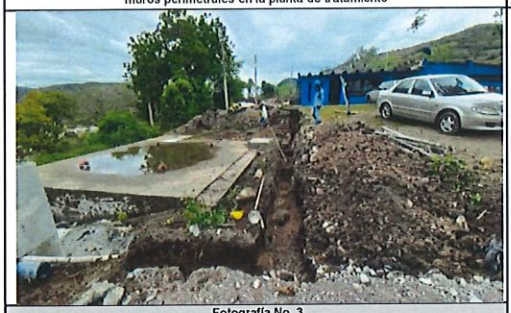

Fotografía No. 3

Excavación manual, para la instalación de la tubería



Fotografía No. 4

Arena para colchón y protección de la tubería biaxial de D= 8".



Fotografía No. 5

Pasa-muros de D=6" para auto lavado de filtros y un (1) pasa muro de D =



Fotografía No. 6

la instalación de la cinta PVC para de retención de agua sobre los muros



Fotografía No. 7

Suministro e Instalación de codos y uniones en llegada a Ptap




Fotografía No. 8

instalación de los DISPOSITIVOS EN C



Fotografía No. 9

Encofrado de la tuberia D=8"

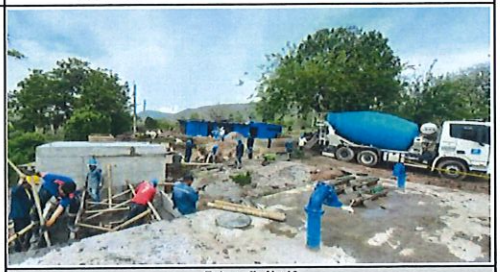


Fotografía No.10

Encofrado de la tuberia D=8"

aguas del huila


REGISTRÓ FOTOGRÁFICO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

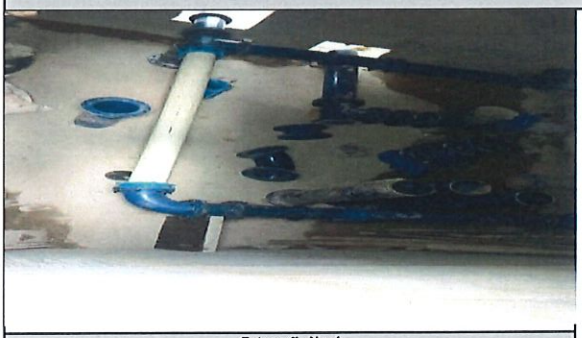

Fotografía No. 1

instalación de accesorios en la caja de entrada

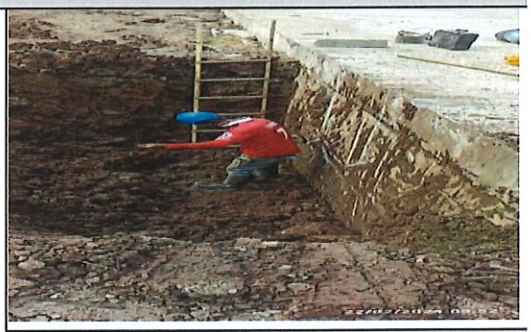

Fotografía No. 2

resane en el tanque



Fotografía No. 3

resane en el tanque



Fotografía No. 4

tubos de D=8" que conecta la caja de salida con las dos secciones del



Fotografía No. 5

Excavación mecánica



Fotografía No. 6

instalacion de cama de arena para proteccion de tubo biaxial de D=8" y 10"



Fotografía No. 7

instalacion de tuberia de agua potable en D=8" y D= 10" hasta pozo y sigue en D=8" para descarga de lavado



Fotografía No. 8

excavacion manual e instalacion de tuberia de D=8 novafort

+EQ-264-08-24

Tesalia, 08 de marzo de 2024

Señores
UNIÓN TEMPORAL PMA SUAZA
Att Ing. Leidy Tovar Barrera
Auxiliar de ingeniería

Referencia: Informe de calidad de los concretos convencionales y pavimentos, procedencia de la mezcla planta Masseq Agrado Huila; concretos suministrados el 08, 27 y 29 de febrero 2024 a la obra PTAP SUAZA.

1. TIPO DE CONCRETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MEZCLA

Las características del concreto a suministrar se presentan en la siguiente tabla:

CÓDIGO DE MEZCLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA (Mpa)	DESCRIPCIÓN DE LA MEZCLA
28Mpa-G12-3D-5P-IA-0	**28**	IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, GRAVA DE ½", ACELERADO A 3 DIAS, ASENTAMIENTO 5", CON INCORPORADOR DE AIRE
21Mpa-G12-28D-5P-0	**21**	CONVENCIONAL 3000 PSI, GRAVA DE ½", NORMAL A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 5"
28Mpa-G12-28D-5P-IA-0	**28**	IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, GRAVA DE ½", NORMAL A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 5", CON INCORPORADOR DE AIRE

2. RESISTENCIAS EN PLANTA

A continuación, se presentan las resistencias de los concretos en planta según las fechas de despacho, tipo de concreto y estructuras fundidas, las muestras son tomadas diariamente de acuerdo con el plan de inspección medición y ensayo establecido por la compañía y según la normatividad NTC 3318 "Producción de concreto".

CONSTRUIMOS CONFIANZA

2.1 Resultados de resistencia de concretos convencionales

FECHA DE TOMA	OBRA / PROYECTO	ELEMENTO	REMISIÓN MIXER	PLACA MIXER	CÓDIGO DE MEZCLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA		CÓDIGO MUESTRA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN							
									3 DIAS		7 DIAS		14 DIAS		28 DIAS	
						PSI	Mpa		PSI	%	PSI	%	PSI	%	PSI	%
8/02/2024	PTAP SUAZA	PLACAS FONDOS DE TANQUE	2440	GQZ-709	28Mpa-G12-3D-5P-IA-0	4000	28,0	M-455	4346	109%	4522	113%	5029	126%	5392	135%
27/02/2024	PTAP SUAZA	MURO	2457	GQZ-819	21Mpa-G12-28D-5P-0	3000	21,0	M-462	2620	87%	2856	95%				
29/02/2024	PTAP SUAZA	MURO	2459	GQZ-819	28Mpa-G12-28D-5P-IA-0	4000	28,0	M-464	3606	90%	3908	98%				

Los resultados de resistencia correspondientes al muestreo en planta de concretos Agrado Huila muestran una adecuada evolución de acuerdo con el tipo de concreto y especificación, las resistencias finales de acuerdo con la edad de evaluación cumplen con el requerimiento solicitado por el cliente.

CARLOS ANDRES CUSCUE
Coordinador de laboratorio
Masseq Proyectos e Ingeniería SAS

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

FECHA 08/02/2024	HORA	10:00 Am

OBJETIVO DE LA REUNION

Construcción de las obras del Plan Maestro de Acueducto Urbano Fase I del Municipio de Suaza en el Departamento del Huila. Contrato obra 217 e interventoria contrato 218/2022

PARTICIPANTES

NOMBRE	N° IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Yesid Toro P	12.228.878	Prof. Consultoria	
Cindy Tovar	1081517484	Auxiliar - ingeniera.	
Joaquin Raigosa B.	71577635	Ing. Residente R.L. Suplente	
Anderson Ordoñez	12198426		
Edgar O. Almeri.	1080360011	Consult.	
Francisco Cuellar C	1004158405	Alcalde	
Patricia Esther Cabezas	36176136.	Ing. Residente interv	Patricia E. Cabezas

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.	**ACTA DE REUNION**

TEMA CONSIDERADOS
-Verificación de obra una vez pasadas las actividades de fin de año.
-Verificación de instalación de Hidrantes en la Red de Distribución
-Verificación de enmalles en Red de Distribución.
-Verificación de instalación de Puntos Hidraulicos.

DEFINICIONES
-Dentro de la instalación de Puntos Hidraulicos se tiene pendientes de instalar los siguientes: ① un punto donde el Señor José fernando Ortiz. ① un punto donde el señor Aristides Plazas. ① punto donde el señor Ramón Salazar. Compromisos adquiridos durante el desarrollo de las actividades.
Al inicio del comité se trato el tema del Topografo Segundo al cual se le adeuda su trabajo como tambien se les comento el porque no habian asistido a la conciliación en la personería el dia 26 y argumentaron que estaban muy ocupados. la Personería saca comunicado donde dice en su enviso cuinto donde Segun lo establecido en el articulo 22 de la ley 640 de 2002, se da un plazo de (3) dias hábiles para que los convocados justifiquen su inasistencia. El Ing. Socio del contratista Tonie una foto de la notificación y se comprometio a Trabajar en eso; se espera que para el proximo comite este concluido el Tema y puedan moitar el paz y Salvo.
- Con relación a la Verificación de los hidrantes fueron verificados y aprovados por EPS Suaza


SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

Su instalación.
- De igual forma fueron verificados los Tres enmalles terminado Total y recibidos a satisfacción de lo cual queda pendiente un cuarto enmalle por la zona del parque principal.
- Con relación al Tanque de almacenamiento se concerto que el día 27 de Febrero estara Terminado en su Totalidad; para hoy se Tenia previsto la fundido de las placa Superior Tanto de entrada como la de salida; Queda pendiente la instalación de accesorios en la caja de Salida en el momento se encuentran Sobre la placa del Tanque, Pendiente esta la aplicación del producto impermeabilizante para concreto Tipo Xypex o Similar. el cual debe aplicarce en una Superficie limpia libre de resabo y de polvo.
Se considero que el Tanque de almacenamiento lleva un 98 % de avance.
- Con relación a la Planta de agua potable las actividades a la fecha desarrollados son: Excavación, Solado, instalación del hierro y hoy la fundición dela losa inferior. El Total del concreto empleado fue una cantidad de Mezcla de 32.5 m^3 correspondiente a la placa dela Planta- parte inferior; Tapa de caja de entrada y caja de Salida. Se considera un avance de obra del 25% adelantado.
El compartimento del Tanque correspondiente al area-del lavado Tambien se le aplico el concreto llegando a un nivel de desague a pasar al compartimento de la caja de Salida.
El comité conto con la presencia del Señor Alcalde el cual fue actualizado con relación a la obra y el cual se mostro muy contento por Todo lo ejecutado

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

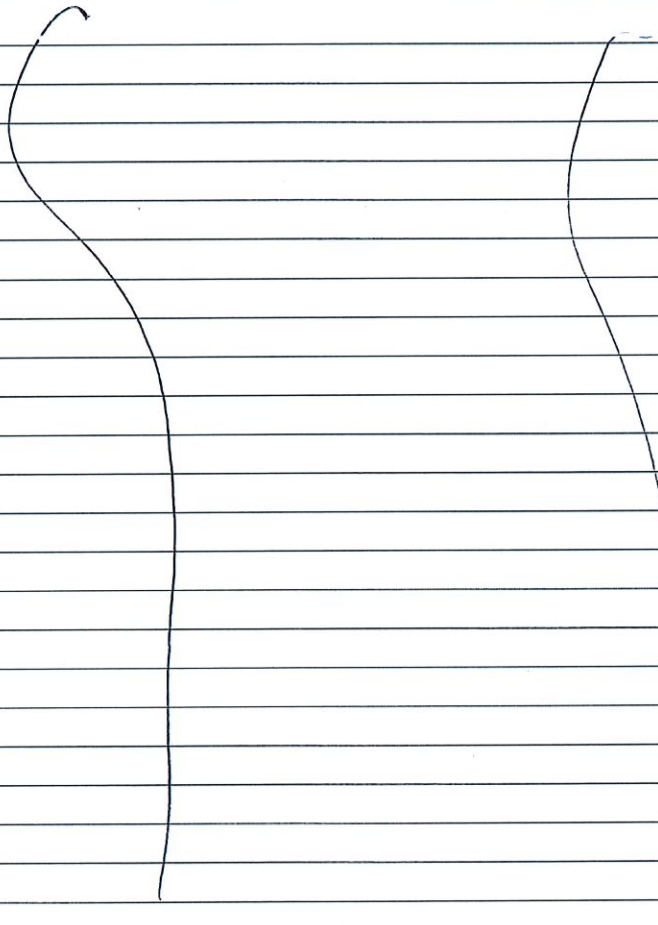

OBSERVACIONES

- Proximo comite de obra 23 febrero/2024.

CONTRATO DE OBRA N° 217 de 2022

INFORME DE GESTION MENSUAL HSEQ

PERIODO DEL INFORME: 01 al 29 de febrero del 2024

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

INFORMACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL PMA SUAZA R.L. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA		**CONTRATO No:** 217 DEL 2022	
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		**Valor:** $ 5.106.990.466 **Anticipo 40%:** $ 2.042.796.186,40 **Fecha de inicio:** 28 /12/2022	
Duración:	QUINCE (15) MESES, contados a partir del acta de inicio	**Municipio:**	SUAZA- HUILA
Nombre del Interventor:	SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Contrato No:** 218 DE 2022	

ELABORADO POR	APROBADO POR
Lida Vanessa Suarez Ortiz **SISOMA** UT PMA SUAZA	Javier Leonardo Valderrama Gutiérrez **REPRESENTANTE LEGAL** UT PMA SUAZA

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCION 5

1. OBJETIVO GENERAL 6

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

3. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS EN EL MES 6

4. RELACION DE PERSONAL DE OBRA 8

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS 10

6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11

7. INSPECCIONES A EQUIPOS DE EMERGENCIAS 12

8. JORNADA DE ORDEN Y ASEO 13

10. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN 15

11. ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16

11.1 EXAMANES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO 16

11.2 INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16

11.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 17

11.4 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL 19

11.5 ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O EMFERMEDADES LABORALES 23

11.6 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 23

12. SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN OBRA 24

Listado de anexos

ANEXO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA 9

ANEXO 2. SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL 9

ANEXO 3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MASEEQ 10

ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 10

ANEXO 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12

ANEXO 6. INSPECCIONES A EQUIPOS DE EMERGENCIAS 13

ANEXO 7. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 16

ANEXO 8. REGISTRO DE INDUCCION 16

ANEXO 9. ENTREGA DE EPP Y DOTACCION 19

ANEXO 10. REGISTRO DE CAPACITACIÒN 23

ANEXO 11. INVESTIGACION DE ACCIDENTES 22

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

1. INTRODUCCION

El presente informe presenta el desarrollo de las actividades ejecutadas en materia de HSEQ, social y manejo de tráfico durante el periodo del mes de febrero de 2024 mediante el contrato de obra **No. 217 con fecha de suscripción 21 de diciembre de 2022**, cuyo objeto es realizar la **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

En mención de lo anterior se busca mitigar mediante la gestión integral en la obra las afectaciones a la salud, cumpliendo el decreto ley 1072 de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, la resolución 0312 de 2019 por la cual se define los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en búsqueda de mejorar la seguridad y bienestar del personal a través de la prevención de los riesgos laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes y/o enfermedades que puedan afectar la calidad de vida de los trabajadores. Así como el decreto 1076 del 2015 el cual busca mediante el control de ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, asegurar el desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables con la gestión ambiental. Definiendo, las políticas que se deben cumplir para evitar la presencia de impactos ambientales en el desarrollo por la ejecución de las actividades constructiva.

Por ende, a través de herramientas se ha enfocado estrategias de intervención a cada una de las actividades desarrolladas encaminadas a fomentar, sensibilizar, mejorar en las partes interesadas (trabajadores, contratistas y/o comunidad) al generar una cultura de autocuidado y estilos de vida saludable, protección de los recursos naturales, que permitan desarrollar un trabajo seguro.

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

1. OBJETIVO GENERAL

Informar la gestión de actividades de HSEQ, social y manejo tráfico ejecutados para la obra que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"** con el fin de anticiparse, prevenir y controlar los riesgos y peligros, impactos ambientales, que sean de origen laboral y que puedan materializarse en enfermedades laborales y accidentes de trabajo durante el desarrollo del proyecto.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- ✓ Cumplir con las actividades programadas en los planes de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, social y manejo de tráfico.
- ✓ Cumplir con los requerimientos normativos aplicables referentes a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ambiental, social y manejo de trafico
- ✓ Generar en las partes interesadas una cultura de sensibilización en la detección de los riesgos que conduzca a fomentar hábitos de autocuidado y estilo de vida saludable.
- ✓ Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del proyecto, independientemente de su tipo de contratación.

3. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS EN EL MES

A continuación, se describen las actividades de obra de manera general durante el periodo del mes de febrero del 2024:

Planta de tratamiento PTAP


Instalación de acero de muros perimetrales primer nivel	Instalación de acero de muros perimetrales primer nivel	Corte y figurado de acero

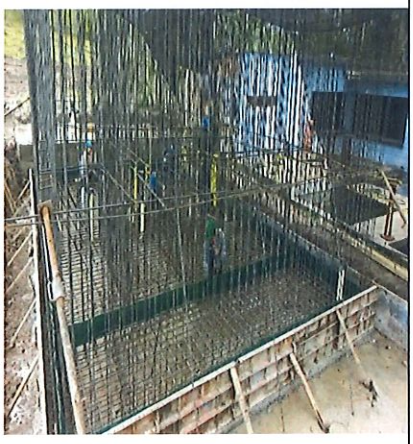
		
Instalación de dispositivos en C	Instalación de dispositivos en C	Instalación de cinta PVC
		

Tanque de almacenamiento

Lavado de pisos y muros perimetrales del tanque	Instalación de accesorios de caja de salida	Resanes placa superior del tanque



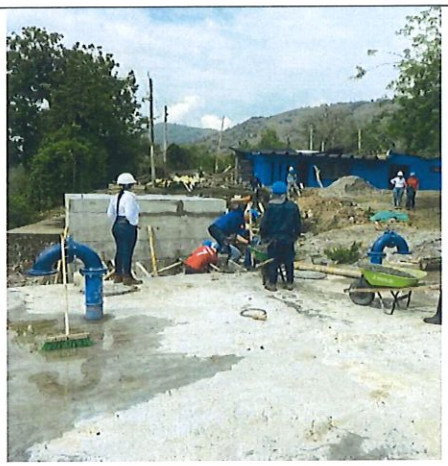

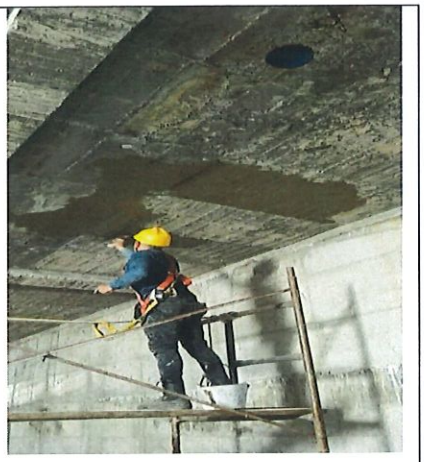

4. RELACION DE PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal vinculado durante el periodo del mes de febrero 2024.

TABLA 1. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	CAJA DE COMPENSACION
GERARDO PEREZ BARREIRO	12,201,258	OBRERO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
INGRI JOHANNA MENDOZA MAYOR	1,075,242,447	SISOMA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
VITELIO GALINDO FLOREZ	12,194,341	MAESTRO	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	COMFAMILIAR HUILA
ALVARO BERMEO CHAVEZ	12,199,979	OFICIAL	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
CARLOS BERMEO CHAVEZ	12,197,132	OBRERO	SURA	SANITAS	COLFONDOS	COMFAMILIAR HUILA
MANUEL AGUSTIN VASQUEZ	8,334,047	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
LEIDY YURANY TOVAER BARRERA	1,081,517,184	AUX INGENIERIA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
YHONNIER EDUARDO CUAJI AVENDAÑO	1,077,874,855	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	COMFAMILIAR HUILA
JUAN DAVID PRADO DORADO	71,265,406	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
YOVANNI TRUJILLO PERDOMO	83,093,499	OFICIAL	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
HERNAN DARIO CUCHIMBA CABRERA	17,691,131	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	COMFAMILIAR HUILA
JOSE WILFREDO PAJOY COMETA	76,357,047	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	COMFAMILIAR HUILA
DIEGO FERNANDO MUÑOZ BUITRON	1,080,363,736	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
BRAYAN STIVEN AGUIRRE VARGAS	1,118,362,660	OBRERO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFAMILIAR HUILA
JOAQUIN ALONSO RAIGOSA BOHORQUEZ	71,577,635	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SURA EPS	PENSIONADO	COMFAMILIAR HUILA

ANEXO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

PERSONAL ACTIVO
PERSONAL RETIRADO

ANEXO 2. SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

Dando cumplimiento a los lineamientos normativos que enmarcan dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se relaciona el personal que suministro concreto por parte del proveedor MASEEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS para la instalación de solado en la PTAP.

TABLA 2. RELACIÓN DE PERSONAL DE PROVEEDORES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	CAJA DE COMPENSACION
YSNOEL BARRERA	12.255.807	CONDUCTOR MISER	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	COMFAMILIAR HUILA

ANEXO 3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MASEEQ

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación, se relaciona la maquinaria a y equipos utilizados durante el presente periodo.

TABLA 3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

Maquinaria, equipos y/o vehículos	Marca	Cantidad	Descripción
Pulidora		1	
Retroexcavadora	CATERPILLAR	1	Excavación mecánica
Camión miser		1	Suministro de concreto

ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA RETROEXCAVADORA

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

Imagen 1. *Registro fotográfico maquinaria y equipos en obra*

		
Excavación mecanica para instalación de tuberia	Suministro de concreto de miser – encofrado de tuberia de la ptap a la caj	Suministro de concreto de miser – encofrado de tuberia de la caja al tanque

6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación: El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Numeral 14 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas, Código Sustantivo de Trabajo, Art. 348: Todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los colaboradores. Ley 9 de 1979: Artículo 84, literal a: Todos los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud dentro de los procesos

Durante el presente periodo se realiza la inspección a los siguientes equipos y maquinaria con el fin de verificar su correcto funcionamiento y minimizar fallas potenciales que puedan suscitarse durante el tiempo de operación en las actividades. Ver anexo 5.

Imagen 2. *Registro fotográfico de Inspecciones de seguridad en obra*

Inspección a equipos de corte	Inspección a herramientas manuales
	



ANEXO 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

7. INSPECCIONES A EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Una de las actividades principales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la prevención de incidentes, actos y condiciones inseguras, a través de la verificación de los equipos, herramientas, elementos y vehículos, que sirven como barrera de contención, mitigación o control del riesgo que permitan garantizar la idoneidad y estado óptimo de uso de cada de estos elementos, en caso de ser requeridos.

Para este periodo se realiza la inspección a los equipos de emergencia en búsqueda de garantizar el estado y condiciones de este mediante los formatos F-TEC-112-001 REV 02 Inspección de botiquín y camilla, F- TEC-112-002 REV 01 inspección de extintores.

Imagen 3. *Registro fotográfico de Inspecciones de equipos de emergencias*

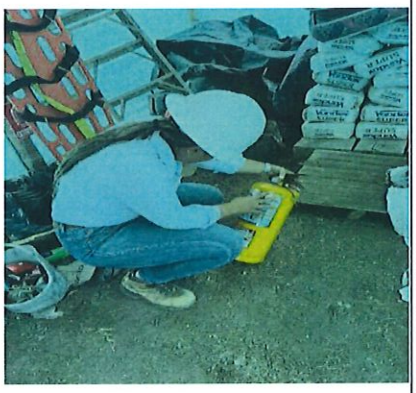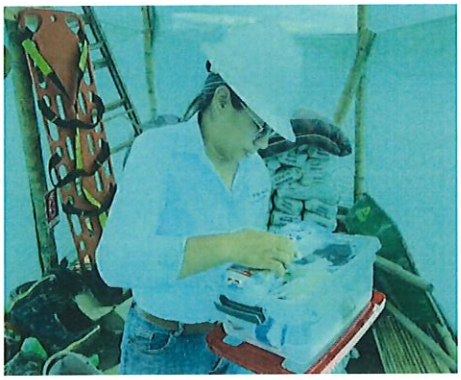Inspección de camilla de emergencias	Inspección de extintor multiproposito ABC	Inspección de botiquin de primeros auxilios
		

ANEXO 6. INSPECCIONES A EQUIPOS DE EMERGENCIAS

8. JORNADA DE ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad, la gestión ambiental y en general para la eficiencia del proyecto, también son factores esenciales para la convivencia social, tanto dentro de nuestros lugares de trabajo como en nuestros hogares y con la comunidad, y como tal requiere de unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y de la participación responsable de todos.
Para el mes de febrero con el personal de la obra se realizan jornadas de orden, limpieza y aseo de todas las áreas de trabajo, mediante la organización de las herramientas, equipos y materiales de construcción.

Los residuos generados fueron dispuestos al gestor externo de la empresa de servicios públicos de suaza S. A. E. S. P en los horarios de recolección.

Imagen 4*. Registro fotográfico de actividades de orden y aseo en obra*

Limpieza del tanque (Antes)	Limpieza del tanque (Despues)	*Recolección de residuos*
		

9. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

En el desarrollo del proyecto se tiene adecuados unos contendores para la segregación y manejo interno de los residuos sólidos domésticos generados por el personal, a los cuales se les tiene adecuadas unos contenedores regidos al código de colores como son blanco, verde y negro. Los residuos sólidos se encuentran debidamente señalizados como punto ecológico con el fin de que los trabajadores segreguen los residuos generados en sus actividades diarias.

***Imagen 5**. Registro fotográfico Punto ecológico*



...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

Instalación de punto ecológico ubicado en PTAP

10. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN

los materiales de construcción son comprados por proveedores que garantizan su calidad y transporte a una zona de almacenamiento temporal, la cual consiste en una bodega adecuada o sitios temporales en la cual se clasifican los materiales de acuerdo con su uso. Este se le proporciona las medidas de protección ante los agentes ambientales como se relaciona a continuación:

Durante este periodo se presenta el ingreso de material pétreo (arena y recebo).

Imagen 6. *Acopio de materiales de construcción*

Llegada de arena	Llegada de recebo
	

...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

11.ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11.1 EXAMANES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007, circular 015 de 2022 Los trabajadores que ingresaron se les practico al inicio de su contratación la realización de los exámenes ocupacionales con el fin de determinar las condiciones de salud de acuerdo con el esfuerzo físico, donde se determine si existe presencia de sintomatología y/o enfermedades que imposibiliten desarrollar la actividad y que sean causal de enfermedades laborales.

A continuación, se relacionan los exámenes médicos del personal apto para realizar actividades de obra durante el presente periodo

TABLA 4. RELACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

NOMRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FECHA	TIPO DE EXAMEN
INGRI JOHANNA MENDOZA MAYOR	SISOMA	07-02-2024	Examen médico ocupacional

ANEXO 7. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

11.2 INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el decreto 1072 del 2015 en su ARTÍCULO 2.2.4.2.4.2. sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST establece que es necesaria una inducción completa y permanente para la prevención del riesgo a los cuales se está expuesto los trabajadores, así como las funciones, compromisos, deberes y derechos inmersos en la empresa. Por tanto, se relaciona las inducciones realizadas al durante el mes de febrero. Ver anexo 8.

TABLA 5. INDUCCION SGSST

INGRI JOHANNA MENDOZA MAYOR	SISOMA	Inducción SGSST


ANEXO 8. REGISTRO DE INDUCCION


11.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En Cumplimento con la Resolución 2400 de 1979 - Capitulo III, ley 9 de 1979 y el Decreto 1295 de 1994, se realiza entrega de elementos de protección personal y dotación a cada uno de los trabajadores, en pro de protegerlos dejando el registro de entrega en el formato F-ADMON -101 -005 Entrega de EPP y dotación. Ver anexo 9.


Imagen 7. *Entrega de EPP y dotación*



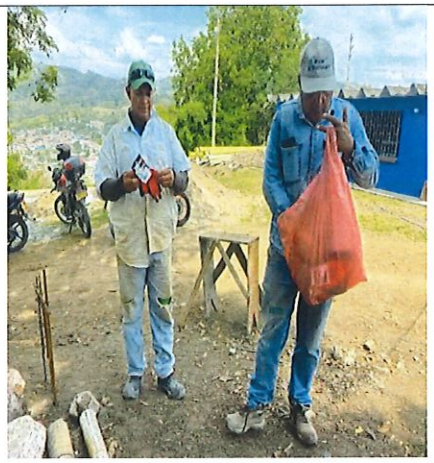


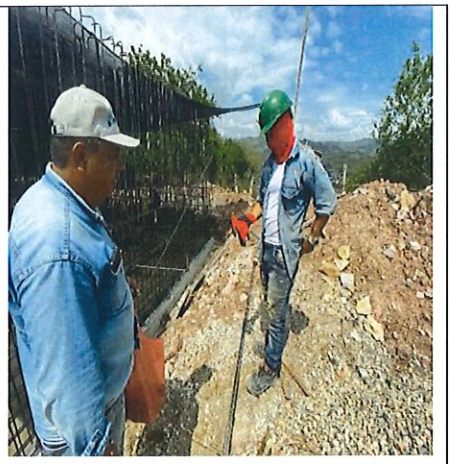



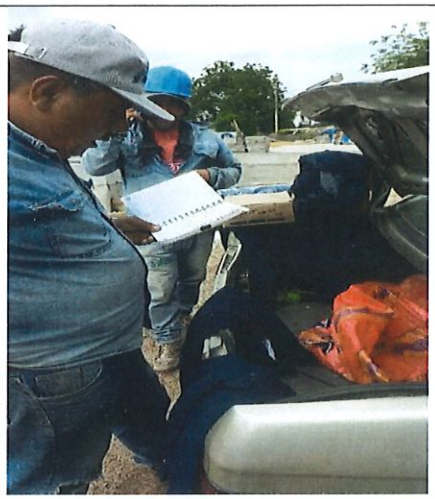




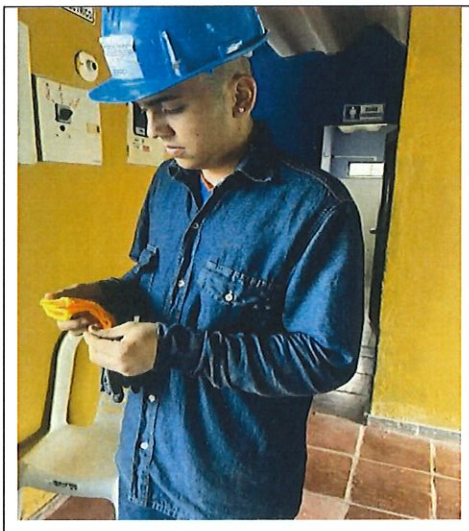





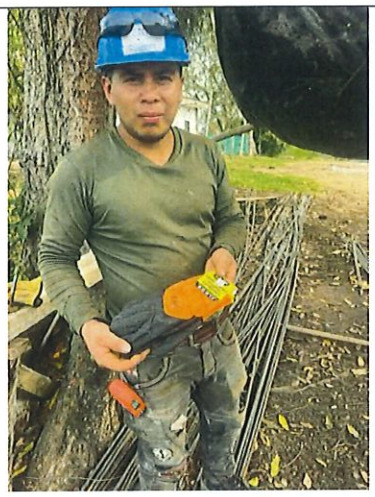

ANEXO 9. ENTREGA DE EPP Y DOTACCION

11.4 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

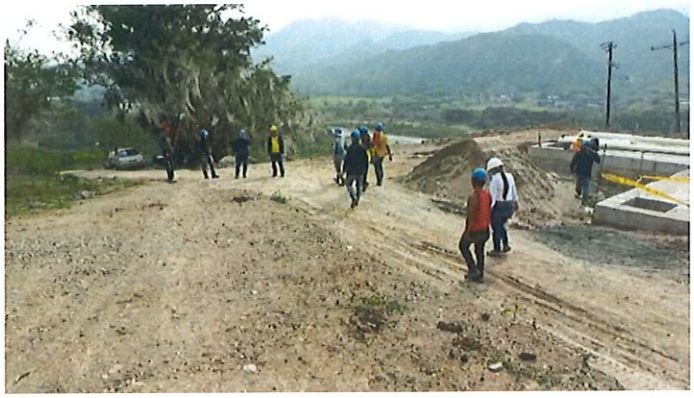
Con el fin de sensibilizar y entrenar al personal de la obra sobre la importancia de los impactos ambientales, autocuidado, medidas de prevención, protección, promoción de la salud, de la seguridad y la generación de conductas asertivas que anticipen y ataquen los riesgos, se ha generado las siguientes jornadas de capacitación en pro de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 en lo citado en el artículo 2.2.4.6.11 capítulo 6:

TABLA 6. REGISTRO DE CAPACITACIONES SGASST

TEMA	FECHA	OBJETIVO

Lecciones aprendidas accidente Brayan Estiven y capacitación uso adecuado de EPP 	19/02/2024	Las Lecciones Aprendidas son las enseñanzas que se adquieren tras la investigación de un accidente o de un incidente. Es decir, se trata de extraer aprendizaje no sólo de aquellas situaciones que hayan ocasionado daños a la persona, sino también de aquellas que, sin provocar daños, presentan riesgos potenciales. Es una herramienta cuyo objetivo va más allá de evitar la repetición de un error. Las lecciones aprendidas ayudan a comprender cómo se produjo.
Lecciones aprendidas accidente Manuel Agustín y capacitación sobre esfuerzo. 	22/02/2024	Las Lecciones Aprendidas son las enseñanzas que se adquieren tras la investigación de un accidente o de un incidente. Es decir, se trata de extraer aprendizaje no sólo de aquellas situaciones que hayan ocasionado daños a la persona, sino también de aquellas que, sin provocar daños, presentan riesgos potenciales. Es una herramienta cuyo objetivo va más allá de evitar la repetición de un error. Las lecciones

		aprendidas ayudan a comprender cómo se produjo. Los trastornos musculoesqueléticos (TME) derivados del trabajo afectan a gran número de trabajadores de los distintos sectores de la actividad económica. Cada año, millones de trabajadores los sufren. Las consecuencias de los sobreesfuerzos abarcan desde el dolor y la inflamación de diverso grado hasta lesiones graves e incapacitantes
Prevención de las lesiones de columna 	26/02/2024	Los objetivos de esta capacitación son reconocer algunos tipos comunes de lesiones de columna, para comprender algunos de los factores que hacen más probables estas lesiones y para discutir las técnicas básicas de protección de la columna.

Simulacro de evacuación  	28/02/2024	Los objetivos de la realización de este simulacro son establecer acciones tendientes a que los trabajadores y comunidad en general se desplace hasta un lugar seguro a través de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos, en las instalaciones, o en cercanías al mismo, que pongan en peligro la integridad del personal que labora, así como de los visitantes. Esto teniendo en cuenta que la evacuación deben ser un proceso muy seguro y en el cual nadie salga herido. Objetivos Específicos • Identificar en forma anticipada todas las eventualidades que puedan afectar a las instalaciones y por ende a sus ocupantes. • Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garantice la salida oportuna y segura de los trabajadores que laboran en cada una de las áreas. • Definir sistemas de alarma a utilizar y el

		significado de dicha señal para una oportuna reacción por parte de todos los trabajadores. • Establecer las rutas de evacuación, así como los puntos de encuentro y conteo del personal evacuado. • Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas de emergencia mediante una adecuada señalización de las mismas.

ANEXO 10. REGISTRO DE CAPACITACIÒN

11.5 ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O EMFERMEDADES LABORALES

Para el presente periodo se han presentado 2 accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados inmediatamente a la ARL mediante el FURAT como lo indica la normatividad legal vigente y adicionalmente se realizó las investigaciones requeridas de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa F-SGI-103-003 REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, F-SGI-102 METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, F-SGI-102-001 INVESTIGACION DE INCIDENTES. VER ANEXO 11.

11.6 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, resolución 2400 de 1979, ley 46 de 1988, decreto 919 de 1989, ley 1562 de 2012, entre otros aplicable se ha instalado en el frente de

trabajo los elementos mínimos para poder reaccionar en caso de una situación de emergencia o contingencia.

Imagen 8. *Instalación de punto de emergencias*

Punto de emergencias instalado en el campamento de PTAP



12. SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN OBRA

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la señalización implementada durante este periodo de acuerdo con el plan de señalización y demarcación en obra y el plan de manejo de tráfico PMT.

TABLA 7. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN OBRA

...llevamos más que agua.


Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

Señalización SST Inforamtiva- Zona de campamaneto , Uso obligatorio de EPP

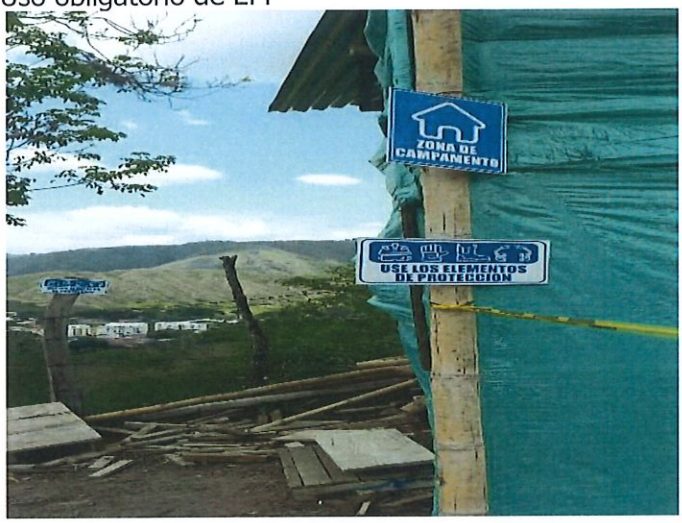

Señalización SST Informativa- Uso obligatorio de EPP



Señalización SST Informativa- Ruta de evacuación a la derecha



Señalización SST Informativa- Punto de encuentro



...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).

Señalización SST Informativa- prohibido el ingreso al personal no autorizado	Señalización SST Preventiva- Riesgo eléctrico
	

ANEXO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

UT PMA SUAZA

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-13

PROYECTO:	Contrato de obra N° 217 del 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESPONSABLE :	Ingri Johanna Mendoza Mayor
MES :	Febrero - Marzo
FECHA	SEMANA 26 AL 02

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Brayan Steven A	1118336260	AY							
2	Manuel			Vasquez	Manuel Vasquez		Vasquez			
3	Alvaro Del-	19.209979		Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro			
4	Gerardo Perez B	1120758								
5	Cesar Rojas	17.19437								
6	Diego Fernando Muñoz B	1083607736	AY	Diego Fernando	Diego Fernando					
7	Hernan Dario Cabrera	17691131	ayudante	Dario	Dario	Dario	Dario			
8	Juan Pineda	7126406	OF							
9	Ubaldo Eduardo C	7677276	Ay							
10	Wilfredo Alvarez	16357048	AY	Lunes	Wilfredo	Wilfredo	Wilfredo			
11	Yovani Trujillo	83043499	OF.							
12	Diego Fernando Muñoz	1083607736	AY	Diego Fernando	Diego Fernando	Diego Fernando	Diego Fernando			
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Observaciones

FIRMA DEL RESPONSABLE

UT PMA SUAZA

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

PROYECTO:	Contrato de obra N° 217 del 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÒN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESPONSABLE :	Ingri Johanna Mendoza Mayor
MES :	FEBRERO
FECHA	SEMANA 12 AL 17

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Yovani Trujillo	83093499	OF							
2	Brayan Steven A.	1118368660	AY.							
3	Diego Fernando M	1083635736	AY	Diego Fernando M	Diego Fernando M	Diego Fernando M	Diego Fernando M	Diego Fernando M	Diego Fernando M	
4	Wilfredo PAVÓN	7635048	AY	Wilfredo	Wilfredo	Wilfredo	Wilfredo	Wilfredo	Wilfredo	
5	Hernan Rojas Rojas	1.669.131	Ayudante	Hernan	Hernan	Hernan	Hernan	Hernan	Hernan	
6	Henrri Eduardo C.R.	1077870855	AY.							
7	Manuel	83733	OF	Manuel	Vasquez	Manuel	Vasquez	Manuel	Vasquez	
8	Alvaro Dev	1020997	OF	Alvar	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	
9	Jhon David Prad	71765	OF	Jhon Prad	Jhon Prad	Jhon Prad	Jhon Prad	Jhon Prad	Jhon Prad	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Observaciones

Ingri Mendoza

FIRMA DEL RESPONSABLE

UT PMA SUAZA

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

FECHA DE EMISIÓN: 08-JUN-15

PROYECTO:	Contrato de obra N° 217 del 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
RESPONSABLE :	Ingri Johanna Mendoza Mayor
MES :	Febrero
FECHA	SEMANA 19 AL 25

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Yovan Trujillo	83093499	OF							
2	Brayan Shen A.	1118362760	AY							
3	Diego Fernando Muñoz B.	1080038736	AY	Diego Fernando	Diego Fernando	Diego Fernando	Diego Fernando			
4	VBEyccloRAIoV	76357044	AY	Hernan Dario	Martes		Jueves			
5	[illegible]	12691134	ayudante	Hernan Dario	Hernan Dario	Hernan Dario	Hernan Dario			
6	Yhonnier Oliveros C.	1077870855	AY							
7	Manuel	83779047	AY	Manuel	Vasquez	Manuel	Vasquez			
8	Alvaro	12109970	OF	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro			
9	Juan Pardo	7726706	OF	Juan Prado	Juan Prado	Juan Prado	Prado			
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

Observaciones

Ingri Mendoza

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANEXO 2. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664952	4	UNION TEMPORAL PMA SUAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 5 12 25 IN 3	NEIVA-HUILA	4376966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510868317	9464280413	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$5,316,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																							$2,850,000	$456,000			$4,150,000	$166,000			$3,997,917	$160,000			$4,150,000		$275,100		$0	$0		$1,057,100
1	CC	1075242447	MENDOZA MAYOR INGRI JOHANNA											X							23030 1	4	$200,000	$32,000	EPS037	4	$200,000	$8,000	CCF32	0	$0	$0	14-11	4	$200,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$40,000
2	CC	1075242447	MENDOZA MAYOR INGRI JOHANNA	X	X															X	23030 1	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF32	19	$997,917	$40,000	14-11	19	$950,000	6.960%	$66,200	19	$0	$0	SI	$296,200
3	CC	71577635	RAIGOSA BOHORQUEZ JOAQUIN ALONSO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
4	CC	1081517184	TOVAR BARRERA LEIDY YURANY																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA-ACQUA EXPRESS (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
Centro de Trabajo: OBRA ACQUA EXPRESS (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
Ciudad: SUAZA Depto: HUILA (13 Afiliados)																							$13,736,668	$2,198,000			$13,736,668	$549,600			$13,873,889	$555,000			$13,736,668		$956,400		$0	$0		$4,259,000
5	CC	1003515460	ACUÑA ARTUNDUAGA BRAYAN SEBASTIAN		X															X	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS042	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$149,861	$6,000	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	SI	$41,100
6	CC	1118362660	AGUIRRE VARGAS BRAYAN STIVEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	1077874855	CUAJI AVENDAÑO YHONNIER EDUARDO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	17691131	CUCHIMBA CABRERA HERNAN DARIO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1077871582	LEON RODRIGUEZ ENOVER		X															X	23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$780,000	$31,200	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$229,900
10	CC	1080363736	MUÑOZ BUITRON DIEGO FERNANDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	1077849882	OLIVERA MONCAYO IVAN DARIO		X															X	25-14	10	$433,334	$69,400	EPSIC3	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$464,028	$18,600	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$135,600
12	CC	76357048	PAJOY COMETA JOSE WILFREDO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	12201258	PEREZ BARREIRO GERARDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	71265406	PRADO DORADO JUAN DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	12202448	RODRIGUEZ MONCAYO JOSE LUIS		X															X	23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$780,000	$31,200	14-11	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$229,900
16	CC	83093499	TRUJILLO PERDOMO YOVANY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	83239047	VASQUEZ RAMIREZ MANUEL AGUSTIN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total Afiliados(16)																							$16,586,668	$2,654,000			$17,886,668	$715,600			$17,871,806	$715,000			$17,886,668		$1,231,500		$0	$0		$5,316,100

2024/03/13 09:59 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664952	4	UNION TEMPORAL PMA SUAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 5 12 25 IN 3	NEIVA-HUILA	4376966	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	510868317	9464280413	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA	0	$5,316,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$2,654,000	$0	$0	$2,654,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$277,400	$0	$0	$277,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,544,600	$0	$0	$1,544,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,231,500	$0	$0	$1,231,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,231,500	$0	$0	$1,231,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$715,000	$0	$0	$715,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	16	$715,000	$0	$0	$715,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$715,600	$0	$0	$715,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$17,400	$0	$0	$17,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$455,500	$0	$0	$455,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$81,500	$0	$0	$81,500
TOTAL				16	$5,316,100	$0	$0	$5,316,100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901516027	2	AQUA EXPRESS SOLUCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 3 7 50		8330000			ACQUAEXPRESS.VITELIO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29337460	E	2024-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,259,100	12,000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29337460	2024-03-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4906015	MANJARRES ANTURI ELIAS	1.300.000		X															0			0	0	8	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	650.000	26.000	1.300.000	90.500	0,06960		0	0	0	0	0	51	5	116.500	N	2433001
2	CC 12194341	GALINDO FLOREZ VITELIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044		0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2475201
3	CC 12197132	BERMEO CHAVEZ CARLOS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960		0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5422001
4	CC 12199979	BERMEO CHAVEZ ALVARO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960		0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5422001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901516027	2	AQUA EXPRESS SOLUCIONES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CALLE 3 7 50		8330000			ACQUAEXPRESS.VITELIO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29337460	E	2024-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.259.100	12.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	29337460	2024-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.900.000	3.900.000	5.200.000	4.550.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	624.000	0	6.000	0	630.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	2.000	0	210.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	2.000	0	210.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	2.000	0	210.000
EPS(Administradoras: 2)				3	156.000	0	1.500	0	157.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	1.000	0	105.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	500	0	52.500
ARP(Administradoras: 1)				4	285.100	0	2.700	0	287.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	285.100	0	2.700	0	287.800
CCF(Administradoras: 1)				4	182.000	0	1.800	0	183.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	182.000	0	1.800	0	183.800
Gran Total					1.247.100	0	12.000	0	1.259.100

ANEXO 3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MASEEQ

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-05, 03:37:39 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68730579

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

Cliente:

PAGADA 2024-02-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS				
Documento	NI 900341710	**Dirección**	CR 15 #26 - 12		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8667787		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	TRUJILLO LOPEZ JAIME ANDRES	**Identificación**	CC 7716060		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 12255807		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARRERA DUARTE YSNOEL	41001000 - 41	000000005	HUILA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X		X							0	23	23	23	23		F	$ 1.800.000	230201		16 %	$ 1.479.000	$ 236.700	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.479.000	$ 59.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.479.000	$ 103.000	CCF32	4 %	$ 1.479.000	$ 59.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	7	7	7	7		F	$ 1.800.000	230201		16 %	$ 516.544	$ 82.700	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 516.544	$ 20.700	$ 0	14-11		0,000 %	$ 516.544	$ 0	CCF32	4 %	$ 443.239	$ 17.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR HUILA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 319.400	$ 0	$ 0	$ 79.900	$ 103.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96343336	0	GENARO POLO ARTUNDUAGA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4923	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-551	AV3 N 19 A 23 SUR		3106940107			DULC1024@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28960190	I	2024-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28960190	2024-03-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 96343336	POLO ARTUNDUAGA GENARO	1.300.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA EPS-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	461.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96343336	0	GENARO POLO ARTUNDUAGA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4923	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-551	AV3 N 19 A 23 SUR		3106940107			DULC1024@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28960190	I	2024-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28960190		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	0	0	90.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	90.500	0	0	0	90.500
Gran Total					461.000	0	0	0	461.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 97519

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC496954	CATERPILLAR	416-E	2012

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0416ETMFG02480

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D42715	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8380 Kg	2860 mm	2400 mm	7400 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MEDINA MOTTA ESDUVAR Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 12.235.333

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INSP TTOYTTE BARRANCABERMEJA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-05-2022	10-05-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482012000186391	27/04/2012



ESTA TARJETA [illegible] TERRITORIO NACIONAL

TM01000026792

ANEXO 5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCION PRE OPERACIONAL DE TALADRO Y PULIDORA													
FECHA	SEMANA 19 AL 24 2024													
CENTRO DE TRABAJO	Tanque de almacenamiento / PTAP.													
Realiza Inspeccion pre operacional de Taladro ☐ o pulidora ☒														
DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		VIER		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓					
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DE LAS BROCAS														
OBSERVACIONES														
FIMRA DIARIA OPERADOR														
FIMRA INSPECTOR HSE														

UT PMA SUAZA	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

FECHA: 19/02/2024

OBRA: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

AREA INSPECCIONADA: PLAP.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Ingri Johana Mendoza.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO NA	OBSERVACIONES DE TIPO DE HERRAMIENTA.
	HERRAMIENTAS MANUALES				Pala, Pica y Barra.
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓			
2	Se encuentran en buen estado	✓			
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	✓			
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓			
	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo				
2	Los cinceles se encuentran afilados				
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes				
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos				
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias				
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos				
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas				
	HERRAMIENTAS DE GOLPE				Martillo Maceta.
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			
	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas				
2	Se observan en la llave huellas y palancas				
3	Se dispone de llaves para golpear				
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas				
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente				
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado				
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.				
	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)				
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada				
3	Están limpia y lubricadas				
4	Tienen sus guardas				
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas				
6	El cable y enchufe no presentan daños				
7	En los taladros se observa el mandil con golpes				
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños				
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados				
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve				
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas				
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados				
	HERRAMIENTA NEUMATICA				
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado				
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta				
3	Se trabaja a las presiones indicadas				
4	La herramienta es descargada al terminar.				
	HERRAMIENTA POR DETONACION				
1	El personal es autorizado				
2	Emplean los elementos de protección				
3	Se descarga y es almacenada				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ANEXO 6. INSPECCION A EQUIPOS DE EMERGENCIAS

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

F- TEC-112-002 REV 01

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA DE EMISIÓN:
12 - SEP - 2015

AREA DE INSPECCIÓN: Planta Proyecto Suaza

DATOS GENERALES / RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MENSUAL

Fecha	No. Inventario	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs	Tipo	Fecha de Proxima Recarga	Presion Manómetro			Pasador y Sujetador de seguridad			Estado de Manguera			Estado de Válvulas			Estado Boquillas			Etiquetas /Argollas			INSPECCIONÓ	OBSERVACIONES
						B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A		
22/oct/24	1	Planta	20	Abc.	2025				X						X			X			X			Ingri M.	

OBSERVACIONES: _____

UT PMA SUAZA

F-TEC-112-001 REV 03

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLA DE EMERGENCIA

FECHA DE EMISIÓN: 17 - OCT - 2018

Nombre del responsable de la inspección:	Ingri Johana Mendoza.	Cargo:	Sisoma
Sede:	Suaza - Huila Planta	Fecha de inspección:	19/02/2024

CAMILLAS

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

No.	N. DE CAMILLA	UBICACIÓN PISO	CONDICIÓN DE CAMILLA							OBSERVACIONES	EXISTE AFECTACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD
			SEÑALIZACIÓN	ACCESO	ESTADO DEL SOPORTE	INSTALACIÓN A PARED	CORREAS DE SEGURIDAD	LIMPIEZA	INMOVILIZADOR		
1	1	Planta Suaza	B	B	B	B	B	B	NC		
2											
3											
4											
5											
6											
7											

BOTIQUIN

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

No.	Nº DE BOTIQUIN	UBICACIÓN PISO	CONDICIONES DEL BOTIQUIN																					OBSERVACIONES	AFECTACIÓN AL SERVICIO
			MODAL - ESTADO GENERAL (Limpio, señalizado, acceso)	GASAS LIMPIAS PAQUETE (20 Unidades)	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4" (1 Unidad)	BAJALENGUAS (Paq. X 20)	GUANTES DE LATEX (Caja * 100 unidades)	VENDA ELASTICA 2 * 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 3 * 5 YARDAS (1 Unidad)	VENDA ELASTICA 5 * 5 YARDAS (1 Unidad)	SOLUCIÓN SALINA 250 o 500 c.c (2 Unidades)	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO (1 Unidad)	ALCOHOL ANTISEPTICO (Frasco 275 ml)	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	MICROPORE (1 Unidad)	CURAS	APLICADORES (1 Paquete)	LINTERNA	PARCHE OCULAR	PITO	TAFABRICAS	VENDAS DE TRAUMA	BOLSA ROJAS	BOLSAS TRANSPARENTES		
1	1	Planta Suaza	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NC	B	B	B	B	NC	NC	B	NC	B	B	NC	NC		
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

* Botiquin con contenido Resolución No. 0705 de 2007 Tipo A

ANEXO 7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

AURIN - AUDIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL IPS S.A.S
NIT: 900907721
Dirección: Cll 15 # 7-55 Barrio La Toma
Contacto: 866 6975 - 313 360 6773
e-mail: comercial@aurinips.com.co
Neiva, Huila



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 41.301

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DIA	02 MES	2024 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	MEDICO LABORAL OSTEOMUSCULAR INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

UNION TEMPORAL PMA SUAZA	UNION TEMPORAL PMA SUAZA
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

MENDOZA MAYOR INGRID JOHANNA	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	FEMENINO	33 AÑOS 11 MESES 10 DÍAS	CC	1075242447
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
S[illegible]OMA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *SIN RESTRICCIONES.*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓	OPTOMETRIA OCUPACIONAL	✓
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO : PROGRAMAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EPS.	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : FORMULADA	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL, SIN LIMITACIONES ACTUALES. AUDIOMETRIA NORMAL. OPTOMETRIA ANORMAL.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Giovanni Cabrera Tovar
Médico y Cirujano General
Esp. Salud Ocupacional
R/M. 2076/1997 - L.S.O. 0154/2021

Firma:

Nombre: CABRERA TOVAR GIOVANNI

R. M.: 2076/1997 L.S.O.: 0154/2021

Código de Seguridad
C583I1O41301

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MENDOZA MAYOR INGRID JOHANNA

CC: 1075242447

ANEXO 8. REGISTRO DE INDUCCIÓN

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4 F-ADMON-101-216 REV 01	EVALUACION DE INDUCCION	FECHA DE EMISION 15-JUL-2022

FECHA: 09/02/2024 CONTRATO: 217 de 2022

NOMBRE: Ingri CEDULA: 1075242447

CARGO: Sisona AREA Operativa

INSTRUCCIONES
Como parte integral del desarrollo y del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión HSEQ de nuestra organización y de la cual usted hace parte activa: Se ha desarrollado este instrumento cuyo objeto es evaluar la inducción con el fin de observar si los trabajadores han logrado comprender y estimar los temas contemplados en la misma. De acuerdo con lo anterior le solicitamos que diligencie las siguientes preguntas: Marque con una X cuando así se requiera, la respuesta que crea correcta.

INDUCCION EN HSEQ

1. **Quien debe de ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad física de cada trabajador de la UT PMA SUAZA**

   a. Jefe del área
   b. El empleador
   c. X Cada uno de los trabajadores

2. **Algunas políticas que se contemplan en el sistema integrado de gestión HSEQ de la UT PMA SUAZA**

   a. X Política integrada HSEQ, política de prevención de alcohol drogas y tabaquismo
   b. Política de No tala de árboles, Política de No contaminación, política de fumigación contra zancudos y política de uso de cinturón de seguridad
   c. Política de orden y limpieza, Política de no fumadores, política de SIDA, Política de vacunación contra dengue.

3. **Que es el comité paritario en seguridad y salud en el trabajo COPASST**

   a. Es el instrumento por medio del cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones que deben de sujetarse a los trabajadores
   b. X Es un ente regulador interno el cual vigila, controla y verifica que las normas, procedimientos y reglas enmarcadas dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo se cumplan en la compañía.
   c. Es un grupo de personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo con las habilidades, conocimientos y competencias específicas para cumplir una determinada meta.

4. **Quienes conforman el COPASST**

a. Únicamente trabajadores
b. Únicamente representantes de la parte directiva de la empresa
X. Trabajadores y parte directiva de la empresa.

5. **PELIGRO ES**

a. Es aquel que sucede al trabajador durante la jornada laboral o bien en su trayecto
X. Fuente, situación o acto potencial de causar daño a la salud de los trabajadores, en los equipos, instalaciones
c. Es un conjunto de riesgos asociados a cualquier actividad

6. **RIESGO ES**

a. Es un conjunto de riesgos asociados a cualquier actividad
b. Situación, condición o conductas que, si se controlan, pueden evitar accidentes de trabajo
X Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la salvedad del daño que puede ser causada.

7. **¿Algunas funciones y responsabilidades de los trabajadores en calidad de medio ambiente, seguridad y salud son?**
a. Evitar el consumo de alcohol y drogas en sus reuniones sociales, mitigar los impactos ambientales
X. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud conocer y aplicar la política integral de HSEQ
c. Hacer uso del celular en horas laborales

8. **¿A que ARL se encuentra afiliado?**
X. SURA
B. POSITIVA
C. COLMENA

9. **Un accidente de trabajo es**

X. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que se produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte
b. Un acto seguro que da por resultado fallas en los equipos de trabajo
c. Un evento no deseado que da por resultado un daño

10. **Lo primero que debes de hacer cuando ocurre un accidente de trabajo es:**

X. Informar a su jefe inmediato, dejar que le suministren los primeros auxilios e informar al responsable de seguridad.
b. Llamar al jefe inmediato después de 2 días para que investigue la causa del accidente de trabajo
c. Avisar a la ARL después de 2 días

11. **¿Escriba un peligro y su consecuencia que usted considere como prioritario en su lugar de trabajo y diga por qué?**

Caídas a nivel, Fractura de huesos.

12. La UT PMA SUAZA cuenta con 3 tipos de brigadas de emergencias

a. Derrames, primeros auxilios y explosivos
b. Explosiones, Primeros auxilios, evacuación y rescate
c. Evacuación y rescate, primeros auxilios, Incendio

13. Como podemos prevenir el contagio del COVID-19

lavado de manos.

PUNTAJE OBTENIDO_____ APROBADO SI ___ NO___

Firma Trabajador

Firma del evaluador HSEQ

ANEXO 9. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

UT PMA SUAZA	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2015

Yo, Joaquin Rojas identificado con cedula de ciudadanía 7157765 de _____ certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ing. Residente

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA PVC: BORCEGUI	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA PVC: OPERARIO	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA PVC: PANTANERAS DE CAUCHO	CASCO DE SEGURIDAD CON PORTAGAFA	GUANTES: VAQUETA	GUANTES: CARNAZA	GUANTES: CAUCHO (NITRILO)	TAPA OIDOS: COPA LORSA	TAPA OIDOS: INSERCIÓN	GAFAS PROTECTORAS: CLARAS	GAFAS PROTECTORAS: OSCURAS	TAPA BOCAS DESECHABLE	OVALETO DRILL CON BROLLON	OVALETO REFLECTIVO NARAJA	PETACA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNES DE SEGURIDAD PARA RETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
05/02/24	-	2	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Joaquin R.

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA: _____

CARGO: Sisoma

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2018

Yo, Ingri Mendoza identificado con cedula de ciudadania 1075247247 de Neiva certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Disoma.

FECHA DE ENTREGA	INSTALACIÓN	CANTIDAD	ESTADO DE MATERIAL CON MONITOREO TIPO			CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	OVALEZO DUAL CON ROLLOS	OVALEZO REFLECTIVO NARAJA	PECHERA DE GARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INVIERNO	OPERARIO	PANTALONERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LONNA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
08/02/24	—	2	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ENTREGADO POR: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA NIT: 901,044,935-4 F-ADMON-101-004 REV 01	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISION 12 - NOV - 2015

Yo, Brayan Aguirre identificado con cedula de ciudadania 1118762460 de Neiva certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante.

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA PAG			CASCO DE SEGURIDAD CERTIFICADO	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	PERCHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INGENIERO	OPERARIO	PANTANERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LONGA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	-	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26/feb/24	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ENTREGADO POR: Hagi Mendoza

FIRMA:

CARGO: Disonra.

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protecion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA NIT: 900.684.921-4 F-ADMON-101-006 REV.02	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2015

Yo, Manuel Agustin. identificado con cedula de ciudadania 8334047 de Suaza cértifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO:			CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PERCHERA DE CARNAZA O POLIESTILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCION Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS .	ELMUNDAS DE SEGURIDAD CON ADAPTADORES DE CINCHAS	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INDUSTRIAL	OFICINAS	PANTANERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LONERA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	x	x	—	x	—			x															Manuel
27/02/24	—	—	—	—	—	—		x		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Vasquez

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: Persona.

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protección personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA
NIT: 901.644.925-4

F-ADMON-101-005 REV 02

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
12 - NOV - 2015

Yo, Alvaro Barrero identificado con cedula de ciudadania 12.999xx de Garzón certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Operario.

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: INDUSTRIAL	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: OPERADOR	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: PANTANERAS DE CAUCHO	CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	GUANTES: VAQUETA	GUANTES: CARNAZA	GUANTES: CAUCHO NITRILO	TAPA OIDOS: COPA LORSILA	TAPA OIDOS: INSERCCIÓN	GAFAS PROTECTORAS: CLARAS	GAFAS PROTECTORAS: OSCURAS	TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PECHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNES DE SEGURIDAD PARA DETENCION Y RESTRICCION DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	GAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
20/02/24	X	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alvaro
27/02/24	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alvaro

ENTREGADO POR: Ingo Hendza

FIRMA:

CARGO: Sistema.

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA NIT: 901.464.935-4	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2015
F-ADMON-101-005 REV.02		

Yo, Gerardo Perez identificado con cedula de ciudadania 1220758 de Garzón cértifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Obrero

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO			CASCO DE SEGURIDAD CERTIFICADO	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PERCHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INGENIERO	OPERARIO	PANTANERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LONGA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	x	x	—	x				x															
26/02/24								x															

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: SISOMA

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA NIT: 901.444.925-4 F-ADMON-101.008 REV 01	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 12 - NOV - 2015

Yo, Carlos Bermeo identificado con cedula de ciudadania 12.197.132 de Garzon certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO			CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	PERCHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNES DE SEGURIDAD PARA SUSTENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			SOCORRISTA	OPERARIO	PUNTERA DE CAUCHO		TAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LONGA	INSPECCION	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	—	X				X															
26/02/24								X															

ENTREGADO POR: Ingrid Mendoza

FIRMA:

CARGO: Sisoma

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA NIT: 901.694.925-4 F-ADMON-101-009 REV 02	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 12 - NOV - 2015

Yo, Diego Fernando identificado con cedula de ciudadania 1080363736 Suaza cértifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: INDUSTRIAL	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: OPERARIO	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO: PANTANERAS DE CAUCHO	CASCO DE SEGURIDAD CONTRATISTA	GUANTES: VAQUETA	GUANTES: CARNAZA	GUANTES: CAUCHO (NITRILO)	TAPA OIDOS: COPA LONGA	TAPA OIDOS: INSERCIÓN	GAFAS PROTECTORAS: CLARAS	GAFAS PROTECTORAS: OSCURAS	TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PECHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
20/02/24	X	X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diego Fernando M.
26/02/24	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diego Fernando M.

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: SISOMA

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sera el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA
NIT: 901.6404.4520-4

F-ADMON-101-005 REV 02

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN
12 - NOV - 2015

Yo, Hernan Dario C. identificado con cedula de ciudadania 17691131 de Florencia certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO Aguadante.

FECHA DE ENTREGA	PANTALÓN	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO			CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTO	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	OVALBOS DRILL CON BROCHES	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	PECHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y ABSTRICCIÓN DE CAÍDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INDUSTRIAL	OPERARIO	PANTANERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LORICA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hernan Dario
27/02/24	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hernan Dario

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: Ssoma

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos, además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2015

F-ADMON-101-000 REV 01

Yo, Jean David Prado identificado con cedula de ciudadanía 71765406 de Medellin cértifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante Obra

FECHA DE ENTREGA	PANTALÓN	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL (COMPUESTAS) TIPO: INDUSTRIAL	BOTAS DE MATERIAL (COMPUESTAS) TIPO: DIELECTRICA	BOTAS DE MATERIAL (COMPUESTAS) TIPO: PANTANERAS DE CAUCHO	GUANTES DE SEGURIDAD CERTIFICADOS	GUANTES: VAQUETA	GUANTES: CARNAZA	GUANTES: CAUCHO (NITRILO)	TAPA OIDOS: COPA LONGA	TAPA OIDOS: INSERCIÓN	GAFAS PROTECTORAS: CLARAS	GAFAS PROTECTORAS: OSCURAS	TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO (MALLA) CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	PETICHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
20/02/24	X	X	—	X	—	—		X		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27/02/24	—	—	—	—	—	—		X		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: Asesora

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protección personal (EPP) y dotación y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotación, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA
NIT: 901.644.925-4

F-ADMON-101-004 REV 02

ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2018

Yo Chavier Eduardo identificado con cedula de ciudadanía 1077584855 de Garzon certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO			CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARANJA	PECHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNES DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	SOLAPAS DE SEGURIDAD CON ABSORCION DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			PEQUEÑO	OPERARIO	PANTANEROS DE CAUCHO		TACUETA	CARNAZA	CAUCHO (NITRILO)	COPA LORNA	INSERCION	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	-	X				X															
27/02/24									X														

ENTREGADO POR: Jaime Mendoza

FIRMA:

CARGO: Asesora

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protección personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; ademas, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN 12 - NOV - 2018

Yo, Wilfredo Reyes identificado con cedula de ciudadanía 7635748 de Inza. certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA PAE			CAMISA DE SEGURIDAD CONTRASTE	GUANTES			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA NUCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PERCHERA DE CAPRANA O POLIESTILENO	ARNES DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			BASKEMITO	OPERARIO	PANTANERAS DE CAUCHO		VAQUETA	CARNAZA	CAUCHO INTALCO	COPA LARGA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	-	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wilfredo
27/02/24	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Wilfredo

ENTREGADO POR: Ingri Mendoza

FIRMA:

CARGO: Sisoma

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protección personal (EPP) y dotacion y por ende sere el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; además, estoy consiente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

UT PMA SUAZA	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12 - NOV - 2015

F-ADMON-101-008 REV 03

Yo, Giovani Trujillo identificado con cedula de ciudadanía 85093499 de Cumaral Meta certifico que he recibido conforme los elementos de protección personal y la dotación.

CARGO: Oficial

FECHA DE ENTREGA	PANTALON	CAMISA	BOTAS DE MATERIAL CON PUNTERA TIPO			CHAQUETA DE SEGURIDAD CONTRATADO	TAPABOCAS			TAPA OIDOS		GAFAS PROTECTORAS		TAPA BOCAS DESECHABLE	CHALECO DRILL CON BOLSILLOS	CHALECO REFLECTIVO NARAJA	PERCHERA DE CARNAZA O POLIETILENO	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAIDAS	ESLINGAS DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR DE CHOQUES	DOTACIÓN DE INVIERNO	CAPA IMPERMEABLE AMARILLA	OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE
			INGENIERO	OPERARIO	PANTANERAS DE CAUCHO		VINILFLEX	CARNAZA	CAUCHO INTRELOS	COPA LORENA	INSERCIÓN	CLARAS	OSCURAS										
20/02/24	X	X	—	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27/02/24	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ENTREGADO POR: Jhoan Mendoza.

FIRMA:

CARGO: Persona.

OBSERVACIONES:

Estoy enterado de los riesgos que conllevara el no uso de los elementos de protección personal (EPP) y dotacion y por ende sera el responsable del uso y mantenimiento de los elementos que me sean entregados, en caso de daño y/o perdida antes de dos (2) meses me hago responsable de adquirirlos; ademas, estoy consciente que el no uso de los EPP y dotacion, de acuerdo a la actividad realizada, puede conllevar a sanciones de tipo disciplinario y constituye causal de terminación de contrato.

ANEXO 10. SOPORTE DE CAPACITACIÓN

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Lección Aprendida accidente y uso adecuado de epp

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 19/02/2024

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Bryan Stiven Aguirre	AY	
	Manuel Vasquez		
	Eliana Bermeo		
	Gerardo Jerez B	Ayudante	
	[illegible]		
	Ing. Ismael Munoz B.	AY.	Ing. Ismael M
	Henry para cabrera	ayudante	
	Juan David Prado	OF	
	Yhonnier Eduardo Cujia	AY	
	Alfredo Pajoy	AY	Alfredo
	Yovani Trujillo.	OF	

EXPOSITOR: Ingri Mendoza.

CARGO: Sistema.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Apotamiento Por Calor.

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 21/02/2024

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	[illegible]	[illegible]	AC
	manuel vasquez		AC
	Gerardo Rojas B		AC
	Alvaro Bermeo		OF
	Brayan Stiven A	AY	
	Wilfredo PAYoy		
	Yhormis Eduardo C.	Ay	
	Diga Fernando Muñoz B.	AY.	Diga Fernando M.
	Yovany Trujillo.	OF	
	Hernan Pavon Cabrera.	ayudante	Hernan Pavon

EXPOSITOR: Ingri Hernandez.
CARGO: Sisoma

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Lecciones Aprendidas Accidente y capacitación sobre esfuerzo.

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA: 22/06/2021

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Yovani Trujillo.	Of	
	Brayan Stiven A.	AY.	
	Diego fernando Muñoz B.	AY	Diego fernando M. B.
	Hernan mario cabrera	ayudante	
	Yhonnier Eduardo Lozada	Ay.	
	Manuel Vasquez		Manuel Vasquez
	Alvaro Bermeo	OF	Alvaro
	Juan David Prado	OF	Juan D. Prado

EXPOSITOR: Ingri Mendoza

CARGO: Disoma.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Prevención de las lesiones de Columna.

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 26/08/2024

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Yovani Trujillo.	Of.	
	Brayan Stiven A	AY.	
	Diego Fernando Alvarez Bahon	AY	
	Hernan para cabrera.	ayudante	
	Jhonnier Eduardo Cajiao A.	Ay.	

EXPOSITOR: Ingri Mendoza.

CARGO: Sisonda.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Simulacro de evacuación.

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 28/02/2024

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	cesar	cesar	AY.
	manuel vasquez		AY
	Gerardo Perez B		AY.
	alvaro BERMEO		OF.
	Braian Rivera.	AY.	
	Wilfredo Pajoy		
	Yadonnier Eduardo Cujia.	AY.	
	Diego Fernando Muñoz Bolaños	AY	Diego Fernando M.
	Yovani Trujillo.	OF	
	Hernan Pardo Cabrera	ufudante	Hernan Pardo Cabrera

EXPOSITOR: Ingri Mendoza.
CARGO: Sisoma.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANEXO 11. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL RELACIONADAS CON TUBERÍAS DE LARGA DISTANCIA, LÍNEAS TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES, TUBERÍAS URBANAS, LÍNEAS URBANAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES; OBRAS AUXILIARES EN ZONAS URBANAS CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SISTEMAS DE RIEGO (CANALES)

Nombre o razón social: UNION TEMPORAL PMA SUAZA

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901664952

Dirección	Teléfono	Fax
CL 5 # 12 - 25 INTE 3		

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
RECURSO.HUMANO@CIVCOL.CO	HUILA	NEIVA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5422001

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL RELACIONADAS CON TUBERÍAS DE LARGA DISTANCIA, LÍNEAS TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

Dirección	Teléfono	Fax
CL 5 # 12 - 25 INTE 3	6088666831	

Departamento	Municipio	Zona
HUILA	NEIVA	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
AGUIRRE	VARGAS	BRAYAN STIVEN

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1118362660	19042002	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
SUAZA	8666836	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
HUILA	SUAZA	(•) U ( ) R	OBRERO

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	0:22

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
22012024	1300000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
13022024 10:00:00	S	Martes

Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra — ¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No — ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	HUILA	SUAZA	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
3:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Lugar donde ocurrió el accidente (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- (•) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ( ) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- (•) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- ( ) Herida
- (•) Trauma superficial
- ( ) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- (•) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ( ) Golpes por o contra objetos
- (•) Otro

CONTACTO CON HERRAMIENTOS U OBJETOS CORTO PUNZANTES...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR BRAYAN STIVEN AGUIRRE VARGAS, SE ENCONTRABA AMARRANDO ACERO EN LA OBRA, CUANDO SE QUITO EL GUANTE PARA PODER AMARRAR BIEN EL ALAMBRE Y SE CORTO DE FORMA SUPERFICIAL LA MANO IZQUIERDA EN LA PALMA DE LA MANO CON UN ALAMBRE, DICHO ACCIDENTE FUE A LAS 10:00 AM.

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? (•) Si ( ) No

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	JUAN DAVID PRADO DORADO		
Cargo	AYUDANDTE OBRA	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	71265406
Apellidos y nombres		Documento de identidad	No.
Cargo		CC TI CE NU PA	

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	MARTINEZ HORTUA LINA MARIA	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1070963884
Cargo	COORDINADORA DE RECURSOS HUMAN		

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente 13-02-2024 11:04:37

Fecha de recibido en ARL SURA 13-02-2024 11:04:28

ARL | SURA RECIBIDO

Fecha Impresión 13-02-2024 11:05:09

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4 F-SGS-102-001 REV 02	INVESTIGACION DE INCIDENTES	FECHA DE EMISIÓN: 13 - MAY - 2016

PROCESO O CONTRATO: contrato de obra 217 de 2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	RESPONSABLE:	INGRI JOHANNA MENDOZA MAYOR
REVISO (CARGO/FIRMA): NATALIA TORO ANDRADE	FECHA DEL REPORTE: 13/02/2024	CLIENTE: N/A

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL LESIONADO:	BRAYAN STIVEN AGUIRRE	CEDULA:	1.118.262.669	FECHA DE NACIMIENTO:	10/04/2002
ESTADO CIVIL: CASADO	FECHA DE INGRESO:	23/01/2024	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:	VITELIO GALINDO FLORES	
MAQUINARIA, EQUIPO, PROCESO AFECTADO:			NINGUNO		
FECHA DEL EVENTO:	13-feb-24	HORA:	10:00 a. m.	DIAS DE INCAPACIDAD:	0
SITIO DEL EVENTO:	CENTRO DE OBRA SUAZA HUILA				
DAÑOS AMBIENTALES REALES:	NINGUNO				

DESCRIPCION DE LOS HECHOS (Antes, Durante y Despues) DEL EVENTO.

DESCRICION DEL AREA DE TRABAJO:	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD DESARROLLADA:	AMARRE DE ACERO
CONDICIONES PREVIAS A LA PERDIDA. INCIDENTE O EMERGENCIA:	SE PRESTA ATENCION AL COLABORADOR Y ES ENVIADO AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LA PERDIDA, INCIDENTE O EMERGENCIA: EL TRABAJADOR, SE ENCONTRABA AMARRANDO ACERO EN LA OBRA, CUANDO SE QUITO EL GUANTE PARA PODER AMARRAR BIEN EL ALAMBRE Y SE CORTO DE FORMA SUPERFICIAL LA MANO IZQUIERDA EN LA PALMA DE LA MANO, DICHO ACCIDENTE FUE A LAS 10:00 AM.





EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Realizaba las labores para las cuales fue contratado:	SI	Recibió Entrenamiento:	SI	Conocía los riesgos de su labor:	SI
Recibio Inducción:	SI	Recibió Capacitación continua:	SI	Recibió los procedimientos y Responsabilidades para su cargo:	SI
Elementos de protección personal entregados:	CASCO, GUANTES, GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD				
Elementos de protección en Uso:	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD				
Se cuenta con planes de Emergencias:	SI	Han sido Divulgados:	SI	Han realizado simulacros:	NO
Cuantos?:	N/A				
Hay un programa de mantenimiento preventivo:	SI	Se ejecuta:	SI	Hay manual HSE:	SI
Se ha divulgado:	SI				
Los procedimientos requeridos están documentados:	SI	Han sido Divulgados:	SI	Hubo testigos?:	SI
Atención médica prestada:	SI				
Se realizan inspecciones:	SI	Se requirió prueba de alcoholemia:	NO	Se practicó:	NO
Resultados:					
Nombre del conductor:	N/A	Pase No:	N/A	Categoria:	N/A
Curso manejo defensivo:	N/A				
El involucrado tiene autorización para manejar:	N/A	Expedida por:	N/A	Se notificó a la ARL:	N/A
Otras evidencias y/o comentarios adicionales:	NO APLICA				

ANÁLISIS DEL INCIDENTE

ANÁLISIS DE CAUSAS (Metodología según procedimiento): SE REALIZA ANALISIS DE LAS CAUSAS PARA LA INVESTIGACION ATRAVEZ DE LA METODOLOGIA ESPINA DE PESCADO

CAUSAS INMEDIATAS:	Actos Inseguros:	Retiro de guante de seguridad
	Condiciones Inseguras:	alambre
CAUSAS BASICAS:	Factores personales:	practicas inadecuadas
	Factores de Trabajo:	amarre de alambre
	Factores Administrativos:	no hay factores asociados
FALTA DE CONTROL:		uso adecuado de los epp
NATURALEZA DE LA LESION:		herida superficial
PARTE DEL CUERPO AFECTADA:		palma de la mano
TIPO DE INCIDENTE PERDIDA O EMERGENCIA:		herida de la mano
AGENTE DE LA LESION:		materiales o sustancias
AGENTE DEL INCIDENTE, PERDIDA O EMERGENCIA:		materiales o sustancias

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4 F-SGS-102-001 REV 02	INVESTIGACION DE INCIDENTES	FECHA DE EMISIÓN: 13 - MAY - 2016

TIPO DE DAÑO: herida superficial

QUE ACCIONES INMEDIATAS SE TOMARON DESPUES DEL EVENTO: capacitar al personal sobre los peligros asocias con el adecuado uso de epp

PLAN DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	PLAZO	FECHA CIERRE	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFICACIA
1	INGRI MENDOZA	CAPACITACION USO ADECUADO DE EPP	19/02/2024	23/02/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA
2	INGRI MENDOZA	LECCIÓN APRENDIDA	19/02/2024	23/02/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA
3					
4					
5					
6					

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

NOMBRES	CARGOS	FIRMAS
INGRI JOHANNA MENDOZA	SISOMA	

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Lección Aprendida accidente y uso adecuado de epp

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 19/02/2024


No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Bryan Stiven Aguirre	AY	
	manuel vasquez		
	Alvaro Beltran		
	Gerardo Jerez B	Ayudante	
	[illegible]		
	Ing. Ingrid Mendez B.	AY.	Ing. Ingrid M
	Hernes para cabrera.	ayudante	
	Juan David Prada	OF	
	Shannick Eduardo Cuaiza	AY	
	Alfredo Pajoy	AY	
	Yovani Trujillo.	OF	

EXPOSITOR: Ingrid Mendez.

CARGO: Residente.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

BRAYAN STIVEN AGUIRRE

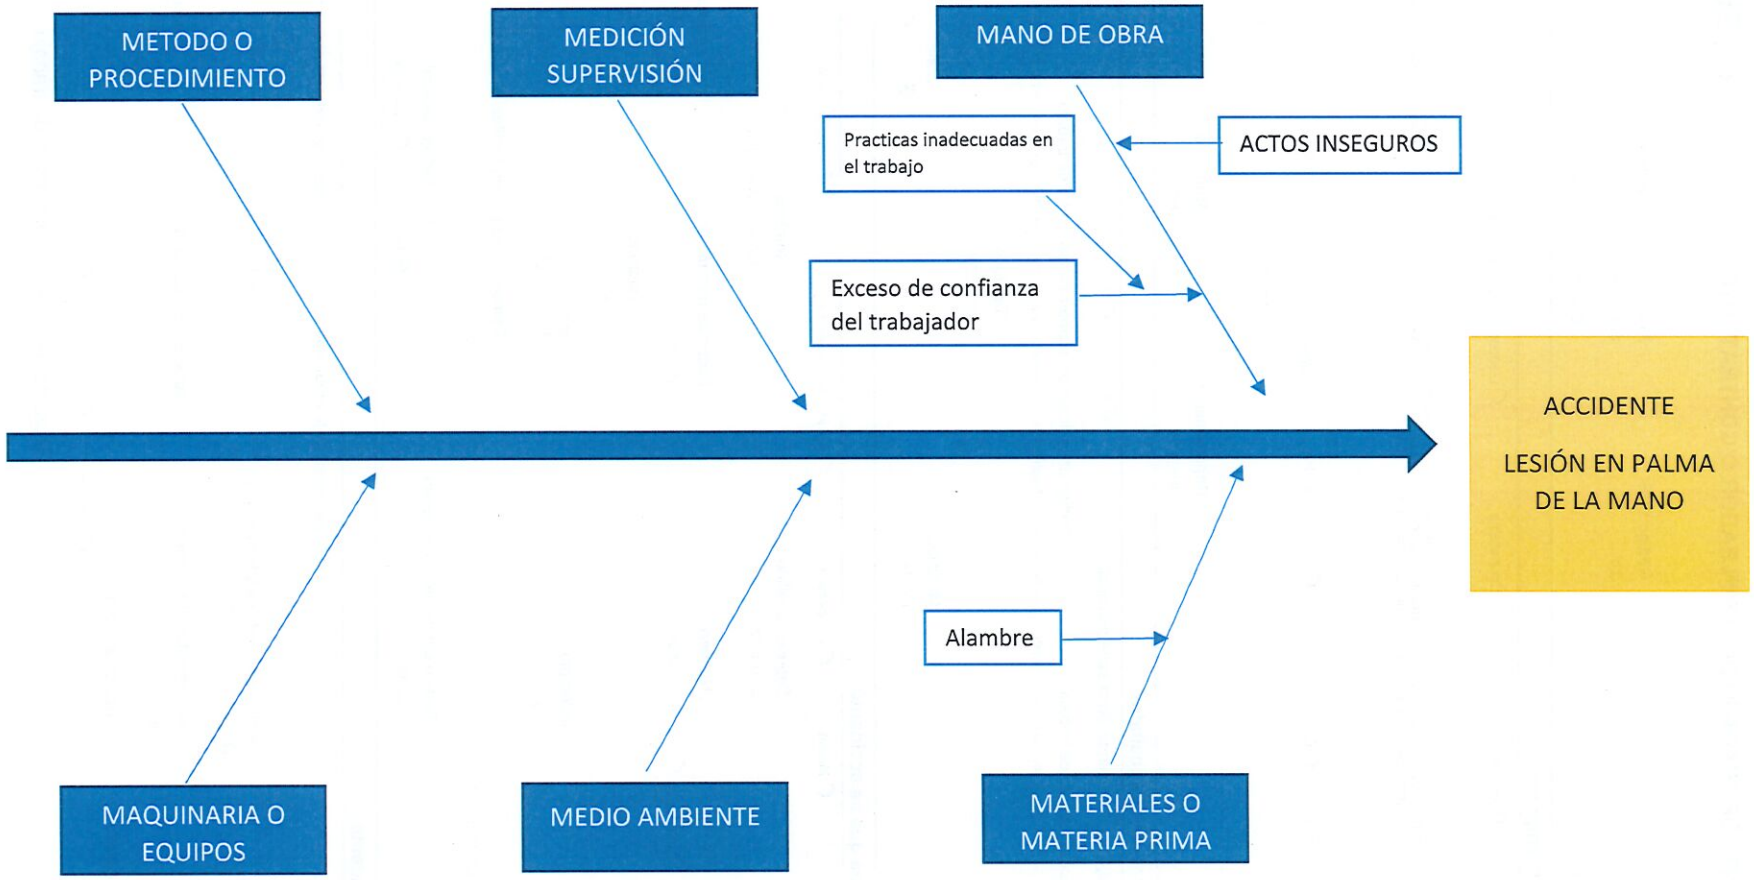

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: NINGUNA AFP — Código AFP: 000

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL RELACIONADAS CON TUBERÍAS DE LARGA DISTANCIA, LÍNEAS TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES, TUBERÍAS URBANAS, LÍNEAS URBANAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES; OBRAS AUXILIARES EN ZONAS URBANAS CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SISTEMAS DE RIEGO (CANALES)

Nombre o razón social: UNION TEMPORAL PMA SUAZA

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901664952

Dirección	Teléfono	Fax
CL 5 # 12 - 25 INTE 3		

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
RECURSO.HUMANO@CIVCOL.CO	HUILA	NEIVA	( ) U (•) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL RELACIONADAS CON TUBERÍAS DE LARGA DISTANCIA, LÍNEAS TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5422001

Dirección	Teléfono	Fax
CL 5 # 12 - 25 INTE 3	6088666831	

Departamento	Municipio	Zona
HUILA	NEIVA	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
VASQUEZ	RAMIREZ	MANUEL AGUSTIN

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	83239047	15021974	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
KM 24 VIA SUAZA	3125883149	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
HUILA	SUAZA	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	3:12

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
09112023	1300000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
21022024 14:25:00	S	Miércoles

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	HUILA	SUAZA	( ) U (•) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
6:25	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Lugar donde ocurrió el accidente — (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- (•) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ( ) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- (•) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- ( ) Herida
- ( ) Trauma superficial
- (•) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- (•) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- (•) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

EL COLABORADOR SE ENCONTRABA TRASLADANDO UN ACCESORIO "VÁLVULA", SE RESBALA PRESENTANDO CAÍDA DE SU MISMO NIVEL Y GgolpE EN HOMBRO, INMEDIATAMENTE PRESENTA DOLOR Y ES TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCIÓN MEDICA.

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres: MENDOZA MAYOR INGRI JOHANNA — Documento de identidad: (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No.: 1075242447

Cargo: SISOMA

ARL | sura

21-02-2024 16:11:37

21-02-2024 16:11:36

RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 21-02-2024 16:11:52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4 F-SGS-102-001 REV 02	INVESTIGACION DE INCIDENTES	FECHA DE EMISIÓN: 13 - MAY - 2016

PROCESO O CONTRATO: contrato de obra 217 de 2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	RESPONSABLE:	INGRI JOHANNA MENDOZA MAYOR
REVISO (CARGO/FIRMA): NATALIA TORO ANDRADE	FECHA DEL REPORTE: 21/02/2024	CLIENTE: N/A

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL LESIONADO:	MANUEL AGUSTIN VASQUEZ RAMIREZ	CEDULA:	83.239.047	FECHA DE NACIMIENTO:	15/02/1974
ESTADO CIVIL: CASADO	FECHA DE INGRESO: 9/11/2023	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:	VITELIO GALINDO FLORES		
MAQUINARIA, EQUIPO, PROCESO AFECTADO:	NINGUNO				
FECHA DEL EVENTO: 21-feb-24	HORA: 2:25 p. m.	DIAS DE INCAPACIDAD:	0	SITIO DEL EVENTO:	CENTRO DE OBRA SUAZA HUILA
DAÑOS AMBIENTALES REALES:	NINGUNO				

DESCRIPCION DE LOS HECHOS (Antes, Durante y Despues) DEL EVENTO.

DESCRICION DEL AREA DE TRABAJO:	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD DESARROLLADA:	TRASLADO DE MATERIAL O ACCESORIOS
CONDICIONES PREVIAS A LA PERDIDA. INCIDENTE O EMERGENCIA:	SE PRESTA ATENCION AL COLABORADOR Y ES ENVIADO AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LA PERDIDA, INCIDENTE O EMERGENCIA: EL COLABORADOR SE ENCONTRABA TRASLADANDO UN ACCESORIO "VÁLVULA", SE RESBALA PRESENTANDO CAÍDA DE SU MISMO NIVEL Y GOLPE EN HOMBRO, INMEDIATAMENTE PRESENTA DOLOR Y ES TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL PARA ATENCIÓN MEDICA.



EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Realizaba las labores para las cuales fue contratado:	SI	Recibió Entrenamiento:	SI	Conocía los riesgos de su labor:	SI		
Recibio Inducción:	SI	Recibió Capacitación continua:	SI	Recibió los procedimientos y Responsabilidades para su cargo:	SI		
Elementos de protección personal entregados:	CASCO, GUANTES, GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD						
Elementos de protección en Uso:	CASCO, GUANTES, GAFAS Y BOTAS DE SEGURIDAD						
Se cuenta con planes de Emergencias:	SI	Han sido Divulgados:	SI	Han realizado simulacros:	NO	Cuantos?:	N/A
Hay un programa de mantenimiento preventivo:	SI	Se ejecuta:	SI	Hay manual HSE:	SI	Se ha divulgado:	SI
Los procedimientos requeridos están documentados:	SI	Han sido Divulgados:	SI	Hubo testigos?:	SI		
Atención médica prestada:	SI						
Se realizan inspecciones:	SI	Se requirió prueba de alcoholemia:	NO	Se practicó:	NO	Resultados:	
Nombre del conductor:	N/A	Pase No:	N/A	Categoria:	N/A	Curso manejo defensivo:	N/A
El involucrado tiene autorización para manejar:	N/A	Expedida por:	N/A	Se notificó a la ARL:	N/A		
Otras evidencias y/o comentarios adicionales:	NO APLICA						

ANÁLISIS DEL INCIDENTE

ANÁLISIS DE CAUSAS (Metodología según procedimiento): SE REALIZA ANALISIS DE LAS CAUSAS PARA LA INVESTIGACION ATRAVEZ DE LA METODOLOGIA ESPINA DE PESCADO

CAUSAS INMEDIATAS:	Actos Inseguros:	sobre esfuerzo
	Condiciones Inseguras:	suelo resbalozo
CAUSAS BASICAS:	Factores personales:	practicas inadecuadas
	Factores de Trabajo:	traslado de material
	Factores Administrativos:	no hay factores asociados
FALTA DE CONTROL:		planeación del trabajo
NATURALEZA DE LA LESION:		dolor
PARTE DEL CUERPO AFECTADA:		hombro y espalda
TIPO DE INCIDENTE PERDIDA O EMERGENCIA:		golpe o contusión
AGENTE DE LA LESION:		herramientas, implementos o utensilios
AGENTE DEL INCIDENTE, PERDIDA O EMERGENCIA:		materiales o sustancias

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4 F-SGS-102-001 REV 02	INVESTIGACION DE INCIDENTES	FECHA DE EMISIÓN: 13 - MAY - 2016

TIPO DE DAÑO: dolor hombro

QUE ACCIONES INMEDIATAS SE TOMARON DESPUES DEL EVENTO: capacitar al personal sobre los peligros asocias con las caidas a nivel y sobre esfuerzo


PLAN DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	PLAZO	FECHA CIERRE	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFICACIA
1	INGRI MENDOZA	CAPACITACIÓN SOBRE ESFUERZO	22/02/2024	29/02/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA
2	INGRI MENDOZA	LECCIÓN APRENDIDA	22/02/2024	29/02/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA
3					
4					
5					
6					

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

NOMBRES	CARGOS	FIRMAS
INGRI JOHANNA MENDOZA	SISOMA	

MANUEL AGUSTIN VASQUEZ

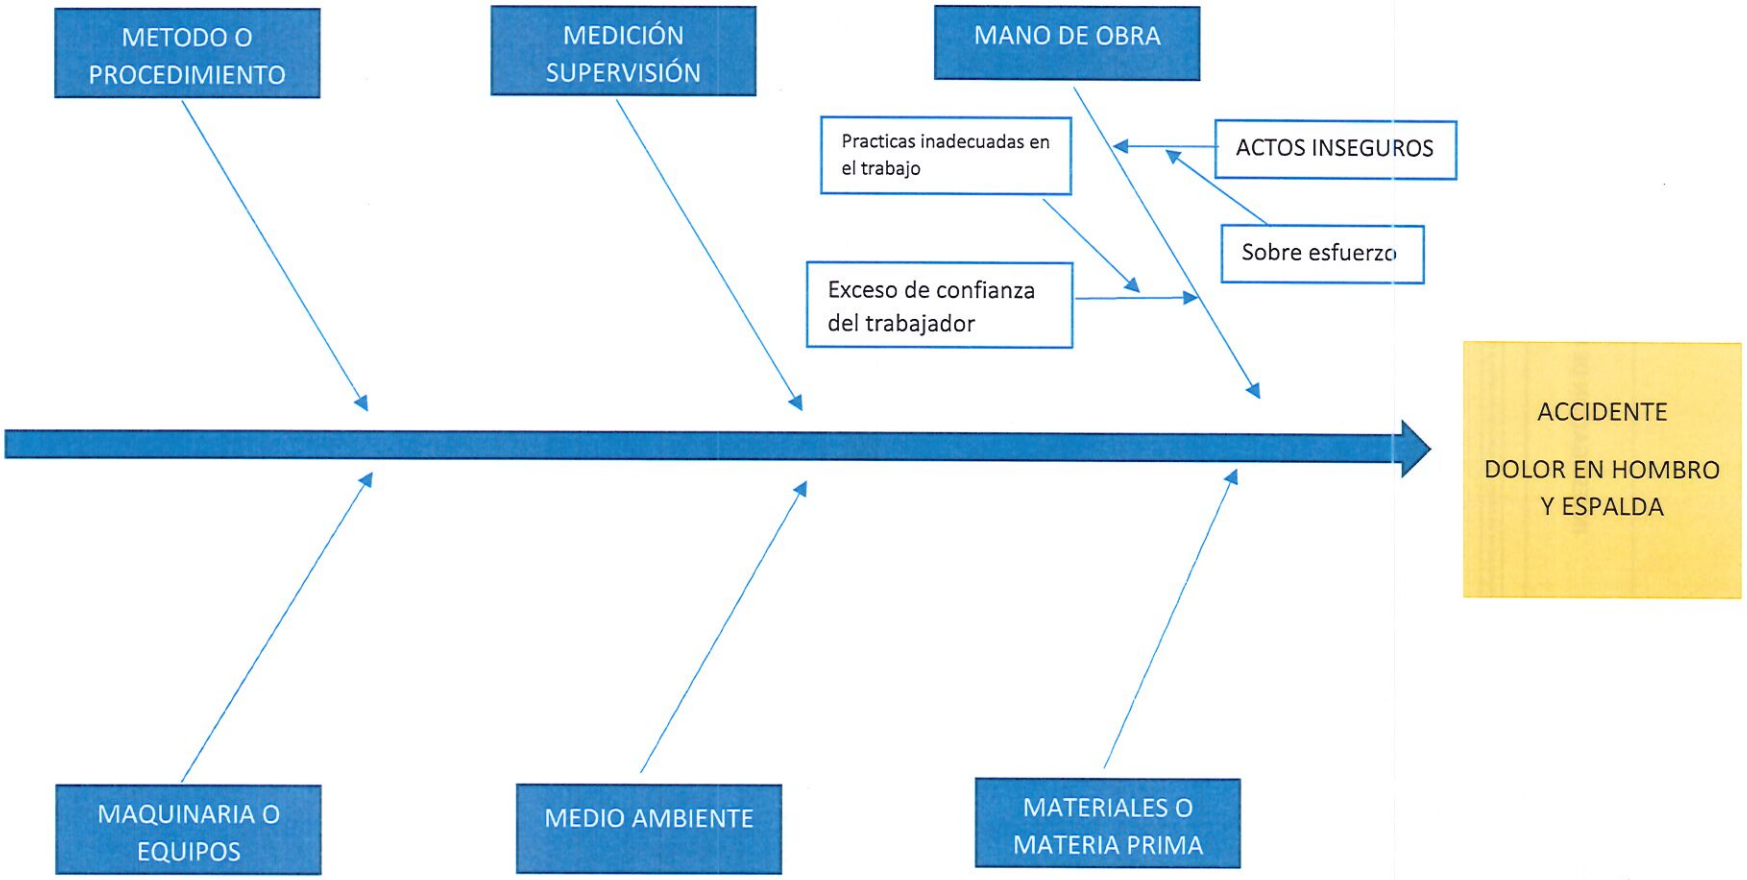

UT PMA SUAZA NIT: 901.664.925-4	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 04-JUN-15

TEMA: Lecciones Aprendidas Accidente y capacitación sobre esfuerzo.

PROYECTO(*): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA: 22/05/2024

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Yovani Trujillo.	Of.	
	Brayan Stiven A.	Ay.	
	Diego fernando Muñoz B.	Ay	Diego fernando M. B.
	Hernan mario cabrera	ayudante	
	Yhonnier Eduardo Lozada	Ay.	
	Manuel vasquez		Manuel Vasquez
	Alvaro Bermeo	OF	Alvaro
	Juan David Prado	OF	Juan D. Prado

EXPOSITOR: Ingri Mendoza

CARGO: Asesora.

(*) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

21/02/2023

SUAZA – HUILA

Yo MANUEL AGUSTIN VASQUEZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía numero 83.239.047 de Suaza Huila, presente caída con dolor en el hombro y parte de la espalda en un accidente laboral en los tanques de agua potable, siendo trasladado al hospital del municipio de Suaza para atención médica. Estando en el hospital decido no esperar la atención médica y me retiro de este haciéndome responsable de lo que me pueda pasar, comprando unas pastas para el dolor y reintegrándome nuevamente a laborar. Es así como exonero al consorcio UT PMA SUAZA de lo que pueda presentar en adelante.

Atentamente,

Manuel Agustin Vasquez R

MANUEL AGUSTIN VASQUEZ RAMIREZ

83239047
