Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238,37-035
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Diciembre-04-2018
		Página 1 de 38

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Contrato No.:	**316 - 2023**
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Fecha de Inicio:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación:	27 DE FEBRERO DE 2024
Valor de contrato:	$ 380.844.085,18
Contratista:	URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC S.A.S.
NIT o Cédula:	800189202-5
Póliza:	BCH-100031016
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Amparos:	Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Calidad de la obra. Cumplimiento de las obligaciones del contrato. Estabilidad y calidad de la obra. Responsabilidad civil extracontractual.
Supervisor de Obra:	EDGAR BAYONA FLÓREZ

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga tiene la responsabilidad de planificar, formular, dirigir, ejecutar y controlar los planes, proyectos y programas de inversión en infraestructura urbana, recreación y alumbrado público, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, "Bucaramanga Ciudad de Oportunidades". Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y consolidar espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la salud, la convivencia y la paz, se deben llevar a cabo acciones prioritarias para la ciudad.


El proyecto consta de la intervención urbana del corredor ambiental de la Diagonal 15 Fase 1 (Av. Quebrada Seca hasta la Calle 33), dicho proyecto surge de renovar las zonas verdes y aportar al confort térmico de la Diagonal 15 por medio de un proyecto paisajístico sobre el separador de la vía, por eso mismo desde la Quebrada Seca hasta la Calle 33 se harán ciertas reparaciones en los andenes y se repotenciará la franja de amoblamiento con mobiliario urbano, a su vez se reharán los vados peatonales que contarán con bolardos metálicos, y en el separador de la via se planteará una propuesta de paisajismo con especies de la región que ayuden a incentivar la proliferación de la fauna y la flora del lugar. El Barrio Centro es uno de los primeros asentamientos que se conformaron en la ciudad de Bucaramanga por estar cerca de su iglesia y parque principal, sin embargo, con el tiempo el centro histórico se le fue dando un gran uso comercial hasta convertirse en uno de los puntos mas concurridos de la ciudad, la Fase 1 del proyecto cuenta con un área de intervención total de 8.020 metros cuadrados (m²) de uso público. Las mejoras en el espacio público se han reprogramado, con la recuperación del espacio residual, incluyendo actividades físicas y sociales para el goce y disfrute de los ciudadanos. El

Powered by CamScanner

aprovechamiento de estas actividades en él se realiza en concordancia con los postulados del Plan de Desarrollo, e incluye diversas áreas características descritas a continuación.

LOCALIZACION

La intervención Vial de la "Carrera 15 – Fase I (Av. Quebrada Seca - Calle 33)" se desarrolla en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, en el Departamento de Santander, más exactamente en el barrio El Centro de la Comuna 15 – Centro.

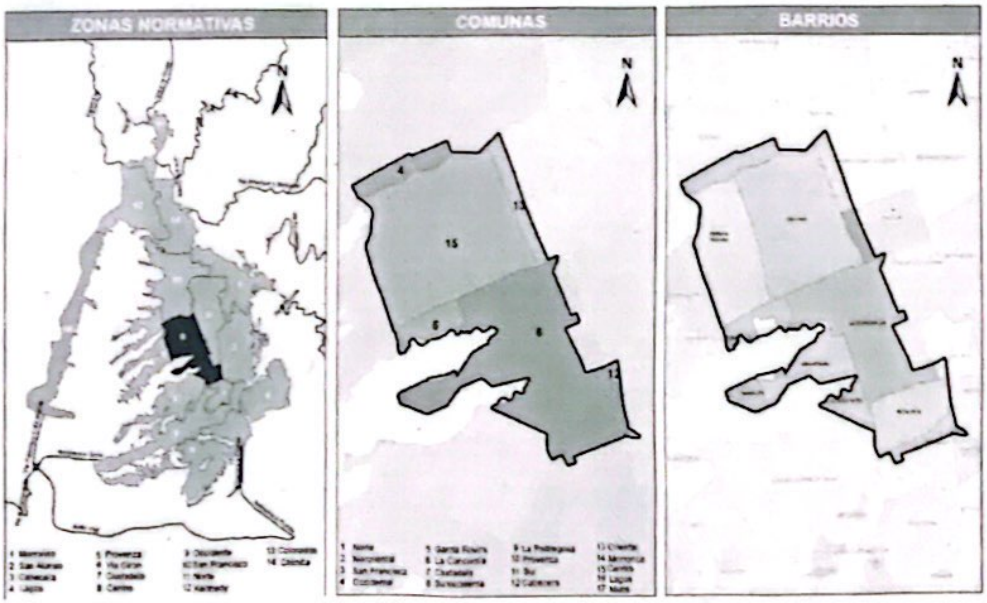

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – Bucaramanga 2014

En esta Administración Municipal, se enfatiza la importancia de recuperar, conservar, rehabilitar, renovar y realzar espacios destinados a brindar una mejor calidad de vida a través de la recreación, la contemplación, el encuentro y el ocio de los ciudadanos, con un enfoque de integración cultural dentro de la comunidad. Aunque Bucaramanga cuenta con una red de parques, plazas y plazoletas, se reconoce la necesidad de más y mejores espacios que promuevan el encuentro y la integración de las personas en su comunidad, así como la articulación del espacio público y el fortalecimiento de la identidad urbana y cultural de la ciudad. Por ello, la

Powered by CamScanner

administración municipal busca generar escenarios adecuados para mejorar el sector, dinamizar el espacio público y fomentar el uso adecuado y el aprovechamiento por parte de la población, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

La administración municipal se compromete a crear espacios públicos representativos del desarrollo de la ciudad, que reflejen valores culturales y urbanísticos, y promuevan el uso activo del tiempo libre por parte de la población. Estas iniciativas están dirigidas a reafirmar valores morales y sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad. En este contexto, se presenta el proyecto de "Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Diagonal 15 Avenida Quebrada Seca hasta la Calle 33 dentro de la Estrategia Corredor Ambiental en el Municipio de Bucaramanga", el cual busca transformar el espacio público para crear un entorno más inclusivo, accesible y agradable para todos los ciudadanos.

Este proyecto se enmarca dentro de una visión integral de desarrollo urbano, que busca no solo mejorar la infraestructura física, sino también promover la integración social, el bienestar comunitario y el cuidado del medio ambiente. A través de la revitalización de espacios públicos, la creación de zonas verdes y la implementación de medidas de accesibilidad, se busca potenciar la calidad de vida de los habitantes de Bucaramanga y fortalecer el sentido de pertenencia hacia su entorno urbano. Buscando el buen uso del tiempo libre de la población vecina, todas ellas encaminadas a reafirmar valores morales y sociales que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto.

Powered by CamScanner

Datos del Predio	
Numero Predial:	-
Barrio:	Centro
Ficha Normativa:	F8 – Centro
Comuna:	15 – Centro
Uso:	Intervención de Vía y Separador Ambiental
Dirección:	
Destinación Económica:	Uso Publico
	Mixto

Plano Localización



ZONIFICACION Y CUADRO DE AREAS



CUADRO DE AREAS		
AREA ZONA VERDE	470.87 M2	6%
AREA CIRCULACION PEATONAL	2.724 M2	34%
AREA CIRCULACION VEHICULAR	4.490 M2	56%
AREA CIRCULACION METROLINEA	335.13 M2	4%
AREA TOTAL DE INTERVENCION	**8.020 M2**	**100.0%**

CUADRO DE INDICES	
AREA DE ESPACIO VEHICULAR	0.56
AREA DE ESPACIO PEATONAL	0.38
AREA PERMEABLE	0.06
AREA DE CIRCULACION	0.94

ALCANCE DEL PROYECTO

Powered by CamScanner

La intervención total se dará por toda la Diagonal 15 desde la Av. Quebrada Seca hasta la Calle 45, sin embargo, se contempla una primera fase que abarca desde la Av. Quebrada Seca hasta la Calle 33.

TIPO DE OBRA

Mejoramiento de la infraestructura urbana de la diagonal 15 avenida quebrada seca hasta la calle 33 dentro de la estrategia corredor ambiental en el municipio de Bucaramanga. Requiere efectuar actividades tales como: localización, replanteo, cerramiento, corte, rotura, demolición de andenes, instalación de sardineles y aplicación de concreto y/o adoquines, construcción de obras civiles entre otras más actividades que hacen parte integral del alcance del proyecto.

Powered by CamScanner

2. CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y/O PERSONAL SALARIOS

CONDICIONES CNTRATADAS			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
PRELIMINARES			
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	570,00
1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	11,00
1.2.2	Desmonte de protector de árbol tipo U invertida, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	76,00
1.3.1	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1,11
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	90,99
1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	4,11
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	121,21
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	6,57
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	15,71

Powered by CamScanner

1.5.2	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador	M3	0,00
1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	0,00
CONCRETOS			
2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	M3	11,31
2.1.2	Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	9,37
2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	ML	28,32
2.2.2	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML	0,00
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
3.1.1	Malla electro soldada	KG	569,00
3.1.2	Alcorque metalico en rejilla electrosodada Avila dentada MBG 532 para la serie pesada, Galvanizada en caliente, Rejilla de 1" de altura reforzada en varilla, anclada con pernos de 3/8"	M2	0,00
ACABADOS			
4.1.1	Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	M2	0,00
4.1.2	Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	M2	0,00
BANCAS			

Powered by CamScanner

5.1.1	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, sin espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	0.00
5.1.2	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, con espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	0.00
ZONAS VERDES			
6.1.1	Suministro y siembra de árbol Cordia Sebestena (no me olvides) H = 1.5m	UN	9.00
6.1.2	Suministro y siembra de árbol Heliocarpus Americanus (majaguillo o majagua) H = 1.5m	UN	9.00
6.1.3	Suministro y siembra de árbol Parkinsonia Aculeata (El espinillo, cina-cina, palo verde, retama) H = 1.5m	UN	9.00
6.1.4	Suministro y siembra planta Lantana Cámara (Bandera española, cinco negritos)	UN	506.00
6.1.5	Suministro y siembra de planta Bella hasta las once	UN	73.00
6.1.6	Suministro y siembra de planta carludovica Palmata (jipijapa, puerto rico, toquilla, palma de bellota)	UN	92.00
6.1.7	Suministro y siembra de planta Hamelia Patens (coralito, bencenuco)	UN	14.00
6.1.8	Suministro y siembra de planta Stachytarpheta Cayennensis (Cayena, falsa verbena de hoja aspera, berbena de cayena)	UN	310.00

Powered by CamScanner

6.1.9	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	M2	101,20
MOBILIARIO			
7.1.1	Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	UN	0,00
7.1.2	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	UN	25,00
7.1.3	Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	UN	0,00
SEÑALIZACION			
8.1.1	Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa), lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex , (incluye cimentación)	UN	0,00
8.1.2	Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ML	0,00
8.1.3	Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, lineas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	M2	0,00
ASEO Y LIMPIEZA			
9.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	577,74
VARIOS			
10.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00

Powered by CamScanner

10.1.2	PLAN MANEJO TRANSITO	UN	1,00
VARIOS			
NP-01	REPARACIÓN MUROS DE CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI, H=0,40 ESP. 0,10	ML	53,00
NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3	4,25
NP-03	ACABADO DE PISO CON ENDURECEDOR PARA CONCRETO	M2	200,00
NP-04	TAPA REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CANAL DIM: 1.00X0.25X0.06M	ML	8,00
NP-05	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200 REFORZADO SEGÚN DISEÑO CDMB	UN	
NP-06	CONEXIÓN DESAGÜE SUMIDERO NUEVO CON SUMIDERO ANTIGUO EN TUBERÍA PVC 315mm (12")	MI	3,00
NP-07	SUMIDERO LATERAL TIPO SL-200 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI REFORZADO SEGÚN DISEÑO EMPAS INCLUYE ASEO Y TAPA	UND	1,00
NP-08	RECONSTRUCCIÓN PLAZA SUPERIOR SUMIDERO SL-200 EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	UND	1,00

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238,37-035
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Diciembre-04-2018
		Página 1 de 32

3. OBRAS EJECUTADAS (incluir Registro Fotográfico)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES EJECUTADAS CANT
PRELIMINARES			
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	569,73
1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	5,00
1.2.2	Desmonte de protector de árbol tipo U invertida, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	76,00
1.3.1	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1,11
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	90,79
1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	4,11
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	121,21
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	6,57
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	15,71
1.5.2	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador	M3	
1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	

Powered by CamScanner

CONCRETOS			
2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	M3	11,31
2.1.2	Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	9,37
2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	ML	28,32
2.2.2	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML	
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS			
3.1.1	Malla electro soldada	KG	569,00
3.1.2	Alcorque metalico en rejilla electrosodada Avila dentada MBG 532 para la serie pesada, Galvanizada en caliente, Rejilla de 1" de altura reforzada en varilla, anclada con pernos de 3/8"	M2	
ACABADOS			
4.1.1	Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	M2	
4.1.2	Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	M2	
BANCAS			
5.1.1	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, sin espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	

Powered by CamScanner

5.1.2	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, con espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	
ZONAS VERDES			
6.1.1	Suministro y siembra de árbol Cordia Sebestena (no me olvides) H = 1.5m	UN	
6.1.2	Suministro y siembra de árbol Heliocarpus Americanus (majaguillo o majagua) H = 1.5m	UN	
6.1.3	Suministro y siembra de árbol Parkinsonia Aculeata (El espinillo, cina-cina, palo verde, retama) H = 1.5m	UN	
6.1.4	Suministro y siembra planta Lantana Cámara (Bandera española, cinco negritos)	UN	
6.1.5	Suministro y siembra de planta Bella hasta las once	UN	
6.1.6	Suministro y siembra de planta carludovica Palmata (jipijapa, puerto rico, toquilla, palma de bellota)	UN	
6.1.7	Suministro y siembra de planta Hamelia Patens (coralito, bencenuco)	UN	
6.1.8	Suministro y siembra de planta Stachytarpheta Cayennensis (Cayena, falsa verbena de hoja aspera, berbena de cayena)	UN	
6.1.9	Contenedor de raices longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	M2	101,2
MOBILIARIO			

Powered by CamScanner

7.1.1	Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	UN	
7.1.2	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	UN	25,00
7.1.3	Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	UN	
SEÑALIZACION			
8.1.1	Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa), lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex , (incluye cimentación)	UN	
8.1.2	Linea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ML	
8.1.3	Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	M2	
ASEO Y LIMPIEZA			
9.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	
VARIOS			
10.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	0,655
10.1.2	PLAN MANEJO TRANSITO	UN	0,774
VARIOS			
NP-01	REPARACIÓN MUROS DE CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI, H=0,40 ESP. 0,10	ML	
NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3	4,25

Powered by CamScanner

NP-03	ACABADO DE PISO CON ENDURECEDOR PARA CONCRETO	M2	
NP-04	TAPA REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CANAL DIM: 1.00X0.25X0.06M	ML	
NP-05	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200 REFORZADO SEGÚN DISEÑO CDMB	UN	
NP-06	CONEXIÓN DESAGÜE SUMIDERO NUEVO CON SUMIDERO ANTIGUO EN TUBERÍA PVC 315mm (12")	MI	3,00
NP-07	SUMIDERO LATERAL TIPO SL-200 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI REFORZADO SEGÚN DISEÑO EMPAS INCLUYE ASEO Y TAPA	UND	1,00
NP-08	RECONSTRUCCIÓN PLAZA SUPERIOR SUMIDERO SL-200 EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	UND	1,00

4. RELACION PRESUSPUESTO CONTRATADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
CONTRATADO	$ 380.844.085,18	100.00%
EJECUTADO	$ 174.660.456,31	45,86%

Powered by CamScanner

En esta Administración Municipal, se enfatiza la importancia de recuperar, conservar, rehabilitar, renovar y realzar espacios destinados a brindar una mejor calidad de vida a través de la recreación, la contemplación, el encuentro y el ocio de los ciudadanos, con un enfoque de integración cultural dentro de la comunidad. Aunque Bucaramanga cuenta con una red de parques, plazas y plazoletas, se reconoce la necesidad de más y mejores espacios que promuevan el encuentro y la integración de las personas en su comunidad, así como la articulación del espacio público y el fortalecimiento de la identidad urbana y cultural de la ciudad. Por ello, la administración municipal busca generar escenarios adecuados para mejorar el sector, dinamizar el espacio público y fomentar el uso adecuado y el aprovechamiento por parte de la población, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

La administración municipal se compromete a crear espacios públicos representativos del desarrollo de la ciudad, que reflejen valores culturales y urbanísticos, y promuevan el uso activo del tiempo libre por parte de la población. Estas iniciativas están dirigidas a reafirmar valores morales y sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad. En este contexto, se presenta el proyecto de "Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Diagonal 15 Avenida Quebrada Seca hasta la Calle 33 dentro de la Estrategia Corredor Ambiental en el Municipio de Bucaramanga", el cual busca transformar el espacio público para crear un entorno más inclusivo, accesible y agradable para todos los ciudadanos.

Este proyecto se enmarca dentro de una visión integral de desarrollo urbano, que busca no solo mejorar la infraestructura física, sino también promover la integración social, el bienestar comunitario y el cuidado del medio ambiente. A través de la revitalización de espacios públicos, la creación de zonas verdes y la implementación de medidas de accesibilidad, se busca potenciar la calidad de vida de los habitantes de Bucaramanga y fortalecer el sentido de pertenencia hacia su entorno urbano. Buscando el buen uso del tiempo libre de la población vecina, todas ellas encaminadas a reafirmar valores morales y sociales que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto.

Powered by CamScanner

2.2 Cuadro de Pólizas

2.2.1 POLIZAS DEL CONTRATO

GARANTIA(s). Póliza (s) No. BCH – 100031016; BCH - 100006360

ASEGURADORA: SEGURO MUNDIAL

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 76.168.817,20	26/12/2023	27/06/2024
PAGO ANTICIPO	$ 114.253.225,80	26/12/2023	27/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 38.084.408,60	26/12/2023	27/02/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 260. 000.000,00	26/12/2023	29/02/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 38.084.408,60	27/04/2024	27/04/2029

2.3 Indicador de Avance de Obra

Las obras tienen el siguiente avance:

ACTIVIDADES	% completado
PROGRAMACION Carrera 15 TRAMO 1 entre AV Qbseca y calle 33	**60%**
MEDICIONES	**100%**
Localización y replanteo	100%
DESMONTES	**75%**
Desmonte de bolardo metálico	50%
Desmonte de protector de árbol tipo U invertida	100%
DEMOLICIONES	**93%**
Demolición de bancas con martillo eléctrico	100%
Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo	100%
Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo	80%
EXCAVACIONES	**90%**
Excavación manual en material común en seco	90%


Powered by CamScanner

Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm	90%
RELLENOS	**60%**
Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	60%
CONCRETOS	**74%**
PLACA DE PISO	**100%**
Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	100%
Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	90%
BORDILLOS Y SARDINELES	**100%**
Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	100%
ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	**100%**
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	**100%**
Malla electro soldada	100%
ACABADOS DE PISO	**10%**
ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL	**10%**
Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	0%
Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	20%
ZONA VERDE	**21%**
Suministro y siembra de árboles	10%
Suministro y siembra plantas	10%
Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio	100%
MOBILIARIO	**50%**
Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	50%
SEÑALIZACIÓN	**3%**
Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa), lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex , (incluye cimentación)	5%
Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	5%
Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	0%
ASEO Y LIMPIEZA PARTE 1	**80%**
Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	80%
VARIOS	**46%**
Plan de manejo Ambiental	80%
Plan de manejo Trafico	80%
ACTIVIDADES NO PREVISTAS	**60%**
Conexión desagüe sumidero nuevo con sumidero antiguo en tubería PVC 315mm (12")	100%

Powered by CamScanner

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	70%
Reconstrucción placa superior sumidero SL-200 en concreto reforzado en 4000PSI	100%
Cerramiento en U con tubería galvanizada tipo cerramiento de 2"	50%
Sumidero lateral tipo SL-200 en concreto premezclado en 4000 PSI reforzado según diseño EMPAS incluye aro y tapa	100%

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

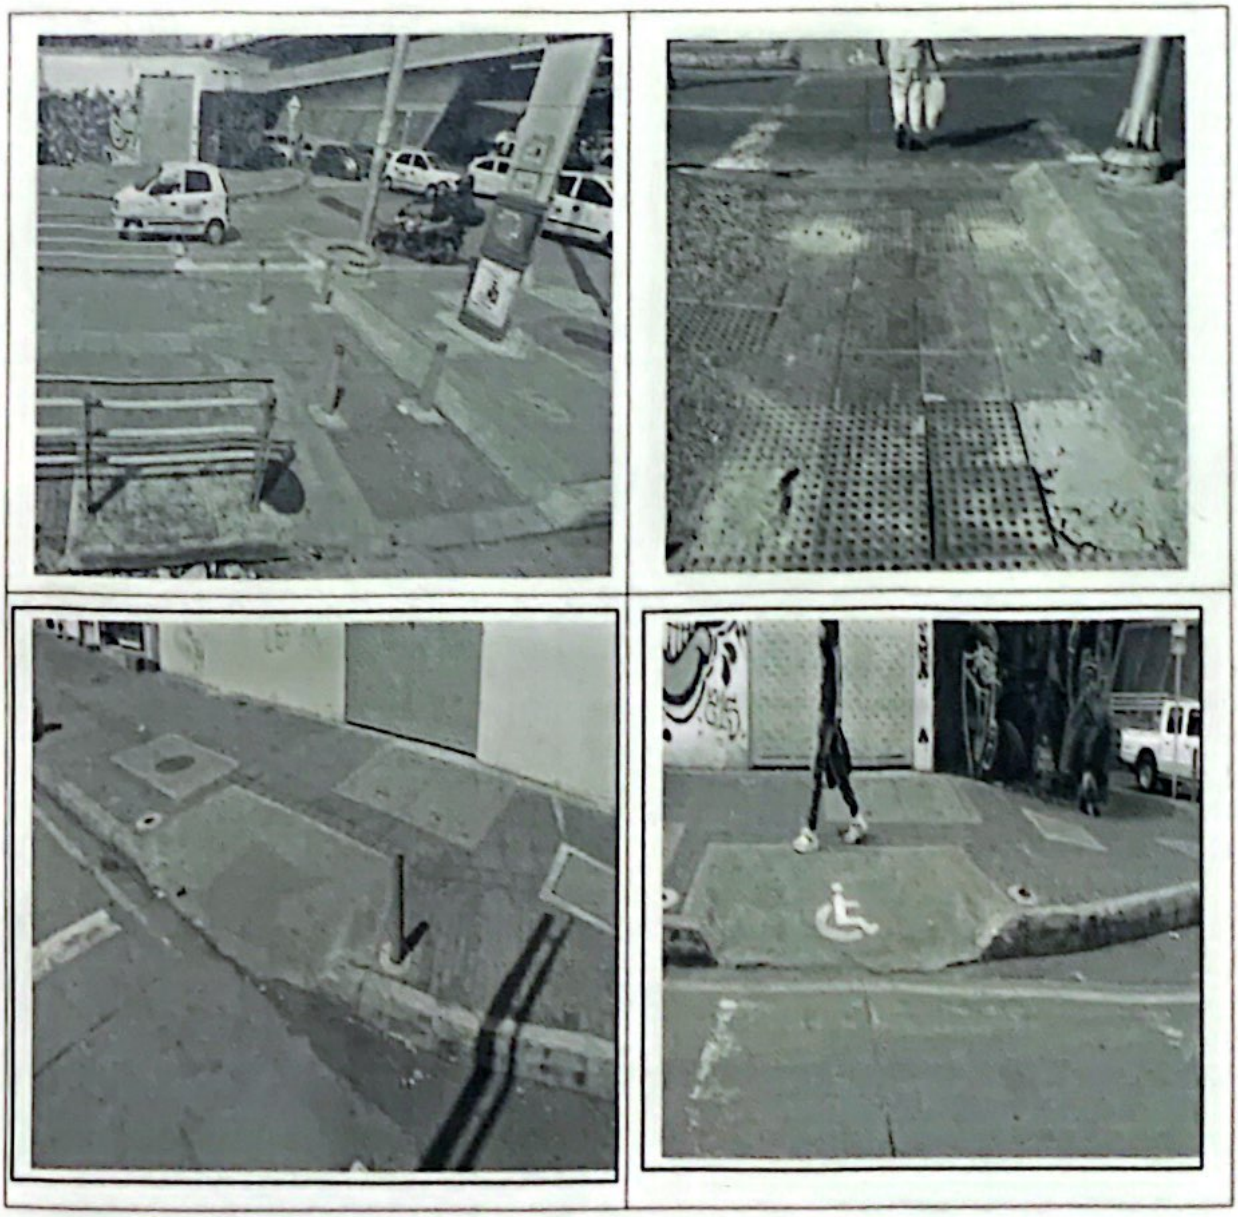

Powered by CamScanner

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 7 de 17










Powered by CamScanner

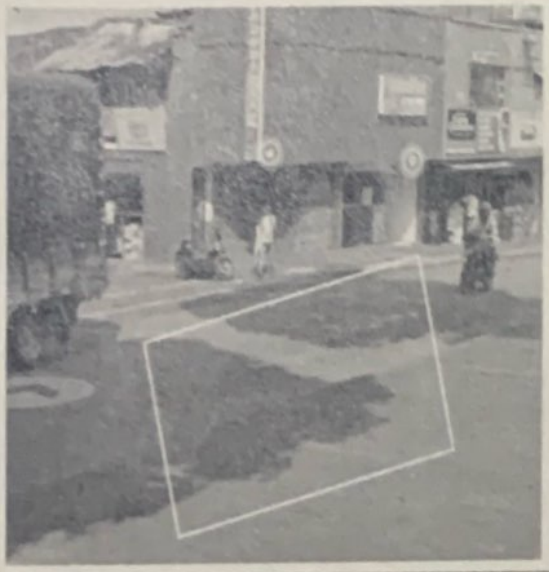







Powered by CamScanner

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238.37-091
		Versión 1.0
		Página 9 de 17










Powered by CamScanner

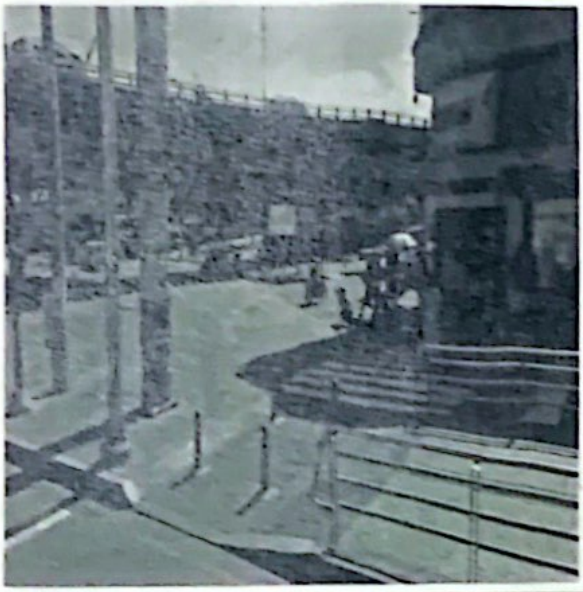







Powered by CamScanner

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238.37-091
		Versión 1.0
		Página 11 de 17









Powered by CamScanner










Powered by CamScanner

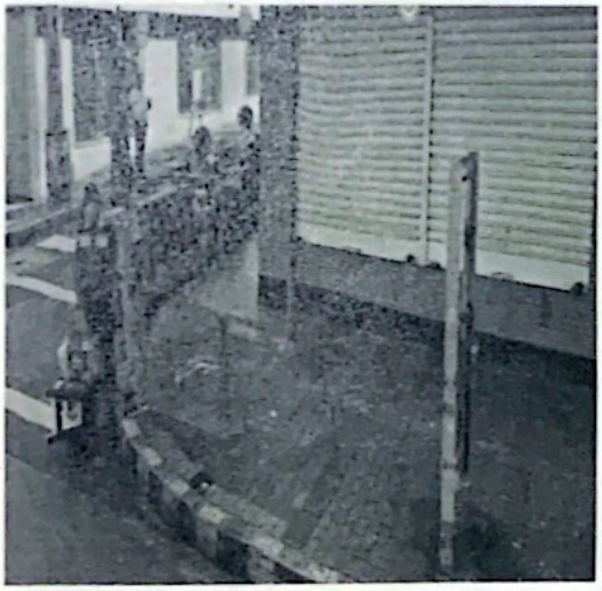







Powered by CamScanner










Powered by CamScanner

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 15 de 17

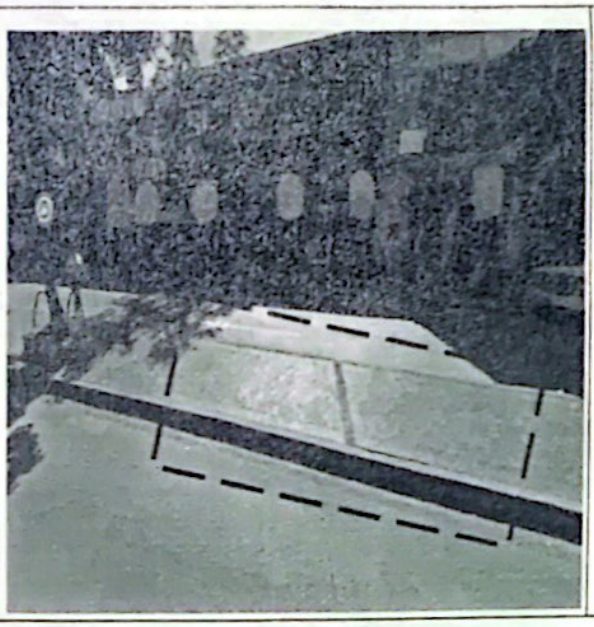







Powered by CamScanner

4. CONTROL DE ACTIVIDADES EJERCIDAS SOBRE LA SUPERVISION

1. Entrega de documentación del contratista a la supervisión de contrato referente al Proceso contractual del contrato de obra. En el presente periodo, se ha venido entregando información requerida tanto en los reuniones en la alcaldía como las solicitudes emitidas por los contratistas de obra y la supervisión, entre las que se encuentran: Diferentes Formatos aplicables a los trámites de Pactación de Precios, Elaboración de Actas de Pago, Balances, APU´S, entre otros formatos para diferentes trámites en el Municipio.
La supervisión ha recibido información por parte de contratistas y generado respuestas.
2. Exigencias a la supervisión para el desarrollo efectivo de sus funciones.
Se requirió la presentación de los contratos del personal clave del contrato así como las afiliaciones a la Seguridad Social, Pensión, ARL y Cajas de Compensación de todo el personal como dependientes bajo el contratista.
3. Atención de consultas y reclamos realizados por Contratista.
Se mantiene la comunicación permanente con el contratista, en pro de resolver las consultas que surjan durante la ejecución de las obras. Se realizan reuniones entre contratista y supervisión cada semana con el fin de verificar las actividades realizadas. También en componente social está atento a realizar los comités de Veedurías Ciudadanas y Reuniones de Transparencia con la Comunidad.
4. Imposición de órdenes, instrucciones e indicaciones al Contratista
Se exige el cumplimiento estricto de las normatividad HSEQ para el contratista
5. Actas Proyectadas del contrato de Contratista.
Se proyectó el acta parcial de pago del Contratista correspondiente al primer mes vencido de acuerdo con la Cláusula Quinta: Valor del contrato y forma de pago

Powered by CamScanner


Alcaldía de Bucaramanga	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: F-GDI-5000-238,37-035
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Diciembre-04-2018
		Página 1 de 38

4. BALANCE GENERAL DE CUMPLIMIENTO

Contratista ha cumplido con sus obligaciones durante el periodo del presente informe.

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Se presentaron cambios en el personal de contratista correspondiente del 15 de enero al 27 de febrero de 2024



Supervisor secretaría de infraestructura

Powered by CamScanner

ANEXOS

Powered by CamScanner

ANEXO 1

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

Powered by CamScanner


440

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: F-GDI-XXX-118,37-058
Versión: 1.0
Fecha aprobación:
Página:

FECHA	13/11/2024	ELABORÓ:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADABLANCA Y CALLE 13		


CAPITULO	1,00	Preliminares	ITEM	1,1,1	Localización y replanteo con conexión topográfica, área mayor a 5.000 m2			UNID.	M2	USOC.	URBANISMO

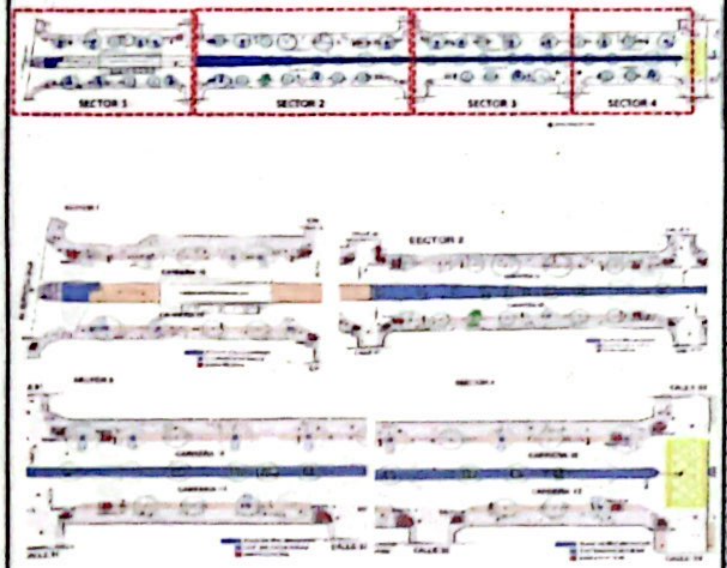

DESCRIPCION	CANT.	LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA		TOTAL
SECTOR 1 Av. Q. Seca - Calle 30						
Vacio 1 Av. Q. Seca		4,10	5,80	23,92		23,92
Sumidero SL 200		2,10	1,00	2,00		2,00
Cortenedores de rieles 1,2,3,4,5,6 y 7.	7,00	1,00	1,29	1,44		10,08
Rampa 1		1,86	1,88	3,50		3,50
Rampa 2		2,40	1,16	2,78		2,78
Rampa 3		0,98	1,60	1,56		1,56
Rampa 4		1,40	1,30	1,82		1,82
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31						
Vacio 2 Calle 30		4,10	5,80	23,92		23,92
Vacio 3 Calle 31		1,45	5,80	8,58		8,58
Cortenedores de rieles 8,9,10 y 11.	4,00	1,00	1,29	1,44		5,76
Rampa 5		3,52	1,48	5,02		5,02
Rampa 6		2,38	1,29	3,07		3,07
Rampa 7		1,48	2,32	3,43		3,43
Rampa 8		1,83	1,63	2,66		2,66
Rampa 9		2,33	1,11	2,56		2,56
Rampa 10		1,96	1,45	2,02		2,02
Rampa 11		1,38	2,40	3,31		3,31
Rampa 12		1,40	1,60	2,56		2,56
Rampa 13		1,37	1,38	1,89		1,89
Area separador		89,24	3,45	298,95		
Areas a descontar						
Jardinera 1		1,38	1,80	2,48		
Jardinera 2		2,45	1,80	2,79		
Jardinera 3		1,38	1,45	1,60		
Jardinera 4		1,80	1,80	2,71		
Jardinera 5		1,80	1,80	2,71		
Jardinera 6		1,96	1,80	1,84		
Jardinera 7		2,33	1,80	2,77		
Jardinera 8		1,38	1,45	1,60		
Jardinera 9		1,38	1,80	1,84		
Tapa caja telefonica		0,84	0,84	0,48		
Vacio 2 Calle 30		4,10	5,80	23,92		
Vacio 3 Calle 31		1,45	5,80	8,58		
Total areas a descontar				**51,78**		
Area total intervenido separador con descuentos de sumideros, Tapas camaras de inspección		73,78	3,45	**247,17**		247,17

9

Powered by CamScanner

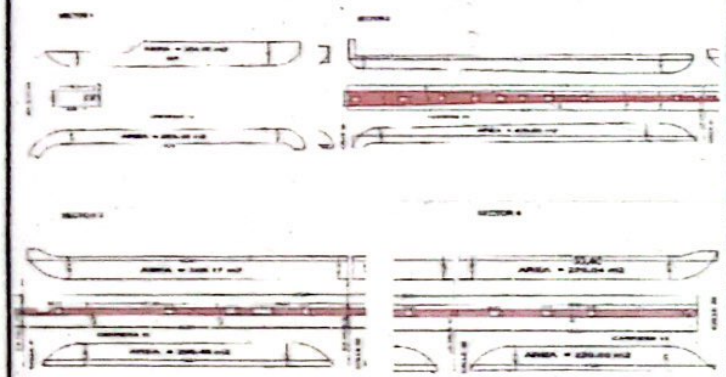


DESCRIPCION	CANT.	LARGO	DIMENSIONES ANCHO	AREA	TOTAL
SECTOR 3 Calle 31-Calle 32					
Vaco 4 Calle 31		1,66	5,20	8,63	8,63
Cortenedores de rejas 12,13,14,15 y 18.	5,00	1,20	1,20	1,44	7,20
Rampa 14		1,77	1,02	1,81	1,81
Rampa 15		1,63	1,62	2,64	2,64
Rampa 16		1,60	1,12	1,97	1,57
Rampa 17		1,60	1,57	2,51	2,51
Rampa 18		3,15	1,69	5,32	5,32
Area separador		64,98	1,66	107,20	
Areas a descontar					
Jardinera 10		1,28	1,20	1,54	
Jardinera 11		1,28	1,20	2,14	
Jardinera 12		2,39	1,20	2,63	
Jardinera 13		3,86	1,20	4,63	
Jardinera 14		1,22	1,19	1,45	
Tapa pozo alcantarillado		0,53	0,93	0,86	
Tapa sumidero		2,40	0,80	1,92	
Vaco 4 Calle 31		1,66	5,20	8,63	
Total areas a descontar				**15,17**	
Area total intervenido separador con descuentos de sumideros, tapas camaras de inspección.		55,44	1,66	**92,03**	92,03
SECTOR 4 Calle 32-Calle 33					
Vaco 5 Calle 33		1,65	5,20	8,58	8,58
Cortenedores de rejas 16,17 y 19	3,00	1,20	1,20	1,44	4,32
Rampa 19		1,30	1,44	1,87	1,87
Rampa 20		1,60	1,60	2,56	2,56
Rampa 21		2,31	1,23	2,82	2,82
Rampa 22		1,60	1,60	2,56	2,56
Rampa 23		1,43	1,40	2,00	2,00
Area separador		45,93	1,65	75,62	
Areas a descontar					
Jardinera 15		1,28	1,20	1,54	
Jardinera 16		1,78	1,20	2,14	
Jardinera 17		2,19	1,20	2,63	
Tapa sumidero		2,40	0,80	1,92	
Area semaforo		0,71	0,71	0,86	
Tapa caja A.P.		0,80	0,72	0,58	
Tapa Caja D.T.		0,81	0,76	0,62	
Base poste A.P		0,40	0,40	0,16	
Vaco 5 Calle 33		1,65	5,20	8,58	
Total areas a descontar				**9,93**	
Area total intervenido separador con descuentos de sumideros, tapas camaras de inspección.		39,31	1,65	**65,69**	65,69
		AREA TOTAL REPLANEADA SEGUN CARTERAS TOPOGRAFICAS			568,73
				Sub total	568,73
				Cantidad	
				TOTAL	568,73

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner


412

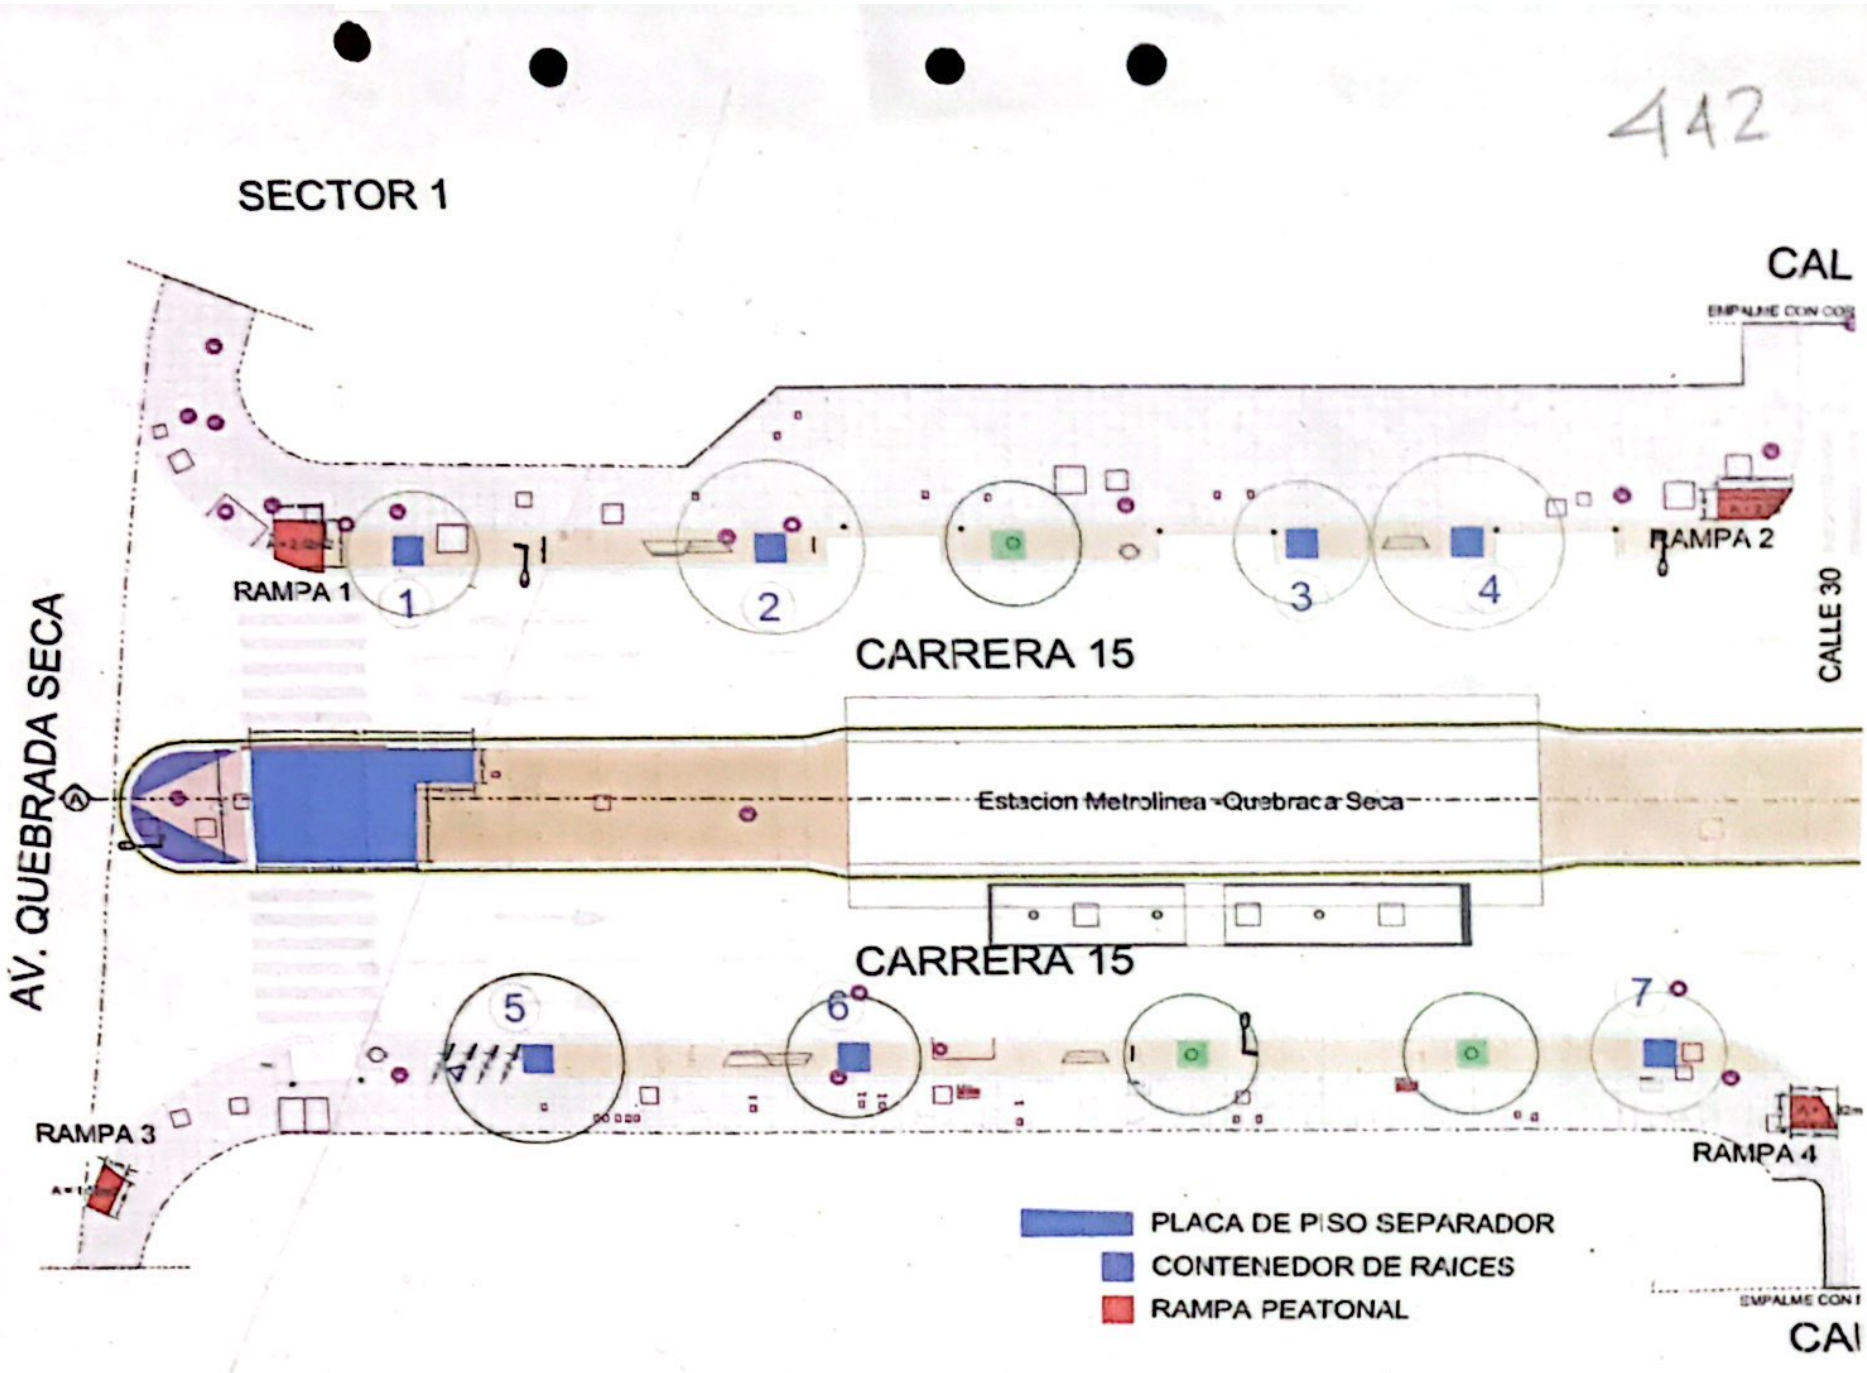

Powered by CamScanner

443


SECTOR 2

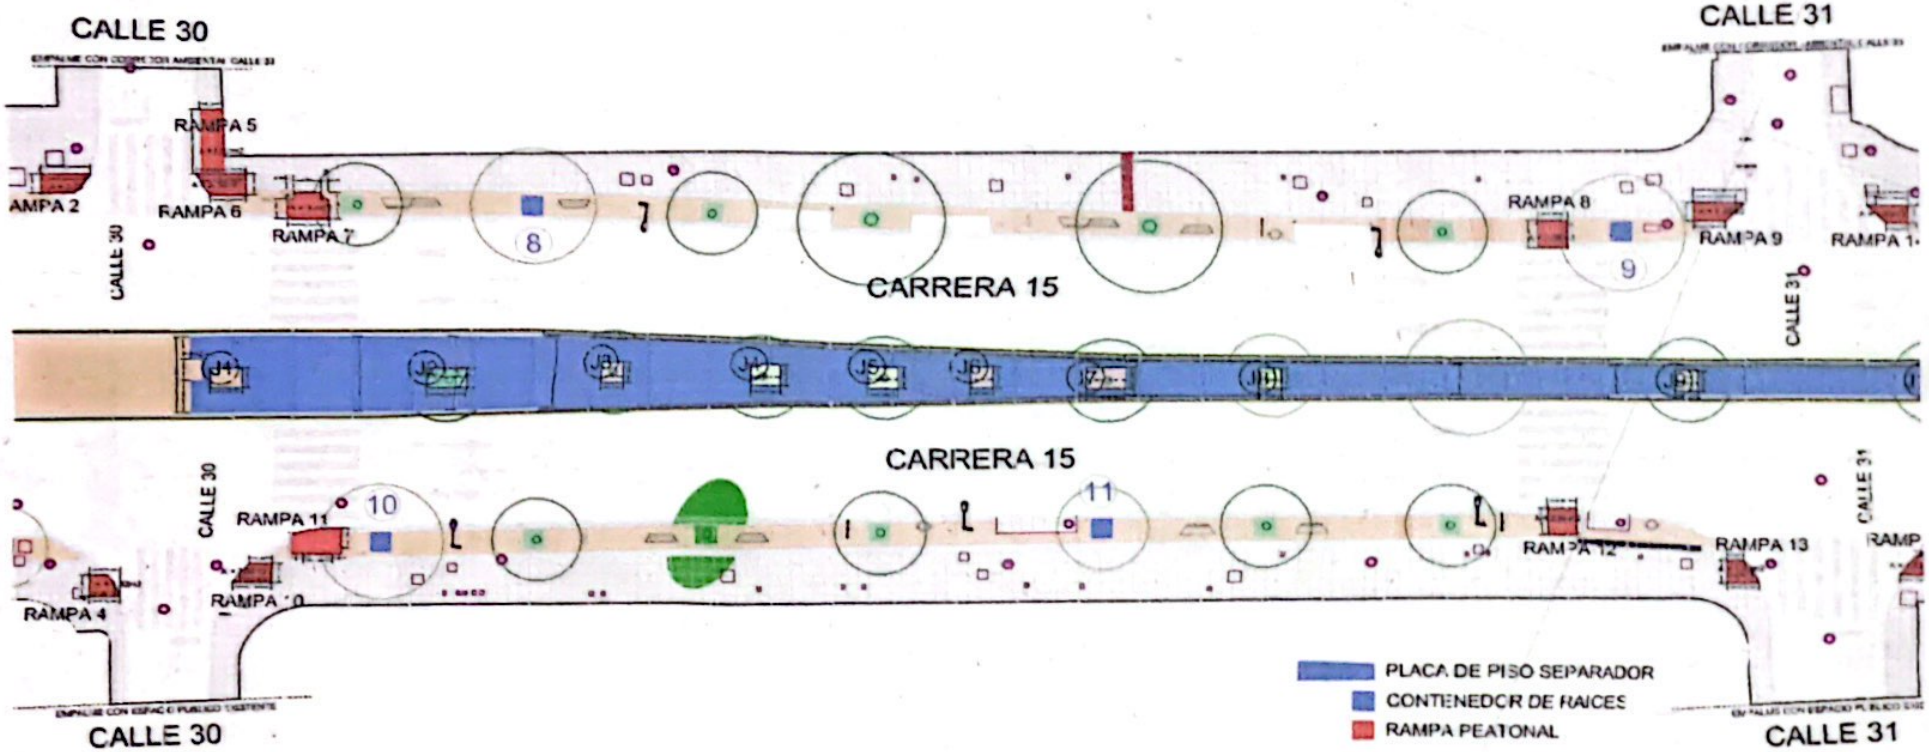

Powered by CamScanner


444

SECTOR 3

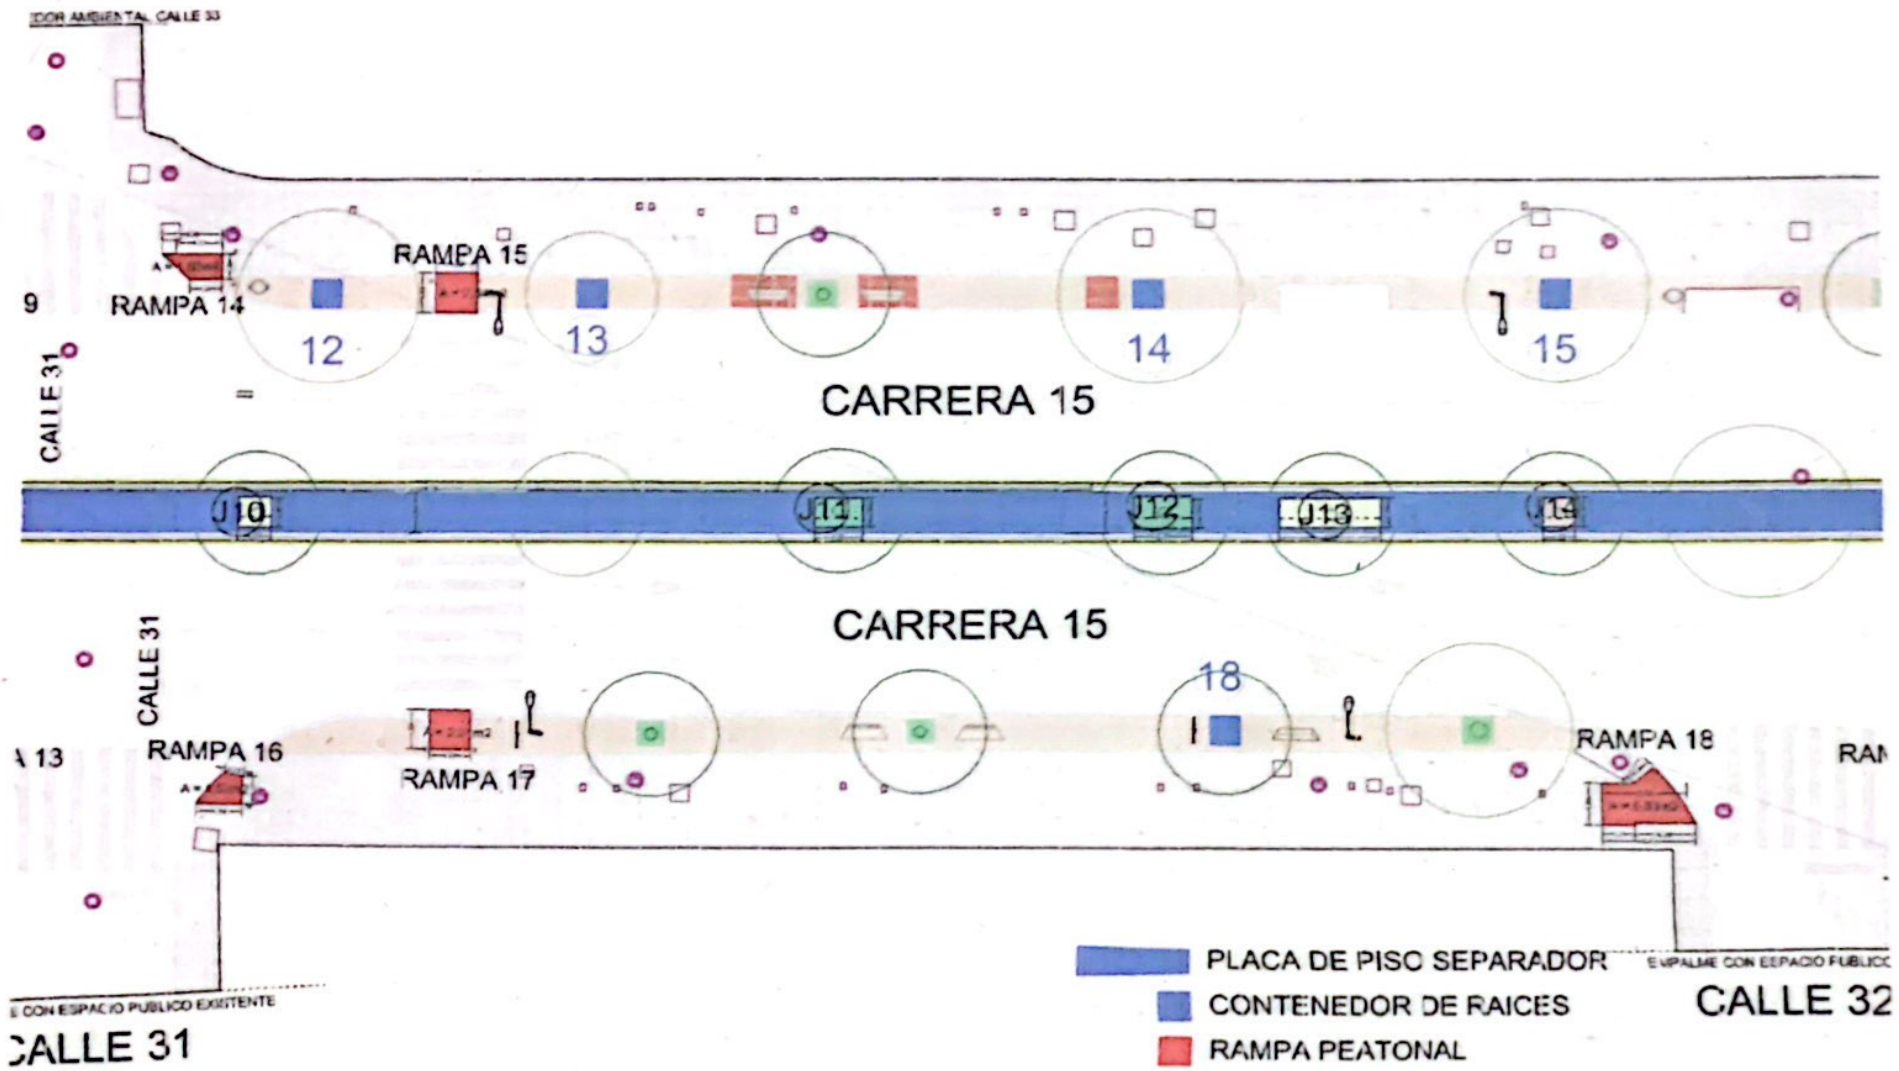

Powered by CamScanner


445

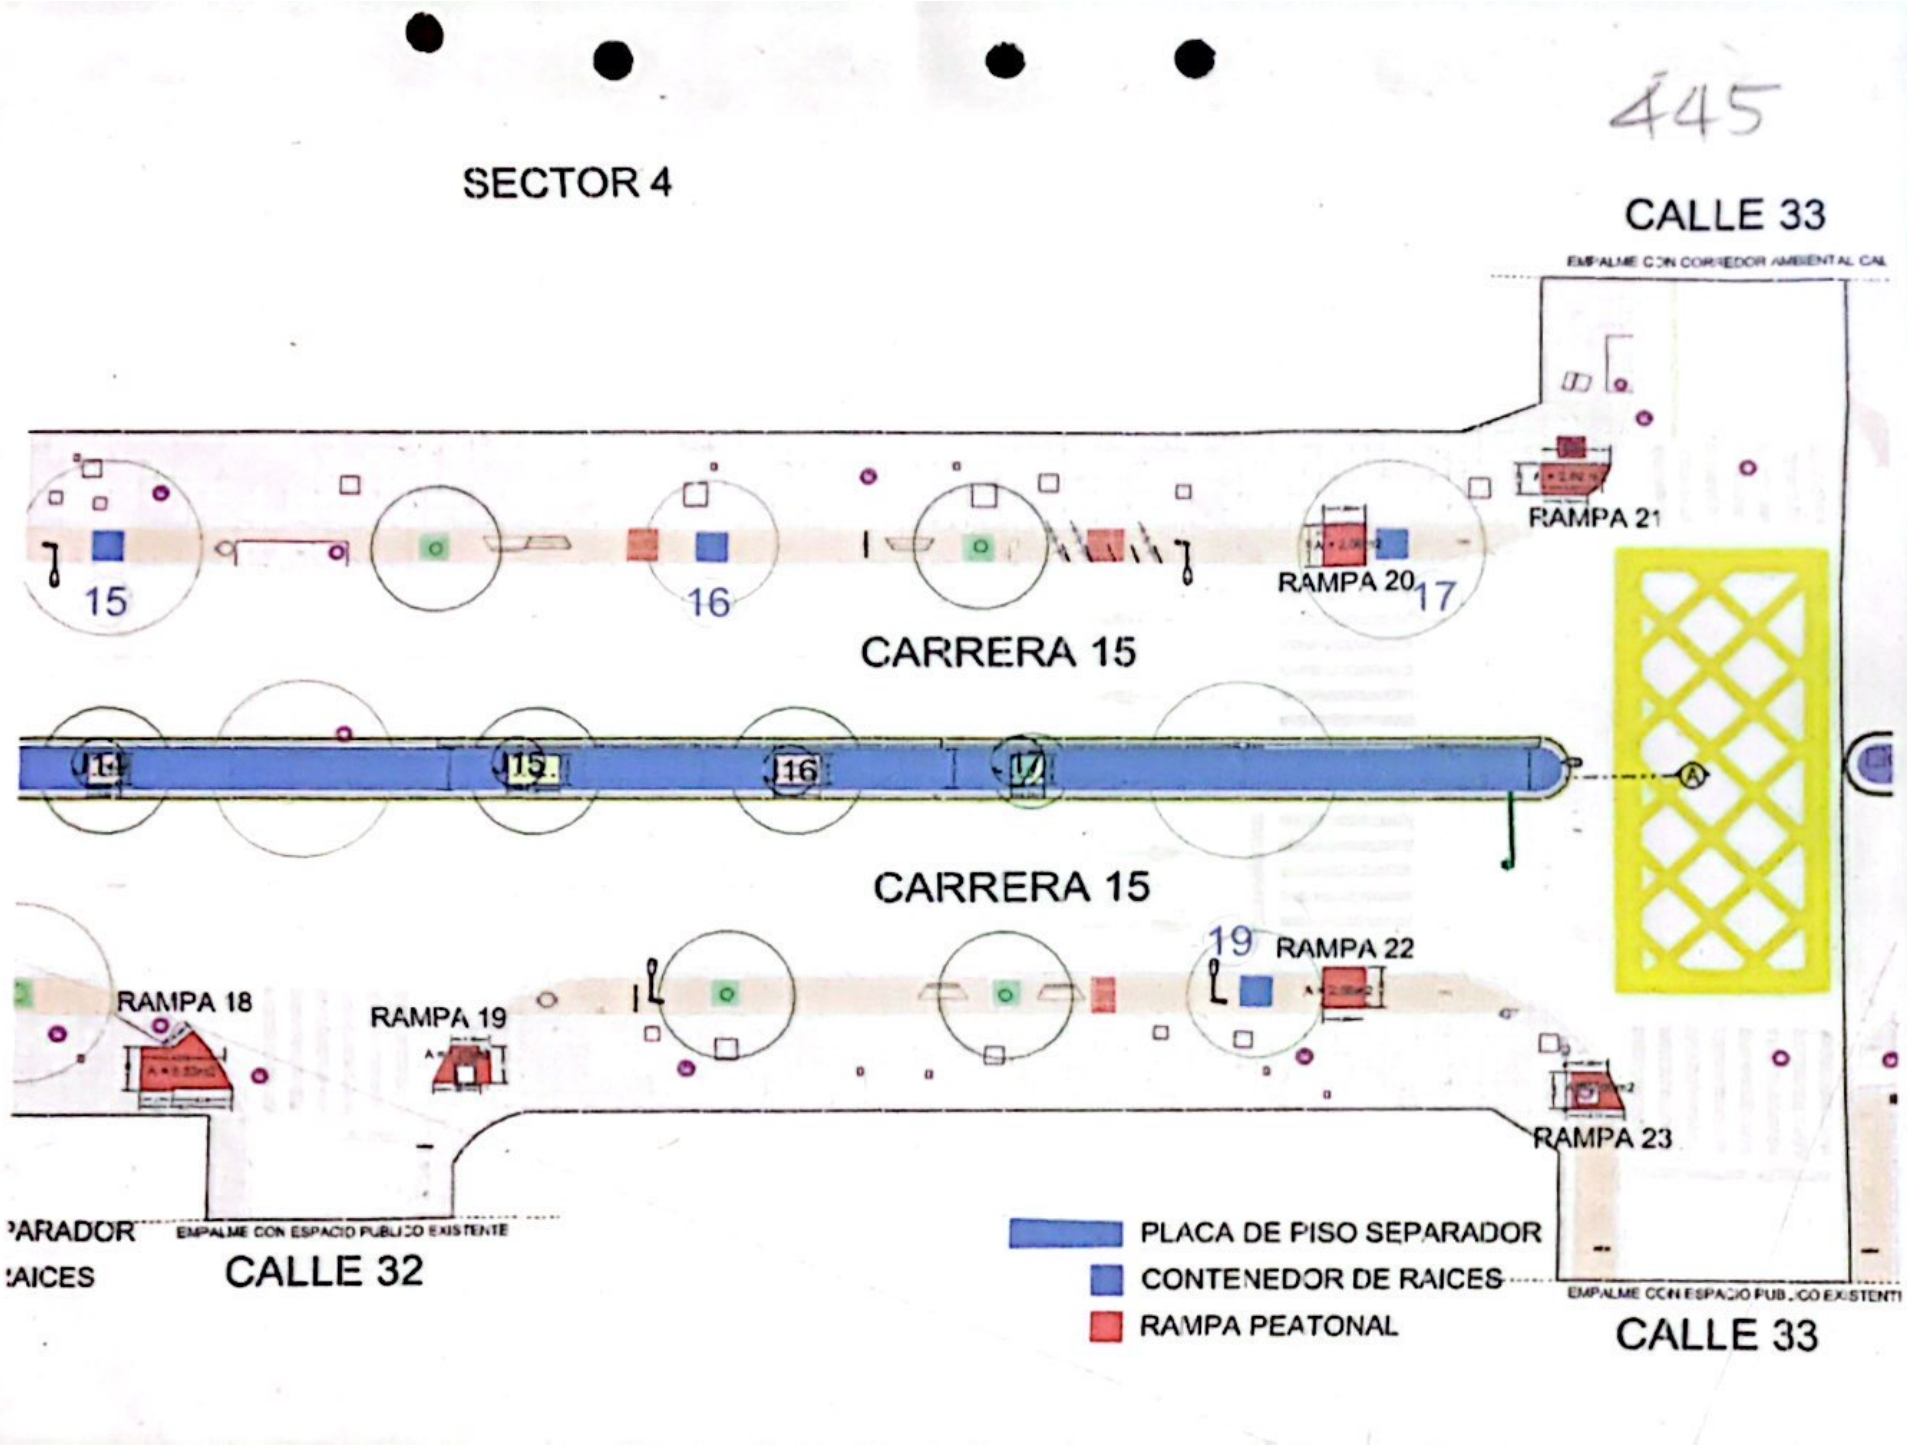


Powered by CamScanner


SECTOR 1

446



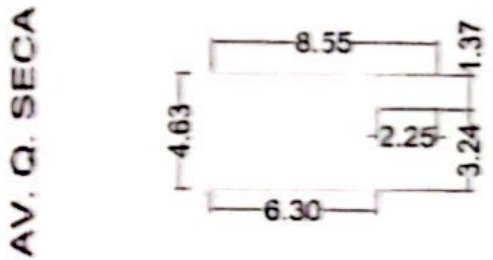

CARRERA 15



Powered by CamScanner


442

SECTOR 2

Powered by CamScanner

448


SECTOR 3

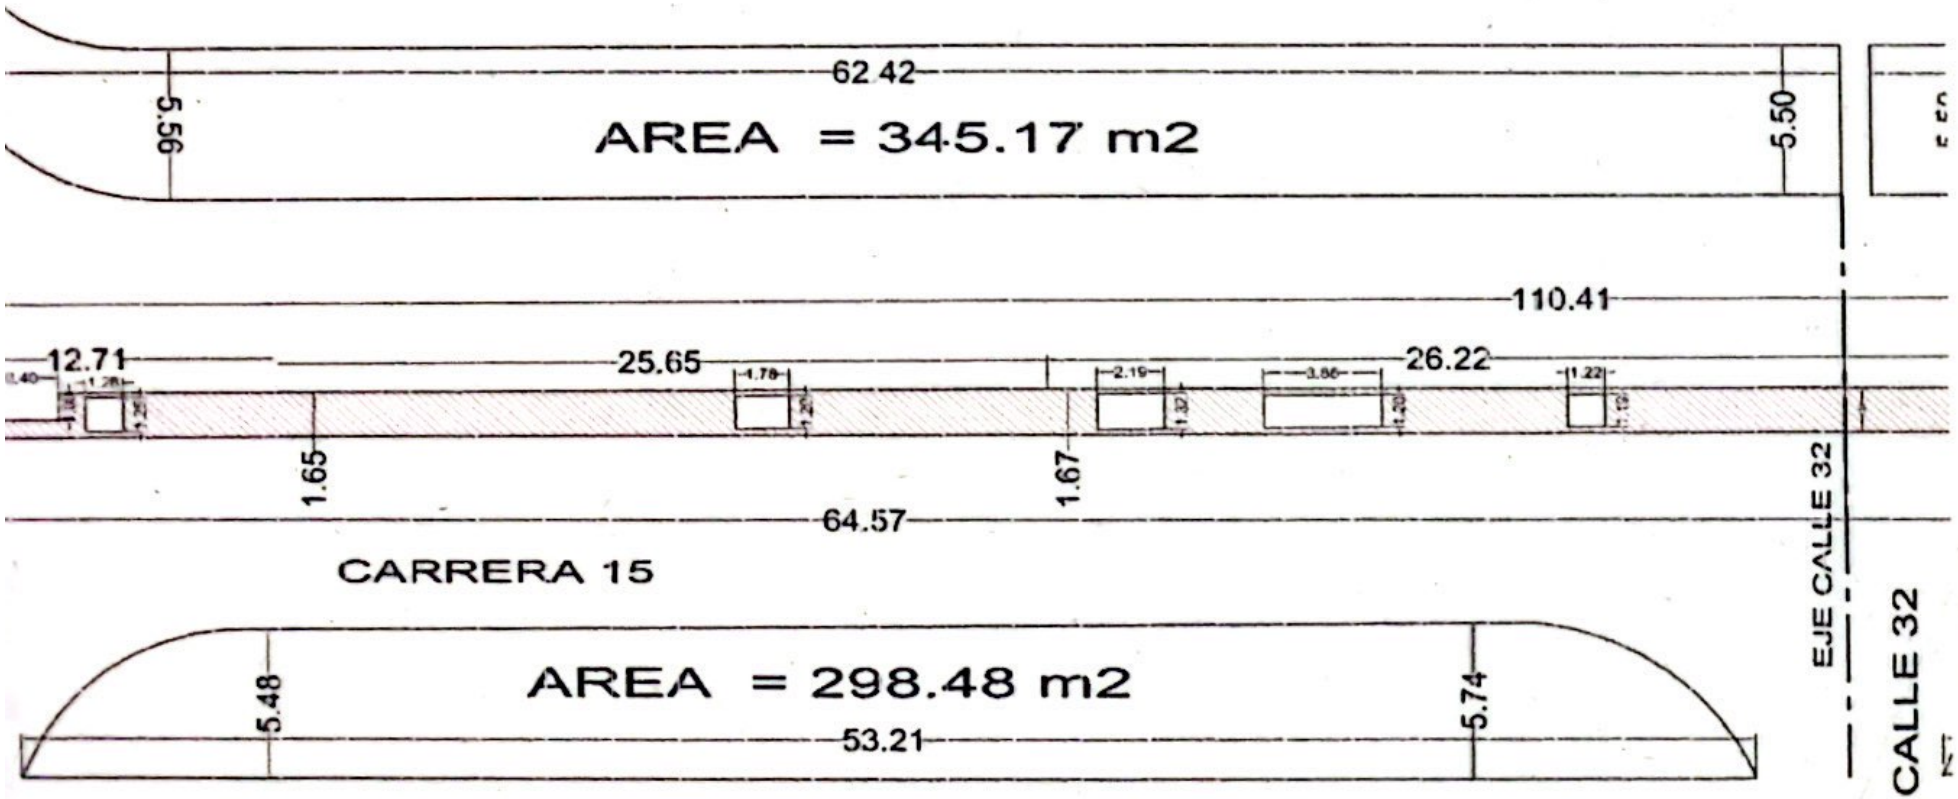

Powered by CamScanner

449

SECTOR 4

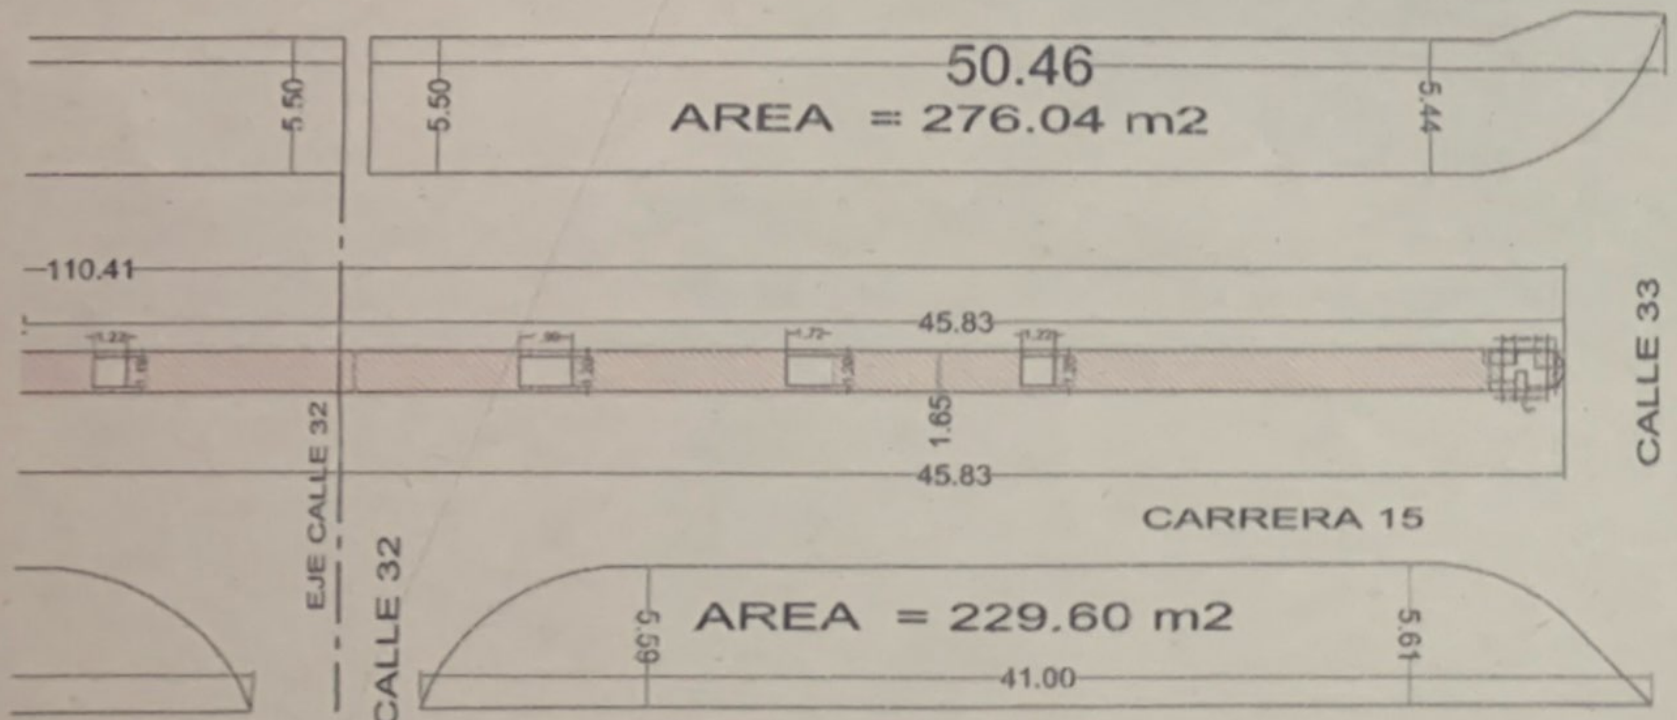

Powered by CamScanner

450

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 418606/2023

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **YERSON FABIAN NOVA LUNA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1098692581** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-14607** con fecha de expedición del **7 de Noviembre de 2013**.

Que el(la) Señor(a) **YERSON FABIAN NOVA LUNA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-14607** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **2 días del mes de Noviembre de 2023**.

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

YERSON FABIAN NOVA L.

***Firma del profesional**

*La firma del profesional se requerirá para corroborar la veracidad de su participación en proyectos contratados. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas: 1. El presente certificado no expide la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2. La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3. Este certificado digital tiene plena validez de autenticidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

Levantamiento Topográfico de la carrera 15 entre la calle 33 y la avenida quebrada seca en el Municipio Bucaramanga Departamento Santander


Powered by CamScanner

451



JERSON FABIAN NOVA L.

Levantamiento Topográfico de la carrera 15 entre calle 33 y la avenida quebrada seca Municipio Bucaramanga Departamento Santander

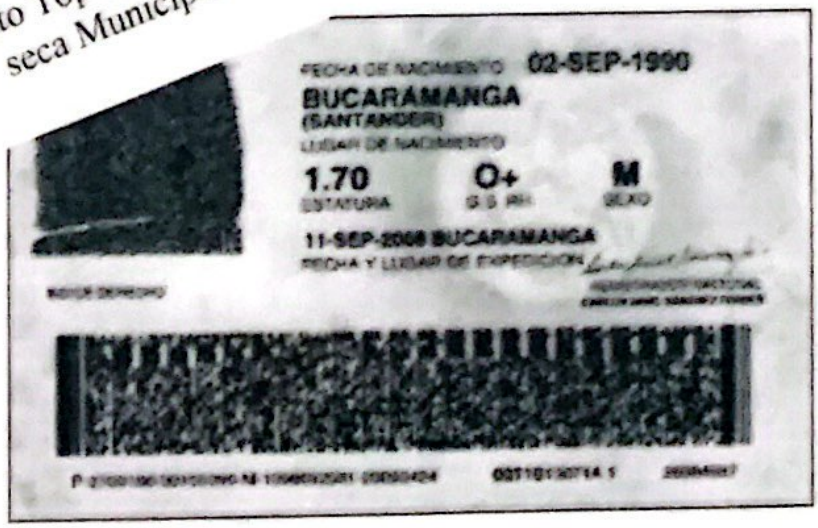

7

Powered by CamScanner

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: YERSON FABIAN NOVA LUNA

Cédula: 1.098.692.581

Licencia Profesional No: **01-14607**

Resolución: 02-4608 - 07/11/2013

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



Presidente

JERSON FABIAN NOVA L.

Levantamiento Topográfico de la carrera 15 entre calle 33 y la avenida quebrada seca Municipio Bucaramanga Departamento Santander

La tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.


Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de Vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 990 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía


Calle 33 No. 7-27 Ofc.:502 Tel.: 2881490
http://cpnt.org Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email info@cpnt.org.

Powered by CamScanner

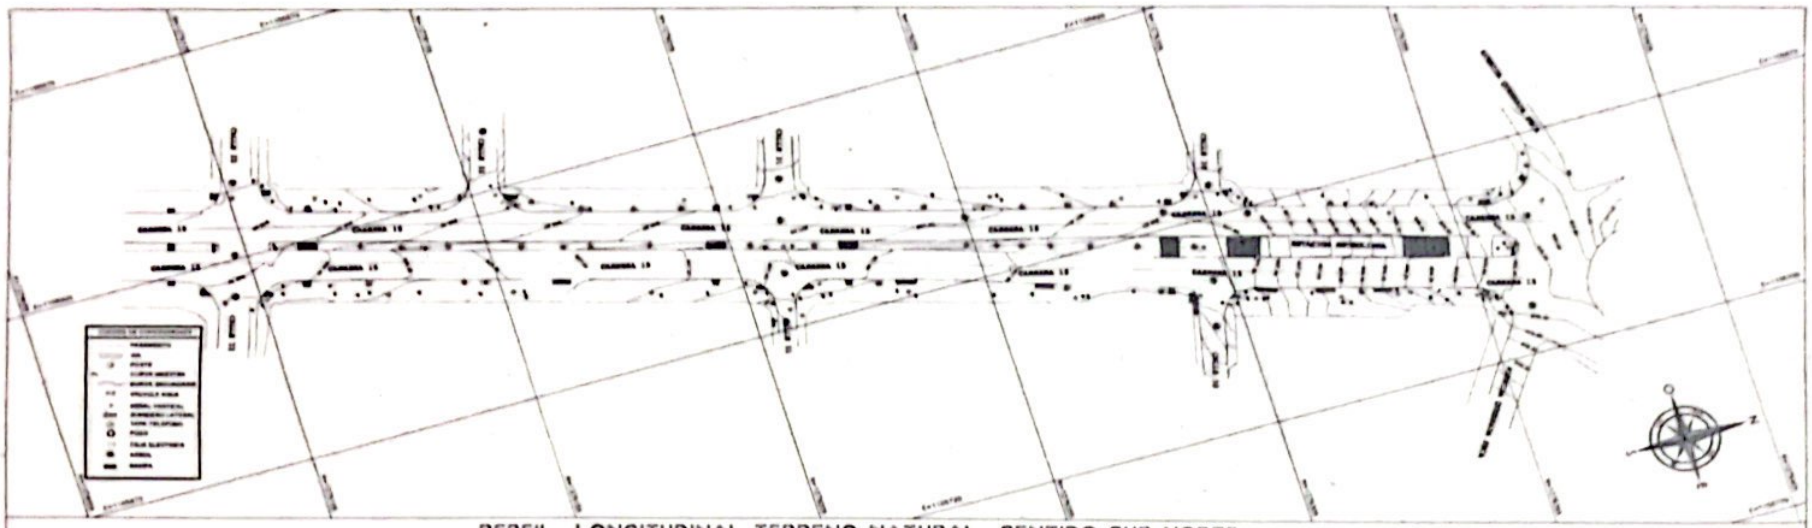


PERFIL LONGITUDINAL TERRENO NATURAL SENTIDO SUR NORTE



ESCALA HORIZONTAL 1 : 5000
ESCALA VERTICAL 1 : 500

PERFIL LONGITUDINAL TERRENO NATURAL SENTIDO NORTE SUR



ESCALA HORIZONTAL 1 : 5000
ESCALA VERTICAL 1 : 500

Powered by CamScanner

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CARTERA DE COORDENADAS

UBICACIÓN: Levantamiento topográfico entre calle 33 a la avenida quebrada seca con carrera 15 centro Municipio de Bucaramanga, Santander.

LEVANTÓ: TOP. YERSON FABIAN NOVA LUNA

FECHA: MARZO 2024

PUNTO	COORDENADAS		COTA	DESCRIPCION
	NORTE	ESTE		
9001	1279064.000	1105598.000	906.000	DEL
9002	1279106.250	1105618.397	906.862	DEL
1	1279054.151	1105630.858	907.114	PAR
2	1279056.883	1105622.267	906.733	PAR
3	1279056.253	1105625.636	907.228	PAR
4	1279064.758	1105611.304	906.686	PAR
5	1279061.385	1105611.764	906.720	PAR
6	1279072.969	1105613.774	906.718	PAR
7	1279081.630	1105616.305	906.709	PAR
8	1279061.727	1105611.581	906.716	PAR
9	1279052.376	1105630.390	907.049	AND
10	1279054.963	1105621.930	906.739	VIA
11	1279053.501	1105621.611	906.657	VIA
12	1279057.727	1105613.192	906.571	VIA
13	1279056.277	1105612.808	906.413	VIA
14	1279059.260	1105609.563	906.443	VIA
15	1279057.427	1105609.115	906.288	VIA
16	1279061.840	1105607.458	906.324	RAMPA
17	1279061.729	1105607.415	906.173	RAMPA
18	1279060.195	1105608.520	906.181	RAMPA
19	1279060.054	1105608.729	906.377	RAMPA
20	1279063.054	1105608.095	906.437	RAMPA
21	1279062.709	1105609.254	906.471	RAMPA
22	1279064.095	1105606.568	906.381	AND
23	1279065.587	1105606.382	906.363	AND
24	1279064.124	1105606.588	906.154	BV
25	1279065.412	1105606.363	906.203	BV
26	1279067.254	1105606.553	906.214	BV
27	1279069.986	1105607.273	906.247	RANPA
28	1279067.261	1105606.571	906.426	AND
29	1279069.726	1105607.263	906.455	AND
30	1279071.852	1105607.859	906.453	AND
31	1279071.593	1105607.750	906.258	RAMPA
32	1279071.117	1105609.338	906.513	RAMPA
33	1279069.615	1105608.833	906.511	RAMPA
34	1279084.321	1105611.588	906.582	AND
35	1279084.408	1105611.611	906.401	BV
36	1279098.882	1105615.858	906.531	BV
37	1279098.877	1105615.856	906.727	AND

Powered by CamScanner

38	1279115.871	1105620.989	906.949	AND
39	1279115.898	1105620.951	906.736	BV
40	1279115.899	1105620.951	906.736	BV
41	1279135.050	1105626.626	906.936	BV
42	1279134.970	1105626.656	907.136	AND
43	1279161.426	1105634.667	907.448	AND
44	1279161.445	1105634.563	907.213	BV
45	1279153.916	1105632.242	907.299	AND
46	1279156.044	1105632.895	907.330	AND
47	1279155.795	1105632.729	907.130	RAMPA
48	1279155.301	1105634.309	907.386	RAMPA
49	1279153.752	1105633.819	907.382	RAMPA
50	1279154.200	1105632.244	907.119	RAMPA
51	1279154.418	1105628.699	907.195	EV
52	1279159.031	1105626.391	907.120	RAMPA
53	1279155.020	1105625.198	907.132	RAMPA
54	1279159.419	1105626.490	907.338	AND
55	1279154.636	1105625.061	907.322	AND
56	1279159.417	1105626.516	907.169	BV
57	1279154.649	1105625.013	907.138	BV
58	1279132.328	1105618.424	906.842	BV
59	1279132.350	1105618.431	907.070	AND
60	1279107.792	1105611.167	906.856	AND
61	1279107.695	1105611.210	906.642	BV
62	1279088.793	1105605.537	906.403	BV
63	1279088.771	1105605.479	906.614	AND
64	1279075.291	1105601.508	906.412	AND
65	1279070.471	1105600.125	906.269	AND
66	1279075.272	1105601.522	906.223	BV
67	1279070.440	1105600.166	906.085	BV
68	1279070.824	1105600.283	906.094	RAMPA
69	1279074.876	1105601.451	906.215	RAMPA
70	1279071.392	1105598.302	905.978	RAMPA
71	1279075.407	1105599.373	906.058	RAMPA
72	1279075.726	1105599.620	906.280	AND
73	1279075.869	1105599.576	906.056	BV
74	1279066.501	1105596.786	905.904	BV
75	1279065.443	1105596.916	905.925	BV
76	1279065.201	1105597.470	905.955	BV
77	1279065.246	1105598.101	905.978	BV
78	1279065.845	1105598.724	906.033	BV
79	1279065.834	1105598.674	906.249	AND
80	1279065.272	1105598.109	906.182	AND
81	1279065.260	1105597.338	906.192	AND
82	1279066.162	1105596.729	906.130	AND
83	1279065.951	1105597.514	906.190	CAJ
84	1279066.472	1105597.683	906.201	CAJ
85	1279066.671	1105597.178	906.165	CAJ
86	1279066.058	1105596.982	906.160	CAJ
87	1279066.160	1105598.341	906.230	CAJ

Powered by CamScanner

88	1279066.659	1105598.404	906.234	CAJ
89	1279066.835	1105597.836	906.194	CAJ
90	1279066.357	1105597.715	906.204	CAJ
91	1279059.758	1105609.959	906.461	CAJ
92	1279060.313	1105610.092	906.440	CAJ
93	1279060.172	1105610.657	906.509	CAJ
94	1279059.620	1105610.483	906.466	CAJ
95	1279061.283	1105609.697	906.472	TC
96	1279064.463	1105609.270	906.498	CAJ
97	1279064.669	1105608.471	906.459	CAJ
98	1279065.379	1105608.678	906.456	CAJ
99	1279066.021	1105597.899	906.425	LUMI
100	1279076.080	1105610.187	906.515	LUMI
101	1279067.254	1105597.692	906.201	SEMAF
102	1279075.305	1105612.235	906.592	CAJ
103	1279075.433	1105611.755	906.581	CAJ
104	1279075.965	1105611.922	906.575	CAJ
105	1279075.740	1105610.058	906.523	SV
106	1279080.756	1105613.610	906.642	CAJ
107	1279080.166	1105613.404	906.622	CAJ
108	1279080.635	1105614.254	906.655	CAJ
109	1279065.393	1105607.089	906.302	VALAGUA
110	1279065.393	1105607.090	906.403	VALAGUA
111	1279086.707	1105615.969	906.665	TC
112	1279083.348	1105613.771	906.650	CAJ
113	1279082.546	1105613.577	906.652	CAJ
114	1279083.201	1105614.560	906.670	CAJ
115	1279083.609	1105615.037	906.677	DOMI
116	1279083.333	1105612.113	906.677	ARB
117	1279092.758	1105616.508	906.716	CAJ
118	1279093.662	1105616.794	906.737	CAJ
119	1279093.366	1105617.694	906.727	CAJ
120	1279093.374	1105617.699	906.727	CAJ
121	1279106.718	1105618.182	906.635	SL
122	1279110.542	1105619.362	906.674	SL
123	1279103.100	1105617.690	906.881	ARB
124	1279092.258	1105617.661	906.714	DOMI
125	1279108.434	1105611.748	906.657	PZ
126	1279112.489	1105623.012	906.932	TC
127	1279117.103	1105622.155	906.946	LUMI
128	1279098.006	1105608.277	906.554	SL
129	1279096.109	1105607.751	906.520	SL
130	1279092.338	1105605.832	906.912	ARB
131	1279083.973	1105603.078	906.506	ARB
132	1279101.907	1105608.010	907.038	ARB
133	1279114.700	1105622.961	906.946	CAJ
134	1279115.140	1105623.074	906.952	CAJ
135	1279114.983	1105623.508	906.953	CAJ
136	1279114.589	1105624.270	906.953	CAJ
137	1279114.389	1105624.898	906.955	CAJ

Powered by CamScanner

138	1279115.079	1105625.088	906.967	CAJ
139	1279115.510	1105624.862	906.971	DOMI
140	1279117.206	1105613.127	906.929	ARB
141	1279126.001	1105616.013	907.392	ARB
142	1279131.808	1105617.586	907.283	ARB
143	1279121.355	1105622.517	906.777	RAMPA
144	1279125.276	1105623.739	906.932	RAMPA
145	1279120.954	1105623.672	907.013	RAMPA
146	1279124.863	1105624.815	907.091	RAMPA
147	1279081.694	1105607.060	906.380	EV
148	1279047.962	1105617.559	906.494	BV
149	1279047.286	1105617.409	906.696	AND
150	1279050.712	1105608.575	906.224	BV
151	1279049.708	1105608.454	906.472	AND
152	1279048.603	1105613.033	906.571	AND
153	1279048.605	1105613.031	906.546	AND
154	1279048.677	1105612.286	906.523	AND
155	1279052.380	1105607.501	906.242	TC
156	1279055.009	1105606.815	906.226	PZ
157	1279057.327	1105610.799	906.272	VALAGUA
158	1279057.769	1105597.434	905.940	PZ
159	1279050.322	1105605.255	906.157	RAMPA
160	1279049.238	1105603.002	906.082	RAMPA
161	1279048.294	1105602.865	906.225	RAMPA
162	1279047.806	1105604.490	906.214	RAMPA
163	1279043.586	1105599.470	905.961	RAMPA
164	1279042.077	1105599.035	905.911	RAMPA
165	1279041.797	1105600.185	906.088	RAMPA
166	1279043.296	1105600.634	906.088	RAMPA
167	1279036.362	1105597.335	905.861	BV
168	1279047.959	1105601.465	906.005	BV
169	1279030.669	1105602.292	905.906	PAR
170	1279048.180	1105602.630	906.212	SEMAF
171	1279036.174	1105603.899	906.017	PAR
172	1279046.222	1105608.572	906.095	PAR
173	1279042.768	1105605.953	906.066	PAR
174	1279047.401	1105610.914	906.050	PAR
175	1279045.581	1105616.500	906.269	PAR
176	1279037.101	1105590.214	905.865	BV
177	1279043.962	1105592.250	905.881	RAMPA
178	1279045.630	1105592.745	905.870	RAMPA
179	1279046.088	1105591.022	905.803	RAMPA
180	1279044.514	1105590.384	905.792	RAMPA
181	1279053.903	1105595.220	905.876	BV
182	1279054.920	1105594.527	905.872	BV
183	1279054.472	1105593.287	905.829	BV
184	1279034.990	1105587.542	905.618	BV
185	1279052.052	1105593.655	906.051	SEMAF
186	1279054.452	1105594.207	906.047	POST
187	1279037.782	1105581.041	905.525	BV

Powered by CamScanner

188	1279046.535	1105583.604	905.571	RAMPA
189	1279048.084	1105584.059	905.583	RAMPA
190	1279046.799	1105582.467	905.817	RAMPA
191	1279048.402	1105582.954	905.818	RAMPA
192	1279049.356	1105583.517	905.856	LUMI
193	1279055.007	1105580.375	905.921	PAR
194	1279043.807	1105577.097	905.870	PAR
195	1279055.976	1105579.953	905.872	PAR
196	1279057.920	1105578.748	905.806	PAR
197	1279060.996	1105568.751	905.451	PAR
198	1279059.025	1105581.867	905.613	BV
199	1279058.690	1105582.416	905.651	RAMPA
200	1279056.824	1105581.650	905.859	RAMPA
201	1279056.298	1105583.186	905.878	RAMPA
202	1279057.630	1105583.744	905.636	RAMPA
203	1279057.425	1105583.987	905.640	BV
204	1279062.753	1105569.593	905.203	BV
205	1279056.506	1105584.623	905.718	BV
206	1279053.392	1105585.481	905.648	BV

Powered by CamScanner

enlace operativos

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-03-20, 03:32:23 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 695451184

Periodo Cotización 202402 **Periodo Servicio** 202403

457

PAGADA 2024-03-11 16:11:07.0

TOS DEL APORTANTE

n Social	BIOSERVICES BGA SAS				
umento	NI 901737764	Dirección	CL 29B #1 E - 54		
de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6076757114		
Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	5
d	FLORIDABLANCA	Departamento	SANTANDER		
esentante Legal	RODRIGUEZ MORENO YOLY PAULINA	Identificación	CC 1098614252		

TOS DEL AFILIADO

umento			Residente		Extranjero		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1098692581						S	NOVA LUNA YERSON FABIAN	68001000 - 68		SANTANDER
Cotizante	01	00								

NORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			

TALES

Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
UPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 52.200	$ 6.800	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.800

Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9494 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 10 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517806.

Powered by CamScanner

458


Alcaldía de Bucaramanga

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: F-GDI-5000-238.37-068
Versión: 1.0
Fecha aprobación:
Página:

FECHA	19/02/2024	**ELABORO:**	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	1,00	Preliminares	**ITEM**	1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue y retiro		**UNID.**	UND	**UBIC.**	URBANISMO









DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		CANTID			
Desmonte de bolardos en separador carrera 15 con Av Quebradaseca		5,00			5,00
				Subtotal	5,00
				Cantidad	
				TOTAL	5,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

5,00


Powered by CamScanner

459

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Codigo: F-GES-5000-248.37-008	
		Version: 1.0	
		Fecha aprobación:	
		Pagina:	

FECHA	31/05/2024	ELABORO:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	1.00	Preliminares	ITEM	1.2.2	Desmonte de protector de articulo tipo U enterrada, incluye cargue, retiro y disposición final		UNID.	/ND	UBIC.	URBANISMO









DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD				
Sector 1 entre AV [illegible] y cl32		6.00			6.00
Sector 2 entre cl 32 y cl31		31.00			31.00
Sector 3 entre cl 31 y cl32		19.00			19.00
Sector 4 entre cl 32 y cl33		20.00			20.00


460

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	19/01/2024	ELABORO:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	1.00	Preliminares	ITEM	1.1.1	Demolición de barras con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final			M2		UNID.	UBIC.	UNITARIO

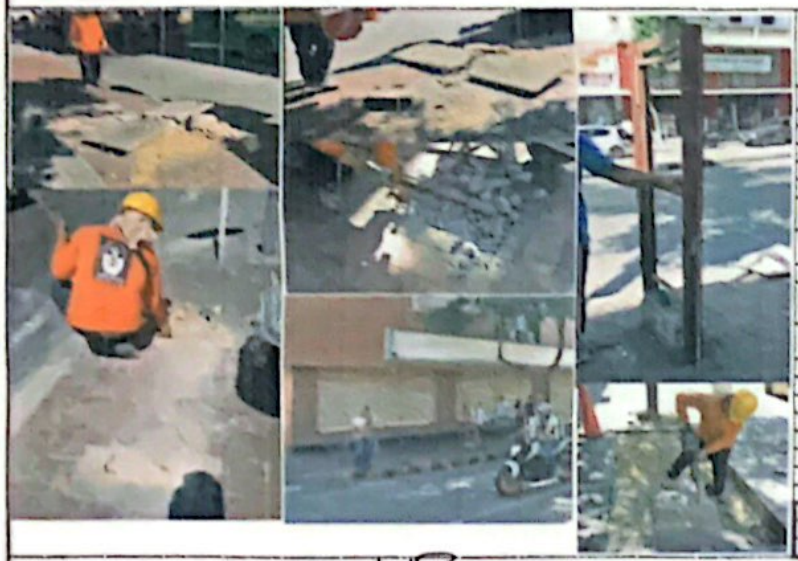


DESCRIPCION			DIMENSIONES				TOTA.
	Largo	Ancho	Espesor	VOLUMEN	CANT	VOLUMEN TOTAL	
Barras en concreto	1.70	0.58	0.04	0.06	18.00	1.11	1.11
Apoyos (patas) barras	3.3	0.07	0.43	0.008	36.00	0.302	0.30
						Sumatoria	1.11
						Cantidad	
						TOTAL	1.11


FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner



PLANTA BANCA
ESC 1:25




ALZADA BANCA
ESC 1:25


DETALLE BANCA EN CONCRETO

Powered by CamScanner

463

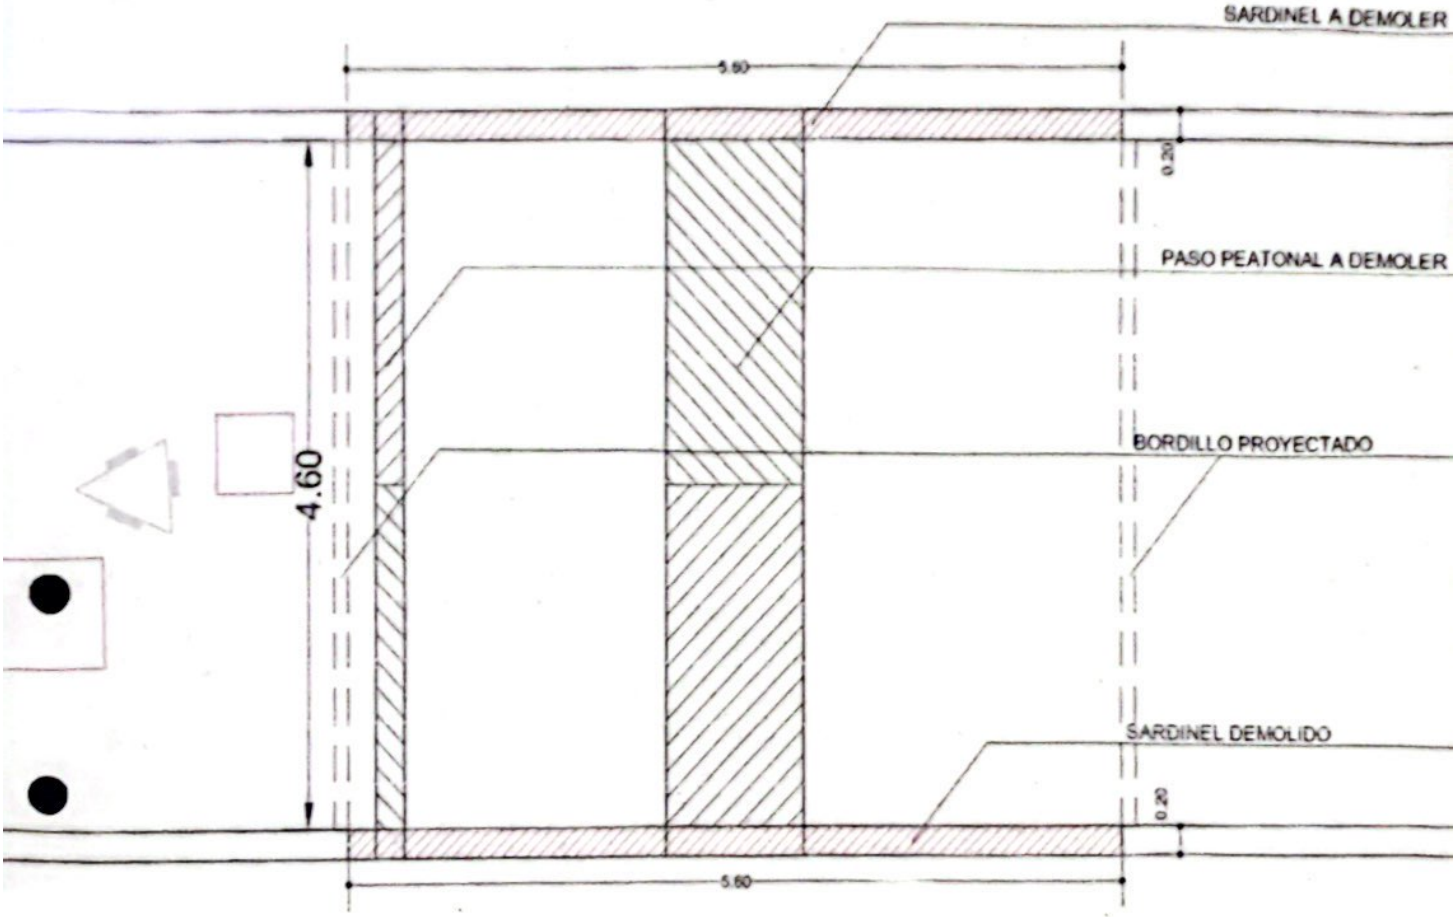

PLANTA ESTADO INICIAL VADO 1
ESC.____1: 50

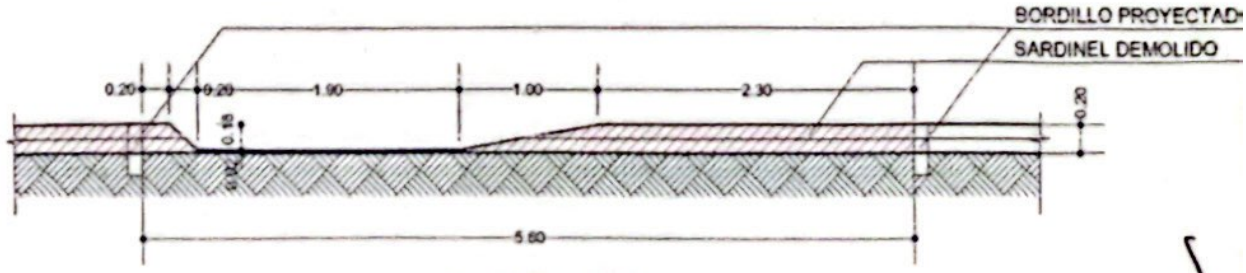


ALZADA VADO 1
ESC.____1: 50

DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1


Powered by CamScanner

464

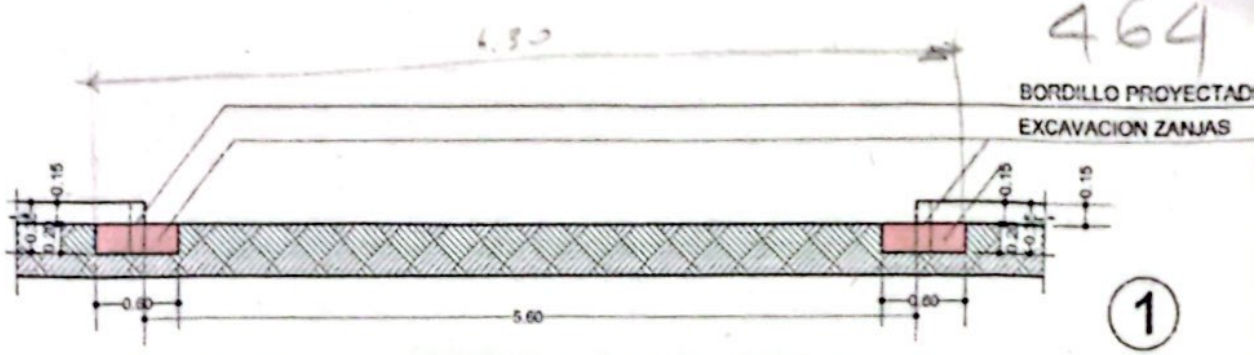


1

EXCAVACION ZANJAS VADO 1
ESC.____1: 50

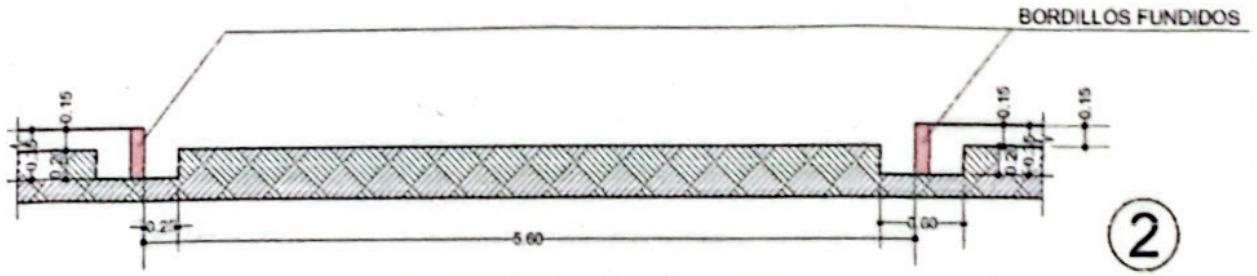

2

BORDILLOS FUNDIDOS EN SITIO VADO 1
ESC.____1: 50

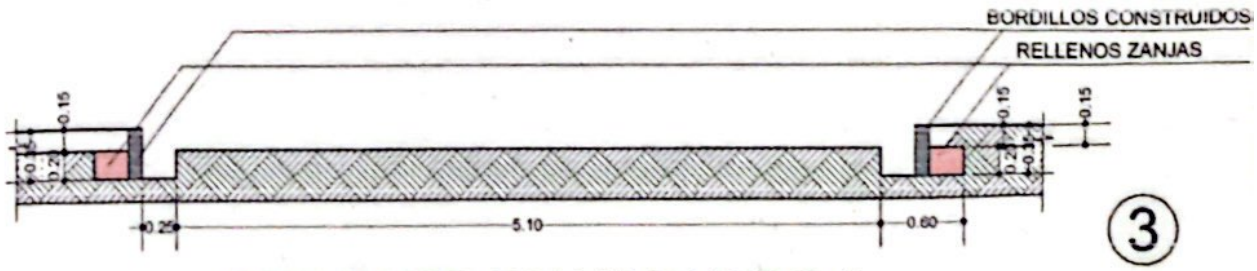


3


RELLENOS ZANJAS VADO 1
ESC.____1: 50

PROCESO CONSTRUCTIVO VADO 1


Powered by CamScanner

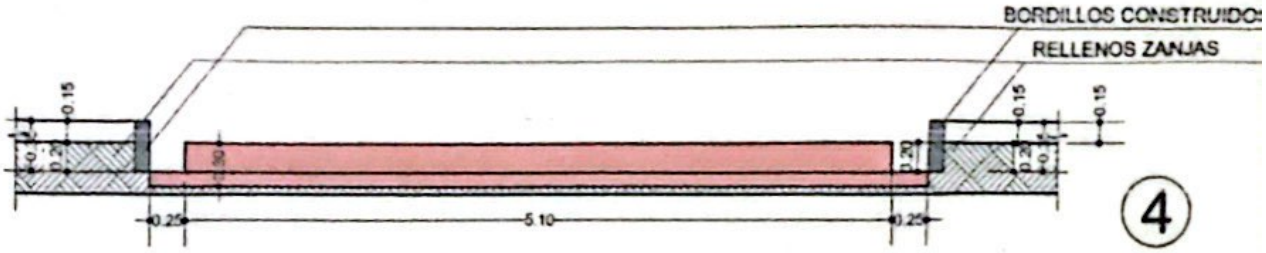


EXCAVACION MANUAL VADO 1
ESC.____1: 50

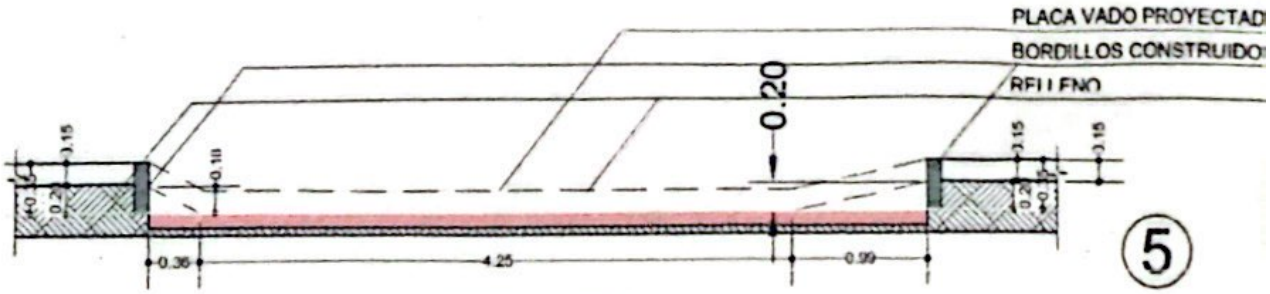

RELLENOS REMATE VADO 1
ESC.____1: 50

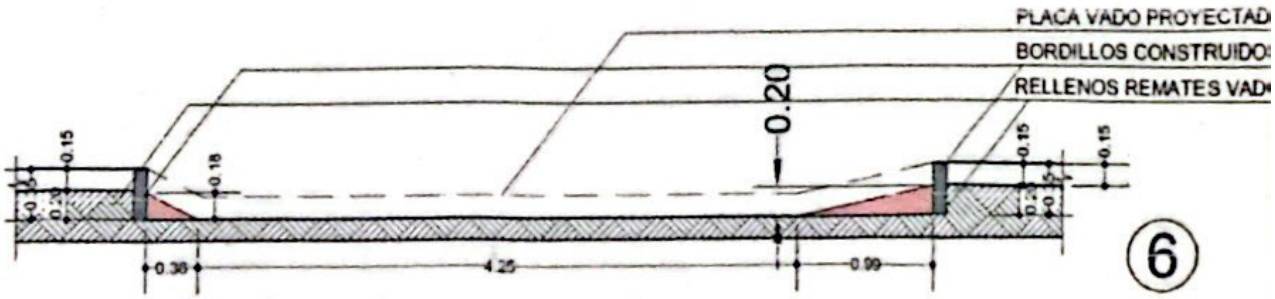


RELLENOS REMATE VADO 1
ESC.____1: 50

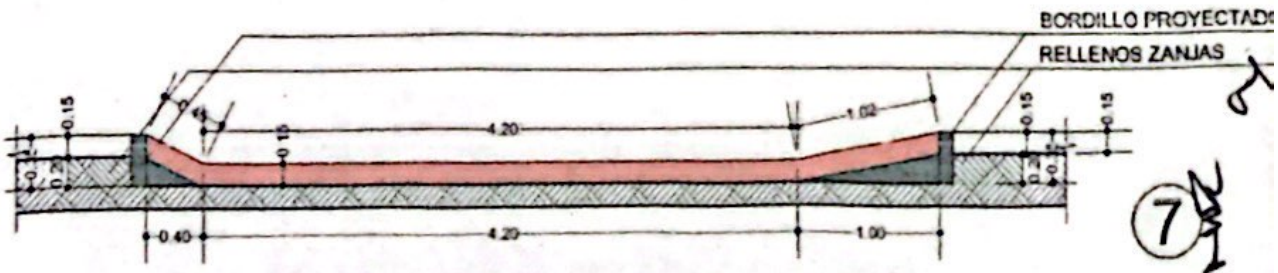

PLACA FUNDIDA EN SITIO VADO 1
ESC.____1: 50


PROCESO CONSTRUCTIVO VADO 1

Powered by CamScanner

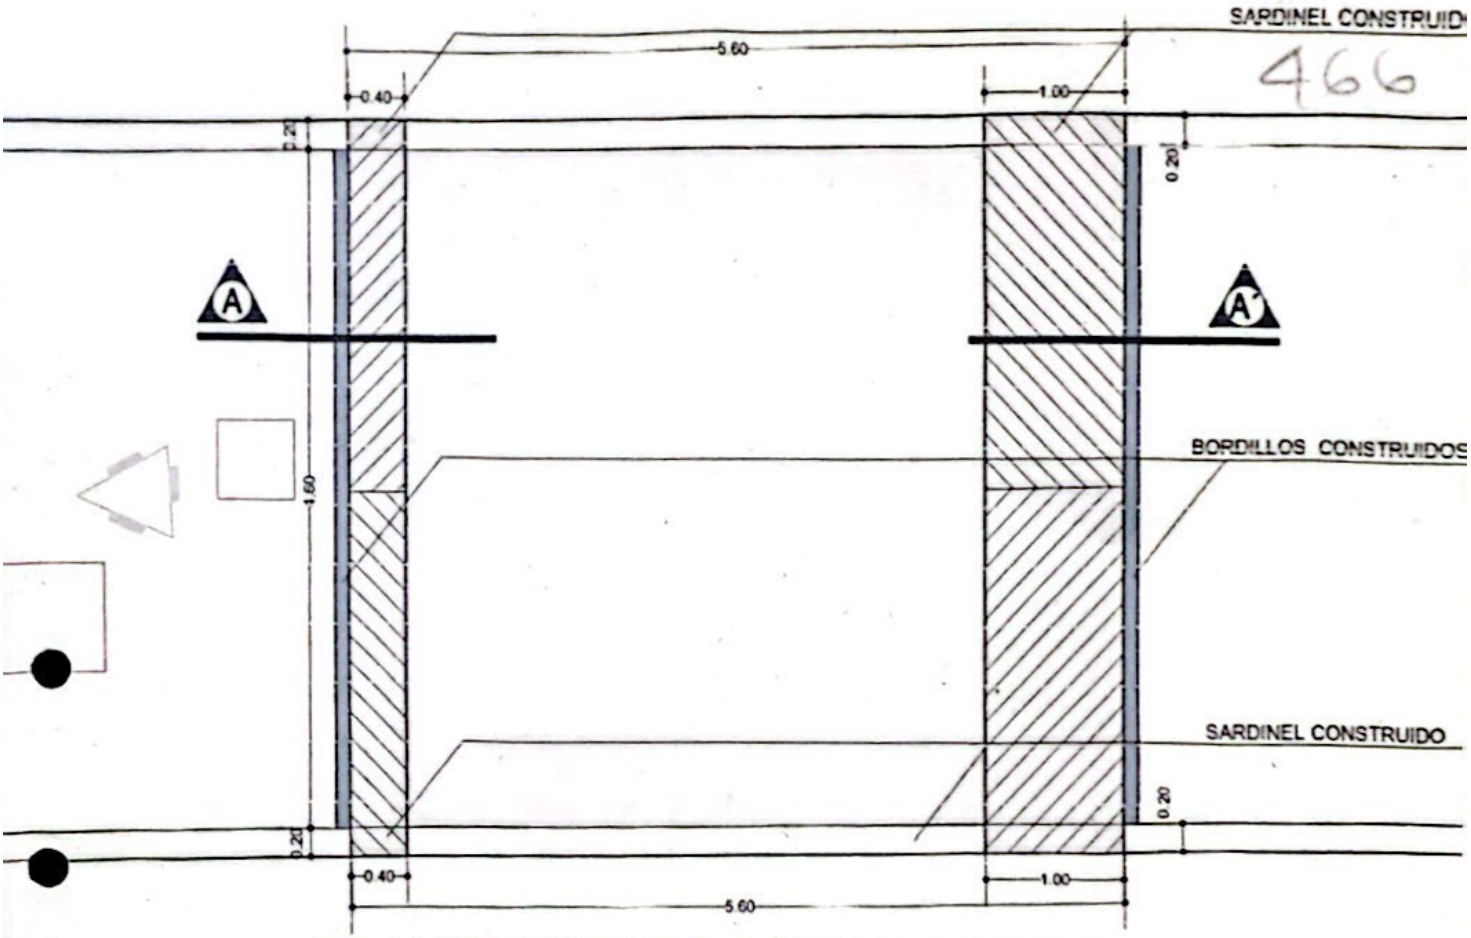

PLANTA ESTADO ACTUAL VADO 1

ESC.____1: 50

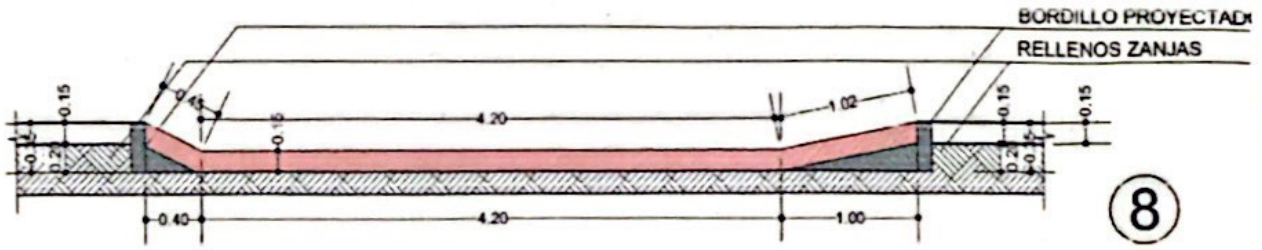


8

SECCION PLACA FUNDIDA EN SITIO VADO 1

ESC.____1: 50


DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1

Powered by CamScanner

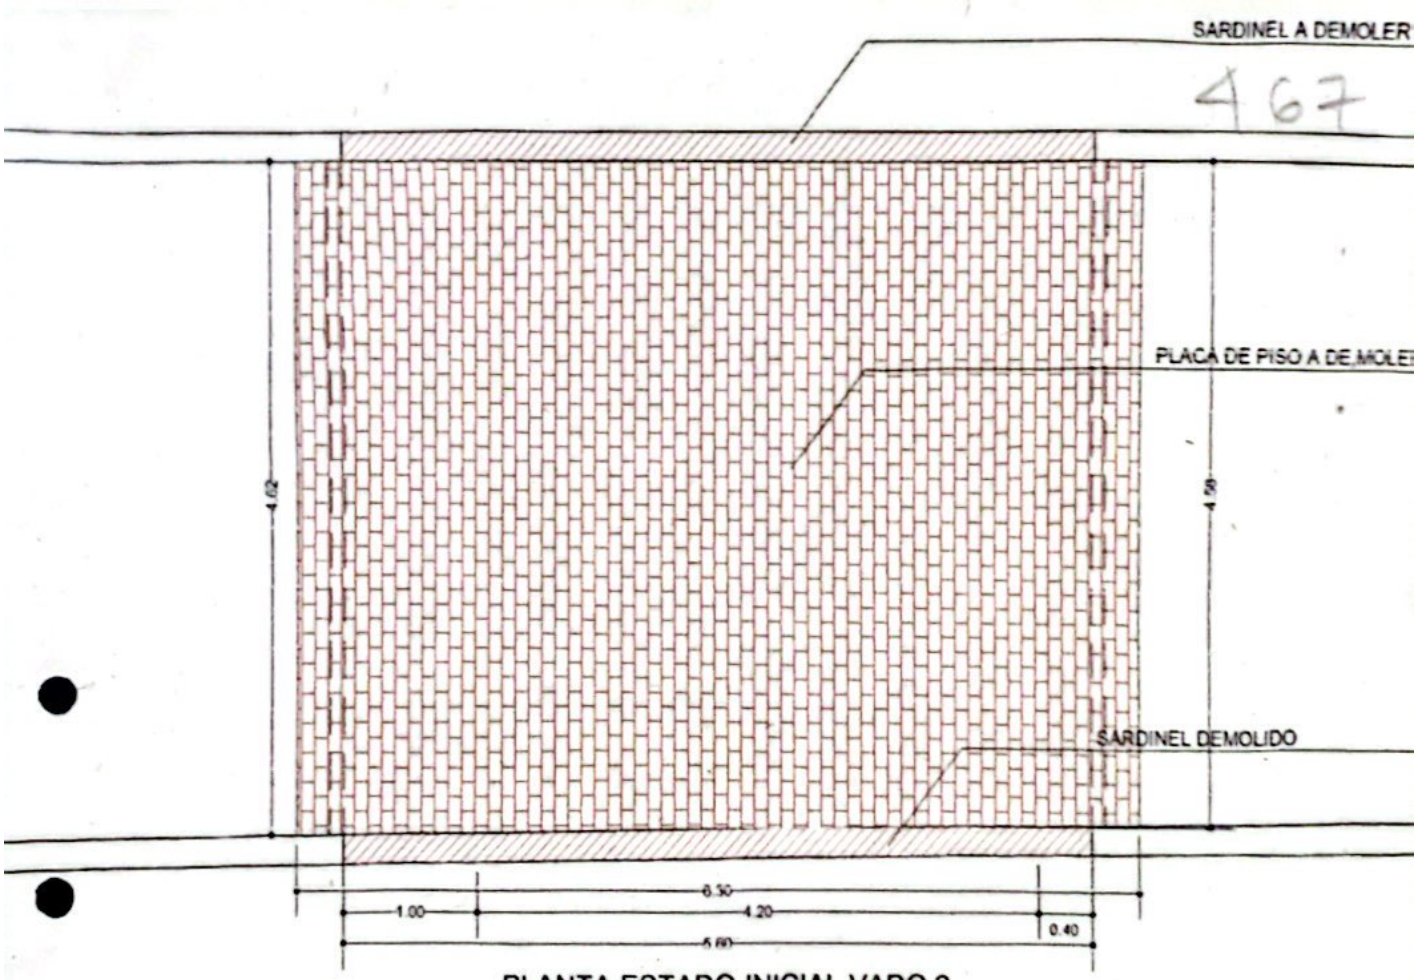

PLANTA ESTADO INICIAL VADO 2

ESC.____1: 50

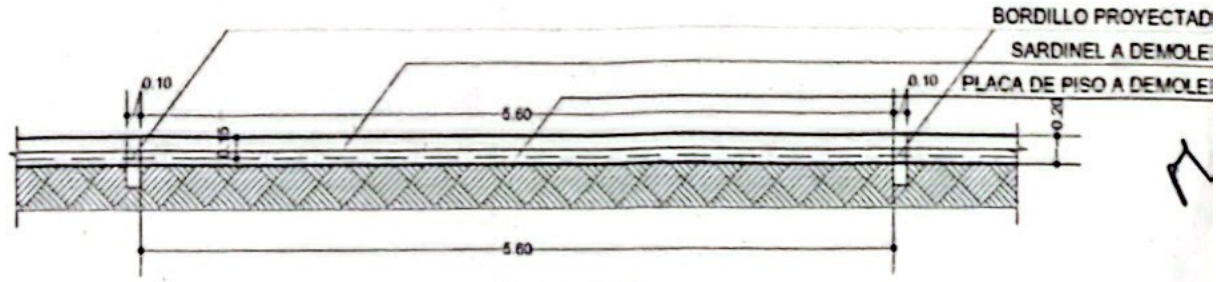


ALZADA VADO 2

ESC.____1: 50

DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 2


Powered by CamScanner

468

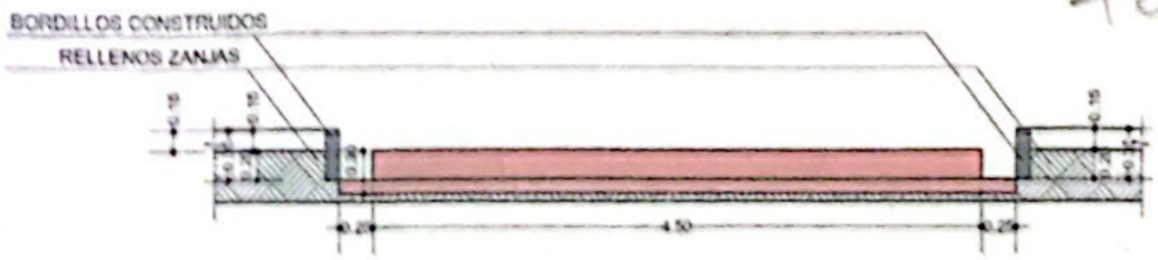


EXCAVACION MANUAL VADO 2
ESC.____1: 50

1

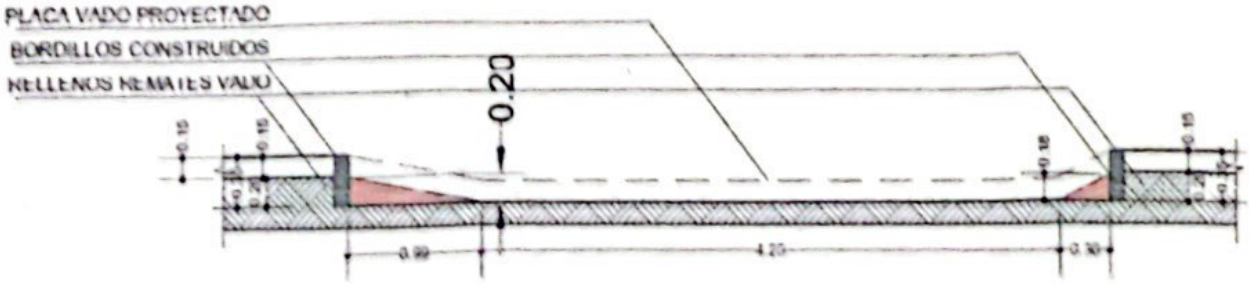

RELLENOS REMATE VADO 2
ESC.____1: 50

2




PLACA FUNDIDA EN SITIO VADO 2
ESC.____1: 50

3


PROCESO CONSTRUCTIVO VADO 2

Powered by CamScanner

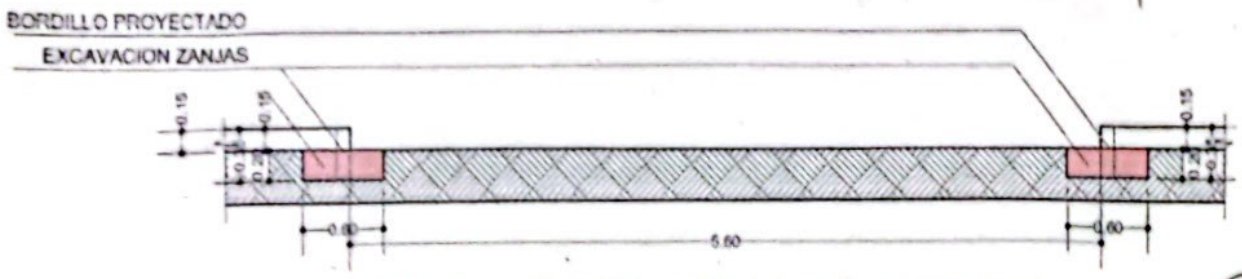


EXCAVACION ZANJAS VADO 2 (4)

ESC._____1: 50

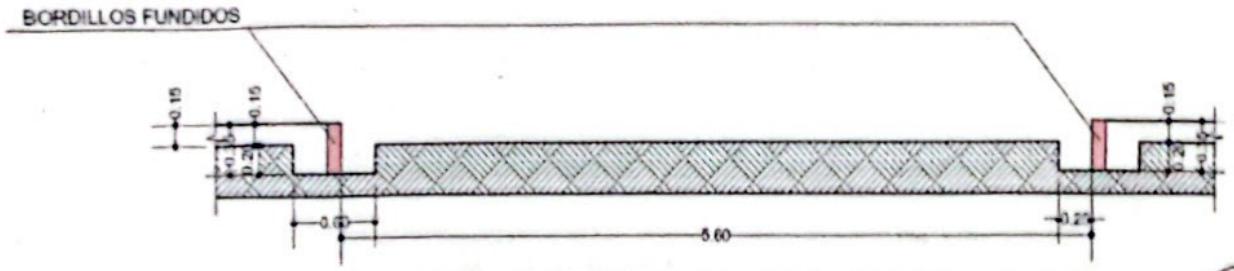

BORDILLOS FUNDIDOS EN SITIO VADO 2 (5)

ESC._____1: 50

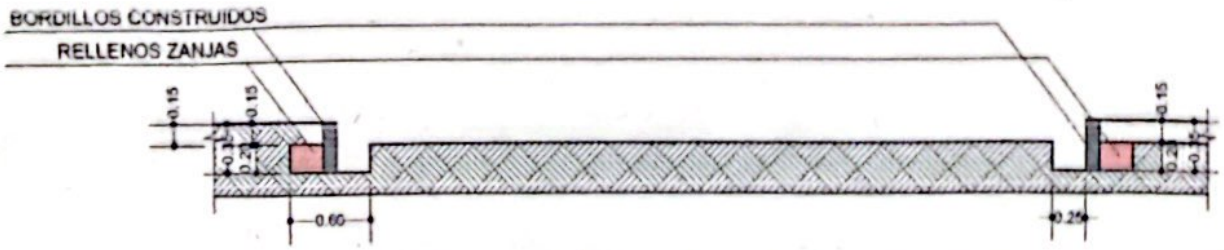


RELLENOS ZANJAS VADO 2 (6)


ESC._____1: 50

PROCESO CONSTRUCTIVO VADO 2

Powered by CamScanner

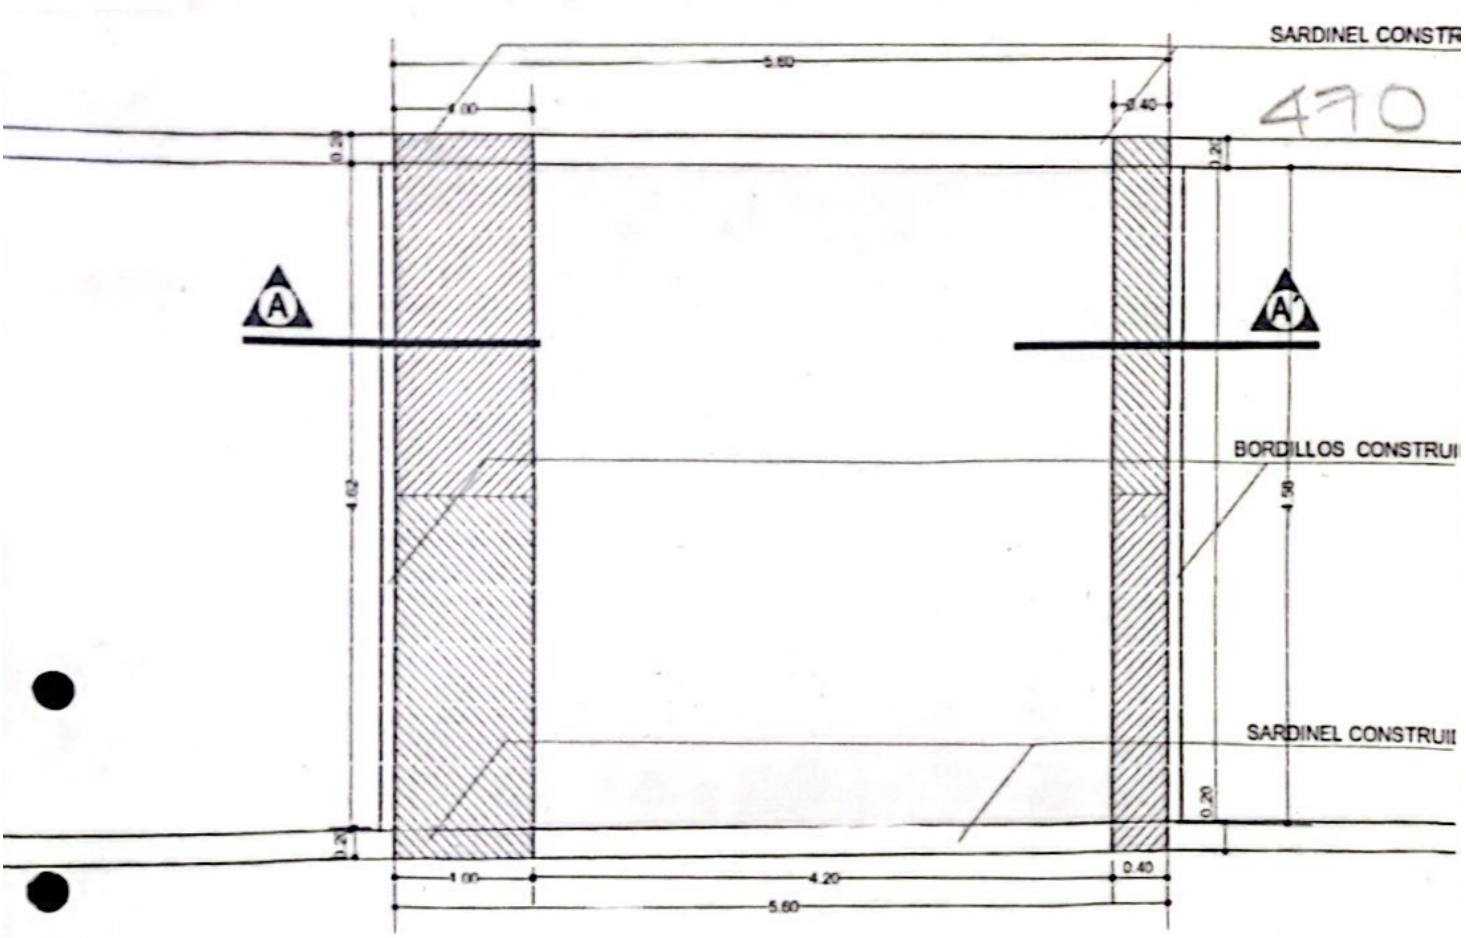

PLANTA VADO 2
ESC.____1: 50

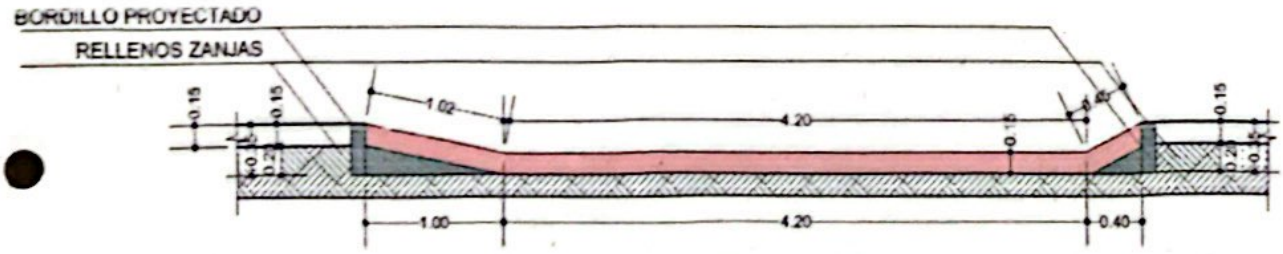


SECCION PLACA FUNDIDA EN SITIO VADO 1
ESC.____1: 50

PROCESO CONSTRUCTIVO VADO 2

7


Powered by CamScanner

471

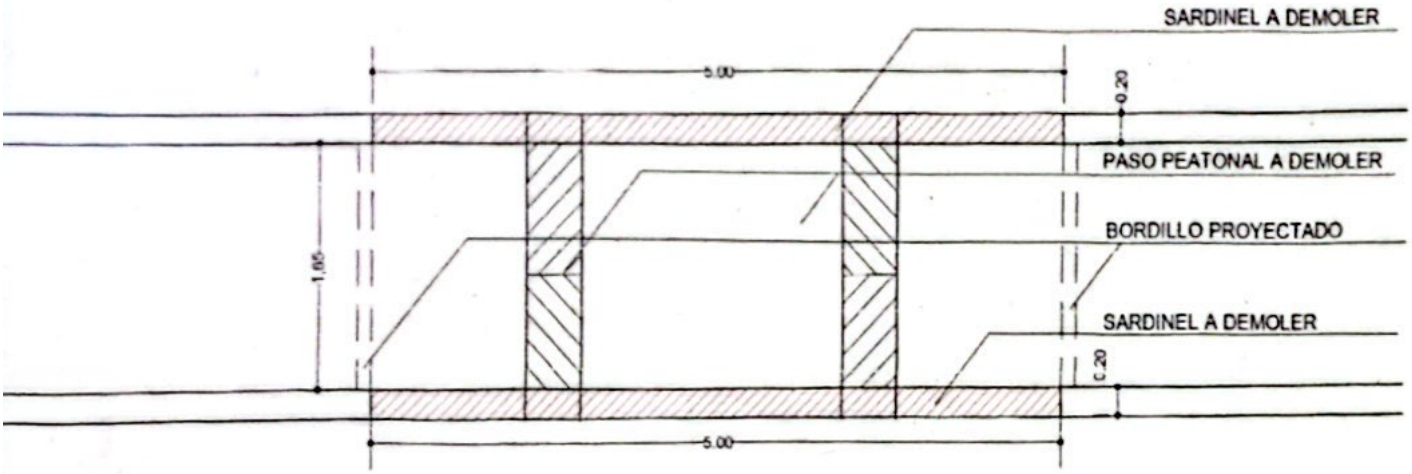

PLANTA ESTADO INICIAL VADOS 3, 4 Y 5

ESC.____1: 50

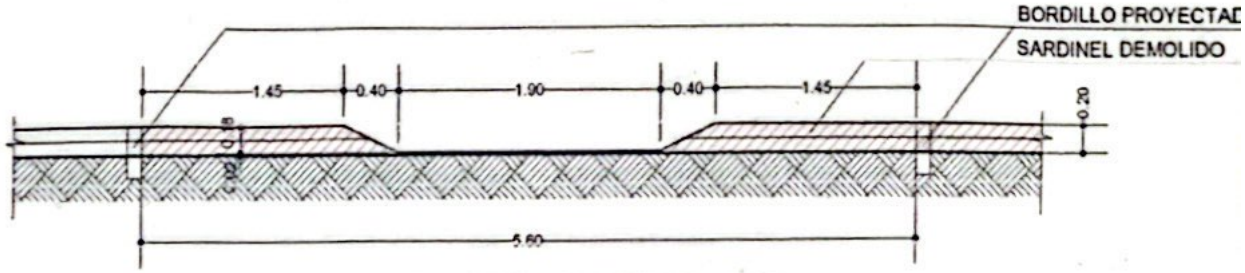


ALZADA VADOS 3, 4 Y 5

ESC.____1: 50

DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1


Powered by CamScanner

472

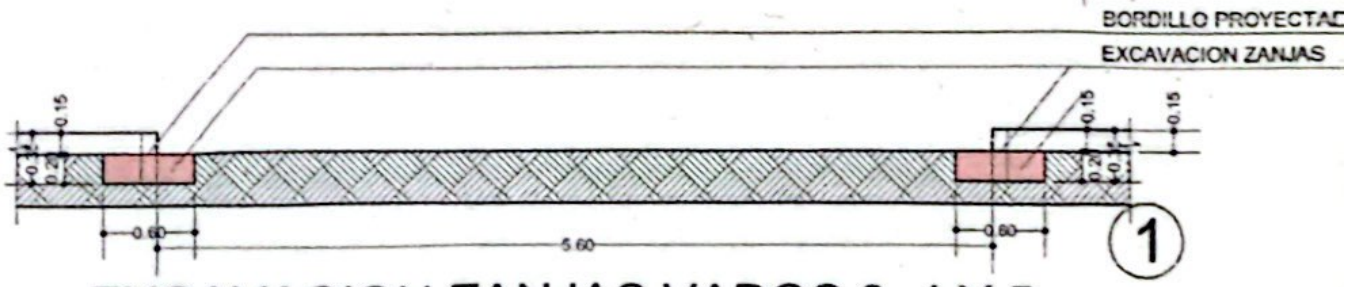


EXCAVACION ZANJAS VADOS 3, 4 Y 5

ESC._____1: 50

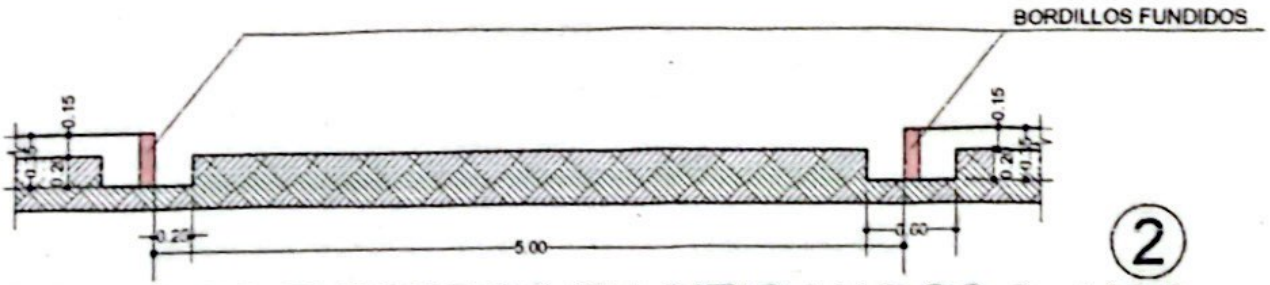

BORDILLOS FUNDIDOS EN SITIO VADOS 3, 4 Y 5

ESC._____1: 50

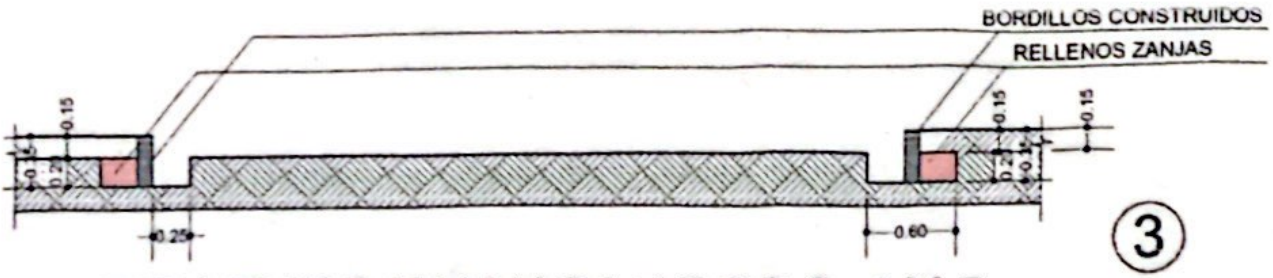


RELLENOS ZANJAS VADOS 3, 4 Y 5

ESC._____1: 50

DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1

Powered by CamScanner


473

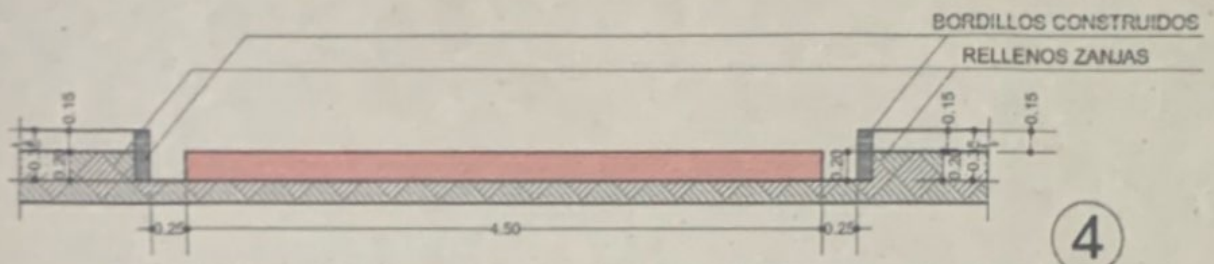

4

EXCAVACION MANUAL VADOS 3, 4 Y 5


ESC._____1: 50

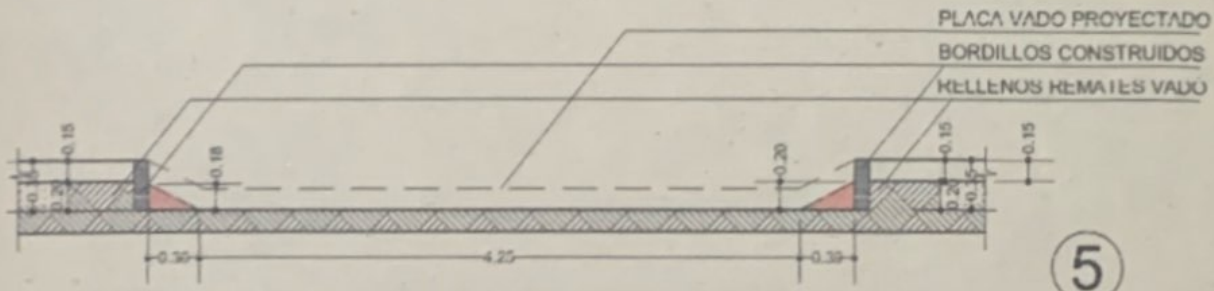

5

RELLENOS REMATE VADOS 3, 4 Y 5

ESC._____1: 50

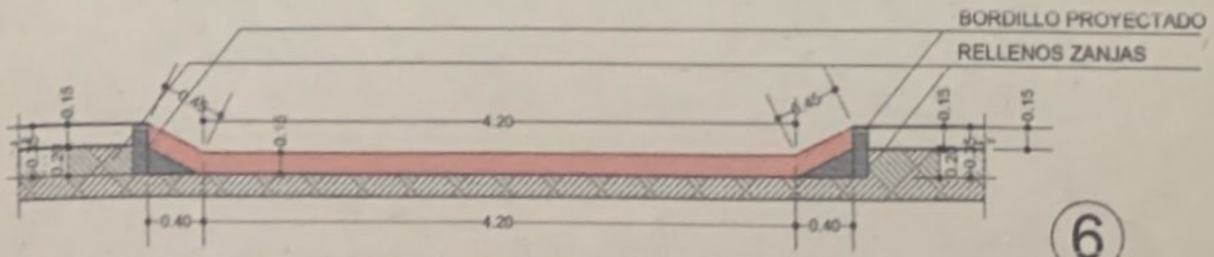

6


PLACA FUNDIDA EN SITIO VADOS 3, 4 Y 5

ESC._____1: 50

DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1


Powered by CamScanner

474

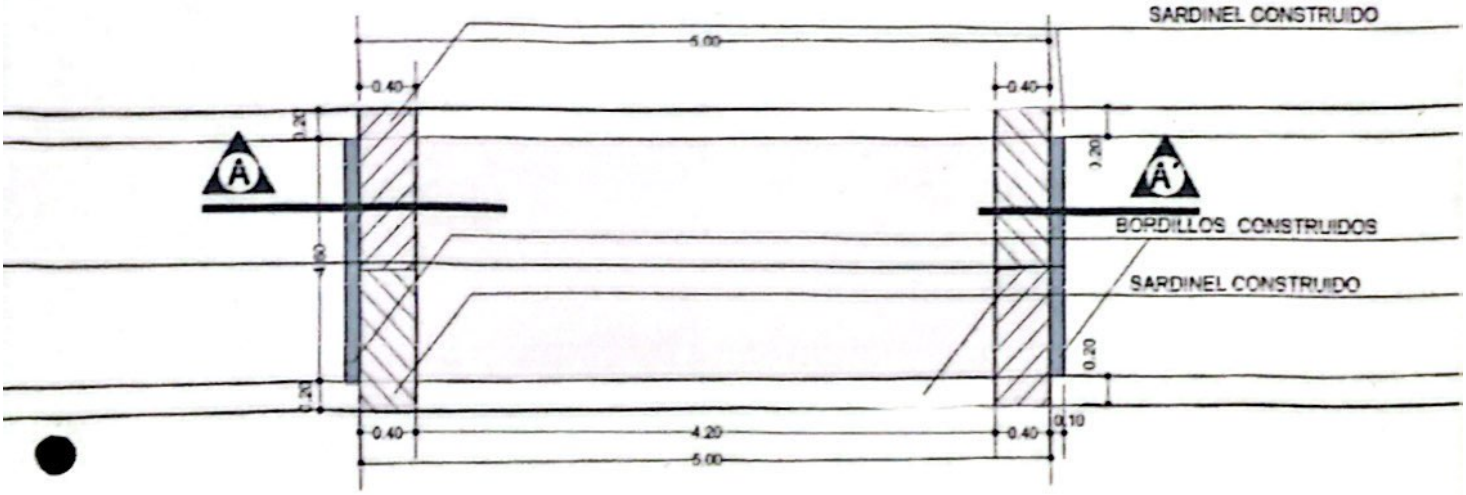

PLANTA ESTADO ACTUAL VADOS 3, 4 Y 5

ESC.____1: 50

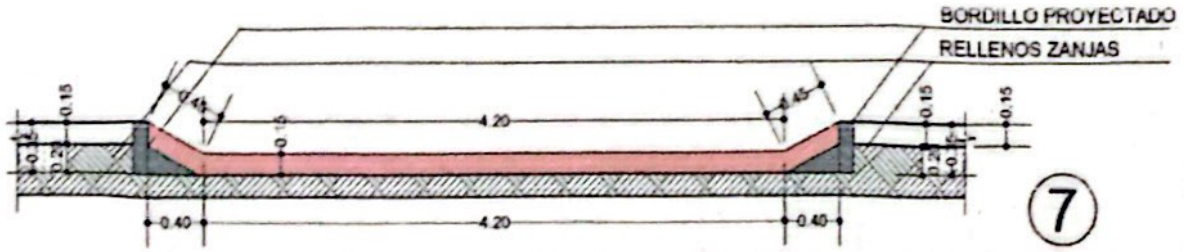

7


SECCION PLACA FUNDIDA EN SITIO VADOS 3, 4 Y 5

ESC.____1: 50


DETALLE DEMOLICION SARDINELES VADO 1

Powered by CamScanner

475




RAMPA 1

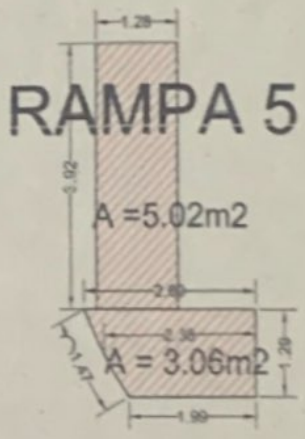


RAMPA 5


RAMPA 6




RAMPA 2




RAMPA 3



RAMPA 7




RAMPA 4




RAMPA 8

Powered by CamScanner


476




RAMPA 9




RAMPA 13




RAMPA 10




RAMPA 14




RAMPA 11



RAMPA 15




RAMPA 12




RAMPA 16


Powered by CamScanner




RAMPA 17




RAMPA 21




RAMPA 18




RAMPA 22



RAMPA 19




RAMPA 23



RAMPA 20


Powered by CamScanner

1

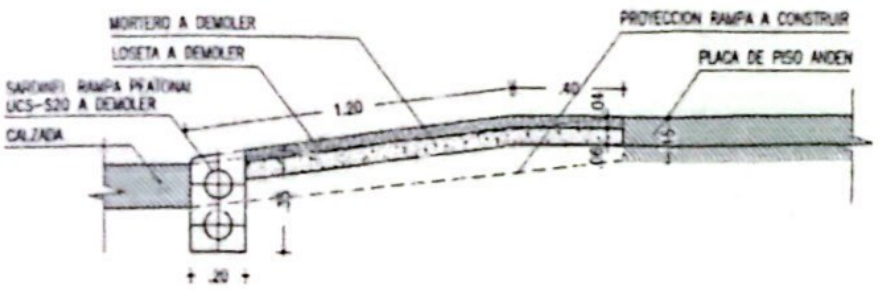


ESTADO INICIAL
ESC 1:25

2

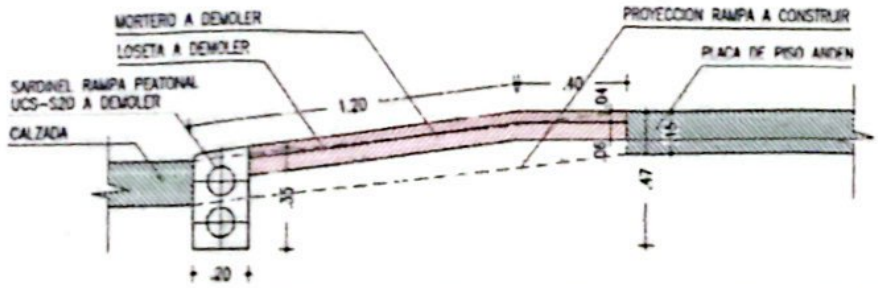

DEMOLICION PLACA DE PISO
ESC 1:25

3

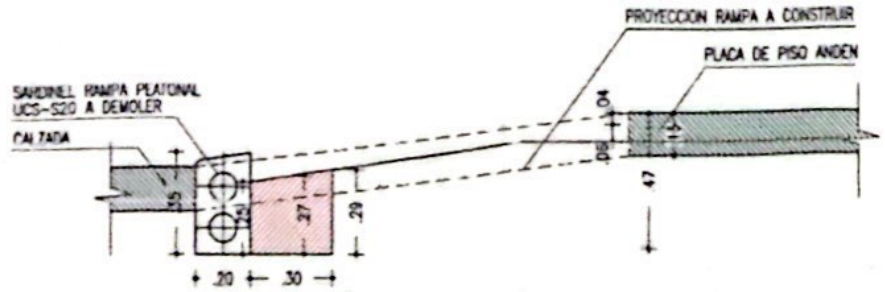


EXCAVACION ZANJA SARDINEL
ESC 1:25

PROCESO CONSTRUCTIVO RAMPAS


Powered by CamScanner

4

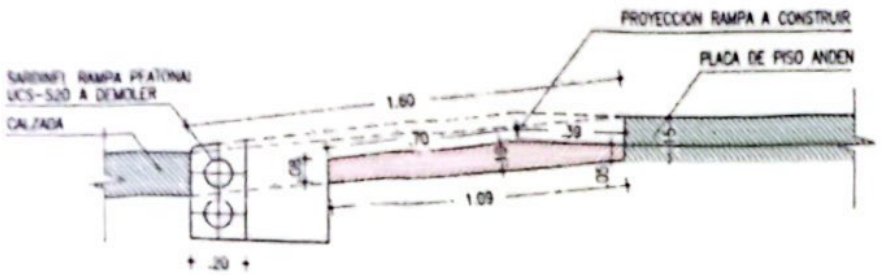


EXCAVACION RAMPA
ESC 1:25

5

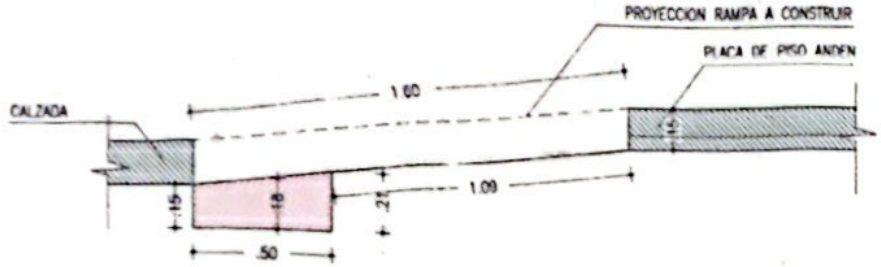

RELLENO ZANJA
ESC 1:25

6

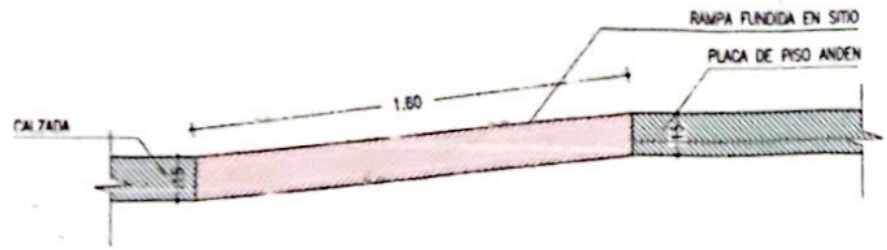

PLACA FUNDIDA EN SITIO
ESC 1:25

PROCESO CONSTRUCTIVO RAMPAS

Powered by CamScanner

480


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: 4-[illegible]-218.17-008
Versión: 1.0
Fecha vigencia versión:
Página

FECHA	19/02/2024	ELABORÓ	Carlos Leiton
OBJETO	PP CARRERA 15 FAJA 1 ENTRE AVENIDA CUERRADADACA Y CALLE 33		

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
[illegible]	[illegible]	Demolición de placa de piso en general con compresor (base y enrasillo, incluye cargue, retiro y disposicion final (incluye picos, rompas en concreto, adicionar, lona, tablestá y cualquier tipo de acabado.	UNID.	M3





DETALLE REALCE ALCORQUE DEMOLIDO



DISCRIPCION	DIMENSIONES						TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	VOL.	CANT.	
SECTOR 1 Av. Q. Sarp - Calle 30							
Viaje 1 Av. Q. Sarp	4.60	4.30		0.15	2.97		2.97
Viaje 1 Av. Q. Sarp pozo peatonal existente	4.60	2.00		0.10	0.92		0.92
Sardinel= SL 200	3.00	2.00		0.15	0.90		0.90
Rampa peatonal 1	2.87	1.88		0.10	0.05		0.05
Rampa peatonal 2	2.40	1.26		0.10	0.28		0.28
Rampa peatonal 3	0.98	1.60		0.10	0.16		0.16
Rampa peatonal 4	1.40	1.30		0.10	0.18		0.18
Contenedores de raices 1, 2, 3, 4, 5(x2), 6 y 7	1.00	1.00		0.15	0.15	8.00	1.20
Bordillo contenedor vs. viviendas existentes	0.10	4.40		0.15	0.07	4.00	0.28
SECTOR 2 Calle 30 - Calle 31							
Viaje 2 Calle 30	4.60	4.30		0.15	2.97		2.97
Viaje 2 Calle 30 pozo peatonal existente	4.60	2.00		0.10	0.92		0.92
Viaje 3 Calle 31	1.65	3.72		0.15	0.92		0.92
Viaje 3 Calle 31 pozo peatonal existente	1.65	2.00		0.10	0.33		0.33
Sardinel SW	73.78	3.25		0.15	37.07		37.07
Rampa peatonal 5	1.92	1.28		0.10	0.50		0.50
Rampa peatonal 6	2.38	1.29		0.10	0.31		0.31
Rampa peatonal 7	1.48	3.42		0.15	0.52		0.52
Rampa peatonal 8	1.43	2.83		0.10	0.27		0.27
Rampa peatonal 9	2.31	1.11		0.10	0.26		0.26
Rampa peatonal 10	1.76	1.15		0.10	0.20		0.20
Rampa peatonal 11	1.38	2.40		0.15	0.50		0.50
Rampa peatonal 12	1.60	1.40		0.10	0.26		0.26
Rampa peatonal 13	1.37	1.38		0.10	0.19		0.19
Contenedores de raices 8(x2), 9, 10 y 11	1.00	1.00		0.15	0.15	5.00	0.75
Bordillo contenedor vs. viviendas existentes	0.10	4.40		0.15	0.07	10.00	0.66
Contenedor de raices existente en peatonal Cra 15 con calle 31	1.20	1.20		0.20	0.29		0.29
Sardinel= 1	1.78	1.20	0.10	0.29	0.061		0.06
Sardinel= 2	2.25	1.20	0.10	0.240	0.054		0.05
Sardinel= 3	1.28	1.25					
Sardinel= 4	1.90	1.80	0.10	0.20	0.057		0.06
Sardinel= 5	1.95	1.80	0.10	0.240	0.067		0.07
Sardinel= 6	1.26	1.80	0.10	0.24	0.033		0.03
Sardinel= 7	2.13	1.80	0.10	0.24	0.055		0.06
Sardinel= 8	1.28	1.25					
Sardinel= 9	1.28	1.20					

Powered by CamScanner





DESCRIPCION	DIMENSIONES					CANT.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	VOL.		
SECTOR 1 Calle 31-Calle 32							
Vado 4 calle 31	1.66	1.70		0.15	0.42		0.42
Vado 4 calle 31 pozo gestional existente	1.66	2.00		0.10	0.33		0.33
Total separación descontado ancho vado	55.44	1.66		0.15	13.80		13.80
Rampa 14	1.77	1.02		0.10	0.18		0.18
Rampa 15	1.63	1.62		0.10	0.26		0.26
Rampa 16	1.40	1.12		0.10	0.16		0.16
Rampa 17	1.60	1.57		0.10	0.25		0.25
Rampa 18	3.15	1.69		0.10	0.53		0.53
Contenciones de raices 12, 13, 14, 15 Y 18	1.00	1.00		0.15	0.15	5.00	0.75
Bordillos contenedor vs arboles existentes	0.10	4.40		0.15	0.07	4.00	0.26
Jardinera 10	1.28	2.20					
Jardinera 11	1.78	1.20	0.10	0.148	0.192		0.19
Jardinera 12	2.19	1.29	2.19	0.33	4.331		4.33
Jardinera 13	3.86	1.20	0.10	0.110	0.496		0.01
Jardinera 14	1.22	1.19					
SECTOR 1 Calle 32-Calle 33							
Vado 5 Calle 33	1.65	1.70		0.15	0.42		0.42
Vado 5 Calle 33 pozo gestional existente	1.65	2.00		0.10	0.33		0.33
Separacion	39.81	1.65		0.15	9.85		9.85
Rampa 19	1.30	1.44		0.10	0.19		0.19
Rampa 20	1.60	1.60		0.10	0.26		0.26
Rampa 21	2.31	1.22		0.10	0.28		0.28
Rampa 22	1.60	1.60		0.10	0.26		0.26
Rampa 23	1.43	1.40		0.10	0.20		0.20
Jardinera 15	1.28	1.20	0.10	0.33	0.139		0.14
Jardinera 16	1.78	1.20	0.10	0.33	0.183		0.18
Jardinera 17	2.19	1.20					
Contenciones de raices 16x21, 17 y 19	1.00	1.00		0.15	0.15	4.00	0.60
Bordillos contenedor vs arboles existentes	0.10	4.40		0.15	0.07	5.00	0.33
						Subtotal	33.79
						Cantidad	*
						TOTAL	33.79

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

FECHA		ELABORO	
OBJETO			

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES							



DESCRIPCION	CANTIDAD						TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	UNIDAD		
SECTOR 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
Sector 1 Cra 18 Entre Calle 38							
SECTOR 2 Calle 40 Calle 39							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
Sector 2 Cra 18 Entre Calle 40							
SECTOR 3 Calle 41 Calle 39							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
Sector 3 Cra 18 Entre Calle 41							
SECTOR 4 Calle 42 Calle 39							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							
Sector 4 Cra 18 Entre Calle 42							


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CALCULO D I CANTIDADES

Código: F-GDI-5000-Cto.-17-004	
Versión: 1.0	
Fecha aprobación:	
Página:	

FECHA	15/01/2024	ELABORO:	Carlos Gil Bo
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	LOC	Preliminares	ITEM	1.4.1	Excavación manual en material común en seco, cargue, retiro y disposición final				UNID.	MU	MMC	UNITARIO









DESCRIPCION	DIMENSIONES						TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	CANT		
SECTOR 1 Pp. CL Seco - Calle 30							
Viadu 1 ent. CL Seco	5.60	1.10	1/0	7.04			7.04
Tram diario o anexo SL 200 y contenidos a entorno existentes	1.18	1.25	1/1	5.76			1.76
Cuentavalores de raices 1,2,3,4 Sec2-1-0 y 7	1.20	1.20	1/40	1.44	7.5		10.8
Rampa peatonal 1	1.87	1.84	1/48	0.26			0.26
Rampa peatonal 2	2.40	1.14	1/48	0.23			0.23
Rampa peatonal 3	0.98	1.60	1/48	0.2			0.12
Rampa peatonal 4	1.46	1.80	1/48	0.4			0.14
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31							
Viadu 2 calle 30	4.60	1.10	1/0	7.04			7.04
Viadu 3 calle 31	3.65	4.50	1/0	2.13			2.13
Cuentavalores de raices No2, 9, 10 y 11.	1.20	1.20	1/40	1.44	4.5		6.48
Rampa peatonal 5	3.92	1.28	1/48	0.38			0.38
Rampa peatonal 6	2.88	1.29	1/48	0.23			0.23
Rampa peatonal 7	1.48	1.33	1/48	0.17			0.17
Rampa peatonal 8	1.61	1.61	1/48	0.20			0.20
Rampa peatonal 9	2.35	1.33	1/48	0.18			0.18
Rampa peatonal 10	1.76	1.35	1/48	0.15			0.15
Rampa peatonal 11	1.58	1.40	1/48	0.17			0.17
Rampa peatonal 12	1.60	1.60	1/48	0.19			0.19
Rampa peatonal 13	1.27	1.98	1/48	0.14			0.14
Sobrante	73.79	1.35	1/0	28.72			28.72
SECTOR 3 Calle 31-Calle 32							
Viadu 4 calle 31	1.66	4.50	1/0	2.24			2.24
Cuentavalores de raices 12, 13, 14, 15 Y 16.	1.20	1.20	1/40	1.44	5		7.20
Rampa peatonal 14	1.77	1.62	1/48	0.4			0.14
Rampa peatonal 15	1.63	1.62	1/48	0.20			0.20
Rampa peatonal 16	1.48	1.17	1/48	0.12			0.12
Rampa peatonal 17	1.60	1.17	1/48	0.19			0.19
Rampa peatonal 18	3.15	1.09	1/48	0.40			0.40
Sobrante	15.84	1.17	1/0	17.25			17.25
SECTOR 4 Calle 32-Calle 33							
Viadu 5 calle 33	1.65	4.50	1/0	1.49			1.49
Cuentavalores de raices 16to21, 17 y 18.	1.20	1.20	1/40	1.44	3.5		5.04
Rampa peatonal 19	1.30	1.44	1/48	0.4			0.14
Rampa peatonal 20	1.60	1.60	1/48	0.19			0.19
Rampa peatonal 21	2.55	1.23	1/48	0.21			0.21
Rampa peatonal 22	3.00	1.00	1/48	0.19			0.19
Rampa peatonal 23	1.43	1.49	1/48	0.15			0.15
Sobrante	15.61	1.13	1/0	12.46			12.46
						Subtotal	17.17
						Cantidad	
						TOTAL	17.17

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: F-GDI-SGRD-036.17-018
Versión: 1.0
Fecha de aprobación:
Página:

FECHA: 19/02/2024 | ELABORÓ: | Carlos Leiton

OBJETO: PP CARRERA 11 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADANEGRA Y CALLE 33


CAPITULO	1.00	Preliminares	ITEM	1.4.2	Excavación especial en zanja en material común en seco, ancho máx: 0.5 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final				UNID.	M3	UBIC.	URBANIZADO



DETALLE ZANJAS BORDILLOS VADOS







DESCRIPCION	DIMENSIONES						TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN M3	CANT		
SECTOR 1 Av. Q. Seca - Calle 30							
Bordillos vado 1 Av. Q. Seca	4.60	0.60	0.20 -	0.55	2.00		1.10
Retiro se nivel rampa peatonal 1	1.98	0.80	0.27	0.16			0.16
Retiro se nivel rampa peatonal 2	1.47	0.80	0.27	0.12			0.12
Retiro se nivel rampa peatonal 3	1.67	0.80	0.27	0.15			0.15
Retiro se nivel rampa peatonal 4	1.47	0.80	0.27	0.12			0.12
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31							
Bordillos vado 2 calle 30	4.60	0.60	0.20	0.55	2.00		1.10
Bordillos vado 3 calle 31	1.70	0.60	0.20	0.20	2.00		0.41
Retiro se nivel rampa peatonal 6	2.38	0.80	0.27	0.19			0.19
Retiro se nivel rampa peatonal 7	2.32	0.80	0.27	0.19			0.19
Retiro se nivel rampa peatonal 8	2.13	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 9	1.59	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 10	1.48	0.80	0.27	0.12			0.12
Retiro se nivel rampa peatonal 11	2.43	0.80	0.27	0.80			0.80
Retiro se nivel rampa peatonal 12	1.60	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 13	1.66	0.80	0.27	0.13			0.13
SECTOR 3 Calle 31-Calle 32							
Bordillos vado 4 calle 31	1.96	0.60	0.20	0.30	2.00		0.40
Retiro se nivel rampa peatonal 14	1.47	0.80	0.27	0.12			0.12
Retiro se nivel rampa peatonal 15	1.62	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 16	1.54	0.80	0.27	0.15			0.15
Retiro se nivel rampa peatonal 17	1.57	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 18	1.79	0.80	0.27	0.72			0.72
SECTOR 4 Calle 32-Calle 33							
Bordillos vado 5 calle 33	1.05	0.60	0.20	0.30	2.00		0.60
Retiro se nivel rampa peatonal 19	1.62	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 20	1.60	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 21	1.55	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 22	1.60	0.80	0.27	0.13			0.13
Retiro se nivel rampa peatonal 23	1.52	0.80	0.27	0.12			0.12
						TOTAL	6.57

PROYECTADO

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

485

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código: P-GDI-SHSO-233.37.068
Versión: 1.0
Fecha aprobación:
Página:

FECHA	19/01/2024	ELABORO:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 17 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	1.00	Preliminares	ITEM	1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactac (in mecánica con apisonador				UNID.	M3	UBIC.	URBANISMO





DESCRIPCION	DIMENSIONES						TOTA.
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.		
SECTOR 1 Av. Q. Seca - Calle 30							
Area vado 1 Av. Q. Seca	4.60	5.60	0.10	2.58			1.579
Demolición poste alumbrado público ortigero en vado 1 0.6x0.90x1.00 3/4 1/2"	0.50	0.80	1.00	0.40			0.040
Base estructura publicidad comercial en riempa peatonal 7 ca le 30 costado oriental (0.40x0.70x0.60)	0.70	0.40	1.60	0.17			0.168
Bordillo vado 1 Av. Q. Seca	4.65	0.21	1.25	0.19	1.00		0.581
Rampa vado 1 Av. Q. Seca	4.65	0.99	1.20	0.46			0.455
Rampa vado 1 Av. Q. Seca	4.65	0.36	1.18	0.15			0.153
Rampa peatonal 1	1.98	0.53	1.18	0.18			0.179
Rampa peatonal 2	1.47	0.50	1.18	0.13			0.141
Rampa peatonal 3	1.87	0.54	1.18	0.17			0.188
Rampa peatonal 4	1.47	0.50	1.18	0.13			0.132
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31							
Area vado 2 Ca le 30	4.60	5.60	0.10	2.58			1.579
Area vado 3 calle 31	1.70	5.00	0.10	0.85			0.850
Bordillo vado 1 calle 30	4.60	0.21	0.25	0.19	2.00		0.579
Bordillo vado 1 calle 31	1.70	0.21	0.25	0.11	2.00		0.213
Rampa vado 2 calle 30	4.60	0.99	1.20	0.46			0.951
Rampa vado 2 calle 30	4.60	0.36	0.20	0.17			0.166
Rampas vado 1 calle 31	1.70	0.84	0.20	0.12	2.00		0.240

Powered by CamScanner

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Cód gc: F-GDS-5000-238,37-058 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:

FECHA	31/02/2024	ELABORÓ:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 35 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 35		

CAPITULO	2.00	Concretos	ITEM	2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado		UNID.	M3	UBIC.	URBANISMO



DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL VOLUMEN
	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	
Placa vado 1 Av. C. Seca	4.60	5.66	0.15	3.91	3.91
Placa vado 2 Calle 30	4.60	5.66	0.15	3.91	3.91
Placa vado 3 calle 31	1.65	5.08	0.15	1.26	1.26
Placa vado 4 calle 32	1.66	5.09	0.15	1.27	1.27
Placa vado 5 calle 33	1.65	5.10	0.15	1.26	1.26
Sardinelerias vado 1	1.39	0.20	0.20	0.06	0.06
Sardinelerias vado 2	1.40	0.20	0.20	0.06	0.06
Sardinelerias vado 3	0.80	0.20	0.20	0.03	0.03
Sardinelerias vado 4	0.80	0.20	0.20	0.03	0.03
Sardinelerias vado 5	0.80	0.20	0.20	0.03	0.03
				Subtotal	11.31
				Cantidad	
				TOTAL	11.31

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

488

MEMORIA DE CALCULO ES CANTIDADES

FECHA

OBJETO

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U.	PARCIAL



DESCRIPCION	DIMENSIONES						TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA	Volumen	Cant.		


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GD-5000-230.37-008 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:

FECHA	25/01/2024	ELABORO:	
OBJETO	PP GUABERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 31		

CAPITULO	2,00	Concreto	ITEM	2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (30 cm x 35 cm) tipo BRS.00 * o similar, incluye soldado y acero de refuerzo			UNID.	M	UBIC	UNITARIO







DETALLE PLACA DE PISO VADOS

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		TOTAL
Bordillos vado 1 Av. Q. Seca	4,60	0,10	0,35	2,00		3,22
Bordillos vado 2 calle 30	4,60	0,10	0,35	2,00		3,22
Bordillos vado 3 calle 31	1,65	0,10	0,35	2,00		3,30
Bordillos vado 4 calle 31	1,66	0,10	0,35	2,00		3,32
Bordillos vado 5 calle 33	1,65	0,10	0,35	2,00		3,30
					Subtotal	19,31
					Cantidad	
					TOTAL	19,32

FIRMA (INTIDAD)

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-SIGD-238.31-064 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:

FECHA	19/02/2024	ELABORÓ:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	3.00	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	ITEM	3.1.1	Malla electrosoldada		UNID:	KG	UBIC.	URBANISMO



DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA	CUANTIA/KG	
SECTOR 1 Av. Q. Seca - Calle 30					
Malla vado 1 Av. Q. Seca	4.60	5.72	26.31	4.07	107.09
Rampa peatonal	1.87	1.88	3.52	4.07	14.31
Rampa peatonal 2	2.40	1.16	2.78	4.07	11.33
Rampa peatonal 3	0.98	1.60	1.56	4.07	6.35
Rampa peatonal 4	1.40	1.30	1.82	4.07	7.41
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31					
Malla vado 2 Calle 30	4.60	5.66	26.04	4.07	105.97
Malla vado 3 calle 31	1.70	5.08	8.64	4.07	35.15
Rampa peatonal 5	3.92	1.28	5.02	4.07	20.43
Rampa peatonal 6	2.38	1.29	3.07	4.07	12.50
Rampa peatonal 7	1.48	2.32	3.43	4.07	13.97

Powered by CamScanner

491











DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA	CUANTIA/KG	
SECTOR 1 Av. G. Seca - Calle 30					
Malla vado 1 Av. G. Seca	4.90	5.72	28,03	4,07	107,09
Rampa peatonal 1	1.87	1.88	3,52	4,07	14,31
Rampa peatonal 2	2.40	1.16	2,78	4,07	11,35
Rampa peatonal 3	0.98	1.60	1,56	4,07	6,35
Rampa peatonal 4	1.40	1.39	1,95	4,07	7,93
SECTOR 2 Calle 30 -Calle 31					
Malla vado 2 Calle 30	4.60	5.66	26,04	4,07	105,97
Malla vado 3 calle 31	1.70	5.08	8,64	4,07	35,15
Rampa peatonal 5	3.92	1.28	5,02	4,07	20,42
Rampa peatonal 6	2.38	1.29	3,07	4,07	12,50
Rampa peatonal 7	1.48	2.92	3,43	4,07	13,97
Rampa peatonal 8	1.63	1.63	2,66	4,07	10,81
Rampa peatonal 9	2.31	1.11	2,56	4,07	10,44
Rampa peatonal 10	1.76	1.15	2,02	4,07	8,24
Rampa peatonal 11	1.38	2.40	3,31	4,07	13,48
Rampa peatonal 12	1.60	1.60	2,56	4,07	10,42
Rampa peatonal 13	1.37	1.38	1,89	4,07	7,69
SECTOR 3 Calle 31-Calle 32					
Malla vado 4 calle 31	1.66	5.09	8,45	4,07	34,39
Rampa peatonal 14	1.77	1.02	1,81	4,07	7,35
Rampa peatonal 15	1.61	1.62	2,64	4,07	10,75
Rampa peatonal 16	1.40	1.12	1,57	4,07	6,38
Rampa peatonal 17	1.60	1.57	2,51	4,07	10,22
Rampa peatonal 18	3.15	1.69	5,32	4,07	21,67
SECTOR 4 Calle 32-Calle 33					
Malla vado 5 calle 33	1.65	5.19	8,42	4,07	34,25
Rampa peatonal 19	1.90	1.44	1,87	4,07	7,62
Rampa peatonal 20	1.60	1.60	2,56	4,07	10,42
Rampa peatonal 21	2.31	1.22	2,82	4,07	11,47
Rampa peatonal 22	1.60	1.60	2,56	4,07	10,42
Rampa peatonal 23	1.43	1.40	2,00	4,07	8,15
				Subtotal	408,00
				Cantidad	
				TOTAL	408,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner


492

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Código:	F-GDI-0000-TEM-XT-068
Versión:	1.0
Fecha aprobación:	
Página:	

FECHA	28/02/2024
ELABORÓ	
OBJETO	PP CARRERA 33 144B-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADANEGRA Y CALLE 33

CAPITULO	6.00	Zona verde	ITEM	6.1.3	Contenedor de raices longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PS mezclado en sitio, espesor 10cm incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo				UNID.	M2	MEC.	URBANISMO

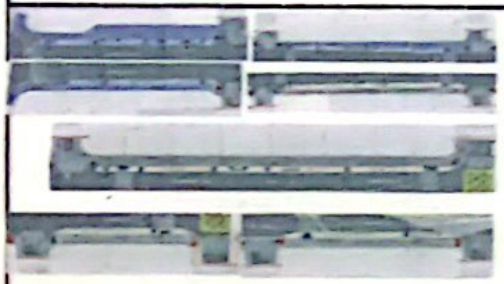



CONTENEDOR DE RAICES



SECCIÓN
ESC 1:25

DETALLE CONTENEDOR DE RAICES

DESCRIPCION	CANT.	LARGO	ALTURA	AREA	M2		TOTAL
Contenedor de raices longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PS mezclado en sitio, espesor 10cm, incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo	23,20	4,4	1,00	6,40	101,20		101,20
						Subtotal	101,20
						Cantidad	
						TOTAL	101,20

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA


9

Powered by CamScanner

493

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GIA-SC00-230.37-008 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:

FECHA	19/01/2024		ELABORO:									Carlos U Paz		
OBJETO	PP CARRERA 31 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33													
CAPITULO	7,00	Mobiliario	ITEM	7.1.1	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (Incluye cimentación)					UNID.	UN	UNIC.	URBANISMO	

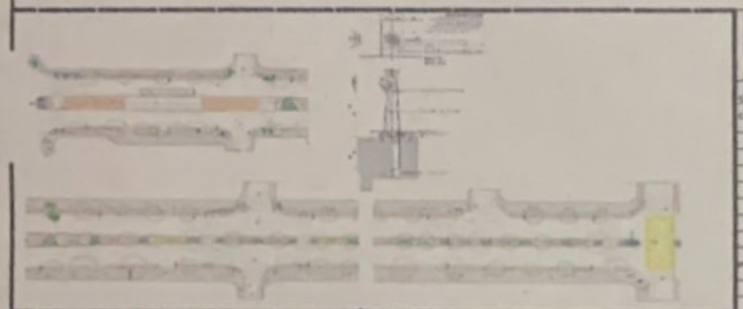

DESCRIPCION	CANT.	DIMENSIONES						TOTAL
Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (Incluye cimentación)	25,00							25,00
							Subtotal	25,00
							Cantidad	
							TOTAL	25,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

9y

Powered by CamScanner

494

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	19/02/2024	ELABORO:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE I ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	10.00	Varios	ITEM	10.1.1	Plan de manejo ambiental			URBANISMO





DESCRIPCION			TOTAL
Plan de manejo ambiental			0,655
		Subtotal	0,655
		Cantidad	
		TOTAL	0,655

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: F-GDI-5000-238.37-016 Versión: 2.24 Fecha aprobación: NOV 2023 Página: 1 de 1
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

PROYECTO:	PP carrera 15 fase 1 entre AV Quebeca y calle 33
ITEM: 10.1.1	
DESCRIPCION: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL o similar	
UNIDAD: und	
ESPECIFICACION: 10.1.1	

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Elaboración del MAO (Manejo Ambiental de la Obra)	UND	1		$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
Capacitación personal , reuniones comunidad de inicio, avance y	UND	5		$ 120.000,00	$ 600.000,00
Bolsas de colores en polietileno alta densidad p/100)	UND	3		$ 33.800,00	$ 101.400,00
Control de Emisiones Atmosféricas (Gases, Material Particulado y Ruido)	gl	1		$ 600.000,00	$ 600.000,00
Plastico negro polietileno cal. 3.1 ancho 3 m c 150 m	rollo	1		$ 788.900,00	$ 788.900,00
Kit de emergencias para derrames	UND	1		$ 195.000,00	$ 195.000,00
Manguera de agua	ml	50		$ 4.663,00	$ 233.150,00
Señalización zona de acopio	UND	2		$ 5.000,00	$ 10.000,00
Extintor , camilla botiquin primeros auxilios	gl	1		$ 750.000,00	$ 750.000,00
Manejo Integral de Residuos Liquidos, combustibles, aceites y Sustancias Quimicas	UND	1		$ 450.000,00	$ 450.000,00
recuperación de areas afectadas (sitios de acopio de materiales y aseo en frentes de obra.	UND	1		$ 304.910,00	$ 304.910,00
			TOTAL MATERIALES		$ 5.233.360,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
Tecnico ambiental o similar	70000	54%	45	0.01530423	107.800,00	$ 7.043.804,23
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 7.043.804,23

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 12.277.164,23
ADMINISTRACIÓN	31 %	$ 3.805.921,00
UTILIDAD	5 %	$ 613.858,00
TOTAL INCLUIDO AU		$ 16.696.943,23
TOTAL INCLUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		$ 16.696.943,23

Firma
Nombre: CARLOS M URIBE B
Representante Legal del Contratista o su Apoderado UACS NIT. 800189202-5
Matricula No. : 257004462 CND C.C 91.258.735

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

CANTIDAD A PAGAR = $ 16.696.943,23 / $ 25.487.360,00 = 0.6551 UND

Powered by CamScanner

- Capacitación de clasificación de residuos sólidos y RCD (residuos de construcción y demolición); se capacita al personal en los conceptos asociados como: gestión integral de residuos sólidos, aprovechamiento, economía circular, que son los residuos sólidos, como se clasifican, como es el código de colores y los impactos que estos generan, esto con el fin de poder realizar una adecuada separación de acuerdo al código de colores.

Fecha: 20 de enero de 2024

Duración: 45 minutos

Asistentes:

- Pablo Andrey Echeverry Rueda
- Jovanny Eduardo Vargas Rueda
- Kiara Maria Vega Calderon
- Ervin Javier Rueda

Resumen:
En la fecha indicada, se llevó a cabo la capacitación sobre la clasificación de residuos sólidos y RCD (residuos de construcción y demolición). La duración de la capacitación fue de 45 minutos y contó con la participación de los siguientes asistentes cuyos nombres se detallan en el formato adjunto.

Durante la capacitación, se proporcionó al personal una comprensión profunda de los conceptos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, el aprovechamiento, la economía circular y la clasificación de los residuos sólidos, incluidos los RCD. Se discutió el proceso de clasificación, incluyendo el uso de códigos de colores y los impactos ambientales asociados con diferentes tipos de residuos.

El objetivo de la capacitación fue capacitar al personal para realizar una adecuada separación de los residuos sólidos de acuerdo con el código de colores establecido, garantizando así una gestión eficaz y sostenible de los residuos generados en el lugar de trabajo.

Los asistentes demostraron comprensión de los conceptos presentados y quedaron capacitados para llevar a cabo la clasificación adecuada de los residuos sólidos y RCD.

Powered by CamScanner

	REGISTRO CAPACITACIONES PRIMER CORTE	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 4 de 9





Powered by CamScanner

Versión		FORMATO DE ASISTENCIA	Fecha
001	UAC URIBE		08/06/2012
		CODIGO: UAC 023 CAP1	

DATOS DE LA CAPACITACION				
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:	CLASIFICACION RESIDUOS SOLIDOS EN CONSTRUCCION			
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	ING. KARLA MANOSALVA	CARGO:	ESPECIALISTA HSQ	
DURACION DE LA CAPACITACION:	45 min - CAP 4	FECHA:	20/01/2024	
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:	PRESENTAR A LOS TRABAJADORES LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y AQUELLOS GENERADOS EN OBRA JUNTO A LA LOS SITIOS AUTORIZADOS DE DISPOSICION DE LOS MISMOS.			

DATOS DEL PERSONAL QUE SE CAPACITÓ					EVALUACIÓN	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	CÉDULA	APROBÓ SI	APROBÓ NO
01	Pablo Andrey Echeverry Rueda	OFICIAL DE OBRA	PABLO ECHEVERRY	91.529.317	X	
02	Jovanny Eduardo Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA	Jovanny Vargas	91.270.740	X	
03	Kiara Maria Vega Calderon	PALETERA	Kiara Maria Vega	1.098.618.099	X	
04	Ervin Javier Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA	Ervin S. Vargas	91.267.203	X	
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CAPACITADOR

Powered by CamScanner

	REGISTRO CAPACITACIONES PRIMER CORTE	Código: F-GDI-5000-238,37-091
		Versión 1.0
		Página 1 de 9

- **Capacitaciones**

Las capacitaciones realizadas dentro del periodo fueron las siguientes:

- Capacitación sobre Kit de derrames; se realiza con el fin de atender en forma segura cualquier derrame de sustancia química (como pintura) que se presente y mitigar el riesgo que se pueda generar sobre las personas, las instalaciones y/o el ambiente.

Fecha: 27 de enero de 2024

Duración: 30 minutos

Asistentes:

- Pablo Andrey Echeverry Rueda
- Jovanny Eduardo Vargas Rueda
- Kiara Maria Vega Calderon
- Ervin Javier Rueda

Resumen:
El día 20 de enero de 2024 se llevó a cabo la primera capacitación sobre el uso del Kit de Derrames. Resaltamos que la capacitación es realizada el día sábado con fines de menos impacto en rendimientos de obra y seguimiento de personal. La capacitación tuvo una duración de 30 minutos y contó con la asistencia de los empleados cuyos nombres se detallan en el formato adjunto.

Durante la capacitación, se instruyó a los asistentes sobre los elementos que componen el kit de derrames y su correcto uso en caso de derrames de sustancias químicas, como aceites y pinturas. Se hizo hincapié en la importancia de responder de manera segura y eficaz ante cualquier derrame para mitigar el riesgo para las personas, las instalaciones y el medio ambiente.

Los asistentes demostraron comprensión y quedaron capacitados en el uso adecuado del kit de derrames.

Powered by CamScanner

Esta capacitación se realizó con el objetivo de garantizar una respuesta segura y eficiente ante cualquier incidente de derrame de sustancias químicas en el lugar de trabajo, protegiendo así la seguridad y salud de los trabajadores y el entorno laboral.

A continuación, se evidencia registro fotográfico de los trabajadores reunidos para la capacitación.







Imagen 1. Capacitación de Kit de derrames

Powered by CamScanner

Versión		FORMATO DE ASISTENCIA 501	Fecha
001	UAC URIBE		08/06/2012
		CODIGO: UAC 023 CAP1	

DATOS DE LA CAPACITACION			
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:	KIT DE DERRAMES		
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	ING. KARLA MANOSALVA	CARGO:	ESPECIALISTA HSQ
DURACION DE LA CAPACITACION:	30 min - CAP 2	FECHA:	27/01/2024
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:	ESCENARIOS PARA LA UTILIZACION DEL KIT DE DERRAMES EN OBRA Y LOS PASOS A SEGUIR CON CADA UNO DE LOS MATERIALES QUE TRAE EL KIT.		

DATOS DEL PERSONAL QUE SE CAPACITÓ					EVALUACIÓN	
					APROBÓ	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	CÉDULA	SI	NO
01	Pablo Andrey Echeverry Rueda	OFICIAL DE OBRA	PABLO VARAS	91.529.317	X	
02	Jovanny Eduardo Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA		91.270.740	X	
03	Kiara Maria Vega Calderon	PALETERA		1.098.618.099	X	
04	Ervin Javier Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA	Ervin S. Vargas	91.267.203	X	
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CAPACITADOR

Powered by CamScanner

- Capacitación sobre la importancia y uso correcto de EPP's; Se capacita al personal mencionan que son elementos básicos y su función principal es preservar la salud del colaborador, ya que, diariamente se encuentra expuesto a los riesgos asociados a las actividades y busca minimizar la posibilidad de que los colaboradores desarrollen complicaciones o enfermedades que afecten su bienestar.

Fecha: 17 de febrero de 2024
Duración: 35 minutos

Asistentes:

- Pablo Andrey Echeverry Rueda
- Jovanny Eduardo Vargas Rueda
- Kiara Maria Vega Calderon
- Jhon Anderson Vargas
- Brayan Fabricio Pinzón Ramírez
- Ervin Javier Rueda

El 17 febrero 2024, se llevó a cabo la capacitación sobre la importancia y el uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP's). La sesión tuvo una duración de 35 minutos y contó con la participación del personal detallado en el formato adjunto.

Durante la capacitación, se resaltó la relevancia de elementos básicos para preservar la salud de los colaboradores. Se enfatizó en que, dado que el personal se encuentra expuesto diariamente a diversos riesgos asociados a las actividades laborales, el uso adecuado de los mismos busca minimizar la posibilidad de que desarrollen complicaciones o enfermedades que afecten su bienestar.

Se revisaron los diferentes tipos de dotaciones disponibles y se proporcionó información detallada sobre su función principal y los escenarios en los que deben ser utilizados. Se destacó la importancia de seleccionar la protección adecuada para cada tarea especifica, así como la necesidad de realizar un mantenimiento adecuado y periódico de los equipos para garantizar su eficacia.

El objetivo de la capacitación fue concienciar al personal sobre la importancia de utilizar correctamente el uniforme como medida de protección personal en el lugar de trabajo. Los asistentes demostraron comprensión de la información presentada y se comprometieron a cumplir con las medidas de seguridad establecidas para preservar su salud y bienestar.

Powered by CamScanner

503

Versión		FORMATO DE ASISTENCIA	Fecha
001	UAC URIBE		08/06/2012
		CODIGO: UAC 022 CAP1	

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:	IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE EPPs		
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	ING. KARLA MANOSALVA	CARGO:	ESPECIALISTA HSQ
DURACION DE LA CAPACITACION:	CAP - 3 (35 min)	FECHA:	17/02/2024
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN:	LA DOTACION ENTREGADA A LOS TRABAJADORES DEBE SER TRATADA Y MANEJADA BAJO UN USO ADECUADO, ES IMPORTANTE QUE LOS EQUIPOS DE OBRA REALICEN ACTIVIDADES DE INSPECCION, LIMPIEZA Y MANEJO PERTINENTE.		

DATOS DEL PERSONAL QUE SE CAPACITÓ

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	CÉDULA	EVALUACIÓN APROBÓ SI	EVALUACIÓN APROBÓ NO
01	Pablo Andrey Echeverry Rueda	OFICIAL DE OBRA	PABLO JARAMA	91.529.317	X	
02	Jovanny Eduardo Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA		91.270.740	X	
03	Klara Maria Vega Calderon	PALETERA		1.098.618.099	X	
04	Jhon Anderson Vargas	AYUDANTE DE OBRA	JHON VARGAS	1.098.615.241	X	
05	Brayan Fabricio Pinzon Ramirez	AYUDANTE DE OBRA	BRAYAN P.	1.098.770.700	X	
04	Ervin Javier Vargas Rueda	AYUDANTE DE OBRA	Ervin J. Vargas	91.267.203	X	
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CAPACITADOR

5

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner









Powered by CamScanner

514

Powered by CamScanner

515

Powered by CamScanner

516

I

Powered by CamScanner

517

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.761.373


MANOSALVA MORA

APELLIDOS

KARLA VANESSA

NOMBRES

FIRMA

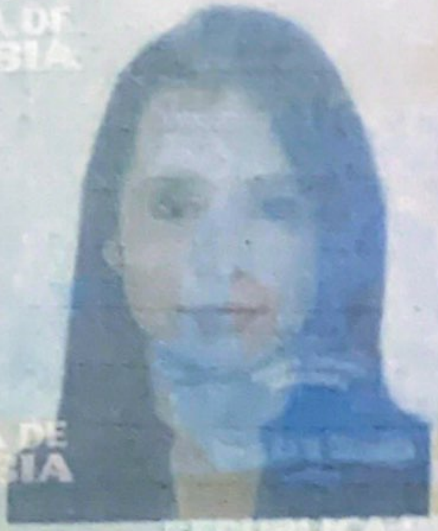



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1994

AGUACHICA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

22-OCT-2012 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2700100-00416826-F-1098761373-20121214 0031894216A 1 38760633

Powered by CamScanner

518

¿QPÑiA

Matrícula Profesional No.
68238-412672 STO
Fecha de Expedición: 31/01/2019

Nombre:
KARLA VANESSA
MANOSALVA MORA
Identificación:
C.C. 1098761373
Profesión:
INGENIERO AMBIENTAL



Institución:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO 02-2024

519

Bucaramanga, 2 de Marzo de 2024

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
C.C. 1.098.761.373 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SEIS PESOS ($10.565.706,00) MONEDA CORRIENTE***

POR CONCEPTO DE:
Prestación de servicios profesionales como PROFESIONAL AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN EN HSEQ para el contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga, desde Enero 16 hasta Febrero 27 de 2024.

Cordialmente.

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
Ingeniera Ambiental
Matricula Profesional N°: 68238-412672 STD
Cédula de Ciudadanía: 1.098.761.373 de Bucaramanga

CALLE 9 No. 24 – 55 CELULAR 3176981539 BUCARAMANGA
ingkarlamanosalva@hotmail.com

Powered by CamScanner

520

COMPROBANTE DE PAGO ASESORIA PMA

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

800.189.202-5

Identificación:	1.098.781.373 de Bmanga	Periodo:	15-01-2024 a 27-02-2024	Salario Básico:	$7.040.804
Nombre:	Ing KARLA VANESSA MANOSALVA MORA	Banco:		C. Costo:	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	RES AMBIENTAL PERIC MERO	Cuenta:	AHORRO # 91477[illegible]6	Fecha Ingreso:	[illegible]-2024
Dedicacion:	100%	Obra:	AV. QUEBRADASECA CRA 13 CLL 53-CONTRATO 318-2023		

Codigo	Descripcion	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios ELABORACIÓN, IMPLENTACIÓN PMA	1.50	10.565.706,00		10.565.706,00
001500	Prima de Servicios		0,00		0,00
002023	Dscto. Anticipo			0,00	0,00
002205	Salud Empleado			0,00	0,00
002210	Pensión Empleado			0,00	0,00
TOTALES:			$10.565.706,00	0,00	$10.565.706,00

Firma:

C.C. 1.098.781.373 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO 01-2024

521

Bucaramanga, 30 de Enero de 2024

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
C.C. 1.098.761.373 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.175.000,00) MONEDA CORRIENTE***

POR CONCEPTO DE:
Prestación de servicios profesionales como PROFESIONAL AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN EN HSEQ para el contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga, elaboración e implementación PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. (anexos) por 1.5 meses:

- Elaboración MAO (Manejo Ambiental de Obra) $1.200.000
- Manejo de Edificaciones e Instalaciones fijas y/o temporales ..... $ 675.000
- Manejo integral de materiales de construcción ..... $ 675.000
- Manejo integral de demoliciones, escombros y desechos ..... $ 675.000
- Control de emisiones atmosféricas (gases, material particulado Y ruido). ..... $ 900.000
- Manejo integral de residuos líquidos, combustibles aceites y Sustancias químicas $ 675.000
- Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y aguas de Escorrentía. ..... $ 675.000
- Manejo de vegetación y paisajismo (inventario forestal y balance De zonas verdes. $2.250.000
- Manejo de fauna silvestre ..... $ 450.000

Cordialmente.

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
Ingeniera Ambiental
Matrícula Profesional N°: 68238-412672 STD
Cédula de Ciudadanía: 1.098.761.373 de Bucaramanga

CALLE 9 No. 24 – 55 CELULAR 3176981539 BUCARAMANGA
ingkarlamanosalva@hotmail.com

4

Powered by CamScanner

522

COMPROBANTE DE PAGO DCTO PMA

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

800.189.202-5

Identificación:	1.098.761.373 de Bmanga	**Periodo:**	30/01/2024	**Salario Básico:**	$8.175.000
Nombre:	Ing KARLA VANESSA MANOSALVA MORA	**Banco:**		**C. Costo:**	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	ING AMBIENTAL ESPEC HSEQ	**Cuenta:**	NEQUI # 3014722679	**Fecha Ingreso:**	ENERO 2024
Dedicación:	100%	**Obra:**	AV. QUEBRADASECA CRA 15 CLL 33-CONTRATO 316-2023		

Código	Descripción	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios ELABORACIÓN, IMPLENTACIÓN PMA	1.50	8.175.000.00		8.175.000.00
001500	Prima de Servicios		0.00		0.00
002023	Dscto. Anticipo			0.00	0.00
002205	Salud Empleado			0.00	0.00
002210	Pensión Empleado			0.00	0.00
TOTALES:			$8.175.000.00	0.00	$8.175.000.00

Firma

C.C. 1.098.761.373 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo.

Powered by CamScanner

523

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02-2024-UACSAS

CONTRATANTE: **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS**
NIT. 800.189.202-5
CALLE 42 No. 4 – 05 Oficina 101 BOGOTA D.C
Teléfono 60 1-3738049 / 3142639322
obrabga@gmail.com

CONTRATISTA: **KARLA VANESSA MANOSALVA MORA**
C.C. 1.098.761.373 de Bucaramanga
Celular 317 6981539
Calle 9 # 24 – 55 Bucaramanga
ingkarlamanosalva@hotmail.com

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.258.735 de Bucaramanga, en su condición de representante legal de **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UACSAS** con Nit. 800.189.202-5, para efectos del presente contrato se denominará el Contratante y **KARLA VANESSA MANOSALVA MORA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.761.373 de Bucaramanga, de profesión Ingeniera Ambiental con especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo; obrando en su nombre, quien para efecto del presente contrato se denominarán el Contratista, hemos decidido celebrar un contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **PROFESIONAL AMBIENTAL-HSEQ**; para desarrollar las funciones de acuerdo a profesión y perfil requerido por la entidad y supervisión; en la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

PARAGRAFO El Contratista se compromete a contar con la disponibilidad de tiempo del 100% a la firma del presente contrato, entre estos disponibilidad para atender reuniones ya sea de forma remota o presencial, llamadas telefónicas, videoconferencias y demás que surjan y que se requieran con ocasión del desarrollo de sus funciones, entre otros, informes semanales, mensual, capacitaciones, documentos, cronogramas, programaciones, etc., para las que fue contratada, y de acuerdo a lo solicitado por su par y/o supervisor, de la Entidad (Alcaldía), el contratante, entre otros.

SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato es la suma de TRES MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.250.000=) pagaderos mensualmente, con dedicación del 100%:

TERCERA – FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará mensualmente, con la presentación de una cuenta de cobro, planilla al día en el pago de aportes de seg social y la aprobación de los informes correspondientes por el supervisor del contrato.

CUARTA – SERVICIOS ADICIONALES: En el desarrollo del proyecto pueden presentarse actividades adicionales a las contratadas por las cuales tendrán un reconocimiento económico hasta por un valor mensual de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 ($1.445.869,40) MONEDA CORRIENTE.

QUINTA – PLAZO DE DURACIÓN: La duración de este contrato a partir de la firma del mismo, es por 30 días; y/o de presentarse una prórroga de la obra hasta la fecha de terminación y/o de presentarse suspensión de obra igualmente se suspenderá el contrato y reiniciará de acuerdo al mismo.
Así mismo terminará una vez la supervisión apruebe el informe final.

Powered by CamScanner

SEXTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE se obliga a 1) Realizar el pago convenido de conformidad con lo señalado en la cláusula tercera, asumir la afiliación y pago de seguridad social. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a:
1) Disponer, organizar y elaborar los documentos, actas, correspondencia, formas, capacitaciones, registros fotográficos, informes semanales, y mensual de Obra, estadísticas, cronogramas de obra, dando oportuno cumplimiento al objeto contractual,
2) Presentar presupuestos de requerirse, cotizaciones, y demás documentos que se presentaren en el transcurso del desarrollo de la obra, según se disponga entre las partes; de no ser aprobado alguno o de recibir observaciones, se subsanarán y radicarán nuevamente hasta obtener la certificación o aprobación por parte de la Supervisión y/o Entidad.

PARAGRAFO 3. Asistir a los comités de obra, reuniones de trabajos y demás citas solicitadas por la interventoría y que se requiera acompañamiento de la PROF. AMBIENTAL-HSEQ durante la duración de contrato ya sea de manera remota o presencial, respetando los montos presentados en el presente contrato y solicitados por **EL SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE,** razón por la cual se espera que los tiempos de trabajo sean los requeridos para realizar las entregas.

SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será en la Calle 31 # 20-07 en la ciudad de Bucaramanga.

Constancia se firma en Bucaramanga a los quince (15) días del mes de Enero de 2024.

CARLOS M. URIBE B.
C.C. 91.258.735 B/manga
Rep. Legal UACSAS

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
C.C. 1.098.761.373 de Bucaramanga
PROFESIONAL AMBIETAL-HSEQ

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 901526649	6	JRVG RECUPERADORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 35 29 40 LOCAL 1	BUCARAMANGA-SANTANDER	3208541667	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	494885248	9464021786	E	2024/03/12	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$12.788.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

525

							SALARIO			PENSION																
vct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	ist	Fecha Inicio ist	Fecha Fin ist	vsp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa
																					$7.451.700					
																					$2.190.100					
																					$2.190.100					
							$3.400.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3.400.000	16%	SIN RIESGO	$544.000	$0	$0	$0	$0	$0	$544.000		SANITAS	30	$3.400.000	4%
							$1.300.000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA E.P.S.	30	$1.300.000	12.5%
							$2.200.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2.200.000	16%	SIN RIESGO	$352.000	$0	$0	$0	$0	$0	$352.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2.200.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.587.664	16%	SIN RIESGO	$254.100	$0	$0	$0	$0	$0	$254.100		NUEVA E.P.S.	30	$1.587.664	4%
							$5.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$5.000.000	16%	SIN RIESGO	$800.000	$0	$0	$0	$0	$0	$800.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$5.000.000	4%
							$1.500.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.500.000	16%	SIN RIESGO	$240.000	$0	$0	$0	$0	$0	$240.000		NUEVA E.P.S.	30	$1.500.000	4%
																					$1.037.600					
																					$1.037.600					
							$3.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.439.404	16%	SIN RIESGO	$230.400	$0	$0	$0	$0	$0	$230.400		SALUD TOTAL	30	$1.439.404	4%
							$2.150.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2.355.851	16%	SIN RIESGO	$377.000	$0	$0	$0	$0	$0	$377.000		NUEVA E.P.S.	30	$2.355.851	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	7	$130.000	16%	SIN RIESGO	$20.800	$0	$0	$0	$0	$0	$20.800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	7	$130.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.300.000	16%	SIN RIESGO	$208.000	$0	$0	$0	$0	$0	$208.000		FAMISANAR	30	$1.300.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	26	$1.126.667	16%	SIN RIESGO	$180.300	$0	$0	$0	$0	$0	$180.300		SANITAS	26	$1.126.667	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$43.334	12%	SIN RIESGO	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$5.300		SANITAS	1	$43.334	0%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$43.334	12%	SIN RIESGO	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$5.300		SANITAS	1	$43.334	0%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86.667	12%	SIN RIESGO	$10.500	$0	$0	$0	$0	$0	$10.500		SANITAS	2	$86.667	0%
																					$748.000					
																					$748.000					
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.650.000	16%	SIN RIESGO	$264.000	$0	$0	$0	$0	$0	$264.000		SALUD TOTAL	30	$1.650.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PROTECCION	7	$383.000	16%	SIN RIESGO	$61.400	$0	$0	$0	$0	$0	$61.400		SALUD HIA EPS	7	$383.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PROTECCION	18	$990.000	16%	SIN RIESGO	$158.400	$0	$0	$0	$0	$0	$158.400		SALUDANIA EPS	18	$990.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	29	$1.595.000	16%	SIN RIESGO	$255.200	$0	$0	$0	$0	$0	$255.200		SALUD TOTAL	29	$1.595.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$55.000	16%	SIN RIESGO	$8.800	$0	$0	$0	$0	$0	$8.800		SALUD TOTAL	1	$55.000	4%
																					$3.484.000					
																					$3.484.000					
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.389.893	16%	SIN RIESGO	$222.400	$0	$0	$0	$0	$0	$222.400		FAMISANAR	30	$1.389.893	4%

Powered by CamScanner

526

SALUD				CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
Valor Cotización	Valor UPC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$7.000.000		$7.000.000						$1.749.500						$1.659.700				$0		$0		$0		$0	
$710.100		$710.100						$459.600						$60.100				$0		$0		$0		$0	
$710.100		$710.100						$459.600						$60.100				$0		$0		$0		$0	
$136.600	$0	$136.600		CONFENALCO SANTANDER	30	$3.400.000	4%	$136.000	ARL SURA	30	$3.400.000	0.522%	1	$17.800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$162.500	$0	$162.500			0	$0	0%	$0		0	$0	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$88.000	$0	$88.000		CONFENALCO SANTANDER	0	$0	4%	$0	ARL SURA	30	$2.200.000	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$63.400	$0	$63.400		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.587.444	4%	$63.400	ARL SURA	30	$1.587.444	0.522%	1	$8.300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$200.000	$0	$200.000		CONFENALCO SANTANDER	30	$5.000.000	4%	$200.000	ARL SURA	30	$5.000.000	0.522%	1	$26.100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$60.000	$0	$60.000		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.500.000	4%	$60.000	ARL SURA	30	$1.500.000	0.522%	1	$7.900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$254.200		$254.200						$254.200						$442.300				$0		$0		$0		$0	
$254.200		$254.200						$254.200						$442.300				$0		$0		$0		$0	
$57.400	$0	$57.400		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.439.404	4%	$57.400	ARL SURA	30	$1.439.404	6.96%	5	$100.250	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$94.300	$0	$94.300		CONFENALCO SANTANDER	30	$2.355.851	4%	$94.300	ARL SURA	30	$2.355.851	6.96%	5	$164.000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$5.200	$0	$5.200		CONFENALCO SANTANDER	2	$130.000	4%	$5.200	ARL SURA	2	$130.000	6.96%	5	$9.100	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$52.000	$0	$52.000		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.300.000	4%	$52.000	ARL SURA	30	$1.300.000	6.96%	5	$90.566	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$45.100	$0	$45.100		CONFENALCO SANTANDER	26	$1.126.667	4%	$45.100	ARL SURA	26	$1.126.667	6.96%	5	$78.500	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0	$0		CONFENALCO SANTANDER	1	$43.334	0%	$0	ARL SURA	1	$43.334	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0	$0		CONFENALCO SANTANDER	1	$43.334	0%	$0	ARL SURA	1	$43.334	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0	$0		CONFENALCO SANTANDER	2	$86.667	0%	$0	ARL SURA	2	$86.667	0%	5	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$187.000		$187.000						$187.000						$138.000				$0		$0		$0		$0	
$187.000		$187.000						$187.000						$138.000				$0		$0		$0		$0	
$66.000	$0	$66.000		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.650.000	4%	$66.000	ARL SURA	30	$1.650.000	4.35%	4	$71.800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$15.400	$0	$15.400		CONFENALCO SANTANDER	7	$385.000	4%	$15.400	ARL SURA	7	$385.000	4.35%	4	$16.800	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$39.600	$0	$39.600		CONFENALCO SANTANDER	18	$990.000	4%	$39.600	ARL SURA	18	$990.000	0%	4	$0	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$63.800	$0	$63.800		CONFENALCO SANTANDER	29	$1.595.000	4%	$63.800	ARL SURA	29	$1.595.000	4.35%	4	$69.400	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$2.200	$0	$2.200		CONFENALCO SANTANDER	1	$55.000	4%	$2.200	ARL SURA	1	$55.000	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$848.700		$848.700						$848.700						$919.300				$0		$0		$0		$0	
$848.700		$848.700						$848.700						$919.300				$0		$0		$0		$0	
$55.400	$0	$55.400		CONFENALCO SANTANDER	30	$1.389.893	4%	$55.600	ARL SURA	30	$1.389.893	4.35%	4	$60.500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

S27

Se certifica que KARLA VANESSA MANOSALVA MORA identificado(a) con CC 1098761373 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JRVG RECUPERADORA SAS NI 901526649

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9462696735	440093848	E	2024-02-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	0												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	0												X					

Este certificado se expide el día 2024-04-05 a las 15:04.

Powered by CamScanner

528

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.098.761.373

MANOSALVA MORA

APELLIDOS

KARLA VANESSA

NOMBRES

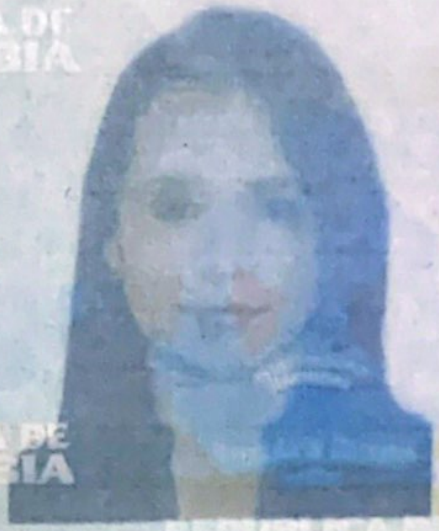

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1994

AGUACHICA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

22-OCT-2012 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2700100-00416826 F-1098761373-20121214 0031894216A 1 38760633

9

Powered by CamScanner

529

¿QPÑiA

Cons.io Profnio1111 Nocianll di In...,1a

Matrícula Profesional No.
68238-412672 STO
Fecha de Expedición: **31/01/2019**

Nombre:
KARLA VANESSA
MANOSALVA MORA
Identificación:
C.C. 1098761373
Profesión:
INGENIERO AMBIENTAL

Institución:
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



97

Powered by CamScanner

530

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Codigo: F-GIS-5000-238,27-1413
Version: 1.0
Fecha aprobación:
Pagina

FECHA	19/01/2024	ELABORO:	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	[illegible]	Varios	ITEM	10.1.1	Plan de manejo de tráfico					UNID.	UN	UBIC.	URBANISMO



	UNID	CANT.						
Elaboración y presentación del PMT (Plan de manejo de tráfico)	UND	1,00						1,00
BARRICADAS	UND	6,00						6,00
PALETAS PARE SIGA ID1 (INV)		5,00						5,00
DELINEADORES TUBULARES (TIPO COLOMBINAS O ESTACAS)	UND	60,00						60,00
BARRERAS PLASTICAS O SIMILARES O EN MADERA	UND	4,00						4,00
CINTA PLASTICA PELIGRO RD PASE O SIMILAR	ml	2000,00						2000,00
SEÑAL VERTICAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL O SIMILAR	UND	4,00						4,00
CONOS DE SEGURIDAD VIAL	UND	19,00						19,00
							Subtotal	5,714
							Cantidad	5,714
							TOTAL	5,714

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	Código: F-GDI-5000-238.37-016 Versión: 2.24 Fecha aprobación: NOV 2023 Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:	**PP carrera 15 fase 1 entre AV Obseca y calle 33**

ITEM: 10.1.2

DESCRIPCION: PLAN MANEJO TRANSITO o similar

UNIDAD: und

ESPECIFICACION: 10.1.2

MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	DESPER.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PMT (Plan de Manejo de tráfico)		UND	1.00		4.500.000,00	4.500.000,00
PALETAS PARE SIGA 45 cm		und	2.00		38.500,00	77.000,00
DELINEADORES TUBULARES (TIPO COLOMBINA O ESTACAS O		und	6.00		33.320,00	199.920,00
BARRERAS PLASTICAS O SIMILARES O EN MADERA (O		und	2.00		285.600,00	571.200,00
CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" O SIMILAR		ml	2.000,00		153,70	307.400,00
SEÑAL VERTICAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL o similar		und	11.00		190.000,00	2.090.000,00
CONOS DE SEGURIDAD VIAL		UND	13.00		250.000,00	3.250.000,00
				TOTAL MATERIALES		**$ 10.995.520,00**

DERECHOS DE DIRECCION DE TRANSITO

DERECHOS DTB PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ALTO		und	1.00		1.160.000,00	$ 1.160.000,00
DERECHOS DTB SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MANEJO		mes	1.00		75.000,00	$ 75.000,00
				TOTAL DERECHOS		**$ 1.235.000,00**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	P.S.	CANT.	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
ASESOR DE TRANSITO	$ 5.772.561,04	54%	1	0,75	$ 8.889.744,00	$ 6.667.308,00
CONTROLADOR TRAFICO (PALETEROS)	$ 1.160.000,00	54%	2	1,5	$ 1.786.400,00	$ 5.359.200,00
				SUB TOTAL PMT PERSONAL		**$ 12.026.508,00**

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	REND.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
				TOTAL EQUIPOS		**$ 0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 24.257.028,00**
ADMINISTRACIÓN	**31 %**	**$ 7.519.678,68**
UTILIDAD	**5 %**	**$ 1.212.851,00**
TOTAL INCLUIDO AU		**$ 32.989.557,68**
TOTAL INCLUIDO AU CON AJUSTE AL PESO		**$ 32.989.557,68**

Firma

Nombre CARLOS M URIBE B

Representante Legal del Contratista o su Apoderado NIT. 800189202-5

Matricula No. 2570044262 CND 91.258.735

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de items no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No.

CANTIDAD A PAGAR = $\frac{\$\ 32.989.557,68}{\$\ 42.909.080,00} * 0,774$ UND

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO 011-2024

532

Bucaramanga, 29 de Febrero de 2024

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
C.C. 1.098.752.603 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE
ONCE MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($11.823.786,00) MONEDA CORRIENTE**

POR CONCEPTO DE:
Asesoría de tránsito para el contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga, desde Enero 15 hasta febrero 27 de 2024.

Cordialmente.

MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
Ingeniera Civil-Especialista en Transporte y Movilidad inteligente
Matrícula Profesional N°: 68238-3317612 STD
Cédula de Ciudadanía: 1.098.752.603 de Bucaramanga

Powered by CamScanner

533

COMPROBANTE DE PAGO ASESORIA PMT
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
800.189.202-5

Identificación:	1.098.752.803	**Periodo:**	15/01/2024 - 27/02/2024	**Salario Básico:**	$7.882.524
Nombre:	MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ	**Banco:**	NEQUI	**C. Costo:**	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD INTELIGENTE	**Cuenta:**		**Fecha Ingreso:**	ENERO -2024
Dedicación:		**Obra:**	AV. QUEBRADASECA CRA 15 CLL 33-CONTRATO 316-2023		

Código	Descripción	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios Asesoria PMT	1.50	11.823.786.00		11.823.786.00
001500	Prima de Servicios		0.00		0.00
002023	Dscto. Anticipo			0.00	0.00
002205	Salud Empleado			0.00	0.00
002210	Pensión Empleado			0.00	0.00
TOTALES:			11.823.786.00	0.00	11.823.786.00

Firma _____
C.C. 1.098.752.803 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO 007-2024

534

Bucaramanga, 26 de Diciembre de 2023

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
C.C. 1.098.752.603 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00) MONEDA CORRIENTE**

POR CONCEPTO DE:
Elaboración, presentación del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, ante la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, del contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga.

Cordialmente.

MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
Ingeniera Civil-Especialista en Transporte y Movilidad inteligente
Matrícula Profesional N°: 68238-3317612 STD
Cédula de Ciudadanía: 1.098.752.603 de Bucaramanga

AV. 87 No. 24 – 09 CELULAR 3188087109 BUCARAMANGA
miguelangelosoriogomez@hotmail.com

Powered by CamScanner

535

COMPROBANTE DE PAGO DCT PMT

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

800.189.202-5

Identificación:	1.098.752.603	Periodo:	26/12/2023 - 26/12/2023	Salario Básico:	$4.500.000
Nombre:	Ing. MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ	Banco:	NEQUI	C. Costo:	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD INTELIGENTE	Cuenta:		Fecha Ingreso:	DIC -2023
Dedicación:		Obra:	AV. QUEBRADASECA CRA 15 CLL 33-CONTRATO 316-2023		

Código	Descripción	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN GESTIÓN PMT	1.00	4.500.000.00		4.500.000.00
001500	Prima de Servicios		0.00		0.00
002023	Dscto. Anticipo			0.00	0.00
002205	Salud Empleado			0.00	0.00
002210	Pensión Empleado			0.00	0.00
TOTALES:			4.500.000.00	0.00	4.500.000.00

Firma:

C.C. 1.098.752.603 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo:

Powered by CamScanner

536

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 05-2024-UACSAS

CONTRATANTE: **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS**
NIT. 800.189.202-5
CALLE 42 No. 4 – 05 Oficina 101 BOGOTA D.C
Teléfono 60 1-3738049 / 3142639322
obrabga@gmail.com

CONTRATISTA: **MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ**
C.C. 1.098.761.373 de Bucaramanga
Celular 318 8087109
AV 87 # 24 – 09 TORRE 1 APTO 1006
miguelangelosoriogomez@hotmail.com

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.258.735 de Bucaramanga, en su condición de representante legal de **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UACSAS** con Nit. 800.189.202-5, para efectos del presente contrato se denominará el Contratante y **MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.752.603 de Bucaramanga, de profesión Ingeniero Civil con especialización en TRANSPORTE Y MOVILIDAD INTELIGENTE; obrando en su nombre, quien para efecto del presente contrato se denominarán el Contratista, hemos decidido celebrar un contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE,** para desarrollar las funciones de acuerdo a profesión y perfil requerido por la entidad y supervisión; en la ejecución del proyecto todo lo concerniente con la elaboración del PMT, presentación a la entidad competente para su aprobación, así como implementación y seguimiento en obra, con informes mensuales, en el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

PARAGRAFO El Contratista se compromete a contar con la disponibilidad de tiempo del 100% a la firma del presente contrato, entre estos disponibilidad para atender reuniones ya sea de forma remota o presencial, llamadas telefónicas, videoconferencias y demás que surjan y que se requieran con ocasión del desarrollo de sus funciones, entre otros, informes semanales, mensual, capacitaciones, documentos, cronogramas, programaciones, etc., para las que fue contratada, y de acuerdo a lo solicitado por su par y/o supervisor, de la Entidad (Alcaldía), el contratante, entre otros.

SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato es la suma de TRES MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.250.000=) pagaderos mensualmente, con dedicación del 100%:

TERCERA – FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará mensualmente, con la presentación de una cuenta de cobro, planilla al día en el pago de aportes de seg social y la aprobación de los informes correspondientes por el supervisor del contrato.

CUARTA – SERVICIOS ADICIONALES: En el desarrollo del proyecto pueden presentarse actividades adicionales a las contratadas por las cuales tendrán un reconocimiento económico hasta por un valor mensual de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 43/100 ($2.547.659,43) MONEDA CORRIENTE.

QUINTA – PLAZO DE DURACIÓN: La duración de este contrato a partir de la firma del mismo, es por 30 días; y/o de presentarse una prórroga de la obra hasta la fecha de terminación y/o de presentarse suspensión de obra igualmente se suspenderá el contrato y reiniciará de acuerdo al mismo.
Así mismo terminará una vez la supervisión apruebe el informe final.

Powered by CamScanner

SEXTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE se obliga a 1) Realizar el pago convenido de conformidad con lo señalado en la cláusula tercera, asumir la afiliación y pago de seguridad social. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a:
1) Disponer, organizar y elaborar los documentos, actas, correspondencia, formas, capacitaciones, registros fotográficos, informes semanales, y mensual de Obra, estadísticas, cronogramas de obra, dando oportuno cumplimiento al objeto contractual,
2) Presentar presupuestos de requerirse, cotizaciones, y demás documentos que se presentaren en el transcurso del desarrollo de la obra, según se disponga entre las partes; de no ser aprobado alguno o de recibir observaciones, se subsanarán y radicarán nuevamente hasta obtener la certificación o aprobación por parte de la Supervisión y/o Entidad.

PARAGRAFO 3. Asistir a los comités de obra, reuniones de trabajos y demás citas solicitadas por la interventoría y que se requiera acompañamiento de la PROF. AMBIENTAL-HSEQ durante la duración de contrato ya sea de manera remota o presencial, respetando los montos presentados en el presente contrato y solicitados por **EL SUPERVISOR Y EL CONTRATANTE,** razón por la cual se espera que los tiempos de trabajo sean los requeridos para realizar las entregas.

SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será en la Calle 31 # 20-07 en la ciudad de Bucaramanga.

Constancia se firma en Bucaramanga a los quince (15) días del mes de Enero de 2024.

CARLOS M. URIBE B.
C.C. 91.258.735 B/manga
Rep. Legal UACSAS

MIGUEL ANGEL OSORIO GÓMEZ
C.C. 1.098.752.603 de Bucaramanga
ING. ESPEC. TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

537

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-02
FECHA DE PAGO:	2024-02-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28613351
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28613351
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 165.000	$ 167.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 211.200	$ 213.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 383.100	$ 387.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2024

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dlb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-04
FECHA DE PAGO:	2024-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29066066
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29066066
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 165.000	$ 167.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 211.200	$ 214.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 383.100	$ 388.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2024

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

538

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-02
FECHA DE PAGO:	2024-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29363724
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29363724
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 165.000	$ 165.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 211.200	$ 211.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 383.100	$ 384.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2024

Powered by CamScanner

539

CUENTA DE COBRO # 001-2024

Bucaramanga, 29 de Febrero de 2024

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

KIARA MARIA VEGA CALDERON
C.C. 1.098.698.099 DE FLORIDABLANCA

LA SUMA DE
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($3.619.200,00) MONEDA CORRIENTE**

POR CONCEPTO DE:
Servicio de Auxiliar de tránsito (paletera - Plan de Manejo de Tráfico), del contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga desde enero 16 febrero 27 de 2024.

Cordialmente.

Kiara Maria Vega C

KIARA MARIA VEGA CALDERON
CC # 1.098.698.099 de Florida

CLL 54 No. 15 – 68 CELULAR 3227018295 FLORIDABLANCA

Powered by CamScanner

540

COMPROBANTE DE PAGO

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

800.189.202-5

Identificación:	91.270.740	**Periodo:**	15/01/2024 - 27/02/2024	**Salario Básico:**	$2.412.800
Nombre:	JOVANNY EDUARDO VARGAS RUEDA	**Banco:**	NEQUI	**C. Costo:**	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	AUXILIAR DE TRANSITO	**Cuenta:**	NEQUI 3134515798	**Fecha Ingreso:**	ENERO -2024
Dedicación:	100%	**Obra:**	AV. QUEBRADASECA CRA 15 CLL 33-CONTRATO 316-2023		

Código	Descripción	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios AUXILIAR MANEJO TRANSITO-PALETERO	1,50	3.619.200,00		3.619.200,00
001500	Prima de Servicios		0,00		0,00
002023	Dscto. Anticipo			0,00	0,00
002205	Salud Empleado			0,00	0,00
002210	Pensión Empleado			0,00	0,00
	TOTALES:		$ 3.619.200,00	0,00	$3.619.200,00

JOVANNY

Firma VARGAS

C.C. 91.270.740 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo
A.		

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO # 003-2024

541

Bucaramanga, 29 de Febrero de 2024

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S
NIT. 800189202-5

DEBE A:

JOVANNY EDUARDO VARGAS RUEDA
C.C. 91.270.740 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($3.619.200,00) MONEDA CORRIENTE**

POR CONCEPTO DE:
Servicio de Auxiliar de tránsito (paletero - Plan de Manejo de Tráfico), del contrato 316-2023 en el Municipio de Bucaramanga desde enero 16 febrero 27 de 2024.

Cordialmente.

JOVANNY
VARGAS

JOVANNY E. VARGAS RUEDA
CC # 91.270.740 de Bucaramanga

Cra 11 No. 7 – 39 **CELULAR 3227851515 FLORIDABLANCA**

4

Powered by CamScanner

542

COMPROBANTE DE PAGO

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

800.189.202-5

Identificación:	1.098.618.099	**Periodo:**	15/01/2024 - 27/02/2024	**Salario Básico:**	$2.412.800
Nombre:	KIARA MARIA VEGA CALDERON	**Banco:**	NEQUI	**C. Costo:**	CONST - BUCARAMANGA
Cargo:	AUXILIAR DE TRÁNSITO	**Cuenta:**	NEQUI 3227018295	**Fecha Ingreso:**	ENERO -2024
Dedicación:	100%	**Obra:**	AV. QUEBRADASECA CRA 15 CLL 33-CONTRATO 316-2023		

Código	Descripción	Cantidad	Devengo	Deducido	Neto
001050	Servicios AUXILIAR MANEJO TRÁNSITO-PALETERA	1.50	3.619.200.00		3.619.200.00
001500	Prima de Servicios		0.00		0.00
002023	Dscto. Anticipo			0.00	0.00
002205	Salud Empleado			0.00	0.00
002210	Pensión Empleado			0.00	0.00
TOTALES:			3.619.200,00	0.00	3.619.200,00

Firma Kiara Maria Vega C

C.C. 1.098.752.603 de Bucaramanga

Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo.

7

Powered by CamScanner

543

D/T	PROCESO PLANEAMIENTO VIAL	Codigo FT- PLV-026
		Serie 133-3 6-50
	ACTA DE COMITE DE TRAFICO PMT	Version 03
		Pagina 1 de 8

GOBERNAR ES HACER

FECHA DE REUNIÓN	26 de Diciembre de 2023
HORA DE REUNIÓN	2 00 P M
LUGAR DE REUNION	PLANEAMIENTO VIAL - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA (KM4 VIA GIRON)
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No 316 del 15 de noviembre de 2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Contratante) y la Persona Juridica URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS (Contratista de Obra), cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
UBICACIÓN	DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
APROBACIÓN PMT	OFICIO N° 988 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS NIT 800 189 202-5 R/L CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA CC 91 258 735 de Bucaramanga
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	ING EDGAR BAYONA FLOREZ Supervisor del Contrato


ORDEN DEL DIA Y OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

1. Se realiza comité de tráfico, que tuvo como finalidad la ejecución del comité de trafico inicial para el contrato de obra en mención y el inicio de plazo contractual de ejecución para el para el segmento vial de la DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; así las cosas, se procede a realizar la definición de los respectivos esquemas de señalización vial de obra que se deberá implementar en este sector, a continuación, se presenta la siguiente información de la intervención:


DIRECCION O SECTOR DEL CIERRE VIAL	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR	OBSERVACIONES
	INICIO	FIN			
DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33	27-Dic-2023	30-Ene-2024	12 horas DE 7:00 A M A 7:00 P M	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	PROGRAMACION DE INTERVENCIONES SE DEBERA IMPLEMENTAR SEÑALIZACION VIAL DE OBRA DIURNA Y NOCTURNA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL 2015

SECTOR EN DONDE SE ADELANTÁ LAS ACTIVIDADES: "DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33

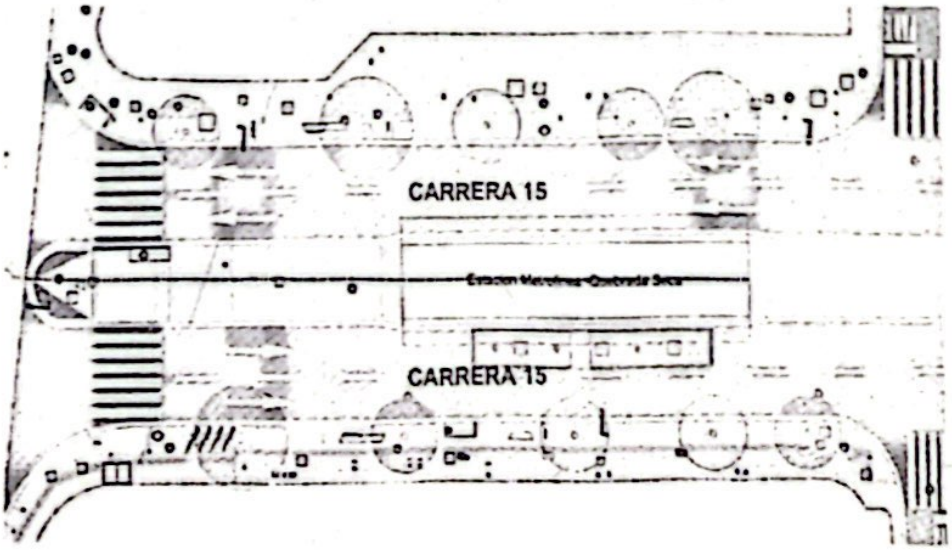


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

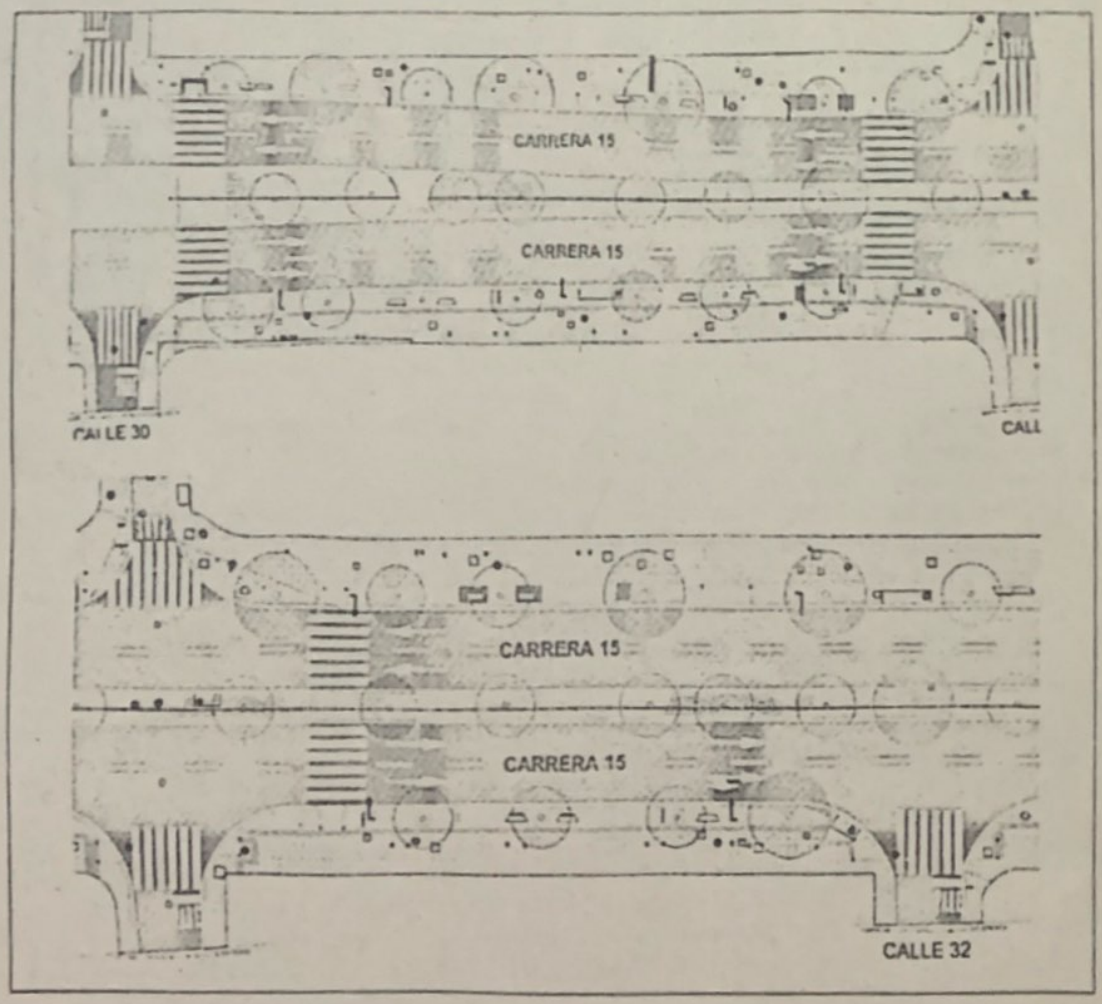

Powered by CamScanner

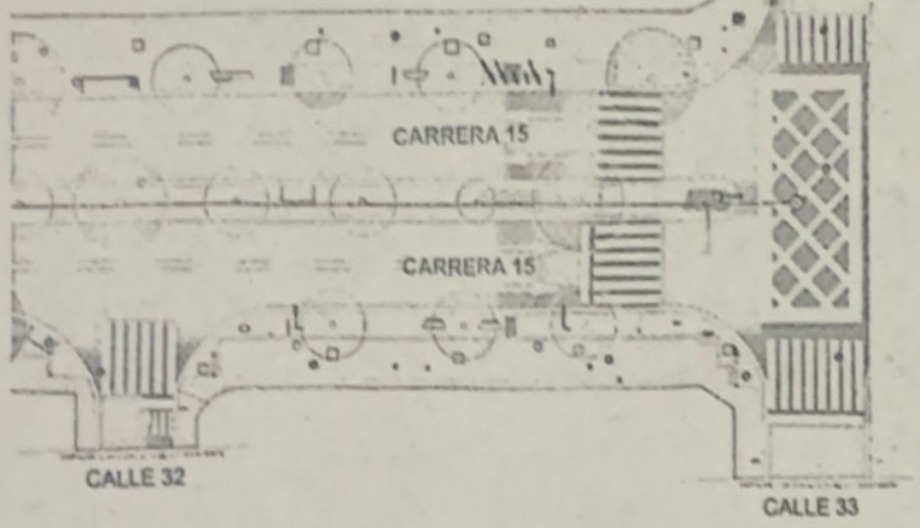

OBSERVACIÓNES:

*Se debe contar con la debida socialización de la intervención: Se anexa informe social adelantado por el Contratista de Obra: **VER ANEXO 3 FOLIOS**.
*Implementar Auxiliares de Transito Certificados cuando se requiera.
*Implementar Señalizacion Vial de Obra Diurna y Nocturna cuando se requiera.
*Delimitación de la Zona de Trabajo mediante delineadores tubulares compuestos.

2. El proyecto requiere el estacionamiento total y temporal de la siguiente maquinaria y/o equipos:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

545.

Código	Descripción	Unidad
EQU 003	Una Pulidora de mano	DIA
EQU 006	Un Taladro	DIA
EQU 008	Un Equipo de topografía	HR
EQU 009	Un Martillo demoledor eléctrico	DIA
EQU 010	Un Compresor portátil diesel media tensión con dos martillos	HR
EQU 011	Una Retro cargadora	HR
EQU 017	Una Mezcladora diésel (1 bulto)	HR
EQU 018	Un Vibrador eléctrico de concreto	DIA
EQU 019	Herramienta menor	(%)mo
EQU 022	Formaleta metálica para concreto	M3
EQU 032	Un Compactador apisonador	DIA
EQU 067	Un Equipo manual para demarcación con pintura	DIA
EQU 069	Una Camioneta D-300	HR

3. El proyecto adelantará actividades sobre el espacio público, en lo referente a la "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

   Las actividades interferirán en las siguientes vías:

   TRAYECTOS

   - Av .Quebrada Seca a la Calle 33

   Cierre Vial Parcial Temporal

   - DIAGONAL 15 ENTRE AV. QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
     Inicio del cierre vial Total : 27 de Diciembre de 2023 a las 7:00 A.M
     Fin del cierre vial Total : 30 de Enero de 2024 hasta las 7:00 P.M
     Horario de trabajo: 12 horas de 7.00 A.M a 7:00 P.M
     Duración de Intervención: 34 dias calendarios de 7:00 A.M a 7:00 P.M

4. El avance de obra a la fecha es del 0 % del costo directo del proyecto y/o plazo de ejecución del contrato.

5. Los cierres se realizará de acuerdo a lo contemplando en el cronograma de actividades presentado por el contratista, se hace la salvedad que los cierres totales temporales donde se afecte las vias arterial primarias o secundaria deben implementar auxiliares de tránsito certificados durante el termino de duración de las intervenciones y contar con la respectiva señalización diurna y nocturna en la zona afectada y su área de influencia directa.

Powered by CamScanner

6. Estas actividades se realizaran a partir del 27 de Diciembre de 2023 a las 7:00 A.M y finalizaría el 30 de Enero del 2024 hasta las 7:00 P.M, estos cierres tienen una vigencia máxima de 34 días calendarios en un horario de trabajo de 7:00 A.M a 7:00 P.M, de conformidad con las horas anteriormente mencionadas, si se llega a requerir adición en tiempo, se deberá presentar nuevamente otra solicitud adicionando el tiempo faltante para culminar con dichas actividades, la Dirección de Transito de Bucaramanga le informa que deberá cumplir con la totalidad de los lineamiento contenidos en la Resolución 1885 de 2015, y deberá realizar el pago con base al Acuerdo 011 del 28 de Diciembre de 2022 de la DTB.

7. **RUTAS DE DESVÍOS APROBADAS PARA PARTICULARES Y/O DE TRANSPORTE MASIVO Y/O COLECTIVO DE PASAJEROS:**

NO APLICA POR QUE SE ADELANTARNA CIERRES VIALES PARCIALES TEMPORALES EN AMBOS COSTADOS Y PASO RESTRINGIDO.

8. **ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENCIÓN: SEGÚN ANEXOS PMT GENERAL APROBADO.**

Se deberá implementar señalización vial noctura, con el fin de hacer visible la señalización en horarios superiores a las 5:30 P.M.

9. La Dirección de Transito de Bucaramanga le solicita al Contratista implementar señalización vial al momento de realizar estas intervenciones, esta señalización deberá seguir lo contemplado en el Manual de Señalización Vial 2015, así mismo debe garantizar la seguridad vial de peatones y usuarios que transitan por el sector en referencia. Estas intervenciones deben contar con reguladores de transito certificados y con experiencia para guiar el tráfico vehicular y peatonal DURANTE LA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, y así evitar accidentes de tránsito por maniobras peligrosas que se llegaren a realizar los usuarios de estas vías y el personal de obra a cargo del contratista.


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

546.

10. Todas intervenciones que se realicen sobre el espacio público deben someterse a la Ley 1503 del 2011, Resolución 1885 del 2015, Resolución N° 105 del 2021, Resolución 470 del 2017 y la Ley 769 del 2002, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos (Peatones y Usuarios).

11. Se anexa recibo de pago N° 5695853 del 12 de Diciembre de 2023, por concepto de SEGUIMIENTO PMT por valor de $ 70.150 pagado por el Contratista de Obra URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS Y NIT: 800.189.202-5.

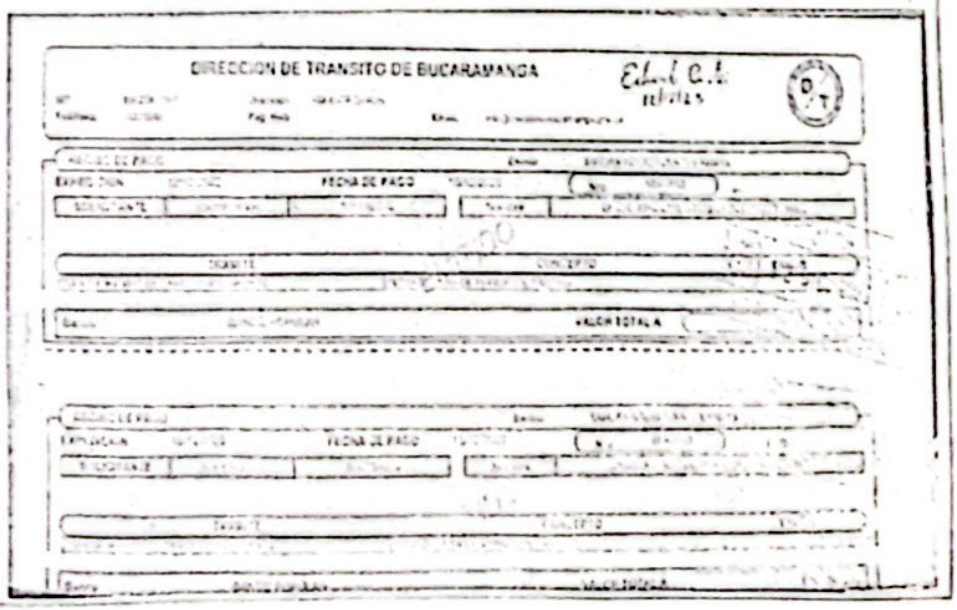
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

FECHA DE PAGO

VALOR TOTAL $

FECHA DE PAGO

Powered by CamScanner

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA	Contratista de Obra URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Representante Legal	3142639322	
2	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ	Contratista de Obra URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Asesor de Tráfico	3188097109	
3	GUILLERMO DIAZ SANDOVAL	Contratista de Obra URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Gerente Proyectos Contratista	3014722679	
4	ANDREA DUQUE	Contratista de Obra URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Profesional Social	3142597516	
5	EDGAR BAYONA FLOREZ	Municipio de Bucaramanga	Supervisor de Obra	3174402934	
6	JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	DTB	Profesional Especializado Planeamiento Vial DTB	3158727506	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FERREFARFAN

TODO PARA LA CONSTRUCCION

FE9566
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 26/02/2024
Medio de pago: Efectivo
Moneda / TRM: COP / $ 0.00

OSORIO PELAYO
NIT: 1095829179-5
CRA. 15 NO. 30-65 CENTRO DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 607-6809110
clarken@hotmail.com

Fecha generacion: 26/02/2024 13:23:19
Fecha expedicion: 26/02/2024 13:23:20

DATOS PARA FACTURACIÓN
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
NIT 800189202-5
CALLE 42 # 4 - 05
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 3142639322
varuaro@gmail.com
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

DATOS PARA ENTREGA
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CALLE 42 # 4 - 05
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 3142639322

CUFE: 3029c34fd25a0556ea07f7d3f9887f0aad13e74c0595b521604e2809849f0433 19d8bf020f3f687c0bc377127ac1a5bc4ccb

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	0001289 CEMENTO CEMEX BULTO	12	94	$27.721,092	19,00%	0%	$ 277.210,92
2	9224 CINTA SENALIZACION PELIGRO NO PASE 500MT X 75MM GENERICA	1	94	$25.126,08	19,00%	0%	$ 25.126,08

Total cantidad : 13
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 302.438,97
IVA	$ 57.461,02
TOTAL FACTURA	$ 359.899,99
AJUSTE	$ 0,01
TOTAL NETO	$ 359.900,00

REGIMEN COMUN IMPOVENTAS NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES RENTA. Actividad 4752 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA Alcaldia de Bucaramanga articulo 1 de la Resolución 3831 del 18 de abril de 2022Tarifa 5.4x1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764030207056 vigencia de 17/08/2022 al 17/08/2024 rango del 2856 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALANDO SAS NIT: 830060521-5 www.alando.com

Rev. 4.04.1

FERREFARFAN

TODO PARA LA CONSTRUCCION

Fecha: 02/03/2024
Medio de pago: Efectivo
Moneda / TRM: COP / $ 0.00

CRA. 15 NO. 30-65 CENTRO DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 607-6809110
clarken@hotmail.com

Fecha generacion: 02/03/2024 07:51:43
Fecha expedicion: 02/03/2024 07:51:44

DATOS PARA FACTURACIÓN
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
NIT 800189202-5
CALLE 42 # 4 - 05
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 3142639322
varuaro@gmail.com
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

DATOS PARA ENTREGA
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CALLE 42 # 4 - 05
BUCARAMANGA (SAN) Colombia
TEL. 3142639322

CUFE: 3cd0803723178a06cd4f46b8d5d2ccc4d7a6e3643e6f444e03027064607934aad9d6b1c7712bf7eb79dfd0f9fdbb8b8e

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	0001289 CEMENTO CEMEX BULTO	12	94	$27.721,092	19,00%	0%	$ 332.773,11
2	9224 CINTA SENALIZACION PELIGRO NO PASE 500MT X 75MM GENERICA	1	94	$25.126,08	19,00%	0%	$ 25.126,08

Total cantidad : 13
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

SUBTOTAL	$ 357.899,19
IVA	$ 68.000,81
TOTAL NETO	$ 425.900,00

REGIMEN COMUN IMPOVENTAS NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES RENTA. Actividad 4752 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA Alcaldia de Bucaramanga articulo 1 de la Resolución 3831 del 18 de abril de 2022Tarifa 5.4x1000

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764030207056 vigencia de 17/08/2022 al 17/08/2024 rango del 2856 al 20000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico: ALANDO SAS NIT: 830060521-5 www.alando.com

Pag. 1 de 1

Powered by CamScanner

CALYPSO

Factura Electronica de Venta

DATOS DEL DOCUMENTO

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL ADQUIRENTE

CODIGO	DESCRIPCION				
CANT	PVP	%DTO	IVA	VALOR	
TOTALES:			16	126,141	

VENTA	:	14,192.00
TOTAL	:	126,140.88
TOTAL A PAGAR	:	126,140.88
RECIBIDO	:	

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP

CALYPSO

Factura Electronica de Venta

DATOS DEL DOCUMENTO

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL ADQUIRENTE

CODIGO	DESCRIPCION				
CANT	PVP	%DTO	IVA	VALOR	
TOTALES:			1	24,850	

VENTA	:	21,000.00
DESCUENTOS	:	49.00
TOTAL	:	24,850.00
TOTAL SIN IMPUESTOS	:	17,442.52
IMPUESTOS	:	4,907.48
TOTAL A PAGAR	:	24,850.00
RECIBIDO	:	
TU CAMBIO	:	24,850.00
TOTAL RECIBIDO	:	24,850.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **


TIPOIMP	BASE IMP	IMP
IVA 19%	20,992.00	3,988.48

Powered by CamScanner

549

Powered by CamScanner



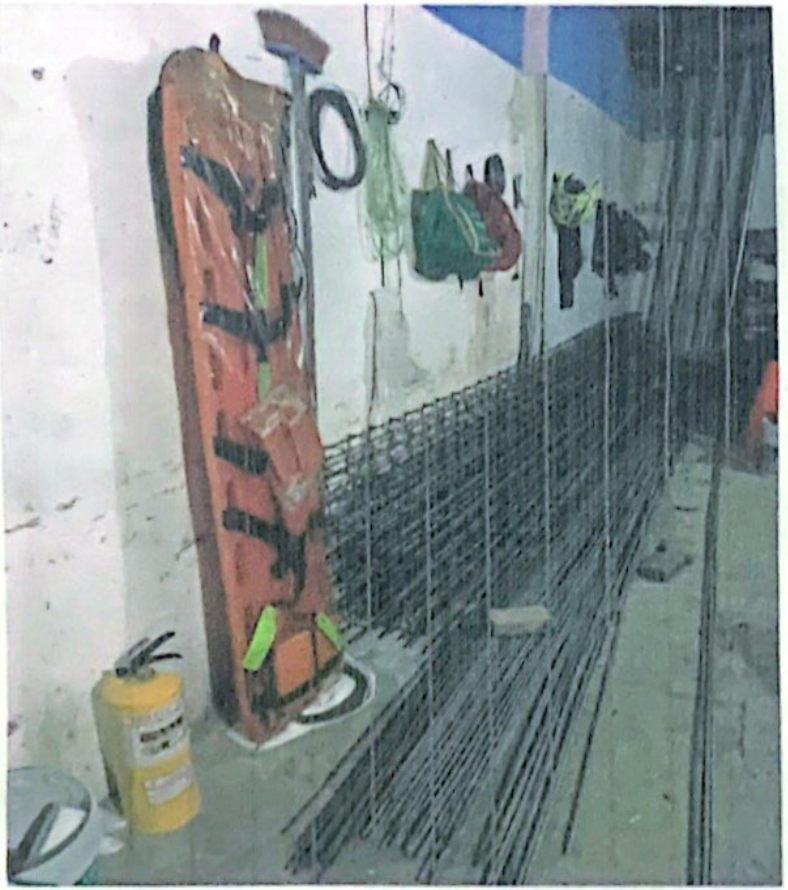

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

552

Powered by CamScanner

553


Powered by CamScanner

554





Powered by CamScanner

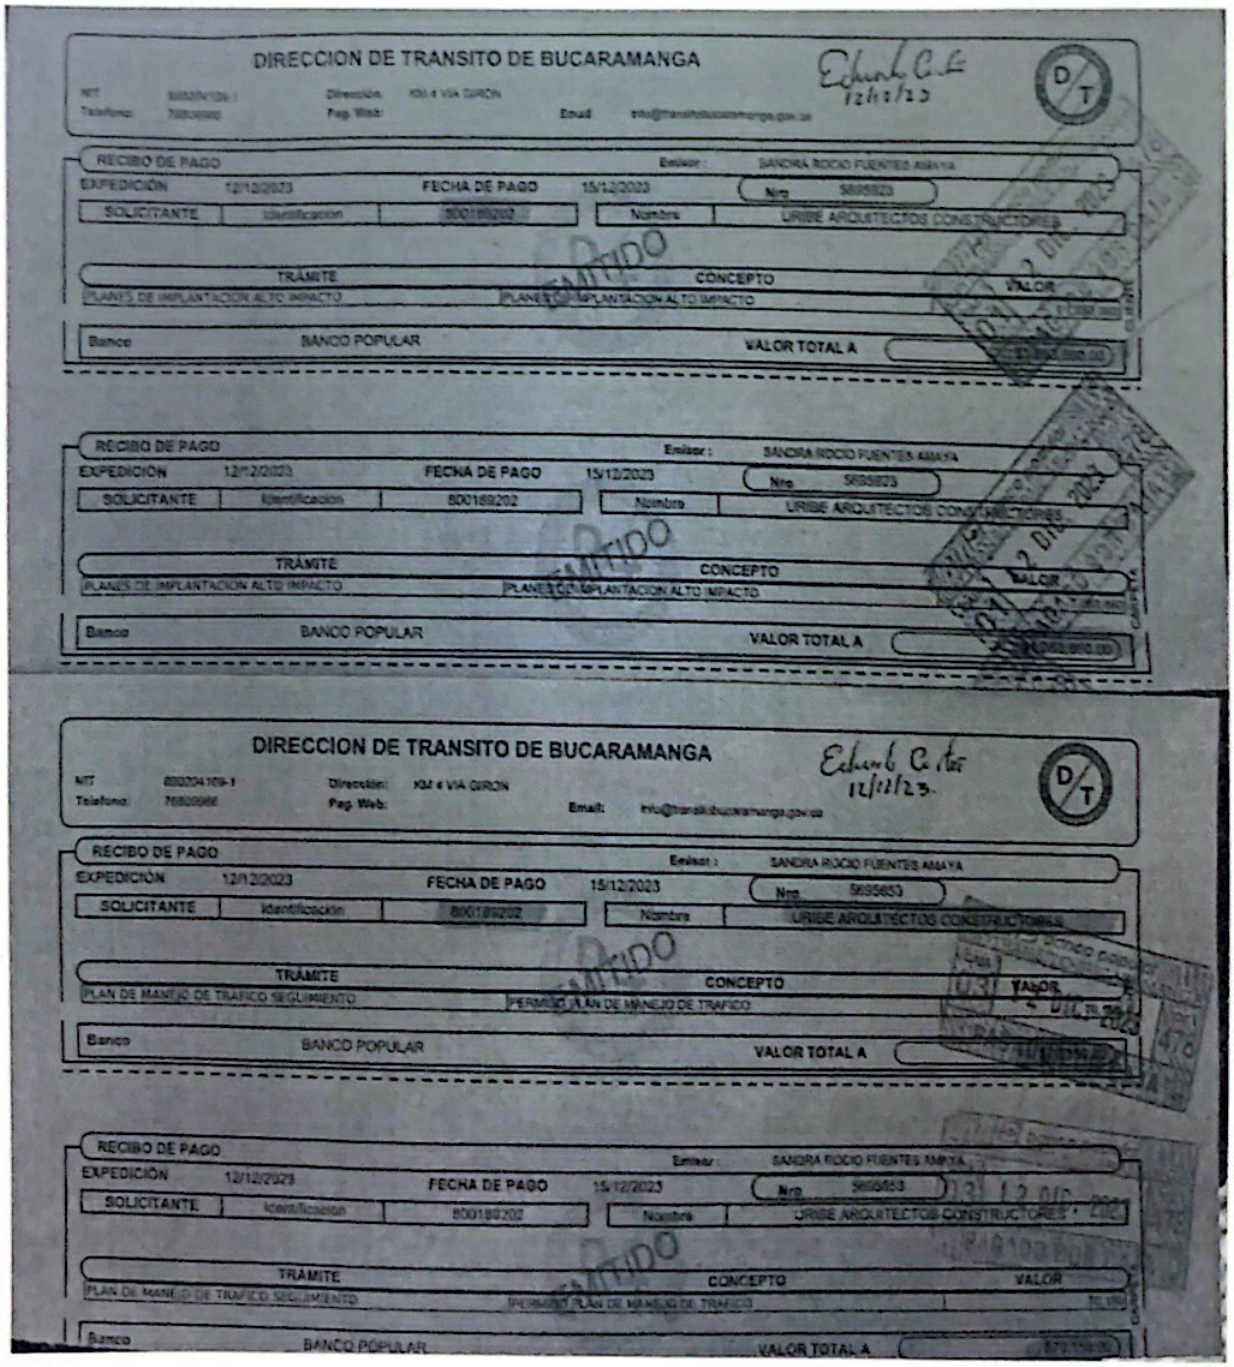

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1 Dirección: KM 4 VIA GIRON
Teléfono: 6809999 Pag. Web: Email: info@transitobucaramanga.gov.co

Eduardo C. L. 12/12/23

RECIBO DE PAGO Emisor: SANDRA ROCIO FUENTES AMAYA

EXPEDICIÓN 12/12/2023 FECHA DE PAGO 15/12/2023 Nro 5695823

SOLICITANTE Identificación 800188202 Nombre URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLANES DE IMPLANTACION ALTO IMPACTO	PLANES DE IMPLANTACION ALTO IMPACTO	

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A

EMITIDO

RECIBO DE PAGO Emisor: SANDRA ROCIO FUENTES AMAYA

EXPEDICIÓN 12/12/2023 FECHA DE PAGO 15/12/2023 Nro 5695823

SOLICITANTE Identificación 800188202 Nombre URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLANES DE IMPLANTACION ALTO IMPACTO	PLANES DE IMPLANTACION ALTO IMPACTO	

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1 Dirección: KM 4 VIA GIRON
Teléfono: 6809999 Pag. Web: Email: info@transitobucaramanga.gov.co

Eduardo C. L. 12/12/23.

RECIBO DE PAGO Emisor: SANDRA ROCIO FUENTES AMAYA

EXPEDICIÓN 12/12/2023 FECHA DE PAGO 15/12/2023 Nro 5695823

SOLICITANTE Identificación 800188202 Nombre URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEGUIMIENTO	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A

EMITIDO

RECIBO DE PAGO Emisor: SANDRA ROCIO FUENTES AMAYA

EXPEDICIÓN 12/12/2023 FECHA DE PAGO 15/12/2023 Nro 5695823

SOLICITANTE Identificación 800188202 Nombre URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEGUIMIENTO	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A

Powered by CamScanner

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1 Dirección: KM 4 VIA GIRON
Telefono: 7650666 Pag. Web: Email:

RECIBO DE PAGO

Emisor: IVONNE ISLENDY FLOREZ CACERES

EXPEDICIÓN 22/02/2024 FECHA DE PAGO 27/02/2024 Nro 5801284

SOLICITANTE	Identificación	800189202	Nombre	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEGUIMIENTO	PRIMER PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	72.000

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A $72.000,00

EMITIDO

CLIENTE

RECIBO DE PAGO

Emisor: IVONNE ISLENDY FLOREZ CACERES

EXPEDICIÓN 22/02/2024 FECHA DE PAGO 27/02/2024 Nro 5801284

SOLICITANTE	Identificación	800189202	Nombre	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEGUIMIENTO	PRIMER PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	72.000

Banco BANCO POPULAR VALOR TOTAL A $72.000,00

EMITIDO

CLIENTE

Powered by CamScanner

UAC SAS	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 316 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	Página 1 de 1

Bucaramanga, 15 de Febrero de 2024

Señores

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
Km 4 Vía Girón, Quinto Piso, Planeamiento Vial
Correo: semaforos@transitobucaramanga.gov.co
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE COMITÉ DE TRAFICO PARA EL SEGUIMIENTO NUMERO 2 DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) DEL CONTRATO N° 316 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Por medio de la presente hago entrega formal de la documentación requerida para adelantar la solicitud de comité de tráfico del seguimiento número 2 para el PMT Del Proyecto adscrito al Contrato N° 316 - 2023 suscrito entre MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Contratante) y URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS (Contratista), cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

SOLICITANTE	TELEFONO
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS R/L CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA C C 91 258 735 Dirección: Calle 42 4 05 OF 101 Tel: 3142639322 Correo: uacsas@gmail.com	3142639322

Estaré atento a cualquier inquietud u observación

Cordialmente

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
C C 91 258 735
R/L URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

Powered by CamScanner

"INFORME N° 1 DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO-PMT IMPLEMENTADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N° 316 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, Y CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Plan de Manejo de Trafico - PMT

CONTRATISTA:

URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
NIT. 800.189.202-5

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT. 890.201.222 - 0

SUPERVISOR:

EDGAR BAYONA FLORES

PERIODO: 16 DE ENERO DE 2024 – 15 DE FEBRERO DE 2024

Powered by CamScanner

558

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-04
FECHA DE PAGO:	2024-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29066066
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29066066
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25095	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 165.000	$ 167.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 211.200	$ 214.100
1423	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 383.100	$ 388.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2024

Powered by CamScanner

GOBERNAR ES HACER

559

Bucaramanga, Diciembre 13 de 2023

Señores
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
NIT: 800.189.202-5
Persona Jurídica
R/L CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
CC. 91.258.735 de Bucaramanga
Dirección: Calle 42 # 4 - 05 OF 101 Bogotá D.C.
Correo electrónico: uacsas@gmail.com - obrabga@gmail.com
Celular: 3142639322
Ciudad

Asunto: RESPUESTA A RADICADO DTB 10449 del 05 de Diciembre de 2023: SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PMT PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 316 del 15 de noviembre de 2023, suscrito entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Contratante) y la Persona Jurídica URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS (Contratista de Obra), cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".** Rad. GPV: 1094 - 2023.

De manera muy atenta nos permitimos informarle que el Grupo de Planeamiento Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga revisó el PMT presentado para atender la contingencia vial temporal que generará la ejecución de las obras civiles del proyecto referenciado en el asunto, y practicó visitas técnicas a ese sector de la ciudad y su zona de influencia.

En virtud de lo anterior le presentamos las siguientes consideraciones:

- **Aprobación:** El PMT presentado se ajusta a las necesidades de movilidad vial del sector y su zona de influencia, razón por la cual es APROBADO.

- **Categorización del PMT y Pago de Derechos de Evaluación y Seguimiento:** La siguiente es la categorización del PMT según el impacto que generará en la movilidad vial del sector y su zona de influencia y el pago respectivo de los derechos derivados de dicho trámite:

    - **Categoría del PMT:** Alto Impacto
    - **Derechos a Pagar:** Treinta (30) SMLDV
    - Acuerdo 011 del 28.12.2022, Artículo Primero:

        - **Parágrafo Primero:** Cumplido el tiempo autorizado del Plan de Manejo de Transito PMT que en ningún caso será mayor a Seis (6) meses, se cobrará un adicional de Dos (2) SMLDV por mes o fracción hasta su terminación.

Powered by CamScanner

- **Parágrafo Segundo:** Una vez cumplido el plazo, en caso de suspensión o interrupción del mismo, deberán actualizar la documentación presentada inicialmente a fin de que sea avalada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

- **Cronograma**

  - **Fecha de Inicio de PMT (sin Prórroga):** Diciembre 13 de 2023
  - **Fecha de Terminación de PMT (sin Prórroga):** Febrero 28 de 2024
  - **Duración Estimada de las Obras (sin Prórroga):** Un (01) mes y Quince (15) días.
  - **Duración de Aprobación inicial del PMT (sin Prórroga):** Un (01) mes y Quince (15) días.
  - **Horario de Trabajo:**
    Lunes a Viernes desde 07:00 A.M. hasta 17:00 P.M.
    Sábados desde 08:00 A.M. hasta 12:00 M.D.
    (Ley 1801 del 29.07.2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", artículo 135 sobre Comportamientos Contrarios a la Integridad Urbanística, modificado por el Decreto Nacional 555 del 30.03.2017, Artículo 10, Literal D, Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones).

  Observación: La vigencia y aprobación del PMT inicia desde la publicación de la presente resolución, independientemente de la fecha de inicio de la obra.

- **PAC:** Se debe establecer el Punto de Atención a la Comunidad, con el fin de atender las inquietudes, quejas y reclamos de la ciudadanía en general.

  Según información recibida, el PAC estará habilitado en el sitio de obra, y estará a cargo del Señor CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA, identificado con C.C. 91.258.735 de Bucaramanga, en su calidad de **Supervisor de Implementación y Seguimiento del Plan de Manejo de Trafico en Obra**, el número de contacto es: **3142639322** y correo electrónico: obrabga@gmail.com, el cual estará disponible para atender las PQRS de la Ciudadanía en General respecto a la ejecución del proyecto.

- **Comité de Tráfico:** Se debe crear el Comité de Tráfico en el cual deben tener participación por lo menos Un (01) representante de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga; Un (01) representante del nivel directivo del Contratista, Unión Temporal, Consorcio o Empresa Constructora; Un (01) representante de la Interventoría y el Responsable de la Implementación del PMT a cargo del Contratista; quienes deberán reunirse semanal, quincenal o mensualmente dependiendo del tiempo estimado de ejecución del proyecto, previa programación por parte del Contratista en Coordinación con la DTB, y dejarán como evidencia un Acta de Comité de Tráfico en la que quede constancia de la correcta implementación del PMT y sus probables modificaciones o ajustes, del seguimiento

Powered by CamScanner

técnico y monitoreo al desarrollo de las obras, del cumplimiento del cronograma de actividades, del estado de la señalización vial y de obra, de la ubicación de bandereros[1] u orientadores de tráfico, y de los eventos, incidentes o accidentes ocurridos durante el periodo evaluado, con las respectivas medidas que se deban aplicar para minimizar el impacto de las obras en la movilidad vial del sector intervenido y su zona de influencia.

- **Socialización:** Se debe socializar con las comunidades y usuarios del sector intervenido y su zona de influencia, a través de medios masivos de comunicación tales como radio, prensa escrita, televisión, redes sociales, comunicados, circulares, hojas volantes, etc., sobre el impacto que generarán las obras en la movilidad vial y en el medio ambiente, tiempo estimado de la afectación generada por la ejecución de las obras y alternativas de desplazamiento.

- **Modificaciones:** Las modificaciones sucesivas que hagan parte de esta contingencia vial no requerirán acto administrativo adicional y formarán parte de la Resolución mediante la cual se apruebe el PMT.

- **Manejo Vehicular:** Si las circunstancias viales imprevistas y/o las condiciones climáticas no son favorables, se podrán hacer modificaciones viales temporales complementarias en el área intervenida y su zona de influencia, previa aprobación de la DTB en el Comité de Tráfico.

- **Manejo Peatonal:** Garantizar zonas, espacios o senderos peatonales continuos, bien delimitados, señalizados, sin obstáculos y separados físicamente de las zonas de circulación vehicular. Para las travesías que generen algún tipo de riesgo en las vías, se debe prever la ubicación de bandereros (paleteros u orientadores de tráfico) que faciliten los desplazamientos de los transeúntes, de manera ordenada, cómoda y segura.

- **Orientación y/o Regulación del Tránsito Vehicular:** Por la ubicación del proyecto, se debe garantizar la regulación del tránsito mediante bandereros (paleteros u orientadores de tráfico) durante el tiempo que dure la afectación vial diurna y/o nocturna, con el fin de facilitar los ingresos y las salidas a los usuarios de las vías del sector intervenido y su zona de influencia.

- **Tránsito de Vehículos de Carga Pesada:** Para el tránsito de vehículos de carga pesada y/o transporte de equipos, elementos, materiales, insumos, escombros, etc., e ingreso o salida de grúas necesarias para la ejecución, desarrollo y logística de las obras, se deben tramitar los permisos necesarios ante la DTB con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón.

[1] Regulador de Trafico debidamente certificado por un ente de educación vial debidamente autorizado por Ministerio de Transporte.

Powered by CamScanner

- **Maniobras de Cargue y/o Descargue, Montaje y/o Retiro de Máquinas, Equipos y Grúas:** Para los cierres viales transitorios parciales o totales que se requieran para efectuar maniobras de cargue y descargue de vehículos de carga pesada, montaje o desmonte de grúas, aparatos o equipos gran tamaño, capacidad o envergadura necesarios para la ejecución, desarrollo y logística de las obras, se deben tramitar previamente los permisos necesarios con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la fecha programada para las labores, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y de tránsito vigentes y cancelar los derechos a que haya lugar en la Sede Administrativa de la Entidad, Km. 4 vía Girón.

- **Rutas o Alternativas de Desplazamiento para la evacuación de escombros:**

  - **Origen:** Sitios de las Obras - Área urbana del Municipio de Bucaramanga, Santander - DIAGONAL 15 ENTRE LA AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33

  - **Destino:** Botadero de Tierra el Parque S.A

    Ingreso: Se definirán en los Comités de Seguimiento a la Implementación del PMT. Ver Notas 1 y 2.
    Salida: Se definirán en los Comités de Seguimiento a la Implementación del PMT. Ver Notas 1 y 2.

Debido a la naturaleza del proyecto y a la cantidad de sectores a intervenir, no se definen rutas para el transporte de escombros. Para su disposición final se utilizará la Escombrera el Parque.

Para efectuar el desplazamiento, disposición y manejo de escombros, materiales y/o residuos de las actividades se indica que durante la ejecución de los Comités de Tráfico se trazaran las rutas específicas desde cada punto de acopio hasta el sitio de destino final (Escombrera El PARQUE S.A. inicialmente) cumpliendo lo dispuesto en la Resolución 080 del 2021 expedida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Nota 1: Será responsabilidad del Supervisor de Implementación del PMT del Contratista realizar la descripción de las rutas que, conforme con la ubicación especifica de los frentes de obra, se deberán adoptar para el traslado de materiales y disposición final.

Nota 2: El contratista deberá adelantar comités de tráfico periódicamente, mensual, quincenal o semanal, en donde se presente los esquemas de señalización específicos, socialización con la comunidad, ubicación exacta de los reguladores de tránsito certificados, ruta de escombro especifica de acuerdo con el sitio a intervenir y demás componentes necesarios para llevar a cabo los cierres viales parciales y/o totales requerido por el proyecto.

Powered by CamScanner

Nota 3: Para las zonas de cargue, descargue de materiales y retiro de escombros, el contratista dispondrá espacios suficientes dentro de la zona donde se realiza la actividad cumpliendo con las medidas de seguridad industrial y normatividad ambiental para este tipo de actividades asegurando que no se genere ninguna clase de impacto en el flujo vehicular ni peatonal en la zona de influencia directa donde se llevaran a cabo las actividades, igualmente, con el objeto de mitigar alguna posibilidad de conflicto con el peatón y demás usuarios de las vías al sitio donde estarán las actividades el contratista mantendrá ubicado en el cerramiento de la zona un paletero debidamente capacitado para garantizar el paso seguro de los peatones.

Nota 4. El Material de cobertura de las volquetas, debe ser resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeto en todos sus costados a las paredes exteriores del contenedor o tolva, cubriéndolos y sobrepasando por lo menos treinta centímetros (30 cm) a partir de los bordes de estos. En caso de derrame o perdida de material en espacio público, este debe ser recogido inmediatamente por el transportador, sin perjuicio a las multas o sanciones a las que haya lugar.

- **Protección y/o Conservación de Vías:** El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a las vías (calzadas, andenes, separadores) utilizadas como alternativas de movilización durante la ejecución de los trabajos, lo mismo que a las zonas verdes o espacio público en general.

- **Protección de Personas y Edificaciones:** El responsable de las obras, de manera directa o a través de sus contratistas deberá responder por los daños físicos o estructurales que se causen a los predios o edificaciones, redes de servicios públicos, bienes, integridad y vida de las personas, durante la ejecución de los trabajos.

- **Protección y/o Conservación del Sistema Semafórico de la Ciudad:** El responsable del proyecto de manera directa o a través de sus Contratistas deberá incluir en él la afectación que se causará a las redes de semaforización ubicadas en el sector que se va a intervenir (si la hubiere) y/o en los diferentes tramos viales que se van a utilizar como alternativas de desvío, y asumirá las obras, costos y demás que se deriven del desmantelamiento y montaje, reubicación de equipos y elementos, postes, semáforos, ductería, cableado de control e interconexión, cajas de paso y/o inspección, tapas, etc., así como los daños, reparaciones y adecuaciones que se generen en la ejecución de los trabajos propios de las obras y sus actividades complementarias, con el fin de garantizar la continuidad y el funcionamiento normal del sistema semafórico en esas zonas de la ciudad.

- **Control Vial y Supervisión del PMT:** La DTB ejercerá seguimiento, control vial y supervisión a la implementación del PMT y efectuará monitoreo al tránsito vehicular y peatonal con el fin de determinar las medidas que se deban aplicar para minimizar

Powered by CamScanner

el impacto de la ejecución del proyecto en la movilidad peatonal y vehicular en el sector intervenido.

- **Informe Final:** Durante el tiempo de ejecución de las obras se presentarán variedad de hechos y eventos que afectarán la movilidad, el comportamiento del tránsito y la seguridad vial, situación para la cual no es fácil establecer una secuencia rígida y única para implementar dispositivos de tránsito (señales). Por esa razón es muy importante presentar un informe final de implementación del PMT aprobado, que incluya las evidencias que se consideren pertinentes, con el fin de que reposen en los archivos de la DTB.

RECOMENDACIONES:

- **Normatividad:** Dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo Rutas de Colombia (Resolución 0001885 del 17 de Junio de 2015) Ministerio del Transporte; y la Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente.

- **Prevención y Seguridad Vial:** Recordar que la seguridad de los usuarios (conductores y peatones) en áreas de control temporal del tránsito por afectación de obras civiles, debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto.

- **Señalización:** Al finalizar los trabajos, retirar la señalización temporal y reponer la que haya resultado afectada por las obras o en las vías usadas como desvíos o tránsito de vehículos de carga pesada al servicio del proyecto y sus actividades conexas.

- **Artículo 367 POT: Operación de equipos y herramientas de construcción, demolición y reparación de vías.** Cuando en desarrollo de obras viales, urbanísticas o de edificaciones las emisiones sonoras sobrepasen los niveles permitidos por la autoridad ambiental, dichas actividades podrán realizarse únicamente entre las 7:00 AM y las 7:00 PM de lunes a sábado.

- **Artículo 368 POT: Actas de vecindad.** Previo al inicio de las obras o actividades de demolición el urbanizador y/o constructor responsable de la obra debe realizar actas de vecindad con los propietarios y/o habitantes de los predios colindantes con los correspondientes registros fotográficos, para certificar el estado en que se encuentran las construcciones vecinas y así facilitar que el constructor tome las medidas preventivas necesarias para garantizar la estabilidad de dichas construcciones y/o la determinación de responsabilidades en el evento de ocurrencia de accidentes o daños a la propiedad. Si en el momento de realizar las actas de vecindad el constructor tiene motivos para creer que alguna de las estructuras de los predios adyacentes se encuentra en condiciones deficientes o inestables, previo al inicio de las obras debe informar a la entidad competente.

Powered by CamScanner

- **Artículo 372 POT. Señalización temporal de vías.** En el caso de actividades de obra que afecten la normal circulación sobre las vías adyacentes, se deben implementar dispositivos para la regulación del tránsito, ubicados con un (1) día de anticipación al inicio de dichas actividades, permanecer durante la ejecución de las obras y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación.

    - Todas las señales, cintas, y barricadas que se utilicen, deben ser reflectivas e iluminarse en horas nocturnas. *Los delineadores tubulares (conos y colombinas) que se ubiquen sobre espacio público y vías deben ser plásticos. La señalización se instalará cumpliendo con lo establecido en las normas que regulan la materia y de forma tal que los conductores y/o peatones tengan suficiente tiempo para captar el mensaje y reaccionar consecuentemente*.

- **Artículo 374 POT. Acopio de materiales.** Está prohibido realizar acopio de materiales de construcción, tierra, escombros, herramientas y maquinaria hacia el exterior del cerramiento sobre la vía pública. Tanto el descargue como el cargue de materiales debe hacerse directamente del vehículo hacia el interior de la obra y viceversa, sin ser depositado en espacio público. En casos excepcionales se permite la descarga momentánea de materiales sobre espacio público para su inmediato traslado al interior de la obra, sin que se obstruya el libre tránsito peatonal; en ningún caso estos materiales pueden permanecer más de cuatro (4) horas en el espacio público.

  Parágrafo 1°. Se debe realizar la limpieza del espacio público tantas veces como sea necesario para garantizar el libre y seguro tránsito de vehículos y peatones frente a las obras. Cuando se compruebe el incumplimiento de esta norma se ordenará su inmediato retiro sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas correspondientes.

  Parágrafo 2°. El titular de la licencia, así como el urbanizador y/o constructor serán responsables de la reposición de los elementos y/o mobiliario ubicado en el espacio público que haya n sido afectados por la realización de las obras

- **Artículo 115. Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito.**

  Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.

- Los vehículos con capacidad de carga superior a 4.5 Toneladas deberán acogerse a la Resolución N° 080 del 2021 expedida por la DTB.

- Los trabajos que deben realizar sobre vías arteriales o principales, se ejecutar en horarios diurnos contrarios a las horas pico de máxima demanda.

Powered by CamScanner

De conformidad con lo establecido en la Resolución No 608 de 2022 "Por medio de la cual se fijan las tarifas de las Tasas, Derechos y servicios prestados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la vigencia 2023", el Grupo de Planeamiento Vial indica que se anexa comprobante de recibo de pago PMT de Categoría Alto Impacto No. 5695923 por valor de $1.053.860 cancelado el día 12 de Diciembre de 2023 por el Contratista de Obra **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS y NIT 800.189.202-5.**

Finalmente, El Grupo de Planeamiento Vial de la DTB informa y solicita al Contratista de Obra **(URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS y NIT: 800.189.202-5)** y la SUPERVISIÓN del **Contrato de Obra No. 316 del 15 de noviembre de 2023, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", ubicado sobre el área urbana del Municipio de Bucaramanga, Santander.** que previamente al inicio de las actividades se debe solicitar la ejecución de un Primer Comité de Tráfico donde se requiere verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Programación de Intervención mensual
- Planos y/o Típicos de Señalización Vial a implementar
- Inventario de dispositivos de señalización vial requeridos para las intervenciones
- Registro Fotográfico de la disponibilidad de los elementos y dispositivos de señalización vial requeridos conforme con los típicos a implementar.
- Rutas de desvío, en caso de ser requeridas.
- Rutas para traslado de escombros y/o materiales
- Verificación de Permisos de Cargue y Descargue para vehículos
- Otros aspectos misceláneos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ
Profesional Especializado Grado 02

Copia. Subdirección Técnica DTB: subtecnico@transitobucaramanga.gov.co
Grupo Control Vial DTB: controlvial@transitobucaramanga.gov.co
Archivo Planeamiento Vial

Proyectó: Jorge Alberto Pérez Jiménez – Profesional Especializado Grado 02 - Planeamiento Vial DTB

Powered by CamScanner

563

EUROGRES SAS
NIT 830.102.026-
Calle 42 No. 4-05
Tel: (061) 3738049 - Ext. 11
Bogotá - Colombia
eurogres@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 220

Fecha y Hora Factura
Generación: 09/03/2024, 09:00
Expedición: 19/03/2024, 09:00

RES.DIAN No. Número Autorización 18764062762896
aprobado en 20231227 prefijo desde el número 218 al 300
Vigencia: 12 Meses

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	800.189.202-5	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	Calle 42 No. 4-05 Of 101	(061) 3738049 - Ext. 11
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
uacsas@gmail.com	Eurogres .	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Barricada reflectiva	und	6.00	350,000.00	2,499,000.00
2	PALETAS DE PARE / SIGA	und	5.00	32,353.00	192,500.35
3	DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA	und	60.00	28,000.00	1,999,200.00
4	BARRERA PLÁSTICA	und	4.00	240,000.00	1,142,400.00
5	Rollo x 500 mts	mts	4.00	64,579.83	307,399.99
6	SEÑAL VERTICAL (PRIMER-SEGUNDO NIVEL)	und	4.00	159,663.00	759,995.88
7	CONO SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL	und	19.00	210,084.00	4,749,999.24

Total ítems: 7

Total Bruto	9,790,332.32
IVA 19%	1,860,163.14
Total a Pagar	**11,650,495.46**

OBSERVACIONES:
EUROGRES SAS, NIT. 830.102.026-0, RÉGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD CIU 7110,4210., ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 772 AL 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ESTA FACTURA PRESENTA MÉRITOS EJECUTIVOS, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

PAGOS, TRANSFERENCIAS EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 946-000004-96

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11.650.495.46

VENDEDOR

C.C. Ó NIT: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT: _____

CUFE: f8fce4c2b6747202b5decac09d47b9da92c1161abbe0573d258b83494deb0db22e685a32e129dc58efcf54399c306d3b

Powered by CamScanner

564.

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

CAPITULO	SUBCAPITULO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION				DIMENSIONES			TOTAL
									ANCHO	LARGO	ALTURA	




Powered by CamScanner

565

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES									Código: E-GDI-5000-238-17-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página:	
FECHA	19/02/2024			ELABORO:			Carlos Jilbe				
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33										
CAPITULO	NP	Items no previstos	ITEM	NP-06	Conexión desagüe sumidero nuevo con sumidero antiguo en tubería PVC 315mm (12")			UNID.	MI	UBIC.	URBANISMO





CONEXION SUMIDEROS VADO 1

DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES DIAMETRO			TOTAL
Conexión desagüe sumidero nuevo con sumidero antiguo en tubería PVC 315 mm (12")	1,00	3,00	12"	3,00		3,00
					Subtotal	3,00
					Cantidad	
					TOTAL	3,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

3


Powered by CamScanner

566

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	18/02/2024	ELABORO:	
OBJETO	PP CARRERA 33 FASE 1 ENTRE AVENIDA QUEBRADANEGRA Y CALLE 55		

CAPITULO	NP	Items no previstos	ITEM	NP-07	Suministro lateral tipo SL-200 en concreto premezclado en 400 PSI reforzado según diseño EMPAS incluye acero y tapa				UNIDA.	UN	UNIV.	UNIDAD/GRUPO

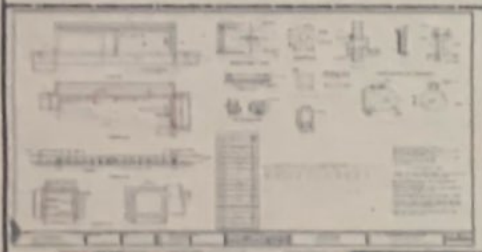





DESCRIPCION			DIMENSIONES			TOTAL
	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTURA	INTERVENCIA	
Suministro lateral tipo SL-200 en concreto premezclado en 400 PSI reforzado según diseño EMPAS incluye acero y tapa	1,00	2,93	1,30	MEDIA#1		1,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

9

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Codigo: F-GDI-5000-218.87-068
Version: 1.0
Fecha aprobacion:
Pagina:

FECHA	[illegible]	**ELABORO:**	Carlos Uribe
OBJETO	PP CARRERA 15 FASE-1 ENTRE AVENIDA QUEBRADASECA Y CALLE 33		

CAPITULO	Nº		ITEM	UP-OE					UNID.	UN	UBIC.	URBANIZAD
		[illegible]			Reconstruccion placa tapadera sumidero sc1-200 en concreto reforzado en 4000PSI							



DESCRIPCION	CANT.	LARGO	DIMENSIONES ANCHO	ALTURA			TOTAL
Reconstruccion placa tapadera sumidero SC1-200 en concreto reforzado en 4000PSI	1,00	2,50	1,80	0,10			1,00
						Subtotal	1,00
						Cantidad	
						TOTAL	1,00

FIRMA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

Powered by CamScanner

ANEXO 2

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL


Powered by CamScanner

568

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

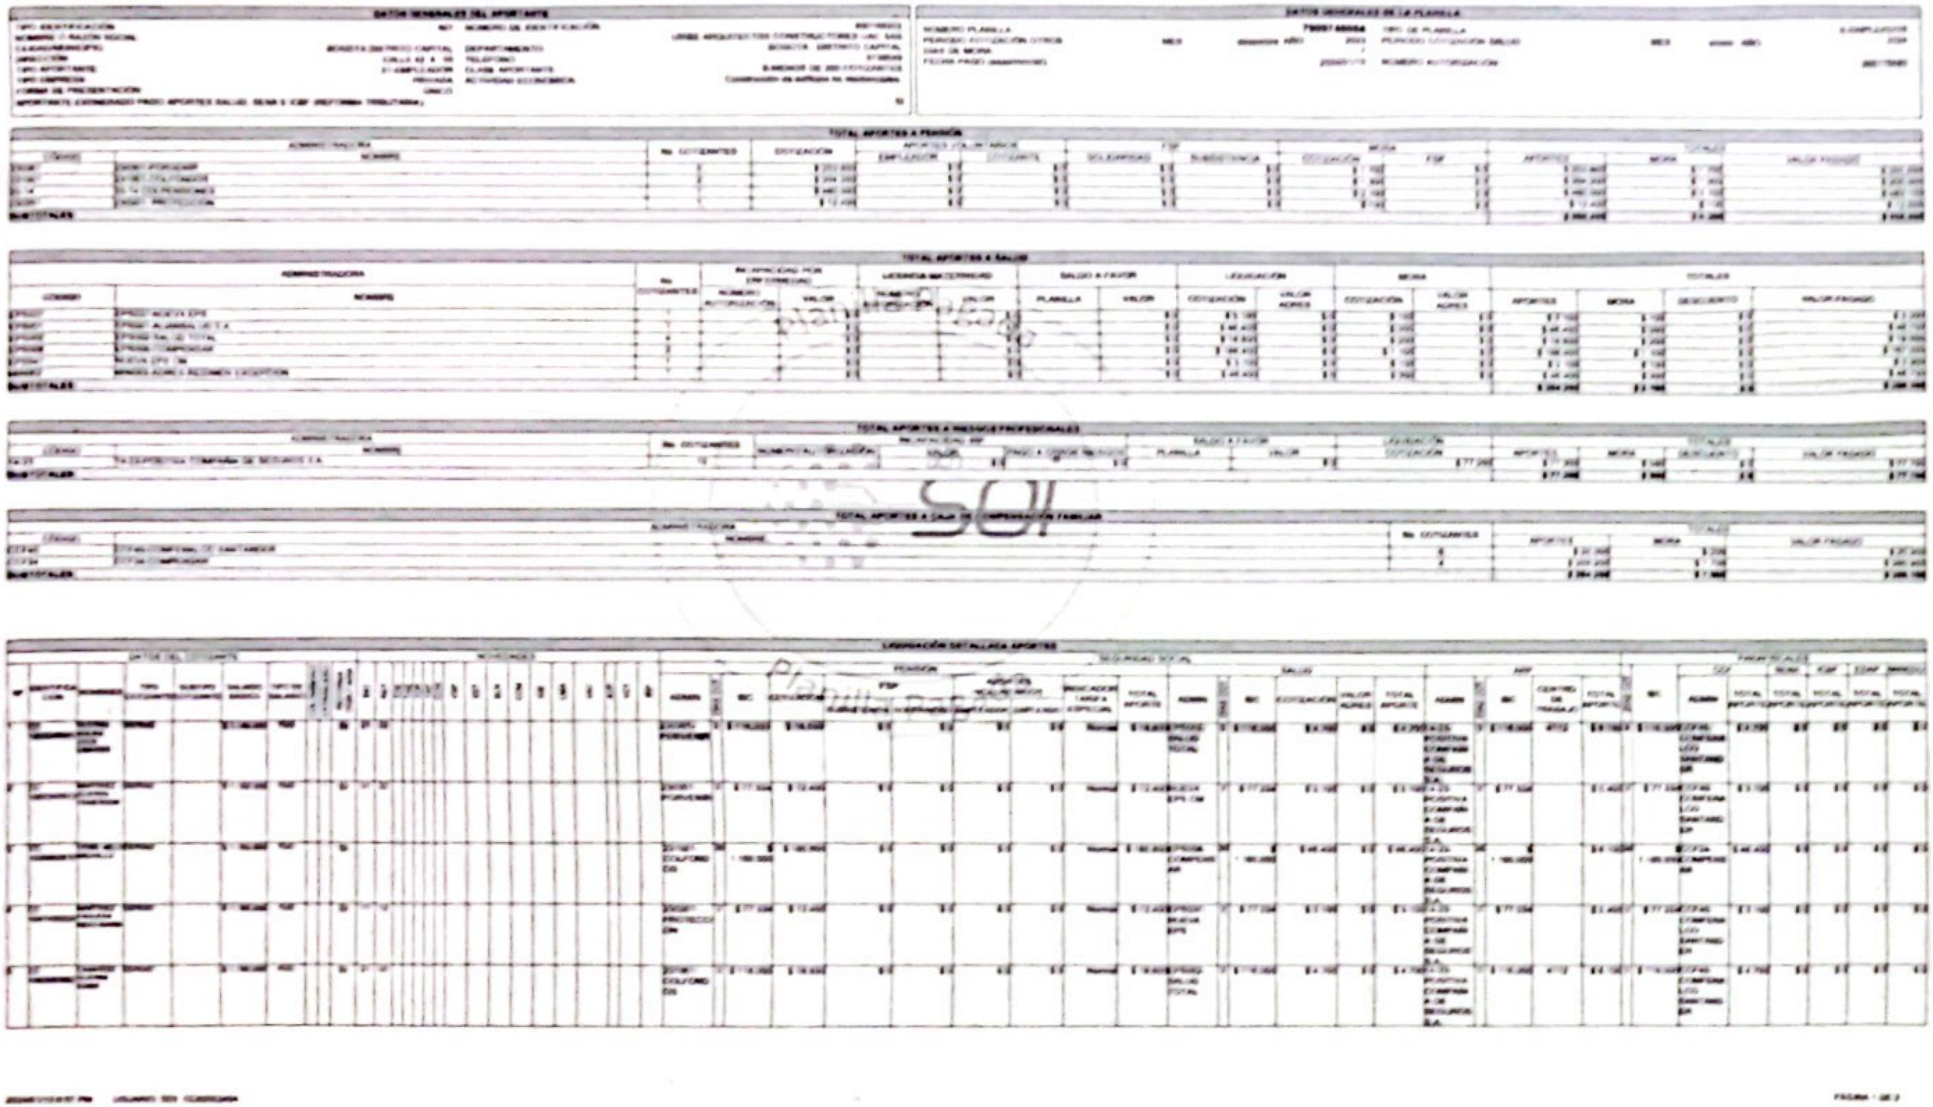

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900 [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			URBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CALLE 42 # 78	TELEFONO	31 [illegible]
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	6 [illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		70007 [illegible]	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO
DIAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaammdd)			NÚMERO AUTORIZACIÓN		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																							PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL		SALUD				ARP				PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	PERIODO DE PENSIÓN	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																							23007 - FONVIVIR	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	P03501 - ALIANSALUD EPS S.A	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000		$ 6.728								
2	[illegible]	[illegible]	DEPEND	MUNDIAL CON PENSIONADO	$ 1.160.000	FIJO																								$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000		$ 6.728	1-160.000	23 - COMPENSAR EPS	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 3.480.000	FIJO																								$ 3.480.000	$ 640.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.320	P03306 - COMPENSAR EPS	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 139.200	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.	$ 3.480.000		$ 20.184	3-480.000	23 - COMPENSAR EPS	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																							23007 - FONVIVIR	$ 116.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.800	P03503 - SALUD TOTAL	$ 116.000	$ 4.640	$ 0	$ 4.640	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.	$ 116.000	30/04/12	$ 672	1-160.000	23 - COMPENSAR EPS	$ 4.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																							23007 - FONVIVIR	$ 116.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.800	P03503 - SALUD TOTAL	$ 116.000	$ 4.640	$ 0	$ 4.640	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA A DE SEGUROS S.A.	$ 116.000	4/12	$ 672	1-160.000	23 - COMPENSAR EPS	$ 4.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.606.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Powered by CamScanner

569

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			URBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CALLE 42 4 55	TELEFONO	5190049
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIGANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		79137932811	TIPO DE PLANILLA		E-AMPLIACIÓN
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Mismo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Mismo AÑO	2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN		4332520999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-01	23-01 - PORVENIR	1	$ 462.100							$ 462.100		$ 462.100
23-14	23-14 - COLPENSIONES	1	$ 480.700							$ 480.700		$ 480.700
23-19	23-19 - COLFONDOS	1	$ 208.000							$ 208.000		$ 208.000
SUBTOTALES										$ 1.150.800		$ 1.150.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AGRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AGRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 - SANITAS EPS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.900	$ 100	$ 0	$ 2.000
EPS008	EPS008 - COMPENSAR EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.900	$ 100	$ 0	$ 2.000
EPS037	EPS037 - NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.300	$ 100	$ 0	$ 1.400
EPS041	EPS041 - FAMISANAR EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 0	$ 100	$ 0	$ 34.400	$ 100	$ 0	$ 34.500
EPS048	EPS048 - COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.300	$ 100	$ 0	$ 1.400
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A CERO RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12						$ 130.300	$ 130.300	$ 600	$ 0	$ 130.900
SUBTOTALES									$ 130.300	$ 600	$ 0	$ 130.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24 - COMPENSAR	4	$ 276.300	$ 600	$ 276.900
CCF40	CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	4	$ 53.400	$ 200	$ 54.100
SUBTOTALES			$ 329.700	$ 800	$ 330.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR AGRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MEN TOTAL APORTE
1	CC		1	0	$ 1.300.000	FIJO		23-01 - PORVENIR	$ 43.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.800	EPS037 - NUEVA EPS CM	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 43.334	$ 1.100	$ 1.100	$ 43.334	CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC		1	0	$ 1.300.000	FIJO		23-01 - PORVENIR	$ 43.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.800	EPS005 - SANITAS S.A.	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 43.334	$ 1.100	$ 1.100	$ 43.334	CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC		1	0	$ 1.300.000	FIJO		23-19 - COLFONDOS	$ 208.000	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS008 - COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 42.300	$ 0	$ 42.300	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000	$ 1.100	$ 1.100	$ 1.300.000	CCF24 - COMPENSAR	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC		1	0	$ 1.300.000	FIJO		23-01 - PORVENIR	$ 130.000	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 23.400	EPS037 - NUEVA EPS CM	$ 130.000	$ 3.200	$ 0	$ 3.200	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 130.000	$ 1.100	$ 1.100	$ 130.000	CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC		1	0	$ 1.300.000	FIJO		23-14 - COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037 - NUEVA EPS CM	$ 606.667	$ 34.300	$ 0	$ 34.300	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 606.667	$ 42.300	$ 42.300	$ 606.667	CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	$ 34.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900.149202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			URBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CALLE 42 A 28	TELÉFONO	3118644
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		79137928 11	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO		2024
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN				433352589

LIQUIDACIÓN INTALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

570

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
FECHA DE INICIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION		CALLE 42 # 55	3738049
TIPO APORTANTE		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION		UNICO	
APORTANTE HONORARIO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		79178449751	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	Número: AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Número: AÑO 2024
DIAS DE MORA		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/05/08	NUMERO AUTORIZACION		442340875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	COLFONDOS	1	$ 208.000	$	$	$	$	$ 400	$	$ 208.000	$ 400	$ 208.400
25-14	PORVENIR	1	$ 140.800	$	$	$	$	$ 300	$	$ 140.800	$ 300	$ 141.100
25-14	COLPENSIONES	1	$ 104.000	$	$	$	$	$ 200	$	$ 104.000	$ 200	$ 104.200
SUBTOTALES										$ 452.800	$ 900	$ 453.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	SANITAS EPS S.A.	1		$		$		$	$ 204.800	$	$ 400	$	$ 204.800	$ 400	$	$ 205.200
EPS017	SANITAS EPS - CAMBIO DE EPS	1		$		$		$	$ 52.000	$	$ 100	$	$ 52.000	$ 100	$	$ 52.100
EPS018	SURA EPS - CAMBIO DE EPS	1		$		$		$	$ 27.800	$	$ 100	$	$ 27.800	$ 100	$	$ 27.900
EPS034	NUEVA EPS - CM	1		$		$		$	$ 52.000	$	$ 100	$	$ 52.000	$ 100	$	$ 52.100
EPS037	SANITAS - CONTRALOR	1		$		$		$	$ 78.100	$	$ 100	$	$ 78.100	$ 100	$	$ 78.200
EPS040	SANITAS - CAMBIO A E.S.	1		$		$		$	$ 1.500	$	$ 100	$	$ 1.500	$ 100	$	$ 1.600
EPS045	SURA - NUEVA EPS	1		$		$		$	$ 38.200	$	$ 100	$	$ 38.200	$ 100	$	$ 38.300
EPS047	SURA - ALIANSALUD E.P.S.	1		$		$		$	$ 52.000	$	$ 100	$	$ 52.000	$ 100	$	$ 52.100
EPS048	SURA - SANITAS	1		$		$		$	$ 772.000	$	$ 100	$	$ 772.000	$ 100	$	$ 772.100
SUBTOTALES													$ 1.331.400	$ 1.000	$	$ 1.332.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$		$	$ 634.400	$ 634.400	$ 1.300	$	$ 635.700
SUBTOTALES								$ 634.400	$ 1.300	$	$ 635.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	COMFENALCO SANTANDER	10	$ 347.300	$ 800	$ 348.100
CCF24	COMPENSAR	4	$ 174.100	$ 300	$ 174.400
SUBTOTALES			$ 521.400	$ 1.100	$ 522.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

No	TIPO DOC. COTIZANTE	NUMERO DOC. COTIZANTE	COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	HORAS LABORADAS	DIAS	HORAS	NOVEDADES	PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSION INDICACION TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	RIESGOS LABORALES ADMIN	RIESGOS LABORALES IBC	RIESGOS LABORALES COTIZACION	RIESGOS LABORALES VALOR ADRES	RIESGOS LABORALES TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	APP ADMIN	APP IBC	APP CENTRO DE TRABAJO	APP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MEN TOTAL APORTE
1	CC	[illegible]	[illegible]	1	00	$ 1.300.000	192	30	192		COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	$	$	$	$	Normal	$ 208.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000		$ 44.200	$ 1.300.000	COMPENSAR	$ 52.000	$ 52.000	$	$	$	$	$
2	CC	[illegible]	[illegible]	1	14	$ 880.334	192	30	192		COLPENSIONES	$ 880.334	$ 140.800	$	$	$	$	Autorizado en ARC Riesgo	$ 140.800	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.	$ 880.334	$ 27.800	$ 27.800	$ 27.800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 880.334		$ 44.200	$ 880.334	COMFENALCO SANTANDER	$ 27.800	$	$	$	$	$	$
3	CC	[illegible]	[illegible]	1	00	$ 1.300.000	192	30	192		PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	$	$	$	$	Normal	$ 208.000	SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000		$ 44.200	$ 1.300.000	COMPENSAR	$ 52.000	$	$	$	$	$	$
4	CC	[illegible]	[illegible]	1	00	$ 1.760.000	192	30	192		PORVENIR	$ 1.760.000	$ 124.800	$	$	$	$	Normal	$ 124.800	PROG SALUD TOTAL	$ 1.760.000	$ 31.200	$ 31.200	$ 31.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.760.000		$ 44.200	$ 1.760.000	COMFENALCO SANTANDER	$ 31.200	$	$	$	$	$	$
5	CC	[illegible]	[illegible]	1	00	$ 1.300.000	192	30	192		PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	$	$	$	$	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS - CM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 52.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 44.200	$ 1.300.000	COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$	$	$	$	$	$

Powered by CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900189202
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CALLE 42 # 55	TELÉFONO	3738849
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7917649751	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Marzo AÑO	2024
DIAS DE MORA		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/03/08	NUMERO AUTORIZACIÓN		497249875

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	CCF	ESAP	MINEDUC	TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30																					23-301-PORVENIR	$ 476.667	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 124.000	EPS040 COOSALUD	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 19.100	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 476.667		$ 33.300	$ 476.667	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30	01	02																			23-301-PORVENIR	$ 663.334	$ 172.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 172.533	EPS037 NUEVA EPS	$ 663.334	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 663.334		$ 46.400	$ 663.334	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30																					23-301-PORVENIR	$ 1.300.000	$ 338.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 338.000	EPS001 SANITAS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	CF34 COMFENAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND	MOBILIZ CON PAGO EXIGIDO	$ 1.300.000	FIJO			30																					23-301-PORVENIR	$ 1.300.000	$ 338.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 338.000	EPS042 COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	CF34 COMFENAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			30																					25-14 COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 480.000	EPS008 COMFENAR	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 3.000.000		$ 15.750	$ 3.000.000	CF34 COMFENAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30																					23-301-PORVENIR	$ 1.300.000	$ 338.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 338.000	EPS002 SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.300.000		$ 86.600	$ 1.300.000	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30	02																				23-301-PORVENIR	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 201.100	EPS002 SALUD TOTAL	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.256.667		$ 87.500	$ 1.256.667	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			15	14																				25-14 COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 13.900	EPS005 SANITAS S.A.	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 86.667		$ 6.100	$ 86.667	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			30	02																				23-301-PORVENIR	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 201.100	EPS002 SALUD TOTAL	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.256.667		$ 87.500	$ 1.256.667	CF45 COMFENALCO SANTANDER	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

TOTAL	$ 4.410.100

Powered by CamScanner

571

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DIGITO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN	CALLE 82 A 35 TELEFONO	3136849	
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE	A-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Contribución de aportes no obligatorios	
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		N
APORTANTE CENTRALIZADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		79205194401		TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Marzo AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril AÑO	2024
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/03/27		NUMERO AUTORIZACIÓN			02P141872

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-07	COLFONDOS	6	$ 729.900	$	$	$	$	$	$	$ 729.900	$	$ 729.900
25-14	COLPENSIONES	4	$ 912.200	$	$	$	$	$	$	$ 912.200	$	$ 912.200
23-07	COLFONDOS	1	$ 228.900	$	$	$	$	$	$	$ 228.900	$	$ 228.900
SUBTOTALES										$ 1.870.900	$	$ 1.870.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	SANITAS	1							$ 52.000				$ 52.000			$ 52.000
EPS008	SALUD TOTAL	4							$ 208.000				$ 208.000			$ 208.000
EPS008	SALUD TOTAL	1							$ 172.000				$ 172.000			$ 172.000
EPS041	NUEVA EPS	1							$ 52.000				$ 52.000			$ 52.000
EPS037	SANITAS	1							$ 52.000				$ 52.000			$ 52.000
EPS037	SANITAS	1							$ 52.000				$ 52.000			$ 52.000
EPS037	SANITAS	1							$ 6.200				$ 6.200			$ 6.200
EPS017	LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO DE SALUD	1							$ 80.700				$ 80.700			$ 80.700
EPS037	SANITAS	1							$ 43.400				$ 43.400			$ 43.400
EPS041	NUEVA EPS	1							$ 52.000				$ 52.000			$ 52.000
SUBTOTALES													$ 807.300	$	$	$ 807.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP		LICENCIA MATERNIDAD EPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11							$ 789.400	$ 789.400	$	$	$ 789.400
SUBTOTALES										$ 789.400	$	$	$ 789.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
57-04	COMFAMILIAR DE SANTANDER	11	$ 421.300	$	$ 421.300
57-04	COMFAMILIAR	4	$ 276.000	$	$ 276.000
SUBTOTALES			$ 697.300	$	$ 697.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	830185202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CALLE 42 # 6 - 66	TELÉFONO	3738949
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de edificios no residenciales
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		70205194401	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mes	AÑO	2024
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/05/27	NUMERO AUTORIZACIÓN				53014972

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	SUSPENSION TEMPORAL DE LABORES	INCAPACIDAD GENERAL	LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD	VACACIONES	APORTE VOLUNTARIO	VARIACION PERMANENTE DE SALARIO	DIAS INCAPACIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO	DIAS INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL	DIAS LICENCIA MATERNIDAD/PATERNIDAD	DIAS INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	DIAS LICENCIA REMUNERADA	DIAS LICENCIA NO REMUNERADA	DIAS LICENCIA POR LUTO	DIAS LICENCIA POR CALAMIDAD DOMESTICA	DIAS LICENCIA POR VACUNACION COVID	PENSIÓN					SALUD					ARP				CCF				PARAFISCALES				
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL SENA	TOTAL ICBF	TOTAL ESAP	TOTAL MINEDU
1	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	$ 1.300.000	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 334.000	EPS042-COOSALUD	$ 1.300.000	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 571484		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			25-14-DEPENDIENTES	$ 1.083.334	$ 171.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.429	ESC36-COOSALUD ESS	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.083.334		$ 75.500	$ 1.083.334	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-734-COMFENALCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC		DEPEND	MITIGAR CON PRIMA EXTRA	$ 1.300.000	FIJO																												ARL003-ARPES-REGIMEN EXCEPCION	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500						
6	CC		DEPEND		$ 3.000.000	FIJO																			25-14-DEPENDIENTES	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS026-COMPENSAR	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 3.000.000		$ 208.500	$ 3.000.000	07-734-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC		DEPEND		$ 150.000	FIJO																			25-14-DEPENDIENTES	$ 150.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.800	EPS EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	$ 150.000	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 150.000		$ 10.500	$ 150.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Actividades de Alto Riesgo	$ 334.000	EPS002-SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC		DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																			23/30/1-DEPENDIENTE	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000		$ 90.500	$ 1.300.000	07-745-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.134.900**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

572

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 901526649	6	JRVG RECUPERADORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 35 29 40 LOCAL 1	BUCARAMANGA SANTANDER	3208541667	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	494885248	94640211786	E	2024/03/12	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	512.788.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION																		
vc t	Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha inicio irt	Fecha Fin irt	vt p	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa
																					$2.190.100					
																					$2.190.100					
							$1.400.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3.400.000	16%	SIN RIESGO	$544.000	$0	$0	$0	$0	$0	$544.000		SANITAS	30	$3.400.000	4%
							$1.300.000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA E.P.S.	30	$1.300.000	12.5%
							$2.200.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2.200.000	16%	SIN RIESGO	$352.000	$0	$0	$0	$0	$0	$352.000		EPS SURA (ANTES SURAMIS)	30	$2.200.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.587.664	16%	SIN RIESGO	$254.100	$0	$0	$0	$0	$0	$254.100		NUEVA E.P.S.	30	$1.587.664	4%
							$5.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$5.000.000	16%	SIN RIESGO	$800.000	$0	$0	$0	$0	$0	$800.000		EPS SURA (ANTES SURAMIS)	30	$5.000.000	4%
							$1.500.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.500.000	16%	SIN RIESGO	$240.000	$0	$0	$0	$0	$0	$240.000		NUEVA E.P.S.	30	$1.500.000	4%
																					$1.037.600					
																					$1.037.600					
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.439.404	16%	SIN RIESGO	$230.400	$0	$0	$0	$0	$0	$230.400		SALUD TOTAL	30	$1.439.404	4%
							$2.150.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2.355.851	16%	SIN RIESGO	$377.000	$0	$0	$0	$0	$0	$377.000		NUEVA E.P.S.	30	$2.355.851	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	3	$130.000	16%	SIN RIESGO	$20.800	$0	$0	$0	$0	$0	$20.800		EPS SURA (ANTES SURAMIS)	3	$130.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.300.000	16%	SIN RIESGO	$208.000	$0	$0	$0	$0	$0	$208.000		FAMISANAR	30	$1.300.000	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	26	$1.126.667	16%	SIN RIESGO	$180.300	$0	$0	$0	$0	$0	$180.300		SANITAS	26	$1.126.667	4%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$43.334	12%	SIN RIESGO	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$5.300		SANITAS	1	$43.334	0%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$43.334	12%	SIN RIESGO	$5.300	$0	$0	$0	$0	$0	$5.300		SANITAS	1	$43.334	0%
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86.667	12%	SIN RIESGO	$10.500	$0	$0	$0	$0	$0	$10.500		SANITAS	2	$86.667	0%
																					$748.000					
																					$748.000					
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.650.000	16%	SIN RIESGO	$264.000	$0	$0	$0	$0	$0	$264.000		SALUD TOTAL	30	$1.650.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PROTECCION	7	$385.000	16%	SIN RIESGO	$61.600	$0	$0	$0	$0	$0	$61.600		SALUD MIA EPS	7	$385.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PROTECCION	18	$990.000	16%	SIN RIESGO	$158.400	$0	$0	$0	$0	$0	$158.400		SALUD MIA EPS	18	$990.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	29	$1.595.000	16%	SIN RIESGO	$255.200	$0	$0	$0	$0	$0	$255.200		SALUD TOTAL	29	$1.595.000	4%
							$1.650.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$55.000	16%	SIN RIESGO	$8.800	$0	$0	$0	$0	$0	$8.800		SALUD TOTAL	1	$55.000	4%
																					$3.484.000					
																					$3.484.000					
							$1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.389.893	16%	SIN RIESGO	$222.400	$0	$0	$0	$0	$0	$222.400		FAMISANAR	30	$1.389.893	4%

Powered by CamScanner

573

SALUD				CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Valor Cotización	Valor UPC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$2.080.400		$2.080.400						$1.249.100						$1.579.700				$0		$0		$0		$0	
$719.100		$719.100						$439.400						$40.100				$0		$0		$0		$0	
$719.100		$719.100						$439.400						$80.100				$0		$0		$0		$0	
$144.020	0%	$176.000		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$3.400.000	4%	$136.000	ARL SURA	30	$3.400.000	0.522%	1	$17.800	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$142.500	0%	$142.500			0	$0	0%	$0		0	$0	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	NO
$80.400	0%	$80.400		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$0	4%	$0	ARL SURA	30	$2.280.000	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$80.400	0%	$80.400		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$3.367.000	4%	$80.400	ARL SURA	30	$3.367.000	0.522%	1	$20.500	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$120.600	0%	$120.600		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$5.000.000	4%	$120.000	ARL SURA	30	$5.000.000	0.522%	1	$29.100	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$84.000	0%	$84.000		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.400.000	4%	$84.000	ARL SURA	30	$1.400.000	0.522%	1	$7.300	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$254.200		$254.200						$254.200						$442.300				$0		$0		$0		$0	
$254.200		$254.200						$254.200						$442.300				$0		$0		$0		$0	
$61.400	0%	$61.400		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.439.400	4%	$57.600	ARL SURA	30	$1.439.400	6.96%	5	$100.200	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$94.300	0%	$94.300		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$2.150.800	4%	$86.000	ARL SURA	30	$2.150.800	6.96%	5	$164.000	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$2.200	0%	$2.200		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$110.000	4%	$2.200	ARL SURA	1	$110.000	6.96%	5	$9.300	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$92.000	0%	$92.000		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.100.000	4%	$55.000	ARL SURA	30	$1.100.000	6.96%	5	$90.500	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$49.100	0%	$49.100		CONTINENTAL CO SANTANDER	25	$1.143.800	4%	$45.700	ARL SURA	25	$1.143.800	6.96%	5	$78.000	25	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	0%	$0		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$43.334	0%	$0	ARL SURA	1	$43.334	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	0%	$0		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$43.334	0%	$0	ARL SURA	1	$43.334	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	0%	$0		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$86.667	0%	$0	ARL SURA	2	$86.667	0%	5	$0	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$187.000		$187.000						$187.000						$156.000				$0		$0		$0		$0	
$187.000		$187.000						$187.000						$156.000				$0		$0		$0		$0	
$66.400	0%	$66.400		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.600.000	4%	$66.000	ARL SURA	30	$1.600.000	4.35%	4	$71.800	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$19.900	0%	$19.900		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$990.000	4%	$19.800	ARL SURA	1	$990.000	4.35%	4	$14.900	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$33.200	0%	$33.200		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$990.000	4%	$33.000	ARL SURA	30	$990.000	4.35%	4	$0	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$63.800	0%	$63.800		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.595.000	4%	$63.800	ARL SURA	30	$1.595.000	4.35%	4	$69.400	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$2.200	0%	$2.200		CONTINENTAL CO SANTANDER	1	$55.000	4%	$2.200	ARL SURA	1	$55.000	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$848.700		$848.700						$848.700						$919.300				$0		$0		$0		$0	
$848.700		$848.700						$848.700						$919.300				$0		$0		$0		$0	
$55.400	0%	$55.400		CONTINENTAL CO SANTANDER	30	$1.384.800	4%	$55.400	ARL SURA	30	$1.384.800	4.35%	4	$60.300	30	$0	0%	$0	4%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

Powered by CamScanner

574

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KARLA VANESSA MANOSALVA MORA identificado(a) con CC 1098761373 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JRVG RECUPERADORA SAS NI 901526649

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9462696735	440093848	E	2024-02-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9462696735	440093848	E	2024-02-06	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	0												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30												X					
9461213865	378922957	E	2024-01-04	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	0												X					

Este certificado se expide el día 2024-04-05 a las 15:04.

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

575

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-02
FECHA DE PAGO:	2024-02-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28613351
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28613351
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 165.000	$ 167.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 211.200	$ 213.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 383.100	$ 387.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2024

PUT

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

576

RAZÓN SOCIAL:	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-04
FECHA DE PAGO:	2024-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29066066
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29066066
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 165.000	$ 167.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 211.200	$ 214.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 383.100	$ 388.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2024

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

577

RAZÓN SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098752603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-02
FECHA DE PAGO:	2024-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29363724
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29363724
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS025	800251440	SANITAS	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 165.000	$ 165.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 211.200	$ 211.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.900	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 383.100	$ 384.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/05/2024

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

578

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT [illegible]	2	CDASCON S.A.S	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 31 143 LC 05 ED RIVIERA PLAZA	BUCARAMANGA-SANTANDER	645302	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	2058131[illegible]2	9462755862	E	2024/02/05	2024/02/07	BANCO POPULAR	2	$18,392,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO: Identificación	EMPLEADO: Nombre	NOVEDADES	PENSION: Codigo	PENSION: Dias	PENSION: IBC	PENSION: Aporte	SALUD: Codigo	SALUD: Dias	SALUD: IBC	SALUD: Aporte	CCF: Codigo	CCF: Dias	CCF: IBC	CCF: Aporte	RIESGOS: Codigo	RIESGOS: Dias	RIESGOS: IBC	RIESGOS: Tarifa	RIESGOS: Aporte	PARAFISCALES: Dias	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: Aporte	PARAFISCALES: Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (28 Afiliados)						$60,573,376	$9,771,000			$64,963,442	$2,369,600			$64,509,375	$2,364,400			$64,462,442		$3,451,600		$0	$0		$10,358,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (11 Afiliados)						$21,428,959	$3,306,900			$25,317,823	$1,002,800			$25,340,756	$1,004,500			$25,317,823		$942,100		$0	$0		$6,456,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)						$21,428,959	$3,306,900			$25,317,823	$1,002,800			$25,340,756	$1,004,500			$25,317,823		$942,100		$0	$0		$6,456,300
1	CC	[illegible]	X	23030	2	$146,667	$23,500	P5037	2	$146,667	$5,900	CCF40	2	$146,667	$5,900	14-23	2	$146,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$35,300
2	CC	[illegible]	X	23030	28	$2,299,733	$368,000	P5037	28	$2,299,733	$91,000	CCF40	28	$2,299,733	$91,000	14-23	28	$2,299,733	4.960%	$140,100	28	$0	$0	SI	$712,100
3	CC	[illegible]	X	25-14	2	$86,667	$13,900	P5047	2	$86,667	$3,500	CCF40	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
4	CC	[illegible]	X	25-14	6	$260,000	$41,600	P5047	6	$260,000	$0	CCF40	6	$260,000	$0	14-23	6	$260,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$41,600
5	CC	[illegible]	X	25-14	22	$953,334	$152,600	P5047	22	$953,334	$38,200	CCF40	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	0.522%	$5,000	22	$0	$0	SI	$234,000
6	CC	[illegible]	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	P5037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	[illegible]	X	23030	12	$1,687,305	$270,000	P5002	12	$1,687,305	$67,500	CCF40	12	$1,687,305	$67,500	14-23	12	$1,687,305	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$405,000
8	CC	[illegible]	X	23030	18	$2,784,053	$445,500	P5002	18	$2,784,053	$111,400	CCF40	18	$2,784,053	$111,400	14-23	18	$2,784,053	4.960%	$193,800	18	$0	$0	SI	$862,100
9	CC	[illegible]	X	0	0	$0	$0	P5010	14	$840,000	$33,600	CCF40	14	$840,000	$33,600	14-23	14	$840,000	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$67,200
10	CC	[illegible]	X	0	0	$0	$0	P5010	16	$1,075,200	$43,100	CCF40	16	$1,075,200	$43,100	14-23	16	$1,075,200	0.522%	$5,700	16	$0	$0	SI	$91,900
11	CC	[illegible]	X	0	0	$0	$0	P5002	13	$800,800	$32,100	CCF40	13	$800,800	$32,100	14-23	13	$800,800	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$64,200
12	CC	[illegible]	X	0	0	$0	$0	P5002	17	$1,172,864	$47,000	CCF40	17	$1,172,864	$47,000	14-23	17	$1,172,864	0.522%	$6,200	17	$0	$0	SI	$100,200
13	CC	[illegible]	X	25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	P5017	30	$7,800,000	$312,000	CCF40	30	$7,800,000	$312,000	14-23	30	$7,800,000	4.960%	$542,900	30	$0	$0	SI	$2,492,900
14	CC	[illegible]	X	23030	6	$280,000	$44,800	P5002	6	$280,000	$11,200	CCF40	6	$280,000	$11,200	14-23	6	$280,000	0.522%	$1,500	6	$0	$0	SI	$68,700
15	CC	[illegible]	X	23030	30	$1,680,000	$268,800	P5041	30	$1,680,000	$67,200	CCF40	30	$1,680,000	$67,200	14-23	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$411,000
16	CC	[illegible]	X	23030	30	$1,300,000	$208,000	P5037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	[illegible]	X	23030	19	$851,200	$136,200	P5002	19	$851,200	$34,100	CCF40	19	$894,133	$35,800	14-23	19	$851,200	0.522%	$4,500	19	$0	$0	SI	$210,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

579

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000013	2	COASCON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 31 143 LC 05 ED RIVIERA PLAZA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6453032	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	493229013	94639997663	E	2024/03/05	2024/03/05	BANCO POPULAR	0	$18,792,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)							$61,312,282	$9,873,500			$65,298,042	$2,612,900			$65,298,042	$2,363,100			$65,398,042		$3,744,900		$0	$0		$18,792,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)							$21,884,089	$3,579,600			$25,969,849	$1,039,000			$25,969,849	$1,039,000			$25,969,849		$1,095,100		$0	$0		$6,752,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)							$21,884,089	$3,579,600			$25,969,849	$1,039,000			$25,969,849	$1,039,000			$25,969,849		$1,095,100		$0	$0		$6,752,700
1	CC	1096249329	AMGARITA MARTINEZ DAMNA ELSEYN		23030 1	30	$2,464,000	$394,300	EPS037	30	$2,464,000	$98,600	CCF40	30	$2,464,000	$98,600	14-23	30	$2,464,000	6.960%	$171,500	30	$0	$0	SI	$763,000
2	CC	1007712435	CONTRERA PACI ANGIES PAOLA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1005297394	GARCIA MORENO ALEJANDRO JOSE		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	91486078	GUARIN CASTELLANOS OSCAR JAVIER		23030 1	30	$4,640,089	$742,500	EPS002	30	$4,640,089	$185,700	CCF40	30	$4,640,089	$185,700	14-23	30	$4,640,089	6.960%	$323,000	30	$0	$0	SI	$1,436,900
5	CC	1098620225	GUERRERO VERA MOLLY TERESA	X		0	$0	$0	EPS010	1	$67,200	$2,700	CCF40	1	$67,200	$2,700	14-23	1	$67,200	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,400
6	CC	1098620225	GUERRERO VERA MOLLY TERESA			0	$0	$0	EPS010	29	$1,948,800	$78,000	CCF40	29	$1,948,800	$78,000	14-23	29	$1,948,800	0.522%	$10,200	29	$0	$0	SI	$166,200
7	CC	1078899592	LEON TRIANA ELSA			0	$0	$0	EPS002	30	$2,069,760	$82,800	CCF40	30	$2,069,760	$82,800	14-23	30	$2,069,760	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$176,500
8	CC	63362809	MORENO RAMIREZ JANETT GRACIELA		25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	EPS017	30	$7,800,000	$312,000	CCF40	30	$7,800,000	$312,000	14-23	30	$7,800,000	6.960%	$542,900	30	$0	$0	SI	$2,492,900
9	CC	1007775709	MORGADO MONCERA DIANA GABRIELA		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
10	CC	1005199659	PONCE SILVA GERALDINE NICOLE		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS041	30	$1,680,000	$67,200	CCF40	30	$1,680,000	$67,200	14-23	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$412,000
11	CC	28907583	RICO CAMEDO EDITH MARIA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (7 Afiliados)							$15,979,334	$2,956,900			$15,979,334	$639,500			$15,979,334	$588,700			$15,979,334		$1,024,200		$0	$0		$4,809,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)							$15,979,334	$2,956,900			$15,979,334	$639,500			$15,979,334	$588,700			$15,979,334		$1,024,200		$0	$0		$4,809,300
12	CC	91354024	CASTRO RUEDA JAVIER FERNANDO		23030 1	30	$2,069,760	$331,200	EPS046	30	$2,069,760	$82,800	CCF40	30	$2,069,760	$82,800	14-23	30	$2,069,760	6.960%	$144,100	30	$0	$0	SI	$640,900
13	CC	52451104	ENRIQUE PACHECO CONSUELO ANDREA		25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS005	30	$2,240,000	$89,600	CCF40	30	$2,240,000	$89,600	14-23	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$691,600
14	CC	1098687485	GALVIS SOTO MATTHEW		23020 9	9	$815,430	$130,500	EPS037	9	$815,430	$32,700	CCF40	9	$815,430	$32,700	14-23	9	$815,430	6.960%	$56,800	9	$0	$0	SI	$252,700
15	CC	1098687485	GALVIS SOTO MATTHEW	X	23020 21	21	$1,268,447	$203,000	EPS037	21	$1,268,447	$50,800	CCF40	21	$1,268,447	$0	14-23	21	$1,268,447	0.000%	$0	21	$0	$0	SI	$253,800
16	CC	1033648857	GONZALEZ PEREZ NESTOR LUIS		23030 1	30	$3,256,205	$521,000	EPS002	30	$3,256,205	$130,300	CCF40	30	$3,256,205	$130,300	14-23	30	$3,256,205	6.960%	$226,700	30	$0	$0	SI	$1,008,300
17	CC	63484038	MORENO RAMIREZ JUDITH BIBIANA		25-14	30	$2,350,540	$376,100	EPS002	30	$2,350,540	$94,100	CCF40	30	$2,350,540	$94,100	14-23	30	$2,350,540	6.960%	$163,600	30	$0	$0	SI	$727,900
18	CC	1095794717	RODRIGUEZ PICO EDGAR ALFONSO		23030 1	30	$2,069,760	$331,200	EPS010	30	$2,069,760	$82,800	CCF40	30	$2,069,760	$82,800	14-23	30	$2,069,760	6.960%	$144,100	30	$0	$0	SI	$640,900
19	CC	1 [illegible]521	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEREMIAS		25-14	30	$1,909,192	$305,500	EPS037	30	$1,909,192	$76,400	CCF40	30	$1,909,192	$76,400	14-23	30	$1,909,192	6.960%	$132,900	30	$0	$0	SI	$591,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000013	2	COASCON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 31 143 LC 05 ED RIVIERA PLAZA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6453032	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5475338567	94652047S6	E	2024/04/03	2024/04/01	BANCO POPULAR	0	$18,162,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)						$59,820,473	$9,649,800			$43,906,233	$2,357,200			$44,671,365	$2,319,400			$43,906,233		$3,440,300		$0	$0		$18,162,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)						$21,884,094	$3,379,600			$25,969,850	$1,039,100			$25,969,849	$1,039,100			$25,969,850		$925,300		$0	$0		$6,583,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)						$21,884,094	$3,379,600			$25,969,850	$1,039,100			$25,969,849	$1,039,100			$25,969,850		$925,300		$0	$0		$6,583,100
1	CC	1096249329	ANGARITA MARTINEZ DAMNA LISETH	23030	30	$2,464,000	$394,300	EPS037	30	$2,464,000	$98,600	CCF40	30	$2,464,000	$98,600	14-23	30	$2,464,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,400
2	CC	1007712935	CONTRERA PAEZ ANGIES PAOLA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS047	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1005297394	GARCIA MORENO ALEJANDRO JOSE	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	91486078	GUARIN CASTELLANOS OSCAR JAVIER	23020	1	$154,670	$24,800	EPS002	1	$154,670	$6,200	CCF40	1	$154,670	$6,200	14-23	1	$154,670	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$37,200
5	CC	91486078	GUARIN CASTELLANOS OSCAR JAVIER	23020	29	$4,485,430	$717,700	EPS002	29	$4,485,430	$179,500	CCF40	29	$4,485,419	$179,500	14-23	29	$4,485,420	6.960%	$312,200	29	$0	$0	SI	$1,388,900
6	CC	1098620225	GUERRERO VERA MOLLY TERESA		0	$0	$0	EPS010	30	$2,016,000	$80,700	CCF40	30	$2,016,000	$80,700	14-23	30	$2,016,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$172,000
7	CC	37389782	LEON TRIANA ELSA		0	$0	$0	EPS002	2	$137,984	$5,600	CCF40	2	$137,984	$5,600	14-23	2	$137,984	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$11,200
8	CC	37389782	LEON TRIANA ELSA		0	$0	$0	EPS002	28	$1,931,776	$77,300	CCF40	28	$1,931,776	$77,300	14-23	28	$1,931,776	0.522%	$10,100	28	$0	$0	SI	$164,700
9	CC	63362809	MORENO RAMIREZ JANETT GRACIELA	25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	EPS017	30	$7,800,000	$312,000	CCF40	30	$7,800,000	$312,000	14-23	30	$7,800,000	6.960%	$542,900	30	$0	$0	SI	$2,492,900
10	CC	1007775709	MORGADO PINCIRA DIANA GABRIELA	23030	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
11	CC	1007199659	PONCE SILVA GERALDINE MICHEL	23030	30	$1,680,000	$268,800	EPS041	30	$1,680,000	$67,200	CCF40	30	$1,680,000	$67,200	14-23	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$412,000
12	CC	28907583	RICO CAMERO EDITH MARIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (7 Afiliados)						$15,707,524	$2,513,400			$15,707,524	$628,500			$15,707,524	$556,000			$15,707,524		$967,400		$0	$0		$4,665,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$15,707,524	$2,513,400			$15,707,524	$628,500			$15,707,524	$556,000			$15,707,524		$967,400		$0	$0		$4,665,300
13	CC	91354224	CASTRO RUEDA JAVIER FERNANDO	23030	30	$2,069,760	$331,200	EPS046	30	$2,069,760	$82,800	CCF40	30	$2,069,760	$82,800	14-23	30	$2,069,760	6.960%	$144,100	30	$0	$0	SI	$640,900
14	CC	92451104	ENRIQUE PACHECO CORNIELES AMILCAR	25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS005	30	$2,240,000	$89,600	CCF40	30	$2,240,000	$89,600	14-23	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	SI	$693,600
15	CC	1098647485	GALVIS NOTO MATTALY	23020	30	$1,812,067	$290,000	EPS037	30	$1,812,067	$72,500	CCF40	30	$1,812,067	$0	14-23	30	$1,812,067	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$362,500
16	CC	74338857	GONZALEZ PEREZ HECTOR LUIS	23030	30	$3,256,205	$521,000	EPS002	30	$3,256,205	$130,300	CCF40	30	$3,256,205	$130,300	14-23	30	$3,256,205	6.960%	$226,700	30	$0	$0	SI	$1,008,300
17	CC	63494018	MORENO RAMIREZ JUDITH BIBLIANA	25-14	30	$2,350,543	$376,100	EPS002	30	$2,350,543	$94,100	CCF40	30	$2,350,543	$94,100	14-23	30	$2,350,543	6.960%	$163,600	30	$0	$0	SI	$727,900
18	CC	1095579717	RODRIGUEZ PICO EDGAR ALFONSO	23030	30	$2,069,760	$331,200	EPS010	30	$2,069,760	$82,800	CCF40	30	$2,069,760	$82,800	14-23	30	$2,069,760	6.960%	$144,100	30	$0	$0	SI	$640,900
19	CC	1 [illegible]	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JERONIMO	25-14	30	$1,909,192	$305,500	EPS037	30	$1,909,192	$76,400	CCF40	30	$1,909,192	$76,400	14-23	30	$1,909,192	6.960%	$132,900	30	$0	$0	SI	$591,200

2024/04/01 03:56 PM

Powered by CamScanner

aportes en linea

Planilla Resumen

| | | |

ANEXO 3

BITACORA

Powered by CamScanner

581

Contrato #. 316-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AN QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33.

INICIO DE OBRA: LUNES 15 DE ENERO 2024.

HORA DE INICIO: 8:00 A.M.

ING. EDGAR BAMONA.
SUPERVISOR DE OBRA ALCALDIA

ARQ. CARLOS M. URIBE.

ARQ. Guillermo Diaz S.

Powered by CamScanner

BITACORA DE CAMPO

PROYECTO PARTICIPATIVO
CARRERA 15 Av. QUEBRADA SECA CALLE 33 PARTE I
CONTRATO 316-2023

LUNES 16 DE ENERO DE 2024.
RECORRIDO INICIAL OBRA
CONTRATISTA CARLOS M. LUNA
SUPERVISA ING. BALOYA
ACTIVIDADES:

- DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO SOBRE LA CARRERA 15: CON EQUIPOS MECANICOS
- DEMOLICION Y TRASLADO PLACA CONTRAPISO DE ALCANTARILLADO; CONTIGUO AL PAV RIGIDO
- CORTE DE PAVIMENTO INCLUSO A ESTACION
- CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO DE .480M HAS 80 cm DE ANCHO
- DEMOLICION BASE A.P. SOBRE LA CRA 15
- DEMOLICION BASE MORTERO VANDALIZADO
- CONSTRUCCION TERRAPLEN e>30 cm PARA PROTEGER RAICES EXPUESTAS SOBRE LA CRA 15.
- ABSTRACCION SUELO FRENTE AL PARQUE BUCARO
- CONSTRUCCION A TERRAPLEN APROX CONTIGUO A VALLAS ESTACION 1 DE MOTOCICLISTAS
- CONSTRUCCION TAPAS CAMARA DE SERVICIOS PUBLICOS POTENCIALMENTE

- Demolición de las placas de piso en concreto de los locales ubicados en la cra 15 entre calles 31 y 32 costado occidental, se presume que son de 10 a 13 cm de espesor
- Se termina el recorrido de obra a las 12 am
- En la tarde se organizan los trabajos para comenzar a bautizar el adoquín en el sector de la V 15 con calle 31. Se inicia la intervención del pavimento en el se parador de este sector.

Powered by CamScanner

582

VIERNES 16 DE ENERO/2023
INICIO DE ACTIVIDADES: 7:00 AM
- Llega personal de obra:
1 oficial
1 ayudante
1. volqueta
1. RETROEXCAVADORA (BAJORITA)
1 AUX DE TRANSITO (PLAN DE MANEJO DE TRAF)
1. INSPECTOR
1 RESIDENTE
1 DIA DE OBRA
- A las 10 am llegó la retroexcavadora y la volqueta y se comienza la actividad de demolición de adoquín y retiro del material
- Se mantiene la señalización de obra con letreros de inicio y colombinas con cinta de peligro.
- Se solicita a tránsito asistencia ya que después de las 2:00 pm hay constantes vehículos estacionados sobre la K 15, a las 4:00 no ha llegado ninguno de tránsito.
- Se evidencia la primera volqueta con retiro de material sobrante.
- Se requiere la gestión por parte de la alcaldía para el cambio de obra, en su defecto no nos conlleva a la suspensión de obra no imputable al contratista.
- Se evidencia la necesidad de un balanceo de obra ya que se encuentra actividades no relacionadas en el contrato.

[illegible]
Ing. Carlos M. Urbe.

INCA

ACTIVIDADES A PRESENTAR APD.

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LA SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS
- SE PRESENTARÁ EL APD CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LA K 15 con Calle 32 cortado. oriental, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
- Reparación e instalación de baranda acero a la estación, central de la K 15 con Calle 32.
- Reposición de caja con rejilla en concreto prefabricado, sobre el espacio público de la K 15 entre calles Calle 32 y 31, 32 (rejillas partidas y caja en mal estado)
- Hacer gestión con el acueducto para la recuperación de las tapas metálicas en las llaves de paso y de más registros inexistentes.
-

Powered by CamScanner

583

ACTIVIDADES A PRESENTAR APU.

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LA SIEMBRA DE ESPECIFICATIVAS
- SE PRESENTARA EL APU CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LA K15 con disco cortado. orientado), DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
- Reparacion e instalacion de baranda acero a la estacion central de la K15 con disco.
- Reposicion de caja con rejilla en concreto prefabricado, sobre el espacio público de la K15 entre calles disco 9 31, 32 (Rejillas partidas y caja en mal estado)
- Hacer gestión con el acueducto para la recuperacion de las tapas metálicas en las llaves de paso y demás registros inexistentes.
- CIERRE DE ACTIVIDADES 5:00 PM. TRASLADO RETROEXCAVADORA AL PARQUEADERO

MIERCOLES 17 DE ENERO /2024

- INICIO DE ACTIVIDADES 7:00 AM.
- RETIRO DE ADOQUINES DE SEPARADOR CON LA RETROEXCAVADORA.
- 8:30 AM LLEGADA VOLQUETA.
- CARGUE DE ADOQUIN REMANENTE A LA VOLQUETA.
- 10:00 AM DEJAMOS VOLQUETA CARGADA DE ADOQUIN RETIRADO DEL SEPARADOR
- 10:30 INICIO LABORES PALETEAR

ACTIVIDADES A PRESENTAR APO.

- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LA SEMBRADA DE ESPECIES NATIVAS
- SE PRESENTARA EL APO CORRESPONDIENTE AL SUMIDERO DE LA K15 con Q sobre costado oriental, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
- Reparacion e instalacion de baranda acero a la estacion central de la K15 con Q seca.
- Reposicion de CAJAS con rejilla en concreto prefabricado, sobre el espacio público de la K15 entre calle Q seca y 31, 32 (rejillas partidas y cajas en mal estado)
- Hacer gestión con el acueducto para la recuperacion de las tapas metálicas en las llaves de paso y demás registros inexistentes.
- CIERRE DE ACTIVIDADES 5.00 PM TRASLADO RETROEXCAVADORA AL PARQUEADERO

MIERCOLES 17 DE ENERO /2024

- INICIO DE ACTIVIDADES 7:00 AM.
- RETIRO DE ADOQUINES Y SEPARADOR CON LA RETROEXCAVADORA.
- 8.30 AM LLEGADA VOLQUETA.
- CARGUE DE ADOQUIN RETIRADO A LA VOLQUETA.
- 10.00 AM DESPACHO VOLQUETA CARGADA DE ADOQUIN RETIRADO DEL SEPARADOR
- 10:30 INICIO LABORES PALETEADA
- TAPA METALICA CODB UBICADA EN EL SEPARADOR DE LA CRA 15 CON CALLE 31. SE ENCUENTRA PARTIDA
- SE REALIZA LA RETIRO DEL ADOQUIN A MANO PUESTO QUE ESTE SE ENCUENTRA INSTALADO SOBRE LA PLACA DE CONCRETO DE LOS POZOS DE LA CODB
- 11:45 LLEGADA DE LA VOLQUETA
- 2:50 DESPACHO 2° VIAJE VOLQUETA


NKB

584

5:00 PM SE DIO POR TERMINADA LAS ACTIVIDADES CON LA PRESENCIA DE ADOQUIN HASTA LA CALLE 3

☒ JUEVES 18 DE ENERO DE 2024

- 7:00 AM. INICIO DE ACTIVIDADES
- DEMOLICION BANCOS EN CONCRETO Y PEDESTALES EN MAL ESTADO
- RECORRIDO PARA REVISAR EL ESTADO DE LAS RAICES DE LOS ARBOLES Y SU POSIBLE INTERVENCION -
- SE EVIDENCIA QUE EL ARBOL QUE ESTA UBICADO EN EL SEPARADOR Y QUE LEVANTO EL ADOQUINADO CERCA A LA ESTACION DE METROLINEA SOBRE LA CALLE 30 NO ESTA REFLEJADO EN EL PLANO ENTREGADO POR LA ALCALDIA. SE HIZO NECESARIO LA RELOCION DEL ADOQUIN PARA HACER EL TRATAMIENTO DE LAS RAICES, PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR
- DETALLE SECCION SARDINEL DEMOLIDO

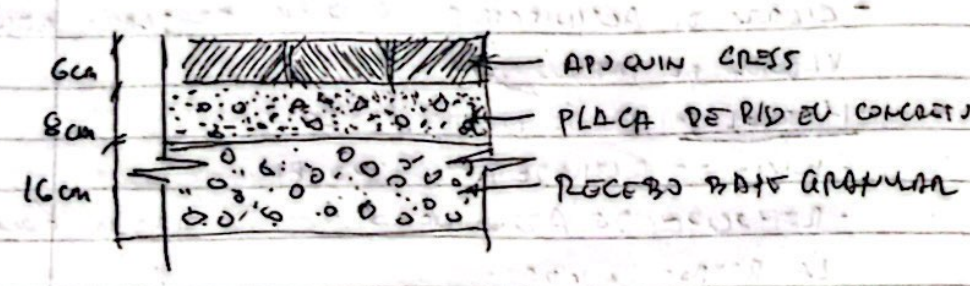

- 2:30 PM. SALE VIAJE DE ESCOMBROS. RCD.
- SE HACE DEMOLICION DE BANCOS DESDE LA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 31 EN AMBOS COSTADOS.
- SE DEBE TENER EN CUENTA OTRAS ACTIVIDADES QUE NO ESTAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL COMO SON
- TALA RADICULAR.
- DEMOLICION DE BORDILLOS Y ASFALTO X ML.
- PARA EL BALANCE SE DEBE TENER ENCUENTA LAS CANTIDADES REALES DE OBRA, ACTIVIDAD QUE SE INICIO EL DIA 19/01/2024
- SIENDO LOS 5:00 PM. SE RETIRO LA RETROEXCAVADORA Y HERRAMIENTA

NKB

☑ VIERNES 19 DE ENERO 2024

-7:00 AM. SE INICIAN ACTIVIDADES.

RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIONES CON RETRO Y LLENADO DE ESCOMBROS A LA VOLQUETA

* RECORRIDO CON EL FORESTAL PARA REVISAR Y CUANTIFICAR LA TALA RADICULAR.*

- SE REPLANTEA EL EJE RADIAL SOBRE EL REMATADOR DE LA CM 15 CON CALLE 31 FRENTE A LA PISCINA.

- PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PROTECTORES DE PALOS DE LOS ANDENES NUEVOS, SE PLANTEA LA COLOCACION CILINDROS PREFABRICADOS EN CONCRETO

- FALTA EL APU DE LA DEMOLICION DE CONCRETO SOBRE PLACAS DE SOTANOS UBICADOS DEBAJO DEL ANDEN DE LA CRA 15, HASTA LOCAL DE GASPOSOM

- REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO COMO PLACA DE LOCALES EN LA CRA 15.

8:30 AM DESPACHO DE LA VOLQUETA CON ESCOMBROS

- SE DA INICIO A LA REPARACION DE LAS BAJAS DE LA SEÑALETICA VANDALIZADA, DANDOLE ACABADO EN CEMENTO ESMALTADO

2:00 PM: LA TRAB. SOCIAL. ANDREA SE PASO PARA HACER ACOM

2:10 PM DESPACHO DE LA VOLQUETA CON ESCOMBROS

- SE INTENTO ROMPER EL BORDILLO DEL SEPARADOR UBICADO EN LA CALLE 30 PARA CONTINUAR EL POZO PROFUNDO,

- SE HICIERON VARIOS INTENTOS CON LA RETRO EXCAVADORA SIN RESULTADOS

- SE PROCEDIO A UTILIZAR EL MARTILLO ELECTRICO PARA DEBILITAR EL BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO

3:15 PM LLEGADA DE LA VOLQUETA PARA CARGAR ESCOMBROS

4:20 P.M. SALIDA VOLQUETA CARGADA CON ESCOMBROS


- EL MARTILLO ELECTRICO DEJO DE FUNCIONAR A LAS 4:35 PM

595

SABADO 20 DE ENERO DE 2024

7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES

- LA RETROEXCAVADORA CONTINUA CON LA DEMOSICION DE ESCOMBROS
- EL MAESTRO ELECTRICO SE LLEVA A MANTENIMIENTO
- SE CONTINUA CON LA MARCACION DE LOS CORTES DEL SEPARADOR DONDE SE CONSTRUIRAN LAS VADOS PEATONALES
- SE EVIDENCIA INCONGRUENCIA ENTRE LOS PLANOS:

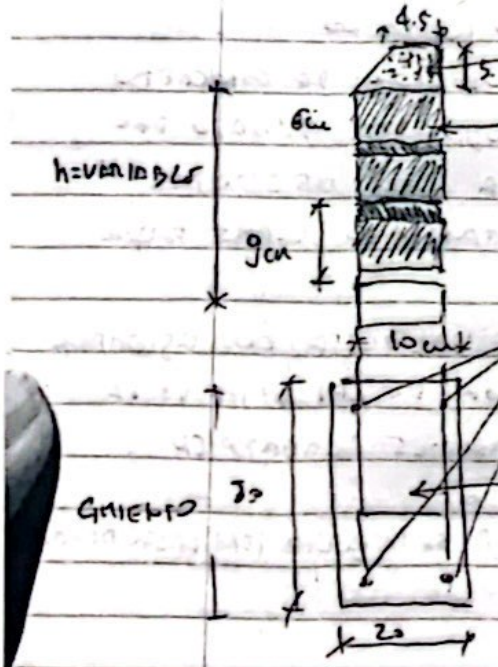

DETALLE JARDINERA CENTRAL DEMOLIDA

- LOS PLANOS DE DEMOLICION Y LOS DE DISEÑO DIFIEREN EN LAS LONGITUDES DE LOS PELOS PEATONALES Y LAS CANTIDADES DE JARDINES A DEMOLER
- NO ESTAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS LA DEMOLICION DE JARDINERA CENTRAL DE CADA ARBOL JUNTO CON SU CIMENTACION

8:35: LLEGADA VOLQUETA CONDUCTOR ANTONIO

9:10: LLEGADA VOLQUETA CONDUCTOR EPIFANIO GOMEZ

9:15 LLEGADA VOLQUETA CONDUCTOR JUAN DE JESUS PLAZAS

9:30 AM SALIDA VOLQUETA CONDUCTOR ANTONIO

Powered by CamScanner

10:30 SALIDA VOLANTE OBRACION EPIMATIO CON EICHBAUT
10:50 LLEGADA VOLVUETA POR ANTONIO
11:15 SALIDA VOLQUETA JUAN DE JESUS
12:30 m. cierre de actividades (12:30 am)

↳ LUNES 22 de enero 2024.

· Se inicia actividad del 7:00 am.

Replanteo de rampas para vados peatonales, de acuerdo a lo planteado x el supervisor el día lunes 16 de enero/24

Demolición de cordineles en sitios de los vados peatonales x

- Retiro de adoquín en sitios donde van los arboles nuevos. x

Los arboles son:

Arboles
- 8 arboles Cordia Sebestena. 1.5 mt.
- 8 " Heliocarpus Americanus 1.5 m
- 8 " Pakinsonia Aculeata 1.5 m.

Plantas
- 86 Plantas. Lantana Cámara (bandera española).
- 53. Plantas. Bella noche bl 11
- 92 " Hamelia Patens. (coralito)
- 92 Planta. cartucho roca Palmeta. (bevbena)
- 143 " Stachytarpheta Cayennensis. (Cayeno

SE HACE LIMPIEZA MANUAL DE LAS PARTES DE LOS ARBOLES EXISTENTES EN EL SEPARADOR PARA QUE EL CONCRETO LAS RECUBRA Y EMITIR EL CONCEPTO TECNICO SOBRE SU TRATAMIENTO

Se PROGRAMA COMITÉ DE OBRA PARA EL DIA DE MAÑANA MARTES 23 DE ENERO DE 2024 CON RECORRIDO A LOS OBRAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE HORA 7:30 AM.

LLEGÓ UNA COTIZACION DE PLANTAS DEL SR. ERNESTO BLANCO SE ESPERAN OTRAS DOS COTIZACIONES QUE INCLUYAN TAMBIEN LOS ARBOLES.

586

10:30 SALIDA VOLANTE ATENCION EPIMADIO CON FIGUEROA

10:50 LLEGADA VOLANTA POR AMIGO

11:15 SALIDA VOLANTA SUAV DE JESUS

12:30 m. cierre de actividades (12:30 am)

↳ LUNES 22 de Enero 2024.

- Se inicia actividad del 7:00 am.
- Replanteo de ~~rampa~~ vados peatonales, de acuerdo a lo planteado x el supervisor el día lunes 16 de enero/24
- Demolición de bordillos en sitios de los vados peatonales x
- Retiro de adoquín en sitios donde van los arboles nuevos x

Los arboles son:

Arboles	8	arboles Cordia Sebestena. 1.5 mt.
	8	" Heliocarpus Americanus 1.5 m
	8	" Pakinsonia Aculeata 1.5 m.
Plantas	86	Plantas Lantana Cámara (bandera española)
	53	Plantas Bella noche la 11
	94	" Hamelia Patens (coralito)
	92	planta cartucho Sabal Palmetto (Palma Sabal)
	143	" Stachytarpheta Cayennensis (Cayeno

- SE HACE LIMPIEZA MANUAL DE LAS ARVEJAS DE LOS ARBOLES EXISTENTES EN EL ALCORNOQUE PARA QUE LOS COJAN LAS RAICES Y EMITIR EL CONCEPTO TECNICO SOBRE SU TRASLADO
- Se programa comité de obra para el día de mañana MARTES 23 DE ENERO DE 2024 CON RECORRIDO A LOS OBRAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ESTRUCTURA HORA 7:30 AM.

Llegó una cotización de Plantas del Jardín pero se esperan otras dos cotizaciones que incluyan también los arboles.

Se ofertan las actividades del día 22 de enero a las 5:00 pm

- Demolición separador de la calle 51
- Retiro de raíces de árboles en el separador y del monte de adoquines para la siembra de árboles en espacio público de la cr 15. ambos costados.

- Martes 23 de enero/24.

7:00 AM INICIO DE LABORES

REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE OBRA CON SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INICIO 8:30 AM

- SE DEBE CAPACITAR LA CIUDADANÍA, LA UBICACIÓN DE LAS BANCAS, BASURERAS Y CICLOPARQUEADEROS.

SE DEBE CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA NO PACTADAS EN EL CONTRATO PARA HACER EL BALANCE.

SE DEBE HACER EL INVENTARIO DE LAS CANTIDADES DE PISO A REPONER, TAPAS DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL SUMIDERO SOBRE EL ACCESO AL VAGÓN DE METROLÍNEA A REUBICAR EN LA CRA 15 CON QUEBRADA SECA.

- SE APRUEBA EL TRASLADO DE LA SEÑAL DE TRÁNSITO UBICADA EN EL ANDÉN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA CBF
- SE HACE NECESARIO CONTAR EL CONCEPTO DE LA CDMB PARA INICIAR EL TRATAMIENTO DE RAÍCES Y FOLLAJE DE LOS ÁRBOLES A INTERVENIR.
- FRENTE A LA INCONFORMIDAD DE LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE BANCOS Y BASURERAS, EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA ARQ JORGE ALEJANDRO GARCÍA RECOMIENDA HACER UNA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LOS VECINOS DE LA OBRA, PARA MOSTRARLES LOS BENEFICIOS DE ESTAS ACCIONES DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CIUDAD CAMINABLE. Y PA

Powered by CamScanner

597

COMPARTAR CON ELLOS LA INSTALACION DE ESTE ELEMENTO

- LOS ALCORQUES METALICOS, DEFINITIVAMENTE DEBEN DESCARTARSE.
- SE INICIARA LA CONSTRUCCION DEL PRIMER PASO PEATONAL UBICADO EN EL SEPARADOR FRENTE A LA SEDE DE LA FISCALIA.
- EL CONTRATISTA SOLICITA REEF MODIFICAR LOS TIEMPOS DE LA OBRA, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS COMO LA REUBICACION DEL SUMIDERO EN LA AVENIDA DE ENTRADA AL VACON DE METRO-LINEA DE LA A. SECA.
- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO RECIBIR EL ANTICIPO DEL CONTRATO, SE VERA OBLIGADO A SUSPENDER LA OBRA.
- SE PROGRAMA REUNION CON LA COMUNIDAD PARA EL VIERNES 26 DE ENERO A LAS 4:00 PM EN EL JARDIN LA BRASA
- SE REQUIERE EL BALANCE Y LA REVISION DE LOS NUEVOS APU.
- LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISOR DE LA OBRA MANIFIESTAN QUE EL ANTICIPO ESTA SUPEDITADO A LA EXPEDICION CORRESPONDIENTE AL REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA
- 3:30 PM SE DA POR TERMINADA LA REUNION
- EN LA OBRA SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LOS BALDINES DEL SEPARADOR DONDE SE CONSTRUIRAN LOS PASOS PEATONALES
- IGUALMENTE SE REVISO EL ARBOLADO DONDE ESTARAN UBICADOS LOS ARBOLES NUEVOS.
- PREVIO SE DA INICIO A LA DEMOLICION DE LOS BORDES PERIMETRALES DE LOS CONTENEDORES DE RAICES DE LOS ARBOLES EXISTENTES
- EN EL SEPARADOR FRENTE A LA DIRECCION DE LA CRA 15 N° 30-69 SE ENCONTRO UNA ESTRUCTURA EN CONCRETO QUE SOBRESALE DEL NIVEL FINAL REQUERIDO
- SE PROCEDE A DESBASARLA PARA DEMOLER CON PISON

3

Powered by CamScanner

5:20 PM LLEGADA DEL SALTARIN Y MOTOCARGA
5:30 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES
MIERCOLES 24 DE ENERO DE 2024
7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
LIMPIEZA AREA DONDE ESTARA UBICADA LA RAMPA EN EL SEPARADOR DE LA CALLE 30


- DEMOLICION DEL ANDEN DONDE ESTARA UBICADO EL PAD PEATONAL EN LA ESQUINA SUR DE LA CRA 15 CON CALLE 31 - COSTADO OCCIDENTAL
- CORTE DE GANCHOS DE HIERRO SOBRE LA PLACA DE RODAMIENTO DE LOS VANOS DE LA CALLE 31 CON DETALLE



4 VARILLAS 3/8
L = 0.60 m VARILLA ESTRIBO

- DEMOLICION ANDEN PARA CONSTRUIR EL PAD PEATONAL EN LA CARRERA 15 CON CALLE 30, COSTADO ORIENTAL
- NIVELACION TERRENO PARA CONSTRUIR LOS BORDILLOS Y LA RAMPA DEL VADO PEATONAL DE LA CALLE 30
- SE HACE EL VOLANTEO DE LA INVITACION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL VIERNES A LAS 4:00 PM EN EL RESTAURANTE LA BRASA
- SE EXCAVO UNA BASE EN CONCRETO EN EL ANDEN ORIENTAL DE LA CRA 15 CON CALLE 31. DONDE VA A ESTAR UBICADA EL PAD PEATONAL. SE MEZCLARON PARA LOS CON HORMIGO DEMOLEDOR

DETALLE DEMOLICION PAD PEATONAL COSTADO OCCIDENTAL CRA 15 CON CALLE 30

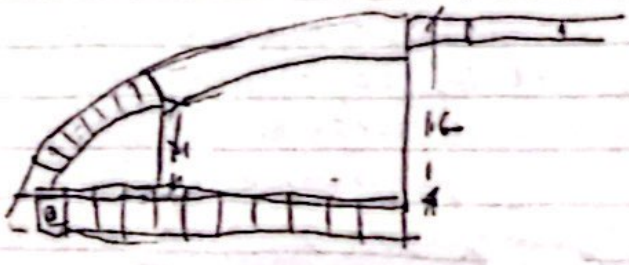

Powered by CamScanner

597


PARA FUNDIR POSTERIORMENTE EL CONCRETO PRETENSADO, LOS MUROS Y LA ESTRUCTURA SUPERIOR. TUMBO CON EL VANO Nº 6. SE HARAN PRUEBAS DE RESISTENCIA DE LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO PARA FUNDIR EL PILA Y PARTE DEL MURO SUMIDERO.

2:30 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES


FEB 19/20 7:00 A.M INICIO DE ACTIVIDADES

LUNES PRESENTES: KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, GILMIN VARGAS, JHON VARGAS, LUIS CARLOS RUGGE

SE PROCEDE A DEMOLER EL TUBO Y EL CONCRETO ENCONTRADO EN LA EXCAVACION

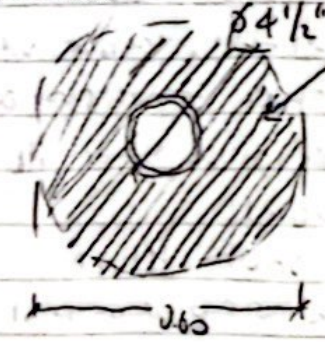

SE COLOCAN 36 GANCHOS DE 1/2" DEL GROSOR DEL CONCRETO

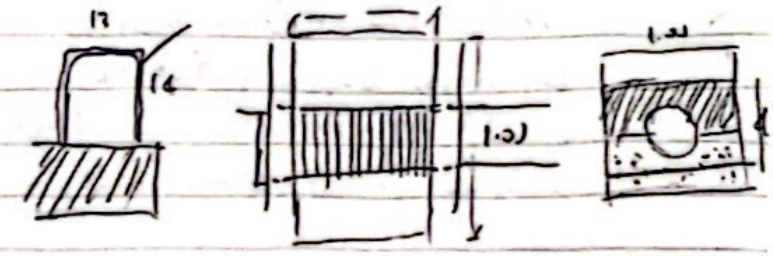

1:30 PM: SE DA INICIO DE FUNDIDA AL ATRAQUE DEL TUBO INSTALADO DE 12", CON CONCRETO SOBRE CAPA DE ARENA

2:00 PM SE INICIA LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DEL PILA DEL SUMIDERO NUEVO UBICADO EN LA QUEBRADA

FEB 20/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MARTES PRESENTES KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, ERWIN VARGAS, JHON VARGAS Y LUIS CARLOS RUEDA ALGUNOS TRABAJADORES NO SE PRESENTARON POR RAZONES DE SALUD.
SE INICIA ACTIVIDAD DE ARMADO DEL ACERO PARA LA FUNDICION DEL VIADUCTO #1 UBICADO EN LA CRA 15 CON AV. GUSTAVO SECA.
- SE FIJAN Y SE ARMAN EL ACERO DE LA PARTE SUPERIOR DE LOS SUMIDEROS NUEVOS Y ANTIGUOS PARA LA FUNDICION DE LOS MUROS Y TAPAS DE LOS DOS SUMIDEROS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

VISITA DEL ARQ. FELIPE RODRIGUEZ QUIEN VISITO A CONTROL DE PROYECTO, YA QUE VA A SER APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DE CONCRETOS DESDE EL LUNES DE LA SEMANA EN CURSO DE 4000 PSI

14:40 DESCANSO SOLICITADO. KILCER
ALGUNOS PLACAS DE PISO VIADUCTO #1 DE LA CRA 15 CON CRA 14

8:00 PM FIN DE ACTIVIDADES) PARA KIARA VEGA, LUIS CARLOS RUEDA Y BRAYAN
9:00 PM FIN DE ACTIVIDADES PARA PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, ERWIN VARGAS Y JHON VARGAS

FEB 21/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MIERCOLES PRESENTES PABLO VARGAS, ERWIN VARGAS, GIOVANNI VARGAS, JHON VARGAS, KIARA VEGA, LUIS CARLOS RUEDA Y BRAYAN
- PABLO VARGAS SOLICITA UN PERMISO PARA ASISTIR POR LA TARDE AL DIA ANTERIOR Y PARA RECUPERARLO A TODO, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LAVADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA

598

FEB 20/24 MARTES

7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTES KIANA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, ERWIN VARGAS, JHON VARGAS Y LUIS CARLOS RUEDA
ALEXIS TRILLOS NO SE PRESENTA POR RAZONES DE SALUD.
SE INICIA ACTIVIDAD DE ARMADO DEL HIERRO PARA LA FUNDICION DEL MURO PERIMETRAL N°1 UBICADO EN LA CRA 15 CON AV. GUBERNADOR SECA.
- SE PLIEGA Y SE ARMA EL HIERRO DE LA PARTE SUPERIOR DE LOS FUNDIDOS ANTIGUOS Y ANTICIPO PARA LA FUNDICION DE LOS MUROS Y PARTE DE LOS QUE SOBRANDO EL CONCRETO PREMEZCLADO DE 4.000 PSI.

VISITA DEL ARQ. FELIPE RODRIGUEZ QUIEN VIENE A REVISAR EL PROYECTO, YA QUE VA A SER APOYO DE UNA BANCA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LLEGO POR LLAMADA DE EL HIERRO CON SRA DE CONCRETO DE 4000 PSI
14:40 TERMINA SOLDAR. KLEBER
ALCANZO PLACA DE PIE VARO N°1 DE LA C. SECA CON CRA 15
8:00 PM PIN DE NOTIFICACION PARA KIANA VEGA, LUIS CARLOS RUEDA Y BRAYAN
9:00 PM PIN DE ACTIVACION PARA PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, ERWIN VARGAS Y JHON VARGAS


FEB 21/24 MIERCOLES

7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTES: PABLO VARGAS, ERWIN VARGAS, GIOVANNI VARGAS, JHON VARGAS, KIANA VEGA, LUIS CARLOS RUEDA Y BRAYAN
- PABLO VARGAS SOLICITA UN PERMISO PARA ACOMPAÑAR POR LA CABINA DE LA DIA ANTERIOR Y PARA RECORDARLES A TODOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LAVADO Y LIMPIEZA DE TODOS LOS IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LA OBRA

SE PROGRAMA EL RETIRO DE TABLEROS, PILARES Y ESCOMBROS DE LOS CONTENEDORES CONTINUAR Y SE ORDENA LA INSTALACION DE TABLEROS, CORTE Y FIGURADO DE LAS VARILLAS PARA LA FUNDIDA DE LOS CONTENEDORES DE PILAS N° 15-16-17-18 Y 19

SE INICIA CON LA DEMOLICION DE PLACA DE PISO DE LOS PASOS PEATONALES UBICADOS SOBRE LOS ANDENES DE LA CALLE 30.

DETALLE DEMOLICION PLACA PEATONAL NOR-ORIENTAL DE LA CARRERA 15 CON CALLE 30.

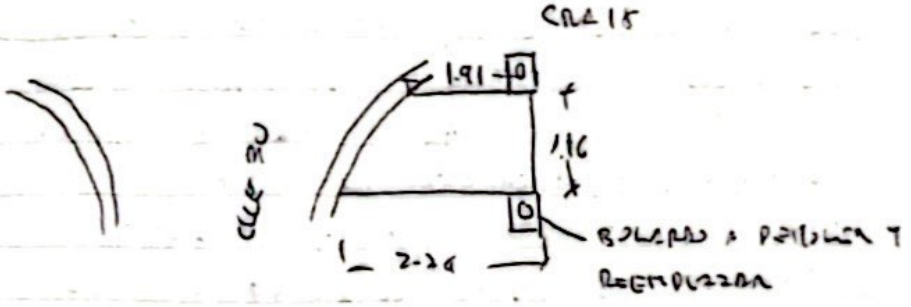

SE REPARA EL ANDEN NUEVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SUMIDERO NUEVO $1m^2$ APROX.

SE DEMUELE EL ANDEN PEATONAL DE LA CALLE 30 SOBRE EL PUNTO UBICADO Y SE INICIA LA DEMOLICION DE LA PLACA DE LA CALZADA NOR-OCCIDENTAL

SE REINSTALARON 4 BOLARDOS DE ACERO Y SE ANCLO EL CIMIENTO DE 4 CONTENEDORES PARA 1.00 DE VIDA DE LA BARANDA A LA OBRA. SOLICITAMOS LOS BOLARDOS EN LOS VANOS PARA IMPEDIR QUE LOS VEHICULOS LOS VUELVAN. PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS PILARES DEL PUENTE UBICADO EN EL PARQUE ORIGINAL DE LA CRA 15 CON CALLE 30 SE DEBE CONSTRUIR UNA ESCALERA PARA ELEVAR EL NIVEL DEL ANDEN Y LIBERAR LAS PILAS

Powered by CamScanner

599

FEB 24/24 7:00 AM INICIO DE LABORES
JUEVES PRESENTES KLEBER VEGA, PABLO VIVAS, GIOVANNI VIVAS
ERWIN VARGAS, JHON VARGAS Y BRAYAN
LOS LLEGADOS LUIS CHICA PUERTA Y ALEXIS TRILLERAS
MIENTRAS DE LOS DEL TIEMPO INCLEMENCIA SE OBSERVA
RESBALOSAMENTE EL DIA DE HOY
SE INICIA EL ARMADO DEL ENCOFRADO PARA FUNDIR 4
CONTENEDORES DE ASEOS, LOS NUMEROS 15, 16, 17 Y 18.
SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE LAS 7:30 AM DE FORMA
EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LO QUE VIA A
CONTRAR ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LAS MISMAS
ELIMINANDO RESPUESTA Y SACAR LA MUCHA DIFICULTAD
DE LA MEZCLADORA Y ASEO DE LAS MALLAS LIMPIEZA
AL TAMBOR Y LA CANCHERA DEL MISMO
/SE HACE EL DESENCOFRADO DE LOS DOS CILINDROS DE
PRUEBA DEL CONCRETO CON EL QUE SE FUNDIO LA
BASE DEL SUMIDERO NUEVO. EL LUNES PASADO.
EN LA TARDE SE TERMINAN DE ARMAR LOS MOLDES PARA
FUNDIR 5 CONTENEDORES DE ASEOS FALTANTES, ADEMAS
SE ARMAN LOS CAJONES PARA LOS MUROS
DOS PERSONAS CONTINUAN DEMOLIENDO Y LEVANTANDO LOS
LOSETAS TIPO ESTIBADAS PARA LOS POZOS PENDIENTES A
RECONSTRUIR
SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD PARA PROTEGER LOS TUBOS DE
LA RED MATRIZ DE AGUA, QUE FUERON ENCONTRADOS EN
LAS EXCAVACIONES DE LOS CONTENEDORES DE ASEOS (2)
5:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES

FEB 23/24 7:00 AM INICIO DE LABORES
VIERNES PRESENTES, PABLO, ERWIN, GIOVANNI, JHON, BRAYAN
Y KLEBER VEGA.
· FUNDIDA DE LOS VECINOS 5 CONTENEDORES DE ASEOS
· SE TERMINAN DE ARMAR LOS MOLDES RESTANTES
DE LA CALLE 32 #7 EL COSTADO OCCIDENTAL

SE CONTRU. LAS VARILLAS PARA ARMAR EL MARCO Y
SE LES HACE EL REFUERZO PARA ALISTARLAS PARA
LA FUNDICIÓN.
SE HACE LIMPIEZA DE PLEVE Y ESCOMBROS DE LOS
ANDENES OCCIDENTALES ENTRE LA D. LEES Y LA CALLE 31
SE DESENCOFRARON LOS DOS CILINDROS DE PRUEBA DE
CONCRETO REFORZADO EN SITIO
SE REALIZÓ LIMPIEZA DEL ÁREA FUNDIDA DE LA MEZZANINA
Y SE RETIRÓ, IGUALMENTE SE VIENEN RECUPLOTANDO LOS
FORMALETAS QUE SOSTENÍAN LA MUESTRA ANTERIOR

FEB 24/21 INICIO DE LABORES
SÁBADO PRELIMINARES
DESENCOFRADO DE LAS 8 COLUMNAS DE PRUEBAS
FUNDIDAS EL D.A DE AYER
SE HACE EL REFUERZO EN PARTE DE LA MEZZA Y SE
HACE ASEO.
SE ARMAN TRES PARRILLAS DE HIERRO PARA LAS
PRUEBAS PENDIENTES QUE SE
11:00 AM FIN DE ACTIVIDADES


FEB 26/21 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
LUNES PRESENTES: PABLO VARGAS, KEVIN VEGA, GUILLERMO VARGAS
LEIVA, VARGAS, ERICK VARGAS Y BRAYAN PINZON
LA MEZZANINA PRESENTA AVANCES EN EL SISTEMA DE
POLEAS Y CONTRAPESO. SE FUNDIERON LAS PARTES DE LA CALLE
30 CON 12, UNA FRANJA ANCHO COMPLETA Y ACERA DEL ANDEN
OCCIDENTAL
10:00 AM LLEGADA DE LA VOLQUETA CON 6m³ DE ARENA Y 6m³
DE TRITURADO. SE RETIRARON 2 VARILLAS DE PEGADERAS
FEB 27/21, 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MARTES SE DESENCOFRARON 6 PILOTES Y SE ARMARON TRES MALLAS PARA
FUNDIR
5:00 PM FIN DE ACTIVIDADES

Powered by CamScanner


600

28/02/2024 MIERCOLES. El supervisor de la obra, procede a dejar ajustes en rampas peatonales y otras vialidades

(1) Rampa peatonal costado sur-oriental cruce calle 30

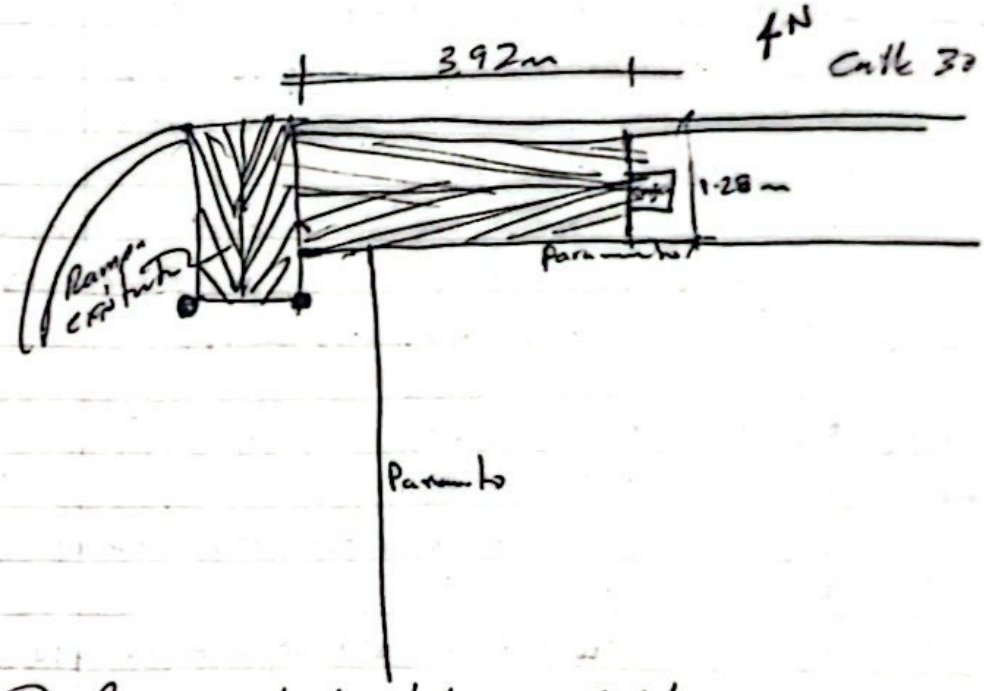


(2) Rampa peatonal costado nor-occidental cruce calle 32.

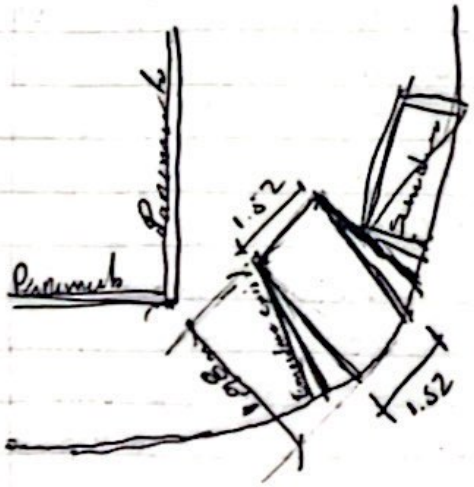

Powered by CamScanner

Visita supervisor Edgar Bayona con

Detalle bordes placa elevada Fachada Posterior
Metrolinea Olaya.

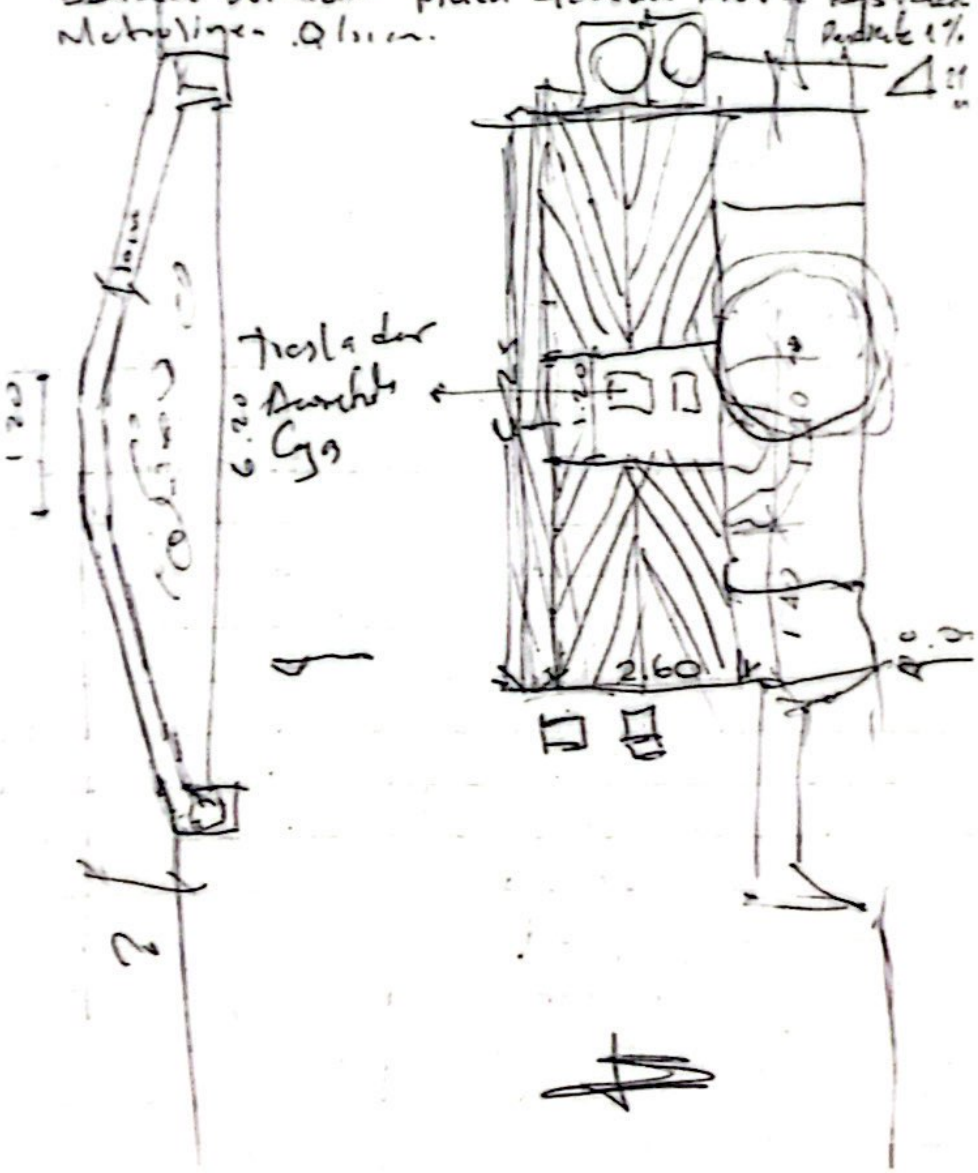


Powered by CamScanner

601


29/24. 2:00 PM INICIO DE ACTIVIDADES
SABADO PRESENTES: KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS
JUEVES JHON VARGAS, ERWIN VARGAS, BRAYAN PINZON
7:15 AM: LLEGADA DE LA RETROEXCAVADORA PARA FUNDIR 6 RAMPAS PEATONALES EN LOS ANDENES DE LA CRA 15 CON CALLE 31.
FUNDIDA DE 7 RAMPAS PEATONALES DE LA CRA 15 CON CALLE 31
00:?M FIN DE LAS ACTIVIDADES

1/03/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
VIERNES PRESENTES KIARA VEGA, PABLO VARGAS, JHON VARGAS
ERWIN VARGAS, BRAYAN PINZON
SE REALIZA EL DESENCOFRE DEL SARDINEL NUEVO CONSTRUIDO EN EL ENCHAPE Y DE UNOS DE METROLINEA DE LA GLORIETA SECA AL IGUAL QUE EL DESENCOFRE DE LA PLACA SUPERIOR DEL SUMIDERO EXISTENTE.
EN EL SITIO QUE ESTA UBICADO DEBAJO DEL ANDEN EN LA CRA 15 N 31-66 SE PROCEDIO DESPRENDIMIENTO Y CAIDA DE LA CAPA DE RECUBRIMIENTO INFERIOR DE LA PLACA ALIGERADA, DEBIDO A LA DEFICIENCIA DE LA RAMPA QUE ESTABA CONSTRUIDA AL COSTADO

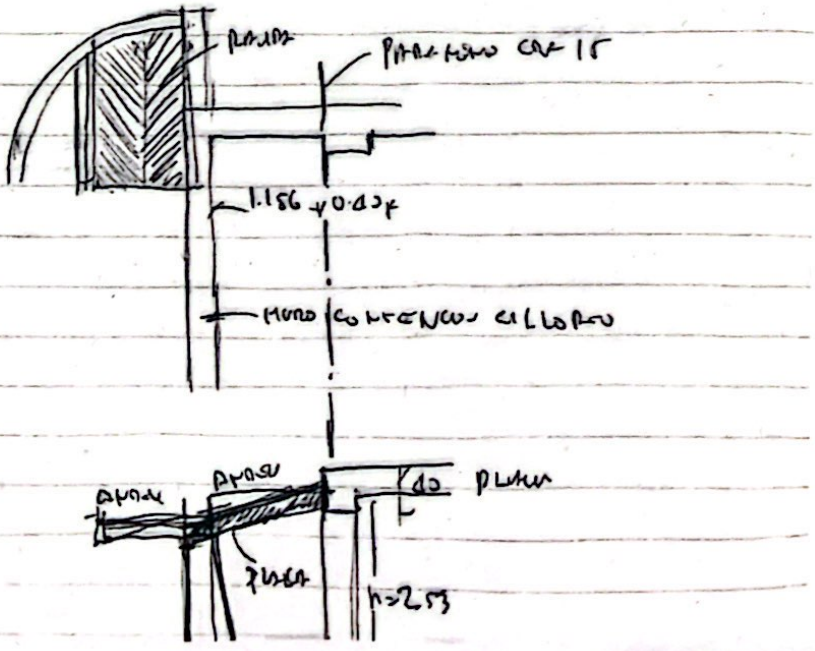

Powered by CamScanner

SE HACE DEVOLUCION DE RESPALDO DE LA RAMPA DE LA CALLE 30 CON CRA 15 EN EL ANDEN ORIENTAL PORQUE ESTA UBICADO EL SUMP

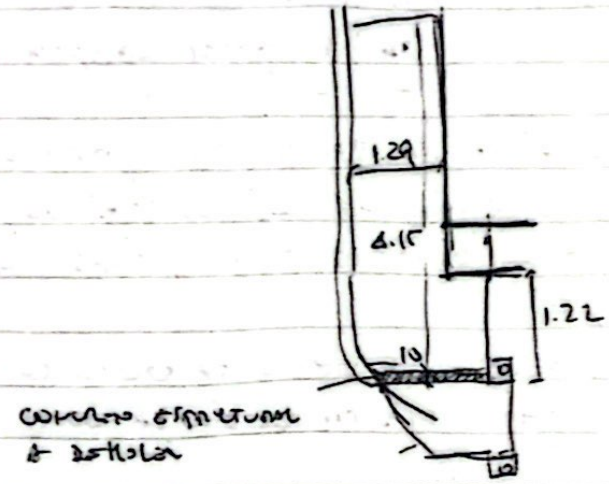

AUN NO LLEGADAS DE LAS BOLARDOS NUEVOS PARA SER INSTALADOS DEFINITIVAMENTE EN LAS 5 VIAS DEL SEPARADOR (5 POR VIAS)

2:00 PM LLEGADA DE LA VOLQUETA CON PLACAS ITC943 CON 6M³ DE TRITURADO Y 3M³ DE ARENA

SE HACE EL RELLENO DE LA RAMPA DE LA CRA 15 K 31-66 SE PARA LA ESTRUCTURA DE LA HUELLA Y SE COLOCA UN PLASTICO PARA QUE FUNCIONE COMO PELICULA IMPERMEABILIZANTE Y NO QUEDEN FILTRACIONES DE AGUA HACIA EL CONCRETO DE LA CANALETA PINOCHO

3:00 PM LLEGADA DE TUBOS EN HIERRO GALVANIZADO DE 2" Y GRAPAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRAL EN EL SEPARADOR.


8:30 SE PUNE CON LLAVE DE MANDO LA RAMPA PEATONAL EN LA CALLE 32 Y SE HACE ACOMPAÑADO ESMOBILIARIO

6:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES

2/03/21

602

SABADO 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTACION KLARA LUCIA, TODOS LOS DEMAS SHOW VARIOS,
GRUPOS VARIOS, Y BANDAS PINZON
SE INICIA LA FUNCION DE 3 BANDAS LOCALES EN
LA CALLE 33 CON CRA 15.
LA LABOR SE DIFICULTA POR LA FALTA DE COLABORACION
Y CUIDADO DE LA CIUDADANIA QUE EN TRES OCASIONES
HAN DAÑADO EL CONCRETO FRESCO, AFECTANDO EL
TRABAJO
SE ALISTAN, ENTOSH, PULEN Y SE COLOCA CONFETTERIA
A LAS TRES PLATINAS FLOTIDAS EL DIA DE HOY

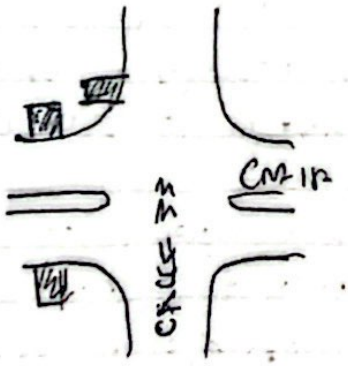


1:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES

Powered by CamScanner

2/03/24
SABADO

7:00 AM - INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTES KIMA VEGA, PABLO VARGAS, JHON VARGAS, EDWIN VARGAS, Y ANDRES PINZON
SE INICIA LA EXCAVACION DE 3 MANUALES UBICADOS EN LA CALLE 33 CON CRA 15.
LA LABOR SE DIFICULTA POR LA FALTA DE COLABORACION Y CUIDADO DE LA CIUDADANIA QUE EN TRES OCASIONES HAN DAÑADO EL CONCRETO FRESCO, AUNQUE ESTABAN EL CERRADO
SE ALISTAN, ENLOSA, PULEN Y SE COLOCA CONCRETO A LAS TRES PLANTAS EXCAVADAS EL DIA DE HOY

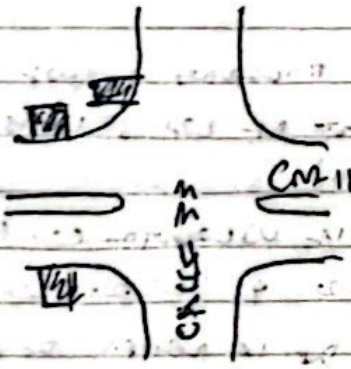

1:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES


04/03/24
LUNES

7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
ASISTENTES: PABLO VARGAS, OLO VARGAS, EDWIN VARGAS, JHON VARGAS, KIMA VEGA, ANDRES PINZON
INICIAN LABORES EN LA OBRA EL JARDINERO (MANUAL DUNAS, PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE ASPLANADO Y DESCAPOTE DEL AREA DEL SUPERMERCADO CENTRAL, PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS
9:00 AM INICIAN LABORES LOS SEÑORES OSWALDO, JORGE, EDWIN CASTILLO, LEONARDO


Powered by CamScanner

603


SE HACE EL REPLANTEO DE LOS VANOS PERIMETRALES EN EL SEÑALADOR PARA MARCAR LOS PUNTOS DONDE SE INSTALARAN LOS 25 BOLARDOS NUEVOS CON PULIDORA, CIZALLA, MARTILLO ELECTRICO SE REALIZARA LOS CORTES Y DEMOLICION DE LOS PISOS CUADRADOS EN LA PLACA, DONDE VAN UBICADOS LOS 25 BOLARDOS NUEVOS

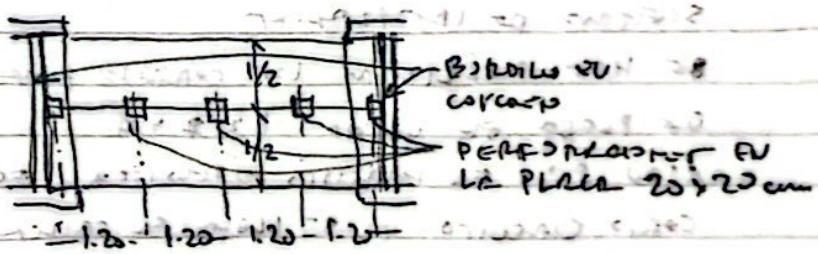

LOS BOLARDOS DEBEN UBICARSE A UNA DISTANCIA DE 1.20 m SEGUN INDICACION DEL ING SUPERVISOR DE LA OBRA. EDGAR BRYAN

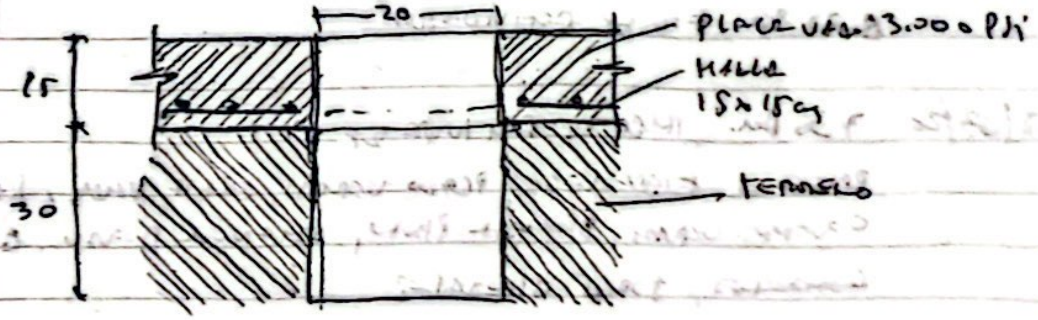

SE HACE LA DEMOLICION DE LOS DOS RAMPAS UBICADOS EN EL PARQUE OCCIDENTAL DE LA CRA 18 ENTRE CALLES 32 y 33

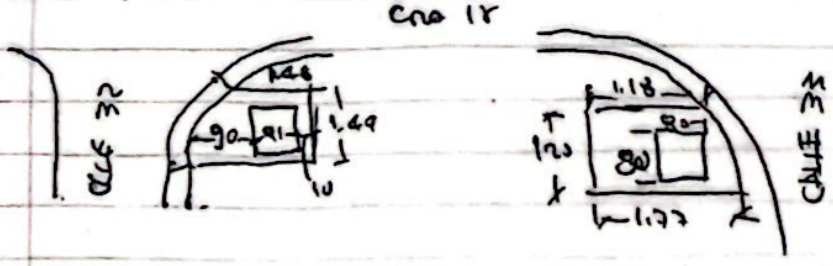

EL PROTECTADO DE LA CAFETERIA PINOCHO SOLICITO QUE SE ABLANDEN PARA RAMPLA. EL RESANE DEL SOTANO AFECTADO POR LA DEMOLICION DE LA RAMPA FRENTE A SU NEGOCIO

A:00 PM
SE INICIA LA DEMOLICION DE LAS RAMPAS (2)
UBICADAS EN EL ANDEN ORIENTAL DE LA CRA 15
Y AV. Q SOBRE LA UBICADA SOBRE LA AV. Q ENTRE
PASEANDO DE LA CRA 15
- EL SR. EMANUEL QUIERE HACER LA MEDICION DE LOS
PUNTOS Y M² DE POLISHEBRA, NECESARIOS PARA
PROTEGER EL ANDEN DEL SEPARADOR AL INICIAR LA
SIEMBRA DE LAS PLANTAS
SE HACE REALIZAN LOS CORTES PARA DEMOLICION
DE PLACA EN VEREDA 1, 2 Y 4
A:30 PM EL MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO PRESENTO
CORTO CIRCUITO Y SE LLEVA AL TALLER PARA LA REPARACION
EL SR PABLO VARGAS CONTINUA ABRIENDO LOS HUECOS
PARA LA REMOCION DE LAS RAMPAS

B:00 PM FIN DE ACTIVIDADES

05/03/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MARTES PRESENTES FABIAN VEGA, PABLO VARGAS, EDWIN VIVAS, JHON VOGAS
GIOVANNI VARGAS, BRAYAN PINO, EMANUEL DAVID, GOLMA CARREÑO
CRISTIAN, JORGE CORTAZAR, JHON GUTIERREZ
8:00 AM SE INICIA LA REMOCION DE LA RAMPA UBICADA EN LA
CRA 15 CON AV Q Y EL RETIRO DE CONCRETO
8:30 AM SE INICIA LA REMOCION DE LA RAMPA DE LA CALLE 33
CON CRA 15 EN EL COSTADO NOR OCCIDENTAL AL INICIAR QUE
LA RAMPA DE LA CALLE 32 CON CRA 15 ESTABA SIN ACCESIBILIDAD
SE INICIA LA REMOCION DE LOS BOLARDOS UBICADOS
EN LA VIA 1 Y 2.
SE DEJAN LAS PREFABRICADAS LISTAS DE LA VIA 2 PARA REMOCION
8:00 PM FINALIZA ACTIVIDADES

NICA

Powered by CamScanner

604

6/03/20 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Taylor
571496

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8:00 PM FIN DE ACTIVIDADES
7:00 PM FIN DE LA FUNCION DE LOS COMISIONES ALUMNOS


07/03/22 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MARTES PRESENTES: KIARA VEGA, ROSALIA VARGAS, CESAR VARGAS, OSKAR VARGAS, BRAYAN PINEDA, GIOVANNI VARGAS.
DOS PERSONAS E INCAPAZ TIENE FALTA VELA CALIFICACION
SE HACE LA CONOCIDA DE LAS DOS DE LOS TIPOS DE CONSTRUCCIONES PUBLICOS COLOCADOS EN LOS PUNTOS DEL CENTRO OCCIDENTAL DE LA CALLE ENTRE CALLES 32 Y 33 (2).
SE INICIA CON LA EXCAVACION DE LOS 4 COMPONENTES DE PUNTOS UBICADOS EN EL SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE
9:00 AM SE DEJA PARA EL ALMUERZO OTRA PODER VISITAR EN LA LOCALIDAD DE 17-41 PARA TRABAJAR EN LA NIVELACION Y EL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA PERFORACION DEL CEMENTERIO METALICO QUE SE INSTALARA EN EL SEPARADOR CENTRAL
PARA LA COLOCACION DE BARRAS LAS CANASTILLAS DE HIERRO QUE SE COLOCARAN COMO REFUERZO EN LOS CONTENEDORES DE PUNTOS DEL SEPARADOR DE LA CALLE 32
5:00 PM FIN DE ACTIVIDADES

08/03/22 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES.
VIERNES PRESENTES: KIARA VEGA, ROSALIA VARGAS, GIOVANNI VARGAS, OSKAR VARGAS Y BRAYAN PINEDA, TODOS EN PUNTO
- POR PETICION DE UNA SOLA SE REALIZA POR PARTE DE LA ESCUELA, UNA TOMATINA DE LIMPIEZA DE LAS BARRAS QUE LOS VECINOS DEL SECTOR, ANTES DE SEPARACION
- LA COMISION PRO-CONCRETO HACE LA RESOLUCION DE LOCALIZACION Y REPARTIDO DE LOS USOS DEL PROYECTO


Powered by CamScanner

605

28/03/24 RECORRIDO POR SUPERVISOR DE OBRA, DONDE BRINDA INSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO METALICO QUE DEBE SUJETARSE A LAS VARILLAS DEL SARDINEL EXISTENTE; COMO LO MUESTRA EL ESQUEMA:

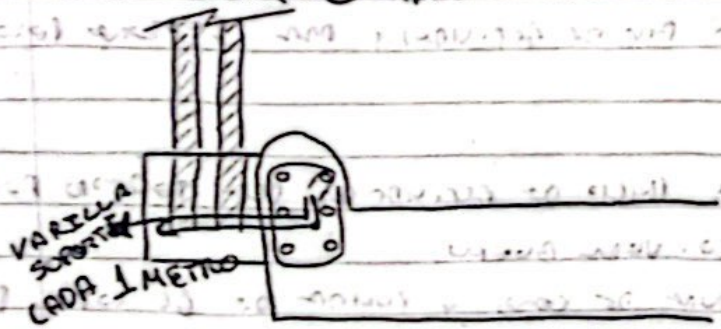

[illegible] EL SUPERVISOR [illegible] DEMOLER EL SARDINEL DE TERRAZA QUE SE ENCUENTRA EN EL BORDE ORIENTAL DEL PISO, LOCALIZADO ENTRE LOS EJES 2 Y 3.

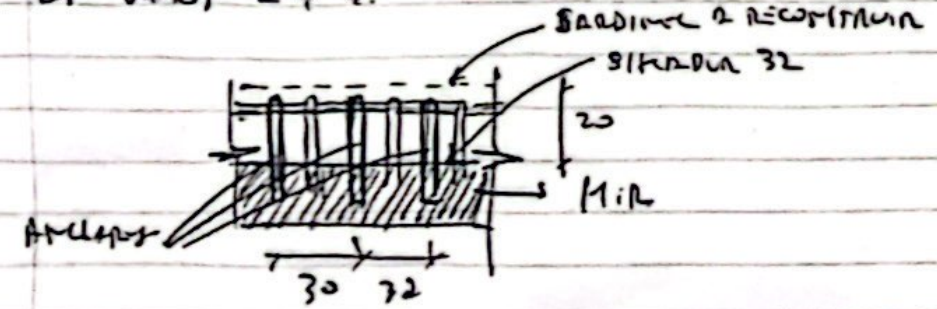

CON: USO APUNTALAMIENTO 4 CONTRAVIENTOS DE REFUERZO, POR LOS CONTRATISTAS DE PALIDOS DE SUSTENTACIÓN TECHOS PARA APOYO DE CONCRETO, SOLDADURA Y PULIDOS [illegible] EN EL DE LOS DEFINITIVOS

04/03/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
CONTROL PERSONAL KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS THAY VARGAS, DARWIN VARGAS, TEODORO PEREZ BARRAL PINZON PERSONAL INCAPACITADO FUERA DE GUAYANA Y RUTINA DE DIA APERTURA DE LA OBRA HABRA REUNIONES DIARIAS CON HABITANTES DE CONSTRUCCIÓN

[illegible] DE PARTES DE [illegible]
DE LA OPERATIVA PLANTA
PARA VERIFICAR HASTA [illegible] LOS CONTACTOS DE PRUEBAS
DE LOS CONTENEDORES DE PELLET (A) DEL ALMACEN
12:00 H FIN DE ACTIVIDADES
4:30 PM FIN DE ACTIVIDADES DEL TECNICO JOSE Y
MARCO

10/03/24 DOMINGO 7:30 AM INICIO DE ACTIVIDADES PARA TODOS PUNTOS Y MARCO - VERA BUENO.
SOLDADURA DE CONOS Y PULIDO DE GC CODO PARA EL CORRIMIENTO METALICO DEL SUPERHEATER
12:00 PM FIN DE ACTIVIDADES

11/03/24 LUNES 7:00 AM, INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTES: KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS JHON VARGAS, ERWIN VARGAS, BRAYAN PINZON, TECNICO PEDRO, MARCO VERA BUENO
SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL REFUERZO PARA LOS 4 CONTENEDORES DE PELLET VERIFICANDO LA NIVELACION PRESENCIA ENCONTRO DE DESECHOS EN MATERIAL POR HORNO MIC CON FUGA DE EL PELLET DE CONTENEDOR. SE HACE NECESARIO RECHAZAR LA CANTIDAD DE MATERIAL EN LA ESTRUCTURA
SE INICIA EL TRASLADO DE LA TUBERIA DE 2" PARA EL CONTENEDOR, HACIA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO
SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LOS CANASTOS PARA FUNDIR LOS 4 CONTENEDORES DE PELLET EN CERAMICA
5:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES

12/03/24 MARTES 7:30 AM INICIO DE ACTIVIDADES
PRESENTES KIARA VEGA, PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS ERWIN VARGAS, JHON VARGAS, BRAYAN PINZON. Y EN EL LOCAL DE ALMACENAMIENTO: TEC PEDRO Y MARCO BUENO

Powered by CamScanner

SE INICIA CON EL ARMADO DE FORMALETA Y
REFUERZOS PARA FUNDIR LA 2 CONTRAPESAS DE PARTES
DEL SEPARADOR
8.30 AM LLEGADA DE LA VOLQUETA GRIS IVY PARA
EL RETIRO Y DESTINO DE ESCOMBROS
11:30 SALIDA DE LA VOLQUETA HACIA LA ESCOMBRERA
11.40 AM SE INICIA LA FUNDIDA DE LA 4 CONTRAPESAS
DEL PILARES DEL SEPARADOR
EN EL TALUD DE CONTRAPESA CONTAMOS CON
SUMA DE 6 MTS DE PROFUNDIDAD DE TIERRA PARA DISPONER
EL ESPACIO DE RIPIUM
2:30 PM LLEGADA DE LA VOLQUETA GRIS IVY PARA
CARGAR EL SEGUNDO VIAJE DE ESCOMBROS DEL DIA
5:00 PM FIN DE LAS ACTIVIDADES

13/03/24 7:00 AM INICIO DE ACTIVIDADES
MIERCOLES PRESENTES: PABLO VARGAS, GIOVANNI VARGAS, EDWIN VARGAS
BRAYAN PINTO, JHON VARGAS, PEDRO PEREZ Y MARCO
VERA PUEYO.
SE DA LA CHARLA DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD
SE REALIZA EL DESENCOFRADO DE LOS 4 CONTRAPESAS
FUNDIDAS EN EL SEPARADOR
SE INICIA EL REPLANTEO Y NIVELACION DE LA VIGA
EN CONCRETO REFORZADO PARA EL EMPALMAMIENTO METALICO
10:00 AM LLEGADA DE LA VOLQUETA PLACA DESIGNADA DE GIOVANNY
- SE PARCHE EL RELLENO DE LOS CONTRAPESAS DEL SEPARADOR
EN MATERIAL DE PRESTAMO
- UNAS BOTELLAS ENCONTRADAS EN EL SEPARADOR
LOS HABITANTES DE CALLE.
EL DESENCOFRADOR SOLICITE RECARGA LA PUNTUAL PARA
CAMBIAR LOS EXTINGUIDORES
4:00 PM LLEGADA DE LA VOLQUETA CON 4 m³ DE ARENA Y
3 m³ DE TRITURADO DE 3/4"

2:00 PM. FIN DE LAS ACTIVIDADES

16/07/24 2:00 PM INICIO DE ACTIVIDADES

JUEVES PRESENTES: PABLO VARGAS, ERWIN VARGAS, GIOVANNI JIRON VARGAS, BRAYAN PINEDA, KIARA VEGA Y [illegible] TALLER DE CAMPAMENTO PIONERO, REUNIDOS PARA LA ACTIVIDAD.

SE INICIA LA ACTIVIDAD DE LOS 5 MINUTOS DE CALENTAMIENTO.

3:30 PM. SE INICIA LA CAMINATA DEL GRUPO DE 5 PERSONAS PARA LA VIGA QUE CONTIENE EL CEMENTO.

ANEXO 4

ACTAS REUNIONES

Powered by CamScanner

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 5

607

ACTA No.	01.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 CON AV QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33

Lugar: K. 15 entre Av. Quebrada seca y la calle 33	**Fecha:** Enero 23 / 2024.
Hora Inicio: 7:30 am.	**Hora Fin:**

TEMAS A TRATAR: Varios

- Demoliciones
- Actividades y obras para socializar si se hacen o no
- Sumidero longitudinal Av Quebrada seca - Cra 15 costado oriental.
- Programación vs avance (90% avance en demolición y desmonte).
- Trámite del anticipo.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se debe definir las siguientes actividades para con la comunidad. →


1. Instalación de vallas y canecas
   - Los alcaldes tienen rejilla, se debe tener en cuenta que esta rejilla se la roban.
   - Los cerramientos; bolardos fueron definidos en donde se instalan y en donde no se instalan.
   - El arq. Secretario de infraestructura y el supervisor Mg Yona. Sugieren programar una reunión urgente con la comunidad y socializar estas actividades.
   - se va arrancar con el primer tramo (cra 10).
   - El contratista solicita revisar el tiempo de la obra debido a los no previstos, como el sumidero, se pasará la petición a la supervisión con todo el análisis.

Cra 15.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS:

- Se precisa reunion con la comunidad el viernes 26 enero 4 pm x
- Se requiere el balance la reunion de bruno-s A.P.
- Anticipo supeditado a la expedicion correspondiente al registro presupuestal de reserva x

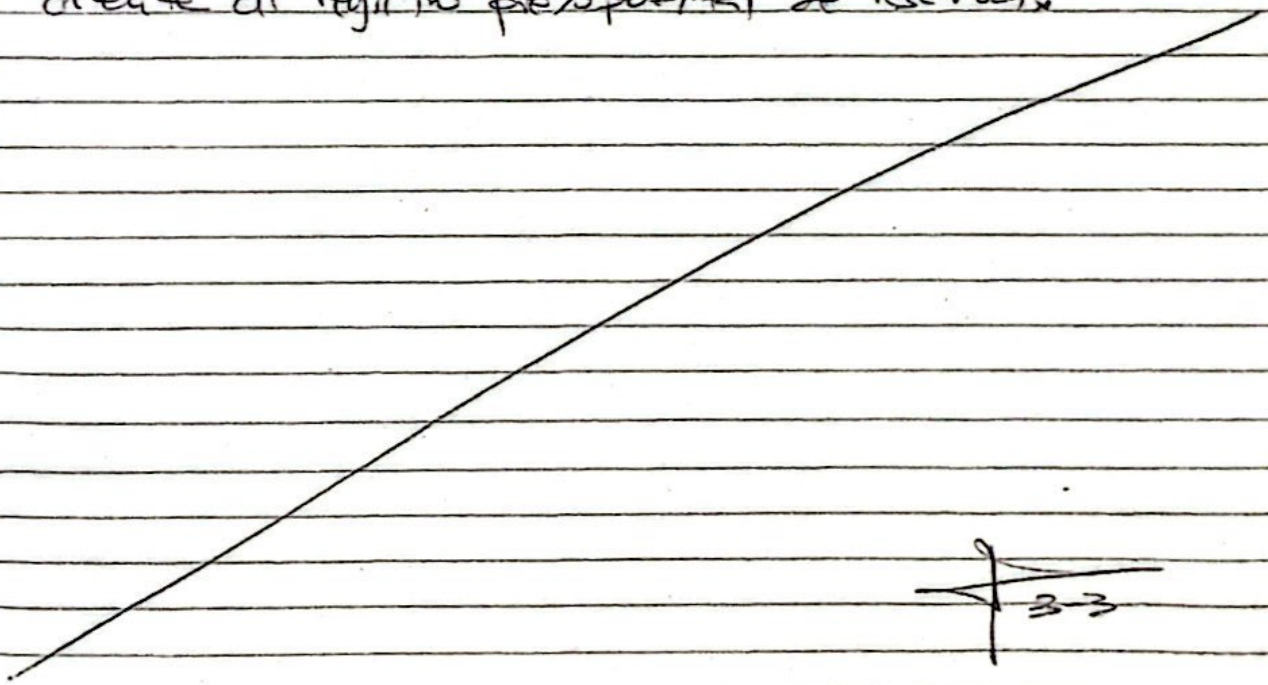

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edgar Bayona Florez	Supervisor Obra	
Carlos M. Uribe	Contratista	
Guillermo Diaz	Arq contratista	
Alejandro Gonzalez	Interventoria	
