ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

2024 02 26 536.021.563,00

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL S.A.

RECIBÍ: CONSORCIO MEJORAMIENTO HOS

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
24010101	BCO Caja Social Cta 26504943391	0.00	536.021.563,00
	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	536.021.563,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
235	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	544.444.797,00

Detalle : PAGO FAC FEV6 POR REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA ESE HRD, S/G ADICION No. 01 DE 2024 AL CONTRATO No. 004 DE 2023 .

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2023

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 20 de febrero de 2024
ACTA No.	05 Mes FEBRERO
OBJETO	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN
NIT/CC	NIT. 901729479-2 R/L. C.C. 1.049.638.664 DE TUNJA
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	No. 557 del diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023) RUBRO 2.1.2.02.02.008.04 MANTENIMIENTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472)
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	No. 1149 del doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023) RUBRO 2.1.2.02.02.008.04 MANTENIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	24 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	9455018050
CARGO DE SUPERVISOR	Subgerente Administrativa
VALOR ADICIÓN 1	Novecientos setenta y seis millones seis cientos once mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 976.611.450)
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	331 del 30 de enero de 2024, rubro 212020200804 Mantenimiento
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	391 del 09 febrero de 2024
VALOR ADICIÓN 2	N.A.
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL(No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
VALOR ADICIÓN 3	N.A.
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N.A.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
MODIFICACION EN VALOR 1	N.A.
MODIFICACION EN VALOR 2	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($4.697.378.922)
PRORROGA 1	*SIETE (7) DIAS CALENDARIO*
PRORROGA 2	30 días calendario
PRORROGA 3	61 días calendario
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	8 MESES y OCHO (8) DIAS CALENDARIO

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 3.720.757.472,00*	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	*$ 976.611.450*	
VALOR REDUCCIONES	*$ 0,00*	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTA ACTA		*$ 3.256.532.385,00*
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*$544.444.797,00*
SALDO A EJECUTAR		*$ 896.391.740,00*
SUMAS IGUALES	***$ 4.697.378.922,00***	***$ 4.697.378.922,00***

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato

En constancia se firma a los 20 días del mes de febrero del año 2024

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR
Erika Natalia Sánchez Medina

SUPERVISORA HRD

ANEXOS:

- Acta parcial suscrita por el supervisor y contratista en dos copias.
- Factura o cuenta de cobro en original y copia.
- Informe de avance y seguimiento de actividades del mes firmado por el contratista y el supervisor en dos copias.
- Soporte de Planilla de Seguridad Social del correspondiente al mes facturado en dos copias
_Para el caso de cesiones, se debe anexar copia de acta de cesión y Registro de Compromiso Presupuestal

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
901.729.479-2
CLL 26 6 56 OF 101 ED SAN JORGE
(311) 8617112
Tunja - Colombia
silyconingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta N°. FEV 6

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Nit: 891.855.438-4
Teléfono: (608) 7632330 - Ext. 1506
Dirección: Av de las Américas #Carrera 35
Ciudad: Duitama - Colombia
Correo: subadministrativa@hrd.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	20/02/2024, 10:47
Expedición	21/02/2024, 10:52
Vencimiento	20/02/2024
Vendedor	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo 2	
1	Acta Parcial # 5.Contrato No. 004-2023 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA,CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	418,803,689.62		0 %
2	ADMINISTRACIÓN 20%	83,760,737.92		0 %
3	IMPREVISTOS 5%	20,940,184.48		0 %
4	UTILIDAD 5%	20,940,184.98		0 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 544,444,797.00

Observaciones:
AMORTIZACION AL 30%

Total Bruto	541,101,406.12
IVA 19%	3,343,390.88
Total a Pagar	544,444,797.00

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S - NIT 901.400.064 - 40%
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA - Cédula de ciudadanía 7.173.560 - 60%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764054391870 aprobado en 20230824 prefijo FEV desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 142dbd51e0fca47b89d390c6d20ea9a23f94d28614b3df7b04a26b7c40fe7740f52bdd471f46ef5bedb00498331b7f93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
2023

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.638.664 de Tunja, en Representación Legal del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), están pagados durante los últimos seis (6) meses.

Yo, JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, dela Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 identificado con NIT No. 901.729.479-2, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ServicioNacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se certifica, en Tunja a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2024.

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPPITALARIO 2023
GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON
CONTRATISTA
CC. 1049638664

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 165.295-T

SILYCON INGENIERÍA SAS

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.638.664, en Representación del SILYCON INGENIERIA SAS, identificado con Nit. 901400064-6, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), están pagados durante los últimos seis (6) meses.

Yo, **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público de SILYCON INGENIERIA SAS, identificado con Nit. 901400064-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se certifica, en Tunja a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2024.

GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON
CC. 1049638664
Representante legal CBD

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
Contador Público

Jorge Alberto
Villamil Mora
Ingeniero Civil

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.560, en Representación propia, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), estan pagados y al dia durante los últimos seis (6) meses

Yo, JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA identificado con NIT No. 7.173.560, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), estan pagados y al dia durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se certifica, en Tunja a los veinte *(20) días del mes de* Febrero *de 2024.*

JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA
CONTRATISTA
CC. 7173560

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165.295-T

Calle 26 # 6 - 56 Of. 101 Tunja. Tel: 313 297 7457 - 7470779 E-mail: jorgevillamil77@gmail.com

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

Hospital

ITAL REGIONAL DE DUITAMA	
NE RECIBO PARCIAL No. 05	
Fecha:	
9 FEBRERO DE 2024	

OBJETO:
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 — NIT. 901729479-2
RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON — C.C. 1.049.638.564

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
APOYO A SUPERVISION
CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
INTERVENTORIA
SC BUILDINGS SAS — NIT. 901235035-9
R. L. SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO — C.C. 1.049.644.870
DIRECTOR INTERVENTORIA: SERGIO CAMARGO

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
PRORROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO
Fecha de Suscripción No. 1	29 diciembre de 2023
Fecha de Reinicio No. 1	9 de enero de 2024
PRÓRROGA No. 02:	30 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 03:	61 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	8 MESES Y 8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	19 DE ABRIL DE 2024

DATOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATADO:	$ 3,729,757,472.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,118,327,241.60
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 976,611,450.00
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 4,697,368,922.00
ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 1,118,227,241.60
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$
VALOR PENDIENTE POR PAGAR:	$ 896,391,740.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	$ 874,717,487.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	$ 772,764,445.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	$ 1,021,895,799.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4	$ 597,219,684.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5	$ 544,444,787.00

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 4. DEL 09/01/2023				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01. DEL 18/10/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL 22/11/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL 20/12/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04			PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05			TOTAL ACUMULADO		
DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. (M+/M-)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUBIERTA																										
ACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA ALTURA MAYOR DE 3 MTS (INCLUYE ANDAMIO CADO ISO 9001)	MC	5,331.60	$ 6,357.00	$ 33,889,167.00	-	5,073.65	$ 6,357.00	$ 32,253,193.05		6,357.00	$ -		6,357.00	$ -		$ 6,357.00	$ -		$ 6,357.00	$ -		$ 6,357.00	$ -	0.00	6,357.00	$ -
NTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE CLUYE POLEAS Y MANLAS	M2	5,331.60	$ 11,926.00	$ 63,577,505.00	-	4,819.72	$ 11,926.00	$ 57,479,980.72	1,068.57	11,926.00	$ 12,750,551.14	931.86	11,926.00	$ 11,111,227.61	1,239.59	$ 11,926.00	$ 14,782,217.37	785.32	$ 11,926.00	$ 9,362,541.45	784.27	$ 11,926.00	$ 9,353,156.32	4,819.73	11,926.00	$ 57,480,694.02
ORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE ASBESTO CEMENTO A SITIO AUTORIZADO	KG	53,972.0	$ 600.00	$ 32,383,200.00	-	82,454.07	$ 600.00	$ 49,496,442.00		600.00	$ -	33,790.00	600.00	$ 20,720,000.00	28,340.00	$ 600.00	$ 16,804,000.00	8,200.00	$ 600.00	$ 4,920,000.00	13,650.00	$ 600.00	$ 8,190,000.00	82,980.00	600.00	$ 49,254,000.00
TRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 28 TIPO HE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	M2	4,681.9	$ 203,928.00	$ 542,532,763.92	-	4,569.73	$ 203,928.00	$ 930,996,371.44	1,068.57	203,928.00	$ 218,014,269.96	931.86	203,928.00	$ 189,985,842.97	661.60	$ 203,928.00	$ 135,582,008.00	463.69	$ 203,928.00	$ 95,579,014.32	781.27	$ 203,928.00	$ 159,331,796.95	4,114.61	203,928.00	$ 835,124,574.72
TRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO HE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER, CIRCULACIONES SISTENCIAL	M2	710.00	$ 218,169.00	$ 154,899,990.00	+	704.92	$ 218,169.00	$ 153,781,681.48		218,169.00	$ -		218,169.00	$ -	378.60	$ 218,169.00	$ 82,575,875.66	326.43	$ 218,169.00	$ 71,215,615.83		$ 218,169.00	$ -	704.92	218,169.00	$ 153,791,681.48
TRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	ML	642.60	$ 48,217.00	$ 26,133,514.00	+	1,231.53	$ 48,217.00	$ 59,358,040.33	201.75	48,217.00	$ 9,727,779.75	282.03	48,217.00	$ 13,596,649.51	323.19	$ 48,217.00	$ 15,578,912.70	262.70	$ 48,217.00	$ 12,665,835.90	147.12	$ 48,217.00	$ 7,906,056.89	1,216.79	48,217.00	$ 58,668,034.75
TRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y S SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)	KG	50,840.79	$ 17,133.00	$ 871,055,253.07	-	52,949.17	$ 17,133.00	$ 1,078,516,409.41	15,837.08	17,133.00	$ 267,939,784.12	11,995.10	17,133.00	$ 205,357,924.12	11,577.87	$ 17,133.00	$ 198,383,569.31	6,250.50	$ 17,133.00	$ 107,076,764.14	10,750.36	$ 17,133.00	$ 184,162,506.91	56,241.79	17,133.00	$ 963,580,543.70
TRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y S SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS) CIRCULACIONES AREA ASISTENCIAL	KG	7,810.00	$ 20,086.00	$ 156,871,660.00	-	9,763.04	$ 20,086.00	$ 196,092,141.44		20,086.00	$ -		20,086.00	$ -	5,087.98	$ 20,086.00	$ 101,754,578.28	4,715.09	$ 20,086.00	$ 94,707,267.20		$ 20,086.00	$ -	9,763.05	20,086.00	$ 196,502,365.97
TRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA US)	KG	1,000.00	$ 23,870.00	$ 23,870,000.00	-	0.00	$ 23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		$ 23,870.00	$ -		$ 23,870.00	$ -		$ 23,870.00	$ -	0.00	23,870.00	$ -
TRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL. 22	ML	50.00	$ 108,481.00	$ 5,424,050.00	-	30.60	$ 108,481.00	$ 3,321,420.00		108,481.00	$ -		108,481.00	$ -		$ 108,481.00	$ -		$ 108,481.00	$ -		$ 108,481.00	$ -	0.00	108,481.00	$ -
RO E INSTALACIÓN CABALLETE METALICO ALTURA MAYOR DE 3 MTS	ML	336.00	$ 89,070.00	$ 29,927,520.00	-	294.69	$ 89,070.00	$ 26,255,580.00	41.35	89,070.00	$ 3,683,044.50	56.00	89,070.00	$ 4,987,920.00	91.90	$ 89,070.00	$ 8,185,533.00	55.05	$ 89,070.00	$ 4,903,303.50	46.19	$ 89,070.00	$ 4,113,017.10	293.41	89,070.00	$ 25,865,818.10
DE CANAL EXISTENTE	ML	668.04	$ 9,155.00	$ 3,448,942.20	-	593.87	$ 9,155.00	$ 3,086,143.85	123.33	9,155.00	$ 535,766.15	100.68	9,155.00	$ 612,005.49	100.33	$ 9,155.00	$ 980,998.50	102.25	$ 9,155.00	$ 627,098.75	63.86	$ 9,155.00	$ 329,160.30	580.42	9,155.00	$ 2,992,065.10
RO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO	ML	669.66	$ 79,272.00	$ 53,006,015.52	-	593.87	$ 79,272.00	$ 47,497,768.24	123.33	79,272.00	$ 9,776,615.76	100.68	79,272.00	$ 7,981,101.96	100.33	$ 79,272.00	$ 15,905,461.80	102.25	$ 79,272.00	$ 8,105,562.00	63.86	$ 79,272.00	$ 5,062,309.92	580.42	79,272.00	$ 46,011,054.24
DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	61,840.79	$ 3,336.00	$ 172,640,875.44	+	72,732.82	$ 3,336.00	$ 242,658,697.52	15,837.08	3,336.00	$ 52,165,232.16	11,995.10	3,336.00	$ 39,985,813.78	16,845.82	$ 3,336.00	$ 65,630,467.86	10,012.73	$ 3,336.00	$ 33,401,872.28	10,750.16	$ 3,336.00	$ 35,862,536.63	65,531.85	3,336.00	$ 219,948,753.71
FACHADA																										
DE FACHADA CON HIDROLAVADORA	M2	4409.74	$ 2,789	$ 12,298,764.86	-	1,922.08	$ 2,789.00	$ 13,737,681.12	1,364.74	2,789.00	$ 3,805,959.85	1,097.07	2,789.00	$ 3,059,725.41	327.58	$ 2,789.00	$ 913,620.62		$ 2,789.00	$ -		$ 2,789.00	$ -	2,791.39	2,789.00	$ 7,787,305.91
DE FACHADA CON HIDROLAVADORA ANCHO MENOR A .60MTS	ML	2365.86	$ 1,395	$ 3,328,274.70	=	3,014.26	$ 1,395.00	$ 4,205,019.25	1,189.05	1,395.00	$ 1,658,766.69	502.71	1,395.00	$ 701,269.45	199.46	$ 1,395.00	$ 278,246.70		$ 1,395.00	$ -		$ 1,395.00	$ -	1,891.25	1,395.00	$ 2,638,283.75
ÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	776	$ 36,472	$ 28,285,600.00	-	430.37	$ 36,472.00	$ 15,690,454.64	293.65	36,472.00	$ 10,711,461.68	9.59	36,472.00	$ 251,585.80	47.50	$ 36,472.00	$ 1,732,420.00		$ 36,472.00	$ -		$ 36,472.00	$ -	348.93	36,472.00	$ 12,955,538.48
TE	M2	4409.74	$ 8,939	$ 39,418,665.86	-	5,507.96	$ 8,939.00	$ 49,235,654.44	1,704.42	8,939.00	$ 15,236,833.86	1,097.07	8,939.00	$ 9,806,690.73	565.78	$ 8,939.00	$ 5,057,507.42		$ 8,939.00	$ -		$ 8,939.00	$ -	3,367.27	8,939.00	$ 30,100,035.47
TE ANCHO MENOR A 0.60MTS	ML	661.461	$ 4,469	$ 2,956,069.21	=	3,968.63	$ 4,469.00	$ 17,465,209.52	0.00	4,469.00	$ -		4,469.00	$ -	2,784.93	$ 4,469.00	$ 12,445,097.97		$ 4,469.00	$ -		$ 4,469.00	$ -	2,784.93	4,469.00	$ 12,445,097.97
FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	4409.74	$ 17,558	$ 77,426,214.92	-	4,849.62	$ 17,558.00	$ 85,149,527.56	1,127.24	17,558.00	$ 19,792,165.42	268.60	17,558.00	$ 4,714,306.44	1,313.18	$ 17,558.00	$ 23,056,885.36		$ 17,558.00	$ -		$ 17,558.00	$ -	2,708.93	17,558.00	$ 47,563,326.22
FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHO MENOR A 0.60MTS	ML	2365.86	$ 8,769	$ 20,921,699.34	=	3,486.48	$ 8,769.00	$ 30,520,153.74	964.26	8,769.00	$ 8,456,353.25	78.65	8,769.00	$ 693,277.14	1,309.05	$ 8,769.00	$ 11,479,559.45		$ 8,769.00	$ -		$ 8,769.00	$ -	2,357.30	8,769.00	$ 20,671,869.84
IMPERMEABILIZADO	M2	825	$ 30,757	$ 25,374,525.00	-	913.59	$ 30,757.00	$ 28,096,519.50	223.45	30,757.00	$ 6,872,682.34		30,757.00	$ -	47.83	$ 30,757.00	$ 1,471,250.34		$ 30,757.00	$ -		$ 30,757.00	$ -	271.28	30,757.00	$ 8,344,082.67
IMPERMEABILIZADO ANCHO MENOR A 0.60MTS	ML	360	$ 15,335	$ 5,520,960.00	-	694.44	$ 15,335.00	$ 10,494,571.84	169.94	15,335.00	$ 2,764,169.64	129.31	15,335.00	$ 1,891,082.16	43.96	$ 15,335.00	$ 674,170.56		$ 15,335.00	$ -		$ 15,335.00	$ -	347.51	15,335.00	$ 5,329,413.36
ON FILOS	ML	360	$ 9,834	$ 3,540,240.00	+	597.30	$ 9,834.00	$ 4,985,788.20		9,834.00	$ -	176.41	9,834.00	$ 1,243,115.94	43.96	$ 9,834.00	$ 432,329.64		$ 9,834.00	$ -		$ 9,834.00	$ -	170.37	9,834.00	$ 1,675,445.58
EN GRANALLAS	M2	925	$ 33,819	$ 27,990,675.00	+	1,661.53	$ 33,819.00	$ 52,822,910.67	577.16	33,819.00	$ 19,519,572.64	593.22	33,819.00	$ 17,018,441.63	160.45	$ 33,819.00	$ 5,425,649.81		$ 33,819.00	$ -		$ 33,819.00	$ -	1,249.83	33,819.00	$ 41,963,666.87
VENTANERIA																										
AMPA LINEAL 3 MANOS ANCHO HASTA 60 CM 3 CARAS	ML	2365.86	$ 7,306	$ 17,451,093.16	-	60.00	$ 7,306.00	$ 438,360.00		7,306.00	$ -		7,303.00			$ 7,306.00	$ -		$ 7,306.00	$ -		$ 7,306.00	$ -	0.00	7,306.00	$ -
N ALUMINIO PROYECTANTE CON VIDRIO TRASLUCIDO	M2	70	$ 215,964	$ 15,117,480.00	+	70.00	$ 215,964.00	$ 15,117,480.00		215,964.00	$ -	35.59	215,964.00	$ 7,772,544.36	20.34	$ 215,964.00	$ 4,392,767.76		$ 215,964.00	$ -		$ 215,964.00	$ -	55.93	215,964.00	$ 12,165,252.12
OTROS																										
DA PERIMETRAL	UN	4	$ 2,333,571	$ 9,334,284.00	+	6.00	$ 2,333,571.00	$ 14,001,426.00	4.00	2,333,571.00	$ 9,334,284.00	2.00	2,333,571.00	$ 4,667,142.00	3.00	2,333,571.00	$ -		2,333,571.00	$ -		2,333,571.00	$ -	0.00	2,333,571.00	$ 14,001,426.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS																								0.00		
S E INSTALACION DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA ¾" X 150 MM ACERO ASTM 193 B 7 CO, TUERCA Y ARANDELA	UND		$ 19,352.00		+	1,740.00	$ 19,352.00	$ 33,672,480.00				640.00	19,352.00	$ 12,385,280.00	360.00	19,352.00	$ 6,966,912.00	280.00	19,352.00	$ 5,418,560.00	335.00	19,352.00	$ 4,667,072.00	1,612.00	19,352.00	$ 29,269,224.00
A MUROS LADRILLO E = 0,18 mts	M2		$ 13,629.00		+	318.81	$ 13,629.00	$ 4,345,061.49				96.32	13,629.00	$ 1,312,690.78	38.06	13,629.00	$ 518,819.74		13,629.00	$ -		13,629.00	$ -	434.35	13,629.00	$ 1,831,510.50
* DEMOLICION SUPERFICIE MURO FACHADA	M2		$ 10,854.00		+	696.37	$ 10,854.00	$ 9,402,579.98				191.67	10,854.00	$ 2,062,601.48	32.29	10,854.00	$ 350,475.66		10,854.00	$ -		10,854.00	$ -	224.18	10,854.00	$ 2,433,077.14
* DEMOLICION SUPERFICIE MURO FACHADA ANCHO MENOR A 0.60 m	M		$ 6,187.00		+	1,321.80	$ 6,187.00	$ 8,151,540.60				860.23	6,187.00	$ 5,321,769.24	24.64	6,187.00	$ 151,954.88		6,187.00	$ -		6,187.00	$ -	984.87	6,187.00	$ 6,093,724.12
PERFICIE MURO FACHADA	M2		$ 17,505.00		+	405.94	$ 17,505.00	$ 7,105,979.70				191.67	17,505.00	$ 3,356,750.12	3.00	17,505.00	$ -		17,505.00	$ -		17,505.00	$ -	191.67	17,505.00	$ 3,356,750.12
PERFICIE MURO FACHADA ANCHO MENOR A 0.60 m	M		$ 12,025.00		+	1,097.19	$ 12,025.00	$ 13,193,709.75				960.23	12,025.00	$ 11,546,326.58	24.64	12,025.00	$ 296,296.00		12,025.00	$ -		12,025.00	$ -	984.87	12,025.00	$ 11,842,622.58
N ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 346,624.00		+	259.88	$ 346,624.00	$ 90,089,645.12					346,624.00	$ -	0.00	346,624.00	$ -		346,624.00	$ -		346,624.00	$ -	0.00	346,624.00	$ -
VIDRIO	M2		$ 3,045.47		+	328.68	$ 3,045.47	$ 1,001,039.04				32.29	3,045.47	$ 98,349.35	17.98	3,045.47	$ 54,691.73		3,045.47	$ -		3,045.47	$ -	48.97	3,045.47	$ 152,172.09
MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	M2		$ 13,629.00		+	335.25	$ 13,629.00	$ 4,569,122.25				35.59	13,629.00	$ 485,207.71	19.35	13,629.00	$ 263,721.15		13,629.00	$ -		13,629.00	$ -	55.34	13,629.00	$ 754,228.86

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

Hospital

TAL REGIONAL DE GUITARA

RECIBO PARCIAL No. 05

Fecha:
FEBRERO DE 2024

OBJETO:
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA FACHADA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GUITARA

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 — NIT. 901729479-2
RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON — C.C. 1.049.638.584

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

APOYO A SUPERVISIÓN
CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

INTERVENTORIA
SC BUILDINGS SAS — NIT. 901338035-9
R. L. SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO — C.C. 1.049.644.870
DIRECTOR INTERVENTORIA: SERGIO CAMARGO

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

FECHA DE ACTA:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES
PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO
Fecha de Suscripción No. 1	29 diciembre de 2023
Fecha de Reinicio No. 1	9 de enero de 2024
PRÓRROGA No. 02:	30 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 03:	61 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	2 MESES Y 6 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024

DATOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATADO:	$ 3,720,757,472.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,116,227,241.60
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 976,611,450.00
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 4,697,368,922.00
ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 1,116,227,241.60
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -
VALOR PENDIENTE POR PAGAR:	$ 830,391,740.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	$ 874,712,487.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	$ 772,704,445.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	$ 1,021,695,799.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4	$ 697,219,654.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5	$ 544,444,797.00

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 4. DEL 09/01/2023				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01. DEL 18/10/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL 23/11/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL 20/12/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04			PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05			TOTAL ACUMULADO		
DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. (4+5=6)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=1.4M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA NAL.	UND		$ 590,000.00		+	10.00	$ 590,000.00	$ 5,900,000.00				10.00	590,000.00	$ 5,900,000.00	0.00	590,000.00	$ -		590,000.00	$ -		590,000.00	$ -	10.00	590,000.00	$ 5,900,000.00
SO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=5.3 M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA NAL.	UND		$ 156,875.00		+	2.00	$ 156,875.00	$ 313,750.00				2.00	156,875.00	$ 313,750.00	0.00	156,875.00	$ -		156,875.00	$ -		156,875.00	$ -	2.00	156,875.00	$ 313,750.00
E REJA METÁLICA	M2		$ 14,421.17		+	155.09	$ 14,421.17	$ 2,249,702.52					14,421.17	$ -		14,421.17	$ -		14,421.17	$ -		14,421.17	$ -	0.00	14,421.17	$ -
ERFILERÍA REJAS CERRAMIENTO PERIMETRAL ACERO ESTRUCT. ASTM A-36. (ELIMINISTRO E KÍN)	Kg		$ 15,188.00		+	329.00	$ 15,188.00	$ 4,996,852.00					15,188.00	$ -	329.00	15,188.00	$ 4,996,852.00		15,188.00	$ -		15,188.00	$ -	329.00	15,188.00	$ 4,996,852.00
IENTO REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL PH=1.67 (INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA CON CEPILLO ETÁLICA, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	ML		$ 109,775.00		+	252.85	$ 109,775.00	$ 26,329,533.75				49.20	109,775.00	$ 5,400,030.00	190.65	109,775.00	$ 20,926,683.75		109,775.00	$ -		109,775.00	$ -	252.85	109,775.00	$ 26,329,533.75
MURO DRYWALL UNA CARA ANCHO MENOR 50 cm	ML		$ 29,132.00		+	69.07	$ 29,132.00	$ 2,094,787.24																	29,132.00	$ -	0.00	29,132.00	$ -
EN GRANFLAET. ANCHO MENOR A 0.50 m	ML		$ 16,909.00		+	363.86	$ 16,909.00	$ 6,153,681.54																	16,909.00	$ -	0.00	16,909.00	$ -
E DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2		$ 5,673.00		+	2,460.73	$ 5,673.00	$ 14,073,181.29																	5,673.00	$ -	0.00	5,673.00	$ -
CIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC	M2		$ 9,013.00		+	2,324.85	$ 9,013.00	$ 20,954,143.44																	9,013.00	$ -	0.00	9,013.00	$ -
IO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2		$ 74,951.00		+	155.85	$ 74,951.00	$ 11,681,113.35																	74,951.00	$ -	0.00	74,951.00	$ -
ÓN PUNTO REVENTILACIÓN EXISTENTE 2" (INCLUYE SALIDA POR ENCIMA DE CUBIERTA)	UND		$ 60,364.00		+	12.00	$ 60,364.00	$ 724,368.00																	60,364.00	$ -	0.00	60,364.00	$ -
ÓN PUNTO REVENTILACION EXISTENTE 5" (INCLUYE SALIDA POR ENCIMA DE CUBIERTA)	UND		$ 110,778.00		+	71.00	$ 110,778.00	$ 7,865,238.00																	110,778.00	$ -	0.00	110,778.00	$ -
DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,12 MTS	M2		$ 77,319.00		+	31.81	$ 77,319.00	$ 2,457,249.39																	77,319.00	$ -	0.00	77,319.00	$ -
DRY WALL 1/2" UNA CARA E=0,12 MTS.	M2		$ 42,359.00		+	95.98	$ 42,359.00	$ 4,066,201.42																	42,359.00	$ -	0.00	42,359.00	$ -
IO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC (NO INCLUYE LAMINA PVC)	M2		$ 29,429.00		+	102.83	$ 29,429.00	$ 3,026,640.87																	29,429.00	$ -	0.00	29,429.00	$ -
E Y TRASLADO DE MURO PROVISIONAL EN DRYWALL UNA CARA	M2		$ 12,333.00		+	350.13	$ 12,333.00	$ 4,318,153.29																	12,333.00	$ -	0.00	12,333.00	$ -
IO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3	M2		$ 388,745.00		+	102.64	$ 388,745.00	$ 39,900,286.80																	388,745.00	$ -	0.00	388,745.00	$ -
IO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS 20x20 EN FACHADA PARA VENTILACIÓN	UND		$ 25,088.00		+	8.00	$ 25,088.00	$ 200,704.00																	25,088.00	$ -	0.00	25,088.00	$ -
IO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm PARA AUDITORIO m, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	UND		$ 6,785,000.00		+	1.00	$ 6,785,000.00	$ 6,785,000.00																	6,785,000.00	$ -	0.00	6,785,000.00	$ -
O E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA ACCESO (5.36*3.02)m, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	UND		$ 16,425,000.00		+	1.00	$ 16,425,000.00	$ 16,425,000.00																	16,425,000.00	$ -	0.00	16,425,000.00	$ -
) SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2		$ 9,860.00		+	111.96	$ 9,860.00	$ 1,104,123.60																	9,860.00	$ -	0.00	9,860.00	$ -
) SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	ML		$ 5,496.00		+	197.85	$ 5,496.00	$ 1,087,324.40																	5,496.00	$ -	0.00	5,496.00	$ -
O E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal 6 mm	M2		$ 139,772.00		+	144.09	$ 139,772.00	$ 20,137,159.02																	139,772.00	$ -	0.00	139,772.00	$ -
E CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO EXISTENTE	M2		$ 13,100.00		+	144.09	$ 13,100.00	$ 1,886,409.00																	13,100.00	$ -	0.00	13,100.00	$ -
O E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 mm	M2		$ 123,047.00		+	93.84	$ 123,047.00	$ 11,522,121.06																	123,047.00	$ -	0.00	123,047.00	$ -
ONES PROVISIONALES EN MADERA PARA PARA EQUIPOS	M2		$ 116,154.00		+	199.50	$ 116,154.00	$ 23,149,482.20																	116,154.00	$ -	0.00	116,154.00	$ -
O E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA CONSULTA 4.84*2.79)m, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	UND		$ 8,675,000.00		+	1.00	$ 8,675,000.00	$ 8,675,000.00																	8,675,000.00	$ -	0.00	8,675,000.00	$ -
MACIÓN DE REMATES, PILOS Y/O DILATACIONES EN ESTUCO.	ML		$ 8,502.00		+	742.54	$ 8,502.00	$ 6,313,075.08																	8,502.00	$ -	0.00	8,502.00	$ -
ÓN ALBARDA SOBRE MUROS INCLUYE DEMOLICIÓN LONGITUD PROMEDIO 25 cm	UND		$ 26,963.00		+	69.00	$ 26,963.00	$ 2,372,929.00																	26,963.00	$ -	0.00	26,963.00	$ -
UCCIÓN DE ALBARDA SOBRE MUROS INCLUYE DEMOLICIÓN	ML		$ 67,463.00		+	35.03	$ 67,463.00	$ 2,351,305.00																	67,463.00	$ -	0.00	67,463.00	$ -
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2,652,121,132.30				$ 3,813,360,709.05			$ 672,655,758.93			$ 594,309,094.94			$ 795,073,691.80			$ 451,797,429.90			$ 418,803,680.82			$ 2,923,629,681.19
ADMINISTRACIÓN		20%		$ 572,424,026.46				$ 732,672,141.81			$ 134,575,154.79			$ 118,977,803.99			$ 157,244,736.36			$ 90,341,485.98			$ 83,760,737.92			$ 584,765,720.24
IMPREVISTOS		5%		$ 143,106,606.61				$ 183,168,035.45			$ 33,643,787.95			$ 29,719,401.76			$ 39,303,684.59			$ 22,585,371.30			$ 20,940,184.46			$ 146,191,430.06
UTILIDAD		6%		$ 143,106,606.61				$ 183,168,035.45			$ 33,643,787.95			$ 29,719,401.76			$ 39,303,684.59			$ 22,585,371.30			$ 20,940,184.46			$ 146,191,430.06
VALOR TOTAL DEL CONTRATO - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 3,720,757,472.00				$ 4,697,368,922.00			$ 874,712,487.00			$ 772,704,445.00			$ 1,031,695,799.00			$ 587,219,853.66			$ 544,444,796.55			$ 3,800,977,181.55
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO				$ 3,720,757,472.00																						
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05				$ 544,444,797.00																						
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - PRESENTE ACTA A VALOR INICIAL DEL CONTRATO		26%		$ 139,267,926.60																						
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 - MENOS AMORTIZACIÓN				$ 405,177,370.40																						

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5: Quinientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos pesos con 0/100 m/cte

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	$	3,720,757,472.00	VALOR ANTICIPO	$ 1,116,227,241.60
VALOR ADICIÓN No.__:	$	976,611,450.00	% ANTICIPO	30.00%
VALOR ACUMULADO:	$	4,697,368,922.00		

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.	VALOR ACTA	%PAGADO	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR SALDO POR AMORTIZAR	% PAGADO ACUMULADO
1	$ 874,712,487.00	18.62%	$ 262,413,746.10	$ 853,813,495.50	18.62%
2	$ 772,704,445.00	16.45%	$ 231,811,333.50	$ 822,092,162.00	16.45%
3	$ 1,021,695,799.00	21.75%	$ 306,508,739.70	$ 315,435,422.33	21.75%
4	$ 587,219,654.00	12.50%	$ 176,165,896.20	$ 139,267,526.10	12.50%
5	$ 544,444,797.00	11.59%	$ 139,267,926.10	$ -	11.59%
TOTAL	$ 3,800,977,182.00	80.92%	$ 1,116,227,241.60		80.91%

s independiente, de las obras ejecutadas no existe ni contratista de la responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado Contrato de Obra.
de la presente, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervinieron, a los DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
RL-GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INTERVENTORIA
SC BUILDINGS SAS
RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

APOYO A SUPERVISION
CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	27 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	2	M2	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE 3 MTS INCLUYE POLEAS Y MANILAS		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMÁGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	36,00	16,00	576,00		1,00	1,00	576,00
HALL DE ACCESO								
1	HALL DE ACCESO	5,30	10,11	53,58		1,00	1,00	53,58
2	HALL DE ACCESO	6,30	10,11	63,69		1,00	1,00	63,69
3	HALL DE ACCESO	9,00	10,11	90,99		1,00	1,00	90,99

ESQUEMA

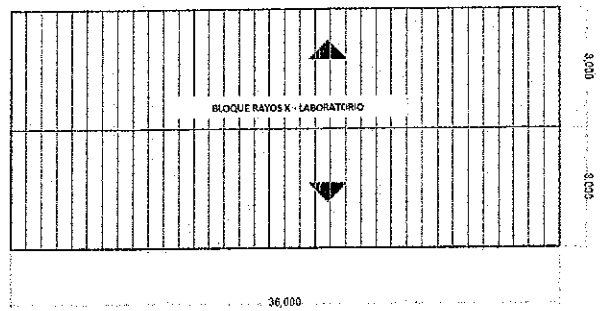






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024

CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
CUBIERTA	2	M2	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE 3 MTS INCLUYE POLEAS Y MARILLAS

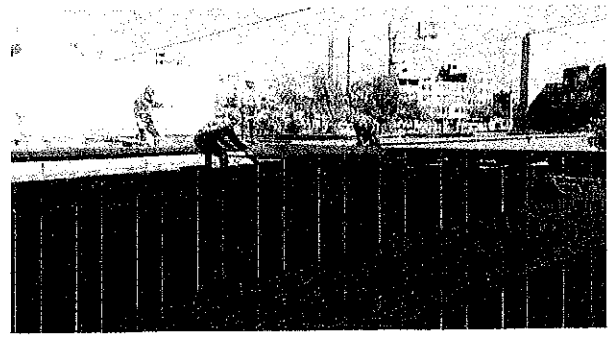

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1	1,661,17
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2	831,68
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3	1,231,50
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4	786,12
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5	784,27

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Fuerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL. CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIL, GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	5 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	4	M2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER.		


	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMAGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	36,00	16,00	576,00		1,00	1,00	576,00
HALL DE ACCESO								
1	HALL DE ACCESO	5,30	10,11	53,58		1,00	1,00	53,58
2	HALL DE ACCESO	3,30	10,11	63,69		1,00	1,00	63,69
3	HALL DE ACCESO	9,00	10,11	90,99		1,00	1,00	90,99


ESQUEMA

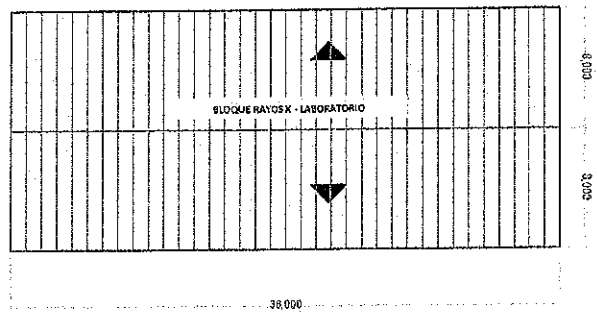

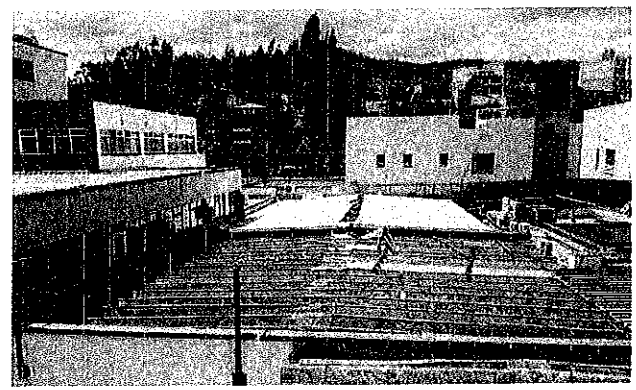

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							1,069,17
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							931,68
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							861,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							463,69
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							784,27

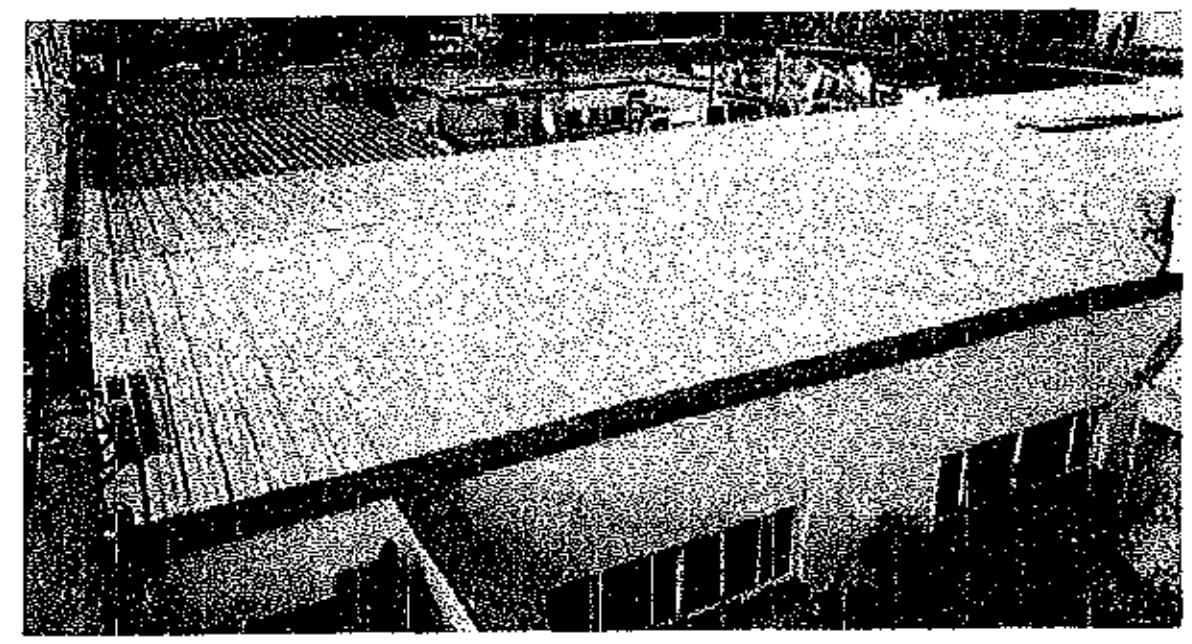

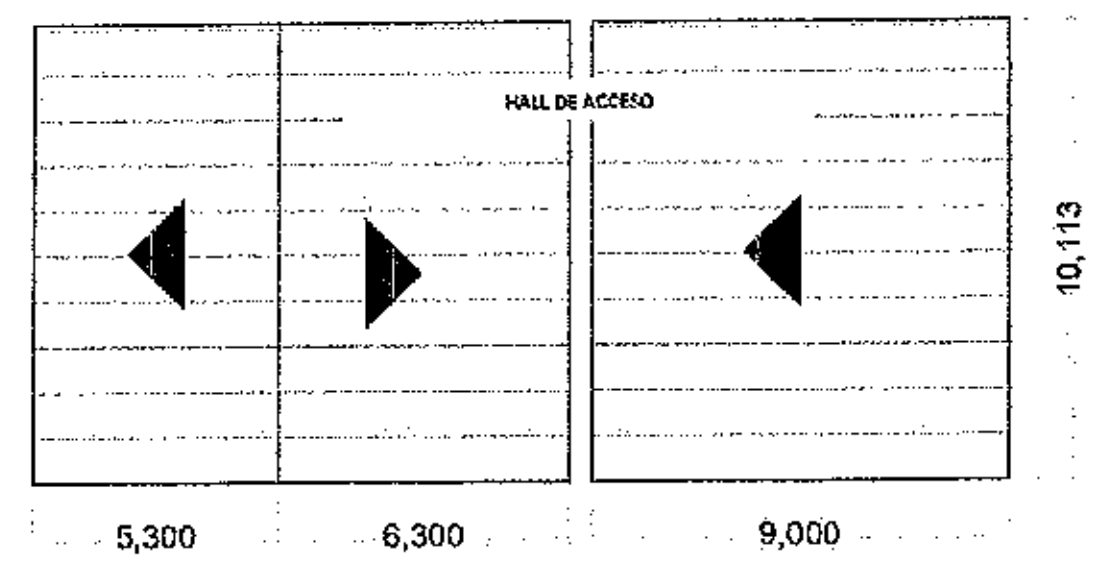

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 014 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL, GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	1 EM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	3	KG	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE ASBESTO CEMENTO A SITIO AUTORIZADO		


	SOPORTE DISPOSICIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		No. VIAJE	FECHA RECEPCIÓN	TIPO RESIDUO				
ZONA HOSPITALIZACION BLOQUE A Y B								
1	Certificado 80865 Pesa fidedigna según parcial 4	7	19/1/20023	TEJA ASBESTO	300,00	1,00	1,00	300,00
3	Certificado No. 8993	9	25/01/2024	TEJA ASBESTO	13200,00	1,00	1,00	13,200,00
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO.1							-
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO.2							33,100,00
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO.3							26.340,00
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO.4							8.200,00
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO.5							13.850,00

ESQUEMA

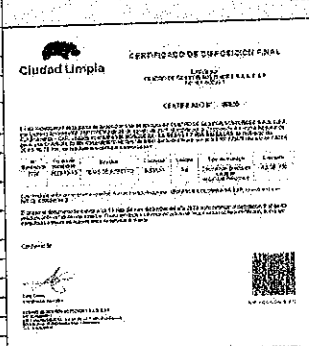





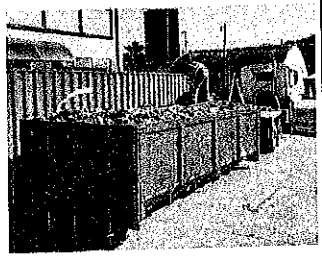

Elaboró

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Pinzón

RESIDENTE INTERVENTORÍA
Ing. Dina Carolina Dallos

Vo.Bo.:

CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RLA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alvaro Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 084 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RIL. GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	6	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			LONGITUD	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMAGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO (REMATE EN VIGA CANAL)	36,00			36,00	1,00	1,00	36,00
2	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO (REMATE EN VIGA CANAL)	8,70			8,70	1,00	1,00	8,70
3	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO (REMATE EN VIGA CANAL)	9,05			9,05	1,00	1,00	9,05
3	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO (REMATE CONTRA MUROS)	16,00			16,00	1,00	1,00	16,00
	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO (REMATE CONTRA MUROS)	16,00			16,00	1,00	1,00	16,00
								-
								-
								-

ESQUEMA

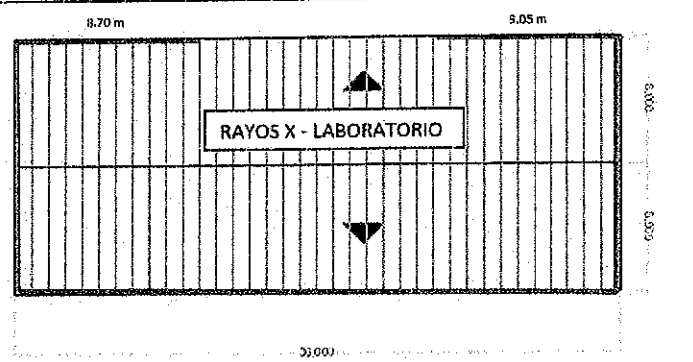

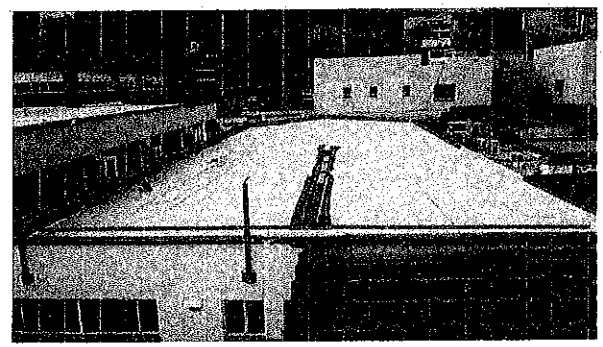


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 984 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	6	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA		

HALL DE ACCESO								
1	HALL DE ACCESO (REMATE CONTRA MUROS)	5,30			5,30	1,00	2,00	10,60
2	HALL DE ACCESO (REMATE CONTRA MUROS)	6,30			6,30	1,00	2,00	12,60
3	HALL DE ACCESO (REMATE CONTRA MUROS)	9,00			9,00	1,00	2,00	18,00
4	HALL DE ACCESO (REMATE CONTRA VIGA CANAL)	10,11			10,11	1,00	2,00	20,22
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							201,75
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							282,63
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							323,10
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							262,79
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							147,17

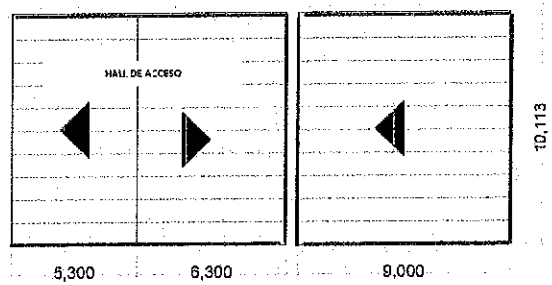

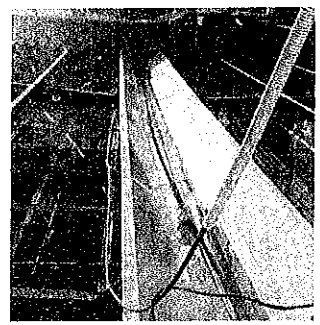

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Parra

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL. CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 084 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LAS PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L, GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA			No. 5		PERIODO DESDE:		9 de enero de 2024	HASTA: 17 de febrero de 2024
CAPÍTULO			ITEM		UNIDAD		DESCRIPCIÓN	
CUBIERTA			7		KG		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)	

2	PLATINA EN L DE 50 X 14 cm X 24 cm ANCHO en 9.5 mm	0.24	0,64	74,80	11,49	1,00	12,00	137,87
3	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 10 X 10 cm en 4 mm CORREAS	0,10	0,10	31,4	0,16	1,00	60,00	0,42

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1	15,497.86
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2	11,986.10
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3	11,577.87
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4	6,289.60
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5	10,750.10

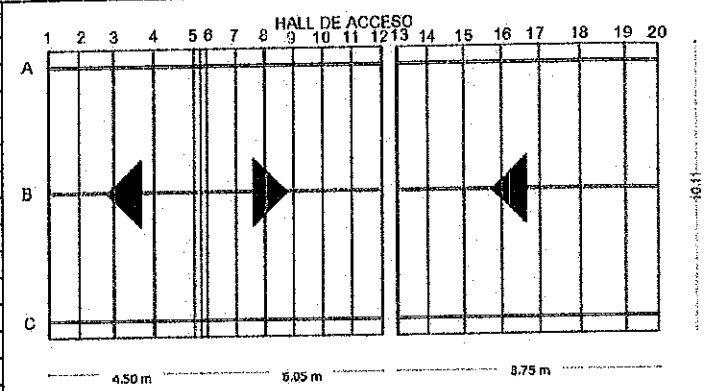

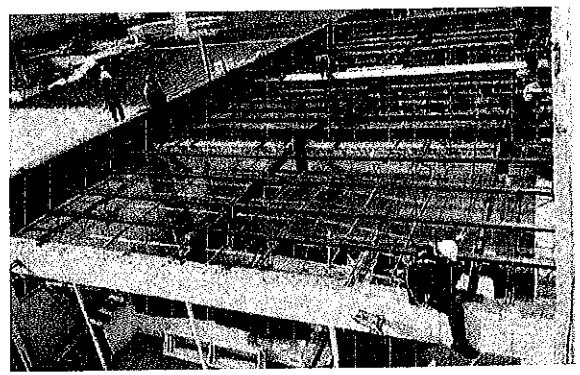

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Parra

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Carrillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT., GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	7	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)		

1	PLATINA EN U DE 55 X 24 X 55 cm X 25 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,25	1,340	74,80	25,06	1,00	22,00	551,28
2	PLATINA EN L DE 50 X 12 cm X 25 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,25	0,62	74,80	11,59	1,00	22,00	255,07
3	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 10 X 10 cm en 4 mm CORREAS	0,10	0,10	31,4	0,16	1,00	198,00	31,09

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			SUB TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL Kg
		LONGITUD (m)	MASA (Kg/m)	AREA				
HALL DE ACCESO								
1	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
2	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
3	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
4	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
5	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
6	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
7	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
8	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
9	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
10	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
11	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
12	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
13	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
14	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
15	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
16	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
17	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
18	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
19	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
20	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
1	VIGA 200 X 70 mm	4,50	16,69		75,11	1,00	3,00	225,32
2	VIGA 200 X 70 mm	6,05	16,69		100,97	1,00	3,00	302,92
3	VIGA 200 X 70 mm	8,75	16,69		146,04	1,00	3,00	438,11
PLATINAS		BASE (m)	ALTURA (m)	MASA (Kg/m2)	SUBTOTAL Kg			
1	PLATINA EN U DE 55 X 24 X 55 cm X 25 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,25	1,340	74,80	25,06	1,00	3,00	75,17

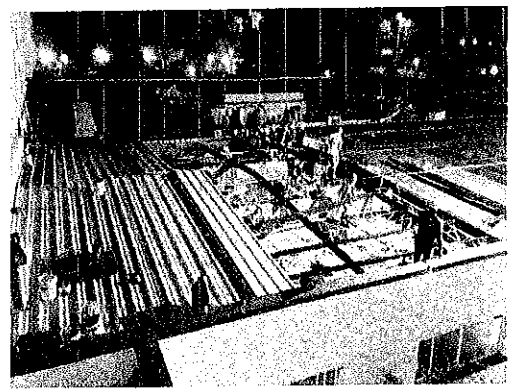

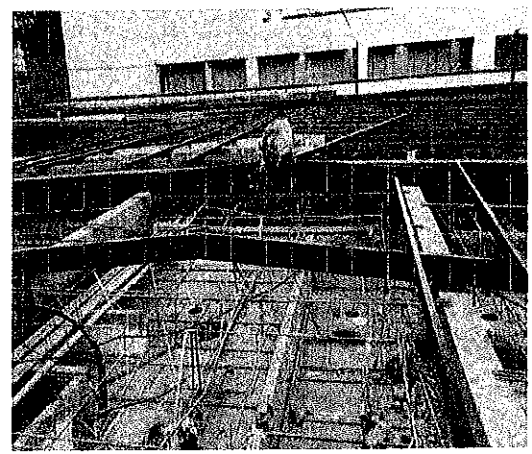

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 094 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	9	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	11	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE METALICO ALTURA MAYOR DE 3 MTS		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMAGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	36,00				1,00	1,00	36,00
	HALL DE ACCESO							
1	CUMBRERA HALL DE ACCESO	10,11				1,00	1,00	10,11


ESQUEMA

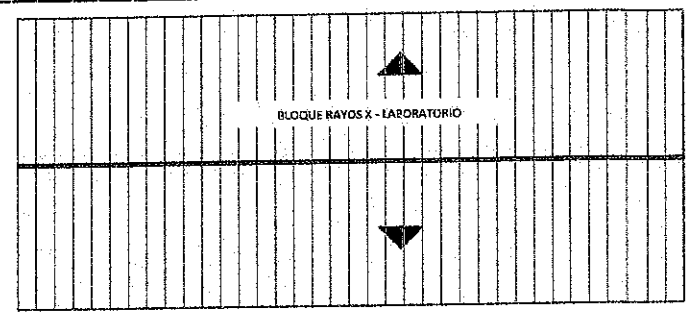



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA							
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN								
ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	3 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024			
CAPÍTULO	3	UNIDAD		DESCRIPCIÓN				
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1					41.35			
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2					56.00			
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3					91.90			
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4					55.05			
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5					46.11			

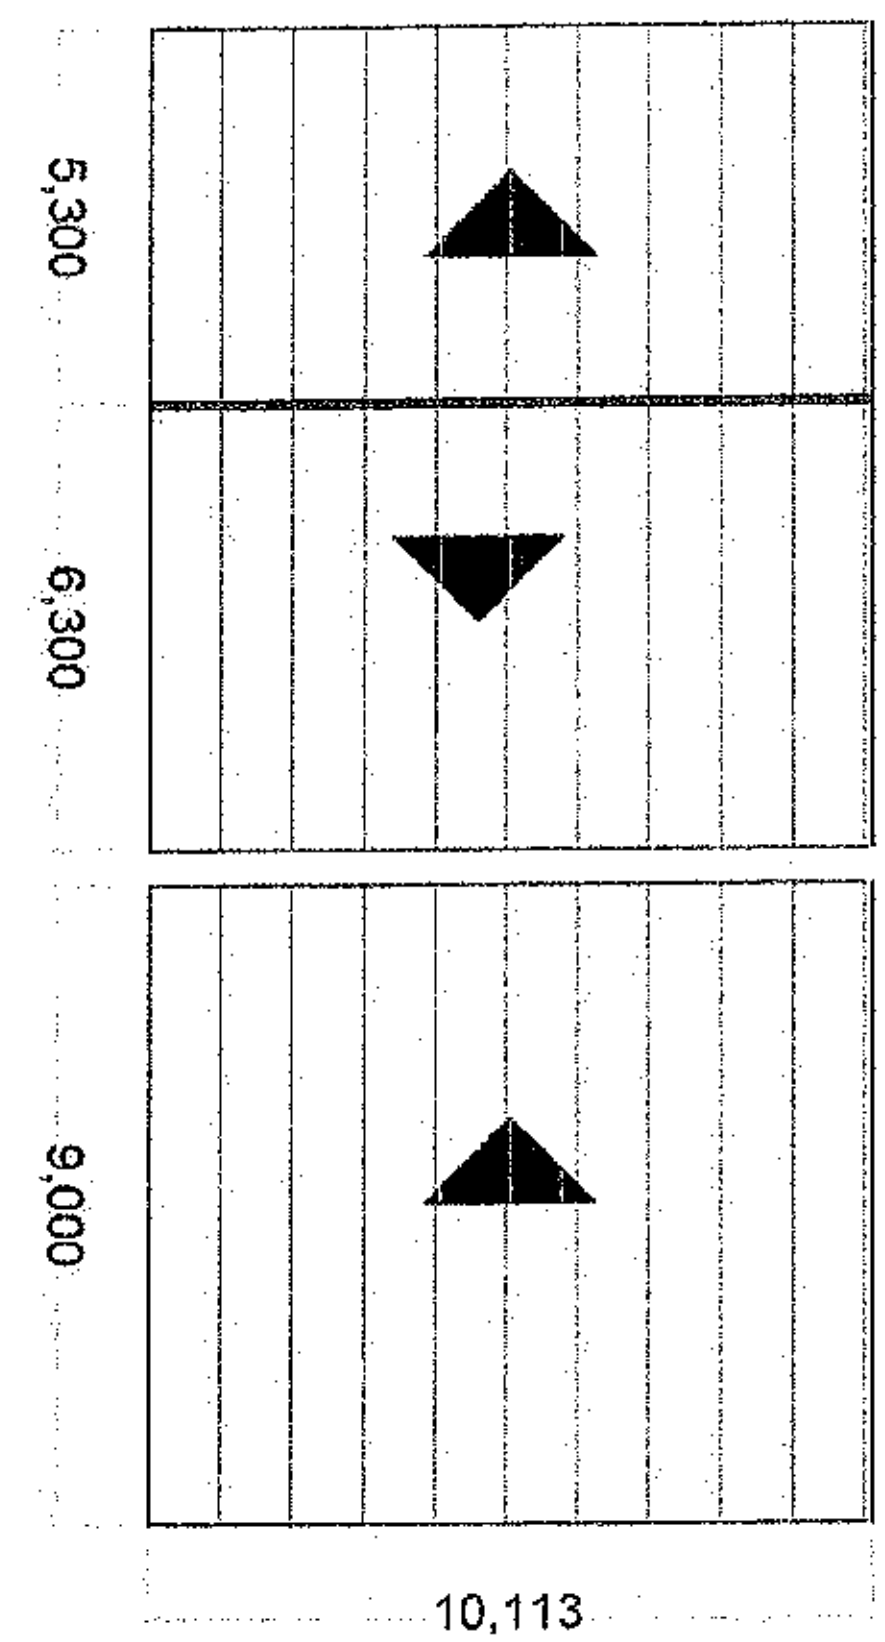

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Vider Hernando Pinto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 064 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	12	ML	LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMÁGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	38,00					1,00	38,00
2	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	8,70					1,00	8,70
3	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	9,05					1,00	9,05

ESQUEMA

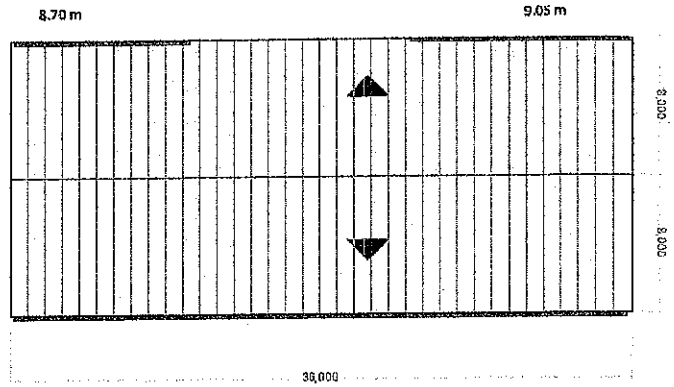

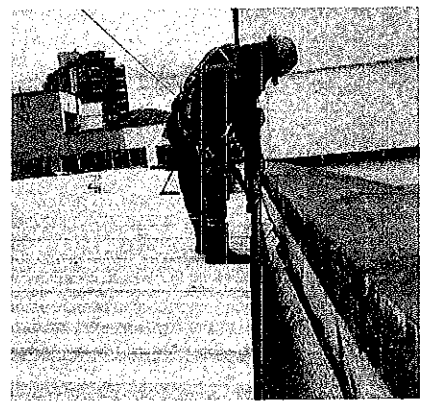

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de Febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	13	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA IMAGENES DIAGNOSTICAS								
1	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	36,00					1,00	36,00
2	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	8,70					1,00	8,70
3	BLOQUE RAYOS X - LABORATORIO	9,05					1,00	9,05


ESQUEMA

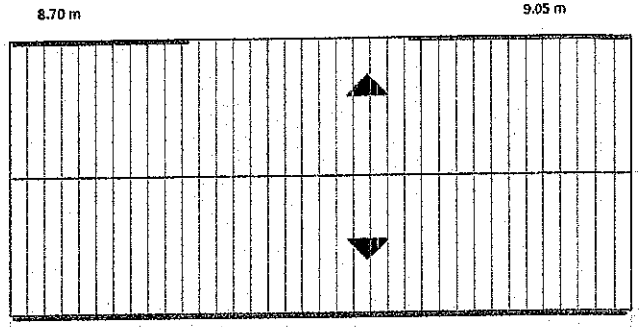



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6					
CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN					
ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	12	ML	LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE		

HALL DE ACCESO								
1	VIGA CANAL HALL DE ACCESO	10,11					1,00	10,1'
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							123.33
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							100.68
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							198.30
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							102.25
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							93.86

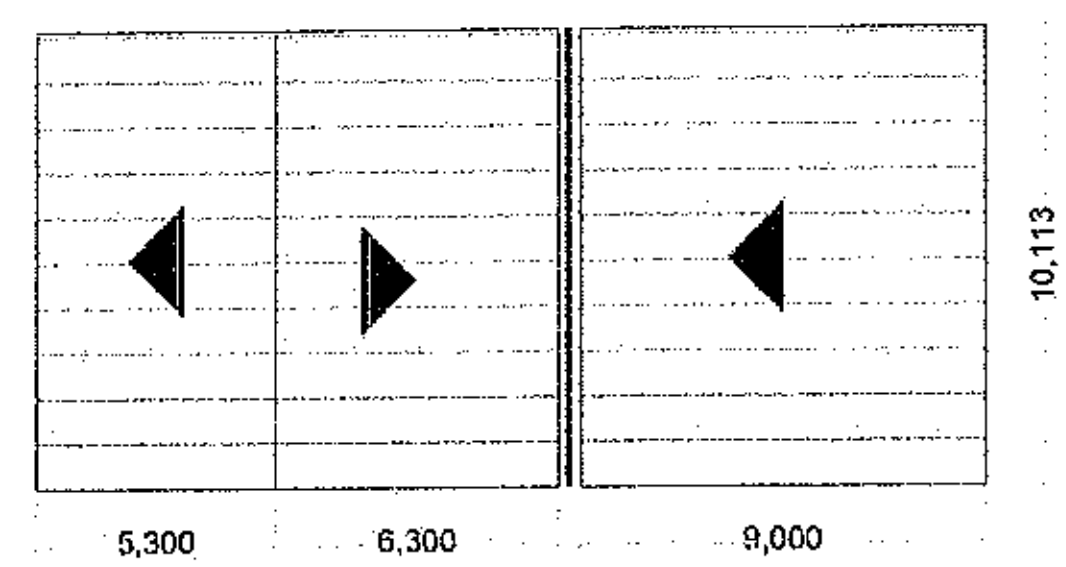



Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	13	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO		

	HALL DE ACCESO							
1	VIGA CANAL HALL DE ACCESO	10,11					1,00	10,1
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							123,33
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							180,68
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							190,39
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							192,25
	CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5							63,80

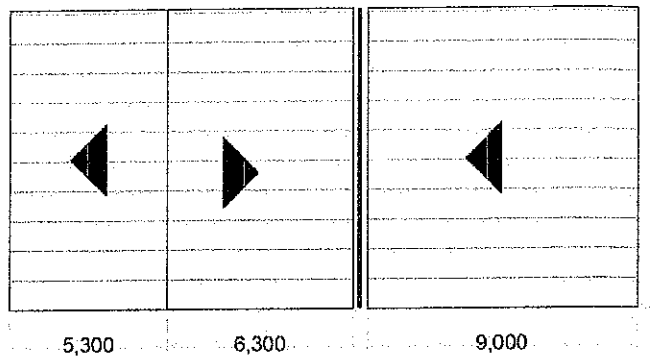

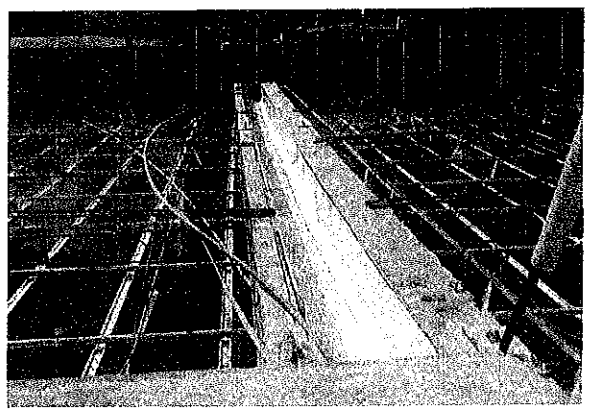

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 043 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL, GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	14	KG	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA		

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			SUB TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL Kg
		LONGITUD (m)	MASA (Kg/m)	AREA				
ZONA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS								
A	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
B	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
C	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
D	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
E	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
F	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
G	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
H	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
I	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
J	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
K	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
L	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
LL	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
M	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
N	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
Ñ	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
O	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
P	CORREA 100 X 50 mm	36,00	6,86		246,96	1,00	1,00	246,96
1	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
2	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
3	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
4	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
5	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
6	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
7	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
8	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
9	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
10	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
11	VIGA 200 X 70 mm	15,75	16,69		262,87	1,00	1,00	262,87
PLATINAS		BASE (m)	ALTURA (m)	MASA (Kg/m2)	SUBTOTAL Kg			

ESQUEMA

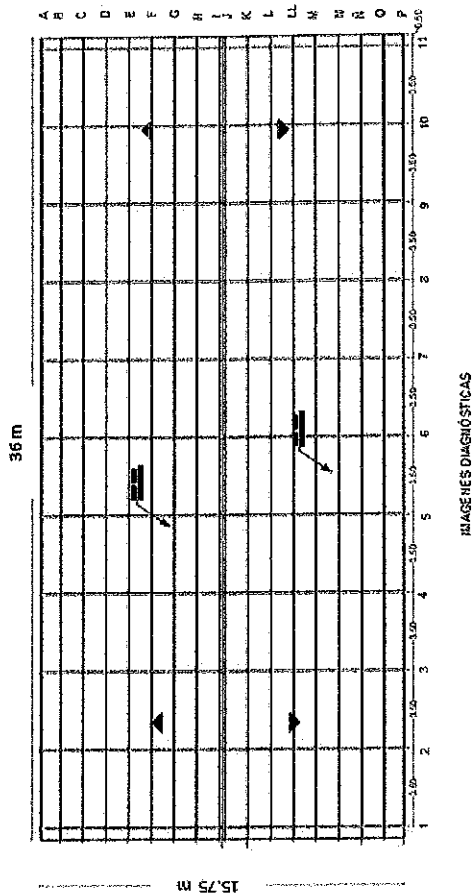

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL., GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	16	KG	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		

1	PLATINA EN U DE 55 X 24 X 55 cm X 25 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,25	1,340	74,80	25,06	1,00	22,00	551,26
2	PLATINA EN L DE 50 X 12 cm X 25 cm ANCHO e=9,5mm	0,25	0,62	74,80	11,59	1,00	22,00	255,07
3	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 10 X 10 cm en 4 mm CORREAS	0,10	0,10	31,4	0,16	1,00	198,00	31,08

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			SUB TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL Kg
		LONGITUD (m)	MASA (Kg/m)	AREA				
HALL DE ACCESO								
1	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
2	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
3	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
4	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
5	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
6	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
7	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
8	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
9	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
10	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
11	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
12	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
13	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
14	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
15	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
16	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35
17	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35



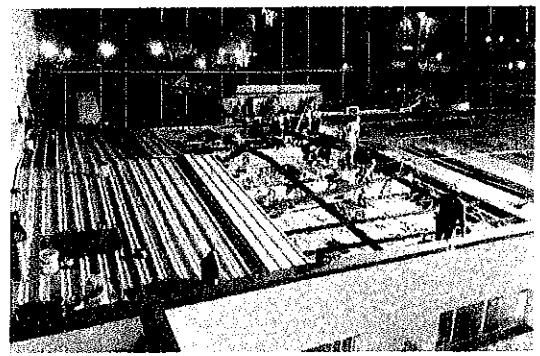

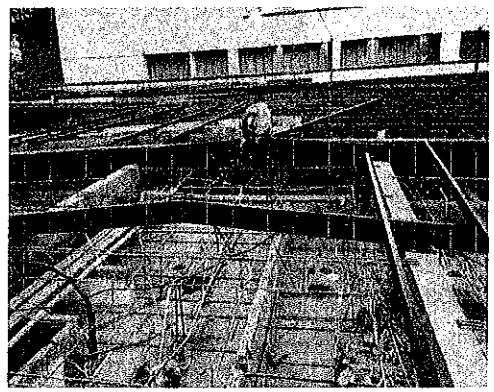


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5

CONTRATO DE OBRA 084 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	HP1	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA ½" X 150 MM ACERO ASTM 193 B 7 CON EPÓXICO, TUERCA Y ARANDELA.		

HALL DE ACCESO:							
VIGA 200 X 70 mm	1,00			1,00	20,00	3,00	60,00

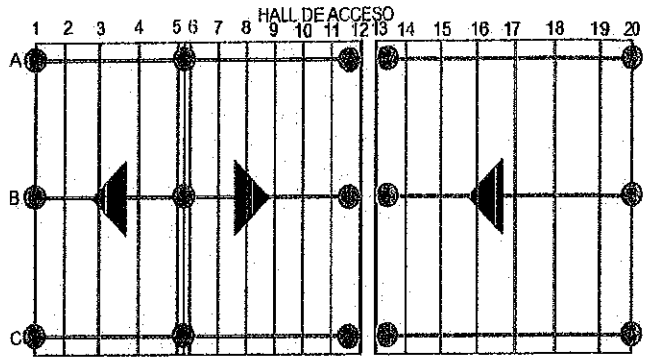





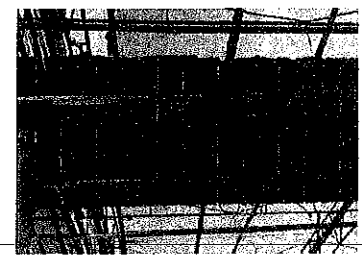

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5

									Descripción
CONTRATO DE OBRA 904 de 2023		REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA							
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN									
ACTA		No. 5		PERIODO DESDE:			9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO		ÍTEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA		14		KG			PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		
18	CORREA 100 X 50 mm	10,11	0,66		69,35	1,00	1,00	69,35	
19	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,88		69,35	1,00	1,00	69,35	
20	CORREA 100 X 50 mm	10,11	6,86		69,35	1,00	1,00	69,35	
1	VIGA 200 X 70 mm	4,50	16,69		75,11	1,00	3,00	225,32	
2	VIGA 200 X 70 mm	6,05	16,69		100,97	1,00	3,00	302,92	
3	VIGA 200 X 70 mm	8,75	16,69		146,04	1,00	3,00	438,11	
PLATINAS		BASE (m)	ALTURA (m)	MASA (Kg/m2)	SUBTOTAL Kg				
1	PLATINA EN U DE 55 X 24 X 55 cm X 25 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,25	1,340	74,80	25,06	1,00	3,00	75,17	
2	PLATINA EN L DE 60 X 14 cm X 24 cm ANCHO e= 9,5 mm	0,24	0,64	74,80	11,49	1,00	12,00	137,87	
3	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 10 X 10 cm e=4 mm CORREAS	0,10	0,10	31,4	0,16	1,00	60,00	9,42	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1								15,637,06	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2								11,986,10	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3								11,577,87	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4								6,280,60	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5								16,750,16	

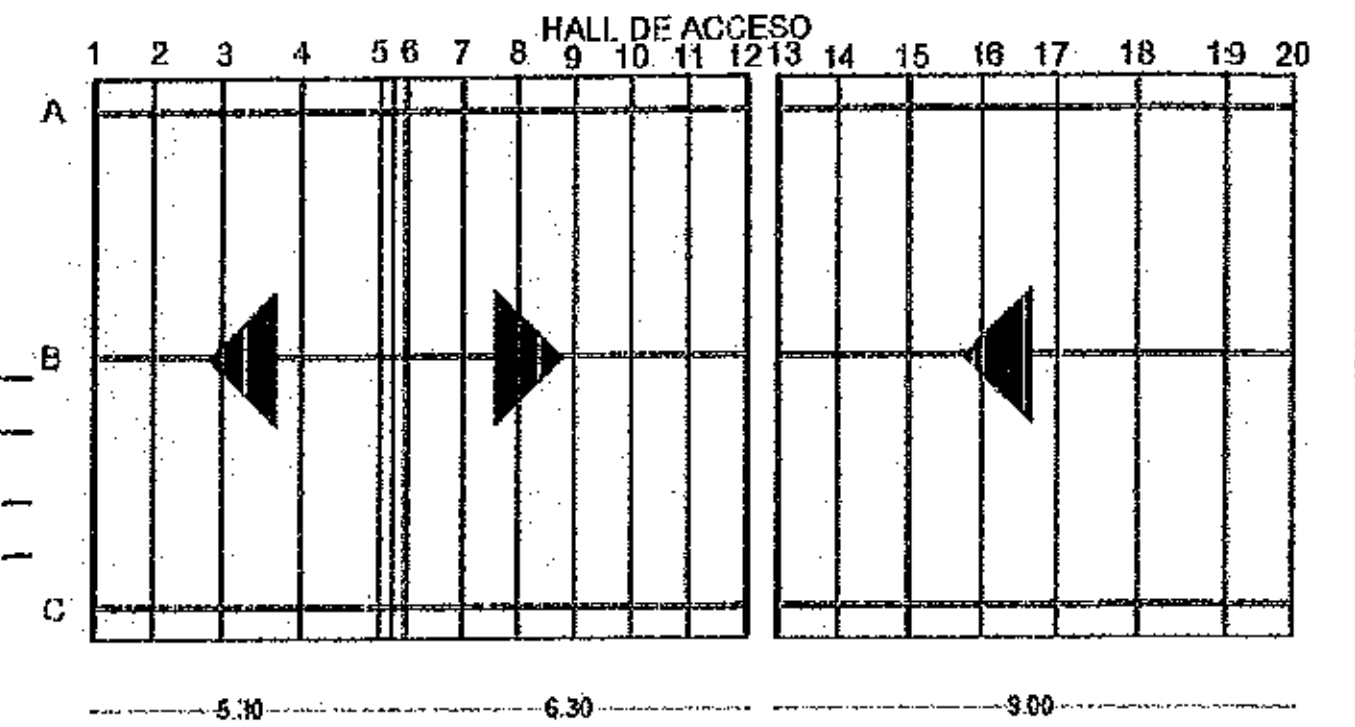

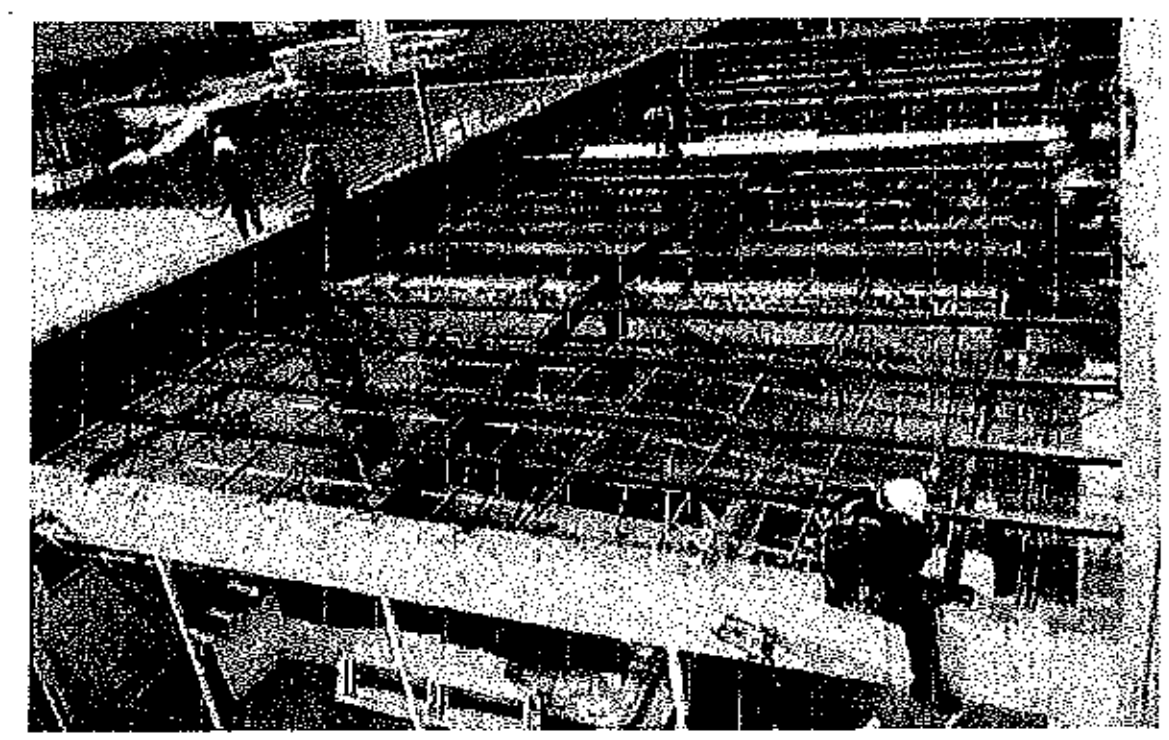

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Puerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez


RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Carrillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 5

CONTRATO DE OBRA 894 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 5	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	HP1	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA 1" X 150 MM ACERO ASTM 193 B 7 CON EPÓXICO, TUERCA Y ARANDELA.		

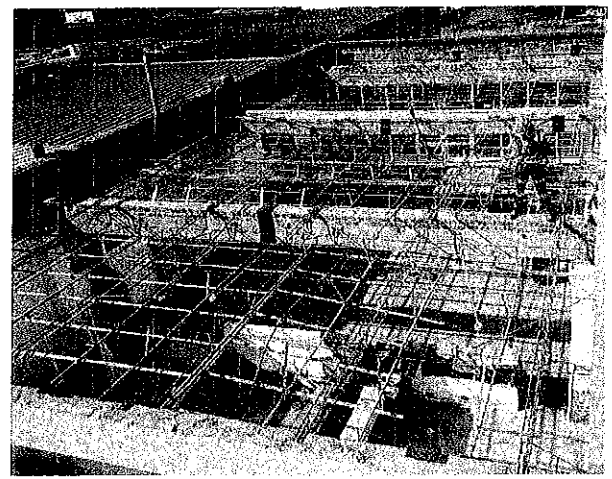

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1	-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2	840.00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3	358.00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4	280.00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5	296.00

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Puerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq/Sebastian Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 694 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	9 de enero de 2024	HASTA:	17 de febrero de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	NP4	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA ½" X 150 MM ACERO ASTM 193 B 7 CON EPÓXICO, TUERCA Y ARANDELA.		


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES UNIDAD VARILLA			SUBTOTAL	CANTIDAD VARILLAS X ELEMENTO	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
ZONA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS							
RAYOS X - LABORATORIO							
VIGA 200 X 70 mm	1.00			1.00	16.00	11.00	176.00

ESQUEMA

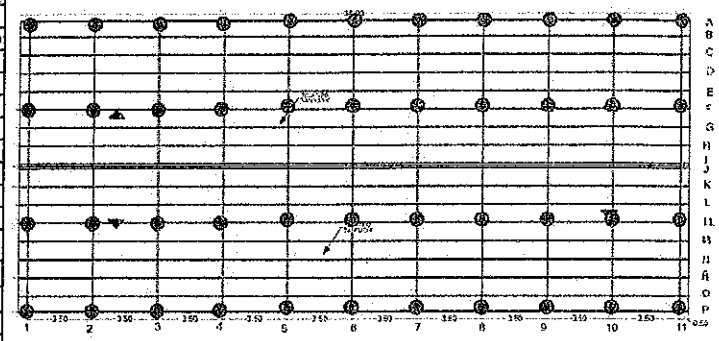

IMAGENES DIAGNÓSTICAS



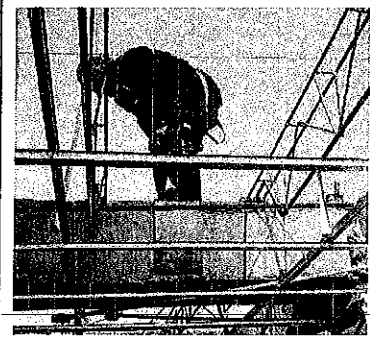

CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA

CERTIFICA QUE:

El contratista, **GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN R/L del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023**, con **NIT 901729479-2**, ha desarrollado y cumplido con toda la documentación requerida para el pago del **Acta Parcial No.005**. correspondiente al contrato de obra **No. 004 de 2023** que tiene por objeto **"REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMINO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".**

La presente se expide en Tunja, a los veintiséis días (20) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

ING. CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA
No. 004 de 2023

Dirección: Avenida Universitaria No. 75 A– 00 Bloque A Oficina 22A
Teléfono: (098) 7459962 -3106098739
Email: apoyoalasupervisionduitama@gmail.com

SC BUILDINGS

DISEÑO Y CONTRUCCIÓN PARA TU VIDA

Duitama, 19 de febrero de 2024

Doctora:
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Supervisora
Ciudad

REFERENCIA: contrato # 001-2004 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".

CERTIFICA:

Con la presente en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control del contrato de Obra 004 de 2023 cuyo objeto del Contrato es ***"REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DECUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍAMETÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA"*** se permite presentar luego de revisiones pertinentes el **ACTA PARCIAL 05** del contrato de Obra, con su sabana y memorias de cantidades con su respectivo registro fotográfico presentado por el Contratista de Obra y revisado por parte de la Interventoria.

Dando cumplimiento a las funciones al CONTRATO DE CONSULTORIA No.001 DE 2024 se da por revisada y aprobada ACTA PARCIAL N° 5 de corte al 17 febrero de 2024.

Cordialmente,

Arq. SERGIO CAMARGO
Director de Interventoría

3163204104-3162779908
SCBUILDINGS2019@GMAIL.COM
TUNJA BOYACÁ
AV. UNIVERSITARIA 41-50 OFICINA 4
ED. MIRADOR DE LA COLINA
