
CONSORCIO HATO LAGUNA 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-012-2023

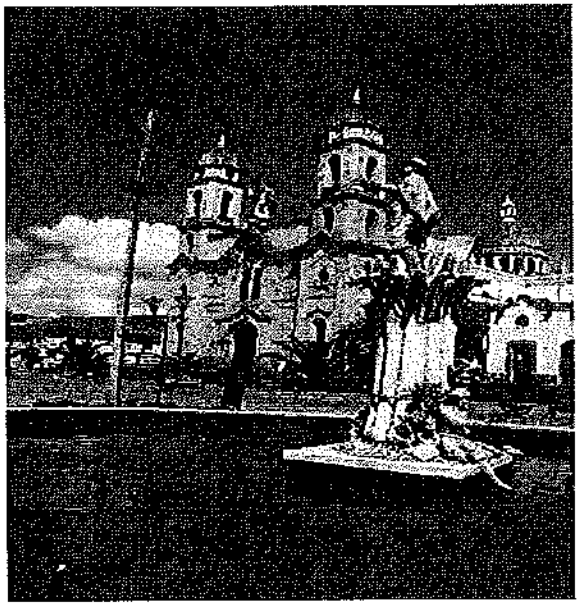

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 3 MESES

FECHA DE INICIO DE OBRA: 18-12-2023

VALOR DE LA OBRA: 220.760.560

INTERVENTORÍA DE OBRA: ANDRES FELIPE RUIZ PIACHE.

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-012-2023



CONSORCIO HATO LAGUNA 2023

INTERVENTORÍA DE OBRA: ANDRES FELIPE RUIZ PIACHE

INFORME PARCIAL
NUMERO 1

CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023
NIT. 800.077.545-5






CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ

ABRIL 01 DE 2024

CONTENIDO

1 ASPECTOS GENERALES 3
1.1 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS 3
1.2 POLIZA TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA 3
2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
2.1 PRELIMINARES 4
2.2 DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTAS 5
2.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
2.4 CONTRATACIÓN PERSONAL 17
3 INFORME AMBIENTAL 19
3.1 ASPECTOS AMBIENTALES ÁREA DE INFLUENCIA 19
3.2 ASPECTOS AMBIENTALES ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (OBRA) 20
3.3 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 20
3.4 MANEJO DE MATERIALES GRANULARES 20
4 CONCLUSIONES 22

INFORME PARCIAL NUMERO 1

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ

1 ASPECTOS GENERALES

FECHA DEL CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$220.760.560,00
FECHA ACTA INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA SUSPENSION:	22 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA REINICIO:	23 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO:	3 MESES
FECHA TERMINACION FINAL:	15 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE EJECUTADO:	45.20%

1.1 RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015			
CLASE DE AMPARO	**VALOR AMPARO**	**VIGENCIA (DESDE)**	**VIGENCIA (HASTA)**
Cumplimiento	$ 44.152.112,00	13/12/2023	15/11/2024
Pago De Salarios	$ 22,076,056,00	13/12/2023	15/05/2025
Estabilidad	$ 44,152,112,00		Por 5 años posterior al acta liquidación

1.2 POLIZA TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS			
CLASE DE AMPARO	**VALOR GARANTIA**	**VIGENCIA (DESDE)**	**VIGENCIA (HASTA)**
Predios -Labores Y Operaciones	$ 260,000,000	13/12/2023	15/05/2024
Contratistas Y Subcontratistas	$ 130,000,000	13/12/2023	15/05/2024
Vehículos Propios Y No Propios	$ 130,000,000	13/12/2023	15/05/2024

2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 PRELIMINARES

- **SOCIALIZACION DEL PROYECTO:** Se realizo la socialización del proyecto con la participación de los involucrados en el mismo, Administración municipal con acompañamiento del Señor alcalde, jefe de la empresa de servicios públicos, comunidad, interventoría y contratistas, el objeto de la misma fue dar a conocer la obra, así como sus impactos, registrar observaciones y percepciones de los participantes. (Se anexa acta de asistencia).




Se hace llegar por parte de la comunidad las autorizaciones respectivas para paso de material (Se anexa autorización para paso material)

- **CAMPAMENTO:** El campamento de la obra esta formado por una construcción provisional que será utilizado para alojamiento de personal, contratista y supervisor de obra, almacenamiento de material.




Dimensiones: 7,5 m * 3,5 m

- **INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA:** Se realizo la inducción por parte de la empresa al personal involucrado en la nomina con la

finalidad de dar a conocer la importancia sobre la seguridad en el trabajo, portando los cascos, guantes, botas y el buen manejo de los implementos en sus actividades (Se anexa formatos de asistencia y entrega de dotación).




2.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTAS

- **DESVIO DE CAUCE:** Como su nombre lo indica esta actividad es indispensable ejecutar para desviar las aguas del rio hato laguna con la finalidad de poder construir la bocatoma, ya que la estructura se ubica dentro del cauce.




- **LOCALIZACION Y REPLANTEO:** Con la finalidad de ubicar el sitio exacto de la estructura de la bocatoma, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos como paso previo a la construcción de la obra.



- **EXCAVACION EN MATERIAL COMUN:** Se refiere a toda la remoción de material común, con el fin de obtener los niveles previstos para la ejecución de obra, sujeto a las cotas y niveles indicados en el plano de implantación de la estructura en el terreno.



- **EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO:** Presencia de roca sedimentaria formada por fragmentos de rocas grandes, no es tan ampliamente utilizada como otras rocas.





- **CONCRETO CICLOPEO:** El concreto ciclópeo tipo de material que contiene piedras, con un fc- 150 Kg/cm2 de resistencia normal con agregados máximo de ¾" y piedra limpia.






- **RECEBO:** Mezcla a base de arena lavada, sin partículas finas con el objeto de utilizar como soporte para la construcción de la cámara de control de caudal.



- **SOLADO:** Una vez terminada la excavación y mejorado el piso con el recebo se procede a realizar el solado, esto permitirá contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta para la construcción de las estructuras.



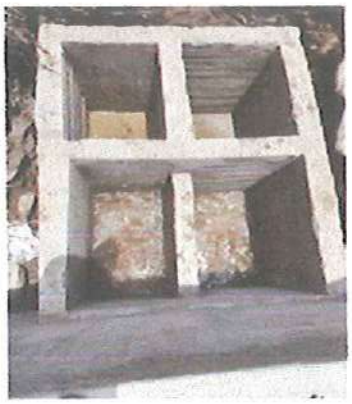


- **CONCRETO PLACA:** Sobre el solado, se ejecutará una losa maciza de contrapiso en concreto reforzado con una resistencia a la compresión del concreto de 4000 PSI; la cual permitirá la instalación del material final de acabado y en los niveles que el Proyecto Arquitectónico lo describa.





- **CONCRETO MUROS:** El sistema de muros de concreto, este asociado a la tecnología del vaciado en sitio del concreto de 4000 PSI, y por ende a la buena selección de formaletas.

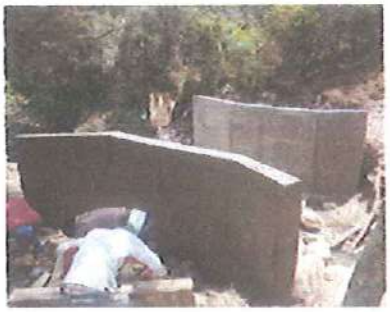
- **ACERO:** El acero en el concreto reforzado aporta las propiedades de resistencia a la tensión tan necesarias en el concreto estructural, lo que evita el daño en estas estructuras, sujetas a cualquier nivel de esfuerzo que se genere por acciones de posible ocurrencia.




- **REJILLA:** Dispositivo instalado en la captación para control de caudal de diseño e impedir el paso de elementos flotantes o solidos grandes.





- **CINTA PVC:** Es recomendada para todo tipo de juntas en estructuras de concreto sometidas a movimientos y presiones hidrostáticas donde se requiere de impermeabilidad total.



- **VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.**

Sirve para trabajar totalmente abierta o cerrada para controlar el caudal de diseño.






- **VALVULA DE PIE:** Esta válvula evita que la tubería succiones partículas sólidas y que se vacié, adicional sirve para ayuda de cebado.

- **TUBERIA 6":** Tubería utilizada para el caudal de excesos de la caja de control de caudal.





- **ADAPTADOR DE LIMPIEZA:** Elemento que ajusta la tubería de conexiones hídricas.

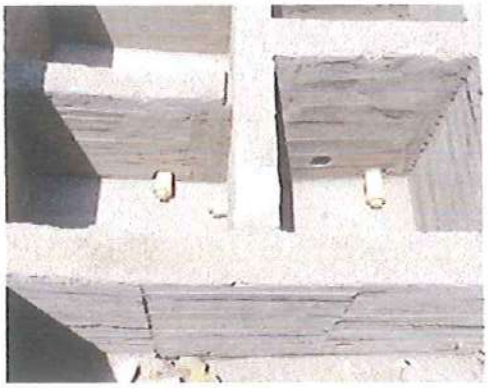

- **ACARREO A LOMO DE MULA:** Se refiere al transporte a lomo de mula hasta el sitio de los trabajos.





- **LOCALIZACION Y REPLANTEO DESARENADOR:** Con la finalidad de ubicar el sitio exacto de la estructura del desarenador, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos como paso previo a la construcción de la obra.



- **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN:** Se refiere a toda la remoción de material común, con el fin de obtener los niveles previstos para la ejecución de obra, sujeto a las cotas y niveles indicados en el plano de implantación de la estructura en el terreno.




- **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO:** Presencia de roca sedimentaria formada por fragmentos de rocas grandes, no es tan ampliamente utilizada como otras rocas.



- **BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO:** Se arroja una mezcla a base de arena lavada, sin partículas finas con el objeto de utilizar como soporte para la construcción de la estructura.



- **SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI):** Consiste en un concreto de bajo contenido de cemento, mezclado en las proporciones 1:5:5, aproximadamente, el cual se colocará con el objeto de emparejar las superficies sobre las cuales se va a cimentar a estructura



- **CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS:** Denominado concreto Clase 3, Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, con una resistencia a la compresión a los (28) días de 281 Kg/cm2 (4.000 psi). El concreto consistirá en una mezcla de cemento Portland, agua, agregado fino y agregado grueso, combinados en las proporciones aprobadas por el Interventor. El concreto deberá ser hecho con los materiales, colocado y terminado en la forma y con la consistencia que estipulan estas especificaciones.









- **CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS:** concreto Clase 3, Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, con una resistencia a la compresión a los (28) días de 281 Kg/cm2 (4.000 psi).



- **CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS:** concreto Clase 3, Se refiere al concreto reforzado o simple para estructuras, con una resistencia a la compresión a los (28) días de 281 Kg/cm2 (4.000 psi).



- **SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa:** El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro del acero y la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto.





- **PASOS UÑA DE GATO D=5/8":** El paso de gato es un sistema de acceso seguro y confiable utilizado en la construcción, que permite a los trabajadores transitar sobre cubiertas, techos y otras superficies elevadas sin riesgo de caídas o accidentes. **Estos sistemas también son conocidos como pasarelas, andadores o caminos para mantenimiento.**



- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA:** Las labores de instalación de tubería estarán regidas por las siguientes condiciones: - Previamente a la ejecución de un tramo de instalación, el CONTRATISTA habrá efectuado un replanteo de alta precisión sobre el tramo respectivo y habrá hecho los ajustes de alineamiento y elevación pertinentes, en relación con los dibujos de proyecto empleados para el replanteo.



- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3":** Los pasamuros son elementos utilizados para garantizar la estanqueidad y permitir el paso de fluidos, Se fabrican a medida en base a los requerimientos del proyecto, pudiendo ser material plástico o en acero de distintas calidades.





- **SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3":** El adaptador LIMPIEZA SANITARIA se adecua a diversos tipos de instalaciones haciendo fácil y sencilla las conexiones, facilitando la limpieza de las tuberías, además su diseño roscado y material lo hacen una herramienta de fuerte agarre y precisión.



- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO** Se BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI: A la entrada y salida del desarenador se instalan las respectivas válvulas de compuerta cuya función es elevar o abrir una compuerta para permitir el paso del fluido, en caso de mantenimiento de la estructura se instala un by pass con sus respectivas válvulas de compuerta.



- **TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM** : Se refiere al transporte a lomo de mula hasta el sitio de los trabajos.





- **LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO; EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN y EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO:** Con la finalidad de transportar el agua de la bocatoma, desde la cámara de control de caudal hasta el desarenador se proyecta la línea de aducción en tubería de polietileno de alta densidad PN 10 en 90 mm con un avance de 150 ml al corte de la presente acta.





2.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





El Consorcio Hato laguna 2023 ha establecido un plan de acción para SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud en el trabajo y preservar un estado de salud y bienestar físico, mental y social a los trabajadores.

2.4 CONTRATACIÓN PERSONAL

El consorcio procede a la afiliación del personal previo a los siguientes procesos.

- Exámenes médicos: En verificación de documentación se evidencia los exámenes médicos ocupacionales de ingreso del personal y el cual es adjuntado al presente informe. (Ver anexo; concepto medico ocupacional). Una vez obtenidos los resultados de exámenes médicos se procede a la selección del personal a trabajar.

- Relación de personal en el frente de trabajo:

CARGO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN
Director	MARTHA ENITT VARGAS PEREZ	23556732
Residente	JAIRO YUBER OJEDA CADENA	7227914
Maestro De Obra	JOSÉ MARIO LOMBANA	1051980288
Ayudante De Obra	DANIEL EDUARDO MARTÍNEZ ESPINEL	1051476165
Ayudante De Obra	CARLOS ALBERTO CELY CASTRO	4204599
Ayudante De Obra	YERSON ZAMIR MARTÍNEZ CASTILLO	4217261

- Afiliación a parafiscales: (Ver documento anexo)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIONES Y CESANTÍAS	CAJA DE COMPENSACIÓN
Martha Enitt Vargas Perez	23556732	NUEVA EPS	N/A	COMFABOY
Jairo Yuber Ojeda Cadena	7227914	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFABOY
Carlos Alberto Cely Castro	1051980288	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Daniel Eduardo Martínez Espinel	1051476165	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	PORVENIR	COMFABOY
José Mario Lombana	4204599	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFABOY
Yerson Zamir Martínez Castillo	4217261	COMPENSAR	COLPENSIONES	COMFABOY


- **Dotación de elementos de protección:** Se realizó entrega de dotación de elementos del personal acorde a la actividad que se va a ejecutar, (Ver anexo, formato entrega de elementos de protección individual y dotación)

- **Inducción y capacitación:** La firma contratista realizo inducción SST el día 26/02/2024 a los trabajadores que ingresaron sobre aspectos que componen el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se anexa acta de asistencia. Capacitación específica en temas de seguridad y salud en el trabajo según información formato anexo. Los temas tratados fueron:

  - ✓ Política de seguridad y salud en el trabajo
  - ✓ Uso y cuidado de los elementos de protección individual
  - ✓ Manipulación de herramienta manual
  - ✓ Instrucciones sobre el levantamiento de cargas

3 INFORME AMBIENTAL



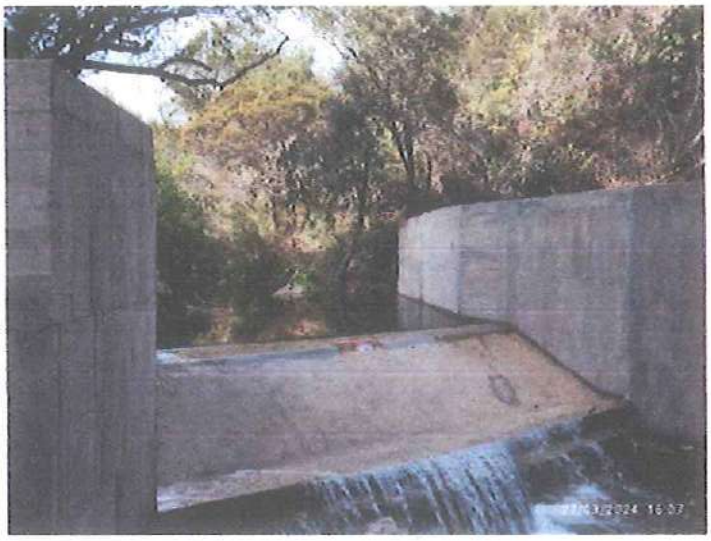

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES ÁREA DE INFLUENCIA

El acueducto objeto del estudio se encuentra ubicado en la vereda Hato laguna. La microcuenca Hato laguna se encuentra ubicada entre los municipios de Aquitania y Sogamoso, se caracteriza por ser uno de los afluentes con mayor drenaje a la laguna de tota, cuenta con un área de 30,76 Km2 (secretaria de salud de Boyacá, 2012) y está conformada por las corrientes La martinera, el Racal, Los Hoyos, la Quebrada Lamuda y Tablón y el **Rio Hato Laguna.**, fuente de ubicación de la bocatoma, objeto del contrato.

La principal actividad productiva en la microcuenca es la agricultura, dentro de los principales cultivos se encuentran la cebolla larga, habas, arveja y papa, siendo la cebolla el cultivo de mayor presencia.

El comportamiento hidrológico de la microcuenca Hato laguna, permite inferir que la ampliación de la frontera agrícola ocasionada por cultivos de cebolla, genere un incremento en el rendimiento de sedimentos, escorrentía superficial y una disminución en la percolación y recarga de acuíferos.

Por otro lado, en lo que respecta a la vegetación los árboles nativos o introducidos que se encuentran en las márgenes del rio han sido talados y en el caso de las plantaciones de pino se han quemado, llegando incluso a secar zonas húmedas o eliminar las coberturas vegetales existentes, entre estos frailejones y otras especies importantes en la conservación del agua, esto con la finalidad de cultivar cebolla.

La escasez hídrica, es otra de las principales problemáticas ambientales durante los periodos secos, lo cual se refleja en la media de las series de caudales, Igualmente se

presenta inconvenientes por la explotación de minas de carbón, ya que se encuentran varias bocaminas en la parte alta en zonas pantanosas o dentro de la ronda del rio (30 metros a cada lado), sin contar con los debidos permisos para la explotación.

A la vez los campesinos realizan zanjas profundas para la realización de drenajes con piedra e implementan maquinaria para las labores de arar y rellenar.

3.2 ASPECTOS AMBIENTALES ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (OBRA)

- **Capacitación ambiental al personal de obra:** En la ejecución del contrato se dio cumplimiento al Proyecto de Capacitación ambiental al personal de obra en donde se capacito al personal de obra en temas ambientales.

- **Cumplimiento y requerimiento ambientales:** Con respecto al cumplimiento de requerimientos legales se verifica al cumplimiento de todos los requisitos para la actividad constructiva a desarrollar, teniendo en cuenta la idoneidad y cumplimiento por parte de los proveedores de materiales, identificando los lugares de disposición de escombros verificando la existencia de documentación ambiental vigente haciendo referencia a los permisos y licencias ambientales. En el programa actividades constructivas- Manejo Integral de materiales de construcción se evidencian los soportes correspondientes a este cumplimiento legal.

3.3 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

- **Manejo integral de material de construcción: Con** respecto a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales generados en la obra por el inadecuado manejo de material de construcción, se implementaron acciones que garanticen la conservación de los recursos naturales y de medio ambiente en general.

- Teniendo en cuenta lo anterior se determinan dos tipos de materiales de construcción, según su tiempo de consumo o utilización: de uso instantáneo y de uso gradual; es decir, los de uso instantáneo fueron aquellos usados al llegar al frente de obra y los de uso gradual aquellos que se acopiaron de manera temporal hasta que fuese necesario su utilización en obra.

3.4 MANEJO DE MATERIALES GRANULARES

- Dentro de las medidas tomadas para para este tipo de materiales se contemplaron: Acopios y/o confinamiento y cubrimiento con polietileno del material presente en obra, lo anterior con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmosfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.

- Según condiciones climáticas se realizó riego permanente sobre las áreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a la atmósfera y vegetación.





- Materiales ingresados a la obra – Proveedores.







4 CONCLUSIONES

Se refleja un avance considerable en el proyecto de construcción y/o mejoramiento del acueducto Buenavista en la vereda Hato Laguna, fase 1, del municipio de Aquitania, Boyacá. Hasta la fecha del informe, se ha logrado un progreso del **45.20%**, a pesar de un breve período de suspensión, se reiniciaron las actividades conforme a lo establecido en el cronograma. Se destaca la eficiente gestión de los contratos, se ha detallado la relación de pólizas de contrato, tanto para garantías generales como específicas para terceros afectados y el municipio de Aquitania, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de las partes involucradas.

En cuanto a las actividades ejecutadas, se han llevado a cabo una serie de tareas preliminares y de ejecución, desde la socialización del proyecto hasta la instalación de tuberías y válvulas. Estas acciones se han desarrollado conforme a los requisitos técnicos y especificaciones del proyecto.

La gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido prioritaria, con la implementación de un programa que incluye exámenes médicos, afiliación a parafiscales, entrega de elementos de protección, inducción y capacitación del personal en aspectos de seguridad laboral. Este enfoque en la seguridad no solo garantiza el bienestar del personal, sino que también contribuye a mantener un entorno de trabajo seguro y productivo.

En relación con el informe ambiental, se han identificado aspectos ambientales tanto en el área de influencia general del proyecto como en el área directa de la obra. Se han implementado medidas para mitigar impactos ambientales, como capacitación ambiental, cumplimiento de requisitos legales, manejo integral de materiales de construcción y medidas específicas para el manejo de materiales granulares. Estas acciones demuestran un compromiso con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social en el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L Consorcio Acueducto Hato laguna

ANEXOS INFORME PARCIAL NO 1

ITEM	CONSORCIO HATO LAGUNA 2023.
1	CONTRATO
2	PÓLIZAS CONTRATO
3	ACTA DE INICIO
4	ACTA DE SUSPENSIÓN
5	ACTA DE REINICIO
6	POLIZAS ACTA DE REINICIO
7	SOCIALIZACIÓN PROYECTO
8	AUTORIZACIÓN PARA PASO DE MATERIAL
9	ACTA DE ASISTENCIA PERSONAL
10	INDUCCIÓN PERSONAL INICIO DE OBRA
11	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP,S
12	CONTROL PREVIO AL INICIO DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES
13	AFILIACIONES DE PERSONAL
14	CERTIFICACION DE CALIDAD Y RESULTADO DE FALLA DE CILINDROS
15	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES A MES
16	BITACORA DE OBRA

CONTRATO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AQUITANIA Y EL CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 R.L. ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA.

Noviembre 22 de 2023

CONTRATO	N° 011 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	800.077.545-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
NIT.	901.775.384-7
REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C. No.	7.226.154 de Duitama
DIRECCION:	Calle 17 No. 10-48 Duitama
CELULAR:	3125693178
E-MAIL:	tundamafll2022@gmail.com
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS. MONEDA CORRIENTE ($220.760.560,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE: TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MA-SAMC-012 DE 2023.

Entre los suscritos: **HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS,** mayor de edad domiciliado en el Municipio de AQUITANIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.939.509 de Bogotá, obrando en condición de Alcalde Municipal de Aquitania – Boyacá elegido por voto popular para el Periodo Constitucional 2020-2023. , cargo para el cual tomó posesión mediante Acta de fecha 19 de Diciembre de 2019, suscrita en el Juzgado Municipal de Aquitania y facultado para celebrar convenios con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y quien obra en nombre y representación de la entidad pública territorial denominada **MUNICIPIO DE AQUITANIA**, por una parte, y quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO** de una parte y de otra parte el Ingeniero **FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.154 expedida en Duitama, en representación del **CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023** y con dirección en la Calle 17 No. 10-47 Duitama, teléfono celular: 3125693178, correo electrónico **tundamafll2022@gmail.com** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos con observancia en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar el presente contrato de OBRA PÚBLICA, objeto de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. **SA-MC-012-2023**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia y las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su honra, vida y bienes. 2) Que la ley 1551 de 2012, los Municipios Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la constitución y la ley y tienen entre otros los derechos a ejercer las competencias que le corresponda conforme a la constitución y a la ley y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 3) Que el Alcalde Municipal, mediante Resolución No. 0279 del 09 de octubre de 2023, Ordeno la Apertura del proceso de Selección Abreviada No. MA-SAMC-012 DE 2023, cuyo objeto es: "REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 100, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA", por un valor de: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS. MONEDA CORRIENTE ($220.760.560,00) M/CTE. por lo que se publicó los pliegos definitivos en el portal único de contratación www.contratos.gov.co. Secop II. **4)** Que una vez verificado el cierre de la convocatoria conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones, se radicaron dos (02) ofertas así: LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO Y CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023. **5)** Que las propuestas presentadas fueron verificadas y evaluadas por parte del comité asesor y evaluador, emitiéndose el respectivo informe preliminar consolidado e informe por componentes, publicado en el SECOP II, al cual se le dio traslado a los interesados por el término de Tres (03) días hábiles según lo señalado en el cronograma del proceso. **6)** Que dentro del término de traslado se presentaron observaciones al informe preliminar emitido por el Comité Evaluador a las cuales le fueron otorgadas sus respectivas respuestas. **7)** Que vencido el término de traslado el comité evaluador de la entidad emitió informe final consolidado de verificación de requisitos habilitantes relacionados con la capacidad jurídica, Técnica, Experiencia, Financiera, organizacional y capacidad residual, presentados documentos de subsanación con informe definitivo en el que se sugirió su adjudicación al proponente **CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023., Representado Legalmente por el Ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.154 de Duitama. **8)** Que una vez agotadas todas las etapas del proceso contractual, el Alcalde Municipal de Aquitania mediante Resolución No. 0317 del siete (07) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), adjudicó el proceso de Selección Abreviada No. MA-SAMC-012 DE 2023, al **CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023, Representado Legalmente por el Ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.226.154 de Duitama, por cumplir con todos los criterios jurídicos, técnicos, económicos, financieros y de experiencia establecidos en el pliego de condiciones y ser favorable para la entidad, además por ser procedente de conformidad con lo previsto en el decreto 1082 de 2015. **9)** Que de conformidad con el Artículo 1603 del Código Civil Colombiano y el numeral 2° del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. **10)** Que, en aplicación al principio de anualidad, (Decreto 111 de 1996; Artículo 14), "*El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)*". **11)** Que este contrato se puede celebrar de conformidad con lo estatuido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios, de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados para la presente contratación por EL MUNICIPIO según lo determina el Artículo 25°, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. **12)** Que **EL CONTRATISTA** ha manifestado bajo la gravedad de juramento no encontrarse dentro de las causales de INHABILIDAD e INCOMPATIBILIDAD consagradas en la Constitución y La Ley. **13)** Que, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, como colaborador de la administración, por consiguiente, se obliga no solo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de él se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o que por ley pertenezcan al contrato. De conformidad con lo anteriormente expuesto las partes obrando bajo el principio de autonomía de la voluntad negocial, acuerdan las siguientes clausulas particulares: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete para con MUNICIPIO, a ejecutar a precios unitarios fijos la obra **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO HATOLAGUNA FASE 1 DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA"**; de acuerdo con la propuesta presentada al Municipio la cual forma parte integral del presente proceso de selección". **CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES:** Los trabajos a ejecutar se sujetarán a las especificaciones técnicas que se plasmaron en el Pliego de Condiciones Definitivo, estudios previos y sus anexos, además la propuesta presentada por **El CONTRATISTA**, que hace parte integral del presente contrato, en especial las consignadas en el anexo técnico separable, de conformidad con los Items, cantidades, especificaciones técnicas y valores unitarios que a continuación se indican:

1.0	BOCATOMA Ancho=4.00m								

1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	60,17	$8.003,49	0%	$8.003,49	$481.570
1,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	7,22	$61.984,68	0%	$61.984,68	$447.385
1,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	10,83	$89.045,56	0%	$89.045,56	$953.533
1,04	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500). 40% RAJON PARABASES	m³	11,62	$525.362,00	4%	$546.376,48	$6.458.170
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m²	4,49	$33.240,66	4%	$34.570,50	$155.222
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	10,00	$1.166.161,43	4%	$1.244.007,89	$12.472.399
1,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	2,50	$1.121.299,67	4%	$1.166.151,66	$2.916.379
1,08	5.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27	$6.722,04	4%	$6.990,92	$7.775.767
1,09	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULODE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00	$315.412,92	4%	$328.029,43	$328.029
1,10	3.13.12	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,00	$73.577,45	4%	$76.520,55	$1.012.723
1,11	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO. 250PSI.	Un	1,00	$1.002.264,69	4%	$1.042.345,09	$1.042.345
1,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$633.189,60	4%	$648.117,18	$648.117
1,13	2.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	3,00	$95.447,92	4%	$99.265,84	$297.798
1,14	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00	$17.406,04	4%	$18.102,28	$54.307
1,15	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINAALFAJOR, CÓN MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,82	$225.222,52	4%	$234.231,42	$894.764
1,16	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	85,00	$94.641,17	0%	$94.641,17	$8.043.999

2,00	DESARENADOR TIPO 1 (9.85m x 3.10m)							
2,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	12,28	$8.003,49	0%	$8.003,49	$98.123
2,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	8,03	$61.984,68	0%	$61.984,68	$497.576
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,05	$89.045,56	0%	$89.045,56	$1.060.948
2,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	3,03	$70.797,24	4%	$73.629,12	$223.096
2,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76	$33.240,66	4%	$34.570,50	$268.267
2,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51	$1.166.161,43	4%	$1.244.007,89	$4.366.468
2,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,18	$1.121.299,67	4%	$1.166.151,66	$1.352.736
2,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09	$1.039.580,89	4%	$1.081.163,33	$97.305
2,09	5.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	822,34	$6.722,04	4%	$6.990,92	$4.350.727
2,10	2.06.06	PASOS UÑA DE GATO D=5.6"	Un	5,00	$10.648,47	4%	$11.074,41	$55.372
2,11	2.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	12,44	$35.599,23	4%	$37.023,20	$460.649
2,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	Un	2,00	$524.941,47	4%	$545.939,13	$1.091.878
2,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00	$17.406,04	4%	$18.102,28	$72.409
2,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO. 250PSI.	Un	4,00	$1.002.264,69	4%	$1.042.345,09	$4.169.380
2,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00	$138.175,67	4%	$143.702,70	$574.811
2,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$51.910,28	4%	$53.986,69	$161.960
2,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC, V=0.22	m	9,00	$73.577,45	4%	$76.520,55	$688.685

2,18	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13	$225.222,52	4%	$234.231,42	$1.435.839
2,19	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	18,00	$94.841,17	0%	$94.841,17	$1.514.259
3,00	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.76m X 4.76m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)							
3,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,58	$8.003,49	0%	$8.003,49	$220.676
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	27,59	$61.984,68	0%	$61.984,68	$1.715.602
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54	$68.045,56	0%	$68.045,56	$2.827.413
3,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,08	$70.797,24	4%	$73.629,12	$887.987
3,05	1.02.26	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,58	$33.240,86	4%	$34.570,50	$53.656
3,06	2.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70	$1.196.161,43	4%	$1.244.007,89	$17.042.908
3,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27	$1.121.299,87	4%	$1.166.151,86	$8.477.929
3,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48	$1.039.660,89	4%	$1.081.143,33	$3.762.579
3,09	8.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,28	$5.722,04	4%	$5.950,92	$22.184.206
3,10	2.06.08	PASO SUÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00	$10.648,47	4%	$11.074,41	$77.521
3,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D= 3"RDE 21 UNIÓN MECANICA	m	27,03	$66.858,71	4%	$69.541,36	$1.879.703
3,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	Un	2,00	$524.941,47	4%	$545.939,13	$1.091.878
3,13	2.06.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00	$17.406,04	4%	$18.102,28	$36.205
3,14	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250PSI.	Un	4,00	$1.002.254,89	4%	$1.042.345,09	$4.169.380
3,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00	$138.175,67	4%	$143.702,70	$1.005.919
3,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$51.910,25	4%	$53.986,66	$161.960
3,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC, V=0.22	m	20,00	$73.577,45	4%	$76.520,55	$1.530.411
3,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00	$54.949,32	4%	$57.147,29	$114.295
3,19	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00	$137.462,34	4%	$142.961,53	$142.962
3,20	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0,10 mts.	m²	4,07	$77.325,82	4%	$80.418,85	$327.305
3,21	1.05.06	PAÑETE IMPERMEABIZADO 1:3	m²	7,28	$29.549,30	4%	$30.731,27	$223.724
3,22	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00	$1.318.153,03	4%	$1.370.879,15	$1.370.879
3,23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$523.199,60	4%	$544.127,58	$544.127
3,24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	2,56	$225.222,52	4%	$234.231,42	$599.632
4,00	RED DE ADUCCION							
4,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	448,62	$1.019,83	0%	$1.019,83	$455.476
4,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	64,31	$61.984,68	0%	$61.984,68	$3.984.845
4,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	18,06	$58.045,56	0%	$58.045,56	$1.048.779
4,04	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10DIAMETRO 90 mm	m	448,62	$38.878,95	4%	$40.432,03	$18.057.751
4,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CONPLANCHA VIBRADORA	m³	80,39	$25.013,02	0%	$25.013,02	$2.010.797
4,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00	$351.623,44	4%	$365.688,38	$1.463.568
4,07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00	$1.128.664,86	4%	$1.171.731,46	$2.343.463

4,08	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00	$481.554,44	4%	$460.016,61	$2.890.100
4,09	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84	$225.222,53	4%	$234.231,42	$899.449
		SUBTOTAL MATERIALES						$169.815.610
						COSTO DIRECTO		$169.815.610
						AIU	30%	$50.944.745
						COSTO TOTAL DE OBRA		$220.760.560
						COSTO TOTAL PROYECTO $220.760.560		

CLAUSULA TERCERA. PLAZO EJECUCION. El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y los demás requisitos señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA. VALOR**: Para los efectos legales el valor total del presente Contrato es por la suma de: **DOSCIENTOS VEINTE MILLONMES SETECIENTOS SESENA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($220.760.560,00) M/CTE. CLAUSULA QUINTA. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.**- El valor de este Contrato se pagará con cargo al presupuesto del Municipio según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000301, de fecha 10 de julio de 2023, conforme a las siguientes especificaciones:

2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos /SGP APSB / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento /VARIOS/VIVIENDA, CIUDAD/SGP

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La naturaleza del contrato es OBRA PUBLICA, El Municipio de Aquitania, cancelará al contratista, mediante actas pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El Municipio para atender el presente compromiso cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2023000301 de 10 de Julio de 2023. Una vez ejecutadas y liquidado en un cien por ciento (100%) el objeto del contrato, previa la presentación de las respectivas actas de liquidación aprobadas por el Supervisor del contrato. previa presentación del respectivo informe del contratista junto con los soportes del caso, avalado por el supervisor que se designe, acreditación de estar al día en el régimen de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales), parafiscales si es del caso, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura acompañada del Informe y registro de cantidades suministradas, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la entidad para el trámite de cuentas. Para efectuar los pagos será necesario: ➢ La entrega al Supervisor de un informe en donde se indiquen las cantidades ejecutadas, con los respectivos soportes. ➢ La presentación del Informe de Ejecución Contractual por parte del Supervisor, en la que se indique que se cumplieron las obligaciones del contrato. ➢ La

constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) si aplica. ➢ La radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores. ➢ Nota: De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla ProAdulto Mayor y Procultura, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato, Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda: Los pagos señalados quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 del 93 y artículo 23 de Ley 1150 de 2007 y demás normas legales y reglamentarias que rigen los pagos en contratos estatales, incluidas las señaladas y demás normas que lo adicionen o modifiquen. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del municipio de AQUITANIA. Lo anterior sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA. Autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería, efectúe el desembolso a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes municipales, departamentales, multas impuestas al contratista, y demás legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Municipio según el Programa Anual Mensualidad de Caja (PAC). El Municipio para atender el presente compromiso cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2023000193 de fecha 24/04/2023. Para proceder al pago del anticipo el contratista deberá presentar las garantías solicitadas, certificado de inversión del anticipo, factura correspondiente, y para pagos parciales el contratista deberá anexar los siguientes documentos: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Acta parcial correspondiente. c. Certificación por medio de la cual se acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007. d. Presentar informes de corte, avalados por el supervisor para cada cuenta de cobro. e. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago a los aportes de la Seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el Artículo 50° de la Ley 789 de 2002 (si es persona jurídica). e. Todos los documentos de pago deberán ser avalados y aprobados por la Interventoría y la Supervisión. **Mayores cantidades de obra:** El reconocimiento de las mayores cantidades de obra por parte del MUNICIPIO requiere previamente la evaluación técnica y económica por parte de la Secretaría de Planeación y de su respectiva aprobación. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems previstos en el Pliego de Condiciones y a los precios que para cada uno de ellos está dispuesto en el pliego de condiciones. **Ítems no previstos:** Los ítems

no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Jefe de la Unidad de Servicios Públicos atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio de mercado y/o la base de precios unitarios de la Gobernación de Boyacá. **CLÁUSULA SEPTIMA.- INTERESES DE MORA**: De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONTRATISTA indicará en sus facturas que EL MUNICIPIO deberá pagar dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por EL MUNICIPIO para su radicación) y aprobada por EL MUNICIPIO. Cuando EL MUNICIPIO no cancele al contratista las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del Artículo 4° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCIÓN:** Lugar de ejecución en el área rural de la jurisdicción del Municipio de Aquitania Vereda de Hatolaguna, **PARÁGRAFO PRIMERO:** En relación con los plazos legales y convencionales, se tendrá en cuenta lo siguiente: En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan: 1. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive; 2. Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y 3. Cuando el último día del plazo total pactado coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer Día Hábil siguiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el **CONTRATISTA** deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos: 1. Suscripción del Contrato. 2. Haber constituido y entregado al MUNICIPIO la garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este Contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del MUNICIPIO. 3. Haber obtenido la aprobación de las hojas de vida del personal exigido y demás documentos del Pliego de Condiciones. Cumplido lo indicado en los numerales anteriores, procederá la firma del acta de inicio de la ejecución del Contrato. **CLÁUSULA NOVENA- PRORROGA**: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el supervisor, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una prórroga de acuerdo con las disposiciones legales. El contratista deberá hacer la petición de suscripción de la prórroga con una antelación no menor de cinco (5) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello la reprogramación de las obras en el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el supervisor del contrato. **PARÁGRAFO.** Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se requiera prorrogar en plazo el contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no se considera que existe razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga en plazo será por cuenta del CONTRATISTA, los cuales serán descontados por el MUNICIPIO de las actas de obra y/o acta de liquidación, para lo cual , el CONTRATISTA con la firma de este contrato autoriza a al MUNICIPIO a realizar el respectivo descuento. **CLÁUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, de la ley, de las señaladas en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor cuantía No **MA-SAMC-012 DE 2023**, el CONTRATISTA se obliga a las siguientes: **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el MUNICIPIO, las siguientes obligaciones: **OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de selección, la propuesta y el contrato que se suscriba. 3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta. 4. Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones del proceso de selección, los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. 5. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 7. Acatar las instrucciones que

durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio de AQUITANIA. 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 10. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 11. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 12. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. 13. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá presentar a la Supervisor, un informe de avance de ejecución de obra y los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución de la obra. 14. Seleccionar para la ejecución de la obra, personal altamente calificado e idóneo, en lo posible mano de obra de la región, que cumpla como mínimo con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demás que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 15. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 16. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 17. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 18. Acoger las directrices definidas por el área competente de El Municipio De AQUITANIA, para el personal de perfil social del Contratista. 19. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 20. Constituir las garantías respectivas. 21. Es obligación del CONTRATISTA que el personal técnico constructor o maestro de obra dispuesto para el contrato, cuente con la experiencia correspondiente. 23. El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los compromisos establecidos en los pliegos de condiciones y a los establecidos en su propuesta, así como a todos los establecidos y/o definidos durante la ejecución del contrato. 24. El CONTRATISTA se obliga a instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde el momento en que la supervisión del contrato lo disponga. 25. El CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de las obras los profesionales matriculados y aceptados por el Municipio De AQUITANIA. 26. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por el CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero, en caso que se requiera. 27. El CONTRATISTA organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del contratista previamente a la iniciación de las actividades correspondientes. 28. El CONTRATISTA garantiza al Municipio De AQUITANIA que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio De AQUITANIA o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato. 29. El contratista se obliga a instalar una valla de acuerdo con las especificaciones que el entregue el Municipio, al momento de inicio de los trabajos. 30. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la Protección Social así como las normas vigentes del municipio de AQUITANIA correspondientes. 31. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. 32. Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera

instancia al municipio de AQUITANIA para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 33. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas vigentes del municipio de AQUITANIA. 34. Las demás inherentes al buen desarrollo del objeto contractual. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** El contratista seleccionado, en desarrollo del objeto contractual deberá cumplir la totalidad de las siguientes obligaciones: **1.** Ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo con las normas colombianas de construcción. **2.** Presentar previo el inicio de las obras el respectivo protocolo de seguridad y salud en el trabajo que además observe lo establecido en la resolución 777 de 2021, con visto bueno de la interventoría y/o supervisión del proyecto, así como de la ARL respectiva, para su aprobación por parte del Municipio. **3.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones y a la oferta presentada. **4.** Garantizar la calidad de los materiales según las especificaciones técnicas contenidas en el proceso de selección. **5.** Suministrar las herramientas, insumos, equipos y materiales para la normal ejecución de los trabajos. **6.** Ejecutar las obras ciñéndose a los estudios, planos, diseños, será obligación del contratista verificar los planos y las cotas antes de iniciar los trabajos, toda discrepancia deberá ser notificada por escrito y aclarada prontamente por el interventor y/o supervisor. **7.** Socializar las labores a realizar, con objeto que la comunidad esté enterada de las interrupciones del servicio se si presentan, debido a las obras construcción. **8.** Mantener informado al supervisor y/o interventor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. **9.** Cumplir con la programación de obra que se apruebe. **10.** Ejecutar las actividades de acuerdo con el cronograma general aprobado por la interventoría y/o supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados. **11.** Llevar a diario bitácora de las obras realizadas. **12.** Elaborar, Suscribir y Presentar a la Alcaldía de Aquitania, las respectivas Actas parciales de Obra, las cuales deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato, según contrato. **13.** Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato. **14.** Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. **15.** Responder por los trabajos asignados y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad que le sean requeridos. **16.** Hacer entrega de los planos récord en formato editable (.dwg) y memorias técnicas, resultados de laboratorios aprobados por la interventoría si es el caso. **17.** Las demás inherentes y necesarias para la correcta ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO** Sera a cargo del MUNICIPIO las siguientes obligaciones: 1. Asegurar que las diferentes dependencias suministren, dentro de los términos establecidos para ello, la información y los documentos necesarios para la ejecución exitosa del contrato. 2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 3. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 4.Prestar colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 5. Garantizar el apoyo logístico para poder realizar las labores pactadas en el cronograma del proceso, el cual hará parte del acta de inicio. 6. Contratar la interventoria que verifique el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. Desembolsar los recursos relacionados objeto del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN:** La Interventoría será contratada por el Municipio mediante proceso de mínima cuantía y con el contratista que resulte favorecido para la buena ejecución y el seguimiento del presente contrato y la supervisión estará a cargo del funcionario que se desempeñe como Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio o quienes a su vez, velarán por los intereses del Municipio y propenderán por el cumplimiento del objeto del Contrato, para lo cual tendrá las funciones que por la naturaleza del presente contrato le sean propias y deberá efectuar el correspondiente seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre la ejecución del objeto del contrato conforme lo establecido en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Entidad, el cual tendrá entre otras las siguientes funciones: 1) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista 2) proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las

obligaciones. 3) Realizar seguimiento a la ejecución del contrato. 4) Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes al Alcalde Municipal. 5) Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato. 6) Informar al Alcalde respecto del incumplimiento de las obligaciones del contratista. 7) Requerir al contratista sobre el incumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato. 8) Suscribir actas de inicio, parciales, de recibo final a satisfacción y liquidación. 9) Solicitar a la secretaria de gobierno con la debida justificación, adiciones, prorrogas o modificatorios al contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA**: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.7 el contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

CLASE DE GARANTIA	AMPAROS QUE CUBRE	VALOR DE LA GARANTÍA	SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO	Cumplimiento del Contrato	20% Del valor total del contrato	Plazo de ejecución del contrato y 6 meses más que es el plazo para liquidar el contrato de mutuo acuerdo
	Estabilidad y calidad de la obra	20% Del valor total del contrato	por cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
	Pago de salarios prestaciones sociales y legales e indemnizaciones laborales.	10% Del valor del contrato.	Plazo de ejecución del contrato y 3 años más que es el tiempo de prescripción legal.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	Con el objeto de protegerse y proteger al Municipio contra reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño a la propiedad que pueda surgir por causa de la obra objeto de este Contrato, ejecutada por el contratista, sus empleados, directores, o asociados y subcontratistas. El contratista designará también al Municipio como parte asegurada de la póliza de seguro con responsabilidad extracontractual y daños a la propiedad. La cobertura mínima del seguro de responsabilidad extracontractual a que se refiere esta cláusula será de 200 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) por el término de duración del mismo y su monto se repondrá en todos los casos en que por cualquier evento se disminuyere como consecuencia de su pago total o parcial, por ocurrencia de los siniestros que ampara.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, dichas garantías deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para efectos de la vigencia de la garantía exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación del suministro. Las Pólizas deberán constituirse a favor del MUNICIPIO DE AQUITANIA. El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente contratación señala. Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA. El régimen de garantías se somete a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de Entrega y Recibo Final, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los Pliegos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Municipio de AQUITANIA. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y

serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del Municipio de AQUITANIA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Municipio de AQUITANIA para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS:** EL MUNICIPIO tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17° de la Ley 1150 DE 2007, EL Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. En virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA autoriza a AL MUNICIPIO para imponerle multas mediante Acto Administrativo en la cuantía que a continuación se describe, así: 1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución e inicio del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en los contratos los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. 2. por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que hacen parte integral del mismo, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 1x1000 del valor total el contrato por cada día calendario que trascurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido, EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato y/o hacer efectiva la cláusula penal. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor máximo de las multas y cláusulas penales señaladas anteriormente, no podrá superar treinta por ciento (30%) del valor del Contrato de Obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** el pago o deducción de las multas y/o cláusulas penales no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones emanadas en el contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** en caso de proceder a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, y/o se haga efectiva la cláusula penal, de conformidad con el Artículo 17° de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente Contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a favor el CONTRATISTA, previo a las retenciones por tributos a que haya lugar sobre dichos saldos a favor. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** en caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento parcial o total del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagará a AL MUNICIPIO, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause a AL MUNICIPIO. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato de Obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** en caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el Artículo 17° de la Ley 1150 de 2007, Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 , el CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo descuento de las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL, DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y DEMÁS**

SANCIONES CONTRACTUALES; de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), EL MUNICIPIO tendrá la facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente. En caso de no existir un procedimiento de rango legal al momento de la iniciación de la actuación respectiva, en virtud de la autonomía negocial que a las partes les asiste, se aplicará el procedimiento que se establece a continuación: Una vez evidenciado por parte del interventor y/o área coordinadora la existencia de un posible incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, EL MUNICIPIO citará al CONTRATISTA a audiencia para que el rinda sus descargos. En la citación se informará, expresa y detalladamente los hechos que soportan acompañado el informe de la interventoría en que se sustente la actuación, y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas, así como las consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. En la misma se especificará el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. El municipio enviará este requerimiento, vía fax, correo electrónico o correo certificado. Esta audiencia deberá celebrarse a la mayor brevedad posible. Las comunicaciones se surtirán a través del número de fax, dirección de correo electrónico y/o dirección de residencia suministrados por el CONTRATISTA en su propuesta, siempre con copia a la entidad garante del CONTRATISTA. El CONTRATISTA informará a AL MUNICIPIO de los cambios en su fax, correo electrónico y/o dirección de residencia para el recibo de comunicaciones. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el Garante y su coasegurado, si fuera el caso, serán citados de la misma manera a audiencia, para debatir el presunto incumplimiento de las Obligaciones a cargo del CONTRATISTA. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas, así como las consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra el representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir explicaciones del caso, aportar y controvertir las pruebas presentadas por la entidad, por única vez. Los descargos presentados por el CONTRATISTA, el interventor del contrato efectuará un análisis técnico de los argumentos y conceptuará sobre la imposición o no de la multa, cláusula penal y/o caducidad y demás sanciones, según corresponda. En audiencia se proferirá resolución motivada donde se decidirá sobre la imposición o no de la multa, cláusula penal, caducidad y demás sanciones, según corresponda. En cualquier momento de desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrán suspenderla cuando de oficio o a petición de parte, ellos resulten en su criterio necesario, para allegar a practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Si el MUNICIPIO establece que existe incumplimiento, que amerita la declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la cláusula penal pecuniaria u otra sanción, hará los descuentos a que haya lugar, en el caso de existir saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, previo a efectuar las retenciones por tributos a que haya lugar. Si no existen saldos se requerirá al CONTRATISTA para que realice el pago de la sanción respectiva, en un término máximo de diez (10) días hábiles. En caso de que este no pague, se requerirá a la compañía de seguros o al garante, conforme a lo dispuesto en el Artículo 180 del Código de Comercio, inciso modificado por el parágrafo del Artículo 101° de la Ley 510 de 1999, a través de correo certificado. Para que asuma el pago correspondiente, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto administrativo. En el evento de que el CONTRATISTA ni el garante cancelen dentro del plazo establecido, se procederá a cobro judicial. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- CADUCIDAD:** Reunidos los supuestos legales para la aplicación, el MUNICIPIO declarará la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 18° de la Ley 80 de 1993, Ley 40 de

1993, Ley 418 de 1997 y Ley 548 de 1999, Ley 1882 de 2018, seguido el procedimiento previsto en la cláusula 20 de este Contrato. **PARÁGRAFO**: En la resolución que declare la caducidad se dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** se entienden incorporadas a los contratos las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15°,16° y 17° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- CESIÓN DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO, cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones jurídicas, técnicas y financiera que demostró el CONTRATISTA cedente para el proceso de selección. Los anteriores criterios se aplican igualmente en los eventos en que el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA - SUBCONTRATACIÓN:** el CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante EL MUNICIPIO por cumplimiento de las obligaciones del Contrato y la celebración subcontratos. En todo caso, la EL MUNICIPIO se reservará el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las actividades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre EL MUNICIPIO y el subcontratista no se configura vínculo contractual alguno y el CONTRATISTA mantendrá indemne a AL MUNICIPIO frente a las obligaciones que adquiera con aquel. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL:** El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA, por una parte, y entre MUNICIPIO y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. **PARÁGRAFO PRIMERO**: será obligación del CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que se emplee para la ejecución del presente contrato de acuerdo con la Ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o SUBCONTRATISTA(S). Por las razones anteriormente expuestas, EL MUNICIPIO se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime AL MUNICIPIO de las mismas. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Lo pactado es esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que se celebre el CONTRATISTA mantendrá indemne a AL MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(S) o proveedores, así como el personal de éstos que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista, mantener a AL MUNICIPIO indemne de cualquier reclamación, demandas, acciones, legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto contratado. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra EL MUNICIPIO y que sean responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne a al municipio y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES:** En el evento que a AL MUNICIPIO le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la entidad o en su defecto rembolsar lo pagado . El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo. **CLÁUSULA**

VIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la ejecutoria del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con los estipulado en el Artículo 60° de la Ley 80 de1993 modificado por el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, EL MUNICIPIO tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 141° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicios de los previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** Las cláusulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determina el Artículo 28° de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos contractuales: 1. Pliego de condiciones y adendas. 2. Contrato. 3. Apéndices. 4. Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5. Resolución de Adjudicación. 6. Documento de Estudio de Evaluación. 7. Estudios y documentos previos del proceso de selección. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.** Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general se da por comprendido el contrato en forma integral. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.** En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá recurrir a los mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstas en el Artículo 68° de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 446 de 1998, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas vigentes. Para los casos eminentemente técnicos se recurrirá al peritaje definitorio consagrado en el Artículo 74° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGECIMA OCTAVA - IMPUESTOS.** Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a al MUNICIPIO, son a cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de tributos, EL MUNICIPIO practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGECIMA NOVENA- COMPROMISOS DE ANTICORRUPCIÓN:** El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del MUNICIPIO y/o personal. **CLÁUSULA TREGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el pliego de condiciones, sus adendas, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el contratista. **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 1. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **2. REQUISITOS DE EJECUCIÓN.** Para su ejecución requiere de la constitución y aprobación por parte del MUNICIPIO de la garantía única; cumplidos estos

requisitos se entenderá legalizado el contrato, esto conforme a lo reglado por el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual el Municipio de Aquitania, quedando expreso para las partes que el presente contrato se rige por las leyes colombianas y que está sometido a los Tribunales Nacionales. Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

El contratante,

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal de Aquitania

El Contratista

ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023

Elaboró: Roisaura Piamonta
Secretaria Despacho Alcalde
Revisó: Dr. Juan Manuel Pérez
Jurídico Contratación



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

PÓLIZAS CONTRATO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101025473	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	12	2023	22	11	2023	00:00	22	02	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023		NIT: 901.776.384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO: 3017557812

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA		NIT: 800.077.545-5
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO 1
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA LA VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2023	22/08/2024	$44,152,112.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/11/2023	22/02/2027	$22,076,056.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$44,152,112.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
AQUADUCTOS SAS	901284585-3	40.00
TUNUAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S.	901605350-9	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****814,999.00	$ *****20,000.00	$ *****158,649.00	$ **********993,649.00	$ ******110,380,280.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101025473

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zamole R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101008654	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	12	2023	22	11	2023	00:00	22	02	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	NIT: 901.775.384-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 NRO. 10 - 48	DUITAMA, BOYACA	3017557612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800.077.545-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	AQUITANIA, BOYACA	1

BENEFICIARIO: 800077545 - MUNICIPIO DE AQUITANIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-H-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RCE DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE I, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2023	22/02/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2023	22/02/2024	$116,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/11/2023	22/02/2024	$116,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
AQUAINCTOS SAS	901284565-3	40.00
FUNDAVA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S.	901605350-9	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****175,430.00	$ *******3,000.00	$ ******33,901.00	$ **********212,331.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101008654

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE INICIO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

ACTA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
(Diciembre 13 de 2023)

CONTRATO	N° 011 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	800.077.545-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
NIT.	901.775.384-7
REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C. No.	7.226.154 de Duitama
DIRECCION:	Calle 17 No. 10-48 Duitama
CELULAR:	3125693178
E-MAIL:	tundamafij2022@gmail.com
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS. MONEDA CORRIENTE ($220.760.560,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE: TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MA-SAMC-012 DE 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2023000465 24/11/23

En el Municipio de Aquitania (Boyacá), a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron a saber: el Doctor HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS, en su condición de Alcalde Municipal, la Ingeniera SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania, Supervisor del Contrato en referencia, ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE, en representación propia quien ejerce la Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y Legal al contrato de obra, y el Ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA como representante legal de CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023. Contratista del CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA No. 011 de 2023; Reunidos con el objeto de suscribir la presente acta de Inicio del Plazo de Ejecución del contrato de Obra Pública en referencia, para el cumplimiento del objetivo propuesto, Teniendo en cuenta lo siguiente

PRIMERO: Que, mediante Proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada de Menor cuantía No. MA-SAMC-012 DE 2023, fue convocado el Proceso que tiene como objeto: *"Realizar la Construcción y/o mejoramiento del acueducto Buenavista de la Vereda de Hatolaguna Fase 1, del Municipio de Aquitania Departamento de Boyacá"*, adjudicando Contrato de Obra Pública a CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023, Representado

Powered by CamScanner

legalmente por el Ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA, Suscrito contrato No. 011 el 22 de Noviembre de 2023.

SEGUNDO: Que el contratista presentó las pólizas Nos. 51-40-101008654 y 51-44-101025473, expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., con fecha de expedición 13 de diciembre de 2023, aceptadas mediante Acta No. 0120 de fecha 13 de diciembre de 2023.

TERCERO: Que, el Municipio de Aquitania estipulo en la Cláusula Cuarta del contrato referido, que el plazo para la ejecución del contrato será de tres (03) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

CUARTO: Que fue celebrado Contrato de Consultoría No. 010 el veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), con el objeto de llevar a cabo la "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL A LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA", debidamente legalizado.

QUINTO: Que la Supervisión por parte del Municipio la ejerce la Unidad de Servicios Públicos y de conformidad a lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan iniciar la ejecución del contrato.

SEXTO: Que, mediante la presente acta, las partes acuerdan iniciar la ejecución del contrato y dar cumplimiento al objeto contractual.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
ALCALDE MUNICIPAL – AQUITANIA

SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
JEFE UNIDA DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISOR

ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
Interventor

Proyectó Revisó y Aprobó
Secretaria de Gobierno

Powered by CamScanner



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

ACTA DE SUSPENSION No. 01 PLAZO DE EJECUCION C.O.P. No. 011 DE 2023

(Diciembre 22 de 2023)

CONTRATO	N° 011 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	800.077.545-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
	NIT: 901775384-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C. No.	7.226.154 DE DUITAMA
DIRECCION:	Calle 17 No. 10-48 Duitama – Boyacá
CELULAR:	3125693178
E-MAIL:	fundamalij2022@gmail.com
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($220.760.560,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MA-SAMC-012DE 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	202300046S 24/11/23
ACTA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 01	22 DE DICIEMBRE DE 2023

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS, obrando en su condición de Alcalde Municipal de Aquitania – Boyacá, FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.226.154 de Duitama, en calidad de representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 Como Contratista, ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE, Quien ejerce la Interventoría sobre el contrato de obra pública No. 011 de 2023 y SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos en calidad de Supervisor, hemos acordado celebrar Suspensión No. 01 al Contrato de Obra Pública No. 011 de Noviembre 22 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1). Que, mediante Proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MA-SAMC-012 DE 2023, fue convocado el Proceso que tiene como objeto:

Powered by CamScanner

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, adjudicando Contrato de Obra Pública al CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 R.L. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, Suscrito contrato No. 011 el 22 de noviembre de 2023.

2). Que el contratista presentó las pólizas Nos. 5144-101025473 y 5140-101008654, expedidas por la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO.

3). Que, el Municipio de Aquitania estipulo en la Cláusula tercera del contrato referido, que el Término de duración y/o Ejecución será de tres meses a partir del acta de inicio

4) Que mediante comunicación de fecha 19 de diciembre de 2023, FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, Representante Legal del CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023, Solicitó al Interventor y este a su vez al Supervisor, la posibilidad de efectuar Suspensión Temporal Justificando dicha solicitud en que la comunidad se encuentra en proceso de legalización del predio y requiere cancelar un saldo pendiente para poder protocolizar dicha transacción, se requiere adelantar permisos de servidumbre por los sitios donde se requieren adelantar zanjas para el paso de tuberías, adelantar actas de vecindad para identificar posibles afectaciones durante la ejecución.

5). Que la Interventoría mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2023 y la supervisión mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2023 señalan que el proyecto cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA", *cumple en sus aspectos técnicos y financieros, por lo que emite concepto de viabilidad a la solicitud de Suspensión de No. 01 requerida por el Contratista y avalada por la Interventoría, además de cumplir con los requerimientos y requisitos de presentación y justificación* así: a). que los estudios y diseños desde el acta de inicio y hasta la fecha de solicitud de suspensión el contratista, supervisor e interventor realizaron actividades de verificación de estos si presentar algún tipo de observación; b). Que el contratista requiere levantar actas de vecindad por el sitio donde se transportaran materiales y por época decembrina parte de la comunidad no se encuentra en la zona, c). Que se requiere adelantar permisos de servidumbre por los sitios donde se ejecutaran zanjas para instalación de tuberías y se requiere que los propietarios firmen consentimiento. Es así como 1). Teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista y respaldado por el interventor en los oficios presentados por cada uno y resumidos en la presente acta se considera viable suspensión

[illegible] por [illegible], que garantiza el CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, debidamente Aceptada mediante la respectiva Acta.

Powered by CamScanner

del contrato de obra que la Supervisión ejercida por parte del Unidad de Servicios Públicos, avala de justificación expuesta teniendo en cuenta la aprobación por parte del Ejecutivo Municipal, con reinicio una vez sean superados los inconvenientes presentados

6) Que las garantías presentadas para la legalización del contrato de Obra Pública No. 011 de 2023, se encuentran vigentes.

7) El Contratista presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías inicialmente presentadas, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la presente suspensión y estipulados una vez reiniciadas las actividades.

Para constancia se firma en Aquitania, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
ALCALDE MUNICIPAL

SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISOR

FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
INTERVENTOR

Powered by CamScanner



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

ACTA DE REINICIO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

ACTA DE REINICIO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
(Febrero 23 de 2024)

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
N.I.T.	800.077.545-5
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-012-2023
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023
NIT	901.775.384-7
REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
CEDULA No	7.226.154 DE DUITAMA
OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA"
SUPERVISOR	ING. DIEGO MONTAÑA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($ 220.760.560,00)
CDP Y FECHA	2023000301 de fecha 10/07/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2020000465 de fecha 24/11/2023
PLAZO INICIAL	TRES MESES
ACTA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 01	22 DE DICIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Aquitania, a los Veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el ING. ÓSCAR DARÍO HURTADO PÉREZ, en su condición de Alcalde Municipal, el ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania en calidad de Supervisor del Contrato en referencia, ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE, en representación propia quien ejerce la Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y Legal al contrato de obra, el ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA identificado con cédula de ciudadanía número 7.226.154 expedida en Duitama, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 identificado con Nit 901.775.384-7 como contratista, con el fin de suscribir ACTA DE REINICIO 01 DEL PLAZO DE EJECUCIÓN del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023 para el cumplimiento del objeto propuesto previa las siguientes consideraciones:

1). Que mediante Proceso Contractual en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-012-2023, fue convocado el proceso que tiene como objeto: *"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA"*, adjudicando Contrato de Obra Pública al CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023 identificado con Nit 901.775.384-7, representado legalmente por el ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA identificado con cédula de ciudadanía número 7.226.154 expedida en Duitama, suscrito Contrato No. 011 de 2023 el 22 de noviembre de 2023.

2). Que el contratista presentó las pólizas Nos. 51-40-101008654 y 51-44-101025473, expedidas por la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A., con fecha de expedición 13 de Diciembre de 2023, aceptada mediante acta No. 0120 de fecha 13 de Diciembre de 2023.

3). Que, el Municipio de Aquitania estipulo en la Cláusula Tercera del contrato referido, que el Término de duración y/o Ejecución será de tres (03) meses, a partir del Acta de Inicio, acta suscrita el 13 de diciembre de 2023, una vez celebrado Contrato de Consultoría No. 010 el veintiuno (21) de

Powered by CamScanner

noviembre de dos mil veintitrés (2023), con el objeto de llevar a cabo la "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1 DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA", debidamente legalizado.

4). Que de común acuerdo entre las partes suscribieron acta de suspensión No. 01 el 22 de diciembre de 2023.

5). Que, Superados los inconvenientes presentados y que generaron suspensión del contrato en referencia; el contratista, la Interventoría y la Supervisión solicitan se realice aprobación del reinicio de actividades.

6). Que las garantías presentadas para la legalización del contrato de Obra Pública No. 011 de 2023, se encuentran vigentes.

7). Con lo anteriormente expuesto, las partes por medio de la presente acta, acuerdan **Reiniciar** actividades y dar cumplimiento al objeto contractual.

8). Por presentarse suspensión temporal, el contratista deberá cobijar la ampliación de vigencias de las garantías inicialmente presentadas, en el momento de la reiniciación objeto de la presente acta.

Para constancia se firma en Aquitania, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL

DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS - SUPERVISOR

FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
CONSORCIO ACUEDUCTO SUSE 2023
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

PÓLIZAS ACTA REINICIO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101025473	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2024	22	11	2023	00:00	22	02	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	NIT:	901.775.384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO:	3017557612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT:	800.077.545-5
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO	1
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECG0169, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA(N)

GARANTIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA LA VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE ANEXO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(814,999.00)	$ ***(20,000.00)	$ ***(158,649.00)	$ *********(993,649.00)	$ ****(110,080,280.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CARRERA 10 NO. 14-130 L.104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101025473

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101025473	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2024	13	12	2023	00:00	15	03	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901,775,384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: QUITAMA, BOYACA	TELÉFONO:	3017557812

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AQUITANIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800,077,545-5
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO	1
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACUERDAN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA LA VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	12/05/2024	$44,152,112.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	15/03/2029	$22,076,056.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$44,152,112.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****814,999.00	$ *****20,000.00	$ *****158,649.00	$ **********993,649.00	$ ******110,360,280.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101025473

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda Vicepresidente de Finanza

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101025473	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	02	2024	13	12	2023	00:00	15	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.778.384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO:	3017657612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AQUITANIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.077.615-3
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO	1
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESCRITAS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RUDIMENTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 3, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PARA SU AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA LA VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	15/11/2028	$44,152,112.00	$44,152,112.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	15/03/2027	$22,076,056.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$44,152,112.00	$44,152,112.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023, DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE FECHA 22/12/2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE FECHA 23/02/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ **********0.00	$ ******110,380,280.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205056	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101025473

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ortiz - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	61	61-44-101025473	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2024	15	12	2023	00:00	15	03	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.775.384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO:	3017557612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AQUITANIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT: 800.027.565-3
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO: 1

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACOGIDA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA LA VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2023	15/12/2024	$44,152,112.00	$44,152,112.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2023	15/06/2027	$22,076,056.00	$22,076,056.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS		$44,152,112.00	$44,152,112.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023, DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE FECHA 22/12/2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE FECHA 31/02/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******6,223.00	$ ******8,000.00	$ ******3,272.00	$ **********20,496.00	$ ******110,380,280.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205056	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

61-44-101025473

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Otalora - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-10 TELEFONO: 601-2185877, 601-6019134

DLF2023STA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	61	61-40-101008554	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2024	22	11	2023	00:00	22	02	2024	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	NIT: 901,775,384-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 NRO. 10 - 48	DUITAMA, BOYACA	3017557612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800.077.545-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	AQUITANIA, BOYACA	1

BENEFICIARIO: 800077545 - MUNICIPIO DE AQUITANIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-3020 - 1339-P-05-00000-R-RCE-002A-D001 / 31-01-22 -1339-P-05-00000-R-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RCE DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(175,430.00)	$ ****(3,000.00)	$ ****(33,901.00)	$ *******(212,331.00)	$ ***(232,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CONTRATO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	225059	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731857 - SOGAMOSO

51-40-101008554
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Mcgerente Sucursal de Efectos

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101008554	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2024	13	12	2023	00:00	14	03	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	NIT: 901.775.384-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 NRO. 10 - 48	DUITAMA, BOYACA	3017557812

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800.077.545-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	AQUITANIA, BOYACA	1

BENEFICIARIO: 800077545 - MUNICIPIO DE AQUITANIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-03-2020 - 1329-P-06-80000-R-RCE-0028-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-R-RCE-0010-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RCE DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	14/03/2024	$232,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	14/03/2024	$116,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	14/03/2024	$116,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13/12/2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******175,430.00	$ ******3,000.00	$ ******33,901.00	$ ******212,331.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARINA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L.104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101008554
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101008854	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2024	13	12	2023	00:00	15	05	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	NIT: 901.775.384-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 17 NRO. 10 - 48	DUITAMA, BOYACA	3017557612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800.077.545-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	AQUITANIA, BOYACA	1

BENEFICIARIO: 800077545 - MUNICIPIO DE AQUITANIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-1026 - 1329-P-06-00000-E-RCE-0002A-0001 / 51-03-12-1329-P-06-00000-E-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RCE DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	13/12/2023	15/05/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	13/12/2023	15/05/2024	$116,000,000.00	$116,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	13/12/2023	15/05/2024	$116,000,000.00	$116,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DEL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA No. 011 DE 2023, DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION No.01 DE FECHA 22/12/2023 Y ACTA DE REINICIO No.01 DE FECHA 23/02/2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******118,224.00	$ ******3,000.00	$ ******23,032.00	$ **********144,257.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101008854
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101008654	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	02	2024	13	12	2023	00:00	15	05	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.776.384-7
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 10 - 48	CIUDAD: QUITAMA, BOYACA	TELÉFONO: 3017557812

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE AQUITANIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.077.545-5
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL	CIUDAD: AQUITANIA, BOYACA	TELÉFONO 1

BENEFICIARIO: 800077545 - MUNICIPIO DE AQUITANIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-03-2020 - 1328-P-06-08000-R-RCE-0019-D001 / 31-03-22 -1328-P-06-08000-R-RCE-0019-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RCE DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C11 DE 2023 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASEGURADO: MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT:800.077.545-5

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	15/05/2024	$260,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	15/05/2024	$130,000,000.00	$116,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	13/12/2023	15/05/2024	$130,000,000.00	$116,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO A LOS 200 SMMLV DEL 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,871.00	$ ******3,000.00	$ ******4,155.00	$ **********26,026.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA VARGAS ASESORES DE SEGUROS L	205058	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 19 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101008654
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIALIZACIÓN PROYECTO

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

SOCIALIZACIÓN ACUEDUCTO VEREDA HATO LAGUNA AQUITANIA – BOYACÁ

Firma asistentes a la socialización para la construccion acueducto en la VEREDA HATO LAGUNA

Socializacion Vereda
Hato laguna

Nombre	cedula	N° Telefono
Evangelio Martinez	3112974477	9398253
Hugo Gutierrez R.	7.125278	3118124944
Hector H. Jomz	19219369	3115826810
Maria del Carmen Lloro	23944578	3143338279
Yerson Zamir Castillo	4217262	3106733770
Nidia Gutierrez Rodriguez		3214718400
Pilar Gómez S.	1057596916	3023957359
Otilia Salomonea	23943246	3023951581
Alba Marina Rodriguez	23943698	3112059767
JAIRO ALEXANDER COPIA	74081950	3112750654
JORGE Chaparro	4121676	3263467411
Juan Eduardo	C.C 74780799	3143500349
HERNANDO ESPINEL	4121676	3226346741
Dora Isabel Chaparro	23946624	2203140902
Imelda Chaparro de	23942717	3775347308
Sonia Patricia	CC1020703742	3775347308
Dayana Rodriguez	1057478291	3223880520
Josefina Chaparro	30010531567	7125201
Matilde Pedraza		3122206918
Segundo Rios	7126723	3732674056
Arlibaci Smith Aragaua	1057573605	3103147416
Oscar Rafael Celis	1053588088	3149425230
Clara Ines Chaparro Pedraza	23946468	322.773582o.
Josue Serafin Cadena.		3212039300



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

AUTORIZACIÓN PARA PASO DE MATERIAL

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

AUTORIZACION PARA EL PASO DE MATERIAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ

Sector: _____

Entre los suscritos a saber Orfilia Lagos Lopez

Identificado con cedula de ciudadanía 9.531751 SOGA 200758 actuando como propietario o poseedor del predio, mediante el siguiente documento acuerdan lo siguiente:

PRIMERA. Que el señor Orfilia Lagos Lopez da autorización para el paso de materiales en carga mular y/o carga hombre destinado a las obras del acueducto denominado **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ,** dichas obras beneficiaran a la comunidad con el mejoramiento de la calidad de agua, ocupación que será temporal por parte del contratista que intervendrá el predio solamente el tiempo de ejecución de la obra, garantizando que el área intervenida será retomada por el dueño del predio o poseedor del predio en el estado original y en su efecto si se intervienen pastos volver a instalarlo en su sitio.

Orfilia Lagos Lopez _____

FIRMA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR FIRMA PRESIDENTE ASOCIACION ACUEDUCTO

_____ _____

FIRMA CONTRATISTA FIRMA INTERVENTOR

AUTORIZACION PARA EL PASO DE TUBERIA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ

Sector: _____

Entre los suscritos a saber Anselmo Segura López

Identificado con cedula de ciudadanía 4.531.467 Soatá actuando como propietario o poseedor del predio, mediante el siguiente documento acuerdan lo siguiente:

PRIMERA. Que el señor Anselmo Segura López da autorización para las obras de instalación de tubería del acueducto denominado **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ,** dichas obras beneficiaran a la comunidad con el mejoramiento de la calidad de agua, ocupación que será temporal por parte del contratista que intervendrá el predio solamente el tiempo de ejecución de la obra, garantizando que el área intervenida será retomada por el dueño del predio o poseedor del predio en el estado original y en su efecto si se intervienen pastos volver a instalarlo en su sitio, el dueño del predio o poseedor del predio dejara ocupación permanente el área de paso de la tubería sin causar daño ni perjuicio.

Anselmo Segura López _____

FIRMA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR FIRMA PRESIDENTE ASOCIACION ACUEDUCTO

_____ _____

FIRMA CONTRATISTA FIRMA INTERVENTOR

AUTORIZACION PARA EL PASO DE TUBERIA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ


Sector: _____

Entre los suscritos a saber Germán Castillo Lopez

Identificado con cedula de ciudadanía 9.533541 actuando como

propietario o poseedor del predio, mediante el siguiente documento acuerdan lo siguiente:

PRIMERA. Que el señor Germán Castillo Lopez da autorización para las obras de instalación de tubería del acueducto denominado **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ,** dichas obras beneficiaran a la comunidad con el mejoramiento de la calidad de agua, ocupación que será temporal por parte del contratista que intervendrá el predio solamente el tiempo de ejecución de la obra, garantizando que el área intervenida será retomada por el dueño del predio o poseedor del predio en el estado original y en su efecto si se intervienen pastos volver a instalarlo en su sitio, el dueño del predio o poseedor del predio dejara ocupación permanente el área de paso de la tubería sin causar daño ni perjuicio.



FIRMA PROPIETARIO Y/O POSEEDOR

FIRMA PRESIDENTE ASOCIACION ACUEDUCTO

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR

ACTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

TUNDAMA CONSTRUCTORA

HOJA DE ASISTENCIA REUNIONES/CAPACITACIONES O CHARLAS

Código: FT-GH-01-010
Versión: 04/2017.08

FECHA: 26-04-2021 TEMA A TRATAR: Inducción

RESPONSABLE Juliana Alejandra Cardenas CARGO: Hseq

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	DANIEL EDUARDO MARTINEZ	AUXILIAR	
2	Jose Mario Jaramillo	Auxiliar	
3	Luis Felipe Chaparro R	Ayudante	
4	Carlos Alberto Cely C.	Ayudante	Carlos Alberto C.
5	Yerson Zamir C. M.	Ayudante	Yerson Zamir C.
6	Hilton Perez	Administrativo	
7	Juliana Alejandra Cardenas Silva	Residente Hseq	
8	Juan Carlos Cely	Maestro General	Juan Carlos Cely
9	Andres Felipe Ruiz Pidiache	Interventor	
10	Martha I Correa P.	Director de obra	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
2			
33			
34			
35			



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

INDUCCIÓN

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

TUNDAMA	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007
		Versión: 04 / 2023.03
		Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE SI	REQUIERE NO	REQUIERE N/A	FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Candado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte Incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Quimicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al Inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehiculos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido Instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación especifica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						

Observaciones generales:

TUNDAMA CONSTRUCTORA	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007 Versión: 04 / 2023.03 Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE SI	REQUIERE NO	REQUIERE N/A	FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Cerdado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte Incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Químicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehículos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido Instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación especifica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						

Observaciones generales:

TUNDAMA CONSTRUCTORA	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007 Versión: 04 / 2023.03 Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE SI	REQUIERE NO	REQUIERE N/A	FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Candado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Químicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehículos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación especifica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						

Observaciones generales:

TUNDAMA CONSTRUCTORES	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007
		Versión: 04 / 2023.03
		Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE			FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
	SI	NO	N/A			
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Candado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte Incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Químicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehículos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		Cortes Alberto C.
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido Instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación específica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación específica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación específica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						
		—	—			
		—	—			
		—	—			

Observaciones generales:

TUNDAMA	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007 Versión: 04 / 2023.03 Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE SI	REQUIERE NO	REQUIERE N/A	FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Candado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte Incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Químicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehículos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido Instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación especifica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						
		—	—			
		—	—			
		—	—			

Observaciones generales:

TUNDAMA CONSTRUCTORA	INDUCCION Y REINDUCCION A PERSONAL NOMINA Y CONTRATISTA	Código: FT-GH-01-007 Versión: 04 / 2023.03 Página: 1 de 1

NOMBRE: _____ NÚMERO DE CÉDULA: _____

CARGO: _____ AREA: _____

ACTIVIDAD	REQUIERE SI	REQUIERE NO	REQUIERE N/A	FECHA REALIZACIÓN	NOMBRE Y FIRMADEL RESPONSABLE	NOMBRE Y FIRMA DEL COLABORADOR
CAPACITACION ESPECIFICA EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Evacuación segura	X			26/02/2024		José Mario Lambraño T.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			26/02/2024		
Política No alcohol tabaco y drogas	X			26/02/2024		
Política de desconexión laboral	X			26/02/2024		
Candado de Seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de Riesgos y Peligros	X			26/02/2024		
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X			26/02/2024		
No te quedes callado "INFORMA" (Reporte Incidente o Accidente)	X			26/02/2024		
Uso y cuidado de los elementos de protección individual	X			26/02/2024		
Instructivo Manipulación de herramientas manuales	X			26/02/2024		
Instructivo Levantamiento de cargas	X			26/02/2024		
Instructivo Prácticas seguras en ambientes de trabajo	X			26/02/2024		
Instructivo Prevención de Ataques caninos	X			26/02/2024		
Brigadistas comprometidos con la seguridad	X			26/02/2024		
Socialización de campañas de seguridad	X			26/02/2024		
Matriz de impactos ambientales, Clasificación de residuos, Manejo de Sustancias Químicas - Hojas de Seguridad	X			26/02/2024		
Control Previo al inicio de los trabajos	X			26/02/2024		
Diligenciamiento de Preoperacionales vehículos y equipos	X			26/02/2024		
COPASST	X			26/02/2024		
Comité de Convivencia Laboral	X			26/02/2024		
Comité de Seguridad Vial	X			26/02/2024		
CAPACITACION ESPECIFICA DE TALENTO HUMANO						
Presentación y Comunicación de Manual de funciones	X			26/02/2024		
Socialización de Reglamento Interno de Trabajo	X			26/02/2024		
Comunicar el organigrama de la institución y quiénes lo componen, aclaración de conductos regulares.	X			26/02/2024		
Tramite de incapacidades, permisos, licencias y vacaciones	X			26/02/2024		
Tramite de certificaciones laborales	X			26/02/2024		
Presentación personal, porte y uso de la dotación	X			26/02/2024		
Presentación a equipo PEI y Recorrido Instalaciones	X			26/02/2024		
CAPACITACION OPERACIONAL						
Horarios de trabajo	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en el Puesto de Trabajo: divulgación de los documentos procedimientos, instructivos, caracterización del proceso, reglamentación, legislación y demás aplicables al área.	X			26/02/2024		
Capacitación especifica en los formatos propios del cargo: diligenciamiento y archivo de los registros.	X			26/02/2024		
Responsabilidades del cargo	X			26/02/2024		
Presentación especifica al grupo de trabajo y normas de Convivencia	X			26/02/2024		
OTROS TEMAS (Especificar						
		—	—			
		—	—			
		—	—			

Observaciones generales:

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP,S

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-SH-01-005 Versión: 05/2018.08 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Daniel Martinez

No. de documento: 1053876165

Obra o Labor: Ayudante

FECHA	CANT. ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
20-02-24	1 UNA	Gafas de Seguridad		
20-02-24	1 UNA	Casco de Seguridad		
20-02-24	1 PAR	Guantes de Nitrilo	Dominguez	
	1 UNA	Tapa Oidos de inserción		
20-02-24	1 UNA	Camisa		
20-02-24	1 UNA	Pantalon	Julian	
20-02-24	1 PAR	Botas de Seguridad		

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-GH-01-003 Versión: 05/2018.08 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Jose Maria Londoño

No. de documento: 1.214.599

Obra o Labor: Ayudante.

FECHA	CANT. ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	1 Und	Gafas de Seguridad		
	1 Und	Casco de Seguridad		
23-02-24	1 PAR	Guantes con Nitrilo		
	1 UNID	Tapa Oidos de Incrustado		
23-02-24	1 UNID	Arnes Talla M	Londoño Julian	
23-02-24	1 UNID	Petaca Talla M		
23-02-24	1 PAR	Botas de Seguridad Talla 39		

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-GH-01-003 Versión: 05/2018.03 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Luis Arley Chacon C.

No. de documento: 1020603203

Obra o Labor: Auxiliar.

FECHA	CANT ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	10und	Gafas de Seguridad		
4-02-2021	1und	Casco de Seguridad	Julian Cardenas	
	1 PAR	Guantes de Nitrilo		
	1und	Tapa Oidos de Insercion		
	1und	Camisa Talla M		
23-02-2021	10und	Pantalon Talla 32	Jairo Cardenas	
	1 PAR	Botas de Seguridad		

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-SH-01-008 Versión: 05/2018.06 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Carlos Alberto Coly

No. de documento: 1051980258

Obra o Labor: Ayudante

FECHA	CANT. ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	1UNA	Gafas de Seguridad		
26-02-2024	1UN	Casco de Seguridad (Roja)	Julian Cardenas	
	1PAR	Guantes de Nitrilo		
	1UNA	Tapa oidos de Inserción		
26-02-2024	1UNA	Camisa Talla 32	Julian Cardenas	Yeimis Hernandez
	1UNA	Pantalon Talla M		
26-02-2024	1UNA	Casco de Seguridad	Julian Cardenas	Yeimis Hernandez

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-GH-01-006 Versión: 05/2018.06 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Yerson Castillo

No. de documento: 1.217.761

Obra o Labor: Auxiliar

FECHA	CANT. ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	1Und	Casco de Seguridad	Juliana Cardenas	
	1Par	Gafas de Seguridad (Rotas)		
	1Par	Guantes de Nitrilo		
	1Und	Tapa oidos de Inserción		
	1Und	Camisa Talla M		
	1Und	Pantalon Talla 32	Juliana Cardenas	
	1Und	Casco de Seguridad		

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

TUNDAMA CONSTRUCTORA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION	Código: FT-GH-01-008 Versión: 05/2018.06 Pagina: 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Jhon Carlos Coley

No. de documento: 98.375.866

Obra o Labor: Maestro General

FECHA	CANT. ENTREGADA	ELEMENTO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE
	1 UND	Gafas de Seguridad		
24-04-2024	1 UNA	Par de Seguridad (Botas)		
	1 PAR	Guantes de Vitua		
	1 UNA	Faja ortopedica de Lumbago		
	1 UNA	Camisa Talla L		
26-02-2024	1 UNA	Pantalon Talla 36		
26-02-2024	1 UNA	Casco de Seguridad	Juliana Valencia Contratista	

IMPORTANTE!!!

QUIENES FIRMAN ESTA PLANILLA SE COMPROMETEN A DAR BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION, A UTILIZARLOS PERMANENTEMENTE MIENTRAS DESEMPEÑAN SUS ACTIVIDADES LABORALES, A CUIDARLOS Y DARLES EL MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN. SE PROHIBE EXPRESAMENTE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS O GENERAR CONFLICTOS QUE AFECTEN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MIENTRAS SE ESTEN UTILIZANDO DICHOS ELEMENTOS.

RECUERDE: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DEVUELTOS POR DETERIORO O CUANDO SE LE REQUIERA.

CONTROL PREVIO AL INICIO DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

CONTROL PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

EMPRESA/UNIDAD EJECUTORA:	Ingeniería Civil y Arquitectura & Ingeniería SAS		
LUGAR DE TRABAJO:	Aguadulce - Boyacá		
TRABAJO A REALIZAR:	Aseo		
ENCARGADO DE TRABAJO:	Martha Vargas - Directora		
Nº PERSONAS:	6	FECHA: 26-02-24	HORA:

CONTROL PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

El objetivo de la cumplimentación de este documento es la de servir como lista de chequeo previo al inicio de los trabajos para la comprobación de las medidas de seguridad adoptadas. No sustituye al documento de obligado cumplimiento que es LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS del trabajo.

1.- TIPO DE TRABAJO: TRABAJOS			
	EN ALTURA		SIN TENSIÓN
X	EN ZANJAS / EXCAVACIONES		EN TENSIÓN
	EN GALERÍAS – TÚNELES – RECINTOS CERRADOS		DE MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES ELÉCTRICAS
	EN ESPACIOS CONFINADOS		DE MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES INSTAL. DE GAS
	EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS		EN PROXIMIDAD DE TENSIÓN
X	DE OBRA CIVIL		DE TENDIDO Y MANTENIMIENTO FIBRA ÓPTICA
	CON SUSTANCIAS QUÍMICAS		DE TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE CANALIZACIONES GAS
	DE EXPLOTACIÓN DE MINAS		DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO II.RR. GA
	DE TALA – PODA – DESBROCE		DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENI. INSTALACIONES TÉRMICAS
	DE IZADO – MOVIMIENTO DE CARGA		DE CONTROL DE CALIDAD
	MANIOBRAS EN REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	OTROS:		

2.- RIESGOS PREVISTOS MÁS SIGNIFICATIVOS			
	CAÍDA MISMO NIVEL		EXPOSICIÓN CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
	CAÍDA A DISTINTO NIVEL		EXPOSICIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS / ASFIXIA / INTOXICACION
	CAÍDA OBJETOS		RUIDO – VIBRACIONES
	CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS		ATRAPAMIENTOS
	CONTACTO TÉRMICO		ATROPELLOS
	CONTACTO ELÉCTRICO		CHOQUES
	ARCO ELÉCTRICO	X	GOLPES – CORTES
	INCENDIO – EXPLOSIÓN		PROYECCIONES
	DESPRENDIMIENTOS – DERRUMBRES		RADIACIONES IONIZANTES
X	ATAQUES ANIMALES		RADIACIONES NO IONIZANTES
	OTROS:		

3.- PROTECCIONES			
X	CASCO SEGURIDAD (con barboquejo para trabajos altura)		SEÑALIZAR ENTORNO TRABAJO (tráfico,...)
	PROTECCIÓN AUDITIVA		DETECCIÓN DE GASES EN ATMÓSFERA
	PROTECCÓN RESPIRATORIA		HERRAMIENTA AISLADA
X	PROTECCIÓN FACIAL: OJOS y/o CARA		HERRAMIENTA ANTICHISPAS
X	CALZADO SEGURIDAD (mecánico, químico,...)		ILUMINACIÓN PORTÁTIL
	ARNÉS DE SEGURIDAD – SISTEMA ANTICAÍDAS		SISTEMA DE RESCATE
X	GUANTES PROTECCIÓN (mecánico, químico, ignífugo,...)		ALFOMBRAS AISLANTES
	GUANTES PROTECCIÓN ELÉCTRICA AT/BT		PERTIGAS AISLANTES
	BUZO DE PROTECCIÓN QUÍMICA		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	ROPA IGNÍFUGA		CHALECO FLOTADOR
	PANTALLA – GAFAS SOLDADURA		CHALECO ALTA VISIBILIDAD
	EQUIPO PROTECCIÓN RESPIRATORIA		BUZO PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO
	DESCARGO EN INSTALACIÓN (5 REGLAS DE ORO)		BUZO APICULTOR
	SEÑALIZAR Y DELIMITAR ZONA DE TRABAJO		OTROS:

4.1.- CONDIONES DEL ENTORNO: ZONA DE ACTIVIDAD			
	RESIDENCIAL (HABITACIONAL)		COMERCIAL
	INDUSTRIAL	X	RURAL
	PANTANOSA		MINAS
X	MONTAÑOSA		RECINTOS O INTERIOR INSTALACIONES COMPAÑÍA
	OTROS		

4.2.- CONDIONES DEL ENTORNO: TRÁFICO DE VEHÍCULOS

EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS PUEDE AFECTAR DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN LA SEGURIDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS	NO		SÍ	

	ALTA DENSIDAD		TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS
	PROXIMIDAD A VÍAS ALTA VELOCIDAD		OTROS

4.3.- CONDIONES DEL ENTORNO: CLIMATOLOGÍA				
LA CLIMATOLOGÍA PUEDE AFECTAR DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN LA SEGURIDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS	NO		SÍ	
	VIENTO		LLUVIA
	NIEVE		HIELO
	OTROS		

4.4.- CONDIONES DEL ENTORNO: CONDICIONES ESPECIALES				
EXISTEN CONDICIONES ESPECIALES QUE PUEDEN AFECTAR DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN LA SEGURIDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS	NO		SÍ	
	ZONA CONFLICTIVA		TRABAJOS NOCTURNOS
	OTROS		

OBSERVACIONES – COMENTARIOS

Si las condiciones existentes no coinciden con las contempladas en la EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE LOS TRABAJOS que le han sido entregadas por su empresa y, afectan de manera significativa a la seguridad, NO INICIE EL TRABAJO y consulte con su superior.

Se han realizado todas las comprobaciones necesarias para realizar el trabajo / actividad en las condiciones adecuadas de seguridad y salud, y se han identificado y comunicado a todos los trabajadores participantes del trabajo / actividad las medidas preventivas que se deben adoptar para la realización del mismo

REALIZADO Y FIRMADO POR:

Nombre: Juan Carlos Cely

Nº Identificación personal: 24325866

CONTROL PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

AFILIACIONES DE PERSONAL

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

JORGE LUIS LOPEZ
CONTADOR PUBLICO

CERTIFICACION DE LOS PARAFISCALES

JORGE LUIS LOPEZ PARRA
CONTADOR PUBLICO
TP 203210-T

CERTIFICO QUE:

Que el CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA, identificado con el **NIT: 901.775.384-7,** realizo el pago por concepto seguridad social , De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que realizo el pago de sus aportes de seguridad durante el mes de Diciembre de 2023 enero y febrero de 2024 a Pensión y el mes de diciembre de 2023 enero, febrero y marzo de 2024 correspondiente a Salud bajo el número de planillas No 9464407719,946486407,9463638412 y 9461707918 planillas pagadas por uno de los integrantes del consorcio como lo es TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA SAS con NIT 901605350-9 por tal razón doy fe que el ente económico certificado en la presente se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Durante los últimos 6 meses contados a partir de la firma del presente certificado.

Para Constancia se firma hoy 04 de abril de 2024 con destino al interesado.

Cordialmente;


JORGE LUIS LOPEZ PARRA
CONTADOR PUBLICO
TP 203210-T

AVENIDAUNIVERSITARIA No 75A-00 BLQA OF 4A
CENTRO EMPRESARIAL GREEN HILLS
TELEFONO 7459609
TUNJA BOYACA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
JORGE LUIS


18-MAY-1966
TUNJA
BOYACA
1.72
A+
M

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 F F 5 4 9 4 9 6 8 5 1 7 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE LUIS LOPEZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049603385 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 203210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aporte en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605250	9	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 13 27 60	DUITAMA-BOYACA	3017557612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	403085265	9461707918	E	2024/01/15	2024/01/18	BANCO DAVIVIENDA		$4,351,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1002457619	AMADO PAULA													L						23100 1	1	EPS037	1	CCF10	1	14-7	1	0.000%	1	SI
2	CC	1002457619	AMADO PAULA		X																X	23100 1	22	EPS037	22	CCF10	22	14-7	22	6.960%	22	SI
3	CC	74260977	FAJARDO EDUARDO		X																X	23020 1	30	ESSC24	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
4	CC	1022382368	FERNANDEZ JIMMY																			23020 1	30	EPS008	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
5	CC	74261417	PAEZ HUGO		X																X	23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
6	CC	1052385005	PEREZ MILTON																			25-14	30	EPS037	30	CCF10	30	14-7	30	0.522%	30	SI
7	CC	1015438055	PIÑEROS PAULA													X						23030 1	1	EPS037	1	CCF10	1	14-7	1	0.000%	1	SI
8	CC	1015438055	PIÑEROS PAULA																			23030 1	29	EPS037	29	CCF10	29	14-7	29	0.522%	29	SI
9	CC	79978921	RAMOS JORGE		X																X	23030 1	30	ESSC24	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
10	CC	74260380	RAMOS JOSE		X																X	23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
11	CC	1056505758	RAMOS JUAN		X																X	23030 1	30	EPS041	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
12	CC	1051184607	SANCHEZ CARLOS		X																X	23030 1	12	EPS041	12	CCF10	12	14-7	12	6.960%	12	SI
13	CC	7226895	VARGAS HECTOR																			23030 1	30	EPS005	30	CCF10	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total			Afiliados(13)																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$2,322,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$142,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,482,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$409,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$817,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$817,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$618,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	$618,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$580,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$56,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$154,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$157,800

2024/03/19 02:55 PM

aporte en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000
TOTAL				11	$4,339,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605350	9	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 13 27 60	DUITAMA-BOYACA	3017557612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523147264	9464407719	E	2024/03/13	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,698,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1052385095	PEREZ MILTON																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	1015438055	PIÑEROS PAULA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	7226895	VARGAS HECTOR																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$209,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total Afiliados(3)																							$6,100,000	$976,000			$6,100,000	$244,000			$6,100,000	$244,000			$6,100,000		$225,000		$0	$0		$1,689,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$976,000	$5,100	$0	$981,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$1,500	$0	$289,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$688,000	$3,600	$0	$691,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$225,000	$1,200	$0	$226,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$225,000	$1,200	$0	$226,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$244,000	$1,300	$0	$245,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$244,000	$1,300	$0	$245,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$244,000	$1,400	$0	$245,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$124,000	$700	$0	$124,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$120,000	$700	$0	$120,700
TOTAL				3	$1,689,000	$9,000	$0	$1,698,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605350	9	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 13 27 60	DUITAMA-BOYACA	3017557612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523804949	9464486407	E	2024/03/13	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	6	$297,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
1	CC 1051980288	CELY CARLOS	X																		230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF10	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	$1	$147,700
2	CC 1051476165	MARTINEZ DANIEL	X																		230301	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF10	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	$1	$147,700
Total	Afiliados(2)																						$953,334	$152,600			$953,334	$38,200			$953,334	$38,200			$953,334		$66,400		$0	$0		$295,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$152,600	$800	$0	$153,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$152,600	$800	$0	$153,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,400	$400	$0	$66,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$66,400	$400	$0	$66,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$38,200	$200	$0	$38,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$38,200	$200	$0	$38,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$38,200	$200	$0	$38,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$19,100	$100	$0	$19,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,100	$100	$0	$19,200
TOTAL				2	$295,400	$1,600	$0	$297,000

2024/03/19 03:44 PM

HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS
NIT. 900632459-3
CARRERA 11A No. 17-64 - Cels. 3108002763 - 3203418835
E-mail. yicaa20@hotmail.com
www.hseqsoluciones.org



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1.868

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
15 DÍA	02 MES	2024 AÑO	SOGAMOSO (BOYACÁ, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
CELY CASTRO CARLOS ALBERTO	MASCULINO	25 AÑOS 0 MESES 29 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1051980288

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO CON PATOLOGÍA QUE NO LIMITA LA LABOR

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

VALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTILO DE VIDA SALUDABLE, CONTINUA MANEJO MEDICO, USO DE CASCO PROTECTOR PERMANENTE OBLIGATORIO EN LABOR.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: VARGAS JULIO JOSE ARTURO

R. M.: 11642009 L.S.O.: 10192023

Código de Seguridad
Y874E1K1868

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: CELY CASTRO CARLOS ALBERTO

CC: 1051980288

SEGUROS
BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S
Identificada con NT No. 901605350

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1523666612302, a partir del 02 de Enero del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1051980288	CARLOS ALBERTO CELY CASTRO	UNO	5	6.96%	20/02/2024		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 19 de Febrero del año 2024.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/02/2024, el empleador TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S identificado con NIT número 901605350 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6824088	20/02/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1051980288	CARLOSALBERTO CELY CASTRO	1300000	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2024-02-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Febrero del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ALBERTO CELY CASTRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.051.980.288,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

SOLICITUD PARA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES DEPENDIENTES

Procesa: Subsidio y Aportes

comfaboy unidos para crecer

Por medio de la presente solicito a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá "COMFABOY" la Afiliación del Trabajador dependiente con beneficiarios.

CIUDAD: Duitama | FECHA: Día 23 | Mes 02 | Año 24

Uso Exclusivo de Comfaboy: Código Empresa: 002388

I. DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL EMPLEADOR: Tordoma Constructora e Ingeniería S.A.S | NIT. / C.C. / C.E.: 901605350 - 9

II. DATOS DEL TRABAJADOR:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	DOCUMENTO: CC [X] CE [ ] TI [ ] P.E.P. [ ] P.P.T. [ ] No.
Cely	Castro	Carlos Alberto	1051980288

DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CIUDAD RESIDENCIA:	DEPARTAMENTO:	FECHA DE NACIMIENTO	TELÉFONO FIJO:
Vereda la Puerta.	Floresta	Boyaca	17/01/99	

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] CASADO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] VIUDO [ ] | CELULAR:

ORIENTACIÓN SEXUAL: HETEROSEXUAL [X] HOMOSEXUAL [ ] BISEXUAL [ ] INFORMACIÓN NO DISPONIBLE [ ]

NIVEL ACADÉMICO: BÁSICA PRIMARIA [ ] SECUNDARIA [X] TÉCNICO [ ] TECNOLÓGICO [ ] PREGRADO [ ] POSTGRADO [ ]

CORREO ELECTRÓNICO: carlos.cely.840@gmail.com | TIPO DE DISCAPACIDAD:

CONTRATO: INDEFINIDO	TÉRMINO FIJO	TIEMPO PARCIAL	FECHA INGRESO: Día	Mes	Año	CIUDAD DONDE TRABAJA
[ ]	[X]	[ ]	20	02	24	Aquitania

INGRESO MENSUAL ($): 1'300.000 | HORAS LABORADAS MES: | ES VENDEDOR: SÍ [ ] NO [X]

ES PROPIETARIO DE: VIVIENDA [ ] LOTE [ ] NINGUNO [X] ARRIENDO [ ] | SU PROPIEDAD ESTÁ UBICADA EN EL SECTOR: URBANO [ ] RURAL [ ]

HA RECIBIDO SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE COMFABOY Y/O DE OTRA ENTIDAD? SÍ [ ] NO [X]

III. DATOS OTROS EMPLEADORES PARA LOS CUALES TRABAJA "DILIGENCIAR ÚNICAMENTE TRABAJADORES DOMÉSTICOS"

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	HORAS LABORADAS MES	CAJA DE COMPENSACIÓN POR LA CUAL RECIBE CUOTA MONETARIA	SALARIO MES

IV. DATOS CÓNYUGE O COMPAÑERA(O) ACTUAL

PRIMER APELLIDO:	SEGUNDO APELLIDO:	NOMBRES:	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] P.E.P. [ ] No. DOCUMENTO:
DIRECCIÓN	CIUDAD	DEPARTAMENTO	CELULAR
TRABAJA: SÍ [ ] NO [ ]	SI TRABAJA REGISTRE NOMBRE EMPRESA:		SALARIO MENSUAL:
CONVIVE: SÍ [ ] NO [ ]	CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADA(O)		

V. DATOS HIJOS, HERMANOS Y PADRES A CARGO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	DOCUMENTO IDENTIDAD Tipo (1°)	DOCUMENTO IDENTIDAD NÚMERO	FECHA NACIMIENTO Día	FECHA NACIMIENTO Mes	FECHA NACIMIENTO Año	PARENTESCO HIJO	PARENTESCO HIJASTRO	PARENTESCO HERMANO	PARENTESCO PADRE	GRADO ESCOLARIDAD (2°)	NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN PADRE (3°)

1°. INDIQUE EL NÚMERO DE DOCUMENTO CON LAS SIGLAS: CC (Cédula de Ciudadanía) CE (Cédula de Extranjería) TI (Tarjeta de Identidad) PEP (Permiso Especial de Permanencia) NUIP (Número Única de Identificación Personal)
2°. INDIQUE GRADO DE ESCOLARIDAD CON LAS SIGLAS: N (Ninguno), P (Primaria), B (Bachilleres), T(Técnico), PR (Profesional), O(Otro)
3°. REGISTRE EL NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO DE LOS HIJOS DIFERENTE AL TRABAJADOR APORTANTE.

SI ES BENEFICIARIO DE CUOTA MONETARIA

ENTIDAD BANCARIA:	No. DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS [ ] CUENTA CORRIENTE [ ]

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, identificada con el NIT. 891800213-8 domiciliada y ubicada en Tunja - Colombia en la dirección carrera 10 # 16-81, teléfono 608 744 1515 extensión 1220 y página web: www.comfaboy.com.co, declara que como responsable de la información protege los datos suministrados por afiliados, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios y otros interesados, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, e informa a ellos que los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular.

Autoriza a COMFABOY, sobre la cual manifiesta conocer que cuenta con la prestación de servicios de vivienda, salud, educación y cultura, recreación y turismo, crédito social, aportes y subsidio y mecanismo de protección al cesante, para cumplir con las finalidades y las funciones asignadas y establecidas en la normatividad, para que en el desarrollo de las mismas se envíe, recolecte, almacene, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a las personas jurídicas en las cuales tengan participación accionaria o de capital o entidades vinculadas, a sus aliados comerciales estratégicos, para que éstos sean incorporados en una base de datos con fines administrativos, comerciales y de mercadeo para el envío de información sobre los diferentes programas y servicios, y en especial para el envío de eventos, campañas, promociones o concursos de carácter comercial y publicitario, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios o investigaciones de mercado, realizar la preinscripción o inscripción al listado de proveedores y la comercialización de servicios y productos. Se informa que la base de datos en la que se encuentran sus datos personales es tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento de datos responsabilidad de COMFABOY. Los anteriores fines todos se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos. Por lo anterior, autoriza el envío de comunicaciones utilizando mis datos de contacto, tales como: Número de teléfono móvil, correo electrónico, redes sociales, dirección de correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otra medio de contacto que permita la tecnología.

Usted podrá consultar la "Política Tratamiento de Datos Personales" en www.comfaboy.com.co. Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribirnos al correo protecciondatos@comfaboy.com.co, o hacerlo en cualquiera de nuestras sedes. Así mismo, COMFABOY le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Leída la anterior, declaro ser el titular de la información, Al diligenciar y Firmar este formato autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada a COMFABOY, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales aquí contempladas, indicando que es completa, confiable, exacta y verídica.

Carlos Alberto C.
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADOR

ESPACIO RESERVADO PARA COMFABOY

Observaciones:	Cantidad de Folios:

RECIBIDO

VIGILADO SuperSubsidio

HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS
NIT. 900632459-3
CARRERA 11A No. 17-64 - Cels. 3108002763 - 3203418835
E-mail. yicaa20@hotmail.com
www.hseqsoluciones.org



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1.867

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
15 DÍA	02 MES	2024 AÑO	SOGAMOSO (BOYACÁ, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE	
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MARTINEZ ESPINEL DANIEL EDUARDO	MASCULINO	29 AÑOS 8 MESES 21 DÍAS	CC (Tipo)	1051476165 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO SIN PATOLOGÍA APARENTE

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTILO DE VIDA SALUDABLE,

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: 

Nombre: VARGAS JULIO JOSE ARTURO

R. M.: 11642009 L.S.O.: 10192023

Código de Seguridad
F874L1R1867

Aspirante o Trabajador

Firma: 

Nombre: MARTINEZ ESPINEL DANIEL EDUARDO

CC: 1051476165

Software para el sector salud - www.biofile.com.co

SEGUROS
BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S
Identificada con NT No. 901605350

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1523666612302, a partir del 02 de Enero del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1051476165	DANIEL EDUARDO MARTINEZ	UNO	5	6.96%	20/02/2024		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 19 de Febrero del año 2024.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DANIEL EDUARDO MARTINEZ ESPINEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.051.476.165,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 22 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOLICITUD PARA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES DEPENDIENTES

Proceso: Subsidio y Aportes

comfaboy unidos para crecer

Por medio de la presente solicito a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá "COMFABOY" la Afiliación del Trabajador dependiente con beneficiarios.

CIUDAD: Duitama | FECHA: Día 23 | Mes 02 | Año 24

Uso Exclusivo de Comfaboy: Código Empresa: 002388

I. DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL EMPLEADOR: Inversiones Constructora e Ingeniería S.A.S | NIT. / C.C. / C.E.: 901605350-9

II. DATOS DEL TRABAJADOR:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	DOCUMENTO: CC [X] CE [ ] TI [ ] P.E.P. [ ] P.P.T. [ ] No.
Martinez	espinel	Daniel eduardo	1.051.476.165

DIRECCIÓN RESIDENCIA	CIUDAD RESIDENCIA	DEPARTAMENTO	FECHA DE NACIMIENTO	TELÉFONO FIJO
Vereda Alto lagoal	Aquitania	Boyaca	27/05/199	

ESTADO CIVIL: SOLTERO [ ] CASADO [X] UNIÓN LIBRE [X] SEPARADO [ ] VIUDO [ ] CELULAR: 3125139869

ORIENTACIÓN SEXUAL: HETEROSEXUAL [X] HOMOSEXUAL [ ] BISEXUAL [ ] INFORMACIÓN NO DISPONIBLE [ ]

NIVEL ACADÉMICO: BÁSICA PRIMARIA [ ] SECUNDARIA [X] TÉCNICO [ ] TECNOLÓGICO [ ] PREGRADO [ ] POSTGRADO [ ]

CORREO ELECTRÓNICO: dany.martinez@hotmail.com | TIPO DE DISCAPACIDAD:

CONTRATO: INDEFINIDO	TÉRMINO FIJO	TIEMPO PARCIAL	FECHA INGRESO: DÍA	MES	AÑO	CIUDAD DONDE TRABAJA
[ ]	[X]	[ ]	20	02	24	Aquitania

INGRESO MENSUAL ($): 1'300.000 | HORAS LABORADAS MES: | ES VENDEDOR: SÍ [ ] NO [ ]

ES PROPIETARIO DE: VIVIENDA [ ] LOTE [ ] NINGUNO [X] ARRIENDO [ ] | SU PROPIEDAD ESTÁ UBICADA EN EL SECTOR: URBANO [ ] RURAL [ ]

HA RECIBIDO SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE COMFABOY Y/O DE OTRA ENTIDAD? SÍ [ ] NO [X]

III. DATOS OTROS EMPLEADORES PARA LOS CUALES TRABAJA "DILIGENCIAR ÚNICAMENTE TRABAJADORES DOMÉSTICOS"

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	HORAS LABORADAS MES	CAJA DE COMPENSACIÓN POR LA CUAL RECIBE CUOTA MONETARIA	SALARIO MES

IV. DATOS CÓNYUGE O COMPAÑERA(O) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] P.E.P. [ ] No. DOCUMENTO

DIRECCIÓN	CIUDAD	DEPARTAMENTO	CELULAR

TRABAJA: SÍ [ ] NO [ ]	SI TRABAJA REGISTRE NOMBRE EMPRESA:	SALARIO MENSUAL:
CONVIVE: SÍ [ ] NO [ ]	CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADA(O)	

V. DATOS HIJOS, HERMANOS Y PADRES A CARGO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	DOCUMENTO IDENTIDAD Tipo (1*)	DOCUMENTO IDENTIDAD NÚMERO	FECHA NACIMIENTO Día	FECHA NACIMIENTO Mes	FECHA NACIMIENTO Año	PARENTESCO HIJO	PARENTESCO HIJASTRO	PARENTESCO HERMANO	PARENTESCO PADRE	GRADO ESCOLARIDAD (2*)	NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN PADRE (3*)

1*. INDIQUE EL NÚMERO DE DOCUMENTO CON LAS SIGLAS: CC (Cédula de Ciudadanía) CE (Cédula de Extranjería) TI (Tarjeta de Identidad) PEP (Permiso Especial de Permanencia) NUIP (Número Única de Identificación Personal)

2*. INDIQUE GRADO DE ESCOLARIDAD CON LAS SIGLAS: N (Ninguno), P (Primaria), B (Bachillerato), T (Técnico), PR (Profesional), O (Otro)

3*. REGISTRE EL NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO DE LOS HIJOS DIFERENTE AL TRABAJADOR APORTANTE.

SI ES BENEFICIARIO DE CUOTA MONETARIA

ENTIDAD BANCARIA:	No. DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS [ ] CUENTA CORRIENTE [ ]

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, identificada con el NIT. 891800213-9 domiciliada y ubicada en Tunja - Colombia en la dirección carrera 10 # 16-81, teléfono 608 744 1515 extensión 1220 y página web www.comfaboy.com.co, declara que como responsable de la información protege los datos suministrados por afiliados, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios y otros interesados, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, e informa a estos que los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular.

Autorizo a COMFABOY, sobre la cual manifiesto conocer que cuenta con la prestación de servicios de vivienda, salud, educación y cultura, recreación y turismo, crédito social, aportes y subsidio y mecanismo de protección al cesante, para cumplir con las finalidades y las funciones asignadas y establecidas en la normatividad, para que en el desarrollo de las mismas se sirva recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a las personas jurídicas en las cuales tengan participación accionaria o de capital o entidades vinculadas, a sus aliados comerciales estratégicos, para que éstos sean incorporados en una base de datos con fines administrativos, comerciales y de mercadeo para el envío de información sobre los diferentes programas y servicios, y en especial para el envío de eventos, campañas, promociones o concursos de carácter comercial y publicitario, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios o investigaciones de mercado, realizar la prescripción o inscripción al listado de proveedores y la comercialización de servicios y productos. Se informa que la base de datos en la que se encuentran sus datos personales es tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento de datos responsabilidad de COMFABOY. Las anteriores finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos. Por lo anterior, autorizo el envío de comunicaciones utilizando mis datos de contactos, tales como: Número de teléfono móvil, correo electrónico, redes sociales, dirección de correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otro medio de contacto que permita la tecnología.

Usted podrá consultar la "Política Tratamiento de Datos Personales" en www.comfaboy.com.co. Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribirnos al correo protecciondatos@comfaboy.com.co, o hacerlo en cualquiera de nuestras sedes. Así mismo, COMFABOY le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar este formato, lo hago expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informado a COMFABOY, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales aquí contempladas. Indicando que es completa, confiable, exacta y verídica.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADOR

ESPACIO RESERVADO PARA COMFABOY

Observaciones:	Cantidad de Folios:

RECIBIDO

VIGILADO SuperSubsidio

HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS
NIT. 900632459-3
CARRERA 11A No. 17-64 - Cels. 3108002763 - 3203418835
E-mail. yicaa20@hotmail.com
www.hseqsoluciones.org



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1.877

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
22 DÍA	02 MES	2024 AÑO	SOGAMOSO (BOYACÁ, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
LOMBANA GARCIA JOSE MARIO	MASCULINO	51 AÑOS 9 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	4204599 (Número)

Cargo
OFICIAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO CON PATOLOGÍA QUE NO LIMITA LA LABOR

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	SVE CARDIOVASCULAR	
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	
	SVE OSTEOMUSCULAR	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTILO DE VIDA SALUDABLE, EDUCACION E HIGIENE DE POSTURA, SVE PREVENCION CARDIOVASCULAR, EVITAR LEVANTAMIENTO DE CARGA SUPERIOR A LA NORMA.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoria brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Jose Arturo Vargas Julio, Médico Especialista en Salud Ocupacional, Licencia 1216/2023

Nombre: VARGAS JULIO JOSE ARTURO

R. M.: 11642009 L.S.O.: 10192023

Código de Seguridad: F874L1R1877

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: LOMBANA GARCIA JOSE MARIO

CC: 4204599

SEGUROS
BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S
Identificada con NT No. 901605350

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1523666612302, a partir del 02 de Enero del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	4204599	JOSE MARIO LOMBADA GARCIA	UNO	5	6.96%	12/03/2024		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 11 de Marzo del año 2024.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE MARIO LOMBANA GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **4.204.599**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de **Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 1 de Marzo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
EPS
Un País de tu bienestar

No. De Radicación	Fecha de Radicación
	D M M A A A A

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones antes de diligenciar este formulario)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒
2. Tipo de Afiliado: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia ☐ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Cotizante ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐
3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
Código (asignado por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Lombana	Segundo apellido: Garcia	Primer Nombre: Jose	Segundo Nombre: Mario
7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
	4.204.591	Femenino ☐ Masculino ☒	13 06 1952

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo: I II III; Condición: T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Seguros Bolivar	Porvenir	$1.300.000

18. Residencia				
Carrera 3 # 5-13	Teléfono fijo	3127349323 Teléfono celular	camigisel32@gmail.com Correo electrónico	
Paya Municipio/Distrito	Zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad/Corregimiento	Boyaca. Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo I	II	III	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a reservar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (asignado por la EPS)
C	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, DESTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
Fundacion Constructora Ingenieros S.A.S	NIT	901605350-	

39. Ubicación				
Dirección: calle 13 # 27-60	Teléfono: 3017557612	Correo electrónico: Proyectos@fundacionquitaraca.com	Municipio/Distrito	Departamento: Boyaca

Powered by CamScanner

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 2 0 3 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no intervención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiados o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades publicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
José Manuel Olarbe Salazar	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

HSEQ ENFOQUE Y SOLUCIONES SAS
NIT. 900632459-3
CARRERA 11A No. 17-64 - Cels. 3108002763 - 3203418835
E-mail. yicaa20@hotmail.com
www.hseqsoluciones.org



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 1.874

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
21 DÍA	02 MES	2024 AÑO	SOGAMOSO (BOYACÁ, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
CASTILLO MARTINEZ YERSON ZAMIR	MASCULINO	42 AÑOS 0 MESES 2 DÍAS	CC Tipo	4217261 Número

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO CON PATOLOGÍA QUE NO LIMITA LA LABOR

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	SVE CARDIOVASCULAR	
	PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTILO DE VIDA SALUDABLE, EDUCACION E HIGIENE DE POSTURA, USO DE MEDIAS PARA VARICES DE COMPRESION ALTA, PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS.

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: José Arturo Vargas Julio, Médico Especialista en Salud Ocupacional, Licencia 1019/2023

Nombre: VARGAS JULIO JOSE ARTURO

R. M.: 11642009 L.S.O.: 10192023

Código de Seguridad
D874J1P1874

Aspirante o Trabajador

Firma: Yerson Zamir Castillo M.

Nombre: CASTILLO MARTINEZ YERSON ZAMIR

CC: 4217261

SEGUROS
BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S
Identificada con NT No. 901605350

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1523666612302, a partir del 02 de Enero del año 2024.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	4217261	YERSON ZAMIR CASTILLO MARTINEZ	UNO	5	8.96%	12/03/2024		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 11 de Marzo del año 2024.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **YERSON ZAMIR CASTILLO MARTINEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **4217261,** se encuentra afiliado/a desde **01/12/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 01 de abril de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 – 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co

FORMULARIO ÚNICO DE AFIL... Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 18 03 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran antes del formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliado		3. Régimen	4. Tipo de afiliado: A. Cotizante			Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación	A. Independiente	B. Cotizante cabeza de Familia ✓	A. Contributivo ✓	B. Beneficiario			01
B. Reporte de Novedades ✓		C. Beneficiario o afiliado adicional	B. Subsidiado	5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ✓	B. Independiente	C. Pensionado	
		D. Otro tipo					

II. AFILIACIÓN III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CASTILLO	MARTINEZ	YERSON	ZAMIR

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo: Femenino	Masculino ✓	10. Fecha de nacimiento
CC	4.217.261			26 01 1982

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo	Condición	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
					BOLIVAR	PORVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$ 1.300.000	VEREDA HATO LAGUNA LT 4			3214118400
yersonsamircastillo1982@gmail	AQUITANIA	Zona Urbana ✓	Rural	BOYACA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			

20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino	Masculino	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre				
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	H	T	P	Condición	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	33. Valor de la UPC adicional (a registrar por la EPS)
B1														
B2														
B3														
B4														
B5														

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Cot.	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA	NIT	901.605.350	

39. Ubicación				
CALLE 13 N° 27 - 60	3017557612	proenergeticos@yahoo.com	DUITAMA	BOYACA

B. REPORTE DE NOVEDADES

39. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación ☐
2. Corrección datos básicos de identificación ☐
3. Actualización documento de identidad ☐
4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐
5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐
6. Reinscripción en la EPS ☐
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐
8. Exclusión de beneficiarios o afiliados adicionales ☐
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ✓
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐
14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐
15. Reporte por fallecimiento ☐
16. Reporte del Sistema de protección al cesante ☐
17. Reporte de la calidad de Pensionado ☐
18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino	Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha
					12 03 2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción ☐
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios ☐
49. Declaración de no encontrarse el cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud ☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales ✓
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran ✓
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ✓
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensajes de texto ✓

VIII. FIRMAS

Yerson Zamir C.M.
C.C 4217261.

IX. ANEXOS

56. Anexa copia del documento de identidad: CN ☐ Cant. ☐ RC ☐ Cant. ☐ TI ☐ Cant. ☐ CC ✓ Cant. 1 PA ☐ Cant. ☐ CE ☐ Cant. ☐ CD ☐ Cant. ☐ SC ☐ Cant. ☐ Total 1
57. Copia de dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente ☐
58. Copia de registro civil de nacimiento, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor ☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ☐
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o del certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. ☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ☐
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ☐

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación			

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerda que con la firma de formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el artículo 19 del formulario.

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersubsidio

Powered by CamScanner

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

compensar | eps salud

	SI	NO
¿Previo diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	☑	☐
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo la entrega de la carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	☑	☐
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	☑	☐
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	☑	☐
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	☑	☐

Firma del afiliado (cotizante): Yersai Zamir C.M.

No. Identificación: 42/7267.

FIRMA A RUEGO (Diligenciar exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar)

A ruego de (la) señor (a) _____ con C.C. No. _____

lo hace en su nombre, el (la) señor(a) _____

con C.C. No. _____ mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que se está entregando, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) _____

Firma a Ruego: _____

Nombres y apellidos: _____

_____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombres y apellidos de quien no sabe firmar: _____

_____

Identificación: _____

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, explícita, previamente informada e inequívoca a todos los servicios de salud Compensar EPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2012, para tratar mi información personal, según lo establecido en su Manual de Protección de Datos Personales, disponible en:www.compensar.com / vínculo protección Datos Personales; información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias para:

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y/o mis beneficiarios.
- Dar cumplimiento a requerimientos legales y de organismos de control.
- Proveer y/o evaluar la calidad de los productos y/o servicios requeridos por mí.
- La realización de estudios internos sobre fines estadísticos y analíticos de los datos, para mejoras de nuestros servicios o programas especializados de atención en salud; información sobre la cual podré, en cualquier momento, ejercer mis derechos de Habeas Data, para solicitar que no se me envíe información de los servicios en los casos que sea pertinente, y que no afecte el servicio de salud prestado por Compensar EPS.
- Transmitir mis datos personales a las administradoras encargadas de la seguridad social, con el fin de actualizar el estado de mi afiliación y/o traslado en el sistema.
- Compartir mis datos personales con la Caja de Compensación Familiar Compensar para efectos de la prestación de servicios de salud.

Cabe anotar, que la protección de los datos personales se efectúa a través de proveedores tecnológicos, con los cuales se tienen firmados contratos de transmisión de información, en aras de cumplir a cabalidad con los principios de acceso de la ley, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos.

Como titular de la información personal sobre la que Compensar EPS ejerce el tratamiento, se me informa sobre los canales a través de los cuales puedo ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir mis datos personales, entre ellos el correo electrónico protecciondedatos@compensar.com. y la central telefónica de la EPS.

La protección de datos personales efectuada por Compensar EPS, cumple con los principios de finalidad, necesidad, circulación restringida, confidencialidad y seguridad señalados en la Ley 1581 de 2012 y manifiesto expresamente que conozco dónde consultar la información sobre protección de datos personales, así como los efectos y alcance de la presente autorización y que estoy libre de todo vicio del consentimiento en el momento de otorgarla.

Firma del afiliado (cotizante): Yersai Zamir C.M.

No. Identificación: 42/7267.

Powered by CamScanner

CERTIFICACIONES DE CALIDAD y RESULTADOS DE FALLA DE CILINDROS

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Teléfono +57 608 7730555

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC01-053
Revision:	3

Autor: Ingeniero Control Calidad	Revisa: Coordinador Control Calidad	Aprueba: Coordinador Control Calidad

Fecha reporte: 11/01/2023

Producto: **Cemento Industrial Fuerte - Tipo ART**

Periodo de análisis de: 2/01/2023
a : 8/01/2023

Alcance

El cemento **Industrial Fuerte** cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo ART. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Informacion General

Proveedor:	Holcim Colombia S.A.
Planta:	Nobsa
Direccion:	Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio	Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono:	608-7730555
Cliente:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un **Informe de Resultados Parcial**. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.
La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento ART.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química	
Oxido	**Resultado Promedio**
SIO2 (%)	27,2
Al2O3 (%)	4,5
Fe2O3 (%)	3,05
CaO (%)	57,2
MgO (%)	0,8
SO3 (%)	2,41
P.I. (%)	3,5
Na2O (%)	0,08
K2O (%)	0,69
TiO2 (%)	0,32
P2O5 (%)	0,26
Mn2O3 (%)	0,090
Cl (%)	0,040
Suma (%)	100,0

Ensayos Físicos			
Ensayo	**Unidad**	**Resultado Promedio**	**Especificación NTC 121_2021**
Blaine	m2/kg	480	N.A.
Densidad	g/cm3	2,98	N.A.
Finura 45 µm	%	2,4	N.A.
Fraguado inicial - Vicat	minutos	125	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	240	N.A.
Consistencia Normal	%	28,0	N.A.
Resistencia 1 día	MPa	18,8	≥ 11
Resistencia 3 días	MPa	29,2	≥ 22
Resistencia 7 días	MPa	N/D	N.A.
Resistencia 28 días	MPa	N/D	N.A.
A/C	% masa cemento	49,1	N.A.
Contenido de aire	%	N/D	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Ana María Rondon
Ana María Rondon
Ingeniera Control Calidad

Revisa y aprueba:

Ariam Lozano
Ariam Lozano Pérez
Coordinador Control Calidad

RESULTADOS DE FALLA DE CILINDROS DE CONCRETO PARA EL CONTRATO No 011 - 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CIVILAB S.A.S.

INTEGRAL DE OBRAS CIVILES & LABORATORIO S.A.S.

AÑO - 2024

ESTUDIOS DE SUELOS Y CIMENTACIONES, LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS, TOPOGRAFÍA, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA E INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL.

310-2400587 - civilab.sas@gmail.com - Carrera 29 # 10-39
Duitama - Boyacá (Colombia)

CIVILAB. S.A.S.

INTEGRAL DE OBRAS CIVILES & LABORATORIO S.A.S. Nit 900.637.164-9

ENSAYO DE RESISTENCIA DE CONCRETO

LOCALIZACIÓN :	MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	INTERVENTOR :	INGENIERO ANDRÉS RUIZ
PROCEDENCIA :	MUNICIPIO DE AQUITANIA SECTOR HATO LAGUNA	CONTRATO :	011 - 2023
CONSTRUCTOR :	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S.	CLIENTE :	TUNDAMA CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S.
		FECHA :	19/03/2024

FECHO DE TOMA	ABSCISA	CILINDRO No	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	RESISTENCIA DE DISEÑO	CARGA (KN)	ESFUERZO (Lb/plg2)	ESFUERZO (Kg/Cm2)	SLUMP	RESISTENCIA (%)	OBSERVACIONES
8/03/2024	PLACA INFERIOR BOCATOMA	1	15/03/2024	7	4000	331	2581	181	4"	65	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
8/03/2024		1	22/03/2024	14			0	0	4"	0	
8/03/2024		1	5/04/2024	28			0	0	4"	0	
8/03/2024		1	5/04/2024	28			0	0	4"	0	

YENAIN DUARTE MOSQUERA
GEOTC - JEFE DE LABORATORIO

CARLOS ANDRÉS BÁEZ SANDOVAL
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO

CALIDAD CERTIFICADA

ICONTEC

Otorga el sello de calidad ICONTEC para el producto:
It grants the quality mark ICONTEC for the product:

ACCESORIOS CONDUIT

Fabricado por P.V.C. GERFOR S.A., ubicada en la Autopista Medellín Km 2 - 600 metros Entrada por la vía Parcelas, Cota (Colombia)
Manufacturated by P.V.C. GERFOR S.A., in Autopista Medellín Km 2 - 600 metros Entrada por la vía Parcelas, Cota (Colombia)

El derecho del uso del Sello de calidad ICONTEC se otorga con el referencial:
The right to use the ICONTEC Quality Mark is granted with the Audit Criteria:

NTC 5442 (2008)

Plásticos. Accesorios de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería conduit
Plastics. Fittings of rigid chlorinated poly (vinyl chloride) (CPVC) for conduit tubing.

Este sello está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC
This Mark is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el Sello de calidad se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.
The references authorized to hold the ICONTEC Quality Mark are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC-0034-16
Certificate

Fecha de Aprobación: 2009-03-20
Approval Date:

Fecha Última Modificación.
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2012-03-19
Expiration Date:

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN

ANSI

Director Ejecutivo
Executive Director

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES A MES

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

PROGRAMACION DE OBRA - ACUEDUCTO HATO LAGUNA- AQUITANIA-BOYACÁ

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CONTRATO: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA:CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA:FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.285 DE PISBA
SUPERVISOR: DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
FECHA DE CONTRATO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO: 23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2024

TIEMPO DE EJECUCION				DICIEMBRE										FEBRERO						
	ACTIVIDAD	Fecha inicio	Fecha final	13-dic-23	14-dic-23	15-dic-23	16-dic-23	17-nov-23	18-dic-23	19-dic-23	20-dic-23	21-dic-23	22/12/2023	23-feb-24	24-feb-24	25-feb-24	26-feb-24	27-feb-24	28-feb-24	29-feb-24
BOCATOMA HATO LAGUNA													SUSPENSION	REINICIO						
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024																	
102	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	23-feb-24	24-feb-24																	
103	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	23-feb-24	24-feb-24																	
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	26-feb-24	26-feb-24																	
105	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	27-feb-24	27-feb-24																	
106	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IM/PERMEABILIZADO PARA MUROS	29-feb-24	02-mar-24																	
107	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IM/PERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	29-feb-24	29-feb-24																	
108	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	28-feb-24	28-feb-24																	

109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	29-feb-24	29-feb-24	
110	CINTA SIKA PVC V=0.22	28-feb-24	28-feb-24	
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	04-mar-24	04-mar-24	
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	04-mar-24	04-mar-24	
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	04-mar-24	04-mar-24	
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	04-mar-24	04-mar-24	
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	05-mar-24	05-mar-24	
116	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	23-feb-24	05-mar-24	
	DESARENADOR			
201	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024	
202	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	06-mar-24	08-mar-24	
203	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	06-mar-24	08-mar-24	
204	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	09-mar-24	09-mar-24	
205	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	11-mar-24	11-mar-24	
206	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	14-mar-24	18-mar-24	
207	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	13-mar-24	13-mar-24	
208	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	21-mar-24	23-mar-24	
209	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	13-mar-24	13-mar-24	
210	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	13-mar-24	13-mar-24	
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	25-mar-24	25-mar-24	
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL "ER	15-mar-24	18-mar-24	

213	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	24-mar-24	25-mar-24
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	24-mar-24	25-mar-24
215	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	24-mar-24	25-mar-24
216	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	24-mar-24	25-mar-24
217	CINTA SIKA PVC. V=0.22	15-mar-24	18-mar-24
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	25-mar-24	27-mar-24
219	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	05-mar-24	27-mar-24
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
301	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024
302	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	08-abr-24	14-abr-24
303	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	08-abr-24	14-abr-24
304	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	15-abr-24	15-abr-24
305	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	16-abr-24	16-abr-24
306	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	23-abr-24	28-abr-24
307	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	21-abr-24	22-abr-24
308	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	29-abr-24	01-may-24
309	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	17-abr-24	18-abr-24
310	PASOS UNA DE GATO D=5/8"	17-abr-24	18-abr-24
311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	02-may-24	02-may-24
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	23-abr-24	28-abr-24
313	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	02-may-24	02-may-24
314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	02-may-24	02-may-24
315	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	02-may-24	02-may-24
316	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	02-may-24	02-may-24
317	CINTA SIKA PVC. V=0.22	17-abr-24	18-abr-24

318	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 3"	04-may-24	04-may-24	
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.G. D=3"	04-may-24	04-may-24	
320	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	05-may-24	06-may-24	
321	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	05-may-24	06-may-24	
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	07-may-24	07-may-24	
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	07-may-24	07-may-24	
324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	07-may-24	07-may-24	
	RED DE ADUCCION			
401	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024	
402	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	02-may-24	05-may-24	
403	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	02-may-24	05-may-24	
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	06-may-24	06-may-24	
405	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	06-may-24	06-may-24	
406	SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	09-may-24	09-may-24	
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	09-may-24	09-may-24	
408	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	09-may-24	12-may-24	
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	09-may-24	14-may-24	


PROGRAMACION DE OBRA - ACUEDUCTO HATO LAGUNA- AQUITANIA-BOYACÁ

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CONTRATO: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.285 DE PISBA
SUPERVISOR: DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
FECHA DE CONTRATO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO: 23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2024

TIEMPO DE EJECUCION				MARZO																														
	ACTIVIDAD	Fecha inicio	Fecha final	01-mar-24	02-mar-24	03-mar-24	04-mar-24	05-mar-24	06-mar-24	07-mar-24	08-mar-24	09-mar-24	10-mar-24	11-mar-24	12-mar-24	13-mar-24	14-mar-24	15-mar-24	16-mar-24	17-mar-24	18-mar-24	19-mar-24	20-mar-24	21-mar-24	22-mar-24	23-mar-24	24-mar-24	25-mar-24	26-mar-24	27-mar-24	28-mar-24	29-mar-24	30-mar-24
BOCATOMA HATO LAGUNA																																		
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024																															
102	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	23-feb-24	24-feb-24																															
103	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	23-feb-24	24-feb-24																															
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	26-feb-24	26-feb-24																															
105	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	27-feb-24	27-feb-24																															
106	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IM/PERMEABILIZADO PARA MUROS	29-feb-24	02-mar-24																															
107	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IM/PERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	29-feb-24	29-feb-24																															
108	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	28-feb-24	28-feb-24																															

109	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	29-feb-24	29-feb-24	
110	CINTA SIKA PVC V=0.22	28-feb-24	28-feb-24	
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	04-mar-24	04-mar-24	
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	04-mar-24	04-mar-24	
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	04-mar-24	04-mar-24	
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	04-mar-24	04-mar-24	
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	05-mar-24	05-mar-24	
116	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	23-feb-24	05-mar-24	
	DESARENADOR			
201	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024	
202	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	06-mar-24	08-mar-24	
203	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	06-mar-24	08-mar-24	
204	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	09-mar-24	09-mar-24	
205	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	11-mar-24	11-mar-24	
206	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	14-mar-24	18-mar-24	
207	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	13-mar-24	13-mar-24	
208	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	21-mar-24	23-mar-24	
209	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	13-mar-24	13-mar-24	
210	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	13-mar-24	13-mar-24	
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	25-mar-24	25-mar-24	
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	15-mar-24	18-mar-24	

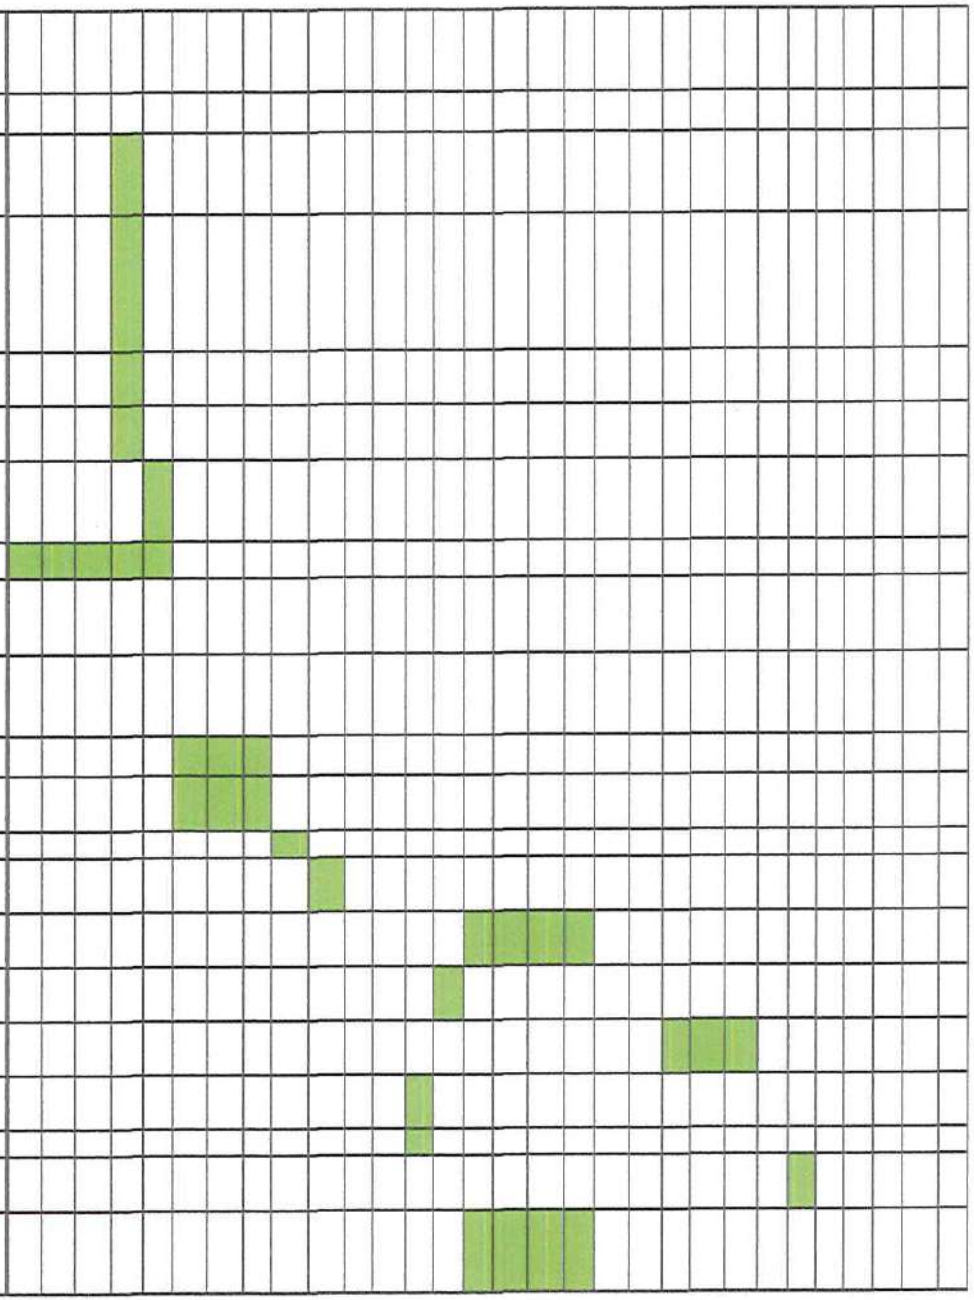

213	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	24-mar-24	25-mar-24	
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	24-mar-24	25-mar-24	
215	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	24-mar-24	25-mar-24	
216	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	24-mar-24	25-mar-24	
217	CINTA SIKA PVC. V=0.22	15-mar-24	18-mar-24	
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	25-mar-24	27-mar-24	
219	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	05-mar-24	27-mar-24	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO			
301	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024	
302	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	08-abr-24	14-abr-24	
303	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	08-abr-24	14-abr-24	
304	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	15-abr-24	15-abr-24	
305	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	16-abr-24	16-abr-24	
306	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	23-abr-24	28-abr-24	
307	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	21-abr-24	22-abr-24	
308	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	29-abr-24	01-may-24	
309	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	17-abr-24	18-abr-24	
310	PASOS UNA DE GATO D=5/8"	17-abr-24	18-abr-24	
311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	02-may-24	02-may-24	
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	23-abr-24	28-abr-24	
313	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	02-may-24	02-may-24	
314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	02-may-24	02-may-24	
315	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	02-may-24	02-may-24	
316	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	02-may-24	02-may-24	
317	CINTA SIKA PVC. V=0.22	17-abr-24	18-abr-24	

318	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 3"	04-may-24	04-may-24
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA H.G. D=3"	04-may-24	04-may-24
320	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	05-may-24	06-may-24
321	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	05-may-24	06-may-24
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	07-may-24	07-may-24
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	07-may-24	07-may-24
324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	07-may-24	07-may-24
	RED DE ADUCCION		
401	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024
402	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	02-may-24	05-may-24
403	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	02-may-24	05-may-24
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	06-may-24	06-may-24
405	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	06-may-24	06-may-24
406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	09-may-24	09-may-24
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	09-may-24	09-may-24
408	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	09-may-24	12-may-24
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	09-may-24	14-may-24

PROGRAMACION DE OBRA - ACUEDUCTO HATO LAGUNA- AQUITANIA-BOYACÁ


OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CONTRATO: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.265 DE PISBA
SUPERVISOR: DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
FECHA DE CONTRATO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO: 23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2024

TIEMPO DE EJECUCION				ABRIL																													
	ACTIVIDAD	Fecha inicio	Fecha final	01-abr-24	02-abr-24	03-abr-24	04-abr-24	05-abr-24	06-abr-24	07-abr-24	08-abr-24	09-abr-24	10-abr-24	11-abr-24	12-abr-24	13-abr-24	14-abr-24	15-abr-24	16-abr-24	17-abr-24	18-abr-24	19-abr-24	20-abr-24	21-abr-24	22-abr-24	23-abr-24	24-abr-24	25-abr-24	26-abr-24	27-abr-24	28-abr-24	29-abr-24	30-abr-24
BOCATOMA HATO LAGUNA																																	
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024																														
102	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	23-feb-24	24-feb-24																														
103	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	23-feb-24	24-feb-24																														
104	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	26-feb-24	26-feb-24																														
105	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	27-feb-24	27-feb-24																														
106	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	29-feb-24	02-mar-24																														
107	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	29-feb-24	29-feb-24																														
108	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	28-feb-24	28-feb-24																														

109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	29-feb-24	29-feb-24
110	CINTA SIKA PVC V=0.22	28-feb-24	28-feb-24
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	04-mar-24	04-mar-24
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	04-mar-24	04-mar-24
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	04-mar-24	04-mar-24
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	04-mar-24	04-mar-24
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	05-mar-24	05-mar-24
116	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	23-feb-24	05-mar-24
	DESARENADOR		
201	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024
202	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	06-mar-24	08-mar-24
203	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	06-mar-24	08-mar-24
204	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	09-mar-24	09-mar-24
205	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	11-mar-24	11-mar-24
206	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	14-mar-24	18-mar-24
207	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	13-mar-24	13-mar-24
208	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	21-mar-24	23-mar-24
209	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	13-mar-24	13-mar-24
210	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	13-mar-24	13-mar-24
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	25-mar-24	25-mar-24
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	15-mar-24	18-mar-24

213	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	24-mar-24	25-mar-24
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	24-mar-24	25-mar-24
215	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	24-mar-24	25-mar-24
216	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	24-mar-24	25-mar-24
217	CINTA SIKA PVC. V=0.22	15-mar-24	18-mar-24
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	25-mar-24	27-mar-24
219	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	05-mar-24	27-mar-24
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO		
301	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024
302	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	08-abr-24	14-abr-24
303	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	08-abr-24	14-abr-24
304	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	15-abr-24	15-abr-24
305	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	16-abr-24	16-abr-24
306	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	23-abr-24	28-abr-24
307	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	21-abr-24	22-abr-24
308	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	29-abr-24	01-may-24
309	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	17-abr-24	18-abr-24
310	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	17-abr-24	18-abr-24
311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	02-may-24	02-may-24
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	23-abr-24	28-abr-24
313	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	02-may-24	02-may-24
314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	02-may-24	02-may-24
315	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	02-may-24	02-may-24
316	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	02-may-24	02-may-24
317	CINTA SIKA PVC. V=0.22	17-abr-24	18-abr-24

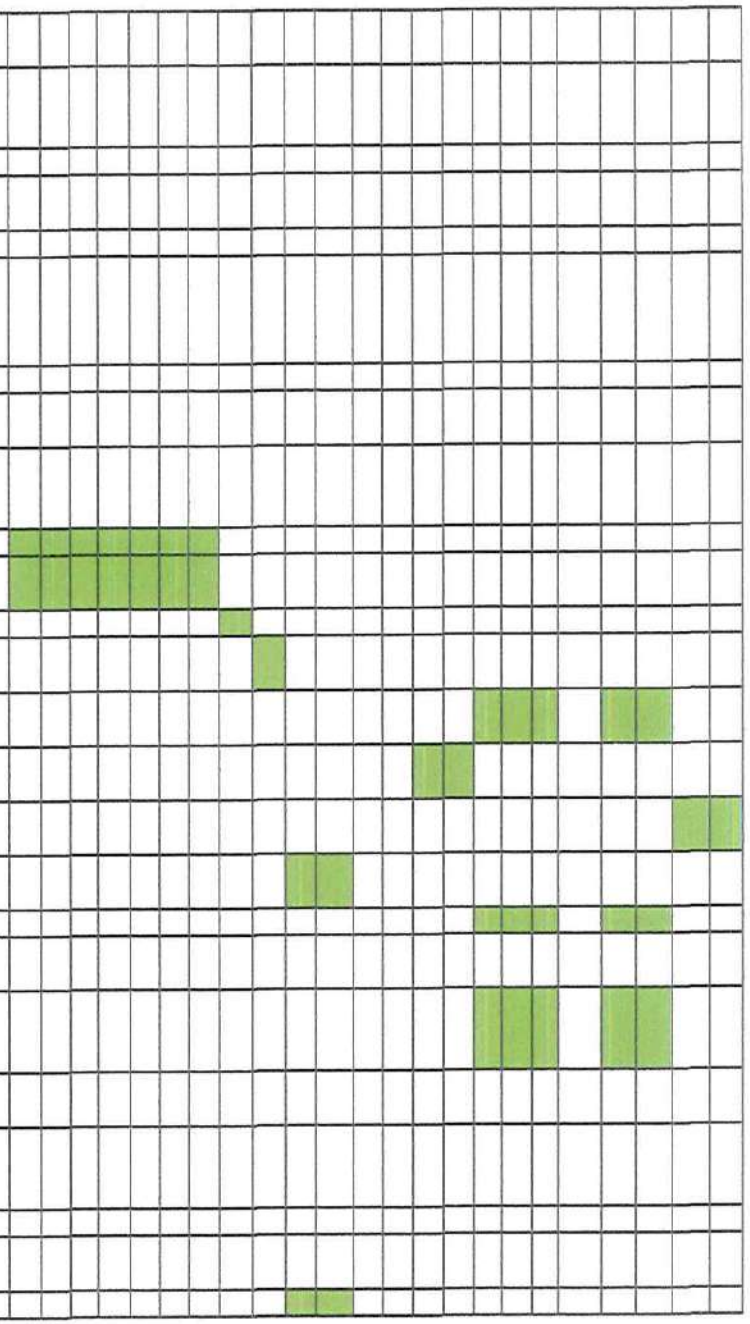

318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	04-may-24	04-may-24
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	04-may-24	04-may-24
320	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	05-may-24	06-may-24
321	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	05-may-24	06-may-24
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	07-may-24	07-may-24
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	07-may-24	07-may-24
324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	07-may-24	07-may-24
	RED DE ADUCCION		
401	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024
402	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	02-may-24	05-may-24
403	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	02-may-24	05-may-24
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	06-may-24	06-may-24
405	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	06-may-24	06-may-24
406	SUMINISTRO E INSTALACION VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	09-may-24	09-may-24
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	09-may-24	09-may-24
408	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	09-may-24	12-may-24
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	09-may-24	14-may-24

PROGRAMACION DE OBRA - ACUEDUCTO HATO LAGUNA- AQUITANIA-BOYACÁ

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CONTRATO: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.285 DE PISBA
SUPERVISOR: DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
FECHA DE CONTRATO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO: 23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2024

TIEMPO DE EJECUCION				MAYO													
	ACTIVIDAD	Fecha inicio	Fecha final	01-may-24	02-may-24	03-may-24	04-may-24	05-may-24	06-may-24	07-may-24	08-may-24	09-may-24	10-may-24	11-may-24	12-may-24	13-may-24	14-may-24
BOCATOMA HATO LAGUNA																	
101	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024														
102	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	23-feb-24	24-feb-24														
103	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	23-feb-24	24-feb-24														
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	26-feb-24	26-feb-24														
105	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	27-feb-24	27-feb-24														
106	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	29-feb-24	02-mar-24														
107	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	29-feb-24	29-feb-24														
108	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	28-feb-24	28-feb-24														

109	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1:2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	29-feb-24	29-feb-24															
110	CINTA SIKA PVC V=0.22	28-feb-24	28-feb-24															
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	04-mar-24	04-mar-24															
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	04-mar-24	04-mar-24															
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC, D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	04-mar-24	04-mar-24															
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	04-mar-24	04-mar-24															
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	05-mar-24	05-mar-24															
116	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	23-feb-24	05-mar-24															
	DESARENADOR																	
201	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024															
202	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	06-mar-24	08-mar-24															
203	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	06-mar-24	08-mar-24															
204	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	09-mar-24	09-mar-24															
205	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	11-mar-24	11-mar-24															
206	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	14-mar-24	18-mar-24															
207	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	13-mar-24	13-mar-24															
208	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	21-mar-24	23-mar-24															
209	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	13-mar-24	13-mar-24															
210	PASOS UNA DE GATO D=5/8"	13-mar-24	13-mar-24															
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC, D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	25-mar-24	25-mar-24															
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	15-mar-24	18-mar-24															

213	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	24-mar-24	25-mar-24																
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	24-mar-24	25-mar-24																
215	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	24-mar-24	25-mar-24																
216	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	24-mar-24	25-mar-24																
217	CINTA SIKA PVC. V=0.22	15-mar-24	18-mar-24																
218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	25-mar-24	27-mar-24																
219	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	05-mar-24	27-mar-24																
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO																		
301	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024																
302	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	08-abr-24	14-abr-24																
303	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	08-abr-24	14-abr-24																
304	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	15-abr-24	15-abr-24																
305	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	16-abr-24	16-abr-24																
306	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	23-abr-24	28-abr-24																
307	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	21-abr-24	22-abr-24																
308	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	29-abr-24	01-may-24																
309	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	17-abr-24	18-abr-24																
310	PASOS UNA DE GATO D=5/8"	17-abr-24	18-abr-24																
311	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	02-may-24	02-may-24																
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	23-abr-24	28-abr-24																
313	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	02-may-24	02-may-24																
314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	02-may-24	02-may-24																
315	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	02-may-24	02-may-24																
316	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	02-may-24	02-may-24																
317	CINTA SIKA PVC. V=0.22	17-abr-24	18-abr-24																

318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	04-may-24	04-may-24	
319	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	04-may-24	04-may-24	
320	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	05-may-24	06-may-24	
321	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	05-may-24	06-may-24	
322	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	07-may-24	07-may-24	
323	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	07-may-24	07-may-24	
324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	07-may-24	07-may-24	
	RED DE ADUCCION			
401	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	13/12/2024	22/12/2024	
402	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	02-may-24	05-may-24	
403	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	02-may-24	05-may-24	
404	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	06-may-24	06-may-24	
405	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	06-may-24	06-may-24	
406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	09-may-24	09-may-24	
407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	09-may-24	09-may-24	
408	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	09-may-24	12-may-24	
409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	09-may-24	14-may-24	



CONSORCIO HATO
LAGUNA 2023

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO HATO LAGUNA 2023
Calle 17 # 10 – 40, Duitama – Boyacá
Teléfono 3017557612

BITACORA. CONTRATO Nº 011 - 2013

OBSETO:: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA ALTO LAGUNO FASE 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ALTO LAGUNO 2023
NIT. 901.775.384 - 7

INTERVENTOR: ING. ANDRES RUIZ.

13 - 12 - 2023. SE INICIA EL RECORRIDO DE OBRA HACIENDO UN RECONOCIMIENTO AL SITIO DE OBRA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA

14 - 12 - 2023. UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO SE OBSERVA QUE ES NECESARIO INTERVENIR PREDIOS POR LO QUE SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA DIALOGO CON LA COMUNIDAD PARA LOS PERMISOS RESPECTIVOS.

15 - 12 - 2023. SE LE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE PARA LA OBRA ES NECESARIO CONTAR CON LOS PERMISOS

16 - 12 - 2023. SE ESTA A LA ESPERA DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS

17 - 12 - 2023 LA COMUNIDAD ACLARA LA INFORMACION A LOS USUARIOS.

18-12-2023 Se envia a la Espera de los Permisos

19-12-2023 Se Revisan Precios y se determina que para la llegada de materiales se debe contactar al propietario de dicho terreno.

20-12-2023. Ante la cercania y Dificultad de Permisos se procede a solicitar por parte del contratista la suspension del contrato

21-12-2023. La Administracion Estudio la solicitud presentada y procede a legalizar dicha suspension

22-12-2023 Se Suspende la obra hasta no contar con los Permisos Pertinentes para paso de materiales y retiro de Mala y Acarreo de materiales

23-02-2024. Se da Reinicio de Obra.

Personal en Obra:
Maestro General
Oficial
3 Ayudantes

Clima: Dia Soleado.
Se da Inicio a la Excavación y desvio de Cauce para la Construcción de la Bocatoma Base Mayor: 2.20 mL; ancho 5mL

24-02-2024. Se continua con la Actividad de Excavación
Se da por terminado el desvio del Cauce Caja de Control: 2.50 mL + 25 mL + 1.00 mL

Personal en Obra:
Maestro General
Oficial
3 Ayudantes

26-02-2024.
Se realiza la actividad de suministro e instalación de concreto ciclopeo para las bases. - Fundida Boqueron

Personal en obra:
Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Dia Soleado

27-02-2024
Una vez terminada la excavación y mejorado el piso con recebo se procede a realizar el solado para la cámara de control de caudal
L= 2.0 ; a= 2.2 m

Personal en obra:
Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes.

Dia Soleado 28-02-2024. Se procede al amarre de hierro

29-02-2024. Se inicia con la instalación de la formaleta para los muros de las captaciones.

Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: Dia Soleado

01-03-2024. Se continua con la actividad de formaleta y fundida de placa para la correspondiente fundida. Area 0.80 m² Muro. Preciado - Irq.

Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: Dia Soleado

02-03-2024

Se Procede a la Fabricación de la Placa de la Estructura de la Bocatoma. Zapata y Dique: 4 * 0.5 * 0.92
Caja Control: 2.10 * 1.8 * 0.15

Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: Dia Soleado

03-03-2024

Se Funden los Muros de la Captación.

Muro Derecho L= 5.40 ml
Muro Izq. L= 5.40

Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

04-03-2024

Una Vez Culminada la Construcción de la Captación se Procede a la Instalación de Tuberías y accesorios como es. La Tubería de 3"; 6" y los respectivos adaptadores de limpieza.

05-03-2024. Se continuo con la Actividad de Accesorios de la Captación.

Personal en obra:
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: Dia Soleado

06-03-2024. Se Inicio la Construcción del Desarenador. Se realizo la excavación y replanteo y se procede a realizar las Excavaciones.

Se Hizo La Zona de Excavación
con un Ancho de 1.90 M y una
Longitud de 6.45 ML.

Se determino L y P
Largo: 7.0 ML.
Ancho: 2.0 ML.

Personal En obra.
1 Maestro General.
1 Oficial
3 Ayudantes

Dia Sabado

07 de Marzo de 2024.
Continua La Actividad de Excavación.
En La Estructura del Regenerador
Personal En obra
1 Maestro General.
1 Oficial
3 Ayudantes

08-03-2024
Se Termino La Actividad de Excavación.
Se Procede a La Medición de La Zapata.
Se Determino Con La Estructuración
Excavación Manual En Material Común.

Estructura Principal: Largo: 9.0 ML.
Ancho: 2.0 ML.
Altura: 1.0 ML.

Personal En obra.
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Dia Sabado

09-03-2024
Se Procede Al Refinamiento del Piso
En Base de Material Afirmado Compactado
Con Herramienta Regenerador - Piso de La
Casa de Dentrado - Piso Cuarto de Aguacate

Piso de Acceso 4 Piso Costa de Solido.

Personal en Obra:

1 Maestro General

1 Oficial

3 Ayudantes

Día Soleado

11-03-2024

Se procede a ejecutar el solado en un concreto de bajo contenido de cemento en una proporción 1:5:5. de la estructura principal del desarenador con una dimensión de 7.0 ml de largo; 1.12 ml de ancho y un espesor de 0.15 m. para un área de 7.8 m2

Personal en obra.

1 Maestro General

1 Oficial

3 Ayudantes

Día Soleado

12 de Marzo de 2024. Se inicia con la instalación de Fierro corrugado de Refuerzo. Posterior el Figurado y armado del Hierro de acuerdo a plano de diseño

Personal en obra:

1 Maestro General

1 Oficial

3 Ayudantes

Día Soleado.

13-03-2024. Se Funde la Placa de Piso posterior a la instalación.

Piso Costa de Entrada. Largo: 0.84 m.
Ancho: 0.84 m.
Altura 0.15 ml.

Piso Casa de Aquietamiento
Largo: 1.66 ml
Ancho: 0.84 ml.
Altura: 0.15 ml.

Personal en obra.

1 Maestro General

1 Oficial.

3 Ayudantes

Día Soleado

14 Marzo 2024
Se continua con la fundicion de muros.
Se inicia con la fundicion de los muros Estructura Principal.

Muro Principal Interno: 2.20 * 0.20 * 1.40
Muro Principal Exterior
Largo 6.40 + 0.20 + 1.80.

Personal en obra.
1 Maestro General
1 Oficial Dia Soleado.
4 Ayudantes

Marzo 15 de 2024.
Se continua con la fundicion de los muros del pedregador.
Se Funden Muros de la Caja de Entrada.
Largo: 2.04.
Ancho o espesor: 0.15 Y altura 0.80

Caja de Alcantarillado:
Largo Muro: 4.05 ml.
Espesor: 0.15. Altura 0.80 m.

Personal en obra.
1 Maestro General.
1 Oficial Dia Soleado.
3 Ayudantes.

Marzo 16 de 2024
Se continua con Fundicion del Muro de Solera de una longitud de 2.30 m de largo; e= 0.20 m y altura de 0.40m. al igual que se Funde la Pantalla de Alcantarillado de 1.6 ml largo con un espesor de 0.10m y altura de 1.05 m.

Personal en obra: 1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes
Dia Soleado

Marzo 17 de 2024.
Se fundieron los ultimos componentes que conforman el desarenador, la caja de lavado y los muros de la caja de lavado
Longitud: 2.04 con un espesor de 0.15m y una altura de 0.30 m.

Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Día Soleado

Marzo 18 de 2024
Descimbrado de la estructura del desarenador
Personal en obra
1 Maestro General
1 Oficial
3 Ayudantes

Día soleado

Marzo 19 de 2024.
Se realizo el recorrido a la linea de conduccion de efectuo la localizacion y replanteo
Se abrio 1 frente con 2 ayudantes para iniciar excavacion en la linea de conduccion.
Dia Soleado

Marzo 20 de 2024.
Se realizan excavaciones en la linea de conduccion.
Personal en obra
1 Maestro de obra
2 Ayudantes

Dia Soleado.

Marzo 21 de 2024.
Se realizo el atraque y figurado de las tapas de la estructura del desarenador

Personal en la obra
1 Maestro General
1 Oficial
1 Ayudante

Día Soltado

Marzo 23 de 2024.
Se realiza la fundición de las
Tapas de la Cimentación de Desarenadores

Personal
1 Maestro de Obra
1 Oficial
2 Ayudantes

Día Soltado

Marzo 24
Se inicia con la instalación de
Accesorios y Elementos en P.V.C.
Diámetros 3"

Personal En obra
1 Maestro General.
1 Oficial.

Día Soltado

Marzo 25 de 2024.
Se continua con instalación de elementos
y accesorios.
Se termina de Decimbrar la Estructura
Se inicia con la Recolección de Escombros
en el Area de Construcción de Desare
nadores
Personal en obra:
1 Maestro General
1 Oficial
2 Ayudantes.

Marzo 27 de 2024.
Se Terminan los ultimos detalles en
El Area de Construcción.
Se Pasa a Fundición la Cimentación y
se termina de 100% la estructura de Desarenadores

Personal en obra

1 Maestro General

1 Oficial

3 Ayudantes.

Dio Solicito

INFORME INTERVENTORÍA

IMC MA- 046-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ



MARZO

2024

TABLA DE CONTENIDO

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
1.2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 7
1.3. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS 8
1.4. PÓLIZAS 9
1.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO 12
1.6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 13
1.7. INFORMACIÓN SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO 13
1.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 13
1.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 13
1.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 13
2. ESTADO FINANCIERO 14
2.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 14
2.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
2.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 14
2.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3. ESTADO TÉCNICO 15
3.1. AVANCE ACTIVIDADES 15
3.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA 25
3.3. ANÁLISIS AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 25
3.4. COMITÉS DESARROLLADOS 26
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del proyecto 4
Ilustración 2. Gráfico avance de obra 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Ítems contratados 5
Tabla 2 Información general entidad contratante 7
Tabla 3. Información general contrato de obra 7
Tabla 4. Información general contrato de interventoría 8
Tabla 5. Información ejecución del contrato de obra 8
Tabla 6. Información ejecución del contrato de interventoría 8
Tabla 7. Información garantías del contrato de obra 9
Tabla 8 Información garantías del contrato de interventoría 11
Tabla 9. Personal administrativo contrato de obra 12
Tabla 10 Personal operativo de obra 12
Tabla 11. Personal Administrativo contrato de interventoría 13
Tabla 12 Supervisora municipal 13
Tabla 13 Correspondencia Enviada 13
Tabla 14 Correspondencia Recibida 13
Tabla 15 Estado Financiero Del Contrato De Obra 14
Tabla 16 Estado Financiero Del Contrato De Interventoría 14
Tabla 17 Avance Financiero Del Contrato De Obra 14
Tabla 18 Avance Financiero Del Contrato De Interventoría 14
Tabla 19 Ítems Ejecutados 15
Tabla 20 Porcentaje de obra ejecutado 25

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el sector centro de la vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, departamento de Boyacá, a continuación, se puede apreciar la localización general dentro de la geografía nacional.

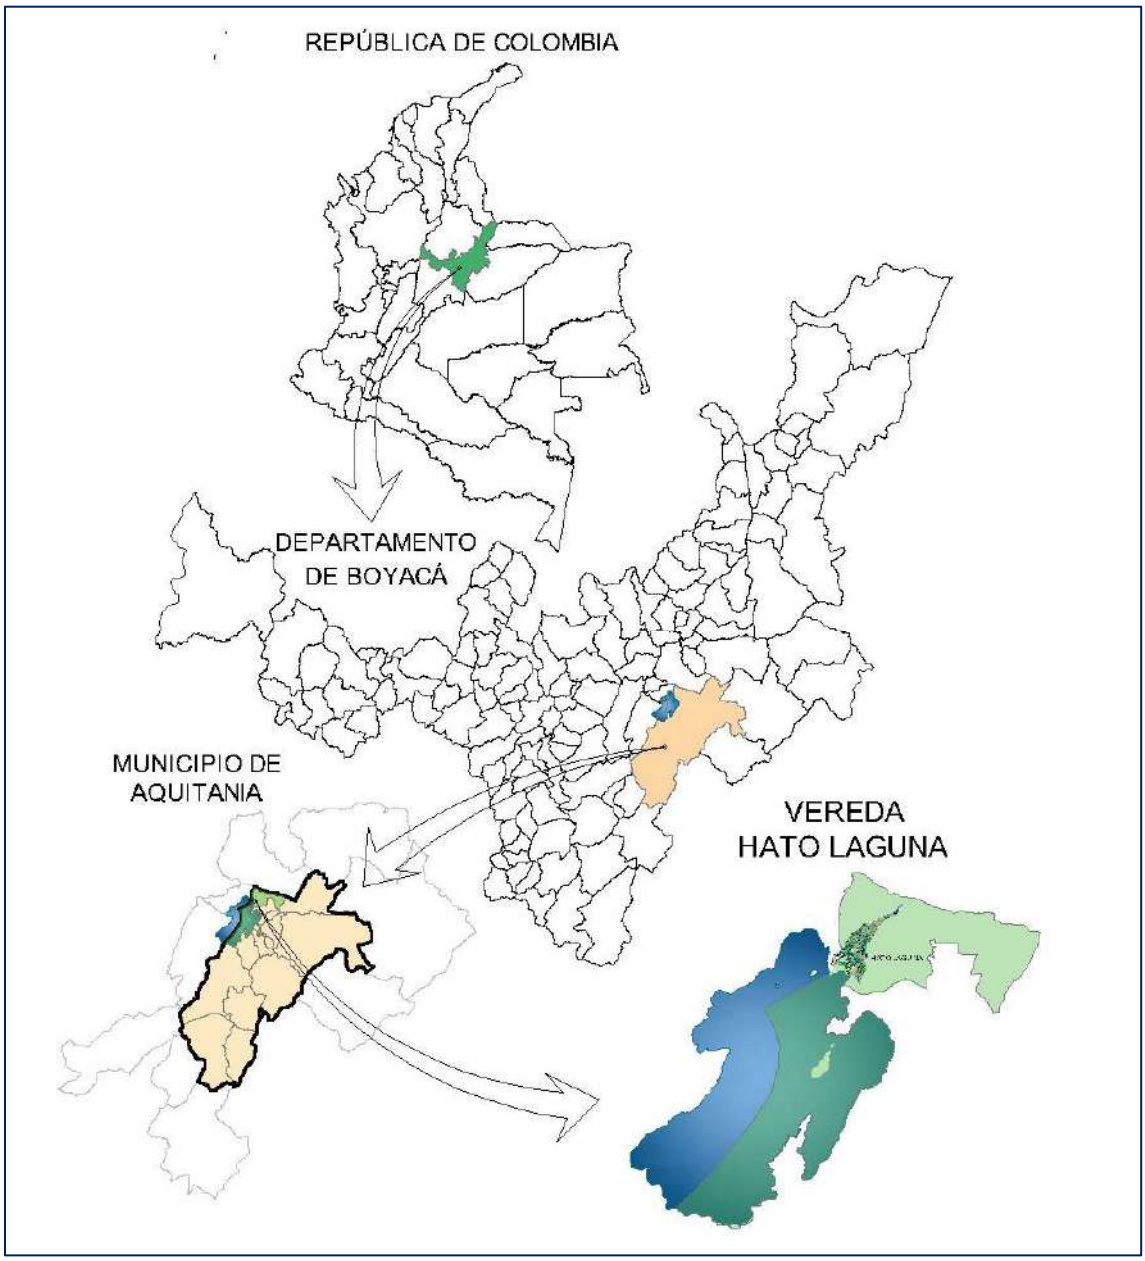


Ilustración 1 Localización del proyecto

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto desarrolla la construcción de las estructuras planificadas para la fase inicial del Acueducto BUENAVISTA, siguiendo los criterios técnicos y especificaciones establecidos en el contrato de obra No. 011 de 2023 (MA-SAMC-012 de 2023) que tiene como objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

A continuación, se presenta la tabla que detalla los ítems contratados y que serán sujetos a revisión por parte de la interventoría:

Tabla 1 Ítems contratados

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	BOCATOMA Ancho=4.00m		
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m^2	60,17
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	7,22
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m^3	10,83
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES	m^3	11,82
1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m^2	4,49
1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m^3	10,03
1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m^3	2,50
1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00
1,10	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	1,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA	m	3,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m^2	3,82
1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00
2,00	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)		
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m^2	12,26
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	8,03
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m^3	12,05
2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m^3	3,03

2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76
2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51
2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,16
2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09
2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34
2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA	m	12,44
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	4,00
2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"	Un	3,00
2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13
2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00

3,00	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)		
3,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,56
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	27,69
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54
3,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,06
3,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,50
3,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70
3,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27
3,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48
3,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,29
3,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE. 21 UNIÓN MECÁNICA	m	27,03
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Un	4,00
3,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00
3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"	Un	3,00
3,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00
3,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00
3,20	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.	m²	4,07
3,21	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28

3,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00
3,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00
3,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	2,56

4,00	RED DE ADUCCIÓN		
4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	446,62
4,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	64,31
4,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	16,08
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIÁMETRO 90 mm	m	446,62
4,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	80,39
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00
4,08	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00
4,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84

1.2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presentan los datos generales de la entidad contratante, y contratistas de obra e interventoría, involucrados en la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Tabla 2 Información general entidad contratante

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ
NIT	800.077.545-5
REPRESENTANTE LEGAL	ÓSCAR DARÍO HURTADO PÉREZ

Tabla 3. Información general contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	No 011 DE 2023 (MA-SAMC-012 DE 2023)
OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023

NIT.	901.775.384-7
REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
IDENTIFICACIÓN	7.226.154 de Duitama
FECHA DEL CONTRATO	13/12/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 220.760.560,00

Tabla 4. Información general contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No 010 DE 2023 (IMC MA- 046-2023)
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ"
INTERVENTOR	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
IDENTIFICACIÓN	1.056.436.285 de Pisba
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
IDENTIFICACIÓN	1.056.436.285 de Pisba
FECHA DEL CONTRATO	13/12/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.600.000,00

1.3. INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS

La etapa de ejecución de los contratos de obra en interventoría se ha desarrollado de acuerdo a lo siguiente:

Tabla 5. Información ejecución del contrato de obra

FECHA INICIO ACTIVIDADES	13/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL	22/12/2023
FECHA ACTA DE REINICIO	23/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	14/04/2023

Tabla 6. Información ejecución del contrato de interventoría

FECHA INICIO ACTIVIDADES	13/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA SUSPENSIÓN TEMPORAL	22/12/2023
FECHA ACTA DE REINICIO	23/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	14/04/2023

1.4. PÓLIZAS

A continuación, se presenta la relación de las pólizas que se encuentran amparando los contratos de obra e interventoría, la cuales se encuentran vigentes:

Tabla 7. Información garantías del contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		1	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	22/11/2023	22/08/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	22/11/2023	22/02/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008654	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		1	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	22/12/2023	22/02/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	22/12/2023	22/02/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	22/12/2023	22/02/2024	$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	12/09/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E	13/12/2023	15/03/2027	$22.076.056,00

Indemnizaciones Laborales			
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008654		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	2		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	14/03/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	14/03/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	14/03/2024	$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	51-44101025473		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	3		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	15/11/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	15/03/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008654		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	3		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	15/05/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		4	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	15/11/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	15/05/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008654	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	15/05/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00

Tabla 8 Información garantías del contrato de interventoría

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157222	
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/11/2023	
ANEXO		0	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	21/11/2023	21/06/2024	$1.600.000,00
Calidad Del Servicio	21/02/2024	21/02/2029	$2.400.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	21/11/2023	21/02/2027	$1.600.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157222	
FECHA DE EXPEDICIÓN		23/02/2024	
ANEXO		1	

ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	21/11/2023	21/08/2024	$1.600.000,00
Calidad Del Servicio	21/02/2024	21/02/2029	$2.400.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	21/11/2023	25/04/2027	$1.600.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		39-44-101157222	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/03/2024	
ANEXO		3	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	16/09/2024	$1.600.000,00
Calidad Del Servicio	14/03/2024	15/03/2029	$2.400.000,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	17/05/2027	$1.600.000,00

1.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta los perfiles exigidos por la entidad contratante, se relaciona a continuacion el personal administrativo del contrato de obra e interventoría:

Tabla 9. Personal administrativo contrato de obra

CARGO	NOMBRE
Director De Obra	MARTHA ENITT VARGAS PEREZ
Residente De Obra	JAIRO YUBER OJEDA CADENA

Tabla 10 Personal operativo de obra

CARGO	NOMBRE
Maestro General	Carlos Alberto Cely Castro
Oficial	Daniel Eduardo Martínez Espinel
Ayudante de Obra 1	José Mario Lombana
Ayudante de Obra 2	Luis Arley Riveros
Ayudante de Obra 3	Yerson Zamir Martínez Castillo

Tabla 11. Personal Administrativo contrato de interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de interventoria	Diego Hernán Rubiano Rodríguez
Residente de interventoria	Jose Francisco Acevedo Vela
Inspector de interventoria	Laura Natalia Ruiz Pidiache

1.6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre Del Trabajador	Identificación	Salud	Pensiones Y Cesantías	Caja De Compensación
Carlos Alberto Cely Castro	1051980288	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Daniel Eduardo Martínez Espinel	1051476165	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
José Mario Lombana	4204599	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Luis Arley Riveros	1030605307	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY
Yerson Zamir Martínez Castillo	4217261	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFABOY

1.7. INFORMACIÓN SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO

Tabla 12 Supervisora municipal

SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CARGO	JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

1.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 13 Correspondencia Enviada

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
18/11/2023	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE	18/11/2023	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
09/02/2024	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE	09/02/2024	Solicitud reinicio de actividades

1.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 14 Correspondencia Recibida

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
18/11/2023	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	18/11/2023	Solicitud de suspensión del contrato de obra.
12/02/2024	ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	12/02/2024	Solicitud reinicio de actividades

2. ESTADO FINANCIERO

2.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 15 Estado Financiero Del Contrato De Obra

DESCRIPCIÓN FINANCIERA	
Valor Inicial Del Contrato	$ 220.760.560,00
Valor Adiciones	-
Valor Total Del Contrato	$ 220.760.560,00

2.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 16 Estado Financiero Del Contrato De Interventoría

DESCRIPCIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000,00
VALOR ADICIONES	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.000.000,00

2.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 17 Avance Financiero Del Contrato De Obra

ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR
-	-	$0,00
-	-	$0,00
VALOR PAGADO A LA FECHA		$0,00
VALOR POR PAGAR		$ 220.760.560,00

2.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 18 Avance Financiero Del Contrato De Interventoría

ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR
-	-	$0,00
-	-	$0,00
VALOR PAGADO A LA FECHA		$0,00
VALOR POR PAGAR		$ 16.000.000,00

3. ESTADO TÉCNICO

3.1. AVANCE ACTIVIDADES

Los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 08 de agosto del 2023 y el 08 de septiembre del 2023 y se describen a continuación:

Tabla 19 Ítems Ejecutados

ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1,00	BOCATOMA Ancho=4.00m	
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS). 	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de las estructuras, incluyendo la bocatoma y la caja de control de caudal, asegurando así la precisión en la ejecución de las obras.
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla.
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.

1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES. 	Se lleva a cabo la preparación y colocación de una mezcla de concreto especial que contiene agregados gruesos dispuestos de manera irregular, con el objetivo de proporcionar una base resistente y duradera. Para los muros de protección de la bocatoma, el dique y la base de esta.
1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI). 	Una vez que la excavación ha sido completada y el piso ha sido mejorado mediante el proceso de recebo, se procede a realizar el solado. El solado es crucial para proporcionar una base sólida y uniforme sobre la cual se puedan construir las estructuras.
1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS. 	Se realiza la construcción de muros de la bocatoma y caja de control de caudal, caracterizado por su resistencia y su capacidad para resistir la penetración de agua.
1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS. 	Se lleva a cabo la construcción de la los de contrapiso de la bocatoma y caja de control.

1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA. 	Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. 	Se instala la rejilla especificada en los planos y diseños de la captación.
1,10	CINTA SIKA PVC V=0.22. 	Según las especificaciones se instala para las juntas de los muros de la caja de control.
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI. 	Con el fin de controlar el caudal se instala una válvula en la caja de control de caudal, para tener un buen control.

1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.	Se instala una válvula de pie para filtrar las impurezas, según especificaciones técnicas previas.
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA. 	Se instala tubería PVC para conexiones de la estructura y caudal de excesos.
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3". 	Se instala los adaptadores de limpieza requeridos en la caja de control de caudal, para facilitar su mantenimiento.
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO. 	Suministro e instalación de las tapas requeridas para la caja de control, garantizando la calidad y componentes técnicos.

1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM. 	Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la bocatoma.

2,00	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS). 	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de los componentes del desarenador.
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para el desarenador.
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.

2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO. 	Para mejorar el suelo de cimentación se aplica una capa de afirmado según especificaciones técnicas.
2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI). 	Luego del afirmado, se procede a la instalación del solado para completar el mejoramiento de la base de construcción del desarenador.
2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS. 	Se realiza la mezcla específica para cumplir la resistencia requerida y se procede a instalar formaletas y fundir los muros de cada sección.
2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS. 	Se vierten las placas sobre la base que ha sido previamente mejorada, asegurándose de cumplir con las especificaciones necesarias del concreto para alcanzar la resistencia requerida.

2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS. 	Se instala la formaleta necesaria para la tapa de concreto según lo especificado en los planos del desarenador. Considerando los requisitos de concreto.
2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa. 	Al igual que el acero de la bocatoma, se figura en el campamento de obra siguiendo la tabla de acero de los planos. Se instala a medida que se avanza en la construcción de cada componente.
2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8". 	Una vez terminado el tanque del desarenador, se instalan los pasos de acero que servirán como acceso para su mantenimiento.
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA. 	Se instala la tubería necesaria para las conexiones de cada componente de la estructura, así como un bypass que permita su funcionamiento cuando la estructura esté en mantenimiento.

2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER. 	Con el objetivo de garantizar un tratamiento efectivo del agua y prevenir la filtración no deseada, se supervisa cuidadosamente la correcta instalación de los pasamuros. Durante esta supervisión, se asegura que los pasamuros sean instalados adecuadamente, permitiendo el transporte del agua de acuerdo con las consideraciones previamente diseñadas.
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3". 	Se instala los adaptadores de limpieza para facilitar su mantenimiento.
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI. 	Se instalan las válvulas definidas en los planos, con las que se garantiza la regulación del flujo en la estructura.
2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3". 	Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.

2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3". 	Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.
2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22. 	Según las especificaciones se instala para las juntas de la estructura.
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO. 	Suministro e instalación de las tapas requeridas, garantizando la calidad y componentes técnicos.
2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM. 	Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.

4,00	RED DE ADUCCIÓN	
4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS). 	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo para la ubicación de la red de aducción.
4,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para la instalación de la tubería.
4,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.

3.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Por parte de la interventoría en compañía del municipio y contratista, se lleva a cabo la revisión técnica de los diseños y la ejecución en obra de estos.
2	Se efectuó el control y supervisión en la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ.
3	Se llevo control y supervisión de los ítems requeridos para la construcción de la estructura de captación 1.BOCATOMA Ancho=4.00m y de la estructura de tratamiento primario 2. DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m) y actividades iniciales para la ejecución de la red de aducción.
4	Comités de obra para toma de decisiones, considerando el inicio de obra, suspensión y reinicio, avances de obra y balance de cantidades mayores y menores.


3.3. ANÁLISIS AVANCE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A la fecha se presenta un porcentaje de ejecución del 45.2%, que, al compararlo con el avance físico proyectado por el contratista de obra dentro del cronograma no se han cumplido la totalidad de las metas, considerando las variaciones de cantidades y los imprevistos relacionados. Aun así, la ejecución se ha mantenido en marcha dando soluciones y garantizando la inversión prevista.

Tabla 20 Porcentaje de obra ejecutado

DATOS DE ORIGEN PARA GRAFICO			
TOTAL		TOTAL, EJECUTADO	TOTAL
CONTRATADA		ACUMULADO	POR EJECUTAR
und	cant	CANTIDAD	CANTIDAD
%	100,0%	45.2%	54.8%

Ilustración 2. Gráfico avance de obra

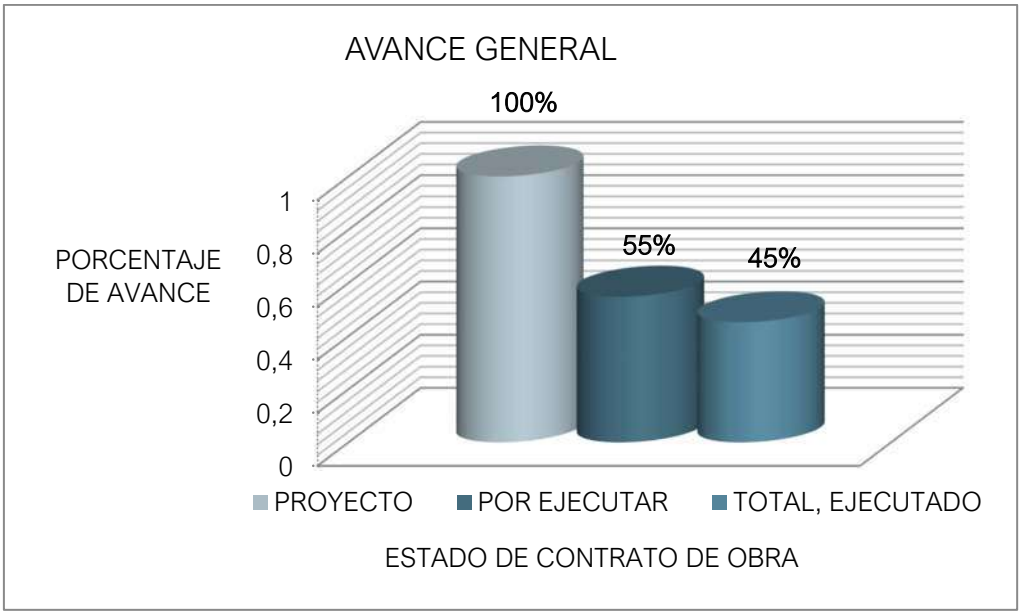

3.4. COMITÉS DESARROLLADOS

COMITÉ No	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	13/12/2023	Aprobación acta de inicio de obra
02	22/12/2023	Aprobación acta de suspensión de obra
03	07/02/2024	Exposición estado de contrato de obra e interventoría con la nueva administración
04	22/02/2024	Aprobación acta de reinicio de obra
05	03/03/2024	Discusión del primer balance de obra y documento s de adición de valor de obra.
06	18/03/2024	Estudio de balance de obra
07	28/03/2024	Aprobación balance de obra acata de mayores y menores cantidades de obra
08	02/04/2024	Verificación de ejecución y solicitud de cuenta acta parcial 1.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se comienza la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **010-2023** INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN FASE 1 DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ".

- Se realizan visitas técnicas para supervisar la ejecución de la obra, rectificando los requerimientos definidos en el contrato, como materiales, cantidades y personal operativo.

- El valor de obra ejecutado es de $ 99.792.553,41 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 41/100 M/CT) con un porcentaje ejecutado del 45.20%

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
C.C. 1.056.436.285 expedida en Pisba

COMITÉ DE OBRA 007 BALANCE DE OBRA

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ DE OBRA N°:	007
FECHA PRESENTE ACTA:	Marzo 22 de 2024
CONTRATO N°:	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No 011 DE 2023
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA DE HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior.

Se da lectura y aprobación del acta anterior y se procede a verificar compromisos

VERIFICACION DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
Presentar documentos para balance de obra, sábana de mayores y menores cantidades de obra, memoria de cantidades balance.	El contratista de obra realizó balance del contrato, con verificación de cantidades y lo envió al interventor para revisión
Revisar balance del contrato	El interventor revisó los documentos presentados de balance del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:00 a.m se da inicio al comité de obra 07, en las instalaciones de la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Aquitania, con la presencia del SUPERVISOR ingeniero DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA, Jefe De La Unidad De Servicios Públicos, el representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTO HATO LAGUNA 2023, contratista de obra, ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, la directora de obra, ingeniera MARTHA ENITT VARGAS PÉREZ y el interventor, ingeniero ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE. Se procede a realizar la presentación y verificación de los documentos de balance de obra, que corresponden a la sábana-acta de mayores y menores cantidades de obra (balance del contrato), con sus respectivas memorias de cantidades que la soportan. El interventor manifiesta que una vez revisada la documentación y con base en la verificación de dimensiones en planos y sitio de obra de acuerdo con la implantación en campo de las estructuras y elementos de las actividades contratadas, se

aprueba el balance presentado y se recomienda a la entidad proceder con la aprobación de este. El supervisor manifiesta que está de acuerdo con la documentación presentada, al haber participado de la verificación de dimensiones y contando con el visto bueno de la interventoría. El contratista de obra procede a entregar la documentación y se procede a realizar la firma de los documentos por las partes involucradas en el trámite. De esta manera, con la firma de la presenta acta y anexando los documentos de soporte, las partes acuerdan realizar la modificación de mayores y menores cantidades o balance de cantidades del contrato de obra, teniendo en cuenta que esta modificación no afecta el valor total del contrato de obra.

Se anexa a la presenta acta de comité los siguientes documentos:

1. SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) – 001
2. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA (DE LOS 40 ÍTEMS QUE PRESENTARON VARIACIÓN DE MAYOR O MENOR CANTIDAD DE OBRA)

Siendo la 1:00 p.m. se da por terminado el comité de obra.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	Lunes 01 de abril de 2024

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Presentar avance de ejecución	01-04-2024	Contratista de Obra

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Ing. Diego Alejandro Montaña Cadena	Supervisor – Jefe Unidad de Servicios Públicos Aquitania	3118981536	
Ing. Andres Felipe Ruiz Pidiache	Interventor	3148477432	
Ing. Franklin Yebrail Ojeda Cadena	R/L Contratista de Obra	3017557612	
Ing. Martha Enitt Vargas Pérez	Directora de Obra	3108089378	

SÁBANA Y MEMORIAS BALANCE DE OBRA

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001

FECHA: 22 de marzo de 2024

OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATO:	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA:	FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR:	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.285 DE PISBA
SUPERVISOR:	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
VALOR INICIAL:	$ 220.760.560,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL:	$ 220.760.560,00

PLAZO INICIAL:	3,00 MESES
PRÓRROGA (S):	0,00 MESES
PLAZO TOTAL:	3,00 MESES
PLAZO EJECUTADO:	1,53 MESES
FECHA DE CONTRATO:	22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO:	23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	14 de mayo de 2024

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,00		BOCATOMA Ancho=4.00m				$ 42.383.127,91			$ 2.253.349,36		$ 44.636.477,28
1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	60,17	$ 8.003,49	$ 481.570,07	-	-10,97	-$ 87.798,30	49,20	$ 393.771,77
1,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	7,22	$ 61.964,68	$ 447.384,98	+	1,88	$ 116.493,60	9,10	$ 563.878,57
1,03	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	10,83	$ 88.045,56	$ 953.533,47	+	2,82	$ 248.288,49	13,65	$ 1.201.821,96
1,04	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	m³	11,82	$ 546.376,48	$ 6.458.169,95	-	-0,43	-$ 236.296,90	11,39	$ 6.221.873,06
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m²	4,49	$ 34.570,50	$ 155.221,54	-	0,00	-$ 69,14	4,49	$ 155.152,40
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	10,03	$ 1.244.007,89	$ 12.477.399,11	+	0,33	$ 404.302,56	10,36	$ 12.881.701,68
1,07	2,07,05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	2,50	$ 1.166.151,66	$ 2.915.379,14	-	-0,09	-$ 108.452,10	2,41	$ 2.806.927,04
1,08	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27	$ 6.990,92	$ 7.775.786,82	+	0,00	$ 2,32	1.112,27	$ 7.775.789,14
1,09	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00	$ 328.029,43	$ 328.029,43		0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.029,43
1,10	3.13.12	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30	$ 76.520,55	$ 1.017.723,33	-	-0,80	-$ 61.216,44	12,50	$ 956.506,89
1,11	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	1,00	$ 1.042.345,09	$ 1.042.345,09		0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.042.345,09
1,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
1,13	2.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	3,00	$ 99.265,84	$ 297.797,52		0,00	$ 0,00	3,00	$ 297.797,52
1,14	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00	$ 18.102,28	$ 54.306,84		0,00	$ 0,00	3,00	$ 54.306,84
1,15	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,82	$ 234.231,42	$ 894.764,02	-	-0,04	-$ 9.369,26	3,78	$ 885.394,76
1,16	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00	$ 94.641,17	$ 6.435.599,42	+	21,00	$ 1.987.464,53	89,00	$ 8.423.063,95

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2,00		**DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)**				**$ 22.540.406,58**			**$ 1.554.952,19**		**$ 24.095.358,77**
2,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	12,26	$ 8.003,49	$ 98.122,80	+	1,74	$ 13.926,07	14,00	$ 112.048,88
2,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	8,03	$ 61.964,68	$ 497.576,37	-	-2,43	-$ 150.574,17	5,60	$ 347.002,20
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,05	$ 88.045,56	$ 1.060.949,06	-	-3,65	-$ 321.366,31	8,40	$ 739.582,74
2,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	3,03	$ 73.629,12	$ 223.096,25	+	4,91	$ 361.318,73	7,94	$ 584.414,98
2,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76	$ 34.570,50	$ 268.267,07	+	0,24	$ 8.186,29	8,00	$ 276.453,36
2,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51	$ 1.244.007,89	$ 4.366.467,69	+	0,88	$ 1.090.372,91	4,39	$ 5.456.840,60
2,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,16	$ 1.166.151,66	$ 1.352.735,92	+	0,12	$ 144.812,71	1,28	$ 1.497.548,64
2,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09	$ 1.081.143,33	$ 97.302,90	-	-0,01	-$ 6.486,86	0,08	$ 90.816,04
2,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34	$ 6.990,92	$ 4.350.727,04	+	0,00	$ 5,31	622,34	$ 4.350.732,35
2,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00	$ 11.074,41	$ 55.372,06	-	-1,00	-$ 11.074,41	4,00	$ 44.297,65
2,11	2.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	12,44	$ 37.023,20	$ 460.568,58	+	0,41	$ 15.253,56	12,85	$ 475.822,14
2,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
2,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00	$ 18.102,28	$ 72.409,12		0,00	$ 0,00	4,00	$ 72.409,12
2,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
2,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00	$ 143.702,70	$ 574.810,79		0,00	$ 0,00	4,00	$ 574.810,79
2,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
2,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00	$ 76.520,55	$ 688.684,96	+	0,40	$ 30.608,22	9,40	$ 719.293,18
2,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13	$ 234.231,42	$ 1.435.838,60	+	0,81	$ 190.687,80	6,94	$ 1.626.526,40
2,19	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00	$ 94.641,17	$ 1.514.258,69	+	2,00	$ 189.282,34	18,00	$ 1.703.541,02
3,00		**TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)**				**$ 71.380.939,82**			**-$ 5.999.440,99**		**$ 65.381.498,84**
3,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,56	$ 8.003,49	$ 220.576,22		0,00	$ 0,00	27,56	$ 220.576,22
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	27,69	$ 61.964,68	$ 1.715.801,94	-	-12,37	-$ 766.503,07	15,32	$ 949.298,87
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54	$ 88.045,56	$ 3.657.412,76	-	-18,56	-$ 1.634.125,68	22,98	$ 2.023.287,08
3,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,06	$ 73.629,12	$ 887.967,24	-	-0,39	-$ 28.492,63	11,67	$ 859.474,61
3,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,50	$ 34.570,50	$ 51.855,75		0,00	$ 0,00	1,50	$ 51.855,75
3,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70	$ 1.244.007,89	$ 17.042.908,06	-	-0,33	-$ 405.105,36	13,37	$ 16.637.802,70
3,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27	$ 1.166.151,66	$ 8.477.922,55		0,00	$ 0,00	7,27	$ 8.477.922,55
3,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48	$ 1.081.143,33	$ 3.762.378,78	+	0,18	$ 190.281,23	3,66	$ 3.952.660,01
3,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,29	$ 6.990,92	$ 22.184.205,76	-	-444,64	-$ 3.108.469,39	2.728,65	$ 19.075.736,37
3,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00	$ 11.074,41	$ 77.520,89	-	-2,00	-$ 22.148,83	5,00	$ 55.372,06
3,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	m	27,03	$ 69.541,38	$ 1.879.703,38	-	-2,55	-$ 177.330,51	24,48	$ 1.702.372,87
3,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
3,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00	$ 18.102,28	$ 36.204,56		0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.204,56
3,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00	$ 143.702,70	$ 1.005.918,88		0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.005.918,88
3.16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
3.17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00	$ 76.520,55	$ 1.530.411,02		0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.530.411,02
3.18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00	$ 57.147,29	$ 114.294,58		0,00	$ 0,00	2,00	$ 114.294,58
3.19	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00	$ 142.981,63	$ 142.981,63		0,00	$ 0,00	1,00	$ 142.981,63
3.20	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	m²	4,07	$ 80.418,85	$ 327.304,73	-	-0,43	-$ 34.467,52	3,64	$ 292.837,21
3.21	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28	$ 30.731,27	$ 223.723,65	-	-0,43	-$ 13.079,23	6,85	$ 210.644,43
3.22	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00	$ 1.370.879,15	$ 1.370.879,15		0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.370.879,15
3.23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
3.24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	2,56	$ 234.231,42	$ 599.632,43		0,00	$ 0,00	2,56	$ 599.632,43
4,00		RED DE ADUCCIÓN				$ 33.511.340,90			$ 2.191.139,41		$ 35.702.480,32
4,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	446,62	$ 1.019,83	$ 455.475,22	+	5,38	$ 5.486,67	452,00	$ 460.961,89
4,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	64,31	$ 61.964,68	$ 3.984.948,47	+	11,63	$ 720.401,35	75,94	$ 4.705.349,82
4,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	16,08	$ 88.045,56	$ 1.415.772,68	+	16,46	$ 1.449.582,18	32,54	$ 2.865.354,86
4,04	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	m	446,62	$ 40.432,03	$ 18.057.751,04	+	5,38	$ 217.524,29	452,00	$ 18.275.275,34
4,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	80,39	$ 25.013,02	$ 2.010.796,74	-	-8,07	-$ 201.855,08	72,32	$ 1.808.941,66
4,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00	$ 365.896,38	$ 1.463.585,51		0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.463.585,51
4,07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00	$ 1.171.731,46	$ 2.343.462,91		0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.343.462,91
4,08	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00	$ 480.016,61	$ 2.880.099,68		0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.880.099,68
4,09	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84	$ 234.231,42	$ 899.448,65		0,00	$ 0,00	3,84	$ 899.448,65
		COSTOS DIRECTOS				$ 169.815.815,21					$ 169.815.815,21
		A.I.U. = 30%				$ 50.944.744,56					$ 50.944.744,56
		COSTO TOTAL				$ 220.760.559,77					$ 220.760.559,77

CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
Ing. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.265 DE PISBA
INTERVENTOR


Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de Servicios Públicos
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BASE MAYOR	6,20	6,00		37,20	m²	37,20
2024-03-22	CAJA DE CONTROL	3,00	3,00		9,00	m²	9,00
2024-03-22	MURO DERECHO	2,00	1,00		2,00	m²	2,00
2024-03-22	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00		1,00	m²	1,00
TOTAL						m²	49,20

FOTOGRAFÍA

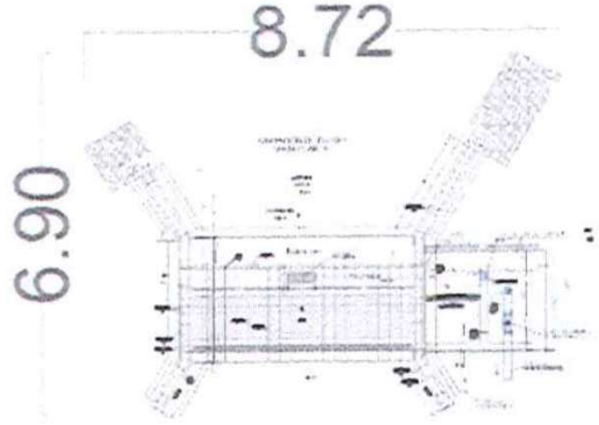

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BASE MAYOR	6,00	5,00	0,50	15,00	m³	15,00
2024-03-22	CAJA DE CONTROL	2,50	2,50	1,00	6,25	m³	6,25
2024-03-22	MURO DERECHO	2,00	1,00	0,50	1,00	m³	1,00
2024-03-22	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00	0,50	0,50	m³	0,50
SUBTOTAL						m³	22,75
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	9,10

FOTOGRAFÍA

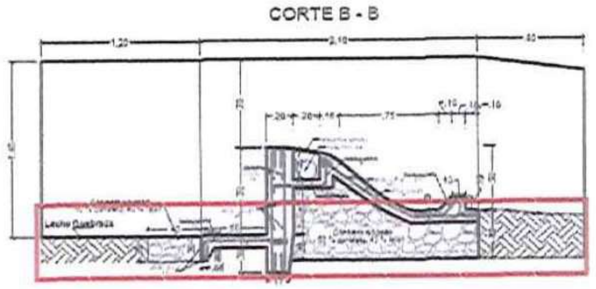

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BASE MAYOR	6,00	5,00	0,50	15,00	m³	15,00
2024-03-22	CAJA DE CONTROL	2,50	2,50	1,00	6,25	m³	6,25
2024-03-22	MURO DERECHO	2,00	1,00	0,50	1,00	m³	1,00
2024-03-22	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00	0,50	0,50	m³	0,50
SUBTOTAL						m³	22,75
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	13,65

FOTOGRAFÍA

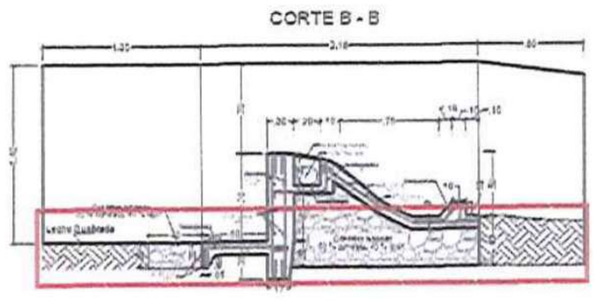

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner


MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ENTRADA A LA BOCATOMA	4,12	0,40	0,20	0,33	m³	0,33
2024-03-22	MURO DERECHO	1,00	1,00	2,40	2,40	m³	2,40
2024-03-22	MURO IZQUIERDO	2,00	1,00	2,40	4,80	m³	4,80
2024-03-22	DIQUE	4,00	0,70	0,70	1,96	m³	1,96
SUBTOTAL						m³	9,49
TOTAL (EXPANSIÓN 20%)						m³	11,39

FOTOGRAFÍA

CORTE B - B

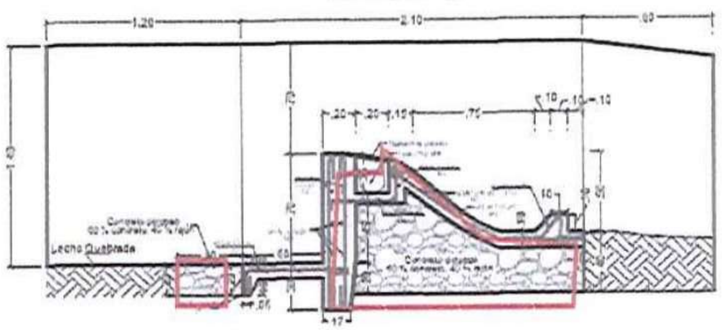

1.20
2.10
.60
.70
.20
.20
.15
.75
.10
.10
.10
.10
.40
.10
.10
.10
.10

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CAJA CONTROL DE CAUDAL	2,04	2,20	0,05	4,49	m²	4,49
TOTAL						m²	4,49

FOTOGRAFÍA

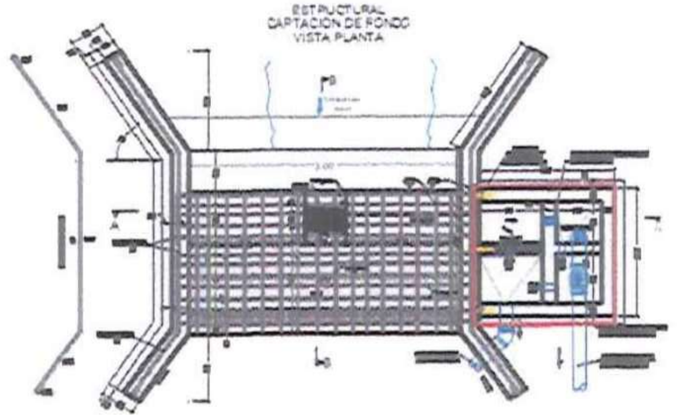

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Alto	Área			
2024-03-22	MURO DERECCHO	5,40		0,80	4,32	m³	4,32
2024-03-22	MURO IZQUIERDO	5,40		0,80	4,32	m³	4,32
2024-03-22	MUROS CAJA RECOLECCION EXTERNOS		1,10	1,15	1,27	m³	1,27
2024-03-22	MUROS INTERNOS		1,00	0,45	0,45	m³	0,45
TOTAL						m³	10,36

FOTOGRAFÍA

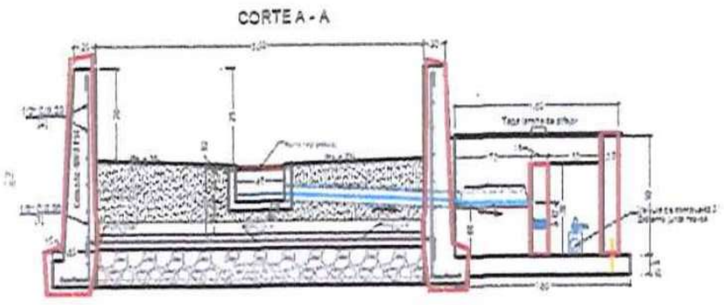

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ZARPA Y DIQUE	4,00	0,50	0,92	1,84	m³	1,84
2024-03-22	CAJA CONTROL DE CAUDAL	2,10	1,80	0,15	0,57	m³	0,57
TOTAL						m³	2,41

FOTOGRAFÍA

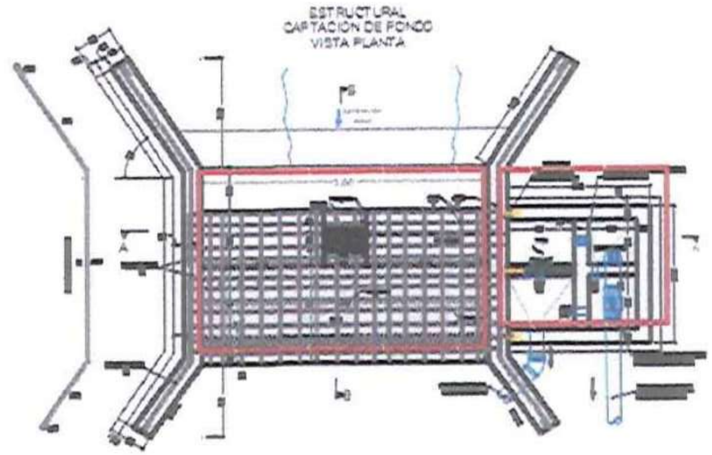

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA








Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	130,00	2,80	0,99	361,82	Kg	361,82
2024-03-22	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	5,90	0,99	87,97	Kg	87,97
2024-03-22	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	5,95	0,99	88,71	Kg	88,71
2024-03-22	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	6,45	0,99	96,17	Kg	96,17
2024-03-22	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	6,30	0,99	93,93	Kg	93,93
2024-03-22	DIQUE Y ZARPA (D=1/2")	38,00	1,20	0,99	45,33	Kg	45,33
2024-03-22	DIQUE Y ZARPA (D=1/2")	16,00	4,80	0,99	76,34	Kg	76,34
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	19,00	0,95	0,56	10,09	Kg	10,09
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	7,00	1,10	0,56	4,30	Kg	4,30
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	12,00	4,80	0,56	32,20	Kg	32,20
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	7,00	1,90	0,99	13,22	Kg	13,22
2024-03-22	PRESA (D=1/2")	12,00	2,35	0,99	28,03	Kg	28,03
SUBTOTAL						Kg	938,11
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	956,87

FOTOGRAFÍA

ID	FIGURACIÓN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
11a	

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	19,00	0,65	0,56	6,90	Kg	6,90
2024-03-22	PRESA (D=3/8")	4,00	2,30	0,56	5,14	Kg	5,14
2024-03-22	ANCLAJES CAJA (D=3/8")	20,00	0,40	0,56	4,47	Kg	4,47
2024-03-22	PLACA CAJA (D=3/8")	14,00	2,70	0,56	21,13	Kg	21,13
2024-03-22	PLACA CAJA (D=3/8")	14,00	2,10	0,56	16,43	Kg	16,43
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	53,00	1,55	0,56	45,92	Kg	45,92
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	7,00	1,10	0,56	4,30	Kg	4,30
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	8,00	5,70	0,56	25,49	Kg	25,49
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	7,00	1,90	0,56	7,43	Kg	7,43
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	5,00	1,15	0,56	3,21	Kg	3,21
2024-03-22	MUROS CAJA (D=3/8")	8,00	1,15	0,56	5,14	Kg	5,14
2024-03-22	GANCHOS MUROS (D=3/8")	39,00	0,31	0,56	6,76	Kg	6,76
SUBTOTAL						Kg	152,35
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	155,40

FOTOGRAFÍA

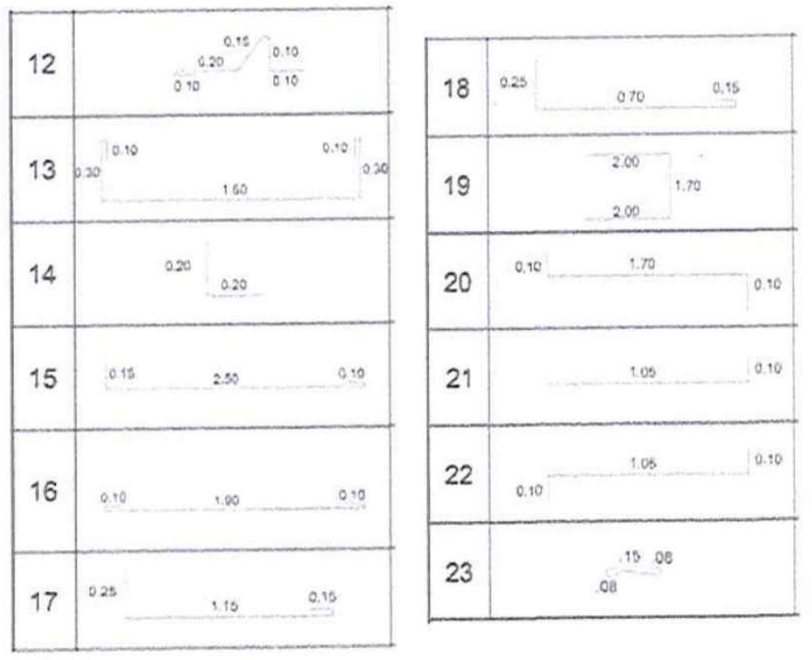

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,1	CINTA SIKA PVC V=0.22	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CINTA SIKA PVC V=0.22	12,50			12,50	m	12,50
TOTAL						m	12,50

FOTOGRAFÍA

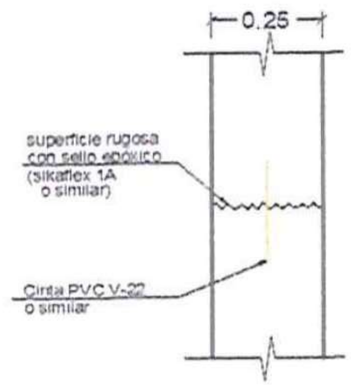

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	TAPA LAMINA ALFAJOR	2,10	1,80		3,78	m²	3,78
TOTAL						m²	3,78

FOTOGRAFÍA

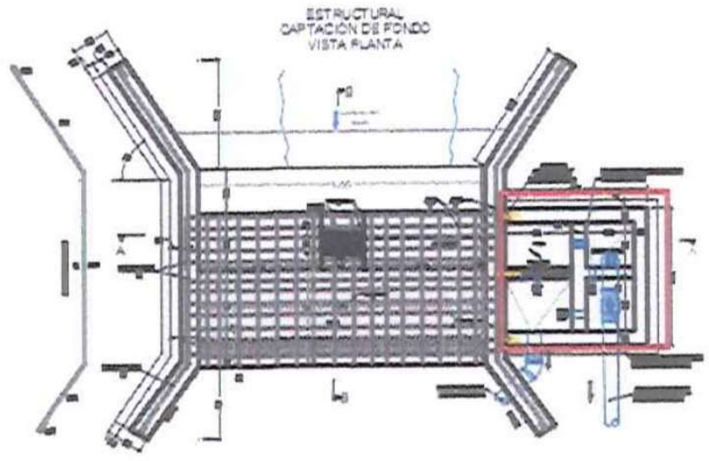

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	UNIDAD: Carga

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Factor			
2024-03-22	CEMENTO	100,00	600,00	0,15	15,00	Carga	15,00
2024-03-22	ARENA	210,00	600,00	0,15	31,50	Carga	31,50
2024-03-22	GRAVA	216,00	600,00	0,15	32,40	Carga	32,40
2024-03-22	RECEBO	5,00	600,00	0,15	0,75	Carga	0,75
2024-03-22	VARILLA	15,00	600,00	0,15	2,25	Carga	2,25
2024-03-22	CAMILLAS DE 1.40 X0.70	15,00	600,00	0,15	2,25	Carga	2,25
2024-03-22	PLANCHONES DE 3X2 M	10,00	600,00	0,15	1,50	Carga	1,50
2024-03-22	TABLAS 30 CM	5,00	600,00	0,15	0,75	Carga	0,75
2024-03-22	REPISAS DE 3MX8CM	2,00	600,00	0,15	0,30	Carga	0,30
2024-03-22	VARAS ROLLIZAS	10,00	600,00	0,15	1,50	Carga	1,50
TOTAL						Carga	89,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00		14,00	m²	14,00
TOTAL						m²	14,00

FOTOGRAFÍA

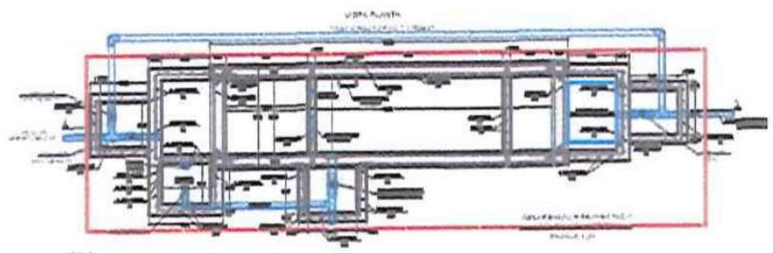

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00	1,00	14,00	m³	14,00
SUBTOTAL						m³	14,00
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	5,60

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00	1,00	14,00	m³	14,00
SUBTOTAL						m³	14,00
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	8,40

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	TANQUE DESARENADOR	3,50	2,00	0,30	2,10	m³	2,10
2024-03-22	PISO CAJA ENTRADA	0,84	0,84	1,00	0,71	m³	0,71
2024-03-22	PISO CAJA AQUIETAMIENTO	1,66	0,84	1,00	1,39	m³	1,39
2024-03-22	PISO ACCESO	1,00	1,20	1,00	1,20	m³	1,20
2024-03-22	PISO CAJA SALIDA	0,84	0,84	1,00	0,71	m³	0,71
SUBTOTAL						m³	6,11
TOTAL (EXPANSIÓN 30%)						m³	7,94

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	1,14	0,05	8,00	m²	8,00
TOTAL						m²	8,00

FOTOGRAFÍA

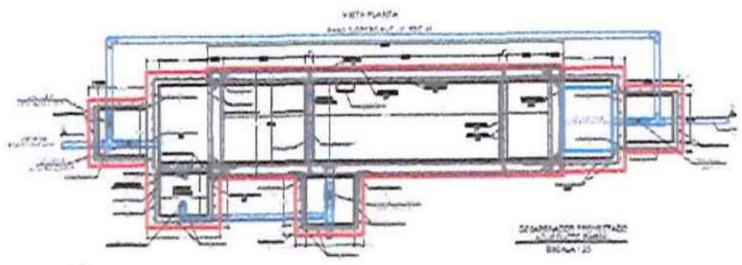

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	e	Alto			
2024-03-22	MUROS CAJA ENTRADA	2,04	0,15	0,60	0,18	m³	0,18
2024-03-22	MUROS CAJA AQUIETAMIENTO	4,05	0,15	0,60	0,36	m³	0,36
2024-03-22	MURO PPAL INTERNO CORTO	2,20	0,20	1,40	0,62	m³	0,62
2024-03-22	MURO PPAL INTERNO LARGO	6,40	0,20	1,80	2,30	m³	2,30
2024-03-22	MURO SALIDA	2,30	0,20	0,70	0,32	m³	0,32
2024-03-22	PANTALLA AQUITAMIENTO	1,60	0,10	1,05	0,17	m³	0,17
2024-03-22	CAJA DE LAVADO	2,04	0,15	0,70	0,21	m³	0,21
2024-03-22	MUROS CAJA SALIDA	2,04	0,15	0,70	0,21	m³	0,21
TOTAL						m³	4,39

FOTOGRAFÍA

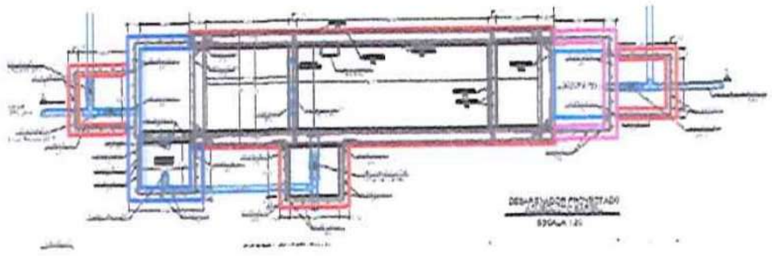

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	PISO CAJA ENTRADA	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
2024-03-22	PISO CAJA AQUIETAMIENTO	1,66	0,84	0,15	0,21	m³	0,21
2024-03-22	PISO TANQUE	3,50	1,10	0,15	0,58	m³	0,58
2024-03-22	PISO ACCESO	1,00	1,20	0,15	0,18	m³	0,18
2024-03-22	PISO CAJA VALV.LAVADO	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
2024-03-22	PISO CAJA SALIDA	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
TOTAL						m³	1,28

FOTOGRAFÍA

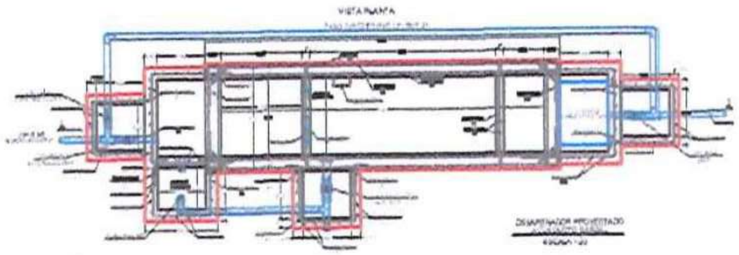

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	PLACA SUPERIOR	1,50	0,80	0,07	0,08	m³	0,08
TOTAL						m³	0,08

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA

R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	1 (D=3/8")	10,00	1,80	0,56	10,06	Kg	10,06
2024-03-22	2 (D=3/8")	10,00	2,30	0,56	12,86	Kg	12,86
2024-03-22	3 (D=3/8")	9,00	2,35	0,56	11,82	Kg	11,82
2024-03-22	4 (D=3/8")	8,00	1,70	0,56	7,60	Kg	7,60
2024-03-22	5 (D=3/8")	8,00	2,90	0,56	12,97	Kg	12,97
2024-03-22	6 (D=3/8")	4,00	2,55	0,56	5,70	Kg	5,70
2024-03-22	6a (D=3/8")	4,00	2,75	0,56	6,15	Kg	6,15
2024-03-22	7 (D=3/8")	4,00	2,35	0,56	5,25	Kg	5,25
2024-03-22	7a (D=3/8")	4,00	1,40	0,56	3,13	Kg	3,13
2024-03-22	8 (D=3/8")	20,00	0,45	0,56	5,03	Kg	5,03
2024-03-22	9 (D=3/8")	5,00	1,90	0,56	5,31	Kg	5,31
2024-03-22	10 (D=1/2")	8,00	1,95	0,99	15,51	Kg	15,51
SUBTOTAL						Kg	101,40
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	103,42

FOTOGRAFÍA

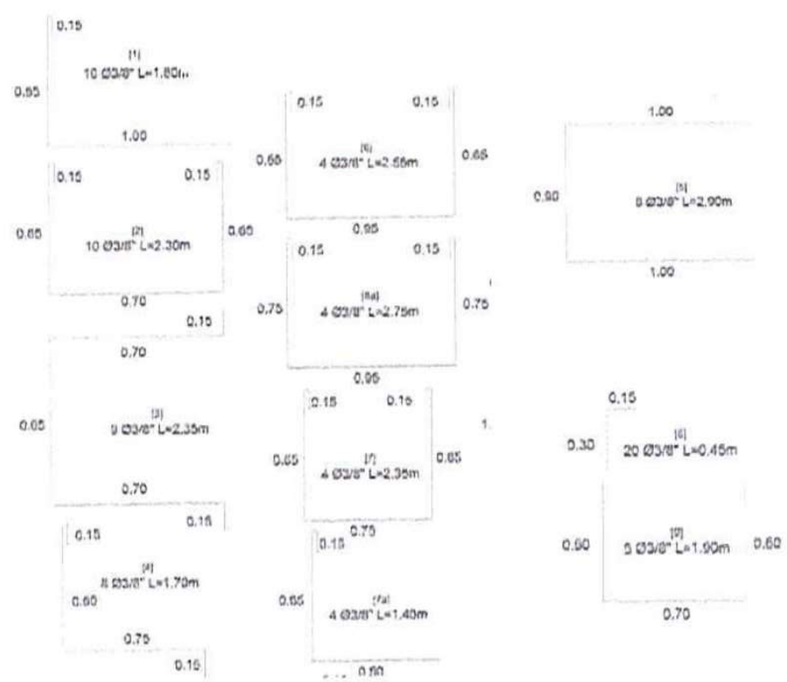

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	11 (D=1/2")	8,00	2,10	0,99	16,70	Kg	16,70
2024-03-22	12 (D=1/2")	28,00	1,40	0,99	38,96	Kg	38,96
2024-03-22	13 (D=1/2")	28,00	0,85	0,99	23,66	Kg	23,66
2024-03-22	14 (D=1/2")	4,00	3,90	0,99	15,51	Kg	15,51
2024-03-22	15 (D=1/2")	4,00	3,90	0,99	15,51	Kg	15,51
2024-03-22	16 (D=1/2")	34,00	1,40	0,99	47,31	Kg	47,31
2024-03-22	17 (D=1/2")	36,00	3,80	0,99	135,98	Kg	135,98
2024-03-22	18 (D=1/2")	36,00	2,50	0,99	89,46	Kg	89,46
2024-03-22	19 (D=1/2")	36,00	2,30	0,99	82,30	Kg	82,30
2024-03-22	20 (D=1/2")	14,00	1,30	0,56	10,17	Kg	10,17
2024-03-22	21 (D=3/8")	10,00	1,20	0,56	6,71	Kg	6,71
2024-03-22	22 (D=3/8")	5,00	2,00	0,56	5,59	Kg	5,59
SUBTOTAL						Kg	487,86
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	497,62

FOTOGRAFÍA

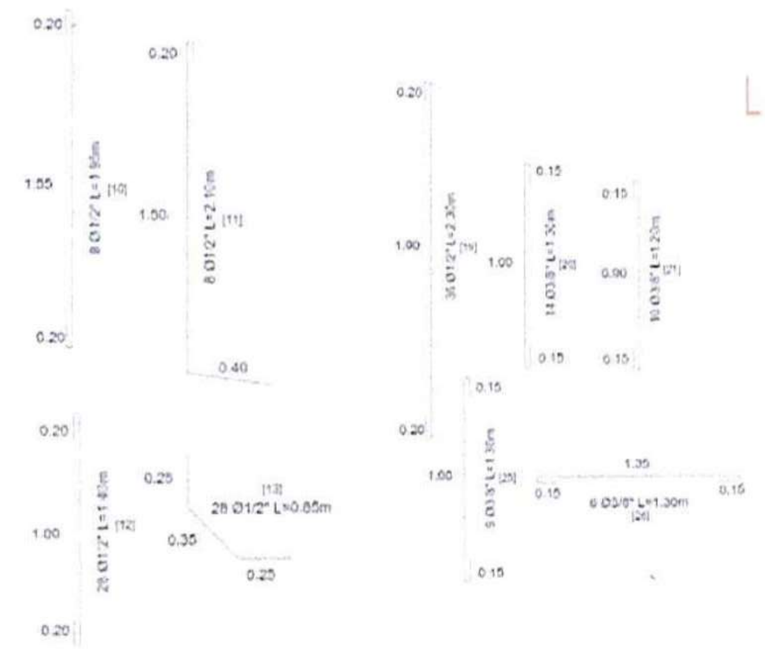

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	23 (D=3/8")	4,00	2,65	0,56	5,93	Kg	5,93
2024-03-22	24 (D=3/8")	5,00	1,45	0,56	4,05	Kg	4,05
2024-03-22	25 (D=3/8")	9,00	1,30	0,56	6,54	Kg	6,54
2024-03-22	26 (D=3/8")	6,00	1,30	0,56	4,36	Kg	4,36
SUBTOTAL						Kg	20,88
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	21,30

FOTOGRAFÍA

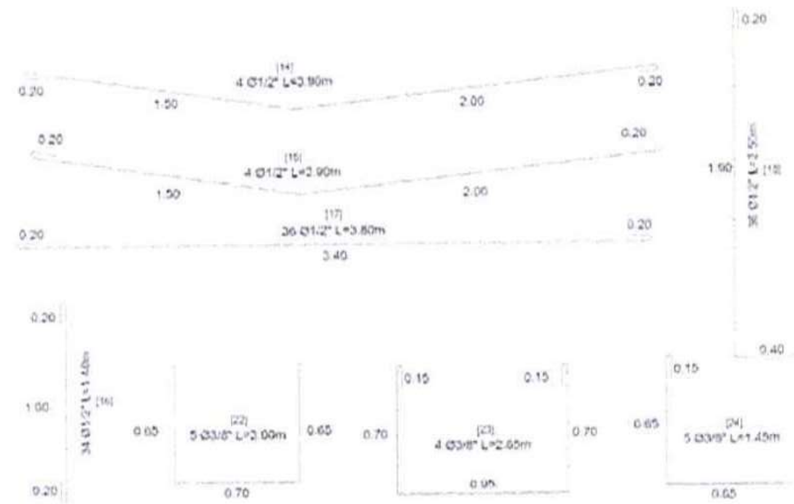

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	PASOS UÑA DE GATO				4,00	Un	4,00
TOTAL						Un	4,00

FOTOGRAFÍA

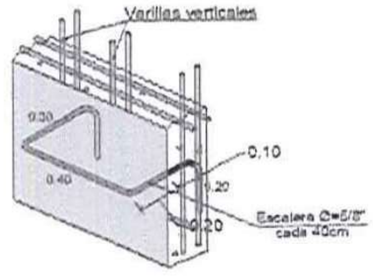

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BY PASS	8,00			8,00	m	8,00
2024-03-22	ENTRADA	0,70			0,70	m	0,70
2024-03-22	REBOSE	2,50			2,50	m	2,50
2024-03-22	SALIDA	0,70			0,70	m	0,70
2024-03-22	LAVADO	0,70			0,70	m	0,70
SUBTOTAL						m	12,60
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						m	12,85

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CINTA SIKA PVC V=0.22	9,40			9,40	m	9,40
TOTAL						m	9,40

FOTOGRAFÍA

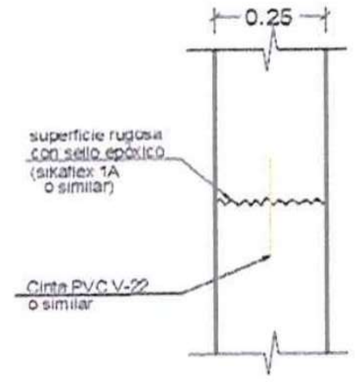

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CAJA ENTRADA	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
2024-03-22	INGRESO CAJA	0,80	1,66		1,32	m²	1,32
2024-03-22	TAPA AREA SEDIMENTACION	2,85	1,10		3,14	m²	3,14
2024-03-22	TAPA ACCESO	0,75	0,90		0,68	m²	0,68
2024-03-22	CAJA SALIDA	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
2024-03-22	CAJA LAVADO	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
TOTAL						m²	6,94

FOTOGRAFÍA

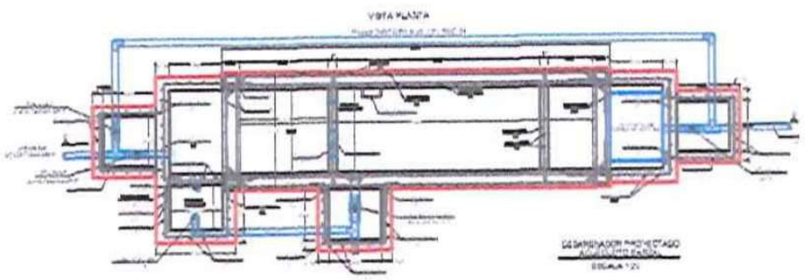

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	UNIDAD: Carga

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Factor			
2024-03-22	CEMENTO	50,00	300,00	0,08	3,75	Carga	3,75
2024-03-22	ARENA	60,00	300,00	0,08	4,50	Carga	4,50
2024-03-22	GRAVA	60,00	300,00	0,08	4,50	Carga	4,50
2024-03-22	RECEBO	5,00	300,00	0,08	0,38	Carga	0,38
2024-03-22	VARILLA	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
2024-03-22	VALVULA, ACCESORIOS	4,00	300,00	0,08	0,30	Carga	0,30
2024-03-22	TUBERIA	2,00	300,00	0,08	0,15	Carga	0,15
2024-03-22	CAMILLAS DE 1.40 X0.70	15,00	300,00	0,08	1,13	Carga	1,13
2024-03-22	PLANCHONES DE 3X2 M	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
2024-03-22	TABLAS 30 CM	5,00	300,00	0,08	0,38	Carga	0,38
	REPISAS DE 3MX8CM	5,00	300,00	0,08	0,38	Carga	0,38
	VARAS ROLLIZAS	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
TOTAL						Carga	18,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	6,00	6,00	1,00	36,00	m³	36,00
2024-03-22	CAJA ENTRADA	1,00	1,00	1,00	1,00	m³	1,00
2024-03-22	CAJA SALIDA	1,00	1,30	1,00	1,30	m³	1,30
SUBTOTAL						m³	38,30
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	15,32

FOTOGRAFÍA

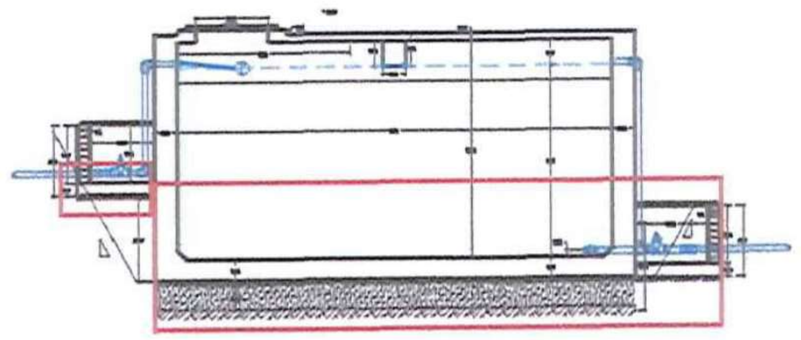

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	UNIDAD: m³
ÍTEM	3,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	6,00	6,00	1,00	36,00	m³	36,00
2024-03-22	CAJA ENTRADA	1,00	1,00	1,00	1,00	m³	1,00
2024-03-22	CAJA SALIDA	1,00	1,30	1,00	1,30	m³	1,30
SUBTOTAL						m³	38,30
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	22,98

FOTOGRAFÍA

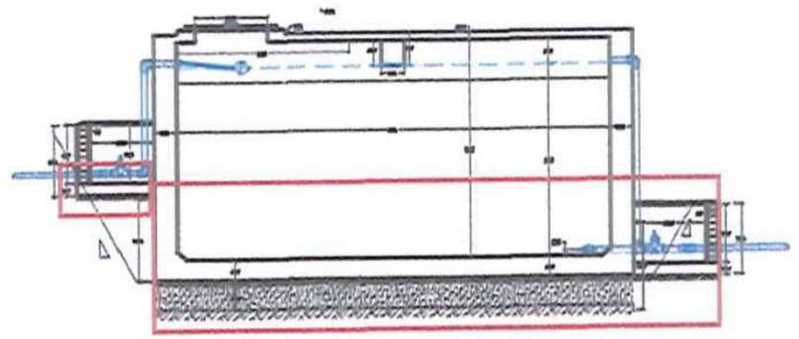

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	5,25	5,25	0,30	8,27	m³	8,27
2024-03-22	CAJA ENTRADA	0,80	0,85	0,50	0,34	m³	0,34
2024-03-22	CAJA SALIDA	0,95	1,30	0,30	0,37	m³	0,37
SUBTOTAL						m³	8,98
TOTAL (EXPANSIÓN 30%)						m³	11,67

FOTOGRAFÍA

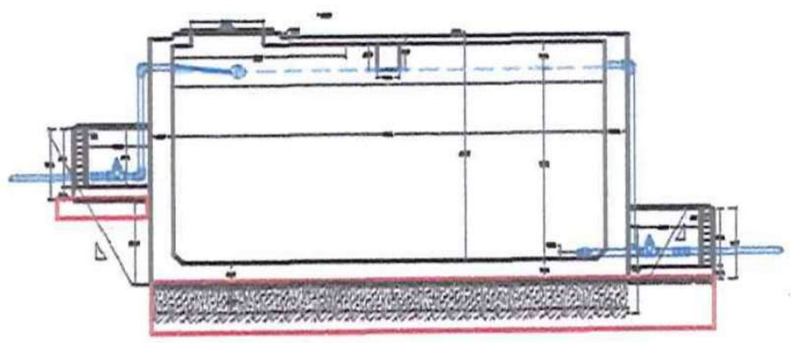

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	e	Alto			
2024-03-22	MUROS ESTRUCTURA	20,50	0,25	2,60	13,32	m³	13,32
2024-03-22	BISELES	0,40	0,05	2,60	0,05	m³	0,05
TOTAL						m³	13,37

FOTOGRAFÍA

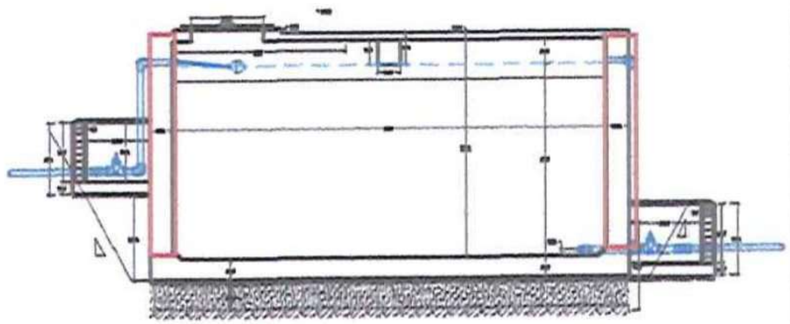

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	VIGA 1	4,75	0,25	0,30	0,36	m³	0,36
2024-03-22	VIGA 2	4,50	0,25	0,30	0,34	m³	0,34
2024-03-22	VIGUETA 1	4,50	0,10	0,15	0,07	m³	0,07
2024-03-22	VIGUETA 2	13,50	0,10	0,15	0,20	m³	0,20
2024-03-22	PLACA SUPERIOR	5,25	5,25	0,10	2,76	m³	2,76
2024-03-22	RESTA ACCESO TANQUE	-0,80	0,80	0,10	-0,06	m³	-0,06
TOTAL						m³	3,66

FOTOGRAFÍA

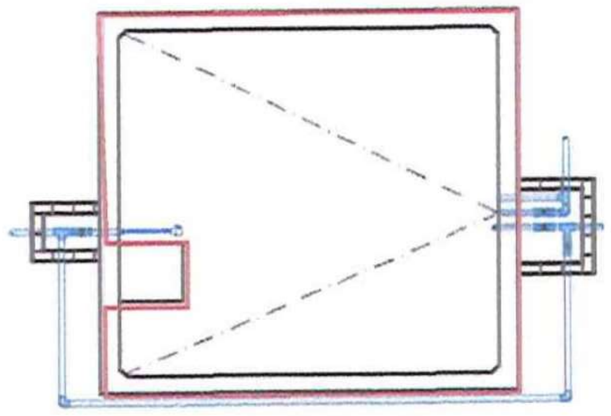

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	1 (D=1/2")	70,00	5,50	0,99	382,69	Kg	382,69
2024-03-22	2 (D=1/2")	70,00	5,50	0,99	382,69	Kg	382,69
2024-03-22	3 (D=3/8")	118,00	1,30	0,56	85,75	Kg	85,75
2024-03-22	4 (D=3/8")	15,00	0,50	0,56	4,19	Kg	4,19
2024-03-22	5 (D=3/8")	6,00	0,95	0,56	3,19	Kg	3,19
2024-03-22	6 (D=3/8")	6,00	1,00	0,56	3,35	Kg	3,35
2024-03-22	7 (D=3/8")	8,00	1,05	0,56	4,70	Kg	4,70
2024-03-22	8 (D=3/8")	6,00	1,50	0,56	5,03	Kg	5,03
2024-03-22	9 (D=1/2")	120,00	3,55	0,99	423,44	Kg	423,44
2024-03-22	10 (D=1/2")	120,00	3,10	0,99	369,77	Kg	369,77
2024-03-22	11 (D=1/2")	120,00	5,50	0,99	656,04	Kg	656,04
2024-03-22	12 (D=3/8")	30,00	1,30	0,56	21,80	Kg	21,80
SUBTOTAL						Kg	2342,64
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	2389,50

FOTOGRAFÍA

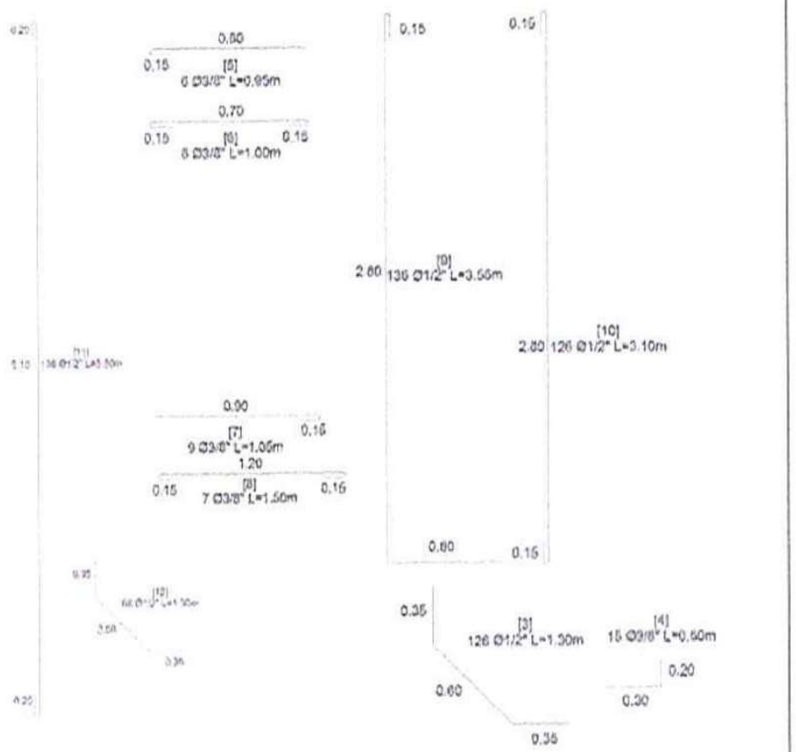

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-03-22	13 (D=3/8")	40,00	6,00	0,56	134,16	Kg	134,16
2024-03-22	14 (D=1/2")	12,00	5,50	0,99	65,60	Kg	65,60
2024-03-22	15 (D=3/8")	80,00	1,10	0,56	49,19	Kg	49,19
2024-03-22	16 (D=1/2")	6,00	5,50	0,99	32,80	Kg	32,80
2024-03-22	17 (D=1/2")	6,00	2,65	0,99	15,80	Kg	15,80
2024-03-22	18 (D=3/8")	150,00	0,35	0,56	29,35	Kg	29,35
2024-03-22	19 (D=3/8")	20,00	0,50	0,56	5,59	Kg	5,59
SUBTOTAL						Kg	332,50
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	339,15

FOTOGRAFÍA

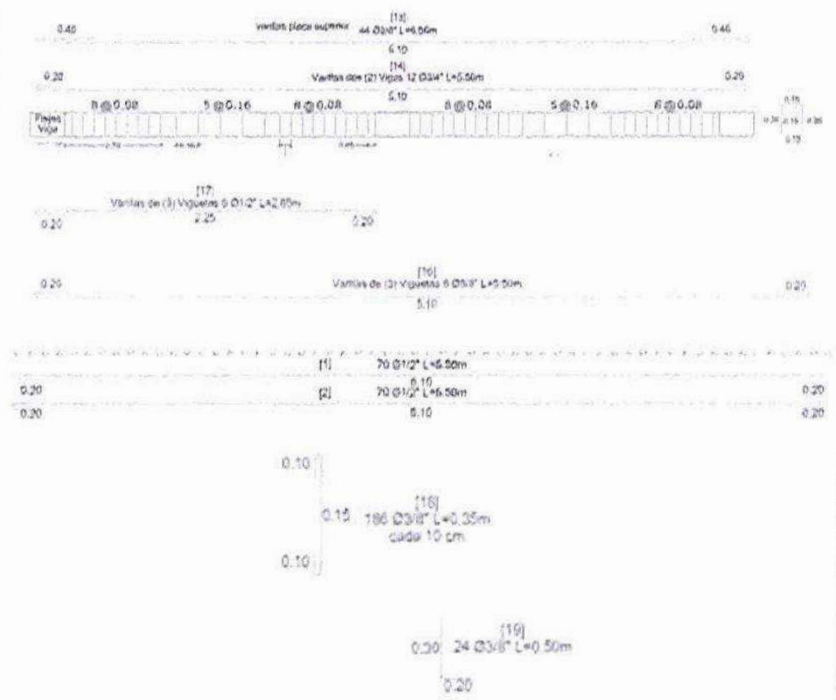

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	UNIDAD: Un
ÍTEM	3,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	PASOS UÑA DE GATO				5,00	Un	5,00
TOTAL						Un	5,00

FOTOGRAFÍA

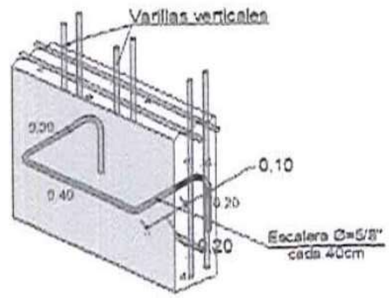

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA

R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BY PASS	10,00			10,00	m	10,00
2024-03-22	ENTRADA	2,00			2,00	m	2,00
2024-03-22	REBOSE	3,00			3,00	m	3,00
2024-03-22	SALIDA	3,00			3,00	m	3,00
2024-03-22	LAVADO	6,00			6,00	m	6,00
SUBTOTAL						m	24,00
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						m	24,48

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,20	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	UNIDAD m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CAJA ENTRADA	2,20		0,70	1,54	m²	1,54
2024-03-22	CAJA SALIDA	2,90		0,70	2,03	m²	2,03
SUBTOTAL						m²	3,57
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						m²	3,64

FOTOGRAFÍA

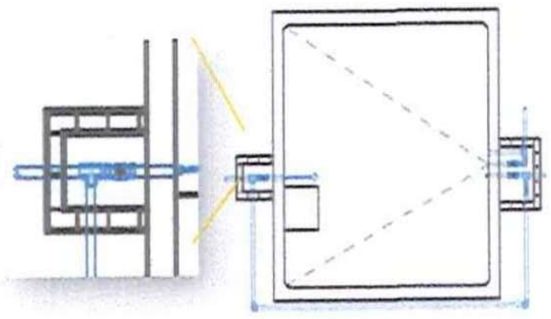

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	3	TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)	
ÍTEM	3,21	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	UNIDAD m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CAJA ENTRADA EXT	2,20		0,70	1,54	m²	1,54
2024-03-22	CAJA ENTRADA INT	1,90		0,70	1,33	m²	1,33
2024-03-22	CAJA SALIDA EXT	2,90		0,70	2,03	m²	2,03
2024-03-22	CAJA SALIDA INT	2,60		0,70	1,82	m²	1,82
SUBTOTAL						m²	6,72
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						m²	6,85

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	BOCATOMA - DESARENADOR	100,00			100,00	m	100,00
2024-03-22	DESARENADOR - PTAP	340,00			340,00	m	340,00
2024-03-22	PTAP - RED EXISTENTE	12,00			12,00	m	12,00
TOTAL						m	452,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	TUBERÍA	452.00	0,40	0,60	108,48	m³	108,48
SUBTOTAL						m³	108,48
TOTAL (MATERIAL COMÚN 70%, MATERIAL CONGLOMERADO 30%)						m³	75,94

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	TUBERÍA	452,00	0,40	0,60	108,48	m³	108,48
SUBTOTAL						m³	108,48
TOTAL (MATERIAL COMÚN 70%, MATERIAL CONGLOMERADO 30%)						m³	32,54

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	TUBERÍA	452,00			452,00	m	452,00
TOTAL						m	452,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA SÁBANA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (Balance del contrato) - 001	

SOPORTE ACTA MAYORES Y MENORES No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	UNIDAD: m3

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	e	Alto			
2024-03-22	MATERIAL COMÚN	316,40	0,40	0,40	50,62	m3	50,62
2024-03-22	MATERIAL CONGLOMERADO	135,60	0,40	0,40	21,70	m3	21,70
TOTAL						m3	72,32

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 001

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 1

En el Municipio de Aquitania Boyacá, , a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Aquitania, en calidad de Supervisor y el Ing. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, identificado con cédula de ciudadanía número 7.226.154 expedida en Duitama, en su calidad de representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 identificado con Nit 901.775.384-7, como contratista de obra y el Ing. ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.056.436.285 expedida en Pisba en su calidad de Interventor, a fin de suscribir la presente acta de recibo parcial, la cual se resume así:

FECHA	05/04/2024
PROCESO No.	MA-SAMC-012-2023
CONTRATO No.	011 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.”
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 R/L FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA C.C. 7.226.154 DE DUITAMA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.775.384-7
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($220.760.560,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Aquitania, cancelará al contratista, mediante actas pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
VALOR ANTICIPO	$0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE REINICIO	23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	14 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

A. ASPECTO TÉCNICO

Dentro del periodo comprendido entre los días 13 y 22 de diciembre de 2023 y los días 23 de febrero al 31 de marzo de 2024, se ejecutaron las actividades correspondientes a ítem 1.00 BOCATOMA Ancho=4.00m y 2.00 DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m) pactadas en la cláusula primera objeto del contrato, así como las obligaciones específicas descritas en la cláusula segunda del contrato en mención previa las siguientes consideraciones:

1. Que se ha suscrito el correspondiente CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA entre el MUNICIPIO DE AQUITANIA y el CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023, representado legalmente por el ingeniero FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, bajo el proceso de contratación MA-SAMC-012-2023.
2. Que el objeto del contrato en mención es: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.”
3. Que con fecha trece (13) de diciembre de 2023 se suscribió Acta de Inicio de actividades, debidamente firmada por las partes.
4. Que, por solicitud del contratista de obra, previa verificación por la interventoría y supervisión, se suscribe acta de suspensión el 22 de diciembre de 2023.
5. Que, una vez superadas las causales de suspensión, se procede a dar reinicio a la ejecución el 23 de febrero de 2024.
6. Que en la cláusula SEXTA - FORMA DE PAGO se pactó: EL MUNICIPIO pagará el valor del presente contrato así: “…mediante actas pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato…”.
7. En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto, el interventor aprueba y el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta.
8. Que no se realizó anticipo.
9. Se presentan los respectivos informes de obra, interventoría y supervisión y se anexa la sábana cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas, junto con las memorias de cantidades de obra que soportan la ejecución y verificación.

B. ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$220.760.560,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 99.792.553,41
VALOR DEL ANTICIPO	$0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL CONTRATO INICIAL	45,20%

ACTA No	FECHA	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13/12/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023	Aprobación acta de suspensión de obra
ACTA DE COMITÉ 03	07/02/2024	Exposición estado de contrato de obra e interventoría con la nueva administración
ACTA DE COMITÉ 04	22/02/2024	Aprobación acta de reinicio de obra
ACTA DE COMITÉ 05	03/03/2024	Discusión del primer balance de obra y documento s de adición de valor de obra.
ACTA DE COMITÉ 06	18/03/2024	Estudio de balance de obra
ACTA DE COMITÉ 07	28/03/2024	Aprobación balance de obra acata de mayores y menores cantidades de obra
ACTA DE COMITÉ 08	02/04/2024	Verificación de ejecución y solicitud de cuenta acta parcial 1.

D. INFORMACIÓN DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO Y AVANCE

— AVANCE EN PLAZO: UN (1) MES DIECISÉIS (16) DÍAS
— PLAZO FALTANTE: UN (1) MES CATORCE (14) DÍAS
— AVANCE PROGRAMADA: 52%
— AVANCE EJECUTADA: 45.20%
— NUEVA FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: 14 DE MAYO
— VALOR INICIAL DEL CONTRATO $220.760.560,00 C/MTE.
— VALOR ADICIONADO AL CONTRATO: $0,00 C/MTE.
— VALOR FINAL DEL CONTRATO: $220.760.560,00 C/MTE.

E. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y GARANTÍAS	
GARANTÍAS	PÓLIZA CUMPLIMIENTO NO. 51-44101025473 PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 51-40101008654
APROBACIÓN DE PÓLIZA	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS No 006 DE 2024
ESTAMPILLA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (4%) ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2.5%) TASA PRO-DEPORTE (2%) INDUSTRIA Y COMERCIO (1%)

	FONDO DE SEGURIDAD (5%) ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%)
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	APORTES EN LÍNEA PLANILLA No 9464486407 APORTES EN LÍNEA PLANILLA No 9464407719 PARAFISCALES: CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) ICBF (3%) SENA (2%)

F. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CÓDIGO(S) PRESUPUESTAL(ES)	VALOR
2023000301	10/07/2023

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR DE: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 41/100 M/CTE. ($99.792.553,41)

NOTA: EL DESEMBOLSO AUTORIZADO NO ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Ing. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. ANDRÉS FELIPE RUIZ PIDIACHE
INTERVENTOR

Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de Servicios Públicos
SUPERVISOR

SÁBANA Y MEMORIAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ

NIT. 800.077.545-5

SÁBANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATO: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
R/L CONTRATISTA: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
INTERVENTOR: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.285 DE PISBA
SUPERVISOR: DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
VALOR INICIAL: $ 220.760.560,00
VALOR ADICIONAL: $ 0,00
VALOR TOTAL: $ 220.760.560,00

PLAZO INICIAL: 3,00 MESES
PRÓRROGA (S): 0,00 MESES
PLAZO TOTAL: 3,00 MESES
PLAZO EJECUTADO: 1,53 MESES
FECHA DE CONTRATO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO: 23 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 14 de mayo de 2024

FECHA: 10 de abril de 2024

ACTA PARCIAL: X
ACTA FINAL:
ACTA No.: 001
PERIODO: DIC 2023 - MAR 2024

										% OBRA EJECT.	45,20%		% TIEMPO	51,11%			
CONDICIONES ORIGINALES								OBRA EJECUTADA									
								MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO			
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1,00		**BOCATOMA Ancho=4.00m**				**$ 42.383.127,91**			**$ 2.253.349,36**		**$ 44.636.477,28**		**$ 0,00**		**$ 44.636.477,28**		
1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	60,17	$ 8.003,49	$ 481.570,07	-	-10,97	-$ 87.798,30	49,20	$ 393.771,77	0,00	$ 0,00	49,20	$ 393.771,77		
1,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	7,22	$ 61.964,68	$ 447.384,98	+	1,88	$ 116.493,60	9,10	$ 563.878,57	0,00	$ 0,00	9,10	$ 563.878,57		
1,03	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	10,83	$ 88.045,56	$ 953.533,47	+	2,82	$ 248.288,49	13,65	$ 1.201.821,96	0,00	$ 0,00	13,65	$ 1.201.821,96		
1,04	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	m³	11,82	$ 546.376,48	$ 6.458.169,95	-	-0,43	-$ 236.296,90	11,39	$ 6.221.873,06	0,00	$ 0,00	11,39	$ 6.221.873,06		
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m²	4,49	$ 34.570,50	$ 155.221,54	-	0,00	-$ 69,14	4,49	$ 155.152,40	0,00	$ 0,00	4,49	$ 155.152,40		
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	10,03	$ 1.244.007,89	$ 12.477.399,11	+	0,33	$ 404.302,56	10,36	$ 12.881.701,68	0,00	$ 0,00	10,36	$ 12.881.701,68		
1,07	2,07,05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	2,50	$ 1.166.151,66	$ 2.915.379,14	-	-0,09	-$ 108.452,10	2,41	$ 2.806.927,04	0,00	$ 0,00	2,41	$ 2.806.927,04		
1,08	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27	$ 6.990,92	$ 7.775.786,82	+	0,00	$ 2,32	1.112,27	$ 7.775.789,14	0,00	$ 0,00	1.112,27	$ 7.775.789,14		
1,09	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00	$ 328.029,43	$ 328.029,43		0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.029,43	0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.029,43		
1,10	3.13.12	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30	$ 76.520,55	$ 1.017.723,33	-	-0,80	-$ 61.216,44	12,50	$ 956.506,89	0,00	$ 0,00	12,50	$ 956.506,89		
1,11	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	1,00	$ 1.042.345,09	$ 1.042.345,09		0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.042.345,09	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.042.345,09		
1,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18	0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18		
1,13	2.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	3,00	$ 99.265,84	$ 297.797,52		0,00	$ 0,00	3,00	$ 297.797,52	0,00	$ 0,00	3,00	$ 297.797,52		
1,14	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00	$ 18.102,28	$ 54.306,84		0,00	$ 0,00	3,00	$ 54.306,84	0,00	$ 0,00	3,00	$ 54.306,84		
1,15	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,82	$ 234.231,42	$ 894.764,02	-	-0,04	-$ 9.369,26	3,78	$ 885.394,76	0,00	$ 0,00	3,78	$ 885.394,76		
1,16	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00	$ 94.641,17	$ 6.435.599,42	+	21,00	$ 1.987.464,53	89,00	$ 8.423.063,95	0,00	$ 0,00	89,00	$ 8.423.063,95		
2,00		**DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)**				**$ 22.540.406,58**			**$ 1.554.952,19**		**$ 24.095.358,77**		**$ 0,00**		**$ 24.095.358,77**		
2,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	12,26	$ 8.003,49	$ 98.122,80	+	1,74	$ 13.926,07	14,00	$ 112.048,88	0,00	$ 0,00	14,00	$ 112.048,88		
2,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	8,03	$ 61.964,68	$ 497.576,37	-	-2,43	-$ 150.574,17	5,60	$ 347.002,20	0,00	$ 0,00	5,60	$ 347.002,20		
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,05	$ 88.045,56	$ 1.060.949,06	-	-3,65	-$ 321.366,31	8,40	$ 739.582,74	0,00	$ 0,00	8,40	$ 739.582,74		
2,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	3,03	$ 73.629,12	$ 223.096,25	+	4,91	$ 361.318,73	7,94	$ 584.414,98	0,00	$ 0,00	7,94	$ 584.414,98		
2,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76	$ 34.570,50	$ 268.267,07	+	0,24	$ 8.186,29	8,00	$ 276.453,36	0,00	$ 0,00	8,00	$ 276.453,36		
2,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51	$ 1.244.007,89	$ 4.366.467,69	+	0,88	$ 1.090.372,91	4,39	$ 5.456.840,60	0,00	$ 0,00	4,39	$ 5.456.840,60		
2,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,16	$ 1.166.151,66	$ 1.352.735,92	+	0,12	$ 144.812,71	1,28	$ 1.497.548,64	0,00	$ 0,00	1,28	$ 1.497.548,64		
2,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09	$ 1.081.143,33	$ 97.302,90	-	-0,01	-$ 6.486,86	0,08	$ 90.816,04	0,00	$ 0,00	0,08	$ 90.816,04		
2,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34	$ 6.990,92	$ 4.350.727,04	+	0,00	$ 5,31	622,34	$ 4.350.732,35	0,00	$ 0,00	622,34	$ 4.350.732,35		

CONDICIONES ORIGINALES								OBRA EJECUTADA							
								MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00	$ 11.074,41	$ 55.372,06	-	-1,00	-$ 11.074,41	4,00	$ 44.297,65	0,00	$ 0,00	4,00	$ 44.297,65
2,11	2.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	12,44	$ 37.023,20	$ 460.568,58	+	0,41	$ 15.253,56	12,85	$ 475.822,14	0,00	$ 0,00	12,85	$ 475.822,14
2,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
2,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00	$ 18.102,28	$ 72.409,12		0,00	$ 0,00	4,00	$ 72.409,12	0,00	$ 0,00	4,00	$ 72.409,12
2,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
2,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00	$ 143.702,70	$ 574.810,79		0,00	$ 0,00	4,00	$ 574.810,79	0,00	$ 0,00	4,00	$ 574.810,79
2,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08	0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
2,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00	$ 76.520,55	$ 688.684,96	+	0,40	$ 30.608,22	9,40	$ 719.293,18	0,00	$ 0,00	9,40	$ 719.293,18
2,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13	$ 234.231,42	$ 1.435.838,60	+	0,81	$ 190.687,80	6,94	$ 1.626.526,40	0,00	$ 0,00	6,94	$ 1.626.526,40
2,19	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00	$ 94.641,17	$ 1.514.258,69	+	2,00	$ 189.282,34	18,00	$ 1.703.541,02	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.703.541,02
3,00		**TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)**				**$ 71.380.939,82**			**-$ 71.380.939,82**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
3,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,56	$ 8.003,49	$ 220.576,22	-	-27,56	-$ 220.576,22	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	27,69	$ 61.964,68	$ 1.715.801,94	-	-27,69	-$ 1.715.801,94	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54	$ 88.045,56	$ 3.657.412,76	-	-41,54	-$ 3.657.412,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,06	$ 73.629,12	$ 887.967,24	-	-12,06	-$ 887.967,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,50	$ 34.570,50	$ 51.855,75	-	-1,50	-$ 51.855,75	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70	$ 1.244.007,89	$ 17.042.908,06	-	-13,70	-$ 17.042.908,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27	$ 1.166.151,66	$ 8.477.922,55	-	-7,27	-$ 8.477.922,55	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48	$ 1.081.143,33	$ 3.762.378,78	-	-3,48	-$ 3.762.378,78	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,29	$ 6.990,92	$ 22.184.205,76	-	-3.173,29	-$ 22.184.205,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00	$ 11.074,41	$ 77.520,89	-	-7,00	-$ 77.520,89	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	m	27,03	$ 69.541,38	$ 1.879.703,38	-	-27,03	-$ 1.879.703,38	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26	-	-2,00	-$ 1.091.878,26	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00	$ 18.102,28	$ 36.204,56	-	-2,00	-$ 36.204,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34	-	-4,00	-$ 4.169.380,34	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00	$ 143.702,70	$ 1.005.918,88	-	-7,00	-$ 1.005.918,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08	-	-3,00	-$ 161.960,08	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00	$ 76.520,55	$ 1.530.411,02	-	-20,00	-$ 1.530.411,02	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00	$ 57.147,29	$ 114.294,58	-	-2,00	-$ 114.294,58	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,19	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00	$ 142.981,63	$ 142.981,63	-	-1,00	-$ 142.981,63	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,20	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	m²	4,07	$ 80.418,85	$ 327.304,73	-	-4,07	-$ 327.304,73	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,21	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28	$ 30.731,27	$ 223.723,65	-	-7,28	-$ 223.723,65	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,22	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00	$ 1.370.879,15	$ 1.370.879,15	-	-1,00	-$ 1.370.879,15	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18	-	-1,00	-$ 648.117,18	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	2,56	$ 234.231,42	$ 599.632,43	-	-2,56	-$ 599.632,43	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,00		**RED DE ADUCCIÓN**				**$ 33.511.340,90**			**-$ 25.479.674,33**		**$ 8.031.666,57**		**$ 0,00**		**$ 8.031.666,57**
4,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	446,62	$ 1.019,83	$ 455.475,22	+	5,38	$ 5.486,67	452,00	$ 460.961,89	0,00	$ 0,00	452,00	$ 460.961,89
4,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	64,31	$ 61.964,68	$ 3.984.948,47	+	11,63	$ 720.401,35	75,94	$ 4.705.349,82	0,00	$ 0,00	75,94	$ 4.705.349,82
4,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	16,08	$ 88.045,56	$ 1.415.772,68	+	16,46	$ 1.449.582,18	32,54	$ 2.865.354,86	0,00	$ 0,00	32,54	$ 2.865.354,86
4,04	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	m	446,62	$ 40.432,03	$ 18.057.751,04	-	-446,62	-$ 18.057.751,04	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	80,39	$ 25.013,02	$ 2.010.796,74	-	-80,39	-$ 2.010.796,74	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00	$ 365.896,38	$ 1.463.585,51	-	-4,00	-$ 1.463.585,51	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00	$ 1.171.731,46	$ 2.343.462,91	-	-2,00	-$ 2.343.462,91	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
ITEM No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4,08	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00	$ 460.016,61	$ 2.880.099,68	-	-6,00	-$ 2.880.099,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,09	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84	$ 234.231,42	$ 899.448,65	-	-3,84	-$ 899.448,65	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		COSTOS DIRECTOS				$ 169.815.816,21					$ 76.763.502,62				$ 76.763.502,62
		A.I.U. = 30%				$ 50.944.744,56					$ 23.029.050,79				$ 23.029.050,79
		COSTO TOTAL				$ 220.760.559,77					$ 99.792.553,41				$ 99.792.553,41

VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 99.792.553,41
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 99.792.553,41

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 41/100 M/CT

CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023 - NIT 901.775.384-7
Ing. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA - CC 7.226.154 DE DUITAMA
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE - CC 1.056.436.265 DE PISBA
INTERVENTOR

Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de Servicios Públicos
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	BASE MAYOR	6,20	6,00		37,20	m²	37,20
2024-04-04	CAJA DE CONTROL	3,00	3,00		9,00	m²	9,00
2024-04-04	MURO DERECHO	2,00	1,00		2,00	m²	2,00
2024-04-04	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00		1,00	m²	1,00
TOTAL						m²	49,20

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	BASE MAYOR	6,00	5,00	0,50	15,00	m³	15,00
2024-04-04	CAJA DE CONTROL	2,50	2,50	1,00	6,25	m³	6,25
2024-04-04	MURO DERECHO	2,00	1,00	0,50	1,00	m³	1,00
2024-04-04	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00	0,50	0,50	m³	0,50
SUBTOTAL						m²	22,75
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	9,10

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	BASE MAYOR	6,00	5,00	0,50	15,00	m³	15,00
2024-04-04	CAJA DE CONTROL	2,50	2,50	1,00	6,25	m³	6,25
2024-04-04	MURO DERECHO	2,00	1,00	0,50	1,00	m³	1,00
2024-04-04	MURO IZQUIERDO	1,00	1,00	0,50	0,50	m³	0,50
SUBTOTAL						m³	22,75
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	13,65

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17,5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ENTRADA A LA BOCATOMA	4,12	0,40	0,20	0,33	m³	0,33
2024-04-04	MURO DERECHO	1,00	1,00	2,40	2,40	m³	2,40
2024-04-04	MURO IZQUIERDO	2,00	1,00	2,40	4,80	m³	4,80
2024-04-04	DIQUE	4,00	0,70	0,70	1,96	m³	1,96
SUBTOTAL						m³	9,49
TOTAL (EXPANSIÓN 20%)						m³	11,39

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	CAJA CONTROL DE CAUDAL	2,04	2,20	0,05	4,49	m²	4,49
TOTAL						m²	4,49

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Alto	Área			
2024-04-04	MURO DERECCHO	5,40		0,80	4,32	m³	4,32
2024-04-04	MURO IZQUIERDO	5,40		0,80	4,32	m³	4,32
2024-04-04	MUROS CAJA RECOLECCION EXTERNOS		1,10	1,15	1,27	m³	1,27
2024-04-04	MUROS INTERNOS		1,00	0,45	0,45	m³	0,45
TOTAL						m³	10,36

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ZARPA Y DIQUE	4,00	0,50	0,92	1,84	m³	1,84
2024-04-04	CAJA CONTROL DE CAUDAL	2,10	1,80	0,15	0,57	m³	0,57
TOTAL						m³	2,41

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-04-04	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	130,00	2,80	0,99	361,82	Kg	361,82
2024-04-04	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	5,90	0,99	87,97	Kg	87,97
2024-04-04	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	5,95	0,99	88,71	Kg	88,71
2024-04-04	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	6,45	0,99	96,17	Kg	96,17
2024-04-04	MURO DE CONTENCIÓN (D=1/2")	15,00	6,30	0,99	93,93	Kg	93,93
2024-04-04	DIQUE Y ZARPA (D=1/2")	38,00	1,20	0,99	45,33	Kg	45,33
2024-04-04	DIQUE Y ZARPA (D=1/2")	16,00	4,80	0,99	76,34	Kg	76,34
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	19,00	0,95	0,56	10,09	Kg	10,09
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	7,00	1,10	0,56	4,30	Kg	4,30
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	12,00	4,80	0,56	32,20	Kg	32,20
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	7,00	1,90	0,99	13,22	Kg	13,22
2024-04-04	PRESA (D=1/2")	12,00	2,35	0,99	28,03	Kg	28,03
SUBTOTAL						Kg	938,11
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	956,87

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	19,00	0,65	0,56	6,90	Kg	6,90
2024-04-04	PRESA (D=3/8")	4,00	2,30	0,56	5,14	Kg	5,14
2024-04-04	ANCLAJES CAJA (D=3/8")	20,00	0,40	0,56	4,47	Kg	4,47
2024-04-04	PLACA CAJA (D=3/8")	14,00	2,70	0,56	21,13	Kg	21,13
2024-04-04	PLACA CAJA (D=3/8")	14,00	2,10	0,56	16,43	Kg	16,43
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	53,00	1,55	0,56	45,92	Kg	45,92
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	7,00	1,10	0,56	4,30	Kg	4,30
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	8,00	5,70	0,56	25,49	Kg	25,49
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	7,00	1,90	0,56	7,43	Kg	7,43
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	5,00	1,15	0,56	3,21	Kg	3,21
2024-04-04	MUROS CAJA (D=3/8")	8,00	1,15	0,56	5,14	Kg	5,14
2024-04-04	GANCHOS MUROS (D=3/8")	39,00	0,31	0,56	6,76	Kg	6,76
SUBTOTAL						Kg	152,35
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	155,40

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,09	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	REJILLA BOCATOMA				1,00	Un	1,00
TOTAL						Un	1,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1.1	CINTA SIKA PVC V=0.22	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	CINTA SIKA PVC V=0.22	12,50			12,50	m	12,50
TOTAL						m	12,50

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	VALVULA H.F 3"				1,00	Un	1,00
TOTAL						Un	1,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACE	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	VALVULA H.F 3" DE PIE				1,00	Un	1,00
TOTAL						Un	1,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	3,00			3,00	m	3,00
TOTAL						m	3,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"				3,00	Un	3,00
TOTAL						Un	3,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	TAPA LAMINA ALFAJOR	2,10	1,80		3,78	m²	3,78
TOTAL						m²	3,78

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	1	BOCATOMA Ancho=4.00m	
ÍTEM	1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	UNIDAD: Carga

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Factor			
2024-04-04	CEMENTO	100,00	600,00	0,15	15,00	Carga	15,00
2024-04-04	ARENA	210,00	600,00	0,15	31,50	Carga	31,50
2024-04-04	GRAVA	216,00	600,00	0,15	32,40	Carga	32,40
2024-04-04	RECEBO	5,00	600,00	0,15	0,75	Carga	0,75
2024-04-04	VARILLA	15,00	600,00	0,15	2,25	Carga	2,25
2024-04-04	CAMILLAS DE 1.40 X0.70	15,00	600,00	0,15	2,25	Carga	2,25
2024-04-04	PLANCHONES DE 3X2 M	10,00	600,00	0,15	1,50	Carga	1,50
2024-04-04	TABLAS 30 CM	5,00	600,00	0,15	0,75	Carga	0,75
2024-04-04	REPISAS DE 3MX8CM	2,00	600,00	0,15	0,30	Carga	0,30
2024-04-04	VARAS ROLLIZAS	10,00	600,00	0,15	1,50	Carga	1,50
TOTAL						Carga	89,00

FOTOGRAFÍA





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00		14,00	m²	14,00
TOTAL						m²	14,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00	1,00	14,00	m³	14,00
SUBTOTAL						m³	14,00
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	5,60

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	2,00	1,00	14,00	m³	14,00
SUBTOTAL						m³	14,00
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	8,40

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	TANQUE DESARENADOR	3,50	2,00	0,30	2,10	m³	2,10
2024-04-04	PISO CAJA ENTRADA	0,84	0,84	1,00	0,71	m³	0,71
2024-04-04	PISO CAJA AQUIETAMIENTO	1,66	0,84	1,00	1,39	m³	1,39
2024-04-04	PISO ACCESO	1,00	1,20	1,00	1,20	m³	1,20
2024-04-04	PISO CAJA SALIDA	0,84	0,84	1,00	0,71	m³	0,71
SUBTOTAL						m³	6,11
TOTAL (EXPANSIÓN 30%)						m³	7,94

FOTOGRAFÍA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-03-22	ESTRUCTURA PRINCIPAL	7,00	1,14	0,05	8,00	m²	8,00
TOTAL						m²	8,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	e	Alto			
2024-04-04	MUROS CAJA ENTRADA	2,04	0,15	0,60	0,18	m³	0,18
2024-04-04	MUROS CAJA AQUIETAMIENTO	4,05	0,15	0,60	0,36	m³	0,36
2024-04-04	MURO PPAL INTERNO CORTO	2,20	0,20	1,40	0,62	m³	0,62
2024-04-04	MURO PPAL INTERNO LARGO	6,40	0,20	1,80	2,30	m³	2,30
2024-04-04	MURO SALIDA	2,30	0,20	0,70	0,32	m³	0,32
2024-04-04	PANTALLA AQUITAMIENTO	1,60	0,10	1,05	0,17	m³	0,17
2024-04-04	CAJA DE LAVADO	2,04	0,15	0,70	0,21	m³	0,21
2024-04-04	MUROS CAJA SALIDA	2,04	0,15	0,70	0,21	m³	0,21
TOTAL						m³	4,39

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UNIDAD m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	PISO CAJA ENTRADA	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
2024-04-04	PISO CAJA AQUIETAMIENTO	1,66	0,84	0,15	0,21	m³	0,21
2024-04-04	PISO TANQUE	3,50	1,10	0,15	0,58	m³	0,58
2024-04-04	PISO ACCESO	1,00	1,20	0,15	0,18	m³	0,18
2024-04-04	PISO CAJA VALV.LAVADO	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
2024-04-04	PISO CAJA SALIDA	0,84	0,84	0,15	0,11	m³	0,11
TOTAL						m³	1,28

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	PLACA SUPERIOR	1,50	0,80	0,07	0,08	m³	0,08
TOTAL						m³	0,08

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.8mx3.20m)	
ÍTEM	2.09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-04-04	1 (D=3/8")	10,00	1,80	0,56	10,06	Kg	10,06
2024-04-04	2 (D=3/8")	10,00	2,30	0,56	12,86	Kg	12,86
2024-04-04	3 (D=3/8")	9,00	2,35	0,56	11,82	Kg	11,82
2024-04-04	4 (D=3/8")	8,00	1,70	0,56	7,60	Kg	7,60
2024-04-04	5 (D=3/8")	8,00	2,90	0,56	12,97	Kg	12,97
2024-04-04	6 (D=3/8")	4,00	2,55	0,56	5,70	Kg	5,70
2024-04-04	6a (D=3/8")	4,00	2,75	0,56	6,15	Kg	6,15
2024-04-04	7 (D=3/8")	4,00	2,35	0,56	5,25	Kg	5,25
2024-04-04	7a (D=3/8")	4,00	1,40	0,56	3,13	Kg	3,13
2024-04-04	8 (D=3/8")	20,00	0,45	0,56	5,03	Kg	5,03
2024-04-04	9 (D=3/8")	5,00	1,90	0,56	5,31	Kg	5,31
2024-04-04	10 (D=1/2")	8,00	1,95	0,99	15,51	Kg	15,51
SUBTOTAL						Kg	101,40
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	103,42

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-04-04	11 (D=1/2")	8,00	2.10	0,99	16,70	Kg	16,70
2024-04-04	12 (D=1/2")	28,00	1,40	0,99	38,96	Kg	38,96
2024-04-04	13 (D=1/2")	28,00	0,85	0,99	23,66	Kg	23,66
2024-04-04	14 (D=1/2")	4,00	3,90	0,99	15,51	Kg	15,51
2024-04-04	15 (D=1/2")	4,00	3,90	0,99	15,51	Kg	15,51
2024-04-04	16 (D=1/2")	34,00	1,40	0,99	47,31	Kg	47,31
2024-04-04	17 (D=1/2")	36,00	3,80	0,99	135,98	Kg	135,98
2024-04-04	18 (D=1/2")	36,00	2,50	0,99	89,46	Kg	89,46
2024-04-04	19 (D=1/2")	36,00	2,30	0,99	82,30	Kg	82,30
2024-04-04	20 (D=1/2")	14,00	1,30	0,56	10,17	Kg	10,17
2024-04-04	21 (D=3/8")	10,00	1,20	0,56	6,71	Kg	6,71
2024-04-04	22 (D=3/8")	5,00	2,00	0,56	5,59	Kg	5,59
SUBTOTAL						Kg	487,86
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	497,62

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD: Kg

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Peso			
2024-04-04	23 (D=3/8")	4,00	2,65	0,56	5,93	Kg	5,93
2024-04-04	24 (D=3/8")	5,00	1,45	0,56	4,05	Kg	4,05
2024-04-04	25 (D=3/8")	9,00	1,30	0,56	6,54	Kg	6,54
2024-04-04	26 (D=3/8")	6,00	1,30	0,56	4,36	Kg	4,36
SUBTOTAL						Kg	20,88
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						Kg	21,30

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA


Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	PASOS UÑA DE GATO				4,00	Un	4,00
TOTAL						Un	4,00

FOTOGRAFÍA

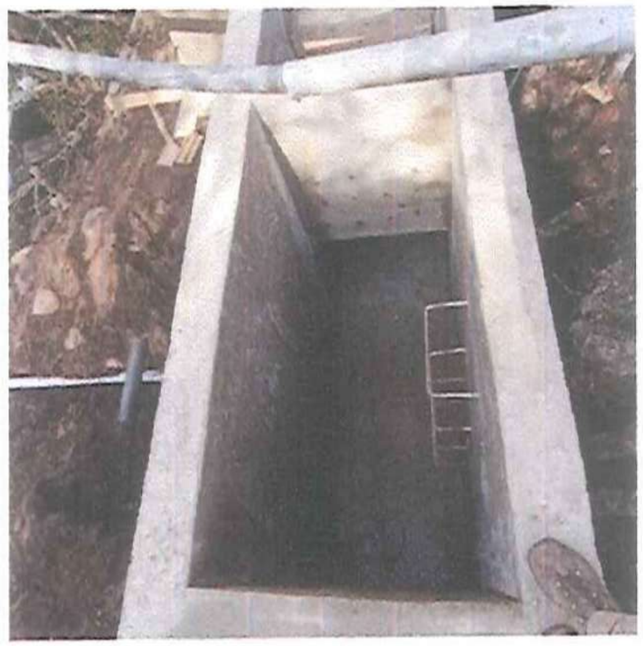

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	BY PASS	8,00			8,00	m	8,00
2024-04-04	ENTRADA	0,70			0,70	m	0,70
2024-04-04	REBOSE	2,50			2,50	m	2,50
2024-04-04	SALIDA	0,70			0,70	m	0,70
2024-04-04	LAVADO	0,70			0,70	m	0,70
SUBTOTAL						m	12,60
TOTAL (DESPERDICIO 2%)						m	12,85

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

EN GEOTECNIA VIAL
Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	PASAMURO				2,00	Un	2,00
TOTAL						Un	2,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,13	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"				4,00	Un	4,00
TOTAL						Un	4,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	VALVULA H.F 3"				4,00	Un	4,00
TOTAL						Un	4,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	CODO 3"				4,00	Un	4,00
TOTAL						Un	4,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,16	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	UNIDAD: Un

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	TEE 3"				3,00	Un	3,00
TOTAL						Un	3,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	CINTA SIKA PVC V=0.22	9,40			9,40	m	9,40
TOTAL						m	9,40

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	UNIDAD: m²

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	CAJA ENTRADA	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
2024-04-04	INGRESO CAJA	0,80	1,66		1,32	m²	1,32
2024-04-04	TAPA AREA SEDIMENTACION	2,85	1,10		3,14	m²	3,14
2024-04-04	TAPA ACCESO	0,75	0,90		0,68	m²	0,68
2024-04-04	CAJA SALIDA	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
2024-04-04	CAJA LAVADO	0,72	0,84		0,60	m²	0,60
TOTAL						m²	6,94

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	2	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
ÍTEM	2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	UNIDAD: Carga

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		No	Longitud	Factor			
2024-04-04	CEMENTO	50,00	300,00	0,08	3,75	Carga	3,75
2024-04-04	ARENA	60,00	300,00	0,08	4,50	Carga	4,50
2024-04-04	GRAVA	60,00	300,00	0,08	4,50	Carga	4,50
2024-04-04	RECEBO	5,00	300,00	0,08	0,38	Carga	0,38
2024-04-04	VARILLA	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
2024-04-04	VALVULA. ACCESORIOS	4,00	300,00	0,08	0,30	Carga	0,30
2024-04-04	TUBERIA	2,00	300,00	0,08	0,15	Carga	0,15
2024-04-04	CAMILLAS DE 1.40 X0.70	15,00	300,00	0,08	1,13	Carga	1,13
2024-04-04	PLANCHONES DE 3X2 M	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
2024-04-04	TABLAS 30 CM	5,00	300,00	0,08	0,38	Carga	0,38
	REPISAS DE 3MX8CM	5,00	300,00	0,08	0,36	Carga	0,36
	VARAS ROLLIZAS	10,00	300,00	0,08	0,75	Carga	0,75
TOTAL						Carga	18,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	UNIDAD: m

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	BOCATOMA - DESARENADOR	100,00			100,00	m	100,00
2024-04-04	DESARENADOR - PTAP	340,00			340,00	m	340,00
2024-04-04	PTAP - RED EXISTENTE	12,00			12,00	m	12,00
TOTAL						m	452,00

FOTOGRAFÍA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	TUBERÍA	452,00	0,40	0,60	108,48	m³	108,48
SUBTOTAL						m³	108,48
TOTAL (MATERIAL COMÚN 70%, MATERIAL CONGLOMERADO 30%)						m³	75,94

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ NIT. 800.077.545-5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL	

SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No.	001	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1. DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATO No.	CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 011 DE 2023	INTERVENTOR	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023	SUPERVISOR	DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
CAPÍTULO	4	RED DE ADUCCIÓN	
ÍTEM	4,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD: m³

FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2024-04-04	ESTRUCTURA PRINCIPAL	452,00	0,40	0,60	108,48	m³	108,48
SUBTOTAL						m³	108,48
TOTAL (MATERIAL COMÚN 40%, MATERIAL CONGLOMERADO 60%)						m³	32,54

FOTOGRAFÍA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
R/L CONTRATISTA DE OBRA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
R/L INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 0.11 de 2023

LUGAR Y FECHA: Aquitania, Boyacá, 10 del mes de Abril de 2024.

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA "

Se Procedió Con Los Siguientes Resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO	N° 011 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	800.077.545-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
NIT	901.775.384-7
REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C. No.	C.C. 7.226.154 DE DUITAMA
DIRECCIÓN:	Carrera 8 No. 16-61 Oficina 201 Tunja
CELULAR:	3112445992
E-MAIL:	administracion@maraltda.com
OBJETO:	“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.”
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($220.760.560,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE: TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MA-SAMC-012-2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000465 de fecha 24/11/2023
FIRMA ACTA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1.	22 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	23 DE FEBRERO DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE MAYO DE 2024

A. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe No 1 con fecha de

radicación el día 10 del mes de abril de 2024; el cual soporta actividades entre el 13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024 el cual contiene:

- Registro fotográfico.
- Bitácoras de obra
- Cronograma
- Ensayos de laboratorio
- Certificación y planilla pagos parafiscales (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, SENA e ICBF)

En el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

B. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** Acta de recibo parcial de obra el cual tiene como objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATOLAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA" **No. 011 DE 2023.**

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE OBRA No. 011 DE 2023, de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato en mención, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS y acompañamiento constante en la realización de las siguientes actividades:

BOCATOMA Ancho=4.00m

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES
- SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)
- CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS
- CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
- CINTA SIKA PVC V=0.22
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO,

TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6” RDE 26 UNIÓN MECÁNICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO
- TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM

DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
- BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
- SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)
- CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS
- CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
- CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS
- SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
- PASOS UÑA DE GATO D=5/8"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3” RDE 26 UNIÓN MECÁNICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.
- CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"
- CINTA SIKA PVC. V=0.22
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO
- TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM

RED DE ADUCCIÓN

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1,00	BOCATOMA Ancho=4.00m	
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS).	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de las estructuras, incluyendo la bocatoma y la caja de control de caudal, asegurando así la precisión en la ejecución de las obras.
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla.
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES.	Se lleva a cabo la preparación y colocación de una mezcla de concreto especial que contiene agregados gruesos dispuestos de manera irregular, con el objetivo de proporcionar una base resistente y duradera. Para los muros de protección de la bocatoma, el dique y la base de esta.
1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI).	Una vez que la excavación ha sido completada y el piso ha sido mejorado mediante el proceso de recebo, se procede a realizar el solado. El solado es crucial para proporcionar una base sólida y uniforme sobre la cual se puedan construir las estructuras.
1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	Se realiza la construcción de muros de la bocatoma y caja de control de caudal, caracterizado por su resistencia y su capacidad para resistir la penetración de agua.
1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA-(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.	Se lleva a cabo la construcción de la los de contrapiso de la bocatoma y caja de control.
1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA.	Se transporta el acero y se figura en el campamento de la obra, siguiendo el cuadro de aceros y especificaciones de los diseños.
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Se instala la rejilla especificada en los planos y diseños de la captación.
1,10	CINTA SIKA PVC V=0.22.	Según las especificaciones se instala para las juntas de los muros de la caja de control.
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Con el fin de controlar el caudal se instala una válvula en la caja de control de caudal, para tener un buen control.
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE	Se instala una válvula de pie para filtrar las impurezas, según especificaciones técnicas previas.

	EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI.	
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA.	Se instala tubería PVC para conexiones de la estructura y caudal de excesos.
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3".	Se instala los adaptadores de limpieza requeridos en la caja de control de caudal, para facilitar su mantenimiento.
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.	Suministro e instalación de las tapas requeridas para la caja de control, garantizando la calidad y componentes técnicos.
1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.	Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la bocatoma.
2,00	DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)	
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS).	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo de los componentes del desarenador.
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para el desarenador.
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO.	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.
2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO.	Para mejorar el suelo de cimentación se aplica una capa de afirmado según especificaciones técnicas.
2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI).	Luego del afirmado, se procede a la instalación del solado para completar el mejoramiento de la base de construcción del desarenador.
2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	Se realiza la mezcla específica para cumplir la resistencia requerida y se procede a instalar formaletas y fundir los muros de cada sección.
2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS.	Se vierten las placas sobre la base que ha sido previamente mejorada, asegurándose de cumplir con las especificaciones necesarias del concreto para alcanzar la resistencia requerida.
2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS.	Se instala la formaleta necesaria para la tapa de concreto según lo especificado en los planos del desarenador. Considerando los requisitos de concreto.
2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa.	Al igual que el acero de la bocatoma, se figura en el campamento de obra siguiendo la tabla de acero de los planos. Se instala a medida que se avanza en la construcción de cada componente.
2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8".	Una vez terminado el tanque del desarenador, se instalan los pasos de acero que servirán como acceso para su mantenimiento.

2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA.	Se instala la tubería necesaria para las conexiones de cada componente de la estructura, así como un bypass que permita su funcionamiento cuando la estructura esté en mantenimiento.
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER.	Con el objetivo de garantizar un tratamiento efectivo del agua y prevenir la filtración no deseada, se supervisa cuidadosamente la correcta instalación de los pasamuros. Durante esta supervisión, se asegura que los pasamuros sean instalados adecuadamente, permitiendo el transporte del agua de acuerdo con las consideraciones previamente diseñadas.
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3".	Se instala los adaptadores de limpieza para facilitar su mantenimiento.
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	Se instalan las válvulas definidas en los planos, con las que se garantiza la regulación del flujo en la estructura.
2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3".	Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3".	Se verifica la instalación de accesorios requeridos en la estructura.
2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22.	Según las especificaciones se instala para las juntas de la estructura.
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO.	Suministro e instalación de las tapas requeridas, garantizando la calidad y componentes técnicos.
2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM.	Se verifica el transporte y carga de los materiales necesarios para la construcción de la desarenador.
4,00	RED DE ADUCCIÓN	
4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS).	Se realiza La revisión de las carteras y planos relacionados con el proyecto para obtener una comprensión completa de las especificaciones y ubicaciones previstas. Además del marcado físico de las ubicaciones identificadas, se realiza el replanteo para la ubicación de la red de aducción.
4,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	La excavación en material común incluye la remoción de tierra, arena y arcilla en el área requerida para la instalación de la tubería.
4,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO.	La excavación en material conglomerado se trata de material consolidado y robustos, como rocas o gravas, se utilizan herramientas resistentes para su remoción.

4. PERSONAL DE OBRA

PERSONAL	CANTIDAD
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Ayudante de Obra	3

5. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

EQUIPO	CANTIDAD
-	-
-	-

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ÍTEM	CONCEPTO	ÍTEM	CONCEPTO
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS). 	2,04	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO. 
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 	2,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI). 
1,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	2,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS. 

1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJÓN PARA BASES. 	2,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS. 
1,05	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI). 	2,08	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS. 
1,06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS. 	2,09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa. 
1,07	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA-(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS. 	2,10	PASOS UÑA DE GATO D=5/8". 

1,08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA. 	2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3” RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA. 
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. 	2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER. 
1,10	CINTA SIKA PVC V=0.22. 	2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3". 
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.	2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELÁSTICO, 250 PSI.

			
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. 	2,15	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3". 
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE. 26 UNIÓN MECÁNICA. 	2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3". 
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3". 	2,17	CINTA SIKA PVC. V=0.22. 

1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO. 	2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO. 
1,16	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM. 	2,19	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM. 
2,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS). 	4,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS). 
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	4,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.

			
2,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 	4,03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO. 

7. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE GENERAL		
	DEBE	**HABER**
Valor Inicial del Contrato	$ 220.760.559,77	
Valor adicional	-	-
Valor Total del Contrato	$ 220.760.559,77	-
Valor del Anticipo	-	-
Valor acta parcial 1	-	$ 99.792.553,41
Valor acta de recibo final	-	-
Valor sin ejecutar	-	$ 120.968.006,36
SUMAS IGUALES	$ 220.760.559,77	$ 220.760.559,77
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-	-

8. GARANTIAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		1	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento Del Contrato	22/11/2023	22/08/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	22/11/2023	22/02/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008654	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		1	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Predios Labores Y Operaciones	22/12/2023	22/02/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	22/12/2023	22/02/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	22/12/2023	22/02/2024	$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	12/09/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E	13/12/2023	15/03/2027	$22.076.056,00

Indemnizaciones Laborales			
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008654		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	2		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	14/03/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	14/03/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	14/03/2024	$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	51-44101025473		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	3		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	15/11/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	15/03/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.	51-40101008654		
FECHA DE EXPEDICIÓN	13/02/2024		
ANEXO	3		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	15/05/2024	$232.000.000,00

Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.		51-44101025473	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		4	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento Del Contrato	13/12/2023	15/11/2024	$44.152.112,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	13/12/2023	15/05/2027	$22.076.056,00
Estabilidad Y Calidad De La Obra	5 Años, 0 Meses Y 1 Día		$44.152.112,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO.		51-40101008654	
FECHA DE EXPEDICIÓN		13/02/2024	
ANEXO		2	
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
Predios Labores Y Operaciones	13/12/2023	15/05/2024	$232.000.000,00
Contratistas Y Subcontratistas	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00
Vehículos Propios Y No Propios	13/12/2023	15/05/2024	$116.000.000,00

9. **VALOR ACTA RECIBO PARCIAL:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 41/100 M/CTE. ($99.792.553,41)

10. **CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO**: Se recibe a satisfacción para el pago parcial 1. Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la

10. **CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO**: Se recibe a satisfacción para el pago parcial 1. Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA PARCIAL No 1** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de Servicios Públicos
SUPERVISOR
