INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 23-feb-23

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

PERIODO MES: Enero de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 23

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.:

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13/02/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Rodrigo Osorio Tovar		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Cindy Paola Torres Rojas		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27/02/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Baez Garcia		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 NIT.: 901.442.158-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA P ING RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.011.291.133,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 23 **DEL PERIODO** Enero de 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 23/02/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO [E]
Fecha firma: 24/02/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. CINDY PAOLA TORRES ROJAS
MAT. PROF.25202-288623 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 24/02/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
VoBo ING RICARDO BAEZ GARCIA
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES (E)
MAT. PROF. 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 23

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 23 ENERO

MI

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	457,70	$ 47.262.102,00	32,10	$ 3.314.646,00	$ 3.314.646,00
3	201.15	201.13		Remoción de Alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -	-	$ -	
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	18.650,20	$ 177.363.402,00	2.138,00	$ 20.332.380,00	$ 20.332.380,00
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	13.807,00	$ 133.927.900,00	-	$ -	$ -
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 358.553.404,00**			**$ 23.647.026,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	4.252,20	$ 595.945.830,00	529,20	$ 74.167.380,00	$ 74.167.380,00
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	2.391,00	$ 358.745.640,00	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 954.691.470,00**			**$ 74.167.380,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	4.499,00	$ 13.092.090,00	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	135.205,50	$ 248.778.120,00	16.220,50	$ 29.845.720,00	$ 29.845.720,00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	3.795,40	$ 2.770.831.770,00	(230,20)	$ (168.057.510,00)	$ (168.057.510,00)
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	6.416,10	$ 5.010.204.168,00	181,40	$ 141.651.632,00	$ 141.651.632,00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	4.021,50	$ 337.323.420,00	-	$ -	$ -
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	M3	$ 78.660,00	29,00	$ 2.281.140,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 8.382.510.708,00**			**$ 3.439.842,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	4.310,90	$ 111.781.637,00	2.138,50	$ 55.451.305,00	$ 55.451.305,00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	708,10	$ 30.951.051,00	374,70	$ 16.378.137,00	$ 16.378.137,00
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	57,60	$ 6.705.792,00	-	$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	894,40	$ 805.416.144,00	(261,80)	$ (235.753.518,00)	$ (235.753.518,00)
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	9,20	$ 6.127.844,00	4,60	$ 3.063.922,00	$ 3.063.922,00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	19,50	$ 11.247.990,00	13,70	$ 7.902.434,00	$ 7.902.434,00
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	213.730,10	$ 1.008.806.072,00	(5.576,20)	$ (26.319.664,00)	$ (26.319.664,00)
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$ -	$ -
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	207,50	$ 146.650.625,00	47,70	$ 33.711.975,00	$ 33.711.975,00
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	384,60	$ 57.228.480,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 2.184.915.635,00**			**-$ 145.565.409,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 23

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 23 ENERO

MI

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	136.572,54	$ 256.756.375,00	256,00	$ 481.280,00	$ 481.280,00
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	1.859,00	$ 15.466.880,00	-	$ -	$ -
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	15,00	$ 3.385.050,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 275.608.305,00**			**$ 481.280,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	40.685,85	$ 44.754.431,00	13.841,60	$ 13.841,60	$ 15.225.760,00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	217.293,70	$ 239.023.070,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 283.777.501,00**			**$ 15.225.760,00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	m2	$ 20.652,00	49.027,50	$ 1.012.515.930,00	5.574,40	$ 115.122.509,00	$ 115.122.509,00
55		2NP		DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 28.312,00	6.743,90	$ 190.933.297,00	553,00	$ 15.656.536,00	$ 15.656.536,00
56		3NP		ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	$ 140.191,00	623,45	$ 87.402.079,00	159,30	$ 22.332.426,00	$ 22.332.426,00
57		4NP		TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 56.236,00	188,00	$ 10.572.368,00	-	$ -	$ -
58		5NP		CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 3.650.344,00	8,00	$ 29.202.753,00	1,00	$ 3.650.344,00	$ 3.650.344,00
59		6NP		CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 2.005.686,00	-	$ -	-	$ -	$ -
60		7NP		CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 9.307.572,00	3,00	$ 27.922.716,00	-	$ -	$ -
61		8NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 72.233,00	-	$ -	-	$ -	$ -
62		9NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 144.855,00	2,00	$ 289.710,00	-	$ -	$ -
63		10NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 253.403,00	5,00	$ 1.267.015,00	-	$ -	$ -
64		11NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 435.056,00	1,00	$ 435.056,00	-	$ -	$ -
65		12NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 580.055,00	3,00	$ 1.740.165,00	-	$ -	$ -
66		13NP		Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3	$ 120.930,00	41,00	$ 4.958.130,00	-	$ -	$ -
67		14NP		Caja movistar (no incluye acero).	und	$ 3.189.052,00	12,00	$ 38.268.624,00	1,00	$ 3.189.052,00	$ 3.189.052,00
68		15NP		Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3	$ 1.174.250,00	13,80	$ 16.204.650,00	-	$ -	$ -
69		16NP		Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U	$ 62.068,00	22,00	$ 1.365.496,00	-	$ -	$ -
70		17NP		Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U	$ 58.608,00	102,00	$ 5.978.016,00	-	$ -	$ -
71		18NP		Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U	$ 6.553,00	-	$ -	-	$ -	$ -
72		19NP		Roceria	Ha	$ 3.670.347,00	0,20	$ 734.069,00	-	$ -	$ -
73		20NP		Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML	$ 223.900,00	-	$ -	-	$ -	$ -
74		21NP		Marca vial	M2	$ 37.357,00	491,72	$ 18.369.184,00	508,70	$ 19.003.506,00	$ 19.003.506,00
75		NP22		Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	Ml	$ 486.045,00	905,00	$ 439.870.725,00	-	$ -	$ -
76		NP23		Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3	$ 145.044,00	310,00	$ 44.963.640,00	-	$ -	$ -
77		NP24		CORTE DE PAVIMENTO	Ml	$ 8.413,00	2.866,20	$ 24.113.341,00	1.118,70	$ 9.411.623,00	$ 9.411.623,00
78		NP25		Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3	$ 150.977,00	1.282,00	$ 193.552.514,00	-	$ -	$ -
79		NP26		Suministro e instalación de Geocelda	M2	$ 49.211,00	-	$ -	-	$ -	$ -
80		NP27		MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2	$ 11.435,00	568,00	$ 6.495.080,00	460,50	$ 5.265.818,00	$ 5.265.818,00
81		NP28		CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U	$ 3.034.523,00	1,00	$ 3.034.523,00	-	$ -	$ -
82		NP29		JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta).	Ml	$ 492.574,00	-	$ -	-	$ -	$ -

MI

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
83		NP30		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 133.847,00	10,00	$ 1.338.470,00	-	$ -	$ -
84		NP31		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 291.653,00	18,00	$ 5.249.754,00	-	$ -	$ -
85		NP32		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 467.151,00	36,00	$ 16.817.436,00	-	$ -	$ -
86		NP33		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 869.286,00	22,00	$ 19.124.292,00	-	$ -	$ -
87		NP34		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.771.323,00	5,00	$ 8.856.615,00	-	$ -	$ -
88		NP35		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.991.653,00	5,00	$ 9.958.265,00	-	$ -	$ -
89		NP36		Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 2.301.571,00	1,00	$ 2.301.571,00	-	$ -	$ -
90		NP37		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN,)	Ml	$ 1.945.330,00	219,00	$ 426.027.270,00	7,00	$ 13.617.310,00	$ 13.617.310,00
91		NP38		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 3.258.506,00	78,00	$ 254.163.468,00	13,00	$ 42.360.578,00	$ 42.360.578,00
92		NP39		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml	$ 2.633.845,00	-	$ -	20,00	$ 52.676.900,00	$ 52.676.900,00
93		NP40		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 4.341.649,00	-	$ -	60,00	$ 260.498.940,00	$ 260.498.940,00
94		NP41		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 233.759,00	71,10	$ 16.620.265,00	-	$ -	$ -
95		NP42		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 285.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
96		NP43		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 477.422,00	273,20	$ 130.431.690,00	-	$ -	$ -
97		NP44		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 653.901,00	167,60	$ 109.593.808,00	-	$ -	$ -
98		NP45		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 782.650,00	44,90	$ 35.140.985,00	159,40	$ 124.754.410,00	$ 124.754.410,00
99		NP46		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.287.299,00	-	$ -	50,80	$ 65.394.789,00	$ 65.394.789,00
100		NP47		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.799.830,00	-	$ -	-	$ -	$ -
101		NP48		CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3	$ 463.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
102		NP49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	$ 11.286,00	4.654,60	$ 52.531.816,00	539,00	$ 6.083.154,00	$ 6.083.154,00
103		NP50		Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 14.708,00	561.540,60	$ 8.259.139.145,00	-	$ -	$ -
104		NP51		Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg	$ 261,00	-	$ -	-	$ -	$ -
105		NP52		Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 4.813,00	-	$ -	-	$ -	$ -
106		NP53		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml	$ 133.652,00	-	$ -	221,30	$ 29.577.188,00	$ 29.577.188,00
107		NP54		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml	$ 166.522,00	900,00	$ 149.869.800,00	-		
108		NP55		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 101.127,00	-	$ -	-		
109		NP56		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 140.469,00	335,50	$ 47.127.350,00	64,70	$ 9.088.344,00	$ 9.088.344,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 23

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 23 ENERO

MI

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
110		NP57		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 668.507,00	3,00	$ 2.005.521,00	-	$ -	$ -
111		NP58		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 885.223,00	4,00	$ 3.540.892,00	-	$ -	$ -
112		NP59		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 1.276.660,00	3,00	$ 3.829.980,00	-	$ -	$ -
113		NP60		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	MI	$ 823.467,00	4,70	$ 3.870.295,00	-	$ -	$ -
114		NP61		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI	$ 922.566,00	1,30	$ 1.199.336,00	-	$ -	$ -
115		NP62		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI	$ 1.054.743,00	4,50	$ 4.746.344,00	-	$ -	$ -
116		NP63		Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 1.976.220,00	3,00	$ 5.928.660,00	-	$ -	$ -
117		NP64		Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.448.193,00	1,00	$ 2.448.193,00	-	$ -	$ -
118		NP65		Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.960.214,00	3,00	$ 8.880.642,00	-	$ -	$ -
119		NP66		Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2	$ 81.846,00	569,40	$ 46.603.112,00	-	$ -	$ -
120		NP67		Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2	$ 64.723,00	-	$ -	-	$ -	$ -
121		NP68		Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2	$ 133.376,00	300,00	$ 40.012.799,30	-	$ -	$ -
122		NP69		Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	$ 126.896,00	450,00	$ 57.103.200,00	(40,00)	$ (5.075.840,00)	$ (5.075.840,00)
123		NP70		Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	$ 90.067,00	174,00	$ 15.671.658,00	-	$ -	$ -
124		NP71		Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	MI	$ 164.369,00	522,00	$ 85.800.618,00	-	$ -	$ -
125		NP72		Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	MI	$ 773.142,00	450,00	$ 347.913.900,00	-	$ -	$ -
126		NP73		Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	$ 34.405,00	2.259,20	$ 77.727.776,00	1.136,00	$ 39.084.080,00	$ 39.084.080,00
127		NP74		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	MI	$ 124.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -
128		NP75		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	MI	$ 93.889,00	-	$ -	129,20	$ 12.130.459,00	$ 12.130.459,00
129		NP76		Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 240.429,00	-	$ -	-	$ -	$ -
130		NP77		Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 268.568,00	-	$ -	-	$ -	$ -
131		NP78		Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3	$ 976.719,00	-	$ -	144,30	$ 140.940.552,00	$ 140.940.552,00
132		NP79		Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m	M2	$ 103.906,00	1.890,00	$ 196.382.340,00	(1.710,00)	$ (177.679.260,00)	$ (177.679.260,00)
133		NP80		Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	$ 201.929,00	-	$ -	-	$ -	$ -
134		NP81		Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U	$ 1.971.133,00	-	$ -	-	$ -	$ -
135		NP82		Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3	$ 1.066.482,00	-	$ -	-	$ -	$ -
136		NP83		Base Granular clase B	M3	$ 174.798,00	670,90	$ 117.271.978,00	221,30	$ 38.682.797,00	$ 38.682.797,00
Subtotal								**$ 12.725.418.325,30**			**$ 845.766.215,00**
								$ 25.165.475.348,30		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 817.162.094,00**

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003_PATIO BONITO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL	**$ 80.556.295,00**
VALOR BASICO GESTION SOCIAL	**$ 199.234.088,00**
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 193.801.219,00**
VALOR BASICO ACTA DE OBRA	**$ 1.290.753.696,00**

MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO

DIRECTOR DE OBRA

MP. 63202-109501 QND

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
2	Demolición de Estructuras		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
8.411,00	457,70	32,10	489,80


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+324	PR0+410	Derecho	86,00	1,80	0,10		15,48	Anden existente Instituto salesiano
2	PR0+640			8,00	0,83	0,10		0,66	Muros caja existente Telecom o Movistar zona verde
3	PR0+640			3,00	1,60	0,15		0,72	Muros caja existente Placa Caja Telecom o Movistar
4	PR0+000		Derecho	2,50	1,70	0,10		0,43	Demolición bajo puente peatonal acceso MERCAR
5	PR0+000		Derecho	4,00	1,50	0,07		0,42	
6	PR0+000		Derecho	6,00	1,90	0,07		0,80	
7	PZ5'	PZ6	Izquierdo	50,77	2,00	0,07		7,11	Demolición de pavimneto
8	PR0+510	PR0+486	Izquierdo	24,00	1,80	0,15		6,48	Esquina Colegio
9							0,00	0,00	
10							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
								0,00	
							TOTAL	**32,09**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	32,10 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**32,10 m3**
SALDO ÍTEM	**7.921,20 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

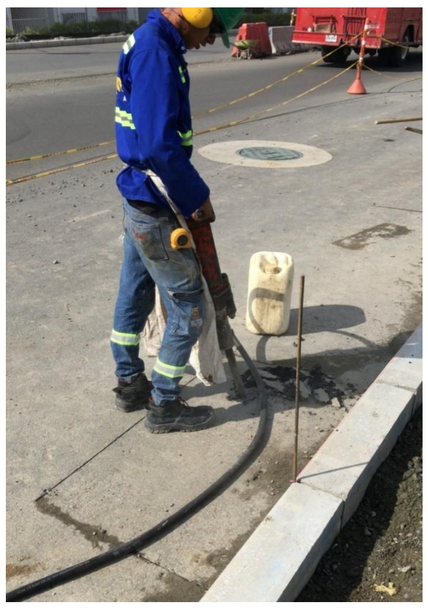



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
36.399,90	18.650,20	2.138,00	20.788,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	0+360		IZQUIERDO	0,00	3,63			0,00	VIA ARMENIA-MONTENEGRO SECCIONES EXCAVACION CARRIL DERECHO CALZADA IZQUIERDA
2	0+370		IZQUIERDO	10,00	3,6			36,15	
3	0+380		IZQUIERDO	10,00	3,66			36,30	
4	0+390		IZQUIERDO	10,00	3,63			36,45	
5	0+400		IZQUIERDO	10,00	3,65			36,40	
6	0+410		IZQUIERDO	10,00	3,58			36,15	
7	0+420		IZQUIERDO	10,00	3,65			36,15	
8	0+430		IZQUIERDO	10,00	3,52			35,85	
9	0+440		IZQUIERDO	10,00	3,6			35,60	
10	0+450		IZQUIERDO	10,00	3,61			36,05	
11	0+460		IZQUIERDO	10,00	3,53			35,70	
12	0+470		IZQUIERDO	10,00	3,43			34,80	
13	0+480		IZQUIERDO	10,00	3,44			34,35	
14	0+490		IZQUIERDO	10,00	3,53			34,85	
15	0+500		IZQUIERDO	10,00	3,86			36,95	
16	0+510		IZQUIERDO	10,00	4,28			40,70	
17	PR0+014	-	DERECHO		14,99				EXCAVACION SECTOR PATIO BONITO
18	PR0+021	-	DERECHO		33,04			171,23	
19	PR0+021	-	DERECHO		33,10				
20	PR0+028	-	DERECHO		46,83			264,97	
21	PR0+028	-	DERECHO		46,83				
22	PR0+035	-	DERECHO		30,08			256,88	
23	PR0+035	-	DERECHO		30,08				
24	PR0+041	-	DERECHO		37,57			228,32	
25	PR0+041	-	DERECHO		31,05				
26	PR0+048	-	DERECHO		44,03			262,78	
27	PR0+048	-	DERECHO		47,10				
28	PR0+055	-	DERECHO		28,50			254,02	
29	PR0+055	-	DERECHO		30,62				
30	PR0+062	-	DERECHO		15,90			157,47	
							TOTAL	**2138,11**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	2.138,00 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2.138,00 m3**
SALDO ÍTEM	**15.611,70 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
10	Subbase Granular clase A		m3


TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
45.906,00	4.252,20	529,20	4.781,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m2)	H		Total	OBSERVACIÓN
1	PR18+850	PR0+002	Izquierdo	170,70	1,10	0,15		28,17	Subbase cunetas
2	PR0+620	PR0+000	Izquierdo	50,77	1,10	0,30		16,75	Sbg relleno de brecha tub. 30" PZ5/6
3	PR0+360		Izquierdo	0,00			1,84	0,00	Vía Armenia-Montenegro Calzada Izquierda carril derecho.
4	PR0+370		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
5	PR0+380		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
6	PR0+390		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
7	PR0+400		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
8	PR0+410		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
9	PR0+420		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
10	PR0+430		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
11	PR0+440		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
12	PR0+450		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
13	PR0+460		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
14	PR0+470		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
15	PR0+480		Izquierdo	10,00			1,84	18,40	
16	PR0+490		Izquierdo	10,00			2,04	19,40	
17	PR0+500		Izquierdo	10,00			2,22	21,30	
18	PR0+510		Izquierdo	10,00			2,4	23,10	
20	PR0+125	PR0+125	Separador	5,70	0,37	0,30		0,63	MODULO 104 SECTOR PATIO BONITO
21	PR0+125	PR0+130	Separador	5,70	2,10	1,44		17,18	
22	PR0+130	PR0+130	Separador	5,70	2,10	1,44		17,24	MODULO 105 SECTOR PATIO BONITO
23	PR0+130	PR0+136	Separador	5,70	0,36	0,30		0,62	
24	PR0+136	PR0+136	Separador	5,70	0,37	0,30		0,63	MODULO 106 SECTOR PATIO BONITO
25	PR0+136	PR0+142	Separador	5,70	2,00	1,51		17,16	
26	PR0+142	PR0+142	Separador	5,70	0,35	0,30		0,60	MODULO 107 SECTOR PATIO BONITO
27	PR0+142	PR0+147	Separador	5,70	2,07	1,51		17,76	
28	PR0+147	PR0+147	Separador	5,70	0,38	0,30		0,65	MODULO 108 SECTOR PATIO BONITO
29	PR0+147	PR0+153	Separador	5,70	2,10	1,66		19,87	
30	PR0+153	PR0+153	Separador	5,70	0,39	0,30		0,67	MODULO 109 SECTOR PATIO BONITO
31	PR0+153	PR0+159	Separador	5,70	2,11	1,71		20,51	
32	PR0+159	PR0+159	Separador	5,70	0,36	0,30		0,62	MODULO 110 SECTOR PATIO BONITO
33	PR0+159	PR0+164	Separador	5,70	2,00	1,80		20,52	
34	PR0+164	PR0+164	Separador	5,70	0,36	0,30		0,62	MODULO 111 SECTOR PATIO BONITO
35	PR0+164	PR0+170	Separador	5,70	2,00	1,82		20,75	
36	PR0+170	PR0+170	Separador	5,70	0,39	0,30		0,67	MODULO 112 SECTOR PATIO BONITO
37	PR0+170	PR0+176	Separador	5,70	2,05	1,81		21,09	
38	PR0+176	PR0+176	Separador	5,70	0,40	0,30		0,68	MODULO 113 SECTOR PATIO BONITO
39	PR0+176	PR0+182	Separador	5,70	2,03	1,84		21,23	
							TOTAL	**529,19**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	529,20	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**529,20**	**m3**
SALDO ÍTEM	**41.124,60**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

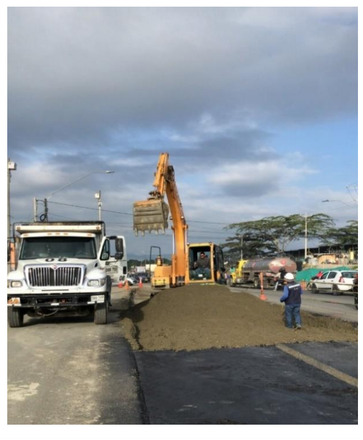REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO
 

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
14	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
201.031,00	135.205,50	16.220,50	151.426,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	-PR0+020	PR0+050	Derecho	70,00	3,80			266,00	Calzada derecha Carril Izquierdo Armenia Montenegro
2	-PR0+020	PR0+050	Izquierdo	70,00	4,20			294,00	Calzada Izquierda Carril Derecho Armenia-Montenegro
3	-PR0+020	PR0+050	Derecho	70,00	5,70			399,00	Calzada Derecha carril derecho Armenia-Montenegro
4	-PR0+020	PR0+050	Izquierdo	65,00	3,50			227,50	Calzada Izquierda Carril izquierdo Armenia-Montenegro
5	-PR0+020	PR0+050	Derecho	70,00	9,50			665,00	Calzada derecha Carril Izquierdo segunda capa Armenia-Montenegro
6	PR0+630	Incoprporación	Retorno	17,07	5,60			95,59	Carril de incorporación Armenia Montenegro
7	-PR0+020	PR0+050	Derecho	93,50	9,50			888,25	Calzada derecha tercera capa
8	-PR0+020	PR0+068	Izquierdo	67,50	7,70			519,75	Calzada Izquierda Carril Izquierdo y Derecho segunda capa Armenia-Montenegro
9	PR0+630	Incorporación	Retorno	17,05	5,58			95,14	Carril de incorporación derecho Armenia-Montenegro
10	PR0+000	PR0+020	Izquierdo	70,25	7,70			540,93	Rampa de acceso a barrio frente a estación de servicio
11	Barrio	PR0+005	Izquierdo	5,17	12,10			62,56	Rampa de incorporación barrio K0+005 Armenia-Montenegro
12	PR9+310	PR9+530	Derecho	220,00	6,40			1408,00	Montenegro Quimbaya
13	PR9+298	PR9+542	Izquierdo	244,00	4,20			1024,80	Montenegro Quimbaya 2 capa
14	PR9+298	PR9+542	Derecho	244,00	4,20			1024,80	Montenegro Quimbaya 2 capa
15	PR10+905	PR11+037	Derecho	132,00	8,10			1069,20	Montenegro Quimbaya
16	PR10+893	PR11+049	Derecho	154,00	10,40			1601,60	Montenegro Quimbaya
17	PR14+810	PR15+450	Derecho	640,00	8,71			5574,40	Cartago-Alcalá. Se aplican dos capas de emulsión en el proceso de instalación de geomalla, de acyerdo a especificación técnica.
18	PR12+200	PR12+560	Izquierdo	360,00	0,90			324,00	Cartago-Alcalá. Se aplican dos capas de emulsión en el proceso de instalación de geomalla, de acyerdo a especificación técnica.
19	PR11+810	PR11+950	Izquierdo	140,00	1,00			140,00	Cartago-Alcalá. Se aplican dos capas de emulsión en el proceso de instalación de geomalla, de acyerdo a especificación técnica.
							TOTAL	**16220,51**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	16.220,50	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**16.220,50**	**m2**
SALDO ÍTEM	**49.605,00**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
9.740,00	3.795,40	-230,20	3.565,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000		IZQUIERDO	0,00	0,28		0,00	0,00	
2	PR0+010		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,50	2,50	
3	PR0+020		IZQUIERDO	10,00	1,10		6,60	6,60	
4	PR0+030		IZQUIERDO	10,00	0,93		10,15	10,15	
5	PR0+040		IZQUIERDO	10,00	0,54		7,35	7,35	
6	PR0+050		IZQUIERDO	10,00	1,49		10,15	10,15	SECCIO0NES MEJORAMIENTO DE PERALTE ACCESO ALCALÁ
7	PR0+060		IZQUIERDO	10,00	1,86		16,75	16,75	
8	PR0+070		IZQUIERDO	10,00	1,45		16,55	16,55	
9	PR0+080		IZQUIERDO	10,00	1,39		14,20	14,20	
10	PR0+090		IZQUIERDO	10,00	1,58		14,85	14,85	
11	PR0+100		IZQUIERDO	10,00	0,92		12,50	12,50	
12	PR0+110		IZQUIERDO	10,00	0,30		6,10	6,10	
13	PR0+050		IZQUIERDO	10,00	0,26		0,00	0,00	
14	PR0+060		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
15	PR0+070		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
16	PR0+080		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
17	PR0+090		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
18	PR0+100		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
19	PR0+110		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
20	PR0+120		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
21	PR0+130		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
22	PR0+140		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
23	PR0+150		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
24	PR0+160		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
25	PR0+170		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
26	PR0+180		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
27	PR0+190		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
28	PR0+200		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO SEGUNDA CAPA VIA ARMENIA- MONTENEGRO
29	PR0+210		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
30	PR0+220		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
31	PR0+230		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
32	PR0+240		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
33	PR0+250		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
34	PR0+260		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
35	PR0+270		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
36	PR0+280		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
37	PR0+290		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
38	PR0+300		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
39	PR0+310		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
40	PR0+320		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
41	PR0+330		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
42	PR0+340		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	
43	PR0+350		IZQUIERDO	10,00	0,26		2,60	2,60	

44	PR0+360		IZQUIERDO	10,00	0,54		0,00	0,00	CALZADA IZQUIERDA CARRIL DERECHO SEGUNDA CAPA VIA ARMENIA- MONTENEGRO
45	PR0+370		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
46	PR0+380		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
47	PR0+390		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
48	PR0+400		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
49	PR0+410		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
50	PR0+420		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
51	PR0+430		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
52	PR0+440		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
53	PR0+450		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
54	PR0+460		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
55	PR0+470		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
56	PR0+480		IZQUIERDO	10,00	0,54		5,40	5,40	
57	PR0+490		IZQUIERDO	10,00	0,598		5,69	5,69	
58	PR0+500		IZQUIERDO	10,00	0,598		5,98	5,98	
59	PR0+510		IZQUIERDO	10,00	0,598		5,98	5,98	
60	PR0+360		IZQUIERDO	10,00	0,22		0,00	0,00	CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO SEGUNDA CAPA VIA ARMENIA- MONTENEGRO
61	PR0+370		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
62	PR0+380		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
63	PR0+390		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
64	PR0+400		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
65	PR0+410		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
66	PR0+420		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
67	PR0+430		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
68	PR0+440		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
69	PR0+450		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
70	PR0+460		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
71	PR0+470		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
72	PR0+480		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
73	PR0+490		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
74	PR0+500		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
75	PR0+510		IZQUIERDO	10,00	0,22		2,20	2,20	
76	PR0+050		IZQUIERDO	0,00	0,24		0,00	0,00	CALZADA IZQUIERDA CARRIL IZQUIERDO SEGUNDA CAPA VIA ARMENIA-MONTENEGRO
77	PR0+060		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
78	PR0+070		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
79	PR0+080		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
80	PR0+090		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
81	PR0+100		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
82	PR0+110		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
83	PR0+120		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
84	PR0+130		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
85	PR0+140		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
86	PR0+150		IZQUIERDO	10,00	0,24		2,40	2,40	
87	PR11+810	PR11+950	IZQUIERDO	140,00	0,80	0,17		-19,04	LLENADO DE CUNETAS MONTENEGRO QUIMBAYA
88	PR12+200	PR12+560	IZQUIERDO	360,00	0,90	0,15		-48,60	
89	PR12+330	PR12+390	DERECHO	60,00	0,90	0,15		-8,10	
90	PR12+970	PR13+100	DERECHO	130,00	0,80	0,10		-10,40	
91	PR12+970	PR13+100	IZQUIERDO	130,00	0,80	0,10		-10,40	
92	PR13+550	PR13+620	DERECHO	70,00	1,00	0,10		-7,00	
93	PR14+000	PR14+100	IZQUIERDO	100,00	0,90	0,13		-11,70	
94	PR14+850	PR15+020	IZQUIERDO	170,00	0,90	0,15		-22,95	
95	PR16+400	PR16+450	DERECHO	50,00	0,80	0,13		-5,20	
96	PR16+400	PR16+450	IZQUIERDO	50,00	0,80	0,13		-5,20	

97	PR17+400	PR17+560	DERECHO	160,00	1,50	0,13		-31,20	LLENADO DE CUNETAS QUIMBAYA ALCALA
98	PR18+200	PR18+300	DERECHO	100,00	1,00	0,10		-10,00	
99	PR18+200	PR18+300	IZQUIERDO	100,00	1,00	0,10		-10,00	
100	PR19+370	PR19+470	DERECHO	100,00	1,00	0,10		-10,00	
101	PR19+370	PR19+470	IZQUIERDO	100,00	1,00	0,10		-10,00	
102	PR19+590	PR19+710	DERECHO	120,00	1,10	0,18		-23,76	
103	PR19+590	PR19+710	IZQUIERDO	120,00	1,10	0,18		-23,76	
104	PR19+980	PR20+100	DERECHO	120,00	1,00	0,10		-12,00	
105	PR19+980	PR20+100	IZQUIERDO	120,00	1,00	0,10		-12,00	
106	PR20+450	PR20+900	DERECHO	450,00	1,00	0,10		-45,00	
107	PR20+450	PR20+900	IZQUIERDO	450,00	1,00	0,10		-45,00	
108	PR21+000	PR21+100	DERECHO	100,00	1,20	0,10		-12,00	
109	PR21+000	PR21+100	IZQUIERDO	100,00	1,20	0,10		-12,00	
110	PR21+480	PR21+580	DERECHO	100,00	1,20	0,10		-12,00	
111	PR21+480	PR21+580	IZQUIERDO	100,00	1,20	0,10		-12,00	
112	PR21+730	PR21+790	DERECHO	60,00	1,00	0,10		-6,00	
113	PR21+730	PR21+790	IZQUIERDO	60,00	1,00	0,10		-6,00	
114	PR22+440	PR22+550	DERECHO	110,00	1,00	0,10		-11,00	
115	PR22+440	PR22+550	IZQUIERDO	110,00	1,00	0,10		-11,00	
116	PR22+650	PR22+800	DERECHO	150,00	1,00	0,16		-24,00	
117	PR22+650	PR22+800	IZQUIERDO	150,00	1,00	0,16		-24,00	
118	PR0+050	PR0+500	DERECHO	450,00	2,40	0,05		-54,00	
							TOTAL	**-230,16**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	-230,20	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**-230,20**	**m3**
SALDO ÍTEM	**6.174,80**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
17	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
9.700,00	6.416,10	181,40	6.597,50


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR15+140	PR15+450	Completo	310,00	8,71	0,13		351,01	Primera Y Segunda capa Parche Vía Cartago-Alcalá
3	PR1+520	PR1+650	Completo	130,00	8,10	0,15		-157,95	Alcala - Cartago
5	PR1+520	PR1+650	Completo	24,00	8,10	0,06		-11,66	Alcala - Cartago Rampa Parcheo 10
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
							TOTAL	181,40	m3

CANTIDAD PARA PAGO	181,40 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**181,40 m3**
SALDO ÍTEM	**3.102,50 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

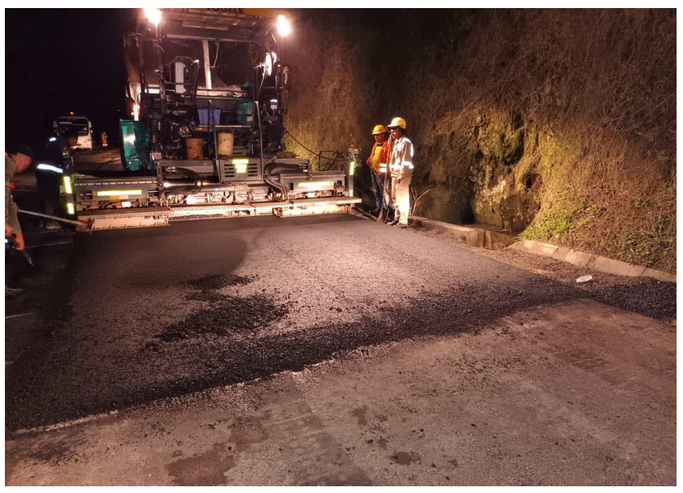



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 22	Excavaciones varias en material comun en seco	UNIDAD	m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.572,00	4.310,90	2.138,50	6.449,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+000	Derecho	17,00	0,80	1,60		21,76	Cruce EDEQ
2	PR0+620	PR0+000	Derecho	17,07	11,18	0,83		158,40	Retorno Armenia
3	MERCAR	PR0+340	Derecho	15,00	0,70	1,00		10,50	Cruce Movistar
4	Descole	PZ6	Izquierdo	1,70			3,80	6,46	Cámara de inspección
5	Descole	PZ7	Izquierdo	2,70			3,80	10,26	Cámara de inspección
6	PR0+502	PR0+540	Derecho	38,00			0,70	26,60	Instalación tubería TDP
6	PR0+350	PR0+524	Derecho	174,4	0,25	0,33		14,39	Excavación para sardinel
7	PR0+728	PR0+793	Derecho	64,7	0,7	2,30		104,17	Excavación Manhole 4 a descole de 12"
8	PR0+360	PR0+420	Derecho	60,15	1,1	1,20		79,40	Excavación Pz 13A a PZ 14
9	PZ 12	PR0+236	Izquierdo			1,70	2,83	4,81	Excavación pozos de alcantarillado CI
10	PZ 13	PR0+315	Izquierdo			2,30	2,83	6,51	
11	PZ 13A	PR0+360	Izquierdo			1,85	2,83	5,24	
12	PZ 14	PR0+420	Izquierdo			1,60	2,83	4,53	
13	PR0+142	PR0+340	Derecho	198	0,8	1,10		174,24	Excavación viga cimentación cerramiento MERCAR
14	PR0+420	PR0+250	Izquierdo	100,4	1,2	1,90		228,91	Excavación PZ 14 /PZ5'
15	PR0+520	Descole	Izquierdo	50,77	1,1	2,00		111,69	Excavación PZ 5' /PZ6
16	PR0+350	PR0+509	Derecho	158,7	0,8	0,35		44,44	Excavación viga apoyo andenes centro comercial
17	PR0+640	PR0+686	Derecho	46	0,6	0,40		11,04	Excavación tuberia TDP4" Movistar

18	PR0+014	-	DERECHO		16,28				EXCCAVACION SECTOR PATIO BONITO
19	PR0+021	-	DERECHO		15,34			112,73	
20	PR0+021	-	DERECHO		16,52				
21	PR0+028	-	DERECHO		13,96			101,04	
22	PR0+028	-	DERECHO		15,04				
23	PR0+035	-	DERECHO		13,16			94,19	
24	PR0+035	-	DERECHO		16,48				
25	PR0+041	-	DERECHO		18,06			116,57	
26	PR0+041	-	DERECHO		50,64				
27	PR0+048	-	DERECHO		32,93			292,50	
28	PR0+048	-	DERECHO		35,83				
29	PR0+055	-	DERECHO		28,10			214,80	
30	PR0+055	-	DERECHO		31,16				
31	PR0+062	-	DERECHO		23,00			183,33	
							TOTAL	**2138,50**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	2.138,50 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2.138,50 m3**
SALDO ÍTEM	**1.122,60 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
24	Rellenos para Estructuras con suelo		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
8.317,00	708,10	374,70	1.082,80


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+000	cruce	17,00	0,80	1,15		15,64	Relleno cruce EDEQ
2	mercar	PR0+340	Derecho	15,00	0,70	0,80		8,40	Relleno cruce Movistar
3	PR0+502	PR0+540	Derecho	38,00	0,70	0,55		14,63	Relleno Tuberia Edeq
4	mercar	PR0+350	Derecho	15,00	0,70	0,90		9,45	Relleno cruce Movistar
5	PR0+728	PR0+793	Derecho	64,70	0,70	1,69		76,54	Relleno ManholeNo4/Descole 12"
6	PR0+360	PR0+420	Izquierdo	60,15	1,10	0,51		33,74	Relleno tubería PZ13A a PZ14
7	PR0+420	PR0+520	Izquierdo	100,40	1,20	1,21		145,78	Relleno tubería PZ14 a PZ15'
8	PR0+640	PR0+686	Derecho	46,00	1,20	0,68		37,54	Relleno tubería TDP 4" Movistar
9	PR0+520	Descole	Derecho	50,77	1,10	0,59		32,95	Relleno tubería 30" PZ5'/6
10								0,00	
11								0,00	
12								0,00	
13								0,00	
14								0,00	
15								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**374,67**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	374,70 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**374,70 m3**
SALDO ÍTEM	**7.234,20 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

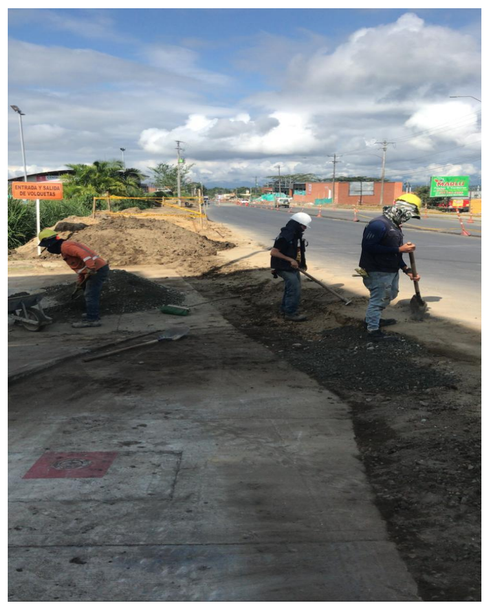

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
28	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.989,00	894,40	-261,80	632,60

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR7+200	-	IZQUIERDO	2,00	7,00	0,40		-5,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 1
2				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 2
3				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 3
4				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 4
5				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 5
6				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 6
7				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 7
8				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 8
9				2,00	9,50	0,40		-7,60	Pantalla Proteccion Vial Modulo 9
10				7,00	10,50	0,20		-14,70	Pantalla Anclada Modulo 1 H:10,50m
11				9,50	8,00	0,20		-15,20	Pantalla Anclada Modulo 4 H:8,00m
12				7,00	6,50	0,20		-9,10	Pantalla Anclada Modulo 7 H:6,50m
13	PR0+050	-	DERECHO	7,20	3,50	1,00		25,20	Zarpa Modulo 9
14	PR0+001	-	DERECHO	7,20	2,00	1,00		-14,40	ZARPA M1
15	PR0+008	-	DERECHO	7,20	2,00	1,00		-14,40	ZARPA M2
16	PR0+001	-	DERECHO	7,20	0,43	2,35		-7,19	VASTAGO M1
17	PR0+008	-	DERECHO	7,20	0,43	2,50		-7,65	VASTAGO M2
18	PR0+054	-	DERECHO	7,20	0,53	5,50		-20,79	VASTAGO M23
19	PR0+054	-	DERECHO	7,20	3,50	1,00		-25,20	ZARPA M23
20	PR0+061	-	DERECHO	7,20	0,53	5,50		-20,79	VASTAGO M24
21	PR0+061	-	DERECHO	7,20	3,50	1,00		-25,20	ZARPA M24
22	PR0+089	-	DERECHO	7,20	0,53	5,50		-20,79	VASTAGO M28
23	PR0+089	-	DERECHO	7,20	3,50	1,00		-25,20	ZARPA M28
							TOTAL	**-261,81**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	-261,80 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**-261,80 m3**
SALDO ÍTEM	**1.356,40 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
30	Concreto clase 21 MPA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.502,00	9,20	4,60	13,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+350	PR0+510	Derecho	22,00	0,60	0,35	4,62	4,62	Viga cerrmiento
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	4,62	m3

CANTIDAD PARA PAGO	4,60 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**4,60 m3**
SALDO ÍTEM	**1.488,20 m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
31	Concreto clase 14 MPA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
174,00	19,50	13,70	33,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+040	PR0+340	Derecho	158,70	0,60	0,05		4,76	Solado viga de cimentación cerramiento MERCAR
2	PR0+015	PR0+022	DERECHO	7,20	2,00	0,10		1,44	SOLADO MODULO 3
					-1,13	0,10		-0,11	
3	PR0+022	PR0+029	DERECHO	7,20	2,00	0,10		1,44	SOLADO MODULO 4
					-1,13	0,10		-0,11	
4	PR0+029	PR0+036	DERECHO	7,20	2,00	0,10		1,44	SOLADO MODULO 5
					-1,13	0,10		-0,11	
5	PR0+036	PR0+043	DERECHO	7,20	2,00	0,10		1,44	SOLADO MODULO 6
					-1,13	0,10		-0,11	
6	PR0+043	PR0+050	DERECHO	7,20	3,50	0,05		1,26	SOLADO MODULO 7
					-1,13	0,05		-0,06	
7	PR0+050	PR0+057	DERECHO	7,20	3,50	0,05		1,26	SOLADO MODULO 8
					-1,13	0,05		-0,06	
8	PR0+057	PR0+064	DERECHO	7,20	3,50	0,05		1,26	SOLADO MODULO 9
					-1,13	0,05		-0,06	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**13,68**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	13,70	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**13,70**	**m3**
SALDO ÍTEM	**140,80**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
757.040,95	213.730,10	-5.576,20	208.153,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
3	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C1
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
4	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C2
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
5	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C3
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
6	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C4
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
7	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C5
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
8	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C6
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	

9	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C7
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
10	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C8
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
11	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C9
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
12	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C10
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
13	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C11
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
14	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C12
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
15	PR7+200		Izquierdo	3,00	1,35	0,56	6	-4,54	Anclaje C13
				4,00	1,65	1,00	2	-3,30	
				4,00	0,70	1,00	2	-1,40	
				4,00	0,75	1,00	4	-3,00	
				6,00	2,00	2,24	25	-112,00	
				6,00	5,50	2,24	10	-123,20	
16	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 1
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
17	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 2
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
18	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 3
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
19	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 4
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
20	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 5
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	

21	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 6
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
22	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 7
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
23	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 8
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
24	PR7+200		Izquierdo	3,00	9,80	0,56	8,00	-43,90	Pantalla Proteccion Vial Modulo 9
				4,00	9,90	1,00	96,00	-950,40	
1	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	33,00	26,80	Modulo 1 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
2	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	5,50	0,56	8	24,64	Modulo 1 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
3	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	82	66,58	Modulo 2 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
4	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	14,15	0,56	8	63,39	Modulo 2 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
5	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	82,00	66,58	Modulo 3 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
6	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,80	0,56	8	61,82	Modulo 3 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
7	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	82	66,58	Modulo 4 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
8	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,80	0,56	8	61,82	Modulo 4 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
9	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	82,00	66,58	Modulo 5 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
10	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,20	0,56	8	59,14	Modulo 5 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
11	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,45	0,56	82	66,58	Modulo 6 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
12	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,20	0,56	8	59,14	Modulo 6 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
13	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,55	0,56	82,00	71,18	Modulo 7 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
14	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,74	0,56	8	61,56	Modulo 7 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
15	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,95	0,56	82	89,54	Modulo 8 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
16	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,76	0,56	10	77,06	Modulo 8 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
17	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,95	0,56	80	87,36	Modulo 9 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
18	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,65	0,56	10	76,44	Modulo 9 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
19	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,90	0,56	81	86,18	Modulo 10 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
20	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,75	0,56	10	77,00	Modulo 10 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
21	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,65	0,56	81,00	74,84	Modulo 11 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
22	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,70	0,56	7	53,70	Modulo 11 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
23	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,55	0,56	81	70,31	Modulo 12 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
24	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,72	0,56	8	61,47	Modulo 12 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
25	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,55	0,56	81,00	70,31	Modulo 13 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
26	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,72	0,56	8	61,47	Modulo 13 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
27	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,75	0,56	81	79,38	Modulo 14 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
28	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,60	0,56	9	68,54	Modulo 14 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
29	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,75	0,56	81,00	79,38	Modulo 15 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
30	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,60	0,56	9	68,54	Modulo 15 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
31	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,25	0,56	89	62,30	Modulo 16 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
32	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	13,90	0,56	6	46,70	Modulo 16 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
33	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,30	0,56	83,00	60,42	Modulo 17 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
34	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	14,10	0,56	6	47,38	Modulo 17 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
35	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,75	0,56	81	79,38	Modulo 18 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
36	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	14,20	0,56	9	71,57	Modulo 18 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
37	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,75	0,56	81	79,38	Modulo 19 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
38	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	14,10	0,56	9	71,06	Modulo 19 Muro pantalla de cerramiento MERCAR
39	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 18 Viga cimentación cerramiento MERCAR
40	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,20	1,55	8	39,68	Modulo 18 Viga cimentación cerramiento MERCAR
41	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	91	61,15	Modulo 18 Viga cimentación cerramiento MERCAR
42	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 19 Viga cimentación cerramiento MERCAR
43	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,10	1,55	8	38,44	Modulo 19 Viga cimentación cerramiento MERCAR

44	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	90	60,48	Modulo 19 Viga cimentación cerramiento MERCAR
45	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 12 Viga cimentación cerramiento MERCAR
46	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,92	1,55	8	36,21	Modulo 12 Viga cimentación cerramiento MERCAR
47	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	91	61,15	Modulo 12 Viga cimentación cerramiento MERCAR
48	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 13 Viga cimentación cerramiento MERCAR
49	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,92	1,55	8	36,21	Modulo 13 Viga cimentación cerramiento MERCAR
50	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	91	61,15	Modulo 13 Viga cimentación cerramiento MERCAR
51	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 14 Viga cimentación cerramiento MERCAR
52	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,00	1,55	8	37,20	Modulo 14 Viga cimentación cerramiento MERCAR
53	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 14 Viga cimentación cerramiento MERCAR
54	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 15 Viga cimentación cerramiento MERCAR
55	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,00	1,55	8	37,20	Modulo 15 Viga cimentación cerramiento MERCAR
56	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 15 Viga cimentación cerramiento MERCAR
57	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 16 Viga cimentación cerramiento MERCAR
58	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,90	1,55	8	35,96	Modulo 16 Viga cimentación cerramiento MERCAR
59	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 16 Viga cimentación cerramiento MERCAR
60	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 17 Viga cimentación cerramiento MERCAR
61	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,10	1,55	8	38,44	Modulo 17 Viga cimentación cerramiento MERCAR
62	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	90,00	60,48	Modulo 17 Viga cimentación cerramiento MERCAR
63	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 6 Viga cimentación cerramiento MERCAR
64	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 6 Viga cimentación cerramiento MERCAR
65	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,60	1,55	8	32,24	Modulo 6 Viga cimentación cerramiento MERCAR
66	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 6 Viga cimentación cerramiento MERCAR
67	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 7 Viga cimentación cerramiento MERCAR
68	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8,00	14,88	Modulo 7 Viga cimentación cerramiento MERCAR
69	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,32	1,55	8,00	41,17	Modulo 7 Viga cimentación cerramiento MERCAR
70	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 7 Viga cimentación cerramiento MERCAR
71	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 8 Viga cimentación cerramiento MERCAR
72	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 8 Viga cimentación cerramiento MERCAR
73	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,76	1,55	8	34,22	Modulo 8 Viga cimentación cerramiento MERCAR
74	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	88	59,14	Modulo 8 Viga cimentación cerramiento MERCAR
75	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 9 Viga cimentación cerramiento MERCAR
76	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 9 Viga cimentación cerramiento MERCAR
77	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	87	58,46	Modulo 9 Viga cimentación cerramiento MERCAR
78	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 10 Viga cimentación cerramiento MERCAR
79	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,75	1,55	8,00	34,10	Modulo 10 Viga cimentación cerramiento MERCAR
80	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	90	60,48	Modulo 10 Viga cimentación cerramiento MERCAR
81	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 11 Viga cimentación cerramiento MERCAR
82	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	3,10	1,55	8	38,44	Modulo 11 Viga cimentación cerramiento MERCAR
83	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	90	60,48	Modulo 11 Viga cimentación cerramiento MERCAR
84	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	5,35	1,55	8,00	66,34	Modulo 1 Viga cimentación cerramiento MERCAR
85	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 1 Viga cimentación cerramiento MERCAR
86	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	37	24,86	Modulo 1 Viga cimentación cerramiento MERCAR
87	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 2 Viga cimentación cerramiento MERCAR
88	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 2 Viga cimentación cerramiento MERCAR
89	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,80	1,55	8,00	34,72	Modulo 2 Viga cimentación cerramiento MERCAR
90	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	88	59,14	Modulo 2 Viga cimentación cerramiento MERCAR
91	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 3 Viga cimentación cerramiento MERCAR
86	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 3 Viga cimentación cerramiento MERCAR

87	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,60	1,55	8	32,24	Modulo 3 Viga cimentación cerramiento MERCAR
88	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 3 Viga cimentación cerramiento MERCAR
89	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8,00	148,80	Modulo 4 Viga cimentación cerramiento MERCAR
90	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 4 Viga cimentación cerramiento MERCAR
91	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,60	1,55	8	32,24	Modulo 4 Viga cimentación cerramiento MERCAR
92	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 4 Viga cimentación cerramiento MERCAR
81	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	12,00	1,55	8	148,80	Modulo 5 Viga cimentación cerramiento MERCAR
82	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	1,20	1,55	8	14,88	Modulo 5 Viga cimentación cerramiento MERCAR
83	PR0+040	PR0+340	Derecho	5	2,60	1,55	8,00	32,24	Modulo 5 Viga cimentación cerramiento MERCAR
84	PR0+040	PR0+340	Derecho	3	1,20	0,56	89	59,81	Modulo 5 Viga cimentación cerramiento MERCAR
81	PR0+340	PR0+510	Derecho	3	1,20	0,56	79	53,09	Viga cimentación frente a centro comercial
82	PR0+340	PR0+510	Derecho	3	1,20	0,56	79	53,09	Viga cimentación frente a centro comercial
83	PR0+340	PR0+510	Derecho	4	9,50	1,00	10	95,00	Viga cimentación frente a centro comercial
84	PR0+340	PR0+510	Derecho	3	1,20	0,56	1244	835,97	Fleje Viga cimentación frente a centro comercial
85	PR0+340	PR0+510	Derecho	5	149,20	1,55	4	925,04	Viga cimentación frente a centro comercial
86	PR0+340	PR0+510	Derecho	4	149,20	1,00	2	298,40	Viga cimentación frente a centro comercial
87	PR0+340	PR0+510	Derecho	5	1,00	1,55	52	80,60	Viga cimentación frente a centro comercial
82	PR0+340	PR0+510	Derecho	4	1,00	1,00	26	26,00	Viga cimentación frente a centro comercial
87	PR0+340	PR0+510	Derecho	3	0,65	0,56	598	217,67	Bordillo fundido en sitio
88	PR0+340	PR0+510	Derecho	4	119,70	1,00	1	119,70	Bordillo fundido en sitio
65	PR0+040	PR0+340	Derecho	4	0,80	1,00	10,00	8,00	Bordillo fundido en sitio
66	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 94Micropilotes para cerramiento
63	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 95 Micropilotes para cerramiento
64	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 96 Micropilotes para cerramiento
65	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 97 Micropilotes para cerramiento
66	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 98 Micropilotes para cerramiento
67	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 99 Micropilotes para cerramiento
68	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 100 Micropilotes para cerramiento
69	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 101 Micropilotes para cerramiento
82	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No 102 Micropilotes para cerramiento
75	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No103 Micropilotes para cerramiento
76	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No104 Micropilotes para cerramiento
73	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No105 Micropilotes para cerramiento
74	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No106 Micropilotes para cerramiento
75	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No107 Micropilotes para cerramiento
76	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No108 Micropilotes para cerramiento
77	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No109 Micropilotes para cerramiento
78	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No110 Micropilotes para cerramiento
79	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No69 Micropilotes para cerramiento
85	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No71 Micropilotes para cerramiento
86	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No72 Micropilotes para cerramiento
83	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No73 Micropilotes para cerramiento
84	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No74 Micropilotes para cerramiento
57	PR0+340	PR0+510	Derecho					78,80	No43 Micropilotes para cerramiento
59	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No48 Micropilotes para cerramiento
60	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No49 Micropilotes para cerramiento
61	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No50 Micropilotes para cerramiento
74	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No51 Micropilotes para cerramiento
67	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No52 Micropilotes para cerramiento

68	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No53 Micropilotes para cerramiento
65	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No54 Micropilotes para cerramiento
66	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No55 Micropilotes para cerramiento
67	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No56 Micropilotes para cerramiento
68	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No57 Micropilotes para cerramiento
69	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No58 Micropilotes para cerramiento
70	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No59 Micropilotes para cerramiento
71	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No60 Micropilotes para cerramiento
72	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No61 Micropilotes para cerramiento
73	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No62 Micropilotes para cerramiento
74	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No63 Micropilotes para cerramiento
75	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No64 Micropilotes para cerramiento
76	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No65 Micropilotes para cerramiento
89	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No66 Micropilotes para cerramiento
82	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No67 Micropilotes para cerramiento
83	PR0+040	PR0+340	Derecho					45,40	No68 Micropilotes para cerramiento
80	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No70 Micropilotes para cerramiento
80	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 80 Micropilotes para cerramiento
81	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 81 Micropilotes para cerramiento
82	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 82 Micropilotes para cerramiento
83	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 83 Micropilotes para cerramiento
84	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 84 Micropilotes para cerramiento
85	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 85 Micropilotes para cerramiento
86	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 86 Micropilotes para cerramiento
87	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 87 Micropilotes para cerramiento
88	PR0+340	PR0+510	Derecho					45,40	No 88 Micropilotes para cerramiento
89	PR0+340	PR0+510	Derecho					62,80	No89 Micropilotes para cerramiento
84	PR0+340	PR0+510	Derecho					62,80	No90 Micropilotes para cerramiento
89	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No91 Micropilotes para cerramiento
90	PR0+040	PR0+340	Derecho					62,80	No92 Micropilotes para cerramiento
87	PR0+340	PR0+510	Derecho					62,80	No93 Micropilotes para cerramiento
78	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	3,40	1,55	74	389,98	zarpa 1
79	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	3,75	1,55	21	122,06	zarpa 1
80	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	5,90	1,55	8	73,16	zarpa 1
81	PR0+338	PR0+350	Derecho	4	6,30	1,00	24	151,20	zarpa 1
82	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	6,30	1,55	22	214,83	zarpa 1
83	PR0+338	PR0+350	Derecho	4	5,90	1,00	36	212,40	zarpa 1
84	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	4,90	1,55	8	60,76	zarpa 2
85	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	3,75	1,55	20	116,25	zarpa 2
86	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	6,30	1,55	20	195,30	zarpa 2
87	PR0+338	PR0+350	Derecho	4	6,30	1,00	21	132,30	zarpa 2
88	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	2,35	1,55	1	3,64	zarpa 2
89	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	5,00	1,55	2	15,50	zarpa 2
90	PR0+338	PR0+350	Derecho	4	5,00	1,00	3	15,00	zarpa 2
91	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	3,40	1,55	37	194,99	zarpa 2
92	PR0+338	PR0+350	Derecho	5	3,40	1,55	37	194,99	zarpa 2
87	PR0+338	PR0+350	Derecho	4	5,90	1,00	36	212,40	zarpa 2
87	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	2,40	1,00	8	19,20	
88	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	1,55	1,00	8	12,40	

89	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	2,25	1,00	2	4,50	PLACA SUSPERIOR CAJA EDEQ RS05
90	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	1,40	1,00	6	8,40	
91	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	0,50	1,00	4	2,00	
92	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	0,40	1,00	2	0,80	
93	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	0,90	1,00	4	3,60	
83	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	0,80	1,00	2	1,60	
88	PR0+801	PR0+801	Derecho	4	1,00	1,00	4	4,00	
89	PR0+057	PR0+064	DERECHO	6	7,70	2,24	38	655,42	ZARPA MODULO 9 ARMENIA CALARCA
				6	6,00	2,24	120	1612,80	
90	PR0+096	PR0+103	DERECHO	6	4,50	2,24	80	806,40	ZARPA MODULO 29 ARMENIA CALARCA
				6	7,70	2,24	22	379,46	
91	PR0+096	PR0+103	DERECHO	4	3,10	1,00	35	108,50	VASTAGO MODULO 29 ARMENIA CALARCA
				5	3,20	1,55	28	138,88	
				5	2,50	1,55	27	104,63	
				4	7,50	1,00	16	120,00	
				4	5,50	1,00	4	22,00	
				4	2,40	1,00	6	14,40	
92	PR0+103	PR0+110	DERECHO	6	4,50	2,24	80	806,40	ZARPA MODULO 30 ARMENIA CALARCA
				6	7,70	2,24	22	379,46	
93	PR0+103	PR0+110	DERECHO	4	2,40	1,00	37	88,80	VASTAGO MODULO 30 ARMENIA CALARCA
				5	2,65	1,55	28	115,01	
				5	2,25	1,55	27	94,16	
				4	7,50	1,00	12	90,00	
				4	5,00	1,00	2	10,00	
				4	3,00	1,00	4	12,00	
94	PR0+042	-	DERECHO	3	4,50	0,56	8	20,16	CAISSON 41 Diam 1.20 m Anillos 5 al 12
				3	4,65	0,56	8	20,83	
				3	4,75	0,56	8	21,28	
				3	4,85	0,56	8	21,73	
				3	5,15	0,56	8	23,07	
				3	1,40	0,56	144	112,90	
95	PR0+046	-	DERECHO	3	4,50	0,56	6	15,12	CAISSON 42 Diam 1.20 m Anillos 6 al 11
				3	4,65	0,56	6	15,62	
				3	4,75	0,56	6	15,96	
				3	4,85	0,56	6	16,30	
				3	5,15	0,56	6	17,30	
				3	1,40	0,56	108	84,67	
96	PR0+050	-	DERECHO	3	4,50	0,56	5	12,60	CAISSON 43 Diam 1.20 m Anillos 7 al 11
				3	4,65	0,56	5	13,02	
				3	4,75	0,56	5	13,30	
				3	4,85	0,56	5	13,58	
				3	5,15	0,56	5	14,42	
				3	1,40	0,56	90	70,56	
97	PR0+054	-	DERECHO	3	4,50	0,56	4	10,08	CAISSON 44 Diam 1.20 m Anillos 8 al 11
				3	4,65	0,56	4	10,42	
				3	4,75	0,56	4	10,64	
				3	4,85	0,56	4	10,86	
				3	5,15	0,56	4	11,54	
				3	1,40	0,56	72	56,45	
98	PR0+154	-	IZQUIERDO	3	6,30	0,56	77	271,66	CAISSON 3 Diam.1.50 m - Eje 2 Anillos 3 al 13
				3	1,15	0,56	385	247,94	
99	PR0+154	-	DERECHO	3	6,30	0,56	70	246,96	CAISSON 4 Diam.1.50 m - Eje 2 Anillos 3 al 12
				3	1,15	0,56	350	225,40	
100	PR0+180	-	DERECHO	3	6,30	0,56	49	172,87	CAISSON 6 Diam.1.50 m - Eje 3 Anillos 8 al 14
				3	1,15	0,56	245	157,78	
101	PR0+195	-	DERECHO	3	6,30	0,56	112	395,14	CAISSON 8 Diam.1.50 m - Eje 4 Anillos 1 al 16
				3	1,15	0,56	560	360,64	
102	PR0+390	-	IZQUIERDO	3	6,30	0,56	21	74,09	CAISSON 33 Diam.1.50 m - Eje 17 Anillos 9 Al 11
				3	1,15	0,56	105	67,62	
103	PR0+405	-	DERECHO	3	6,30	0,56	21	74,09	CAISSON 36 Diam.1.50 m - Eje 18 Anillos 9 Al 11
				3	1,15	0,56	105	67,62	


104	PR0+420	-	DERECHO	3	6,30	0,56	14	49,39	CAISSON 38 Diam.1.50 m - Eje 19 Anillos 9 Y 10
				3	1,15	0,56	70	45,08	
105	PR0+435	-	DERECHO	3	6,30	0,56	42	148,18	CAISSON 40 Diam.1.50 m - Eje 20 Anillos 9 Al 14
				3	1,15	0,56	210	135,24	
106	PR0+450	-	DERECHO	3	6,30	0,56	35	123,48	CAISSON 42 Diam.1.50 m - Eje 21 Anillos 10 Al 14
				3	1,15	0,56	175	112,70	
107	PR0+001	PR0+008	DERECHO	4,00	7,50	1,00	-34,00	-255,00	MURO 1 SECTOR PATIO BONITO
				4,00	4,25	1,00	-28,00	-119,00	
				6,00	4,20	2,24	-80,00	-752,64	
				6,00	7,70	2,24	-22,00	-379,46	
				6,00	2,40	2,24	-21,00	-112,90	
				6,00	4,15	2,24	-21,00	-195,22	
108	PR0+008	PR0+015	DERECHO	4,00	7,50	1,00	-34,00	-255,00	MURO 2 SECTOR PATIO BONITO
				4,00	4,25	1,00	-28,00	-119,00	
				6,00	4,20	2,24	-80,00	-752,64	
				6,00	7,70	2,24	-22,00	-379,46	
				6,00	2,40	2,24	-21,00	-112,90	
				6,00	4,15	2,24	-21,00	-195,22	
109	PR0+054	PR0+061	DERECHO	4,00	7,50	1,00	-80,00	-600,00	MURO 23 SECTOR LA MARIA
				4,00	7,25	1,00	-36,00	-261,00	
				6,00	6,30	2,24	-120,00	-1693,44	
				6,00	7,70	2,24	-38,00	-655,42	
				6,00	2,40	2,24	-65,00	-349,44	
				7,00	6,00	3,04	-65,00	-1185,60	
110	PR0+061	PR0+068	DERECHO	4,00	7,50	1,00	-80,00	-600,00	MURO 24 SECTOR LA MARIA
				4,00	7,25	1,00	-36,00	-261,00	
				6,00	6,30	2,24	-120,00	-1693,44	
				6,00	7,70	2,24	-38,00	-655,42	
				6,00	2,40	2,24	-65,00	-349,44	
				7,00	6,00	3,04	-65,00	-1185,60	
111	PR0+089	PR0+096	DERECHO	4,00	7,50	1,00	-80,00	-600,00	MURO 28 SECTOR LA MARIA
				4,00	7,25	1,00	-36,00	-261,00	
				6,00	6,30	2,24	-120,00	-1693,44	
				6,00	7,70	2,24	-38,00	-655,42	
				6,00	2,40	2,24	-65,00	-349,44	
				7,00	6,00	3,04	-65,00	-1185,60	
							TOTAL	**-5576,15**	**kg**

CANTIDAD PARA PAGO	-5.576,20 kg
CANTIDAD TOTAL PAGO	**-5.576,20 kg**
SALDO ÍTEM	**548.887,05 kg**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

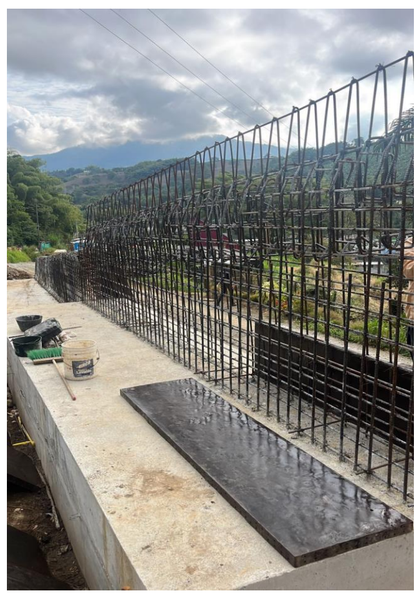



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
40	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.018,00	207,50	47,70	255,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR18+850	PR19+021	Derecho	170,70	1,10	0,10		18,78	Cuneta Margen derecha
2	PR18+850	PR19+021	Derecho	167,20	0,15	0,20		5,02	Bordillo
3	PR18+850	PR19+021	Izquierdo	170,60	1,10	0,10		18,77	Cuneta Margen Izquierda
4	PR18+850	PR19+021	Izquierdo	170,60	0,15	0,20		5,12	Bordillo
								0,00	
							TOTAL	**47,68**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	47,70	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**47,70**	**m3**
SALDO ÍTEM	**762,80**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
44	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos		m

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
209.215,50	136.572,54	256,00	136.828,54

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR9+650	PR9+906		128,00	2,00			256,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
						TOTAL	256,00	m	

CANTIDAD PARA PAGO	256,00	m
CANTIDAD TOTAL PAGO	**256,00**	**m**
SALDO ÍTEM	**72.386,96**	**m**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
52	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.299.360,00	40.685,85	13.841,60	54.527,45

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Distancia (km)	Volumen (m3)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+360	PR0+510		1,69	542,45			916,74	TRANSPORTE EXCAVACION CARRIL DE INCORPORACION RETORNO
2	PR0+021	PR2+200	DERECHO	8,10	171,23			1386,94	TRANSPORTE EXCAVACION SECTOR PATIO BONITO
3	PR0+028	PR2+200	DERECHO	8,10	264,97			2146,24	
4	PR0+035	PR2+200	DERECHO	8,10	256,88			2080,72	
5	PR0+041	PR2+200	DERECHO	8,10	228,32			1849,38	
6	PR0+048	PR2+200	DERECHO	8,10	262,78			2128,52	
7	PR0+055	PR2+200	DERECHO	8,10	254,02			2057,53	
8	PR0+062	PR2+200	DERECHO	8,10	157,47			1275,51	
							TOTAL	13841,58	m3-km

CANTIDAD PARA PAGO	13.841,60	m3-km
CANTIDAD TOTAL PAGO	**13.841,60**	**m3-km**
SALDO ÍTEM	**2.244.832,55**	**m3-km**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
54	Geomalla en fibra de vidrio		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
68.000,00	49.027,50	5.574,40	54.601,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR14+810	PR15+450		640,00	8,71			5574,40	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	5574,40	m2

CANTIDAD PARA PAGO	5.574,40	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**5.574,40**	**m2**
SALDO ÍTEM	**13.398,10**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
55	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	**UNIDAD**	**ml**

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
17.100,00	6.743,90	553,00	7.296,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000			102,00	1			102,00	CRUCE EDEQ ENTRADA MERCAR
2	MERCAR	PR0+340	CD	39,00	1			39,00	
3	PR0+502	PR0+540	CD	38,00	6			228,00	
4	PR0+640	PR0+686	CD	46,00	4			184,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**553,00**	**ml**

CANTIDAD PARA PAGO	553,00 ml
CANTIDAD TOTAL PAGO	**553,00 ml**
SALDO ÍTEM	**9.803,10 ml**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
56	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.200,00	623,45	159,30	782,75

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+360	PR0+420	Izquierdo	60,15	0,52			31,28	Arena de soporte tuberia entre PZ13A y PZ14
2	PR0+420	PR0+520	Izquierdo	100,40	0,52			52,21	Arena de soporte entre PZ14 y PZ5'
3	PR0+640	PR0+686	Derecho	46,00	0,24			11,04	Arena tubería TDP 4" Movistar
4	PR0+520	Descole	Derecho	50,77	0,71			36,05	Arena soporte tuberia 30" PZ5'/PZ6
5	PR0+000	PR0+000	Cruce	17,00	0,24			4,08	Arena TDP cruce
6	PR0+502	PR0+540	Derecho	38,00	0,24			9,12	Arena tuberia TDP Edeq
7	PR0+728	PR0+793	Derecho	64,70	0,24			15,53	Arena Manhole 14/descole 12" en estación de servico PRIMAX
								0,00	
							TOTAL	**159,30**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	159,30	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**159,30**	**m3**
SALDO ÍTEM	**417,25**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
58	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)		und

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
28,00	8,00	1,00	9,00


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+907	PR0+907	DERECHO				1,00	1,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**1,00**	**und**

CANTIDAD PARA PAGO	1,00 und
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1,00 und**
SALDO ÍTEM	**19,00 und**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

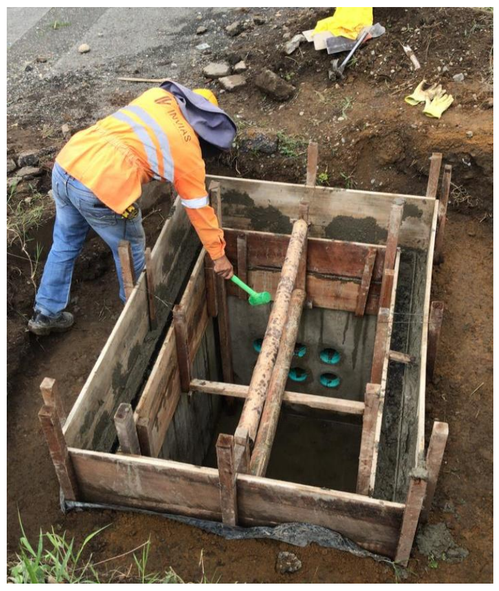

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
67	Caja movistar (no incluye acero).		und

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
26,00	12,00	1,00	13,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+801	PR0+801	derecho				1,00	1,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**1,00**	**und**

CANTIDAD PARA PAGO	1,00 und
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1,00 und**
SALDO ÍTEM	**13,00 und**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
74	Marca vial		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.900,00	491,72	508,70	1.000,42

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad		Total	OBSERVACIÓN
1	TRAMAO CARTAGO ALCALA			6,90	4,20	2,00		57,96	Cartago-Alcalá
2	TRAMO ARMENIA MONTENEGRO			2,00	13,20	2,00		52,80	Montenegro
				0,27	13,20	2,00		7,13	Montenegro
				2,25	10,70	2,00		48,15	Montenegro
				2,10	0,37	14,00		10,88	Montenegro
				2,37	0,40	4,00		3,79	Montenegro
				4,28	7,50	3,00		96,30	Montenegro
				2,37	0,40	4,00		3,79	Montenegro
				2,37	0,40	4,00		3,79	Montenegro
3	TRAMO MONTENEGRO QUIMBAYA			0,70	2,40	29,00		48,72	Quimbaya
				3,07	8,60	2,00		52,80	Quimbaya
				1,00	1,90	2,00		3,80	Quimbaya
				0,50	1,90	2,30		2,19	Quimbaya
				2,37	0,20	22,00		10,43	Quimbaya
				3,00	0,40	10,00		12,00	Quimbaya
4	TRAMO QUIMABAYA ALCALA			1,46	0,70			1,02	Alcala
				7,00	4,00			28,00	Alcala
				0,83	0,40	21,00		6,97	Alcala
				1,50	0,70			1,05	Alcala
				3,30	0,70			2,31	Alcala
				5,60	0,70			3,92	Alcala
				8,30	0,70			5,81	Alcala
				7,40	0,50			3,70	Alcala
				2,20	0,60			1,32	Alcala
				1,50	0,40			0,60	Alcala
				0,38	0,98			0,37	Alcala
				0,85	0,54			0,46	Alcala
				0,87	0,90			0,78	Alcala
				1,29	0,80			1,03	Alcala
				2,70	0,64			1,73	Alcala
				5,40	0,73			3,94	Alcala
				0,70	9,86			6,90	Alcala
				0,70	10,90			7,63	Alcala
				8,80	0,70			6,16	Alcala
				6,80	0,70			4,76	Alcala
				5,00	0,70			3,50	Alcala
				3,20	0,70			2,24	Alcala
							TOTAL	**508,74**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	508,70	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**508,70**	**M2**
SALDO ÍTEM	**899,58**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
77	CORTE DE PAVIMENTO		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.000,00	2.866,20	1.118,70	3.984,90


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+350	PR0+517	Derecho	167,23				167,23	Instalación de sardinel
2	PR0+000	PR0+199	Eje	198,60	2			397,20	Instalación de newjersey
3	-PR0+021	PR0+013	Derecho	37,40				37,40	Instalación sardinel
4	PR0+040	PR0+200	Derecho	157,70				157,70	Instalación sardinel
5	Carrill acceso	PR0+620	Derecho	100,80				100,80	Instalación sardinel
6	PR0+109	PR0+139	Izquierdo	29,60				29,60	Instalación sardinel
7	PR0+150	PR0+214	Izquierdo	63,60				63,60	Instalación sardinel
8	PR0+230	PR0+346	Izquierdo	116,7				116,70	Instalación sardinel
9	PR0+561	PR0+610	Izquierdo	48,5				48,50	Instalación sardinel
							TOTAL	**1118,73**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	1.118,70 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1.118,70 MI**
SALDO ÍTEM	**3.015,10 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

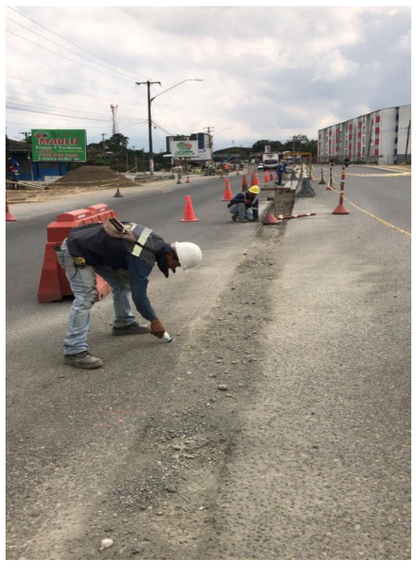



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
80	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.000,00	568,00	460,50	1.028,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR18+850	PR19+021	derecho	170,70	1,30			221,91	Malla electrosoldada para cunetas vía Quimbaya Alcalá
2	PR18+850	PR19+021	Izquierdo	170,60	1,30			221,78	Malla electrosoldada para cunetas vía Quimbaya Alcalá
2	PR0+320	PR0+340	derecho	21,00	0,80			16,80	Sobre espesor viga
							TOTAL	**460,49**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	460,50	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**460,50**	**M2**
SALDO ÍTEM	**2.971,50**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
90	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
380,00	219,00	7,00	226,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+042	-	Derecho	41	3,00			3,00	
2	PR0+046	-	Derecho	42	2,00			2,00	
3	PR0+050	-	Derecho	43	1,00			1,00	
4	PR0+054	-	Derecho	44	1,00			1,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	7,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	7,00 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**7,00 MI**
SALDO ÍTEM	**154,00 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
91	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
230,00	78,00	13,00	91,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+042	-	Derecho	41	4,00			4,00	
2	PR0+046	-	Derecho	42	3,00			3,00	
3	PR0+050	-	Derecho	43	3,00			3,00	
4	PR0+054	-	Derecho	44	3,00			3,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
						TOTAL		13,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	13,00 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**13,00 MI**
SALDO ÍTEM	**139,00 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
92	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI	

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
200,00	0,00	20,00	20,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+150	PR0+350	Derecho	20,00				20,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	20,00	MI

CANTIDAD PARA PAGO	20,00 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**20,00 MI**
SALDO ÍTEM	**180,00 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
93	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
120,00	0,00	60,00	60,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+150	PR0+350	Derecho	60,00				60,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	**60,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	60,00 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**60,00 MI**
SALDO ÍTEM	**60,00 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
98	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
208,00	44,90	159,40	204,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+360	PR0+420	izquierdo	58,95				58,95	
2	PR0+420	PR0+520	izquierdo	100,40				100,40	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	159,35	MI

CANTIDAD PARA PAGO	159,40 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**159,40 MI**
SALDO ÍTEM	**3,70 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
99	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
100,00	0,00	50,80	50,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+520	descole	izquierdo	50,77				50,77	descole
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	50,77	MI

CANTIDAD PARA PAGO	50,80 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**50,80 MI**
SALDO ÍTEM	**49,20 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	UNIDAD	M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
10.000,00	4.654,60	539,00	5.193,60

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+390	PR0+500	Izquierdo	110,00	4,90			539,00	Calzada Izquierda carril derecho Armenia-Montenegro
							TOTAL	**539,00**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	539,00 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**539,00 M2**
SALDO ÍTEM	**4.806,40 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 106	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	UNIDAD	MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.000,00	0,00	221,30	221,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+040	PR0+200	Derecho	157,70				157,70	Bordillo prefabricado
2	PR0+446	PR0+510	Derecho	63,60				63,60	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	221,30	MI

CANTIDAD PARA PAGO	221,30	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**221,30**	**MI**
SALDO ÍTEM	**6.778,70**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 109	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	UNIDAD	MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
800,00	335,50	64,70	400,20


N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+728	PR0+793	derecho	64,70				64,70	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
11								0,00	
12								0,00	
13								0,00	
							TOTAL	64,70	MI

CANTIDAD PARA PAGO	64,70	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**64,70**	**MI**
SALDO ÍTEM	**399,80**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

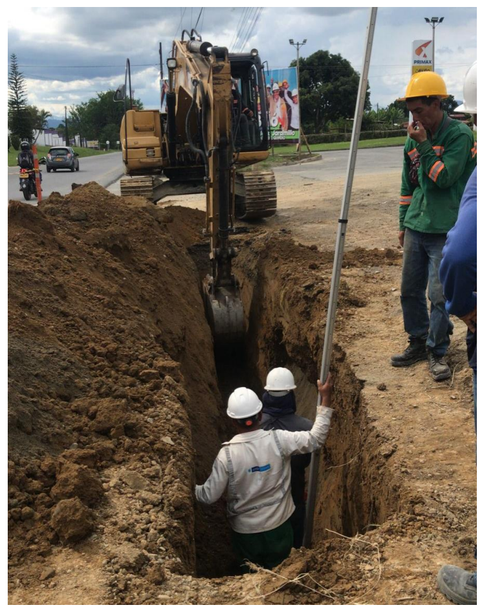

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
122	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	**UNIDAD**	**MI**

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
490,00	450,00	-40,00	410,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+040	PR0+340		-40,00				-40,00	
							TOTAL	**-40,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	-40,00 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**-40,00 MI**
SALDO ÍTEM	**80,00 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
126	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.120,00	2.259,20	1.136,00	3.395,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+314	-	DERECHO	2,40	0,20			0,48	DEMOLICION PREDIO No. 08 A Y No.08 B SECTOR LA MARIA ESTRIBO LADO DERECHO PUENTE LA MARIA
				5,70	0,20			1,14	
				6,30	3,30			20,79	
				5,50	4,20			23,10	
				13,50	6,50			87,75	
				5,70	2,40			13,68	
				4,40	3,50			15,40	
				0,90	1,90	-2,00		-3,42	
				1,20	1,10	-3,00		-3,96	
				4,60	2,75			12,65	
				6,00	2,75			16,50	
				4,50	2,30			10,35	
				1,50	0,80	2,00		2,40	
				0,90	0,60	3,00		1,62	
				4,50	2,30	2,00		20,70	
				4,30	5,50			23,65	
				0,90	0,19	-3,00		-0,51	
				1,20	1,00	-2,00		-2,40	
				5,80	2,40			13,92	
				6,20	2,40			14,88	
				3,50	2,40			8,40	
				5,00	2,40			12,00	
				3,30	2,40			7,92	
				4,10	2,40			9,84	
				5,00	2,40			12,00	
				3,40	2,00			6,80	
				6,20	2,00			12,40	
				3,75	2,40			9,00	
				2,60	2,40			6,24	
				2,85	2,40			6,84	
				4,70	2,40			11,28	
				5,00	2,40			12,00	
				3,40	2,40			8,16	
				2,40	2,40			5,76	
				5,00	2,40			12,00	
				9,40	2,40			22,56	
				0,90	1,80	-4,00		-6,48	
				1,50	1,10	-3,00		-4,95	
				1,10	0,80			0,88	
				1,80	1,10			1,98	
				7,90	0,75			5,93	
				0,90	1,80	-2,00		-3,24	
				0,90	1,80	-5,00		-8,10	
				0,90	1,80	-5,00		-8,10	
				1,00	1,20	-3,00		-3,60	
				1,10	1,30	-2,00		-2,86	
				0,90	1,80	-2,00		-3,24	
				36,83	2,16			79,55	
				8,70	4,80			41,76	
				3,30	0,85			2,81	
				1,90	1,40			2,66	
				6,00	2,20			13,20	
				6,30	1,75			11,03	
				2,55	2,00			5,10	
				0,25	2,00			0,50	
				6,00	0,90			5,40	

	2	PR0+155	-	DERECHO	3,00	0,90			2,70	DEMOLICION PREDIO No 20 SECTOR PATIO BONITO
					4,70	2,25			10,58	
					40,66	2,30			93,52	
					7,65	5,30			40,55	
					39,45	3,00			118,35	
					14,40	2,80			40,32	
					2,90	2,50			7,25	
					7,57	2,20			16,65	
					2,50	2,80			7,00	
					0,88	0,60	2,00		1,06	
					3,50	2,80	2,00		19,60	
					4,10	2,32			9,51	
					4,30	3,00	2,00		25,80	
					13,00	2,30			29,90	
					5,00	1,05			5,25	
					5,42	3,40			18,43	
					5,80	1,00			5,80	
					1,20	1,00			1,20	
					7,90	3,25			25,68	
					2,20	2,80			6,16	
					2,32	0,50			1,16	
					7,90	2,60			20,54	
					4,10	3,00			12,30	
					6,16	2,80	2,00		34,50	
					6,12	2,90			17,75	
					1,32	0,60	2,00		1,58	
					0,60	0,65	2,00		0,78	
								TOTAL	**1136,04**	**M2**


CANTIDAD PARA PAGO	1.136,00	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1.136,00**	**M2**
SALDO ÍTEM	**7.724,80**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



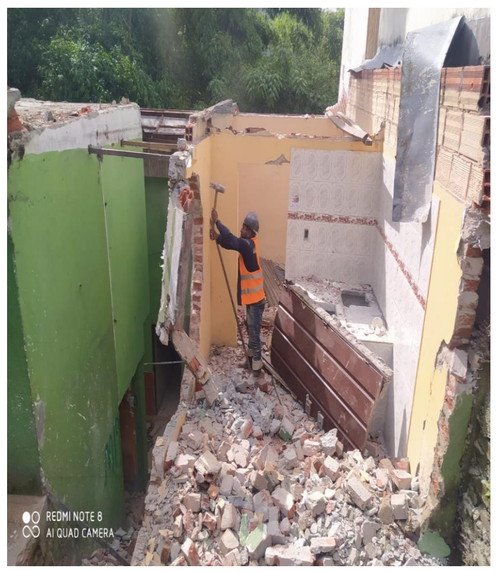

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
131	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.680,00	0,00	144,30	144,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR10+893	PR11+059		156,00	2,30	0,08		28,70	
2	PR9+298	PR9+542		244,00	1,00	0,08		19,52	
3	PR9+298	PR9+542		244,00	1,00	0,08		19,52	
4	PR11+810	PR11+950	IZQUIERDO	140,00	1,00	0,20		28,00	
5	PR12+200	PR12+560	IZQUIERDO	360,00	0,90	0,15		48,60	
6									
7									
8									
9									
10									
							TOTAL	**144,34**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	144,30	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**144,30**	**M3**
SALDO ÍTEM	**1.535,70**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
132	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
16.600,00	1.890,00	-1.710,00	180,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR1+000	IZQUIERDO	950,00	1,80			-1710,00	
2								0,00	
							TOTAL	**-1710,00**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	-1.710,00 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**-1.710,00 M2**
SALDO ÍTEM	**16.420,00 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 23

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	MI
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
136	Base Granular clase B		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
27.744,00	670,90	221,30	892,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+360		Izquierdo	0,00			1,43	0,00	
2	PR0+370		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
3	PR0+380		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
4	PR0+390		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
5	PR0+400		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
6	PR0+410		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
7	PR0+420		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
8	PR0+430		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	Vía Armenia-Montenegro Calzada Izquierda carril derecho.
9	PR0+440		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
10	PR0+450		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
11	PR0+460		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
12	PR0+470		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
13	PR0+480		Izquierdo	10,00			1,43	14,30	
14	PR0+490		Izquierdo	10,00			1,59	15,10	
15	PR0+500		Izquierdo	10,00			1,73	16,60	
16	PR0+510		Izquierdo	10,00			1,87	18,00	
							TOTAL	**221,30**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	221,30 M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**221,30 M3**
SALDO ÍTEM	**26.851,80 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		25,58%	ACTA DE OBRA	X	23	Enero de 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	217322	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 1.011.291.133,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 1.011.291.133,00

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 23 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00 | MES: Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	18,00	$20.673.540,00	-	$ -	-	$ -
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	8.411,00	$868.519.860,00	32,10	$ 3.314.646,00	489,80	$ 50.576.748,00
3	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	56,70	$3.928.176,00	-	$ -	-	$ -
4	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	40.112,00	$415.159.200,00	-	$ -	-	$ -
5	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	8.626,00	$541.885.320,00	-	$ -	-	$ -
6	1	11601	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	36.399,90	$346.163.049,00	2.138,00	$ 20.332.380,00	20.788,20	$ 197.695.782,00
7	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	-	$ -	13.807,00	$ 133.927.900,00
8	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	79.760,00	$1.044.058.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	599,00	$6.211.630,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$3.622.959.175,00**		**$ 23.647.026,00**		**$ 382.200.430,00**
10	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	45.906,00	$6.433.725.900,00	529,20	$ 74.167.380,00	4.781,40	$ 670.113.210,00
11	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	2.658,00	$398.806.320,00	-	$ -	2.391,00	$ 358.745.640,00
12	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$7.640.939.820,00**		**$ 74.167.380,00**		**$ 1.028.858.850,00**
13	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	58.437,00	$170.051.670,00	-	$ -	4.499,00	$ 13.092.090,00
14	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	201.031,00	$369.897.040,00	16.220,50	$ 29.845.720,00	151.426,00	$ 278.623.840,00
15	8	11603	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	2.726,00	$1.965.364.220,00	-	$ -	-	$ -
16	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	9.740,00	$7.110.687.000,00	(230,20)	-$ 168.057.510,00	3.565,20	$ 2.602.774.260,00
17	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	9.700,00	$7.574.536.000,00	181,40	$ 141.651.632,00	6.597,50	$ 5.151.855.800,00
18	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	6.968,00	$584.475.840,00	-	$ -	4.021,50	$ 337.323.420,00
19	8	11603	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	29,00	$ 2.281.140,00
						SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$18.125.206.090,00**		**$ 3.439.842,00**		**$ 8.385.950.550,00**
20	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	4.596,00	$324.201.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	7.572,00	$196.341.960,00	2.138,50	$ 55.451.305,00	6.449,40	$ 167.232.942,00
23	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	11604	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	8.317,00	$363.536.070,00	374,70	$ 16.378.137,00	1.082,80	$ 47.329.188,00
25	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	7.380,00	$859.179.600,00	-	$ -	57,60	$ 6.705.792,00
26	6	11606	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	496,00	$1.365.864.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7	14104	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7	14104	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	1.989,00	$1.791.114.390,00	(261,80)	-$ 235.753.518,00	632,60	$ 569.662.626,00
29	7	14104	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	1.502,00	$1.000.437.140,00	4,60	$ 3.063.922,00	13,80	$ 9.191.766,00
31	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	174,00	$100.366.680,00	13,70	$ 7.902.434,00	33,20	$ 19.150.424,00
32	4	14104	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	11604	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	757.040,95	$3.573.233.297,00	(5.576,20)	-$ 26.319.664,00	208.153,90	$ 982.486.408,00
34	5	14104	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.834,00	$87.809.700,00	-	$ -	-	$ -
35	6	14104	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6	14104	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	11604	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6	11604	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -
40	6	11604	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	1.018,00	$719.471.500,00	47,70	$ 33.711.975,00	255,20	$ 180.362.600,00
41	6	11605	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	2.442,00	$200.170.740,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 23 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00 | MES: Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
42	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	14.999,00	$115.192.320,00	-	$ -	-	$ -
43	6	11604	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	384,60	$ 57.228.480,00
						SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$13.888.339.127,00**		**-$ 145.565.409,00**		**$ 2.039.350.226,00**
44	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	209.215,50	$393.325.140,00	256,00	$ 481.280,00	136.828,54	$ 257.237.655,00
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$30.609.280,00	-	$ -	1.859,00	$ 15.466.880,00
46	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	110,00	$43.390.600,00	-	$ -	-	$ -
47	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	689,00	$223.360.020,00	-	$ -	-	$ -
48	4	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	4.184,00	$944.203.280,00	-	$ -	15,00	$ 3.385.050,00
						SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$1.637.930.920,00**		**$ 481.280,00**		**$ 276.089.585,00**
50	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.771,00	$467.946.420,00	-	$ -	-	$ -
52	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	2.299.360,00	$2.529.296.000,00	13.841,60	$ 15.225.760,00	54.527,45	$ 59.980.191,00
53	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.397,00	$554.836.700,00	-	$ -	217.293,70	$ 239.023.070,00
						SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$3.552.079.120,00**		**$ 15.225.760,00**		**$ 299.003.261,00**
54	8	11603	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	68.000,00	1.404.336.000,00	5.574,40	$ 115.122.509,00	54.601,90	$ 1.127.638.439,00
55	6	11605	OA		2P	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 28.312,00	$ -	17.100,00	484.135.200,00	553,00	$ 15.656.536,00	7.296,90	$ 206.589.833,00
56	6	11605	OA		3P	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	M3		$ 140.191,00	$ -	1.200,00	168.229.200,00	159,30	$ 22.332.426,00	782,75	$ 109.734.505,00
57	6	11605	OA		4P	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 56.236,00	$ -	193,00	10.853.548,00	-	$ -	188,00	$ 10.572.368,00
58	6	11605	OA		5P	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 3.650.344,00	$ -	28,00	102.209.632,00	1,00	$ 3.650.344,00	9,00	$ 32.853.096,00
59	6	11605	OA		6P	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 2.005.686,00	$ -	7,00	14.039.802,00	-	$ -	-	$ -
60	6	11605	OA		7P	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 9.307.572,00	$ -	14,00	130.306.008,00	-	$ -	3,00	$ 27.922.716,00
61	6	11606	OA		8NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 72.233,00	$ -	1,00	72.233,00	-	$ -	-	$ -
62	6	11606	OA		9NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 144.855,00	$ -	3,00	434.565,00	-	$ -	2,00	$ 289.710,00
63	6	11606	OA		10NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 253.403,00	$ -	5,00	1.267.015,00	-	$ -	5,00	$ 1.267.015,00
64	6	11606	OA		11NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 435.056,00	$ -	1,00	435.056,00	-	$ -	1,00	$ 435.056,00
65	6	11606	OA		12NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 580.055,00	$ -	3,00	1.740.165,00	-	$ -	3,00	$ 1.740.165,00
66	6	11608	OA		13NP	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3		$ 120.930,00	$ -	50,00	6.046.500,00	-	$ -	41,00	$ 4.958.130,00
67	6	11605	OA		14NP	Caja movistar (no incluye acero).	und		$ 3.189.052,00	$ -	26,00	82.915.352,00	1,00	$ 3.189.052,00	13,00	$ 41.457.676,00
68	6	11607	OA		15NP	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3		$ 1.174.250,00	$ -	20,00	23.485.000,00	-	$ -	13,80	$ 16.204.650,00
69	6	11607	SCT		16NP	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U		$ 62.068,00	$ -	22,00	1.365.496,00	-	$ -	22,00	$ 1.365.496,00
70	8	11607	SCT		17NP	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U		$ 58.608,00	$ -	114,00	6.681.312,00	-	$ -	102,00	$ 5.978.016,00
71	8	11607	SCT		18NP	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U		$ 6.553,00	$ -	1.128,00	7.391.784,00	-	$ -	-	$ -
72	6	11606	OA		19NP	Roceria	Ha		$ 3.670.347,00	$ -	1,00	3.670.347,00	-	$ -	0,20	$ 734.069,00
73	6	11604	OA		20NP	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML		$ 223.900,00	$ -	240,00	53.736.000,00	-	$ -	-	$ -
74	8	11607	SCT		21NP	Marca vial	M2		$ 37.357,00	$ -	1.900,00	70.978.300,00	508,70	$ 19.003.506,00	1.000,42	$ 37.372.690,00
75	6	11606	OA		22NP	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML		$ 486.045,00		990,00	481.184.550,00	-	$ -	905,00	$ 439.870.725,00
76	2	11602	E		23NP	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3		$ 145.044,00		400,00	58.017.600,00	-	$ -	310,00	$ 44.963.640,00
77	8	11603	PA		24NP	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 8.413,00		7.000,00	58.891.000,00	1.118,70	$ 9.411.623,00	3.984,90	$ 33.524.964,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 23 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00 | MES: Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
78	2	11602	SB		25NP	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3		$ 150.977,00		3.000,00	452.931.000,00	-	$ -	1.282,00	$ 193.552.514,00
79	8	11602	SB		26NP	Suministro e instalación de Geocelda	M2		$ 49.211,00		5.000,00	246.055.000,00	-	$ -	-	$ -
80	4	11606	OA		27NP	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2		$ 11.435,00		4.000,00	45.740.000,00	460,50	$ 5.265.818,00	1.028,50	$ 11.760.898,00
81	6	11605	OA		28NP	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U		$ 3.034.523,00		2,00	6.069.046,00	-	$ -	1,00	$ 3.034.523,00
82	6	11605	OA		29NP	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	ML		$ 492.574,00		14,00	6.896.036,00	-	$ -	-	$ -
83	6	11606	OA		NP30	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 133.847,00		100,00	13.384.700,00	-	$ -	10,00	$ 1.338.470,00
84	6	11606	OA		NP31	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 291.653,00		150,00	43.747.950,00	-	$ -	18,00	$ 5.249.754,00
85	6	11606	OA		NP32	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 467.151,00		140,00	65.401.140,00	-	$ -	36,00	$ 16.817.436,00
86	6	11606	OA		NP33	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 869.286,00		142,00	123.438.612,00	-	$ -	22,00	$ 19.124.292,00
87	6	11606	OA		NP34	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.771.323,00		85,00	150.562.455,00	-	$ -	5,00	$ 8.856.615,00
88	6	11606	OA		NP35	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.991.653,00		110,00	219.081.830,00	-	$ -	5,00	$ 9.958.265,00
89	6	11606	OA		NP36	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 2.301.571,00		60,00	138.094.260,00	-	$ -	1,00	$ 2.301.571,00
90	6	11606	OA		NP37	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml		$ 1.945.330,00		380,00	739.225.400,00	7,00	$ 13.617.310,00	226,00	$ 439.644.580,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 23 ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00 | MES: Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91	6	11606	OA		NP38	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml		$ 3.258.506,00		230,00	749.456.380,00	13,00	$ 42.360.578,00	91,00	$ 296.524.046,00
92	6	11606	OA		NP39	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml		$ 2.633.845,00		200,00	526.769.000,00	20,00	$ 52.676.900,00	20,00	$ 52.676.900,00
93	6	11606	OA		NP40	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml		$ 4.341.649,00		120,00	520.997.880,00	60,00	$ 260.498.940,00	60,00	$ 260.498.940,00
94	6	11604	OA		NPR 41	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 233.759,00		400,00	93.503.600,00	-	$ -	71,10	$ 16.620.265,00
95	6	11604	OA		NPR 42	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 285.639,00		200,00	57.127.800,00	-	$ -	-	$ -
96	6	11604	OA		NPR 43	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 477.422,00		276,00	131.768.472,00	-	$ -	273,20	$ 130.431.690,00
97	6	11604	OA		NPR 44	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 653.901,00		208,00	136.011.408,00	-	$ -	167,60	$ 109.593.808,00
98	6	11604	OA		NPR 45	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 782.650,00		208,00	162.791.200,00	159,40	$ 124.754.410,00	204,30	$ 159.895.395,00
99	6	11604	OA		NPR 46	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.287.299,00		100,00	128.729.900,00	50,80	$ 65.394.789,00	50,80	$ 65.394.789,00
100	6	11604	OA		NPR 47	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.799.830,00		240,00	431.959.200,00	-	$ -	-	$ -
101	6	11604	OA		NP48	CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3		$ 463.639,00		60,00	27.818.340,00	-	$ -	-	$ -
102	8	11603	OA		NPR 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 11.286,00		10.000,00	112.860.000,00	539,00	$ 6.083.154,00	5.193,60	$ 58.614.970,00
103	5	14104	OA		NPR 50	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 14.708,00		591.074,00	8.693.516.392,00	-	$ -	561.540,60	$ 8.259.139.145,00
104	5	14104	OA		NP 51	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg		$ 261,00		491.074,00	128.170.314,00	-	$ -	-	$ -
105	5	14104	OA		NPR 52	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 4.813,00		491.074,00	2.363.539.162,00	-	$ -	-	$ -
106	6	11605	OA		NPR 53	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml		$ 133.652,00		7.000,00	935.564.000,00	221,30	$ 29.577.188,00	221,30	$ 29.577.188,00
107	6	11605	OA		NPR 54	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml		$ 166.522,00		10.000,00	1.665.220.000,00	-	$ -	900,00	$ 149.869.800,00
108	6	11604	OA		NPR 55	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 101.127,00		6,00	606.762,00	-	$ -	-	$ -
109	6	11604	OA		NPR 56	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 140.469,00		800,00	112.375.200,00	64,70	$ 9.088.344,00	400,20	$ 56.215.694,00
110	6	11604	OA		NP 57	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 668.507,00		24,00	16.044.168,00	-	$ -	3,00	$ 2.005.521,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 23 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.290.753.696,00 | MES: Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	6	11604	OA		NP 58	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 885.223,00		14,00	12.393.122,00	-	$ -	4,00	$ 3.540.892,00
112	6	11604	OA		NP 59	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 1.276.660,00		14,00	17.873.240,00	-	$ -	3,00	$ 3.829.980,00
113	6	11604	OA		NP 60	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	MI		$ 823.467,00		35,00	28.821.345,00	-	$ -	4,70	$ 3.870.295,00
114	6	11604	OA		NP 61	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI		$ 922.566,00		35,00	32.289.810,00	-	$ -	1,30	$ 1.199.336,00
115	6	11604	OA		NP 62	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI		$ 1.054.743,00		35,00	36.916.005,00	-	$ -	4,50	$ 4.746.344,00
116	6	11604	OA		NPR 63	Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 1.976.220,00		14,00	27.667.080,00	-	$ -	3,00	$ 5.928.660,00
117	6	11604	OA		NPR 64	Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.448.193,00		14,00	34.274.702,00	-	$ -	1,00	$ 2.448.193,00
118	6	11604	OA		NPR 65	Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.960.214,00		14,00	41.442.996,00	-	$ -	3,00	$ 8.880.642,00
119	6	11605	OA		NP 66	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2		$ 81.846,00		590,00	48.289.140,00	-	$ -	569,40	$ 46.603.112,00
120	6	11605	OA		NP 67	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2		$ 64.723,00		365,00	23.623.895,00	-	$ -	-	$ -
121	6	11605	OA		NPR 68	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2		$ 133.376,00		340,00	45.347.840,00	-	$ -	300,00	$ 40.012.800,00
122	6	11605	OA		NPR 69	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI		$ 126.896,00		490,00	62.179.040,00	(40,00)	-$ 5.075.840,00	410,00	$ 52.027.360,00
123	6	11605	OA		NPR 70	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI		$ 90.067,00		220,00	19.814.740,00	-	$ -	174,00	$ 15.671.658,00
124	6	11606	OA		NP 71	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	MI		$ 164.369,00		550,00	90.402.950,00	-	$ -	522,00	$ 85.800.618,00
125	6	11606	OA		NPR 72	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	MI		$ 773.142,00		6.000,00	4.638.852.000,00	-	$ -	450,00	$ 347.913.900,00
126	6	11605	OA		NP 73	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2		$ 34.405,00		11.120,00	382.583.600,00	1.136,00	$ 39.084.080,00	3.395,20	$ 116.811.856,00
127	6	11605	OA		NPR 74	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	MI		$ 124.270,00		500,00	62.135.000,00	-	$ -	-	$ -
128	6	11605	OA		NPR 75	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	MI		$ 93.889,00		500,00	46.944.500,00	129,20	$ 12.130.459,00	129,20	$ 12.130.459,00
129	2	11602	PA		NP 76	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 240.429,00		1.800,00	432.772.200,00	-	$ -	-	$ -
130	2	11602	PA		NPR 77	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 268.568,00		2.400,00	644.563.200,00	-	$ -	-	$ -
131	8	11603	PA		NP 78	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3		$ 976.719,00		1.680,00	1.640.887.920,00	144,30	$ 140.940.552,00	144,30	$ 140.940.552,00
132	6	11605	OA		NPR 79	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2		$ 103.906,00		16.600,00	1.724.839.600,00	(1.710,00)	-$ 177.679.260,00	180,00	$ 18.703.080,00
133	6	11605	OA		NPR 80	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2		$ 201.929,00		400,00	80.771.600,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 23 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.290.753.696,00 **MES** Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
134	6	11604	OA		NPR 81	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U		$ 1.971.133,00		25,00	49.278.325,00	-	$ -	-	$ -
135	6	11606	OA		NPR 82	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3		$ 1.066.482,00		45,00	47.991.690,00	-	$ -	-	$ -
136	2	11602	PA		NPR 83	Base Granular clase B	M3		$ 174.798,00		27.744,00	4.849.595.712,00	221,30	$ 38.682.797,00	892,20	$ 155.954.776,00
						SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		**37.540.429.524,00**		**$ 845.766.215,00**		**$ 13.571.184.541,00**
						Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		**$1.337,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**		**$ 86.157.343.433,00**	**$ 817.162.094,00**	**$ 25.982.637.442,30**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00		$ 4.498.396.661,00		$ 2.692.714.132,30
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00		$ 350.000.000,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**		**$ 91.005.740.094,00**	**$ 817.162.094,00**	**$ 28.675.351.574,60**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00		$ 665.041.946,00	$ 5.971.569,00	$ 209.550.650,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**		**$ 91.670.782.040,00**	**$ 823.133.663,00**	**$ 28.884.902.224,60**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00		$ 68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00		$ 12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**		**$ 80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -		$ 1.285.361.022,00	$ 193.801.219,00	$ 441.561.119,00
IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -		$ 244.218.594,00	$ 36.822.232,00	$ 83.896.614,00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -		**$ 1.529.579.616,00**	**$ 230.623.451,00**	**$ 525.457.733,00**
VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**		**$ -**	$ 279.790.383,00	**$ 3.515.924.585,85**
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**		**$ -**	$ 7.918.431,00	**$ 73.728.174,70**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**		**$ 26.896.363.423,00**	**$ 287.708.814,00**	**$ 3.589.652.760,55**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**		**$ 272.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 87.344.477.724,00		$ 119.527.464.539,00	$ 1.290.753.696,00	$ 32.632.837.279,45
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**		**$ 120.449.645.079,00**	**$ 1.341.465.928,00**	**$ 33.000.012.718,15**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.570.567.203,00	25,58%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 330.174.795,00	25,58%
Valor Amortizado Acumulado	$ 8.210.466.237,00	26,86%
Valor Saldo por Amortizar	$ 22.360.100.966,00	73,14%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	23.647.026,00	382.200.430,00
2 Sub-bases y bases	112.850.177,00	1.423.329.780,00
3 Transporte de materiales	15.225.760,00	299.003.261,00
4 Aceros y elementos metálicos	(21.053.846,00)	997.632.356,00
5 Acero Estructural y cables de acero	-	8.259.139.145,00
6 Concretos, morteros y obras varias	627.764.029,00	3.988.945.129,00
7 Concreto para superestructuras	(235.753.518,00)	569.662.626,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	294.482.466,00	10.062.724.715,30
TOTAL	817.162.094,00	25.982.637.442,30

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO | **ACTA No.:** 23 | **ACTA FINAL:** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.290.753.696,00 | **MES:** Enero de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | **PLAZO INICIAL:** 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | **FECHA DE SUSPENSION:** N/A | **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.13 de fecha 30/01/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	817.162.094,00	5.971.569,00	823.133.663,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	193.801.219,00	36.822.232,00	230.623.451,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	80.556 295,00	6.288.334,00	86.844.629,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	199.234.088,00	1.630.097,00	200.864.185,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**1.290.753.696,00**	**50.712.232,00**	**1.341.465.928,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	23.647.026,00	427.164.070,00
SB	74.167.380,00	1.222.411.364,00
PA	307.597.323,00	9.844.009.280,30
PC	-	-
OA	377.039.819,00	13.869.243.680,00
SCT	19.484.786,00	320.805.787,00
OV	-	-
T	15.225.760,00	299.003.261,00
ESTUDIOS	193.801.219,00	441.561.119,00
TOTAL	1.010.963.313,00	26.424.198.561,30

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE - ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	23.647.026,00	382.200.430,00
11602 - Afirmados, subbases y bases	112.850.177,00	1.423.329.780,00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	274.997.680,00	9.746.669.476,30
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	289.425.652,00	2.044.289.104,00
11605 - Obras de urbanismo	(57.135.015,00)	913.572.030,00
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	374.419.546,00	2.002.803.025,00
11607 - Señalización y control de transito	19.484.786,00	337.010.437,00
11608 -Transporte y sobre acarreos	15.225.760,00	303.961.391,00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	(235.753.518,00)	8.828.801.771,00
TOTAL	817.162.094,00	25.982.637.444,30

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.290.753.696,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 960.578.901,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.011.291.133,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

4

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE Enero de 2023 SEGUIMIENTO No. 23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.290.753.696,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	1 / 25 al 31 de Marzo de 2021	2 / Abril de 2021	3 / Mayo de 2021	4 / Junio de 2021	5 / Julio de 2021	6 / Agosto de 2021	7 / Septiembre de 2021	8 / Octubre de 2021	9 / Noviembre de 2021	10 / Diciembre de 2021	11 / Enero de 2022	12 / Febrero de 2022	13 / Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,61%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
	$ 8.615.826,84	12,26%	427.164,07	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,74%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	90%
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.222.411,36	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	14,01%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	80%
	$ 16.564.435,43	23,58%	9.844.009,28	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.874,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.656,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	19,74%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	70%
	$ 41.006.865,29	58,36%	13.869.243,68	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,46%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	60%
	$ 1.999.577,60	2,85%	320.805,79	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,43%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	40%
	$ 5.590.538,62	7,96%	299.003,26	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.356,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$141.789,67	$141.789,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%	30%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	36,98%																20%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 86.150.563,36	122,62%	25.982.637,44																10%
																			0%

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.874,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.874,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $4.498.396,66	$2.692.714,13	59,86%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $671.822,02	$209.550,65	31,19%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $26.896.363,42	$3.589.652,76	13,35%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $272.000,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.285.361,02	$525.457,73	40,88%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $244.218,59	$83.896,61	34,35%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $1.529.579,62	$609.354,35	39,84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$7.017.375,28	20,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$34.299.081,72		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$33.000.012,72	27,40%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original. Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE Enero de 2023 SEGUIMIENTO No. 23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.290.753.696,00

CONTRATO DE OBRA No: 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,61%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
	$ 8.615.826,84	12,26%	427.164,07	$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
				$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07				110%
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%				
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,74%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	100%
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.222.411,36	$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.690,43	
				$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36				90%
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%				
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	14,01%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	80%
	$ 16.564.435,43	23,58%	9.844.009,28	$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	
				$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28				70%
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	19,74%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	60%
	$ 41.006.865,29	58,36%	13.869.243,68	$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	
				$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68				50%
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%				
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,46%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	40%
	$ 1.999.577,60	2,85%	320.805,79	$P		$95.648,13	$1.500.842,48	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
				$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79				30%
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%				
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				10%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,43%	%P		0,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,14%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	0%
	$ 5.590.538,62	7,96%	299.003,26	$P		$105.389,58	$1.570.553,79	$166.994,97	$266.494,97	$517.203,56	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	
				$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$288.592,55	$283.726,13	$283.777,50	$299.003,26				
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	36,98%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 86.150.563,36	122,62%	25.982.637,44																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%
	VALOR (Miles de Pesos)		12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%			
	VALOR (Miles de Pesos)		613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%			
	VALOR (Miles de Pesos)		6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44			

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $4.498.396,66	$2.692.714,13	59,86%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $671.822,02	$209.550,65	31,19%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $26.896.363,42	$3.589.652,76	13,35%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $272.000,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.285.361,02	$525.457,73	40,88%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $244.218,59	$83.896,61	34,35%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $1.529.579,62	$609.354,35	39,84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$7.017.375,28	20,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$34.299.081,72		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$33.000.012,72	27,40%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Febrero de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 DE Enero de 2023 SEGUIMIENTO No. 23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.290.753.696,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,61%	%P		11,47%	14,47%	12,26%
				$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$8.615.826,84
	$ 8.615.826,84	12,26%	427.164,07	$E				
				%E				
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	1,74%	%P		11,19%	14,19%	17,40%
				$P		$7.861.884,78	$9.969.676,31	$12.223.861,26
	$ 12.223.861,26	17,40%	1.222.411,36	$E				
				%E				
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	14,01%	%P		15,53%	16,33%	23,58%
				$P		$10.908.521,23	$11.470.589,97	$16.564.435,43
	$ 16.564.435,43	23,58%	9.844.009,28	$E				
				%E				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	19,74%	%P		17,40%	34,40%	58,36%
				$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$41.006.865,29
	$ 41.006.865,29	58,36%	13.869.243,68	$E				
				%E				
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,46%	%P		2,28%	2,38%	2,85%
				$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$1.999.577,60
	$ 1.999.577,60	2,85%	320.805,79	$E				
				%E				
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,21%
				$P		$0,00	$0,00	$149.458,32
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E				
				%E				
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,43%	%P		5,74%	6,24%	7,96%
				$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$5.590.538,62
	$ 5.590.538,62	7,96%	299.003,26	$E				
				%E				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	36,98%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 86.150.563,36**	122,62%	25.982.637,44					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	11,60%	24,40%	34,61%
	VALOR (Miles de Pesos)	8.150.127,25	17.143.371,10	24.319.767,26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63,60%	88,00%	122,62%
	VALOR (Miles de Pesos)	44.687.424,99	61.830.796,10	86.150.563,36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			
	VALOR (Miles de Pesos)			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			
	VALOR (Miles de Pesos)			

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $4.498.396,66	$2.692.714,13	59,86%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $671.822,02	$209.550,65	31,19%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $26.896.363,42	$3.589.652,76	13,35%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $272.000,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.285.361,02	$525.457,73	40,88%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $244.218,59	$83.896,61	34,35%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $1.529.579,62	$609.354,35	39,84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 / $34.299.081,72	$7.017.375,28	20,46%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 / $120.449.645,08	$33.000.012,72	27,40%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba: _____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 23 **Valor basico** 1.290.753.696,00 **Período** Enero de 2023

Valor incluido el Iva $ 1.341.465.928,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-		-	**-**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	1.187.588.087,00		-	**1.187.588.087,00**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS		-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ		-	153.877.841,00	**153.877.841,00**
						-
	TOTALES		**1.187.588.087,00**		**153.877.841,00**	**1.341.465.928,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Obras)	$ 669.255.822,00	$ 664.400.587,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Social)	$ 200.864.185,00	$ 199.234.088,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Predial)	$ 86.844.629,00	$ 80.556.295,00
	MUNICIPIO 4	ARMENIA (Estudios y Diseños)	$ 230.623.451,00	$ 193.801.219,00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1.187.588.087,00**	**$ 1.137.992.189,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	$ 153.877.841,00	$ 152.761.507,00
	MUNICIPIO 2	ALCALA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 153.877.841,00**	**$ 152.761.507,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Apoderado
INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN MUROS LA MARIA

Período de Revisión 2 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Especialista en Estructuras	$ 6.510.132,00		1,00	2,00	$ 13.020.264,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Dibujante	$ 1.923.268,00		0,80	1,60	$ 3.077.229,00
					$	**16.097.493,00**
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$**	**29.780.362,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 2.000.000,00		0,50	$ 1.000.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, e-mail, etc)	Global	$ 500.000,00		0,25	$ 125.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$**	**1.579.263,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)				**$**	**31.359.625,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$**	**5.958.329,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$**	**37.317.954,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO PUENTES - PUENTE 0+0140 - 0+0295

Período de Revisión 3 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1,8	Especialista en Estructuras	$ 6.510.132,00		0,55	1,65	$ 19.335.092,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Dibujante	$ 1.923.268,00		0,55	1,65	$ 3.173.392,00
						$ 22.508.484,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 41.640.695,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1.000.000,00		0,50	$ 500.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, e-mail, etc)	Global	$ 500.000,00		0,25	$ 125.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1.079.263,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 42.719.958,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 8.116.792,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 50.836.750,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO PUENTES - PUENTE 0+0295 - 0+0450

Período de Revisión 3 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1,8	Especialista en Estructuras	$ 6.510.132,00		0,55	1,65	$ 19.335.092,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Dibujante	$ 1.923.268,00		0,55	1,65	$ 3.173.392,00
						$ 22.508.484,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 41.640.695,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1.000.000,00		0,50	$ 500.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, e-mail, etc)	Global	$ 500.000,00		0,25	$ 125.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1.079.263,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 42.719.958,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 8.116.792,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 50.836.750,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO

DIRECTOR DE OBRA

MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

Diseño señalización horizontal, vertical y obras de seguridad vial Variante de alcala

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista en señalización	$ 6.510.132,00		0,20	0,20	$ 1.302.026,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	$ 2.173.440,00	$ 550.000,00	0,20	0,20	$ 544.688,00
						$ 1.846.714,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 3.416.421,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	Elaboración de informe y plano	Mes	$ 2.000.000,00	0,5	0,50	$ 500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 500.000,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 3.916.421,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 744.120,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 4.660.541,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO

DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

Diseño hidraulico sector Torres del rio - El pescador (via Armenia - Calarca) y Armenia - Montenegro sector Mercar alcantarillado pluvial PR 0+0000 - 0+0800.

Período de Revisión 2 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista hidraulico	$ 6.510.132,00		0,60	1,20	$ 7.812.158,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	$ 2.173.440,00	$ 550.000,00	0,20	0,40	$ 1.089.376,00
						$ 8.901.534,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 16.467.838,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Elaboración de informes y planos	Mes	$ 2.000.000,00	0,5	1,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1.000.000,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 17.467.838,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 3.318.889,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 20.786.727,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO

DIRECTOR DE OBRA

MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

Diseño señalización horizontal, vertical y obras de seguridad vial TORRES DEL RIO

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista en señalización	$ 6.510.132,00		0,20	0,20	$ 1.302.026,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Topógrafo	$ 2.173.440,00	$ 550.000,00	0,20	0,20	$ 544.688,00
						$ 1.846.714,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 3.416.421,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	Elaboración de informe y plano	Mes	$ 2.000.000,00	0,5	0,50	$ 500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 500.000,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 3.916.421,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 744.120,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 4.660.541,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO

DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN -MURO MERCAR Muro H= 5mts y Pantalla sobre pilotes

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
					0,00	$ -
1	Ingeniero Estructural	$ 6.510.132,00		0,40	0,40	$ 2.604.053,00
1	Especialista en Geotecnia	$ 6.510.132,00		0,40	0,40	$ 2.604.053,00
	PERSONAL TÉCNICO					
1	Dibujante	$ 1.923.268,00		0,20	0,20	$ 384.654,00
1	Topógrafo	$ 2.173.440,00	$ 550.000,00	0,10	0,10	$ 272.344,00
						$ 5.865.104,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 10.850.442,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
	Sondeos por Rotación aluvión	m	$ 420.000,00		0,00	$ -
	Sondeos por Rotación	m	$ 305.000,00		0,00	$ -
	Sondeo por percusión	m	$ 170.000,00		0,00	$ -
	Trinchera	und	$ 350.000,00		0,00	$ -
	Linea de refracción sísmica 100 m	und	$ 1.200.000,00		0,00	$ -
	Ensayos de caracterización del subsuelo	Und	$ 250.000,00		0,00	$ -
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	Reproducción de Documentos					
1	- informe final geotecnista	GBL	$ 500.000		1,00	$ 500.000,00
1	- Informe diseños estabilidad de taludes	GBL	$ 500.000		1,00	$ 500.000,00
1	- Diseño Estructural Muros de Contencion	GBL	$ 500.000		1,00	$ 500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1.500.000,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 12.350.442,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 2.346.584,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 14.697.026,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR MERCAR PR 0+0000 - 0+0500 Y CONEXIÓN VIA ARMENIA

Período de Revisión 1,5 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista en Pavimento	$ 6.510.132,00		0,60	0,90	$ 5.859.119,00
	OTRO PERSONAL					
3	Obrero	$ 906.000,00		0,10	0,15	$ 407.700,00
						$ 6.266.819,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 11.593.615,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
1	Especialistas	Día	$ 220.000,00	2,00	3,00	$ 660.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
3	Apique	und	$ 180.000,00		3,00	$ 540.000,00
1	Humedade natural	und	$ 6.500,00		1,00	$ 6.500,00
1	Limites de Atterberg	und	$ 55.000,00		1,00	$ 55.000,00
1	Granulometria Capas Granulares	und	$ 40.000,00		1,00	$ 40.000,00
1	Lavado T200	und	$ 12.000,00		1,00	$ 12.000,00
1	Ensayo de compactación	und	$ 90.000,00		1,00	$ 90.000,00
1	CBR inalterado en laboratorio sumergido	und	$ 110.000,00		1,00	$ 110.000,00
1	CBR de laboratorio para capas granulares	und	$ 180.000,00		1,00	$ 180.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1.000.000,00		0,80	$ 800.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 2.947.763,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 14.541.378,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 2.762.862,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 17.304.240,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 0+0500 - 4+0000 via Armenia - Montenegro

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista en Pavimento	$ 6.510.132,00		0,60	0,60	$ 3.906.079,00
	OTRO PERSONAL					
3	Obrero	$ 906.000,00		0,10	0,10	$ 271.800,00
						$ 4.177.879,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 7.729.076,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
1	Especialistas	Día	$ 220.000,00	2,00	2,00	$ 440.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
11	Apique	und	$ 180.000,00		11,00	$ 1.980.000,00
11	Humedade natural	und	$ 6.500,00		11,00	$ 71.500,00
11	Limites de Atterberg	und	$ 55.000,00		11,00	$ 605.000,00
1	Granulometria Capas Granulares	und	$ 40.000,00		1,00	$ 40.000,00
1	Lavado T200	und	$ 12.000,00		1,00	$ 12.000,00
1	Ensayo de compactación	und	$ 90.000,00		1,00	$ 90.000,00
3	CBR inalterado en laboratorio sumergido	und	$ 110.000,00		3,00	$ 330.000,00
1	CBR de laboratorio para capas granulares	und	$ 180.000,00		1,00	$ 180.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1.000.000,00		0,80	$ 800.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 5.002.763,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 12.731.839,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 2.419.049,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 15.150.888,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro					
1	Especialista en Pavimento	$ 6.510.132,00		0,60	0,60	$ 3.906.079,00
	OTRO PERSONAL					
3	Obrero	$ 906.000,00		0,10	0,10	$ 271.800,00
						$ 4.177.879,00
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1,85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					**$ 7.729.076,00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
1	Especialistas	Día	$ 220.000,00	2,00	2,00	$ 440.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
9	Apique	und	$ 180.000,00		9,00	$ 1.620.000,00
8	Humedade natural	und	$ 6.500,00		8,00	$ 52.000,00
8	Limites de Atterberg	und	$ 55.000,00		8,00	$ 440.000,00
1	Granulometria Capas Granulares	und	$ 40.000,00		1,00	$ 40.000,00
1	Lavado T200	und	$ 12.000,00		1,00	$ 12.000,00
1	Ensayo de compactación	und	$ 90.000,00		1,00	$ 90.000,00
2	CBR inalterado en laboratorio sumergido	und	$ 110.000,00		2,00	$ 220.000,00
1	CBR de laboratorio para capas granulares	und	$ 180.000,00		1,00	$ 180.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1.000.000,00		0,80	$ 800.000,00
1	Software	Global	$ 908.526,00		0,50	$ 454.263,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 4.348.263,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$ 12.077.339,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 2.294.694,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 14.372.033,00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

PAGO ACTA DE OBRA No 23 MES DE ENERO 2023						
ORDEN	**ITEM**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR BÁSICO**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**	**OBSERVACIONES**
1	VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN MUROS LA MARIA	1	GL	$ 31.359.625,00	$ 37.317.954,00	
2	VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO PUENTES - PUENTE 0+0140 - 0+0295	1	GL	$ 42.719.958,00	$ 50.836.750,00	
3	VOLUMEN DE FUNDACIONES - CAPITULO PUENTES - PUENTE 0+0295 - 0+0450	1	GL	$ 42.719.958,00	$ 50.836.750,00	
4	Diseño señalización horizontal, vertical y obras de seguridad vial Variante de alcala	1	GL	$ 3.916.421,00	$ 4.660.541,00	
5	Diseño señalización horizontal, vertical y obras de seguridad vial TORRES DEL RIO	1	GL	$ 3.916.421,00	$ 4.660.541,00	
6	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN - MURO MERCAR Muro H= 5mts y Pantalla sobre pilotes	1	GL	$ 12.350.442,00	$ 14.697.026,00	
7	DISEÑO HIDRAULICO SECTOR LA MARIA - EL PESCADOR - ALCANTARILLADO SANITARIO MERCAR	1	GL	$ 17.467.838,00	$ 20.786.727,00	
8	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR MERCAR PR 0+0000 - 0+0500 Y CONEXIÓN VIA ARMENIA	1	GL	$ 14.541.378,00	$ 17.304.240,00	
9	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 0+0500 - 4+0000 via Armenia - Montenegro	1	GL	$ 12.731.839,00	$ 15.150.888,00	
10	DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PR 4+0000 - 7+0000 via Armenia - Montenegro	1	GL	$ 12.077.339,00	$ 14.372.033,00	
SUB -TOTAL				**$ 193.801.219,00**	**$ 230.623.450,00**	

ING. JULIAN MORENO SANZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS S.A.S NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°
Fecha
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 6.9 X MIL PARA BOGOTÁ D.C
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	02	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	TV 5926 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:		**Hora emisión:**		**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:					
Total de Líneas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE OBRA No. 23 PERIODO: ENERO de 2023 VALOR BASICO OBRAS:		$ 817.162.094,00	$ 817.162.094,00
			IVA 19% - AIU 30% - U 5%		$ 5.971.569,00	$ 5.971.569,00
			ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 193.801.219,00	$ 193.801.219,00
			IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 36.822.232,00	$ 36.822.232,00
			GESTION PREDIAL		$ 80.556.295,00	$ 80.556.295,00
			IVA GESTION PREDIAL		$ 6.288.334,00	$ 6.288.334,00
			GESTION SOCIAL		$ 199.234.088,00	$ 199.234.088,00
			IVA GESION SOCIAL		$ 1.630.097,00	$ 1.630.097,00
			MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			$ 330.174.795,00

SON: (MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100)

NOTAS:

CONTRATO 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."

#$24-02-00;1904-2020;rbaezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$ 960.578.901,00
IVA	$50.712.232,00
TOTAL:	$ 1.011.291.133,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

BORRADOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 2 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 23
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución dia, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO "CONTRATO DE OBRA Nº. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

N° CONTRATO 1904-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$	**87.906.264.713,00**
Valor Adicional No.	$	**32.126.901.413,00**
Valor Adicional No.	$	**416.478.753,00**
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	**120.449.645.079,00**

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	26.896.363.423,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	26.896.363.423,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	26.896.363.423,00

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1913-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2023

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	5.999.975.010,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	5.999.975.010,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

							CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° Fecha									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR						CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN					VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00						
									SUBTOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0**	$ 0,00												

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Carlos Mendez Lezama
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 2520219017 CND

Firma
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF. 2202-13914 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Joyce Arboleda Garcia
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. :25.568 RES. 110 DEL 2009

Vo. Bo. Firma
Nombre : **DIEGO ALEJANDRO ORREGO**
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : ***6623814701 RIS***

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Escriba el texto aquí

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	23	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grandes Proyectos y Túneles	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"."	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1904 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1913 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	13	DICIEMBRE	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)		ITEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes	Unitario	32.310	$ 190	$ 6.138.900		X		$ 6.467.638	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	17.310	$ 3.465.021	$ 3.002.617	
	Avisos	Unitario	10	$ 550.000	$ 5.500.000		X		$ 5.794.525	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	4	$ 2.317.810	$ 3.476.715	
	Pendones	Unitario	10	$ 80.000	$ 800.000		X		$ 842.840	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 842.840	
	Plegables	Unitario	1500	$ 470	$ 705.000		X		$ 742.753	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 742.753	
	Cuñas radiales	Unitario	4.608	$ 1.953	$ 8.999.424		X		$ 9.481.343	310	$ 605.430	4,5%	$ 32.421	$ 637.851	1977	$ 4.067.842	$ 5.413.501	El valor cobrado corresponde a la emisión de 10 cuñas diarias entre el 1 al 31 de diciembre de 2022
	Cartillas	Unitario	1500	$ 4.200	$ 6.300.000		X		$ 6.637.365	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.637.365	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad	Unitario	2472	$ 6.000	$ 14.832.000		X		$ 15.626.254	276	$ 1.656.000	4,5%	$ 88.679	$ 1.744.679	1155	$ 7.295.097	$ 8.331.157	El valor cobrado corresponde a las capacitaciones realizadas con el SENA con la comunidad de patio bonito bajo y reunión extraordinaria con la comunicad del tramo Armenia Montenegro

Cultura vial y participación comunitaria	Kit capacitaciones en seguridad vial	Unitario	600	$ 29.800	$ 17.880.000	X		$ 18.837.474	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	589	$ 18.492.120	$ 345.354	
	Kits campaña en seguridad vial	Unitario	500	$ 23.500	$ 11.750.000	X		$ 12.379.213	500	$ 11.750.000	4,5%	$ 629.213	$ 12.379.213	500	$ 12.379.213	$ -	Se realizo la entrega de 200 kits en el tramo Armenia montenegro, 200 kits en el tramo armenia calarcá y 100 kits en el tramo quimbaya cartago, durante la ejecución de la campaña vial "la seguridad nunca se toma vacaciones"
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria	Unitario	1225	$ 6.000	$ 7.350.000	X		$ 7.743.593	55	$ 330.000	4,5%	$ 17.672	$ 347.672	461	$ 2.914.119	$ 4.829.474	El valor cobrado corresponde a las reuniones con el comité de participación comunitaria, CPC de Montenegro y sector la Florida
Proyectos productivos y obras con participación comunitaria	Obras con participación comunitaria	Unitario	3	$ 400.000.000	$ 1.200.000.000	X		$ 1.264.260.000	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 621.291.402	$ 642.968.598	
	Capacitaciones en unidades productivas	Unitario	1	$ 126.700.000	$ 126.700.000	X		$ 133.484.785	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 62.791.580	$ 70.693.205	
Protección al patrimonio arqueologico y cultural	Plan de manejo de hallazgos fortuitos	Unitario	1	$ 27.888.840	$ 27.888.840	X		$ 29.382.287	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 29.382.287	
INVIAS/Gerencia de regiones	Plan de acciones integrales en proyectos estrategicos del INVIAS	Global	1	$ 200.000.000	$ 200.000.000	X		$ 210.710.000	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 47.154.376	$ 163.555.624	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO 2000											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)				VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Compensación impacto social	Factores de compensación social a unidades sociales	Global	Global	$ 2.500.000.000	$ 2.500.000.000	X		$ 2.633.875.000		0	$ 176.313.200	4,5%	$ 9.441.572	$ 185.754.772	0	$ 716.980.125	$ 1.916.894.875	El valor cobrado corresponde al pago de los factores sociales de: ADIELA CEBALLOS (UMV,UME) CLARA INES BOTERO (UMV,UME,TDO,ARRDO,HTO)ORLANDA BETANCOURTH CLAVIJO (UMV,UME,ARRDO,TDO)

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 190.654.630	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 190.654.630	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	8.579.458
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 1.630.097	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	15.109.414
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 200.864.185	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	185.754.772
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.857.118.366	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	1.499.148.703
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.356.267.069	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		34,41%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Ing. Carlos Fernando Mendez Lezama**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **Yaqueline Hurtado Dominguez**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **52.213.840**

Firma
Nombre: **Ing. Hector Miguel Diaz Gomez**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma
Nombre: **Natalia Garcias Cuartas**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: **28538381**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 23**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **28/01/2023** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2023**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: **No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	AAAA-MM-DD	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2023**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**26.896.363.423**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	**$11.896.363.423**
21. VR. ANTICIPO:	$0
22. VR. ADICIÓN No. 1:	**$15.000.000.000**
23. VR. ADICIÓN No:	$0
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$15.000.000.000**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$26.896.363.423**

III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE**	**1**	**$ 1.394.000**	**$ 1.394.000**
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		**$ 2.788.000**	**$ 0**
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	**1**	**$ 1.045.000**	**$ 1.045.000**
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		**$ 348.500**	**$ 0**
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	**7**	**$ 1.074.000**	**$ 7.518.000**
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL		**$ 805.500**	**$ 0**
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		**$ 268.500**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)**	**3**	**$ 754.000**	**$ 2.262.000**
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	**2**	**$ 377.000**	**$ 754.000**
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	**1**	**$ 377.000**	**$ 377.000**
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		**$ 320.000**	**$ 0**
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		**$ 217.000**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO**	**2**	**$ 1.340.000**	**$ 2.680.000**
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	**4**	**$ 2.680.000**	**$ 10.720.000**
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	**6**	**$ 860.000**	**$ 5.160.000**
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		**$ 430.000**	**$ 0**
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		**$ 640.000**	**$ 0**
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		**$ 320.000**	**$ 0**
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		**$ 346.500**	**$ 0**
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		**$ 346.500**	**$ 0**
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 115.500**	**$ 0**
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		**$ 462.000**	**$ 0**
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 231.000**	**$ 0**
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		**$ 231.000**	**$ 0**
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		**$ 321.000**	**$ 0**
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 321.000**	**$ 0**
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 107.000**	**$ 0**
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		**$ 749.000**	**$ 0**
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		**$ 642.000**	**$ 0**
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		**$ 150.000**	**$ 0**
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		**$ 300.000**	**$ 0**
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		**$ 150.000**	**$ 0**
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 150.000**	**$ 0**
1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		**$ 640.000**	**$ 0**
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				**$ 31.910.000**
IVA				**$ 6.062.900**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 37.972.900**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 23	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **28/01/2023** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2023**	MES [1] **2** 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		

7. OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	AAAA-MM-DD	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2023**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**26.896.363.423**

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
008ADT1MCACAQCYC	**M**	LANDA CLAVIJO BETA	41.929.239	NA		NA	$ 0	$ 0	$ 29.713.400	$ 29.713.400	**100%**
008BDT1MCACAQCYC	**M**	ARA INES BOTERO UR	41.925.619	NA		NA	$ 0	$ 0	$ 17.746.400	$ 17.746.400	**100%**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**47.459.800**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	47.459.800
64. **OTROS** (Porcentaje de Administración 2,5%)	1.186.495
65. **IVA**	225.434
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	48.871.729


IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	80.556.295
68. IVA PRESENTE PREACTA	6.288.334
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**86.844.629**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	37.972.900

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$1.996.324.473
72. GESTIÓN PREDIAL	$31.910.000
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$47.459.800
74. OTROS	$1.186.495
75. IVA	6.288.334
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$2.083.169.102
77. SALDO POR EJECUTAR	**$24.813.194.321**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**	NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ**
C.C. **X** C.E. __	NUMERO **14.270.552**	C.C. **X** C.E. __	NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO **25202-19017 CND**	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO **25202-13914 CND**
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **28/01/2023**

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
CONTRATO DE OBRA No	**1904 DE 2020**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	**1913 DE 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)**		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
008ADT1MCACAQCYC	41.929.239	MARIA ORLANDA CLAVIJO BETANCOURTH	K0+307,53	K0+322,63	$ 29.713.400
008BDT1MCACAQCYC	41.925.619	CLARA INES BOTERO URIBE	K0+308,72	K0+321,80	$ 17.746.400



Firma

Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25222-324243 CND



Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDIO

PRE ACTA PREDIAL No: VEINTITRÉS (23)
PERIODO - MES: ENERO DE 2023
FECHA ELABORACION: VEINTIOCHO DE ENERO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2023

VALOR ADICIÓN No:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCION

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestion Predios					Gestion Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
0014QT19CACAQCYC	MARTHA INES PARRA CHACON - ROSENDO ALMANZA GARCIA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14										
0015T19CACAQCYC	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	ACTA 9		ACTA 9 Y 23											
0023T19CACAQCYC	ASOCIACION ARRAZAR	ACTA 9		ACTA 9 Y 23											
0030T19CACAQCYC	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15										
0040T19CACAQCYC	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	ACTA 9		ACTA 9											
0053T19CACAQCYC	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15										
0060T19CACAQCYC	ANA MILENA BENAVIDES ECHEVERRY	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14										
0070T19CACAQCYC	MARIO CABEZAS LOPEZ	ACTA 9	ACTA 23	ACTA 9	ACTA 15										
0080T19CACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 19													
0084QT19CACAQCYC	MARIA ORLANDA BETANCOURTH CLAVIJO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0088QT19CACAQCYC	CLARA INES BOTERO URIBE	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0092T19CACAQCYC	MARTHA LUCIA TORO LOPEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0105T19CACAQCYC	ALDEMAR URIBE MORA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0112QT19CACAQCYC	ISABEL DIAZ PERALTA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0122QT19CACAQCYC	ALBA LUCY LIPESA DIAZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0130T19CACAQCYC	RUIZ OCAMPO ANDRES FELIPE Y OTROS	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0142T19CACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0152QT19CACAQCYC	WILSON WALTEROS SOTO	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0154QT19CACAQCYC	OLGA CECILIA WALTEROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0162T19CACAQCYC	JUAN MANUEL UPEQUI SUAREZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0172QT19CACAQCYC	ADELA CEBALLOS GOMEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14										
0180T19CACAQCYC	HOGAR CLINICA SAN RAFAEL DE BOGOTA	ACTA 23													
0184QT19CACAQCYC	ANGELICA JULIETH GARCIA CEBALLOS	ACTA 23													
0188QT19CACAQCYC	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	ACTA 23													
0192QT19CACAQCYC	LUZ VIANA CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23													
0196QT19CACAQCYC	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	ACTA 23													
0168QT19CACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 23													
0197QT19CACAQCYC	JOSÉ RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23													
0164QT19CACAQCYC	RUBIELA VALENCIA	ACTA 15		ACTA 16	ACTA 17										
0182T19CACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15										
0200T19CACAQCYC	HERNAN WILLIAN BOTERO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0212QT19CACAQCYC	LUCILA CORREA VELASQUEZ Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0214QT19CACAQCYC	FABIOLA CARDONA	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 14										
0222QT19CACAQCYC	FABIOLA CORREA ROMERO Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14										
0232QT19CACAQCYC	JOSE JESUS HIDALGO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0240QT19CACAQCYC	EDGAR VASQUEZ VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15										
0252QT19CACAQCYC	TOMAS E JARAMILLO CARDENAS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17										
0260T19CACAQCYC	INVERSIONA LA GUACA S.A.S.	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0270T19CACAQCYC	JUAN CAMILO BOTERO ZULUAGA Y OTROS 3	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0280T19CACAQCYC	MARIA GLADYS ECHEVERRY DE ARIZA	ACTA 16		ACTA 16											
0290T19CACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16											
0300T19CACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16											
0310T19CACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 16		ACTA 19	ACTA 21										
0320T19CACAQCYC	JULIO CESAR TAMAYO RESTREPO Y OTRA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20										
0340T19CACAQCYC	INVERSIONES CASTANEDA S.A.S Y OTROS 4	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23										
0350T19CACAQCYC	JESUS EVELIO FRANCO MEJIA Y OTROS 7	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23										
0360T19CACAQCYC	TERESITA RESTREPO MOLINA	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 20										
0370T19CACAQCYC	JORGE LUIS HERNANDEZ URIBE	ACTA 18		ACTA 17	ACTA 23										
0380T38CACAQCYC	MUNICIPIO DE CALARCA	ACTA 19		ACTA 19											
0400T38CACAQCYC	JOSE ORLANDO RANOS Y OTROS	ACTA 19		ACTA 19											
0410T38CACAQCYC	JOSE YESID RENDON Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
0414QT38CACAQCYC	JORGE AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
0418QT38CACAQCYC	EDELMIRA MATEUS OVALLE	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
0412QT38CACAQCYC	YAHIRE AGUDELO MATEUS Y OTRO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
0410QT38CACAQCYC	DIGNORI AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20										
0416QT38CACAQCYC	MARIA AYDEE SANCHEZ	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0418QT38CACAQCYC	RICARDO ANTONIO MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0419QT38CACAQCYC	ALBA NUBIA MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0418T38CACAQCYC	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23										
0412QT38CACAQCYC	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 23		ACTA 23											
0500T48CACAQCYC	ERNESTO AGUIRRE RUEDA Y OTRA	ACTA 21		ACTA 21											
0510T48CACAQCYC	OSCAR HERNANDO ARIETZABAL	ACTA 21		ACTA 21											
0520T48CACAQCYC	MARCUS JOHANNES TIMOTHEUS FOKKER Y OTRA	ACTA 21		ACTA 23											
0530T48CACAQCYC	LUIS EDUARDO ZAPATA CASTRO	ACTA 21		ACTA 23											
0540T48CACAQCYC	MARIA CIELO VASQUEZ GALLEGO	ACTA 21		ACTA 23											
0630T48CACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23										
0640T48CACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23										
0650T48CACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23										
0660MCACAQCYC	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PATIÑO	ACTA 19		ACTA 19											
TOTAL		**69**	**1**	**61**	**46**										
Preacta gestión y adquisición No. 9		8		8											
Preacta gestión y adquisición No. 12		9		9											
Preacta gestión y adquisición No. 14					15										
Preacta gestión y adquisición No. 15		14		14	5										
Preacta gestión y adquisición No. 16		10		6											
Preacta gestión y adquisición No. 17				4	4										
Preacta gestión y adquisición No. 18		1		1											
Preacta gestión y adquisición No. 19		14		6											
Preacta gestión y adquisición No. 20				7	9										
Preacta gestión y adquisición No. 21		5		2	1										
Preacta gestión y adquisición No. 23		8	1	4	12										
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
Preacta gestión y adquisición No															
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		**69**	**1**	**61**	**46**										

Firma
Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matricula Profesional No: 25222-324243 CND

Firma
Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Interval Andino
Matricula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **28/01/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

Pre-acta Predial No. 23
PERIODO - MES: **ENERO**
FECHA ELABORACION: **28/01/2023**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: VEINTITRÉS (23) MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

VALOR ADICIÓN No 1: $ 15.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
DVP 06/12/2022	6/12/2022	008ADT1	0	SI	K0+307,53	K0+322,663	NA	NA	NA	41.929.239	MARIA ORLANDA CLAVIJO BETANCOURTH	9/11/2022	$ 29.713.400,00	$ 29.713.400,00	$ -	100%
DVP 06/12/2022	6/12/2022	008BDT1	0	SI	K0+308,72	K0+321,80	NA	NA	NA	41.925.619	CLARA INES BOTERO URIBE	9/11/2022	$ 17.746.400,00	$ 17.746.400,00	$ -	100%
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ 47.459.800	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre: **Ing. MARVIN CUTIVA**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25222-324243 CND

Firma
Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido del mes de enero de 2023 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de febrero de 2023.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-13, 03:11:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1051127339

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 12/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	87	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005098872	JOHAN SEBASTIAN RUIZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.296.876	$ 207.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.296.876	$ 51.900	6,960	$ 1.296.876	$ 90.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.296.876	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.118.750	$ 179.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.118.750	$ 44.800	6,960	$ 1.118.750	$ 77.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.118.750	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.500
CC 1005254127	FABIAN DAVID ARISTIZABAL OQUENDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.222.917	$ 195.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.222.917	$ 49.000	6,960	$ 1.222.917	$ 85.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.222.917	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.900
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.917.708	$ 306.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.917.708	$ 76.800	6,960	$ 1.917.708	$ 133.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.917.708	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.000
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.773.672	$ 283.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.773.672	$ 71.000	6,960	$ 1.773.672	$ 123.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.773.672	$ 71.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.300
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.817.406	$ 290.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.817.406	$ 72.700	6,960	$ 1.817.406	$ 126.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.817.406	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.700
CC 1012368299	JUAN CAMILO BARAJAS CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1016052376	GABRIEL EFREN RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.231.250	$ 357.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.231.250	$ 89.300	6,960	$ 2.231.250	$ 155.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.231.250	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.900
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.361.966	$ 218.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.361.966	$ 54.500	6,960	$ 1.361.966	$ 94.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.361.966	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.800
CC 1031152541	JHON JAIR ZULUAGA ANIMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.695.000	$ 431.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.695.000	$ 107.800	6,960	$ 2.695.000	$ 187.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.695.000	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.400
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.209.375	$ 353.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.209.375	$ 88.400	6,960	$ 2.209.375	$ 153.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.209.375	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.100
CC 1054555304	NEIDER ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.582	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.582	$ 57.000	6,960	$ 1.423.582	$ 99.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.423.582	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.297.291	$ 207.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.297.291	$ 51.900	6,960	$ 1.297.291	$ 90.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.297.291	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.811.876	$ 290.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.811.876	$ 72.500	6,960	$ 1.811.876	$ 126.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.811.876	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 1065664211	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1075271206	JESUS JOAQUIN LOZANO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1079390385	BRAYAN MISAEL VEGA LOZADA	01	00		X								X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 775.730	$ 124.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 775.730	$ 31.100	4,350	$ 775.730	$ 33.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.158.914	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.500
CC 1083884434	CARLOS EDUARDO ALDANA CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.345.208	$ 215.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.345.208	$ 53.900	4,350	$ 1.345.208	$ 58.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.345.208	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 12/01/2023 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1051127339** **Periodo Cotización: diciembre de 2022** **Periodo Servicio: enero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.332.500	$ 373.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.332.500	$ 93.300	6,960	$ 2.332.500	$ 162.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.332.500	$ 93.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.200
CC 1094913698	CATERIN ALVAREZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.344.062	$ 215.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.344.062	$ 53.800	4,350	$ 1.344.062	$ 58.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.344.062	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.200
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.384.376	$ 221.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.384.376	$ 55.400	6,960	$ 1.384.376	$ 96.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.384.376	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.800
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.237.500	$ 198.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.237.500	$ 49.500	6,960	$ 1.237.500	$ 86.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.237.500	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.200
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096037593	OSCAR HUMBERTO BUSTOS GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.314.583	$ 210.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.314.583	$ 52.600	6,960	$ 1.314.583	$ 91.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.314.583	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.100
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.358.750	$ 217.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.358.750	$ 54.400	6,960	$ 1.358.750	$ 94.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.358.750	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.800
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 766.667	$ 122.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 766.667	$ 30.700	0,000	$ 766.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 766.667	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.100
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.427.020	$ 228.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.427.020	$ 57.100	4,350	$ 1.427.020	$ 62.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.427.020	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700
CC 1097039105	SERGIO EDUARDO CORREA OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.290.625	$ 206.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.290.625	$ 51.700	6,960	$ 1.290.625	$ 89.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.290.625	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.800
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.791.667	$ 286.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.791.667	$ 71.700	4,350	$ 1.791.667	$ 78.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.791.667	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.100
CC 1097389141	LUIS ERNEY CUERVO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.252.500	$ 200.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.252.500	$ 50.100	6,960	$ 1.252.500	$ 87.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.252.500	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.800
CC 1097390221	JEISON ALEXANDER MARTINEZ RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.189.583	$ 190.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.189.583	$ 47.600	6,960	$ 1.189.583	$ 82.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.189.583	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.400
CC 1097394576	RUBEN DARIO LOPEZ ACEVEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.381.667	$ 221.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.381.667	$ 55.300	6,960	$ 1.381.667	$ 96.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.381.667	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.900
CC 1097397824	JUAN CARLOS NOREÑA VASQUEZ	01	00	X									X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 71.250	$ 11.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 71.250	$ 2.900	6,960	$ 71.250	$ 5.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 90.884	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.000
CC 1097400017	CRISTIAN GUILLERMO HERRERA SUESCA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.104.167	$ 176.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.104.167	$ 44.200	6,960	$ 1.104.167	$ 76.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.104.167	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.734.792	$ 277.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.734.792	$ 69.400	6,960	$ 1.734.792	$ 120.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.734.792	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 100.001	$ 16.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.113.959	$ 178.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.113.959	$ 44.600	6,960	$ 1.113.959	$ 77.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.113.959	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.100
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.168.750	$ 187.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.168.750	$ 46.800	6,960	$ 1.168.750	$ 81.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.168.750	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.000
CC 1105054533	ROBINSON ANDRES TIQUE REPIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.166.667	$ 46.700	6,960	$ 1.166.667	$ 81.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 1110477534	DIEGO MAURICIO CARDENAS MATALLANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.632.813	$ 261.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.632.813	$ 65.400	6,960	$ 1.632.813	$ 113.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.632.813	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.800
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.229.166	$ 196.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.229.166	$ 49.200	4,350	$ 1.229.166	$ 53.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.229.166	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.600
CC 1121905122	JHOHAN ALEXIS DAZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.385.313	$ 221.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.385.313	$ 55.500	4,350	$ 1.385.313	$ 60.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.385.313	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.000
CC 1152712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
CC 1233691183	JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 1.553.200	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 5.648.700
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.310.833	$ 209.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.310.833	$ 52.500	4,350	$ 1.310.833	$ 57.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.310.833	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.900
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00	X									X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.611.750	$ 257.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.611.750	$ 64.500	6,960	$ 1.611.750	$ 112.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.611.750	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100
CC 16230543	CONRADO GARCIA DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.159.375	$ 185.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.159.375	$ 46.400	6,960	$ 1.159.375	$ 80.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.159.375	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.000
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.212.500	$ 354.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.212.500	$ 88.500	6,960	$ 2.212.500	$ 154.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.212.500	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 12/01/2023 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1051127339** **Periodo Cotización: diciembre de 2022** **Periodo Servicio: enero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.201.250	$ 352.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.201.250	$ 88.100	6,960	$ 2.201.250	$ 153.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.201.250	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.700
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.850.000	$ 456.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.850.000	$ 114.000	6,960	$ 2.850.000	$ 198.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.850.000	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.400
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.334.375	$ 213.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.334.375	$ 53.400	6,960	$ 1.334.375	$ 92.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.334.375	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.870.313	$ 299.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.870.313	$ 74.900	6,960	$ 1.870.313	$ 130.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.870.313	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.300
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 33.334	$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 33.334	$ 1.400	0,000	$ 33.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 18401456	CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.209.375	$ 193.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.209.375	$ 48.400	6,960	$ 1.209.375	$ 84.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.209.375	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.500
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.221.250	$ 195.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.221.250	$ 48.900	6,960	$ 1.221.250	$ 85.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.221.250	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.200
CC 18416109	FABIAN RINCON LONDOÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.253.125	$ 200.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.253.125	$ 50.200	6,960	$ 1.253.125	$ 87.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.253.125	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.200
CC 18418671	LEONARDO BEDOYA PUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.451.459	$ 232.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.451.459	$ 58.100	6,960	$ 1.451.459	$ 101.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.451.459	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.600
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.434.250	$ 229.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.434.250	$ 57.400	6,960	$ 1.434.250	$ 99.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.434.250	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.200
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.492.084	$ 238.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.492.084	$ 59.700	6,960	$ 1.492.084	$ 103.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.492.084	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.100
CC 41924991	LUZ MARIA QUINTERO AMEZQUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 4438857	GUSTAVO ANDRES VELASCO GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.116.251	$ 338.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.116.251	$ 84.700	6,960	$ 2.116.251	$ 147.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.116.251	$ 84.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.400
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00										X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 408.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 767.100
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00													X				0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 2.100.000	$ 357.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.100.000	$ 84.000	0,000	$ 2.100.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.000
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.323.125	$ 371.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.323.125	$ 93.000	6,960	$ 2.323.125	$ 161.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.323.125	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 719.400
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.495.001	$ 239.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.495.001	$ 59.900	4,350	$ 1.495.001	$ 65.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.495.001	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.200
CC 89002363	WILGEN MONTOYA PATIÑO	01	00										X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 732.146	$ 117.200	(EPS010) EPS SURA	$ 732.146	$ 29.300	6,960	$ 732.146	$ 51.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 732.146	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.800
CC 89002363	WILGEN MONTOYA PATIÑO	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 424.969	$ 68.000	(EPS010) EPS SURA	$ 424.969	$ 0	0,000	$ 424.969	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 424.969	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000
CC 89002363	WILGEN MONTOYA PATIÑO	01	00														X			0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 728.518	$ 116.600	(EPS010) EPS SURA	$ 728.518	$ 29.200	0,000	$ 728.518	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 622.708	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.800
CC 93436513	CARLOS ARTURO CARRERA SALCEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.187.500	$ 350.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.187.500	$ 87.500	6,960	$ 2.187.500	$ 152.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.187.500	$ 87.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.300
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.878.125	$ 300.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.878.125	$ 75.200	6,960	$ 1.878.125	$ 130.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.878.125	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.700
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.041	$ 256.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.600.041	$ 64.100	6,960	$ 1.600.041	$ 111.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.600.041	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.476.750	$ 236.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.476.750	$ 59.100	6,960	$ 1.476.750	$ 102.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.476.750	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.300
CC 94445575	CARLOS ANDRES TRUQUE GRANJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.302.500	$ 208.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.302.500	$ 52.100	6,960	$ 1.302.500	$ 90.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.302.500	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.300
CC 9732527	FERNEY ROMERO MONTEALEGRE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.575.834	$ 412.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.575.834	$ 103.100	6,960	$ 2.575.834	$ 179.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.575.834	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.700
CC 9732822	JHON FREDDY GRAJALES TEJADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.259.167	$ 201.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.259.167	$ 50.400	4,350	$ 1.259.167	$ 54.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.259.167	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.100
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.209	$ 216.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.355.209	$ 54.300	6,960	$ 1.355.209	$ 94.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.355.209	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.391.751	$ 222.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.391.751	$ 55.700	6,960	$ 1.391.751	$ 96.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.391.751	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 170.460.812	$ 170.460.812	$ 170.460.812	$ 170.757.820	$ 27.535.600	$ 7.860.500	$ 11.211.000	$ 6.816.200	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.044.600	$ 0	$ 54.044.600

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 13 de enero de 2023 03:17:41 PM

Período del informe: 202212

Pagada 12/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1051163497	12/01/2023	202212	202301																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$9.100.000	$9.100.000	$9.100.000	$9.100.000	$1.547.000	$1.137.500	$633.400	$364.000	$182.000	$273.000	$0	$0	$4.136.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 13 de enero de 2023 03:16:10 PM

Período del informe: 202212

Pagada 05/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 18371617	TABORDA BECERRA GUSTAVO ADOLFO	1051223420	05/01/2023	202212	202301										X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$2.910.533	$2.910.533	$2.910.533	$2.910.533	$465.700	$116.500	$126.700	$116.500	$0	$0	$0	$0	$825.400
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1051223420	05/01/2023	202212	202301																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$8.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$0	$320.000	$556.800	$320.000	$0	$0	$0	$0	$1.196.800
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1051223420	05/01/2023	202212	202301														X				4	4	4	4	230201	EPS008	14-4	CCF22	$1.040.000	$1.040.000	$1.040.000	$1.040.000	$176.800	$41.600	$0	$41.600	$0	$0	$0	$0	$260.000
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1051223420	05/01/2023	202212	202301																		26	26	26	26	230201	EPS008	14-4	CCF22	$6.760.000	$6.760.000	$6.760.000	$6.760.000	$1.149.200	$270.400	$470.500	$270.400	$0	$0	$0	$0	$2.160.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes


Se certifica que EDISON RAMIREZ DIAZ identificado(a) con CC 9732217 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA NI 800075467

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-12	2023-01	1868288805	9445532808	E	2023-01-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	4.35%	$1,000,000	$43,500
CCF	COMFENALCO QUINDIO	30	4%	$1,000,000	$40,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,000,000	$40,000

Este certificado se expide el día 2023-01-18 a las 04:29.

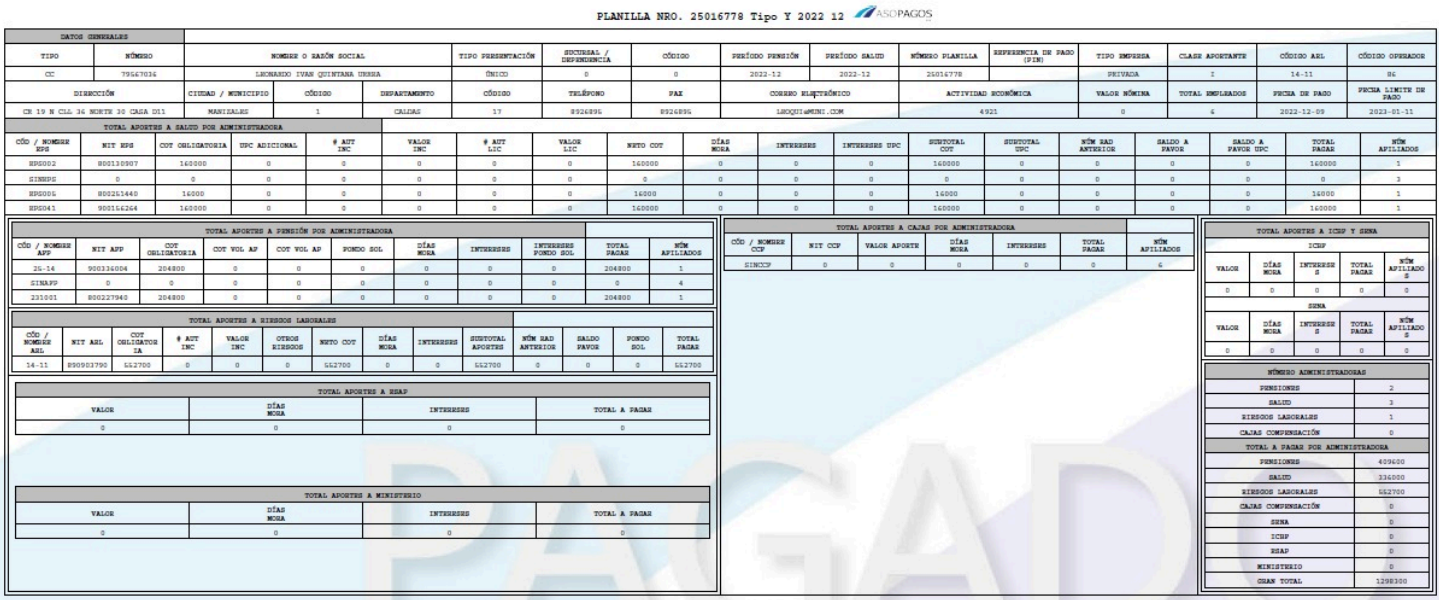

PLANILLA NRO. 25016778 Tipo Y 2022 12 ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	79667036	LEONARDO IVAN QUINTANA UREÑA	ÚNICO	0	0	2022-12	2022-12	25016778		PRIVADA	I	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CR 19 N CLL 36 NORTE 30 CASA D11	MANIZALES	1	CALDAS	17	8926896	8926896	LEOQUI@MSN.COM	4921	0	6	2022-12-09	2023-01-11

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS002	800130907	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	160000	1
SINEPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
EPS005	800251440	14000	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	14000	1
EPS041	900156264	160000	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	160000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
26-14	900336004	204800	0	0	0	0	0	0	204800	1
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
231001	800227940	204800	0	0	0	0	0	0	204800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	552700	0	0	0	552700	0	0	552700	0	0	0	552700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	6

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	2
SALUD	3
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	409600
SALUD	334000
RIESGOS LABORALES	552700
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	1296300

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	manz 1 casa 3 piso 2 barrio Elvira	QUIMBAYA-QUINDIO	7321572	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	9445553499	9445553499	E	2023/01/16	2023/01/19	BANCO BOGOTA	3	$3,108,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$2,566,669	$410,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$13,700		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (6 Afiliados)						$2,566,669	$410,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$13,700		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)						$2,566,669	$410,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$102,900			$2,566,669	$13,700		$0	$0
1	CC	82383514	CORDOBA ARMANDO	25-14	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF43	7	$233,334	$9,400	14-23	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0
2	CC	78076744	MARIMON EDILBERTO	25-14	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF43	6	$200,000	$8,000	14-23	6	$200,000	$1,100	6	$0	$0
3	CC	1007317494	MARTINEZ EMMANUEL	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF43	29	$966,667	$38,700	14-23	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0
4	CC	1040496888	MENDOZA CRISTIAN	230301	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF43	5	$166,667	$6,700	14-23	5	$166,667	$900	5	$0	$0
5	CC	1076386754	MOSQUERA HAMINSON	230301	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF43	5	$166,667	$6,700	14-23	5	$166,667	$900	5	$0	$0
6	CC	1128845849	PALACIO FRANCISCO	230301	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-23	25	$833,334	$4,400	25	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL TRIANA (13 Afiliados)						$7,966,667	$1,274,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$555,000		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA (13 Afiliados)						$7,966,667	$1,274,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$555,000		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (13 Afiliados)						$7,966,667	$1,274,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$318,700			$7,966,667	$555,000		$0	$0
7	CC	98670727	ARBOLEDA FREDIS	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF43	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
8	CC	1109069349	BUITRAGO JOSE	230301	6	$200,000	$32,000	EPS041	6	$200,000	$8,000	CCF43	6	$200,000	$8,000	14-23	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
9	CC	18388034	CASTAÑO REINALDO	25-14	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF43	12	$400,000	$16,000	14-23	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
10	CC	1097400117	CASTILLO WILMAR	230301	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF43	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
11	CC	1005088349	GALLEGO JHON	230301	6	$200,000	$32,000	EPS041	6	$200,000	$8,000	CCF43	6	$200,000	$8,000	14-23	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
12	CC	1118025525	HERNANDEZ PABLO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	1069728877	JUNCA EDNA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	13991437	MORALES CARLOS	230301	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF43	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
15	CC	13992157	MURILLO LENIS	230301	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF43	17	$566,667	$22,700	14-23	17	$566,667	$39,500	17	$0	$0
16	CC	1094921944	PALTA DIEGO	230301	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF43	6	$200,000	$8,000	14-23	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
17	CC	93337659	TRIANA JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	4376770	VANEGAS WILMAR	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF43	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
19	CC	13993599	VIQUE MILTON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$10,533,336	$1,685,600			$10,533,336	$421,600			$10,533,336	$421,600			$10,533,336	$568,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	manz 1 casa 3 piso 2 barrio Elvira	QUIMBAYA-QUINDIO	7321572	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	9445553499	9445553499	E	2023/01/16	2023/01/19	BANCO BOGOTA	3	$3,108,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$1,685,600	$5,900	$0	$1,691,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$325,400	$1,200	$0	$326,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,200,200	$4,100	$0	$1,204,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$600	$0	$160,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$568,700	$2,000	$0	$570,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$568,700	$2,000	$0	$570,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$421,600	$1,500	$0	$423,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$421,600	$1,500	$0	$423,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$421,600	$1,600	$0	$423,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$24,000	$100	$0	$24,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$333,600	$1,200	$0	$334,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$56,000	$200	$0	$56,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$8,000	$100	$0	$8,100
TOTAL				**19**	**$3,097,500**	**$11,000**	**$0**	**$3,108,500**

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-24, 07:29:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60896008

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 23/01/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 14010428	DIEGO FERNANDO CERQUERA VAQUIRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 72280384	ALEXANDER ALVAREZ DE LA ROSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 200.000	$ 348.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000	$ 36.900	$ 1.584.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618943	2	OBRAS CIVILES JL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 34 # 18B 06	CALARCA-QUINDIO	7105996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	9445540349	9445540349	E	2023/01/12	2023/01/17	BANCO BOGOTA	5	$11,448,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	PT	1284136	BASTIDAS ROMDON DIOGENES ZAIRT	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
2	CC	1094923277	BEDOYA VASQUEZ JOHN BRYAN	230201	15	$500,000	$80,000	EPS018	15	$500,000	$62,500	CCF43	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	$34,800	15	$500,000	$25,000
3	CC	1005252978	BUITRAGO RICO KEVIN ALONSO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
4	CC	1089802087	CADENA CAICEDO MELQUI	230301	25	$833,334	$133,400	EPS005	25	$833,334	$104,200	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$58,100	25	$833,334	$41,800
5	CC	1027942703	CAMPILLO VALDERRAMA LUIS ALFONSO	230301	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$116,700	CCF43	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$65,000	28	$933,334	$46,800
6	CC	93087299	CANO LEONARDO FABIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
7	CC	1116258223	CASTRO GONZALEZ JULIAN ALBEIRO	230301	27	$900,000	$144,000	EPS037	27	$900,000	$112,500	CCF43	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$62,700	27	$900,000	$45,000
8	CC	1082686689	CORTES MACUACE JOSE ESNEIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
9	CC	1004200519	CORTES CORTES ULBER SANTOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
10	CC	1097401483	CUERVO GARCIA CRISTIAN CAMILO	230301	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$104,200	CCF43	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	$58,100	25	$833,334	$41,800
11	CC	18401689	DAVILA AGUIRRE JAVIER HERNAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
12	CC	1097403188	GRANADOS CAMPO CARLOS MARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
13	PT	1182744	GRATEROL GARCIA DEIVIS GREGORIO	230301	9	$300,000	$48,000	EPS018	9	$300,000	$37,500	CCF43	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	$20,900	9	$300,000	$15,000
14	CC	1094926289	HACHITO PEREA YEFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
15	PT	14317805	MARCANO GUZMAN FREDDY JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
16	CC	1004130881	MEJIA MIRANDA JOSE DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
17	PT	3185645	MENDEZ DELGADO CARLOS ALBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
18	CC	1033374695	MERCADO PERALTA WILBER	230301	24	$800,000	$128,000	EPS018	24	$800,000	$100,000	CCF43	24	$800,000	$32,000	14-4	24	$800,000	$55,700	24	$800,000	$40,000
19	CC	1010103648	MINOTTA MURILLO DIMAR	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
20	CC	1097395823	MOSQUERA VASQUEZ DIEGO FERNANDO	230301	14	$466,667	$74,700	EPS002	14	$466,667	$58,400	CCF43	14	$466,667	$18,700	14-4	14	$466,667	$32,500	14	$466,667	$23,500
21	CC	1097390869	OSORIO CRISTIAN CAMILO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS018	1	$33,334	$4,200	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	$2,400	1	$33,334	$1,800
22	CC	33819209	QUINTERO PACHON LUZ STELLA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
23	CC	1097398168	RESTREPO CALLES WILLIAN FERNEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
24	CC	1097401330	RICO MARROQUIN RUBEN DARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
25	CC	18402215	RIVERA RIOS JHON FREDDY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
26	CC	18400475	RODRIGUEZ VARGAS ESNORALDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
27	CC	1097390719	SANCHEZ MONTOYA EMILIO ANDRES	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
28	CC	1007857247	VENTE RUIZ WASHINGTON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
29	CC	15329133	ZAPATA MEDINA EDGAR ALONSO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
Total			**Afiliados(29)**			**$25,600,003**	**$4,096,300**			**$25,600,003**	**$3,200,200**			**$25,600,003**	**$1,024,300**			**$25,600,003**	**$1,782,200**		**$25,600,003**	**$1,280,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$4,096,300	$23,300	$0	$4,119,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,536,300	$20,000	$0	$3,556,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$400,000	$2,300	$0	$402,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,782,200	$10,100	$0	$1,792,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$1,782,200	$10,100	$0	$1,792,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,024,300	$5,800	$0	$1,030,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	$1,024,300	$5,800	$0	$1,030,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$3,200,200	$18,400	$0	$3,218,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$250,000	$1,500	$0	$251,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$491,700	$2,800	$0	$494,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$591,700	$3,400	$0	$595,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$125,000	$800	$0	$125,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	$1,329,200	$7,500	$0	$1,336,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$183,400	$1,100	$0	$184,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$229,200	$1,300	$0	$230,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$768,500	$4,400	$0	$772,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	29	$768,500	$4,400	$0	$772,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$512,200	$2,900	$0	$515,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	29	$512,200	$2,900	$0	$515,100
TOTAL				**29**	**$11,383,700**	**$64,900**	**$0**	**$11,448,600**

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co

Bogotá, 18 de marzo de 2022

PODER


Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL ANDINO única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

Contrato INVIAS No. 1913 DE 2020

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879

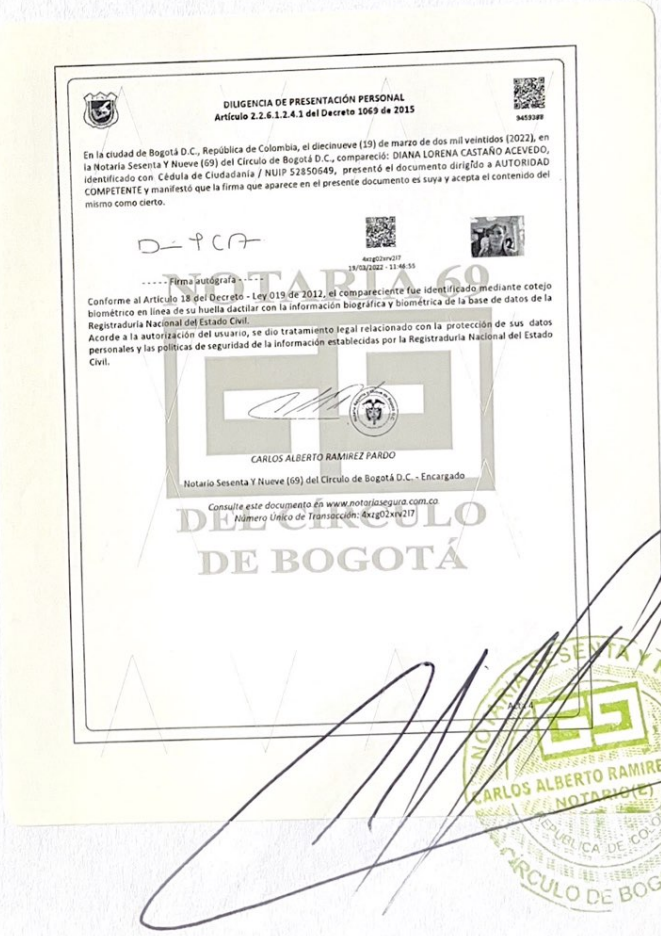

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

94593##

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52850649, presentó el documento dirigido a AUTORIDAD COMPETENTE y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

4xzg02xrv217
19/03/2022 - 11:46:55

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
Notario Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 4xzg02xrv217

NOTARÍA 69
DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ

NOTARÍA SESENTA Y NUEVE
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
NOTARIO(E)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.332.879**

DIAZ GOMEZ

APELLIDOS

HECTOR MIGUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1958**

PAIPA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155305-M-0019332879-20090428 **0011**089097A 1 1200032791
