DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	EDWARD CAMILO GOMEZ FONSECA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.665.052
Direccion	LOTE 6 MANZANA 4	Telefono	3115654819
		Conyuge o Hijo (a)	ELIAN CAMILO GOMEZ CASTILLO
Barrio	VILLA POLITA	Cedula o TI	1.116.669.353

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0107 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001780 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%


REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA



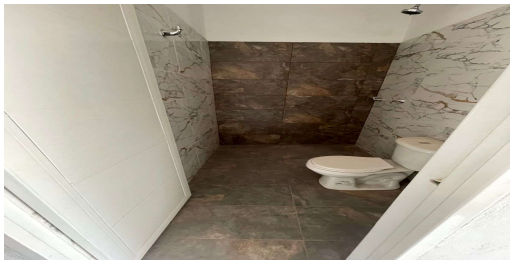

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JESSICA ANDREA MURILLO TOLOZA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.499.415
Direccion	CALLE 14 No 11-53 LOTE 2 MANZANA C	Telefono	3118318980
		Conyuge o Hijo (a)	MIA SHOE ACOSTA MURILLO
Barrio	LOS NARANJOS	Cedula o TI	1.222.133.597

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0108 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001778 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



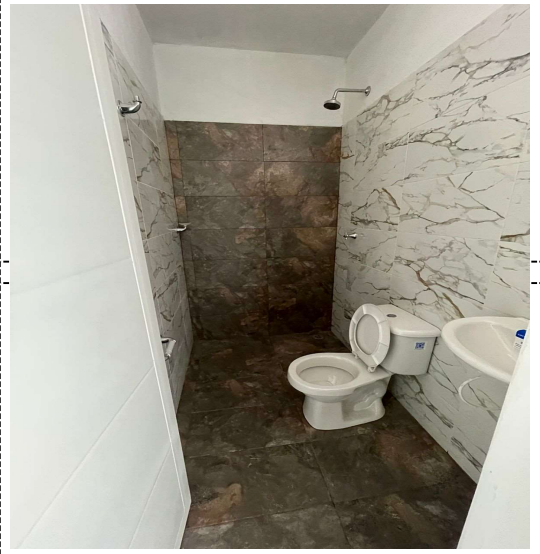

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JENNY PAOLA GUTIERREZ GUAYABO
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.664.614
Direccion	LOTE 12 MANZANA C	Telefono	3132296505
		Conyuge o Hijo (a)	MARIA JOSE ACEVEDO GUTIERREZ
Barrio	LOS NARANJOS	Cedula o TI	1.222.126.432

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0109 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001776 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

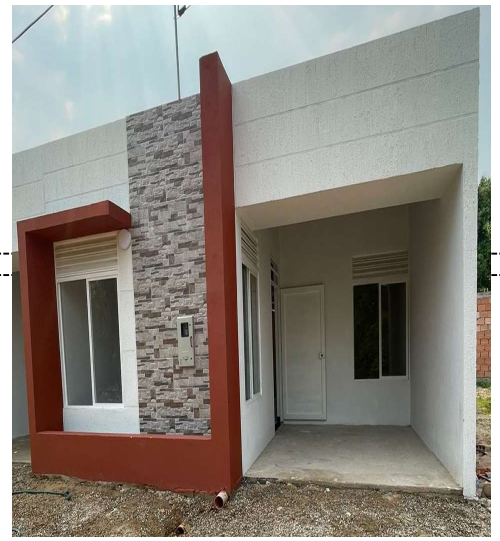



DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JORGE ELIECER MONROY CELIS
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.118.542.976
Direccion	CALLE 14 No 11-41 LOTE 4 MANZANA C	Telefono	3228119270
		Conyuge o Hijo (a)	ZARA HELENA MONROY ANZUETA
Barrio	LOS NARANJOS		
		Cedula o TI	1.222.138.191

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0110 DEL 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001777 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



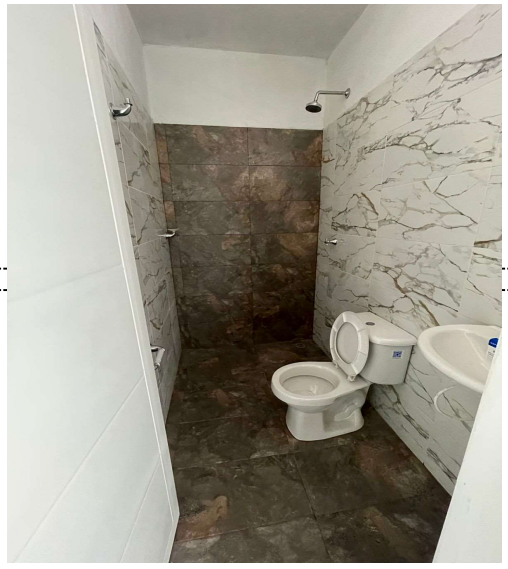

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LEIDY JOHANNA VELANDIA DUQUE
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.068.658.583
Direccion	LOTE 1 MANZANA D	Telefono	3108529556
		Conyuge o Hijo (a)	AVRIL SOFIA COGOLLO VELANDIA
Barrio	LOS NARANJOS	Cedula o TI	1.062.441.876

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0112 DEL 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal


DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001774 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





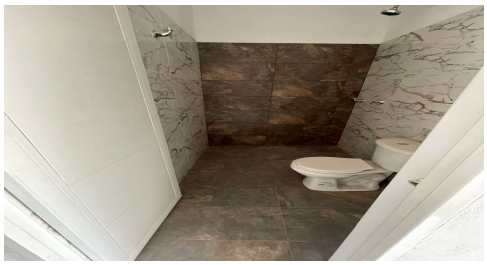

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	MARTHA YANET COLMENARES TIBADUIZA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.040.213
Direccion	MANZANA D LOTE 17	Telefono	3125975003
		Conyuge o Hijo (a)	ERIKA JOHANA BETANCOURT COLMENARES
Barrio	VILLA VICTORIA	Cedula o TI	1.116.667.357

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0113 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001773 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



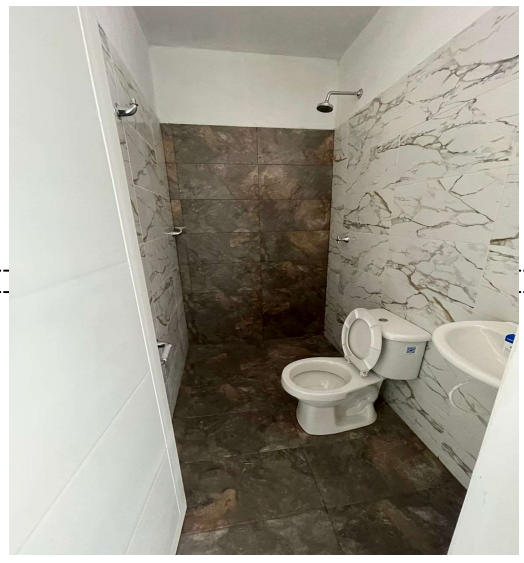

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	NOHORA ISABEL MOSQUERA FUENTES
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.668.436
Direccion	CALLE NO. 6 – 23 LOTE 1	Telefono	3223776738
		Conyuge o Hijo (a)	BRAULIO ALEJANDRO MOSQUERA FUENTES
Barrio	LAS PALMERAS	Cedula o TI	1.116.663.476

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0117 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001764 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



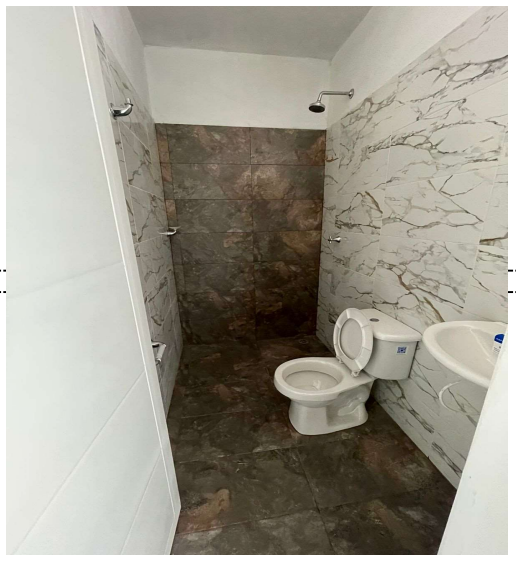

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA





OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	EDWIN DUVAN RIOS DIAZ
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.069.900.808
Direccion	MANZANA C LOTE 9	Telefono	3134101064
		Conyuge o Hijo (a)	JOSE ALVARO RIOS MARULANDA
Barrio	LOS NARANJOS	Cedula o TI	17.338.226

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0119 DEL 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001771 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 103.903.000,50
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



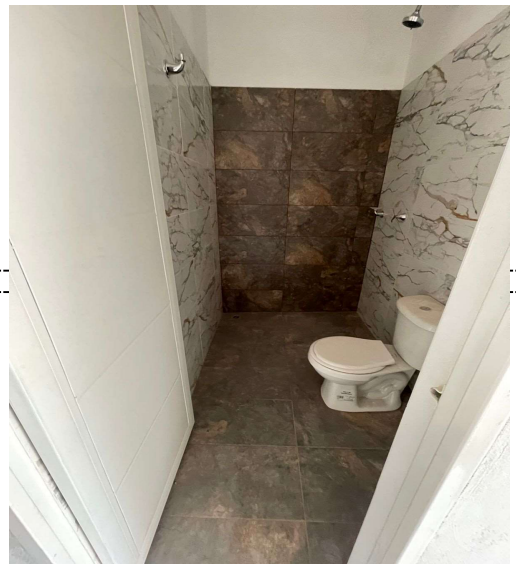

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CARLOS ANDRES PEREZ FARFAN
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.664.234
Direccion	LOTE 18 MANZANA A	Telefono	3118344589
		Conyuge o Hijo (a)	YENNY MARISOL MORALES MECHE
Barrio	EL PARAISO		
		Cedula o TI	1.116.666.859


ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0105 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001781 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 107.627.299,85
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



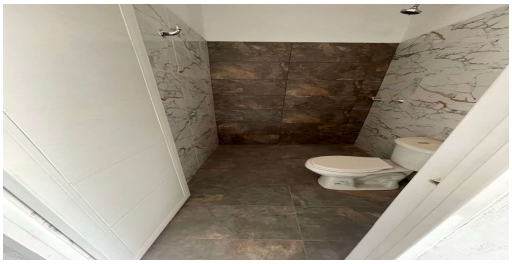

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	WIILIAM PEREZ OROPEZA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	74.865.766
Direccion	LOTE 6 MANZANA 4	Telefono	3212693036
		Conyuge o Hijo (a)	MARIA DEL CARMEN MARIN DUARTE
Barrio	VILLA POLITA	Cedula o TI	47.426.590

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0106 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001779 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 107.627.299,85
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	ALEICY CACERES PEREZ
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	74.866.371
Direccion	MANZANA F LOTE 13	Telefono	3102277647
		Conyuge o Hijo (a)	JHONATAN ALEXIS CACERES ABRIL
Barrio	CRISTO REY	Cedula o TI	1.116.666.856

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0118 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001769 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 107.627.299,85
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

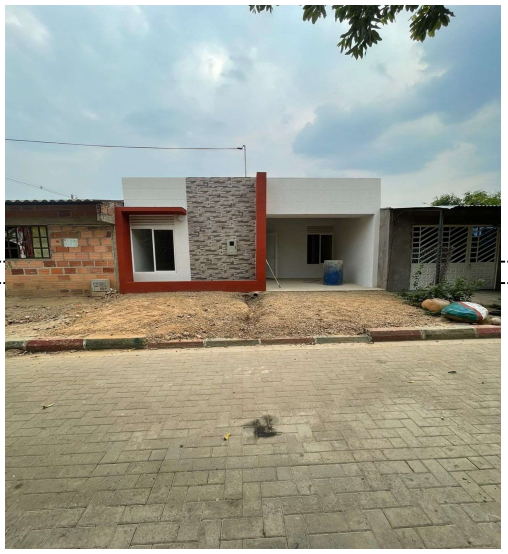



DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LUZ ADRIANA GUEVARA CONTRERAS
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.115.912.729
Direccion	LOTE 4 MANZANA A	Telefono	3102610319
		Conyuge o Hijo (a)	JUAN JOSE RINCÓN GUEVARA
Barrio	EL PARAISO	Cedula o TI	1.222.114.054

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0120 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ100001772 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 107.627.299,85
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



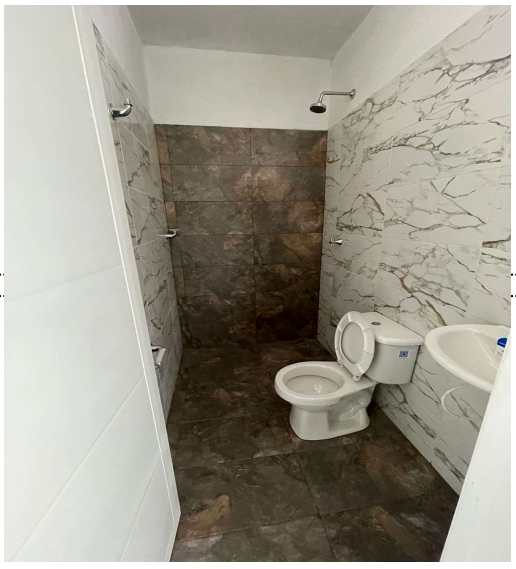

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA





OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LINDA NAYIBE SANCHEZ SOGAMOSO
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.666.005
Direccion	LOTE 14 MANZANA A	Telefono	3112431841
		Conyuge o Hijo (a)	ARNOLDO ARENAS SANCHEZ
Barrio	EL PARAISO	Cedula o TI	1.116.668.881

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0123 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001770 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 107.627.299,85
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA





OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	GEISEN FERNEY GOMEZ COBA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	4.284.849
Direccion	MANZANA J LOTE 9	Telefono	3222721047
		Conyuge o Hijo (a)	DANNA CAROLINA GOMEZ CALDERON
Barrio	VILLA POLITA	Cedula o TI	1.222.125.654

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0104 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001782 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JUAN DAVID PEREZ DIAZ
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.118.529.934
Direccion	LOTE 5 MANZANA E	Telefono	3214256083
		Conyuge o Hijo (a)	ARIANA ISABELLA PEREZ MORENO
Barrio	VILLA POLITA		
		Cedula o TI	1.222.126.922

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0111 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001775 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



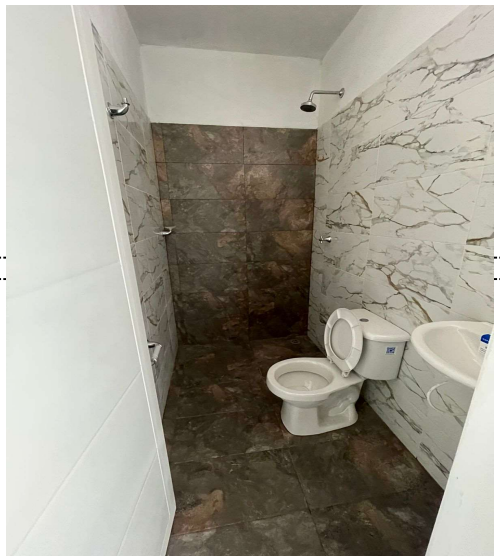

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	RULVER COVA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	9.433.756
Direccion	LOTE 8 MANZANA J	Telefono	3125886492
		Conyuge o Hijo (a)	MARIA CLELIA ALARCÓN MARTINEZ
Barrio	VILLA POLITA		
		Cedula o TI	47.441.638

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0114 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001767 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	ANGIE KATHERINE VARGAS PEREZ
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.123.514.148
Direccion	MANZANA H LOTE 9	Telefono	3138355974
		Conyuge o Hijo (a)	KEINNER SANTIAGO RODRIGUEZ VARGAS
Barrio	VILLA POLITA	Cedula o TI	1.123.513.301

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0115 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001766 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

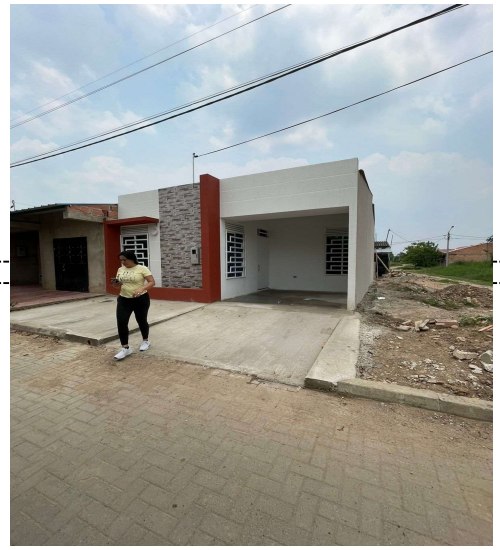



DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	MARLENY HERNANDEZ COBA
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	47.426.111
Direccion	LOTE 2 MANZANA K	Telefono	3204921210
		Conyuge o Hijo (a)	CLEVI MAYERLI HERNANDEZ COBA
Barrio	VILLA POLITA		
		Cedula o TI	1.116.667.336

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0116 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001765 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%


REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

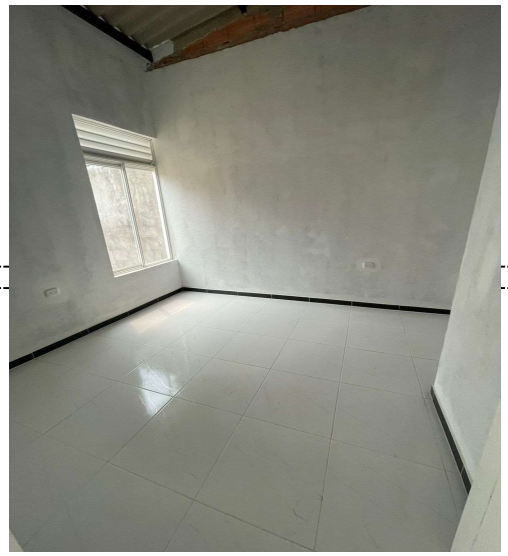



DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA



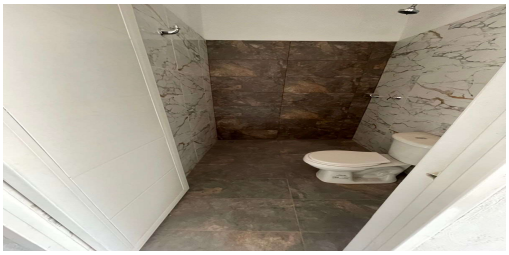

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	YULI ANGELICA LEON NAVAS
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.115.866.670
Direccion	MANZANA R LOTE 12	Telefono	3115947192
		Conyuge o Hijo (a)	JORGE JOAQUIN RINCÓN LEÓN
Barrio	VILLA POLITA	Cedula o TI	1.115.866.405

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0121 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001783 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA





OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 04 Marz 2024 - 03 Abril 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JENER JAIR GOMEZ OROS
UBICACIÓN:			
Municipio	TRINIDAD	Cedula	1.116.663.822
Direccion	LOTE 6 MANZANA J	Telefono	3135089500
		Conyuge o Hijo (a)	LINDY MENDIVELSO LUNA
Barrio	VILLA POLITA		
		Cedula o TI	1.116.666.491

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0199 del 28 de noviembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casana			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	0122 del 16-07-2023	Expedida por:	Secretaria de Planeacion e Informacion Municipal

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 2484 / 2023
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001768 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	06 de Marzo de 2024
Valor ejecutado:	$ 112.845.400,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



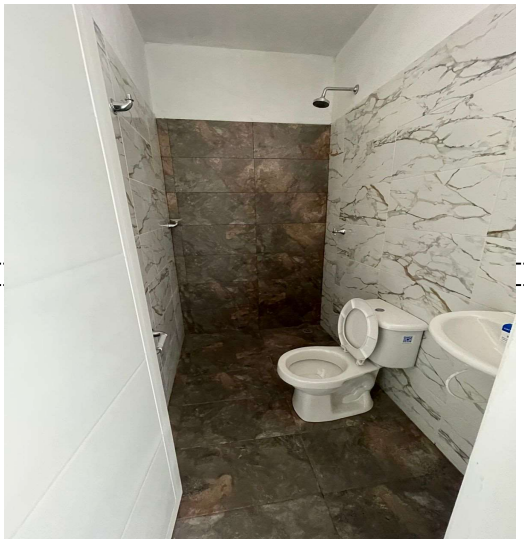

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Vivienda terminada en tramite de entrega por parte de la Direccion Tecnica de Vivienda Departamental, se cumplio con la aplicación del subsidio de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion No. 0199 del 28-11-2023.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 / 2023
