# IDRD

**Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023**
**SOLIUN INGENIERÍA SAS**
**DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55**
**TELÉFONO: 76530168 – 3013942384**

"***Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".***

## INFORME MENSUAL No 6 – COMPONENTE TÉCNICO
## PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

**TOMO __1___ DE _____**



**TABLA DE CONTROL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COPIA CONTROLADA | X | COPIA NO CONTROLADA | |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Luis Alberto Medrano Bermúdez | Residente de Interventoría | |
| **APROBÓ** | Edna Constanza Cepeda Sánchez | Directora de interventoría | |

**FEBRERO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.**




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.03.26 11:10:24 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

## CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES ..... 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ..... 11
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: ..... 12
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: ..... 12
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO ..... 12
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES ..... 13
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES ..... 13
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: ..... 15
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO ..... 15
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS: ..... 15
7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ..... 47
8. CLIMATOLOGÍA: ..... 47
9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: ..... 48
9.1 ACTAS DE COMITÉ ..... 48
9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: ..... 48
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 48
11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS ..... 54
12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ..... 54
13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL ..... 55
15. BITÁCORA ..... 56
16. CORRESPONDENCIA ..... 56

***TABLA DE ANEXOS***

**ANEXO 1.** PÓLIZAS
**ANEXO 2.** CONTROL CLIMATOLÓGICO
**ANEXO 3.** COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
**ANEXO 4.** INFORMES SEMANALES
**ANEXO 5.** REGISTRO FOTOGRÁFICO
**ANEXO 6.** FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
**ANEXO 7.** ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP
**ANEXO 8.** INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
**ANEXO 9.** BITÁCORA DE OBRA
**ANEXO 10.** COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

## INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al sexto mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1° de febrero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este informe.

## 1. CONDICIONES CONTRACTUALES

### 1.1. OBJETO DEL CONTRATO

*"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".*

### 1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla en diferentes escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

| PARQUE O ESCENARIO | CÓDIGO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| LA VIDA | 01-012 | USAQUÉN | Calle 165 # 7-76 |
| SERVITA | 01-023 | USAQUÉN | Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 Nó 7-38 |
| NUEVA AUTOPISTA | 01-064 | USAQUÉN | Carrera 20 # 136- 91 |
| ALTA BLANCA | 01-075 | USAQUÉN | Carrera 8 A # 158- 04 |
| EL COUNTRY | 01-1000 | USAQUÉN | Avenida Calle 127 # 11 D -90 |
| GUSTAVO URIBE | 02-004 | CHAPINERO | Carrera 1 # 70-11 |
| CANAL EL VIRREY-EL CHICO | 02-014 | CHAPINERO | Calle 88 # 13 A -40 |
| SUCRE O HIPPIES | 02-019 | CHAPINERO | Calle 60 # 7-49 |
| LOS LACHES LA MINA | 03-014 | SANTAFÉ | Carrera 8 Este # 48- 55 |
| PARQUE NACIONAL | 03-035 | SANTAFÉ | Carrera 7 # 37 -04 |
| SENDERO A MONSERRATE | 03-051 | SANTAFÉ | no tiene nomenclatura |
| LAS CRUCES | 03-036 | SANTAFÉ | Carrera 5A #1- 90 |
| INDEPENDENCIA | 03-039 | SANTAFÉ | Calle 24 # 6A -01 |
| TERCER MILENIO | 03-085 | SANTAFÉ | Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10 |
| PLAZA DE TOROS | 03-093 | SANTAFÉ | Carrera 5 # 26B- 72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MORALBA | 04-013 | SAN CRISTÓBAL | Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur |
| VILLA DE LOS ALPES | 04-075 | SAN CRISTÓBAL | Carrera 3 B # 35 -04 Sur |
| GAITÁN CORTES | 04-103 | SAN CRISTÓBAL | Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E |
| LA VICTORIA | 04-122 | SAN CRISTÓBAL | Calle 37A Bis Sur # 2A- 04 |
| SAN CRISTÓBAL | 04-127 | SAN CRISTÓBAL | Calle 17A Sur # 2A- 50 E |
| CEFE SAN CRISTÓBAL | | | |
| DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO | 04-196 | SAN CRISTÓBAL | Calle 19 Sur # 5 -40 |
| LA AURORA II | 05-002 | USME | Diagonal 69 F Sur # 14U- 45 |
| VALLES DE CAFAM | 05-003 | USME | Calle 92 Sur # 14D -87 |
| LA ANDREA | 05-004 | USME | Calle 81 BIS Sur # 8A- 24 |
| EL VIRREY SUR | 05-016 | USME | Calle 96 B Sur # 8- 10 |
| FAMACO | 05-086 | USME | Calle 90 Sur # 6 -00 |
| VILLA ALEMANA | 05-087 | USME | Calle 100 BIS Sur # 1 -17 |
| SAN CAYETANO | 05-236 | USME | Carrera 15 Este # 74- 00 Sur |
| NUEVO MUZU | 06-017 | TUNJUELITO | Carrera 61 B # 52A -20 Sur |
| EL TUNAL | 06-063 | TUNJUELITO | Calle 48 C Sur # 22D -81 |
| CEFE TUNAL | | | Calle 48 B Sur 22 A 70 |
| LAURELES NARANJOS | 07-035 | BOSA | Calle 70 F S # 80 J- 50 |
| CLARELANDIA | 07-163 | BOSA | Calle 58 J Sur # 80 D -10 |
| PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR | 07-164 | BOSA | Carrera 86 # 74- 85 S |
| PALESTINA | 07-165 | BOSA | Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur |
| EL RECREO | 07-260 | BOSA | Carrera 100 Calle 20 |
| TIBANICA | 07-274 | BOSA | Calle 74 Sur # 77 I -31 |
| PORVENIR | 07-391 | BOSA | Avenida Calle 54 S # 97-37 |
| AUTOPISTA SUR (PAVCO) | 07-152 | BOSA | Carrera 72 # 57 H -20 S |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 07-273 | BOSA | Parte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE |
| TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO | 07-036 | BOSA | Carrera 68 D # 54 A -03 Sur |
| PATIO BONITO | 08-034 | KENNEDY | Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02 |
| EL TINTAL | 08-109 | KENNEDY | Calle 6A # 86- 20 |
| PORVENIR GIBRALTAR PREDIO | 08-110 | KENNEDY | Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b |
| BELLAVISTA-DINDALITO | 08-144 | KENNEDY | Carrera 96 # 41- 01 Sur |
| CASTILLA | 08-200 | KENNEDY | Carrera 75 # 8 A- 31 |
| LA IGUALDAD | 08-212 | KENNEDY | Carrera 68 F # 3A -30 |
| TIMIZA | 08-219 | KENNEDY | Calle 40 H Sur # 70A -81 |
| CAYETANO CAÑIZARES | 08-241 | KENNEDY | Carrera 80 40 56 Sur |
| LA AMISTAD | 08-355 | KENNEDY | Transversal 79 No 41-10 Sur * Transversal 78J No 41 - 10 Sur |
| GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS) | 08-552 | KENNEDY | Calle 51 A Sur # 82 A- 16 |
| SAN IGNACIO | 08-791 | KENNEDY | Cl 6c con Cra. 94 |
| MARSELLA | 08-066 | KENNEDY | Carrera 69 No 8-28 |
| ESTADIO DE TECHO | 08-554 | KENNEDY | |
| CARMEN DE LA LAGUNA | 09-020 | FONTIBÓN | Diagonal 16 F Bis # 104A-15 |
| CANAL BOYACÁ | 09-050 | FONTIBÓN | Calle 23 G # 73 F- 04 |
| ATAHUALPA | 09-104 | FONTIBÓN | Avenida Calle 24 # 113-51 |
| SAUZALITO | 09-111 | FONTIBÓN | Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal |
| ZONA FRANCA | 09-125 | FONTIBÓN | Diagonal 12 C Carrera 109 |
| VILLA LUZ | 10-018 | ENGATIVÁ | Carrera 77 A # 64 B- 03 |
| VILLAS DE GRANADA | 10-102 | ENGATIVÁ | Calle 77 # 112 -50 |
| EL CARMELO | 10-169 | ENGATIVÁ | Carrera 104 # 71 C- 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JUAN AMARILLO | 10-171 | ENGATIVÁ | Avenida Calle 90 # 110- 06 |
| TABORA | 10-192 | ENGATIVÁ | Calle 74 #76- 62 |
| BONANZA | 10-215 | ENGATIVÁ | Carrera 70 F # 75 -80 |
| LA SERENA | 10-223 | ENGATIVÁ | Calle 90 A # 85- 70 |
| SAN ANDRÉS | 10-234 | ENGATIVÁ | Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a - |
| UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMÓN BOLÍVAR | 10-290 | ENGATIVÁ | Avenida Calle 63 # 68 -45 |
| LA FLORIDA | 10-311 | ENGATIVÁ | Calle 64 # 128- 90 |
| PTAR SALITRE | 10-531 | ENGATIVÁ | Av. Calle 80 No 119-60 |
| CANAL CÓRDOBA | 11-003 | SUBA | Avenida Carrera 55 # 116- 16 |
| SAN JOSÉ DE BAVARIA | 11-078 | SUBA | Calle 170 # 67 -51 |
| MORATO | 11-113 | SUBA | Calle 107 # 70A- 34 |
| LA GAITANA | 11-205 | SUBA | Transversal 126 # 134- 88 |
| TIBABUYES | 11-212 | SUBA | Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No |
| FONTANAR DEL RIO | 11-368 | SUBA | Diagonal 147 # 141A -42 |
| CEFE Fontanar del Rio | | SUBA | Dirección diagonal 145 # 138 a 10 |
| ATABANZA | 11-796 | SUBA | ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES |
| CASA BLANCA | 11-069 | SUBA | Carrera 80 # 145-50 |
| CIUDADELA CAFAM II | 11-1101 | SUBA | Carrera 146 No 142A 60 |
| COMETAS | 11-204 | SUBA | Cerros de suba cuchilla |
| CEFE Cometas | | SUBA | Cerros de suba cuchilla |
| CANAL RIO NEGRO | 12-002 | BARRIOS UNIDOS | Calle 90 # 60 B- 44 |
| ALCÁZARES | 12-015 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 24 # 71 - 25 |
| GIMNASIO DEL NORTE | 12-023 | BARRIOS UNIDOS | Calle 6 3B # 27B - 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRD EL SALITRE - UCAD | 12-091 | BARRIOS UNIDOS | Carrera 60 # 63 -75 |
| PISTA DE BMX PRD | 12-117 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 63 # 60 -80 |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | 12-092 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45 - 10 |
| COMPLEJO ACUÁTICO | 12-1000 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45-10 |
| PALACIO DE LOS DEPORTES | 12-125 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45 -10 |
| PARQUE DE LOS NIÑOS | 12-141 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 63 # 60 -80 |
| LA ESTACIÓN | 12-093 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 72 No 23-40 |
| NICOLAS DE FEDERMÁN 3 | 13-038 | TEUSAQUILLO | Carrera 36A # 58- 22 |
| VIRGILIO BARCO | 13-088 | TEUSAQUILLO | Avenida Carrera 60 # 57- 60 |
| SIMÓN BOLÍVAR | 13-089 | TEUSAQUILLO | Avenida Carrera 68 # 53-36 |
| ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN | 13-122 | TEUSAQUILLO | Calle 53 B # 28A- 10 |
| EL CAMPINCITO-CEAD | 13-123 | TEUSAQUILLO | Calle 53 B # 28A- 10 |
| SANTA ISABEL | 14-009 | MÁRTIRES | Avenida Carrera 27 # 1 G- 02 |
| EDUARDO SANTOS | 14-030 | MÁRTIRES | Calle 4A Bis # 18 B- 30 |
| EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO | 14-036 | MÁRTIRES | Avenida Calle 26 # 19 B - 55 |
| RECONCILIACIÓN | 14-037 | MÁRTIRES | Calle 26 Carrera 20 Y 32 |
| CIUDAD JARDÍN | 15-027 | ANTONIO NARIÑO | Carrera 11 B # 11 -88 Sur |
| VILLA MAYOR CEMENTERIO | 15-036 | ANTONIO NARIÑO | Calle 31 Sur # 30- 99 Sur |
| LA FRAGUA | 15-040 | ANTONIO NARIÑO | Carrera 29 A # 14 - 09 Sur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA | 16-024 | PUENTE ARANDA | Calle 43 Sur # 52- 20 |
| MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO | 16-099 | PUENTE ARANDA | Carrera 54 # 18- 23 Sur |
| CIUDAD MONTES | 16-112 | PUENTE ARANDA | Carrera 39 # 10- 75 Sur |
| EL JAZMÍN | 16-204 | PUENTE ARANDA | Avenida Carrera 50 # 1 D- 28 |
| VERAGUAS PREDIO | 16-221 | PUENTE ARANDA | Kr 34 3- 97 |
| INDUSTRIAL LOS EJIDOS | 16-416 | PUENTE ARANDA | Calle 11A No 36-56 |
| LA CONCORDIA | 17-008 | CANDELARIA | Calle 12 B Bis A # 0- 08 |
| BOSQUE SAN CARLOS | 18-028 | RAFAEL URIBE | Carrera 12 D # 32- 44 Sur |
| DIANA TURBAY | 18-031 | RAFAEL URIBE | Calle 48 X Sur # 2B -00 E |
| PIJAOS JORGE E. CABALIER | 18-090 | RAFAEL URIBE | Carrera 10 D # 34- 50 Sur |
| LOS MOLINOS II | 18-162 | RAFAEL URIBE | Calle 48 P Bis C Sur # 4-30 |
| QUIROGA | 18-205 | RAFAEL URIBE | Calle 31B Sur No 22-07 |
| PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA | 18-207 | RAFAEL URIBE | Calle 22 Sur # 21 -09 |
| GIMNASIO DEL SUR ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA | 18-452 | RAFAEL URIBE | Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur |
| SANTA LUCIA | 18-073 | RAFAEL URIBE | Diagonal 36 Sur Carrera 16 B |
| ARBORIZADORA ALTA | 19-188 | CIUDAD BOLÍVAR | Diagonal 73 sur No 40-80 |
| CANDELARIA LA NUEVA | 19-189 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27 |
| ARBORIZADORA ALTA METRP | 19-229 | CIUDAD BOLÍVAR | Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b |
| MEISSEN | 19-230 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 62 Bis Sur # 18 C -32 |
| LA ESTANCIA | 19-231 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 59 A Sur # 86-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ILLIMANI (PARAÍSO) | 19-346 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 74 B Sur # 27 M- 06 |
| LA JOYA | 19-349 | CIUDAD BOLÍVAR | Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13 |
| EL TALLER | 19-348 | CIUDAD BOLÍVAR | Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11 |
| BUENA VISTA PORVENIR | 19-347 | CIUDAD BOLÍVAR | Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur |
| ALTOS DE LA ESTANCIA | 19-756 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 68 Sur # 75 H -93 |
| SIERRA MORENA | 19-190 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 75 A Sur # 73- 08 |

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| No. de contrato | 3099 DE 2023 |
| Contratista Consultoría y/obra | CONSORCIO PARQUES BOG |
| Objeto | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |
| Etapa preliminar | QUINCE (15) DÍAS |
| Plazo de la ejecución etapa de obra | SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| Plazo total del contrato | SIETE (7) MESES. |
| Valor etapa de obra | $ 13.733.153.000,00 |
| Valor total del contrato | $ 13.733.153.000,00 |
| Fecha Inicio | 12 de septiembre de 2023 |
| Fecha de Terminación del contrato: | 11 de abril de 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| No. de contrato | 3131 DE 2023 |
| Contratista de Interventoría | SOLIUN INGENIERÍA SAS |
| Objeto | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| Etapa preliminar | QUINCE (15) DÍAS |
| Periodo etapa de obra | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

| | |
|---|---|
| Plazo de liquidación | UN (01) MES |
| Plazo total del contrato | OCHO (08) MESES |
| Valor etapa de obra | $ 1.192.172.234,00 |
| Valor total del contrato | $ 1.192.172.234,00 |
| Fecha Inicio | 12 de septiembre de 2023 |
| Fecha de Terminación contrato: | 11 de mayo de 2024 |

## 3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de la zona a intervenir en compañía de los funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS y delegados del contratista Consorcio Parques BOG.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

## 4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Durante el desarrollo del presente periodo, correspondiente al Informe N° 6, se continuó realizando verificación, así como ajustes a los presupuestos y a las programaciones para los escenarios priorizados; se atendieron las emergencias que se presentaron durante el mismo periodo. Por otra parte, se iniciaron y continuaron las actividades propias de obra en algunos de los escenarios ya priorizados.

De igual manera como se procedió en el periodo anterior, tanto el Contratista como la Interventoría y con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión del IDRD, se continuaron efectuando las revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración y ajustes de los presupuestos y programaciones de obra, para los diferentes Escenarios. Por parte de la Interventoría también se realizó acompañamiento permanente en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la coordinación de reuniones, mesas de trabajo, comités de obra; además, por la parte administrativa, se efectuó la revisión y /o aprobación de documentos inherentes a los contratos; todo esto, para la marcha y el buen desempeño de las obras.

## 5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 3099 de 2023 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los siguientes aspectos:

## 5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Se dio inicio a la etapa de obra, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría. Durante el trascurso del presente informe, el contrato de obra e interventoría, no presenta ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual, tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prorroga).

## 5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

### 5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA - NACIONAL DE SEGUROS

1. **EMISIÓN ORIGINAL**

| AMPARO | | Emisión inicial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988 | Cumplimiento | $4.119.945.900,00 | 18/07/2023 | 20/08/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $1.373.315.300,00 | 18/07/2023 | 20/02/2027 |
| | Estabilidad de la obra | $2.746.630.600.00 | 24/02/2024 | 20/02/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $5.493.261.200,00 | 18/07/2023 | 20/08/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989 | | $686.657.650,00 | 18/07/2023 | 20/02/2024 |

| AMPARO | | Actualización acta de inicio | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988 | Cumplimiento | $4.119.945.900,00 | 12/09/2023 | 11/10/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $1.373.315.300,00 | 12/09/2023 | 11/04/2027 |
| | Estabilidad de la obra | $2.746.630.600.00 | 11/04/2024 | 11/04/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $5.493.261.200,00 | 12/09/2023 | 11/10/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989 | $686.657.650,00 | 12/09/2023 | 11/04/2024 |

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

**DETALLE DE LA GARANTÍA** X

Id de la garantía CO1.WRT.12803731

Referencia de la garantía 400049989-400049989

Estado Aceptado

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Número de póliza 400049989-400049989

Tomador CONSORCIO PARQUES BOG

Beneficiario INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 5.493.261.200,00 COP | 11/10/2024 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.119.945.900,00 COP | 11/04/2027 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 1.373.315.300,00 COP | 11/04/2027 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | 2.746.630.600,00 COP | 11/04/2028 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, |

### 5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

#### 1. ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO

| AMPARO | | Emisión original | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535 | Cumplimiento | $238.434.646,80 | 28/08/2023 | 28/10/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $101.217.323,40 | 28/08/2023 | 28/04/2027 |
| | Calidad de servicio | $238.434.646,80 | 28/04/2024 | 28/04/2029 |

| AMPARO | | Actualización acta de inicio | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535 | Cumplimiento | $238.434.646,80 | 12/09/2023 | 12/11/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $101.217.323,40 | 12/09/2023 | 13/05/2027 |
| | Calidad de servicio | $238.434.646,80 | 13/05/2024 | 13/05/2029 |

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

Garantías del proponente:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Detalle | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12511121 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 584.088 617,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 13/05/2029 | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.12338242 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 584.088 617,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 28/04/2029 | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.12344227 | Beneficio de la oferta | - | 238 434 447,40 COP | - | 19/01/2024 | Caducado | Detalle | Modificar |

## 6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

### 6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizados, se solicita verificar en campo y realizar las correspondientes actas de inspección preliminares del estado actual de los escenarios. Verificación y ajustes, acompañado del respectivo presupuesto y la programación de obra para cada frente de trabajo.

### 6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

**6.2.1 Semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2024**

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

- Senderos en adoquín costado oriental del parque frente a la puerta de ingreso # 4.
- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.
- Se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se avanza con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso.
- Resane y pintura porterías.
- Se terminan los trabajos de resane y pintura de portería # 1, se avanza en portería #4, se inician trabajos en portería #2.

PISTA DE BMX

- Se avanza con la instalación de asfalto en zona de llegada y con trabajos complementarios de mantenimiento y adecuación de la pista y su contorno existente.

- Zona de gimnasios. Se termina y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1

PARQUE ILLIMANI:

- Se avanza en la adecuación del módulo de baños

PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalación de enchape en baños de coliseo y la instalación de biosaludables ya restaurados.

PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalación de geotextil en la excavación de la pista de patinaje en asfalto.
- Se realiza retiro de escombros, se avanza con la excavación de la zona de juegos infantiles.
- Se avanza con el mantenimiento hidrosanitario de los baños del coliseo

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

- Se hace entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes.

PARQUE NUEVO MUZU

- Se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.

PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con las actividades de fundida de tapas de cajas de inspección e instalación de equipamiento urbano.

PARQUE GILMA JIMÉNEZ:

- Llegan eléctricos a realizar retiro de cableado en mal estado.

PARQUE LA VICTORIA:

- Se realiza la reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio.

PARQUE VIRREY SUR:

- Se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico.

- Se continua con el retiro del material que se excavó en zona exterior de los tanques.
- Se avanza con la revisión del tanque séptico y lavado al interior de los tanques sépticos, con equipos especiales.
- Se termina la Impermeabilización mediante la aplicación de IGOL denso por la parte externa e inferior de los tanques sépticos.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Se continúa con el enchape en cerámica al interior de los baños de hombres y mujeres.
- Se solicita terminar la construcción de la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico.
- Se solicita continuar con el cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø= 6".

En el Sector del lago

- Se continúa avanzando con la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.

En el Sector del Módulo del Carbón.

- En zona exteriores para los baños de mujeres, se continúa con la localizan las redes de agua potable para inicio de las prolongaciones en tubería de Ø 1 1/2",

PARQUE DE LOS NIÑOS -PARQUEADERO.

- Se revisa la reconstrucción de pozo de alcantarillado de Aguas. lluvias
- Se termina la extendida y compactación de la subbase granular e=30 cm.
- Se revisa que la subbase granular compactada no presenta fallos.

PRD - TENIS

- PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.
- Se revisa que la base granular compactada no presenta fallos.
- Se termina la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.

- Se continúa la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.

PRD - ÁREA ADMINISTRATIVA.

- Se continua la instalación de la estructura metálica, para el cielorraso en PVC para la oficina.
- Se inicia la instalación de las láminas de PVC

CANAL RIO NEGRO

- Se realiza la instalación de pintura de los tableros de baloncesto
- Se realiza la instalación de pintura de los arcos de microfutbol
- En fabricación los deslizaderos metálicos en acero.
- Se están realizando subsanación de las observaciones al Contratista, referentes a la instalación de la malla eslabonada y a los remates de soldadura en los módulos del cerramiento

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se continua con la excavación para pilotes costados norte, sur y occidental.
- Se continua con la Figuración de hierro para pilotes.
- Inicio armado de viga de amarre costado oriental y sur
- Se termina la construcción del pozo de alcantarillado de aguas lluvias.
- Se termina la instalación de tuberías de 6", por costado norte.
- Se continua con la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Se continua con el acopio de material para conformar las graderías.

PARQUE ALTA BLANCA

- Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.
- Se realiza aseo general de la pista de patinaje, recolección de material y llevada a disposición final.
- Se termina la ejecución de pintura en muros y techos de la cocineta
- Se tiene en estudio de la propuesta por parte de la Institución de realizar la pulida de toda la pista de patinaje de velocidad

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se continua la aplicación de pintura en módulo de administración.
- Se realiza la reparación y cambio de fluxómetros para push de sanitarios baños hombres.
- Se continua la instalación de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños.

- Se realiza replanteo topográfico en el túnel del amor
- Se inician excavación para ejecución de pedestales para la instalación de la estructura metálica para el túnel del amor.

PARQUE SERVITA

- Cancha múltiple 1. Se realiza el desmonte de 8 luminarias y montaje de 8 luminarias de "Dino".
- Cancha múltiple 2. Se realiza el desmonte de 8 luminarias y montaje de 8 luminarias de "Dino".
- Cancha futbol 5. Se realiza el desmonte de 2 luminarias y montaje de 2 luminarias Karliz , o sea de las existentes.
- Se detectó fallo en unas luminarias de tenis. Se desmontaron 4 y se montaron 4 tipo Karliz.

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Se continúa realizando el mantenimiento de adoquín en área interna del parque. Está actividad ya se inició. (70%)
- Finaliza la actividad de la señalética y cambio de vinilos.
- Se instalan los protectores metálico tipo M-90 del árbol circular - 2 unidades.
- En fabricación de bancas para remplazo de existentes.
- Desmonte y retiro de rejilla tipo cárcamo ; son 42 unidades
- Instalación de rejilla en concreto para cárcamo 16.8 ml.
- Se termina limpieza de cárcamo de h=20 cm, son 16,80 ml.

PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Parque totalmente terminado
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

Zona baños administrativos

- Se realiza revisión de las divisiones metálicas instalados en los baños de hombres y mujeres.
- Se realizó pintura con vinilo dentro de los baños de hombres y mujeres.

Zona juegos infantiles

- Se realizo la construcción de los dados en concreto para la instalación de los juegos.
- Llego juego infantil para su correspondiente instalación.

Zona grecorromanos

- Se realiza la colocación de tubo PVC D=6" sobre la raíz del árbol paras u correspondiente protección.
- Se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto sobre la tubería PVC de D=6".

PARQUE PORVENIR - COD.

- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

Zona de la huerta cerramiento.

- Se termina la instalación de los módulos en malla eslabonada h=2,5 mts, por la Diag. 16 Sur en zona de la huerta.
- Se realiza el desmonte e instalación del portón metálico entrada a la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Cra 40.

Zona ruta de la vida

- Se continua con las actividades de lijado metálico en los módulos.

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Se revisan actividades terminadas por el contratista quedando pendiente los siguiente:

Cancha de futbol

- El contratista suministro e instalación las colchonetas cónicas y las coloco en la base de concreto de las luminarias de la cancha de futbol.
- El contratista suministro e instalación las fundas para proteger de la lluvia los bajos en graderías.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

Biosaludables

- El contratista realizó la instalación de los Biosaludables que estaban en taller en mantenimiento y pintura.

Modulo m-5 (columpios)

- Se realiza la revisión por parte de interventoría de los arreglos de pintura solicitados en los módulos de juegos M-5 (Columpios). .

Ruta de la vida

- Se aplico pintura en los módulos ruta de la vida.

Coliseo

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

**Semana del 4 de febrero al 10 de febrero de 2024**

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

Senderos en adoquín costado oriental del parque frente a la puerta de ingreso # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.
- Se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

Casa del adulto mayor

- Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso.
- Resane y pintura porterías:
- Se avanza con los trabajos en portería #2 y #3

Pista de BMX:

- Se adecua zona de senderos en adoquín, se termina adecuación de placas nuevas en concreto zona de juegos y zona del módulo de lectura y se procede al ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo.

Zona de gimnasios

- Se avanza con el mantenimiento de la zona de gimnasio # 2

PARQUE ILLIMANI:

- Se avanza en la adecuación del módulo de baños en el taller, se hace aseo por debajo del módulo y se inician trabajos hidrosanitarios

PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo y se termina la instalación de biosaludables ya restaurados y pintados

PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalación de geotextil sobre la excavación de la pista de patinaje en asfalto y la instalación de subbases .
- Llegan al frente de fragua bordillos y cañuelas.
- Se avanza con el mantenimiento hidrosanitario de los baños del coliseo, se inicia la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos
- Actividades realizadas al 100 %

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

- Se realizó recorrido en el parque con el apoyo a la supervisión del contrato donde se incluyeron nuevas actividades a ejecutar como: Inclusión de otro módulo grecorromano, cambio de divisiones metálicas en los baños de mujeres, desmonte mantenimiento y pintura de los biosaludables, arreglo de fisuras en la placa de los biosaludables, pintura de materas azul por gris.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES

- Se debe revisar los elementos de la ruta de la vida, realizar el desmonte y suministro de marco y puerta zona de cafetería.

ESTADIO OLAYA HERRERA

- Se realizó el suministro e instalación de las colchonetas para la base de los postes de iluminación de la cancha de futbol.

PARQUE CIUDAD MONTES

- Se terminó el cerramiento perimetral en la zona de la huerta sobre la Diag. 16 S, se inició el suministro e instalación de los portones metálicos de la zona de la huerta. Se debe terminar el lijado y pintura de los módulos de la ruta de la vida.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

- La cotización correspondiente a pintura para kioscos de comidas; tampoco se ha recibido.

PARQUE PRIMERA DE MAYO

- Está pendiente el cambio de las luminarias de la zona del patinódromo,

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (CARBÓN)

- Se le ha solicitado al Contratista presentar la Cotización para la reparación de las instalaciones hidro sanitarias en baños del módulo El Carbón; no se ha recibido a la fecha.

PARQUE ALTA BLANCA

- Está pendiente por parte del contratista entregar el ajuste del ítem " pulida de piso en granito" de acuerdo con la última revisión de Interventoría.

PARQUE CANAL BOYACÁ

- Importante iniciar actividades ya que la programación ya empieza a reflejar atraso en este Escenario.

PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.
- Actividades eléctricas realizadas al 100 %

PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con la instalación de equipamiento urbano y el mantenimiento de cajas de inspección y senderos.

PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

PARQUE VIRREY SUR:

- Se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Actividades eléctricas realizadas al 100%
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

Zona baños administrativos

- Se realiza revisión de las divisiones metálicas instalados en los baños de hombres y mujeres.
- Se realizó pintura con vinilo dentro de los baños de hombres y mujeres.

Zona juegos infantiles

- Se realizo la instalación de juego infantil.

Zona biosaludables

- Los biosaludables se encuentran en taller donde se les está realizando su respectivo mantenimiento y pintura.

Zona grecorromanos

- Se realiza la colocación de tubo PVC D=6" sobre la raíz del árbol paras u correspondiente protección.
- Se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto sobre la tubería PVC de D=6".

PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades terminadas 100%
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

Zona de la huerta cerramiento.

- Se termina la instalación de los módulos en malla eslabonada h=2,5 mts, por la Diag. 16 Sur en zona de la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Diag. 16 S.
- Se realiza el desmonte e instalación del portón metálico entrada a la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Cra 40.

Zona ruta de la vida

- Se continua con las actividades de lijado metálico en los módulos.
- Se inicia pintura de los módulos ruta de la vida.
- Actividad eléctrica realizada al 100%

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se inicia traslado de material para relleno al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Finaliza la limpieza y el lavado al interior de los tanques sépticos en muros y piso, con equipos especiales.
- Se inicia la retapada, sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos.
- Se tiene programado para la próxima semana, el inicio de la instalación de la Polyurea en muros internos.
- Retiro de a gravilla/filtro existente en el compartimiento del tanque séptico.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Se termina el enchape en cerámica al interior de los baños de hombres y mujeres.
- En construcción la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico.
- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø= 6".
- Se termina el enchape en cerámica en los baños donde se realizó cambio de fluxómetros de sanitarios.

En el Sector del lago

- Se avanza con la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos. 60% de avance.
- Por costado norte y occidental (paralelo a la Av. 68), se termina la aplicación de pintura de dos kioscos de comidas y se continúa con la el kiosco ubicado frente al Templete.
- Lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.

Zona entrada al parque

- Se realizo revisión sobre la cubierta entrada al parque donde se presenta goteos para verificar los arreglos a realizar.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

Biosaludables

- El contratista realizó la instalación de los Biosaludables que estaban en taller en mantenimiento y pintura.

Modulo m-5 (columpios)

- Se realiza la revisión por parte de interventoría de los retoques de pintura solicitados en los módulos de juegos M-5 (Columpios). .

Ruta de la vida

- Se aplico pintura en los módulos ruta de la vida.

Coliseo

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Parque totalmente terminado
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Se realizó el suministro e instalación de las colchonetas en la base en concreto de las bases luminarias cancha de futbol.
- Se realizó el suministro e instalación de los forros para tapar los bajos ubicados en las graderías del estadio.
- En este Estadio se realizó actividades eléctricas al 100%

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Finaliza mantenimiento de adoquín en área interna del parque.
- Termina la aplicación de pintura e instalación de vinilos en la señalética.
- Instalación del protector metálico tipo M-90 del árbol circular - 2 unidades.
- Cambio vinilo señal IDG-S Son 12 unidades.
- Se termina la limpieza del cárcamo
- Reparación de piso en adoquín (reemplazo de elementos ).
- Cambio de rejillas en concreto para cárcamo.
- Desmonte y reinstalación de loseta tipo IDU

PARQUEADERO DE LOS NIÑOS

- Finaliza la reconstrucción de pozo de alcantarillado de A. lluvias.
- Se realiza la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Se le hace la observación al Contratista de proteger adecuadamente y sellar las capas de la estructura que conforma el pavimento (subbase ), para no afectar la subrasante, principalmente por efecto de las lluvias que han ocurrido durante la semana.
- Se evidenció que, a los pozos existentes, les drena agua procedente de las edificaciones próximas al parqueadero; además una de las redes se encontró taponada con sedimentos de piedra de grandes proporciones que no dejaban pasar el agua al pozo de alcantarillado.
- Se sondea y revisa estado de taponamiento de la tubería entre pozos de red de alcantarillado de aguas lluvias en el parqueadero.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Avance con la aplicación de pintura en el módulo de administración y baños.

- Termina la demolición de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños.
- Se realiza reunión con los Administradores del Complejo Acuático y del Parque de los Novios, para coordinar retiro de escombros y acceso de los materiales para las construcciones que se adelantan en el Escenario; esto obedece a la dificultad de poder disponer los materiales y equipos en el sitio de
- intervención.
- En el Túnel del Amor, se terminan las excavaciones para construir los pedestales que irán en concreto reforzado.
- Avanza la figurada de acero de refuerzo de los pedestales.

FONTANAR DEL RIO

- Comité de Obra semanal celebrado en las instalaciones del CEFE, recorrido e inspección de obra.
- Inicio de retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida .
- Se define el sitio donde se construirá el Parkour.
- PRD- Cancha de baloncesto
- Inicio de excavación para retiro de capa de base granular existente de 20 cm. Se acuerda disponer este material para ser reutilizado como relleno en el Parque Simón Bolívar (áreas externas de los tanques sépticos).
- Retiro de agua que ha sido producto de las lluvias que han ocurrido en la presente semana.
- PRD- Cancha de Hockey
- En la cancha de hockey se instala y alambra el tablero de circuitos.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Continúan las excavaciones manuales para instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur; cargue, transporte y retiro del material fuera de la obra.
- Avance en la excavación para pilotes ubicados en el perímetro de las canchas. Excavación para conformar el tramo de sendero por costado occidental.
- Amarre de hierro para viga de cimentación por costados sur y oriental.
- Continúa la figuración de hierro para canastillas de los pilotes.
- Finaliza la construcción del pozo de alcantarillado de aguas lluvias. Por disposiciones técnicas y constructivas de la obra, se aprueba en comité de obra la construcción de otro pozo de alcantarillado de aguas lluvias, el cual será el que capte finalmente todas las aguas de las canchas; adicionalmente
- efectuar la conexión de las canchas de arena existentes a la red, ya que actualmente carecen de una tubería de drenaje.
- Terminan las excavaciones para instalación de tuberías de 6", por costado norte.
- Continúa la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.

- Liberación por la interventoría de aceros de refuerzo para pilotes y viga, con el fin de aprobar la fundida de elementos en concreto.
- Fundida en concreto de tramo de concreto ciclópeo bajo viga de cimentación con refuerzo 30x30 cm
- Fundida en concreto de tramo de viga de cimentación en concreto 30x30 cm
- Toma de muestras para ensayos de la resistencia de los concretos llegados a la obra procedentes de planta. - Control de asentamientos en obra.

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se continúan realizando las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres.
- Terminan las prolongaciones con tubería de 11/4", agua potable; se realizan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.

PRD - TENIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Finaliza la Nivelación y seriado de la base granular.
- Continúa la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Continúa la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Ensayo de densidades para la capa de base granular compactada; resultados satisfactorios.
- Liberación de la base granular.
- Imprimación de la base granular con emulsión asfáltica.
- Inicio de reparación para el muro que presenta la fisura.

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza el montaje e instalación de la estructura metálica, para el cielorraso en PVC para la oficina.
- Inicio de la colocación de las láminas de PVC, para el cielorraso en Área administrativa.

PRD - UCAD

- Reunión con el Administrador del UCAD, para coordinar y socializar el inicio de actividades en el Restaurante del UCAD
- Inicio de actividades en los baños del Restaurante - cielorraso. El material está en la obra.

PARQUE SERVITA

- Instalación de lámparas Led Vance en cancha múltiple.
- Inicio en el mantenimiento desagües de lavamanos en baños.

CANAL RIO NEGRO

- Aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Se le aplican puntos de soldadura a la puerta metálica que se encuentra suelta y que se está cayendo.
- Desmonte y retiro malla eslabonada en la parte baja sobre los tres módulos del cerramiento contra impacto, la cual está deteriorada.
- Instalación de nueva malla eslabonada en la parte baja sobre los tres módulos del cerramiento contra impacto.

PARQUE ALTA BLANCA

- Finaliza instalación y pulida en granito en los tramos de la pista de patinaje que estaban en mal estado.
- Termina la aplicación de pintura en cocineta y cornisas de techo en oficina y sala de reunión.
- Pendiente cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Limpieza de canales en la cubierta del edificio administrativo por costado sur.
- En Comité de obra, se acuerda solicitarle al Contratista presupuesto para poder pulir la totalidad de la pista de velocidad de este Escenario.

CANAL BOYACÁ

- Reunión de socialización con la Comunidad del Sector, con la participación de la Coordinación del IDRD, el Contratista y la Interventoría.

VIRREY CHICO

- Se realiza el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se realiza el desmonte de bancas para realizar el cambio.

UDS.

- En los baños del velódromo se realizan las regatas para identificar daños de los puntos hidráulicos y realizar

**Semana del 11 de febrero al 17 de febrero de 2024**

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

Senderos en adoquín costado oriental del parque frente a la puerta de ingreso # 4.

- Se continua con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de piezas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos.

Senderos en adoquín reciclado

- Se avanza con el remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquín reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4, se funden rampas en concreto en plazoleta de eventos.

Casa del adulto mayor

- Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso, se hacen aseos de los espacios para su respectiva puesta en servicio.

Zona de porterías:

- Se terminan trabajos de pintura en portería #2, está pendiente el arreglo de goteras en la cubierta , se avanza con los trabajos de estuco y pintura en portería #3

- Se avanza con la instalación de estructura de fachada verde en la portería #1.

Pista de BMX:

- se continúa con los remates de asfalto, demarcación y con la evacuación de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

Zona de gimnasios

- Se avanza con el mantenimiento de la zona de gimnasio # 2

PARQUE ILLIMANI:

- Se avanza en el mantenimiento de senderos en adoquín de concreto y aseo por debajo del módulo de baños.

PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo, se inicia la instalación de divisiones en los sanitarios e instalación de puertas de ingreso a baños de coliseo.

PARQUE LA FRAGUA:

- Se continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque.
- Se avanza con la instalación de bases compactas sobre la excavación de la pista de patinaje
- Se avanza con la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos hidrosanitarios en los baños de coliseo

PARQUE NUEVO MUZU:

- Se adecua zona de senderos en adoquín, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalación de juegos infantiles.

- Se avanza con los arreglos hidrosanitarios en los baños del coliseo

PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con el mantenimiento de cajas de inspección y remates de senderos en adoquín.

PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas

PARQUE GILMA JIMÉNEZ:

- Se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Actividades eléctricas realizadas al 100%

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BIOSALUDABLES

- Se realiza corte en placa piso donde estaban las fisuras.
- Se barre bien y se coloca malla electrosoldada.
- Se realiza instalación de Sikadur 32 Primer
- Se realiza la colocación de concreto,

ZONA GRECORROMANOS

- Se realiza el armado de hierro y flejes para la viga zarpa.
- En este parque no se van a realizar actividades eléctricas 0,00%

PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades terminadas al 100.00%
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

Zona de la huerta cerramiento.

- Se realiza el desmonte e instalación del portón metálico entrada a la huerta.
- Se realiza la instalación de portones metálicos entrada a la huerta costado norte y sur.
- Se realiza entrega con Acta de los portones viejos y en mal estado al administrador del parque y a la comunidad por solicitud del IDRD.

Zona ruta de la vida

- Se continua con las actividades de lijado metálico en los módulos.
- Se inicia pintura de los módulos ruta de la vida.
- Actividad eléctrica realizada al 100%

Zona entrada al parque

- Se realizó revisión sobre la cubierta entrada al parque donde se presenta goteras para verificar los arreglos a realizar.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

Biosaludables

- El contratista realizó en sitio retoques de pintura a los Biosaludables a solicitud de la interventoría.

Ruta de la vida

- Pendiente el cambio de una banca de abdominales

Coliseo

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Parque totalmente terminado
- En este Estadio no se realizó actividad eléctrica. 0,00%

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Parque totalmente terminado
- En este Estadio se realizaron actividades eléctricas al 100,00%

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Finaliza el desmonte y reinstalación de loseta tipo IDU.
- Se realiza la instalación de las bancas en concreto.
- Se realiza pintura en bordillo materas de los árboles.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - MANA

- En el sector del Tanque de pozo séptico
- Se termina el traslado de material para relleno para utilizar al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Continúa la retapada, el sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos, en muros y piso.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Está en construcción la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. (se recomienda realizar la conexión definitiva, cuando se habilite el vertimiento de residuos al tanque séptico).

- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø 6" (En ejecución).

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Avance en la aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos.
- Lijado y pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.
- Lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se terminan las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres. Pruebas hidrosanitarias para baños de mujeres.
- Continúan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.
- Se realizan resanes de pañete en muros, antes de iniciar la instalación del enchape.
- Instalación de bebederos en el sector de Juegos 2.

PRD - TENIS

Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Se realiza la aplicación de la carpeta asfáltica Tipo 1350; remates y aseo general .
- Avance en la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Finaliza la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Toma de muestras del asfalto por parte de la Interventoría, para realizar los ensayos correspondientes.
- Continúa la reparación para el muro que presenta la fisura. (anclajes para coser el muro)

Área Administrativa.

- Finaliza la instalación de cielorraso en PVC para la oficina de sistemas en el Área administrativa del PRD.
- Inicio en la colocación e instalación de luminarias (hay solamente 4 luminarias que están buenas). Se realiza pedido de las 9 luminarias restantes.
- En Comité de Obra , se aprueba la determinación de pintar la oficina de sistemas - aplicar color blanco.

UCAD.

- Se inicia la estructuración de cielorrasos de baños y bodega para montaje de láminas en PVC, en el Restaurante.
- Corrección de la gotera que se presenta en la cubierta de la edificación, por el costado oriental.
- Inicio instalación cielorraso en PVC baños.

Cancha de baloncesto

- Finaliza la excavación retirando la capa de base granular existente de 20 cm. El material es transportado y dispuesto en el Parque Simón bolívar para ser reutilizado como relleno (áreas externas de los tanques sépticos).
- Compactación de la subbase existente; se retiran tres fallos que se encontraron durante el proceso; se retiran y se realiza el mejoramiento con rajón
- Colocación de geotextil tejido 2400, e inicio en la extendida y compactación de la base granular.
- Nivelación topográfica del terreno, para establecer pendientes y desniveles.
- Retiro de agua que ha sido producto de las lluvias que han ocurrido en la presente semana.

Cancha de Hockey

- En la cancha de hockey se realiza la instalación del tablero para control de circuitos.
- Instalación de estructura metálica y pie de amigos para asegurar el tablero de control.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se acuerda en Comité de Obra, realizar la construcción de otro pozo de alcantarillado en el sitio donde está la caja de inspección que se encontraba enterrada. Se determinó, además, instalar tuberías para drenar las canchas de vóley-playa existentes, evacuando hacia el pozo construido inicialmente; esto en virtud de que estas canchas no tienen drenaje.
- Avance de excavaciones manuales para instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur; cargue, transporte y retiro del material fuera de la obra.
- Termina la excavación para pilotes ubicados en el perímetro de las canchas; así mismo la excavación para conformar el tramo de sendero por costado occidental.
- Finaliza el amarre de hierro para viga de cimentación por costados sur y oriental.
- Fundida en concreto para las vigas de cimentación y pilotes del costado oriental y sur-cerramiento.
- Se inicia la instalación de tuberías de 6", por costado norte, para efectos de conectar la arenera existente a la red, mediante cajas de inspección.
- Avance en la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Fundida de último tramo en concreto ciclópeo bajo viga del costado oriental.

- Toma de muestras de la interventoría, para ensayos de la resistencia de los concretos llegados a la obra procedentes de planta. - Control de asentamientos en obra.
- Finaliza construcción de la caja de inspección, cuya red es la que sirve para desaguar el arenero grande en el interior del parque, en razón a que la tubería de desagüe se ha encontrado tapada con arena.
- Fundida de pilotes en concreto h=1.50 m, que conforma con la viga el diafragma para cerramiento; instalación de camisas de Ø4" y parales metálicos. Viga del costado oriental
- Inicio de excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección externas a las canchas. Inicio de instalaciones de redes de aguas lluvias en tuberías corrugada de PVC.
- Inicio excavaciones para construcción del filtro francés
- Vaciado de concreto pobre para cajas de inspección.
- Inicia la construcción de cajas de inspección con ladrillo recocido.

CANAL RIO NEGRO

- Instalación de deslizaderos metálicos
- Continúa la aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Termina la aplicación de pintura para la estructura de arcos de fútbol y baloncesto.

PARQUEADERO DE LOS NIÑOS

- Inicio de excavaciones manuales para instalación de tubería que sirvan para drenar las aguas hacia el pozo de alcantarillado, por costado oriental (conexión del cárcamo).
- Continúa la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Excavación para construcción de cajas de inspección.
- Como se evidenció que, a los pozos existentes, les drena agua procedente de las edificaciones próximas al parqueadero; además una de las redes se encontró taponada con sedimentos de piedra de grandes proporciones que no dejaban pasar el agua al pozo de alcantarillado. Se realizó sondeo y se destaparon las tuberías que estaban presentando este inconveniente.
- Vaciado de concreto de limpieza para cajas de inspección.
- Inicia la construcción de cajas de inspección con ladrillo recosido.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Finaliza la aplicación de pintura en el módulo de administración y baños.
- Se retiran los vidrios del Módulo de Administración para poder aplicar la pintura por la parte interna principalmente.
- Finaliza la figurada de acero de refuerzo de los pedestales; se termina la fijación de las platinas metálicas.

- En el Túnel del Amor, se termina la fundida en concreto reforzado de los pedestales donde se fijará finalmente la estructura metálica. Pedestales de (30x30x50) cm. Platinas metálicas de 20x20x1/4"
- En módulo de baños, se inicia el enchape de muros en los sitios donde se realizaron reparaciones hidrosanitarias.
- Finaliza el mantenimiento de los juegos infantiles.
- En el área de cimentación donde se ubicará el nuevo módulo de baños, finalizan las excavaciones y se inicia la cimentación para zapatas con el concreto ciclópeo.
- Se efectúa el trasiego de material excavado en Túnel y módulo de baños; se carga y transporta el material fuera de la obra.

PARQUE ALTA BLANCA

- Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.
- Se realiza aseo general de la pista de patinaje, recolección de material y llevada a disposición final.
- Se termina la ejecución de pintura en muros y techos de la cocineta
- Se tiene en estudio de la propuesta por parte de la Entidad realizar la pulida de toda la pista de patinaje en el carril de velocidad.

FONTANAR DEL RIO

- Se continua con el retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida.
- Se continua con la instalación de los vinilos nuevos en los módulos de baño y Comida .

PARQUE SERVITA

- Avance en la instalación de lámparas Led Vance en cancha múltiple.
- Continuó la ejecución del mantenimiento desagües de lavamanos en baños.

PARQUE ALTA BLANCA

- Pendiente cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Está en estudio la aprobación para poder pulir la totalidad de la pista de velocidad de este Escenario.
- Se termina la instalación de las rejillas del cárcamo para reposición, de aquellas que estaban deterioradas y/o faltantes.

CANAL BOYACÁ

- Se realiza cerramiento de la zona a trabajar en polisombra
- Se inicia la demolición de la placa de piso en concreto.
- Se realiza recorrido en el parque entre contratista interventoría y supervisión del IDRD

VIRREY CHICO

- Se continua con el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se realiza instalación de canecas nuevas.
- Se realiza la instalación de espaldares de bancas.

UDS.

- En los baños del velódromo se realizan las regatas para identificar daños de los puntos hidráulicos y realizar el listado de los materiales necesarios.
- Inicio de actividades con el cambio de fluxómetros baños de 1° y 2° piso.
- Resanes de pañete en muros, donde se han cambiado los fluxómetros en baños.
- Se retiran módulos de cerramiento para el ingreso de manlift o elevador, con el objeto de iniciar el desmonte y suministro de luminarias en la cancha de béisbol.
- Llegan a la obra las luminarias y se realiza la socialización de inicio y coordinación de actividades.
- Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas, Coordinación del IDRD, Contratista y la Interventoría.

**De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 17-02-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 55,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 56,00%, donde se refleja un adelanto en la Programación de las Obras, la cual da como resultado del + 1.00%, Igualmente se le solicita al Contratista continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.**

**Semana del 18 de febrero al 24 de febrero de 2024**

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

Senderos en adoquín costado oriental del parque frente a la puerta de ingreso # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4.

Senderos en adoquín reciclado

- Se avanza con la instalación de piezas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, se recibe la instalación de adoquín reutilizado y se dejan observaciones para que corrijan y entreguen ya los senderos.

Casa del adulto mayor

- Se avanza con los remates de observaciones, se instalan vidrios y espejos, se instalan puertas en baños de discapacitados.

Zona de porterías:

- Se terminan trabajos de pintura en portería #2, está pendiente el arreglo de goteras en la cubierta Se avanza con los trabajos de estuco y pintura en portería #3 .
- Se realiza la entrega y puesta en servicio de la fachada verde en la portería #1.

Pista de BMX:

- Se continúa con los remates de asfalto, demarcación de la pista y se revisan el estado de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 19 de febrero del 2024, en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

Zona de canchas

- Se termina la instalación de tapas de caja de inspección de válvula de cierre de riego de cancha futbol 11.

PARQUE ILLIMANI:

- Se realizó visita a proveedores para verificar la fabricación de los elementos en acero del módulo de baños y señales informativas que es lo único que falta en este frente de trabajo.

PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la pintura de pisos de la zona de biosaludables.
- Se realiza el cambio de luminarias del coliseo y de aparatos eléctricos de distintos espacios del coliseo.
- Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo, se inicia la instalación de divisiones en los sanitarios.

PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalación de geotextil y subbase en la zona de jugos exterior del parque.
- Se avanza con la instalación de bases compactas sobre la sub bases de la pista de patinaje .
- Se avanza con la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos hidrosanitarios en los baños de coliseo y la instalación de luminarias, se instalan canecas en nuevo lugar elegido.

PARQUE NUEVO MUZU:

- Se termina afinado y pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos, se inician la instalación de juegos infantiles.
- Se avanza con los arreglos hidrosanitarios en los baños del coliseo.

PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con el mantenimiento de cajas de inspección, se inicia el encoroce del muro de cerramiento parte inferior del parque

PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y biosaludables

PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de cubiertas.

PARQUE GILMA JIMÉNEZ:

- No se realizaron esta semana actividades en este parque, estamos a la espera de que llegue el trasformador para poder energizar y seguir avanzando con las actividades eléctricas, que son el objeto contractual del mismo.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

Zona baños administrativos

- Se realiza la instalación de baldosa negra en piso caja de inspección baño de hombres

- Se realiza la instalación de baldosín blanco en ´pared arreglo pendiente.

ZONA JUEGOS INFANTILES

- Se realiza la instalación de pareles metálicos verticales para instalación de baranda cerca al sendero peatonal.
- Se tienen ya los dados fundidos para la instalación de los juegos infantiles.
- Se realiza visita a taller de ornamentación se verifica construcción de módulos complementarios para cerramiento infantil

Zona biosaludables

- Se tiene pendiente la instalación de los módulos de los Biosaludables los cuales se están arreglando en el taller.

ZONA GRECORROMANOS

- Se realiza el suministro e instalación del hierro para fundir la viga zarpa.
- Se realiza la instalación de formaleta metálica para fundir la viga zarpa.
- Se inicia la fundida de la viga zarpa con concreto mezclado en sitio. se vibra el concreto con vibrador eléctrico.
- Se toman los respectivos cilindros en concreto para ser fallados en laboratorio.

Zona externa del parque

- Se realiza la instalación del juego infantil M3, donde estaba el juego dañado en madera.

Actividades eléctricas

- En este parque no se van a realizar actividades eléctricas 0,00%

PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD.
- El IDRD realiza reubicación y movimiento de los módulos sanitarios
- Se deben adecuar con las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Zona de la huerta cerramiento.

- Zona totalmente terminada.

Zona ruta de la vida

- Se termina la pintura de los módulos ruta de la vida.
- Se cambian banner de la zona.
- Actividad eléctrica realizada al 100%

Actividades eléctricas

- En este parque ya se realizaron las actividades eléctricas al 100,00%

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

Biosaludables

- El contratista realizó en sitio retoques de pintura a los Biosaludables a solicitud de la interventoría.
- Ya se tiene la puesta en servició de estos elementos.

Ruta de la vida

- Se realizo el cambio de una banca de abdominales a solicitud de la interventoría, ya que esta presentaba la malla parcialmente rota.

Coliseo

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio se realizaron actividades eléctricas al 100,00%

CANAL BOYACÁ

- Se termina la demolición de la placa de piso en concreto.

- Se realiza desmonte de canecas dañadas.
- Se realiza desmonte de juegos en madera dañados existente en el parque externos a la
- Se realiza desmonte de juego M3 existente

FONTANAR DEL RIO

- Se termina el retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida .
- Está pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

VIRREY CHICO

- Se termina el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se termina la instalación de canecas nuevas.
- Se termina la instalación de espaldares de bancas.
- Se recoge campamento y se realiza aseo en la zona.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se termina el traslado de material para relleno para utilizar al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Continúa la retapada, el sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos, en muros y piso.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Está en construcción de la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. (se recomienda realizar la conexión definitiva, cuando se habilite el vertimiento de residuos al tanque séptico).
- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø6" (En ejecución).

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Avance en la aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos.
- Lijado y pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.
- Lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

En el área interna de los baños de mujeres, se terminan las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres. Pruebas hidrosanitarias para baños de mujeres.
Continúan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.
Se realizan resanes de pañete en muros, antes de iniciar la instalación del enchape.
Instalación de bebederos en el sector de Juegos 2.

**EMERGENCIA** : A solicitud de la Administración del Parque, se realizaron investigaciones para determinar aposamiento de agua en un sector paralelo a la pista de trote y a la Av. 68. *** Evidencias de que personas externas que construyen tramo de ciclovía han intervenido al interior del Parque (cajas de inspección con tapa provisionales de madera y pozo de inspección sin tapa). *** Al retirar el tapón de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada.

PRD - TENIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Continúa la reparación para el muro que presenta la fisura. (anclajes para coser el muro)
- Reunión con el Veedor, con los Apoyos de la Administración PRD, Contratista y la Interventoría. (definición de colores para el piso de la cancha).

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza la instalación de cielorraso en PVC para la oficina de sistemas en Área administrativa del PRD.
- Instalación de luminarias en la oficina de sistemas.
- Aplicación de pintura para los muros de la Oficina de sistemas
- Inicia desmonte de cielorraso en el depósito del área administrativa.

PRD - UCAD.

- Finaliza la estructuración de cielorrasos de baños y bodega para montaje de láminas en PVC, en el Restaurante.
- Continúa la instalación cielorraso en PVC baños.

PRD- Cancha de baloncesto

- Compactación de la base granular.
- Inicio instalación de bordillos prefabricados.

PRD- Cancha de Hockey

- En la cancha de hockey continúa la instalación del tablero para control de circuitos.
- En proceso la instalación de estructura metálica y pie de amigos para asegurar el tablero de control.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS.)

- Cambio de fluxómetros baños de 1° y 2° piso; en el Velódromo
- Enchape de muros, en sitios donde se han cambiado los fluxómetros en baños.
- Se realizan protocolos para iniciar el desmonte y la instalación de nuevas luminarias en la cancha de béisbol.
- Se identifica en uno de los postes de energía un panal de abejas, el cual deberá ser tratado para realizar procedimientos de erradicación y traslado.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Continuaron las excavaciones manuales para instalación de tubería que sirvan para drenar las aguas hacia el pozo de alcantarillado, por costado oriental (conexión del cárcamo).
- Finaliza la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Terminan las excavaciones para construcción de cajas de inspección.
- Extendida y compactación de la subbase granular.
- Ensayos de densidades en el terreno, para establecer grado de compactación de la subbase.
- Continúa la construcción de cajas de inspección con ladrillo recosido.
- Inicio extendida y compactación de la base granular.

CANAL RIO NEGRO

- Finaliza el anclaje y la instalación de deslizaderos en acero inoxidable (2 unidades). Pendiente la instalación de los otros dos (2).
- Termina la aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Aplicación de anticorrosivo para la malla eslabonada del cerramiento y la estructura metálica correspondiente.
- Aplicación de puntos de soldadura para la puerta metálica que se estaba cayendo. (costado norte).
- Arreglos de tubulares metálicos que estaban podridos (encamisado).

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Termina la instalación de los bolardos metálicos, a solicitud de la Comunidad.
- Finaliza la demolición de las bancas existentes por el Costado Sur.
- Se termina la instalación de las bancas en concreto, por el costado sur del Parque.

PARQUEADERO DE LOS NIÑOS

- Instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur.
- Continúa la instalación de tuberías de 6", por costado norte, para efectos de conectar la arenera existente a la red, mediante cajas de inspección.
- Continúa la construcción de cajas de inspección por costado occidental.
- Finaliza la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Pedido de materiales (tuberías drenaje), para realizar conexión a las canchas de arena existentes.
- Avance de excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección externas a las canchas. Continúan las instalaciones de redes de aguas lluvias en tuberías corrugada de PVC.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Nivelación de la subrasante - revisión de pendientes.
- Instalación del material geotextil 4000 en la subrasante del terreno.
- Inicio en la extendida de la capa de triturado de rio 3/4" -1" (e=20 cm).

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Figuración de acero de refuerzo para las zapatas y pedestales de columnetas en la cimentación, para el Módulo de baños por costado sur.
- En el Túnel del Amor, se fabrica en taller la estructura metálica y rolada de la tubería de soporte.
- En módulo de baños, se termina el enchape de muros en los sitios donde se realizaron reparaciones hidrosanitarias.
- En el área de cimentación donde se ubicará el nuevo módulo de baños, se funde la cimentación para zapatas con el concreto ciclópeo.
- Amarre de hierro para zapatas y pedestales de columnetas; fundida de las zapatas en concreto.
- Revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias en los baños de servicios.
- Se realiza visita a taller de ornamentación (contratista e interventoría).
- Limpieza de cajas de inspección existentes y sondeo de tuberías, para poder identificar y conectar desagües desde el sitio donde se instalará el nuevo Módulo de baños.

PARQUE ALTA BLANCA

- Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.
- Se realiza aseo general de la pista de patinaje, recolección de material y llevada a disposición final.
- Se termina la ejecución de pintura en muros y techos de la cocineta
- Se tiene en estudio la propuesta por parte de la Institución, de realizar la pulida de toda la pista de patinaje de velocidad

PARQUE SERVITA

- Instalación de espejo en baños.
- Finaliza la ejecución del mantenimiento desagües de lavamanos en baños.
- Se programa para próxima semana reunión de socialización para realizar intervención para cambio de luminarias en la Cancha de fútbol.

PARQUE ALTA BLANCA

- Se realiza el cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Se aprueba por parte de la Entidad la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Se realiza cambio de las rejillas del cárcamo, de aquellas que estaban deterioradas y/o faltantes.

**7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan a diario emergencias en cada uno de los escenarios, las cuales durante el periodo, se han atendido de manera ágil y oportuna.

Para las emergencias que se han presentado, inicialmente se les realiza en el sitio una visita e inspección y se evalúa el daño; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de los recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

Previo a la intervención de cada uno de los Escenarios, se realiza una socialización de carácter técnico con el respectivo Administrador, para escuchar y aclarar inquietudes; esto se debe esencialmente a que en su mayoría estos Escenarios están activos y con frecuente afluencia de público. Se coordina el acceso al sitio de intervención, al movimiento de personal, así como el traslado de los materiales y equipos al frente de trabajo.

**8. CLIMATOLOGÍA:**

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024; en el **(ANEXO 02)** se adjunta formato de control de lluvias.

**9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:**

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

**9.1 ACTAS DE COMITÉ**

| Escenario | FECHA |
|---|---|
| Comité de seguimiento No. 17 | 07/02/2024 |
| Comité de seguimiento No. 18 | 15/02/2024 |
| Comité de seguimiento No. 19 | 21/02/2024 |
| Comité de seguimiento No. 20 | 28/02/2024 |

**9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:**

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

| RELACIÓN DE INFORME SEMANALES | |
|---|---|
| **Número** | **Periodo** |
| Informe semanal No. 21 | 28/01/2024 – 03/02/2024 |
| Informe semanal No. 22 | 04/02/2024 – 10/02/2024 |
| Informe semanal No. 23 | 11/02/2024 – 17/02/2024 |
| Informe semanal No. 24 | 18/02/2024 – 24/02/2024 |
| Informe semanal No. 25 | 25/02/2024 – 02/03/2024 |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024.

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| 1. El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. | 2. El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. |
| 3. El Tunal. Instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto. | 4. El Tunal. retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. |

| | |
|---|---|
| 5. El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias. | 6. El Tunal. Resane y pintura de portería # 1, se avanza en portería #4, se inician trabajos en portería #2. |
| 7. El Tunal. Instalación de asfalto en zona de llagada y con trabajos complementarios de mantenimiento y adecuación de la pista y su contorno existente. | 8. El Tunal. Gimnasio- Se pone en servicio la zona de gimnasios # 1. |
| 9. Parque Illimani. - Adecuación del módulo de baño. | 10. Parque Eduardo Santos. Instalación de enchape en baños de coliseo y la instalación de biosaludables ya restaurados. |
| 11. Parque La Fragua. Instalación de geotextil en la excavación de la pista de patinaje en asfalto. | 12. Parque Cayetano Cañizares. Entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes. |
| 13. Parque Nuevo Muzu. Fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos. | 14. Parque Villa Alemana. Fundida de tapas de cajas de inspección e instalación de equipamiento urbano. |
| 15. La Victoria. Reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio. | 16. Virrey Sur. Mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables. |
| 17. Alta Blanca. Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje. | 18. PDR. Cancha de Tenis- Se revisa que la base granular compactada no presenta fallos. Se termina la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash. |
| 19. Canal Rio Negro. Subsanación de las observaciones al Contratista, referentes a la instalación de la malla eslabonada y a los remates de soldadura en los módulos del cerramiento. | 20. Parque de los Niños. Se está realizando figuración de hierro para viga y pilotines - se realiza construcción de pozo aguas lluvias. |
| 21. Parque de Los Novios. Se continua la demolición de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños. - Se realiza replanteo topográfico en el Túnel del amor. | 22. Parqueadero del Parque de los Niños. Se solicita el retiro de agua y la recompactación del material. Se termina la extendida y compactación de la subbase granular e=30 cm. - Se revisa que la subbase granular compactada no presenta fallos. |
| 23. PDR- Cancha de baloncesto. Se solicitó el retiro del agua y el secado; la compactación del material. | 24. Simón Bolívar. El Carbón - Se revisa la instalación externa e interna de tubería PVC para los baños |
| 25. Simón Bolívar Sector Maná- Retiro del agua para terminar la Impermeabilización mediante la aplicación de IGOL denso por la parte externa e inferior de los tanques sépticos. | 26. Bosques de San Carlos. Se realiza el suministro e instalación de las divisiones metálicas en baños hombres y mujeres – se aplica nuevamente Sika Flex alrededor de los lavamanos baño de hombres. |
| 27. Bosques de San Carlos. Se realiza la protección de las raíces de los árboles con tubería PVC D=6" malla electrosoldada y concreto en zona de grecos. | 28. Bosques de San Carlos. Se realizó el suministro e instalación de juego en la zona infantil. |
| 29. Villa de Los Alpes. Se realizo la instalación de los biosaludables arreglados y pintados. | 30. Olaya Herrera. Suministro e instalación de las colchonetas para la base en concreto de las luminarias en la cancha de futbol. |
| 31. Olaya Herrera. Suministro e instalación de forros para los bajos zona de gradería. | 32. Parque El Tunal. se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. |

| | |
|---|---|
| 33. Parque Tunal. Senderos- Instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos. | 34. Parque El tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. |
| 35. Parque El tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. | 36. Parque El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias. |
| 37.<br>38. Parque El Tunal. se terminan los trabajos de resane y pintura de portería # 1, se avanza en portería #4, se inician trabajos en portería #2. | 38. Parque El Tunal. se avanza con la instalación de asfalto en zona de llegada y con trabajos complementarios de mantenimiento y adecuación de la pista y su contorno existente. |
| 39. Parque El Tunal. Se termina y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1 | 40. Parque ILLIMANÍ. Se avanza en la adecuación del módulo de baños. |
| 41. La Fragua. Instalación de geotextil en la excavación de la pista de patinaje en asfalto. | 42. Nuevo Muzu. Fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos. |
| 43. Villa alemana. Fundida de tapas de cajas de inspección e instalación de equipamiento urbano. | 44.<br>45. La Victoria. Se realiza la reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio. |
| 45. Virrey Sur. se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables. | 46. Bosques de San Carlos. Instalación de pintura vinilo en pared dentro de los baños de hombres y mujeres. |
| 47. Bosques de San Carlos. Suministro e Instalación de Pintura de Biosaludables en taller. | 48. Bosques de San Carlos. Suministro e Instalación juego infantil zona media luna. |
| 49. Bosques de San Carlos. Corte y reparación de placa piso en zona de Biosaludables. | 50. Villas de los Alpes. Se realizo la instalación de los Biosaludables arreglados y pintados. |
| 51. Villa de los Alpes. Se realizó la instalación de pintura en los módulos ruta da la vida. | 52. Ciudad Montes. Suministro e instalación módulos malla de cerramiento Diag. 16 S. |
| 53. Ciudad Montes. Suministro e Instalación de portones entrada posterior costado norte y entrada a la huerta costado sur. | 54. Ciudad Montes. Lijado estructuras Módulo ruta de la vida. |
| 55. Canal Rio Negro. Fijación de la malla eslabonada a la estructura metálica, con platinas y la aplicación de soldadura. | 56. Parque de Los Niños. Armare de hierro, armado, Formaleteada y acodalado de viga y pilotes. |
| 57. Parque de los Niños. Toma de muestras del concreto para estudios. | 58. Parque de Los Niños. Excavación para conformar sendero por costado occidental. |
| 59. Parque Sucre o Hippies. Reparación de piso en adoquín (reemplazo de elementos que están en mal estado o dañados. | 60. Parque Sucre o Hippies. Instalación de rejillas para cárcamo. |
| 61. Simón Bolívar- Maná. Proceso de repello al interior de los tanques sépticos. | 62. Fontanar del rio. Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. |

| | |
|---|---|
| 63. Fontanar del Rio. Comité de obra semanal. Selección del sitio donde se ubicará el Parkourt. | 64. Servitá. Conexiones eléctricas para alumbrado de lámparas en postes. |
| 65. Canal Boyacá. Reunión de socialización con la Comunidad. | 66. Canal Boyacá. Juegos existentes en el área perimetral. |
| 67. Virrey Chicó. Desmonte de bancas y canecas | 68. Virrey Chicó. Desmonte de canecas. |
| 69. El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4. | 70. El Tunal. Remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquín reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4, |
| 71. El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias. | 72. El Tunal. Aseo de los espacios para su respectiva puesta en servicio. |
| 73. El Tunal. Remates de asfalto, demarcación y con la evacuación de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso. | 74. El Tunal. Mantenimiento de la zona de gimnasio # 2. |
| 75. Eduardo Santos. Instalación de divisiones en los sanitarios y de puertas para ingreso a baños. | 76. Eduardo Santos. Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo. |
| 77. La Fragua. Excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque. | 78. La Fragua. Instalación de bases compactas sobre la excavación de la pista de patinaje . |
| 79. Nuevo Muzu. Adecuación de la zona de senderos en adoquín; inicio de pintura en placas nuevas de concreto en la zona de juegos y se termina el ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo; se inician la instalación de juegos infantiles. | 80. Villa Alemana. Mantenimiento de cajas de inspección y remates de senderos en adoquín. |
| 81. La Victoria. Mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio. | 82. Virrey Sur. Mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas |
| 83. Gilma Jiménez. Desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas | 84. Bosques de San Carlos. Se realiza corte y figurado de hierro para fundir la viga zarpa zona grecorromanos. |
| 85. Bosques de San Carlos. Se revisan por parte de interventoría, las divisiones metálicas instaladas en el baño de mujeres. | 86. Bosques de San Carlos. Corte en piso para fundir viga de cerramiento parque infantil. |
| 87. Villa de los Alpes. Se realizó la aplicación de pintura en los módulos ruta da la vida. | 88. Ciudad Montes. Se realiza encintada, lijado de los elementos ruta de la vida. |

| | |
|---|---|
| 89. Canal Rio Negro. Instalación de deslizaderos metálicos. | 90. Simón Bolívar. Tapada y repellada de fisuras al interior de los tanques sépticos en Maná. |
| 91. Simón Bolívar. Instalación de bebederos. | 92. Simón Bolívar. Inicio en la pintura de juegos. |
| 93. Simón Bolívar. Pintura barandas. | 94. Parque de Los Niños. Instalación de sardinel prefabricado por costado norte y compactación de la subbase granular. |
| 95. Parque de Los Niños-Parqueadero. Concreto de limpieza para conformar base de caja de inspección. | 96. PRD- Administración. Instalación de cielorraso en PVC blanco en áula de sistemas. |
| 97. PRD- Restaurante- Instalación cielorraso en baños del Restaurante. | 98. PRD- Canchas Baloncesto. Extendida y nivelación topográfica y compactación de la base granular. |
| 99. PRD- Cancha de squash. Extendida y compactación de rodadura asfáltica 1350. | 100. Parque de Los Novios. Excavación para construcción de zapatas en el sitio donde se instalará el módulo de baños. |
| 101. Parque de Los Novios. Túnel. Fundida en concreto para pedestales | 102. Parque de Los Novios. Aplicación de pintura en el Módulo de Administración. |
| 103. Fontanar del rio. Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. | 104. UDS. Beisbol. Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas, Coordinación del IDRD, Contratista y la Interventoría. |
| 105. Canal Boyacá. Cerramiento en polisombra y demolición placa de piso en concreto | 106. Canal Boyacá. Demolición placa de piso en concreto. |
| 107. Virrey Chicó. Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto | 108. Virrey Chicó - Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto. |
| 109. El Tunal. Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias | 110. El Tunal. Avance con remates de asfalto, demarcación y con la evacuación de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso. |
| 111. Eduardo Santos. Inicia la instalación de divisiones en los sanitarios e instalación de puertas de ingreso a baños de coliseo. | 112. La Fragua. Continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque. |
| 113. Nuevo Muzu. Se adecua zona de senderos en adoquín, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalación de juegos infantiles. | 114. La Victoria. Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio. |

| | |
|---|---|
| 115. Gilma Jiménez. se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas. | 116. Bosques de San Carlos. Colocación de sellante piso zona infantil - colocación de parales metálicos para cerramiento zona juego, infantil. |
| 117. Bosques de san Carlos. Colocación de formaleta con hiero para fundir viga zarpa en grecorromana - Mezcla de materiales para fundir viga zarpa | 118. Villa de los Alpes. Se realizo la instalación de los Biosaludables arreglados y pintados |
| 119. Ciudad Montes. Se realiza instalación de bancas de abdominales en la ruta de la vida. | 120. Ciudad Montes. Suministro e instalación portón de entrada zona de la huerta. |
| 121. Alta Blanca. Pulida del piso en granito pulido en los sitios donde se realizaron las reparaciones puntuales para la pista de velocidad. | 122. Canal Rio Negro. Fijación de la puerta existente, con la aplicación de puntos de soldadura./ Canal Rio Negro. Instalación del deslizadero en acero inoxidable. |
| 123. Parque de los Niños. Apertura de zanjas para instalación de filtro/ Parque de los Niños. Colocación y extendida de material granular para conformación del sendero peatonal. | 124. Parque de los Niños. Fabricación de las estructuras metálicas para cerramientos. |
| 125. Sucre o Hippies. Socialización con Miembros de la Comunidad, Contratista y la Interventoría./ Sucre o Hippies. Instalación de bancas en concreto - instaladas por el costado sur del parque. | 126. Simón Bolívar. Durante la ejecución de las conexiones hidráulicas en los bebederos./ Simón Bolívar. Instalación de bebederos. |
| 127. Simón Bolívar. Cambio de bebederos./ Simón Bolívar. Aplicación de pintura en los Kioscos de comidas. | 128. Simón Bolívar. Campamento para personal y protección de equipos y materiales de obra./ Simón Bolívar. Tanques sépticos. |
| 129. Simón Bolívar. Al retirar el tapón de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada. | 130. Parqueadero Parque de los Niños. Extendida y compactación de la base granular./ Parqueadero Parque de los Niños. Extendida y compactación de la base granular. |
| 131. Reunión con el Veedor, con los Apoyos de la Administración PRD, Contratista y la Interventoría. (definición de colores al piso de la cancha). | 132. PRD TENIS (Muro). Reparación del muro en la Cancha de squash- Tenis. |
| 133. PRD. Oficina Sistemas. Instalación de lámparas para iluminación en el cielorraso de la oficina de Sistemas. | 134. PARQUE DE LOS NOVIOS. Amarre de hierro para zapatas y pedestales./ PARQUE DE LOS NOVIOS. Fundida en concreto para zapatas - módulo de baños |
| 135. PARQUE DE LOS NOVIOS. Fabricación de la estructura metálica para instalar en el Túnel del Amor. | 136. UDS. Retiro de Luminarias en Canchas de Beisbol. |
| 137. Canal Boyacá. Desmonte de juego en madera en mal estado./ Canal Boyacá. Retiro de juego en madera en mal estado. | 138. Canal Boyacá. Llegada de materiales (Adoquines y bordillos). |

| | |
|---|---|
| 139. Virrey Chicó. Suministro e instalación de canecas. | 140. Virrey Chicó. Desmonte de Campamento - Retiro de materiales - aseo general. |
| 141. Simón Bolívar. Instalación de enchape para los baños de hombres en el Sector El Carbón. | 142. Simón Bolívar. Investigaciones para determinar aposamiento de agua en un sector paralelo a la pista de trote y a la Av. 68. |
| 143. Simón Bolívar. Al retirar el tapón de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada. | 144. Parqueadero del Parque de los Niños. Humectación y compactación de la base granular/ Parqueadero del Parque de los Niños. Registro de las densidades tomadas en el terreno para la subbase granular. |

## 11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024.

## 12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de enero de 2023 se realizan revisiones por parte de esta interventoría a los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra, se adelantan mesas de trabajo y los APU'S se encuentran en subsanación para remitir el acta de fijación al IDRD.

Producto de las mesas de trabajo y del trámite de revisión por parte del IDRD a la fecha:

- El 04 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 2 por parte del IDRD la cual cuenta con 27 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 11 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 3 por parte del IDRD la cual cuenta con 5 precios no previstos legalizados en el contrato.

- EL 25 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 4 por parte del IDRD la cual cuenta con 12 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 30 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 5 por parte del IDRD la cual cuenta con 9 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 05 de febrero de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-223 se remite al IDRD el acta de fijación de precios no previstos No. 6 para revisión del IDRD, la cual fue objeto de observaciones por la entidad.

  En ese sentido, se remite subsanación a las observaciones solicitadas mediante comunicado IDRD-3131-2024-260 del 16 de febrero de 2024, a la fecha pendiente remisión de observaciones o concepto de probación por parte del IDRD

En el **ANEXO 7** se remite relación de precios unitarios no previstos tramitados a la fecha.

## 13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024 objeto del presente informe.

| CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PERIODO** | **VALOR BRUTO** | **AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | **VALOR NETO** | **% EJECUCIÓN** |
| **ADICIÓN** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **PARCIAL 1 OBRA** | 12/09/2023<br>31/10/2023 | $52.355.755,00 | $16.745.804,00 | $35.609.951,00 | 0.38% |
| **PARCIAL 2 OBRA** | 01/11/2023<br>30/11/2023 | $96.726.072,00 | $30.937.493,00 | $65.788.579,00 | 0.70% |
| **PARCIAL 3 OBRA** | 01/12/2023<br>31/12/2023 | $180.169.718,00 | $57.626.649,00 | $122.543.069,00 | 1.31% |
| **PARCIAL 4 OBRA** | 01/01/2024<br>31/01/2024 | $1.398.933.917,00 | $447.444.080,00 | $951.489.837,00 | 10.19% |
| **PARCIAL 4 OBRA** | 01/02/2024<br>29/02/2024 | $4.453.603.463,00 | $1.780.586.704,00 | $2.673.016.759,00 | 32.43% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 13.733.153.000,00 | | | | |
| **SALDO A FAVOR CONTRATISTA** | $ 7.551.364.075,00 | | | | |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PERIODO** | **VALOR BRUTO** | **IVA** | **VALOR NETO** | **% EJECUCIÓN** |
| **ADICIÓN** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **PARCIAL 1 OBRA** | 12/09/2023<br>31/10/2023 | $76.322.867,00 | $12.186.004,00 | $64.136.863,00 | 6.40% |
| **PARCIAL 2 OBRA** | 01/11/2023<br>30/11/2023 | $77.848.847,00 | $12.429.648,00 | $65.419.199,00 | 6.53% |
| **PARCIAL 3 OBRA** | 01/12/2023<br>31/12/2023 | $80.757.748,00 | $12.894.094,00 | $67.863.654,00 | 6.77% |
| **PARCIAL 4 OBRA** | 01/01/2024<br>31/01/2024 | $123.103.705,00 | $19.655.213,00 | $103.448.491,00 | 10.33% |
| **PARCIAL 5 OBRA** | 01/02/2024<br>29/02/2024 | $229.159.347,00 | $36.588.467,00 | $192.570.880,00 | 19.22% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.192.172.234,00 | | | | |
| **SALDO A FAVOR CONTRATISTA** | $ 604.979.720,00 | | | | |

## 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Conforme a los desembolsos realizados en el mes de enero, se evidencia el reporte de inversión del anticipo en el siguiente cuadro:

| CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE | VALOR DESEMBOLSADO | PORCENTAJE | SALDO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | $ 4.001.731.087 | 95,90% | $ 4.001.731.087 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| ALQUILER EQUIPOS | $ 171.144.445 | 4,10% | $ 171.144.445 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| TOTAL | $ 4.172.875.532 | 100% | $ 4.172.875.532 | 100,00% | $ - | 0,00% |

Se remite informe con el reporte consolidado mensual en el **(ANEXO 08)**

## 15. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 09)** se adjuntan copias de las bitácoras con el registro de las actividades más relevantes del periodo en cada uno de los Escenarios.

## 16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 10)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

## 17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se relaciona el personal del Contratista Consorcio Parques BOG, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de febrero al 29 de febrero de 2024.

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO |
| RESIDENTE DE OBRA | RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO |
| RESIDENTE DE OBRA | JOSE ORLANDO PEÑA BAEZ |
| RESIDENTE DE OBRA | LUS STELLA QUINTERO RODRIGUEZ |
| INSPECTOR DE OBRA | NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO |
| INSPECTOR DE OBRA | MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS |
| INSPECTOR DE OBRA | CARLOS ANDRÉS ROJAS ROJAS |
| INSPECTOR DE OBRA | BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA |
| PROFESIONAL ESTRUCTURAL | YHON EDISON POLO GARZON |
| PROFESIONAL SST | INGRID KATHERINE BAEZ SANABRIA |
| ING. AMBIENTAL | DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA |
| ING. CALIDAD | MONICA RODRIGUEZ |
| PROFESIONAL ELÉCTRICO | DIANA ALEJANDRA ARAGÓN |

| | |
|---|---|
| ESP. TRANSITO | MARTHA ROCIO CASTILLO FERNANDEZ |
| PROFESIONAL HIDRÁULICO | CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA |
| TRABAJADORA SOCIAL | YESICA AGUDELO GONZALEZ |
| PROFESIONAL PPTO Y PROGRAMACIÓN | LAURA MARIA NATALIA AVILA CASTILLO |
| GERENCIA DE PROYECTOS | MARYORY PASACHOVA |
| TOPÓGRAFO | HARVEY ENRIQUE TAVERA OHOA |
| CADENERO | ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN |
| CADENERO | DAVID JOEL MUETE HURTADO |
| SECRETARIA | MARICEL MARTINEZ PULIDO |
| CONTADORA | XIMEN PAOLA GARZÓN CASTILLO |
| ABOGADA | NATALIA PARDO DEL TORO |

**18. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.**

Se relaciona el personal de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de febrero al 29 de febrero de 2024.

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | EDNA CONSTANZA CEPEDA SÁNCHEZ |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | LUIS ALBERTO MEDRANO BERMÚDEZ |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | LUIS FERNANDO MONDRAGÓN |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | JOHN CUELLAR |
| PROFESIONAL ESTRUCTURAL | GERMAN CAMILO ALFONSO |
| PROFESIONAL HIDRÁULICO | ÁLVARO AUGUSTO VERGARA |
| ING. CALIDAD | VIANNEY LEAÑO |
| PROFESIONAL ELÉCTRICO | YENNY PAOLA REYES |
| ING. AMBIENTAL | SINDY NATALI ESPINOSA |
| ESP. TRANSITO | CARLOS ANDRÉS FIGUEROA |
| PRESUPUESTO | JEISON DELGADO |
| PROFESIONAL SST | YINETH CRUZ ARANZALEZ |
| PROFESIONAL SOCIAL | ROSARIO CÁRDENAS JUNCA |
| INSPECTOR | GUILLERMO GÓMEZ |
| INSPECTOR | JEAN PAUL REYES MORALES |
| INSPECTOR | KAREN ALGECIRAS |
| CADENERO | DIEGO GALE |
| SECRETARIA | LIZETH CASTILLO |
| TOPÓGRAFO | DIEGO VICENTE CORTÉS |
| CADENERO | RUBÉN DARÍO MÁRQUEZ |
| CONTADORA | SOLBEY MAYERLY DUQUE |
| ABOGADA | LINA RODRÍGUEZ |
| CADENERO | YENNIFER BERNAL |

**19. CONCLUSIONES**

- La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, calidad, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados; todo esto se realiza para garantizar el normal desarrollo del proyecto.

- Se planea, coordina y resuelve en mesas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría las diferentes inquietudes que se presentan en los diferentes frentes de obra; se dan alternativas y soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas, a que haya lugar.

- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina además con los administradores de los Escenarios y con los Supervisores de la Entidad.

- Durante el periodo, se atendieron de manera inmediata las emergencias que han surtido en los diferentes Escenarios y frentes de trabajo.

- De manera oportuna, se continúan atendiendo las Emergencias que se presentaron durante el periodo en algunos Escenarios. Algunas se han resuelto de manera inmediata y en otras se coordina para el buen desempeño y pronta solución.

- La Interventoría ha velado para que el Contratista entregue a tiempo, los diferentes análisis de precios NO PREVISTOS con los respectivos soportes, para el estudio, análisis y aprobación ante la Entidad.

- Se le verificado que el Contratista, entregue oportunamente las planillas del personal con las afiliaciones a la seguridad social, con el fin de poder validar el ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo. No se han tenido inconvenientes por este aspecto, durante el periodo.

- Se revisaron las memorias de cantidades de obra de acuerdo a los trabajos realizados durante el periodo, en aras de aprobar el Acta Parcial de Obra, según las actividades que se ejecutaron en el presente periodo.

- Durante el periodo, se realizó recorrido e inspección de los Escenarios a intervenir, dando priorización de las actividades a desarrollar en cada uno de ellos; se levantó el Acta correspondiente. Todas las visitas e inspecciones, se realizaron en coordinación del Contratista, la Interventoría y funcionarios encargados de la Entidad IDRD.

- Durante el periodo, se llevaron a cabo los Comités de obra semanales, con la participación de los profesionales de la Entidad IDRD, Contratista y la Interventoría.

- El Acta Parcial de obra N° 5, de fecha 1 de marzo de 2024, se tramitó ante la entidad por un valor de $4.453.603.463,00

$4.453.603.463,00

**ANEXO 1.** PÓLIZAS

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148028 | BOGOTA | | 11 | | | 30 | 400049988 | 1 |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | | | HOJA |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | | |
| 28 / 9 / 2023 | 12 / 9 / 2023 | 00:00 | 11 / 4 / 2027 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 318 |

**OBJETO DEL SEGURO**

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO N.° 3099 de 2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/09/2023 | 11/10/2024 | 4.119.945.900.00 | 0.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/09/2023 | 11/04/2027 | 1.373.315.300.00 | 0.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 12/09/2023 | 11/10/2024 | 5.493.261.200.00 | 0.00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 11/04/2024 | 11/04/2026 | 2.746.630.600.00 | 0.00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Día - Mes - Año | |
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 29/09/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 13.733.153.000,00 | TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049988 | 1 | BOGOTA | 28 /9 /2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /9 /2023 | 00:00 Horas del 11 /4 /2027 | MODIFICACIÓN | TELÉFONO | 7483219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.951-9
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

:NCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 29/09/2023 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 28 DE 2023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 28 días del mes de Septiembre de 2023.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148029 | BOGOTA | | 11 | | 15 | 400049989 | 1 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS Horas** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 28 / 9 / 2023 | 12 / 9 / 2023 | 00:00 | 11 / 4 / 2024 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| GASTOS MEDICOS | 125,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 343,328,825.00 | 386,657,650.00 | 386,657,650.00 | 0.00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 29/09/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 686.657.650,00 | SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
Informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Ameya
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LCARDENAS

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049989 | 1 | BOGOTA | Día - Mes - Año 28 9 2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 12 9 2023 | 00:00 | 11 4 2024 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 80-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA . CONTRATO N.° 3099 DE 2023 DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

TA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN IGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400049989 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 29/09/2023 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 28 DE 2,023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145616 | BOGOTÁ D.C. | 11 | | 15 | 400049989 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 17 / 8 / 2023 | 18 / 7 / 2023 | 00:00 | 20 / 2 / 2024 | 00:00 | EXPEDICIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 686.657.650,00 | 686,657,650.00 | 686.657.650,00 | 1.224.696,25 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 343.328.825,00 | 686,657,650.00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| STOS MEDICOS | 125.000.000,00 | 250,000,000.00 | 250.000.000,00 | 0,00 |
| LUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 343.328.825,00 | 686,657,650.00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| IPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 343.328.825,00 | 686,657,650.00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 343.328.825,00 | 686,657,650.00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 343.328.825,00 | 386,657,650.00 | 386.657.650,00 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.224.696,25 | $ 14.700,00 | $ 235.485,29 | $ 1.474.881,54 | Día - Mes - Año 18/08/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 686.657.650,00 | SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of: 202/ Bogota D.C.
(601) 926 0801
313 799 3800
defensornacionaldeseguros@umosbogados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Nacional de Seguros S.A.
LCARDENAS

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049989 | 0 | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año 17 8 2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 18 7 2023 | 00:00 | 20 2 2024 | 00:00 | EXPEDICIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEC ··· CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARI Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400049989 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 1.474.882,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 18/08/2023 | $ 1.474.881,54 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2.023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145615 | BOGOTÁ D.C. | 11 | | 30 | 400049988 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 17 / 8 / 2023 | 18 / 7 / 2023 | 00:00 | 20 / 2 / 2027 | 00:00 | EXPEDICIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 319 |

**OBJETO DEL SEGURO**

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 18/07/2023 | 20/08/2024 | 4.119.845.900,00 | 12.610.420,71 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 18/07/2023 | 20/02/2027 | 1.373.315.300,00 | 13.832.483,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 18/07/2023 | 20/08/2024 | 5.493.261.200,00 | 16.813.894,28 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 24/02/2024 | 20/02/2026 | 2.746.630.600,00 | 15.317.921,23 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Día - Mes - Año | |
| $ 58.574.719,42 | $ 14.700,00 | $ 11.131.989,69 | $ 69.721.409,11 | 18/08/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 13.733.153.000,00 | TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049988 | 0 | BOGOTÁ D.C. | 17 /8 /2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 18 /7 /2023 | 00:00 Horas del 20 /2 /2027 | EXPEDICIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.951-9
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 69.721.409,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 18/08/2023 | $ 69.721.409,11 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 17 días del mes de Agosto de 2023.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 | 2023 | 12 | 09 | 2023 | 00:00 | 13 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SOLIUN INGENIERIA SAS | | NIT: 901.114.547-5 |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | | NIT: 860.061.099-1 |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 6605400 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, RSPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/09/2023 | 12/11/2024 | $238,434,646.80 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 13/05/2024 | 13/05/2029 | $238,434,646.80 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/09/2023 | 13/05/2027 | $119,217,323.40 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3131 DEL 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***4,200,042.00 | $ ******20,000.00 | $ *****801,808.00 | $ *********5,021,850.00 | $ ******596,086,617.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS | 52848 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.*

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 | 2023 | 12 | 09 | 2023 | 00:00 | 13 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| SOLIUN INGENIERIA SAS | | NIT: 901.114.547-5 | |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | | NIT: 860.061.099-1 | |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 6605400 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.*

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADRIANABERNALC 2

368

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284535, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 2023 | 28 | 08 | 2023 | 00:00 | 28 | 04 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SOLIUN INGENIERIA SAS | | NIT: 901.114.547-5 |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | | NIT: 860.061.099-1 |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 6605400 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, REPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/08/2023 | 28/10/2024 | $238,434,646.80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 28/04/2024 | 28/04/2029 | $238,434,646.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/08/2023 | 28/04/2027 | $119,217,323.40 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***4,200,042.00 | $ ******20,000.00 | $ *****801,808.00 | $ *********5,021,850.00 | $ ******596,086,617.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS | 52848 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.*

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



369

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284535, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

**1. AMPAROS.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

**EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:**

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

**EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.**

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

**EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

**EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.**

**EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.**

**1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

**ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

**2. EXCLUSIONES.**

**LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:**

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**3. SUMA ASEGURADA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

**4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

**5.1** RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

**5.2** EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.3** EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.4** EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

**6. COMPENSACIÓN.**

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

**7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

**8. PLAZO PARA EL PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

**11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

SEGUROS ESTADO S.A.

**12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

**ANEXO 2.** CONTROL CLIMATOLÓGICO

| | REGISTRO DE CUMA | CÓDIGO: | OBR-FR-07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | VIGENCIA: | 2023-07-11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA No: | 3131 de 2023 | CONTRATO DE OBRA No: | 3090 de 2023 |
| INTERVENTOR: | SOLUN INGENIERÍA SAS | CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". | OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE : | 1° de febrero al 29 de febrero de 2024 |

| FRENTE DE OBRA | | | | ESCENARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | | LLUVIAS |
| jueves | 1 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. |
| viernes | 2 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras y generalizadas en la ciudad. Durante la mañana predominaron las condiciones de tiempo seco. Durante la tarde se han registrado lluvias entre ligeras a moderadas en diferentes sectores de las localidades de Engativá, Suba y Usaquén. |
| sabado | 3 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras y generalizadas en la ciudad. Durante la mañana predominaron las condiciones de tiempo seco. Durante la tarde se registraron lluvias entre ligeras a moderadas en diferentes sectores del centro oriente, norte y occidente de la ciudad. Durante la noche se registraron lluvias entre ligeras a moderadas en múltiples sectores del centro oriente y occidente de la ciudad. Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en amplios sectores del centro oriente, occidente y norte de la ciudad. |
| domingo | 4 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias entre ligeras y moderadas en gran parte de la ciudad, los mayores acumulados se registraron en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme. Durante la mañana predominaron las condiciones de tiempo seco con presencia de lluvias ligeras en sectores del sur de la ciudad. Durante la tarde se registraron lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del centro oriente, occidente y suroccidente de la ciudad. |
| lunes | 5 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias entre ligeras y moderadas en gran parte de la ciudad principalmente en Bosa, Engativá y Barrios Unidos. En la mañana ha predominado tiempo seco en la capital. Durante la tarde se registraron lluvias entre ligeras y fuertes en las localidades de Santa Fé, Barrios Unidos y Chapinero. |
| martes | 6 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en los cerros centro orientales y surorientales, principalmente en la localidad de Usme. En la mañana ha predominado tiempo seco en la capital. Durante la tarde se registraron lluvias generalizadas en la capital, principalmente en los Sectores de los cerros nororientales, cerros orientales y sector occidental, registrando los mayores acumulados en la localidad de Suba. |
| miercoles | 7 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal, Kennedy y Usme. En la mañana predominó tiempo seco en la capital. Durante la tarde se registraron lluvias con intensidades de ligeras a muy fuertes en la localidad de Suba y de ligeras a moderadas en la localidad de Engativá. |
| jueves | 8 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital. Durante la tarde ha continuado predominio de tiempo seco en la ciudad. |
| viernes | 9 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en gran parte de la capital, principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe. En la mañana predominó tiempo seco en la ciudad. En la tarde se han presentado lluvias ligeras en la localidad de Usme, San Cristóbal y Santa Fe. |
| sabado | 10 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lloviznas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero y San Cristóbal; en el resto de la ciudad predominó tiempo seco. En la mañana y en la tarde ha predominado el tiempo seco en la capital. |
| domingo | 11 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy no se registraron lluvias en la ciudad. En la tarde ha continuado predominio de tiempo seco.Durante la última semana, se registraron hasta 5 días sin lluvias por debajo de los 0.2 mm en las localidades de Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén. |
| lunes | 12 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron condiciones secas en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias muy ligeras y sectorizadas en la localidad de Bosa. En la mañana continuó el predominio de tiempo seco. |
| martes | 13 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y en la mañana de hoy se presentaron condiciones secas en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias muy ligeras y puntuales en la localidad de Bosa. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Suba y Usaquén. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| miercoles | 14 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y en la mañana de hoy se presentaron condiciones secas en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias muy ligeras y puntuales en la localidad de San Cristóbal. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias muy ligeras y puntuales en algunos sectores de las localidades de Tunjuelito y Sumapaz. |
| jueves | 15 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy no se presentaron lluvias en gran parte de la Capital, con excepción de algunas lluvias muy ligeras y puntuales en las localidades de Usme y San Cristóbal. En la mañana predominó el tiempo seco en la ciudad. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias muy ligeras y puntuales en algunos sectores de la localidad de Chapinero. |
| viernes | 16 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy no se presentaron lluvias en gran parte de la Capital, con excepción de algunas lluvias muy ligeras y puntuales en las localidades de Chapinero, Usme y San Cristóbal. En la mañana predominó el tiempo seco en la ciudad. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias muy ligeras y puntuales en algunos sectores de la localidad de Fontibón. |
| sábado | 17 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias de bajos acumulados en las localidades de Ciudad Bolivar, Usme y Usaquén. En la mañana predomino el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde se han presentado lluvias ligeras en la localidad de Usaquén. |
| domingo | 18 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y el transcurso de la mañana de hoy predomino el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde, se presentaron bajos acumulados en las localidades de Chapinero y Usme. |
| lunes | 19 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy, predomino el tiempo seco sobre Bogotá. En el transcurso de la mañana, se presentaron lluvias aisladas de bajos acumulados en la localidad de Usaquén. En el transcurso de la tarde, se han presentado lluvias de bajos acumulados en la localidad de Suba. |
| martes | 20 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá, sin embargo, se observa ingreso de humedad por el norte del distrito. |
| miercoles | 21 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde se presentaron lluvias con bajos acumulados en las localidades de Usaquén y Chapinero. |
| jueves | 22 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde se presentaron lluvias con bajos acumulados en la localidad de Ciudad Bolivar. |
| viernes | 23 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde se presentaron lluvias con bajos acumulados en la localidad de Usme. |
| sabado | 24 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó el tiempo seco y en el transcurso del día se presentaron lluvias ligeras y aisladas en algunas localidades de Usme y Engativa. |
| domingo | 25 | febrero | 2024 | Durante la madrugada predominó tiempo seco en la ciudad, con excepción de lloviznas en zonas aisladas de las localidades de Chapinero y Ciudad Bolivar. En la mañana continuó el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde se ha mantenido el predominio del tiempo seco en la ciudad, con excepción de lluvias aisladas al centro oriente de la capital, particularmente en la localidad de Chapinero. |
| lunes | 26 | febrero | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá. En la tarde, ha predominado el tiempo seco sobre Bogotá, sin embargo, se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde en las Localidades de Usaqué y Suba. |
| martes | 27 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominaron las condiciones secas en la ciudad, sin embargo, se presentaron lluvias ligeras en sectores de las localidades de San Cristóbal y Usme. En la mañana continuó el tiempo seco, no obstante, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Usme y Engativá. Para la tarde se registraron lluvias moderadas a fuertes en sectores de las localidades de San Cristóbal, Usme, así como precipitaciones ligeras a moderadas en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar. |
| miercoles | 28 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias en sectores de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Fontibón y Barrios Unidos. En la mañana predominó el tiempo seco, no obstante, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de la localidad de Barrios Unidos. Para la tarde se registraron lluvias moderadas a fuertes en sectores de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, así como precipitaciones ligeras a moderadas en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Engativá, Barrios Unidos y Ciudad Bolivar. |
| jueves | 29 | febrero | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar. En lo transcurrido de la mañana predominó el tiempo seco, no obstante, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de San Cristóbal y Usme. |

Firma:
JOSÉ ORLANDO PEÑA
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
ING. LUIS A. MEDRANO B.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**ANEXO 3.** COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

| ACTA No. | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 20 COP 3099123 Clo Int 3131123 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| | | 28 | 02 | 2024 |

LUGAR: Oficina interventoria - Solun Ingeniera HORA DE INICIO: 8:00 am. HORA F.N:

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistentes | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Aprobación acta anterior | 4. Componente calidad |
| 2. Componente técnico. | 5. Componente SST |
| 3. Componente Social | 6. Componente ambiental. |

**TEMAS TRATADOS**

1 Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no se presentan observaciones.

2. Componente técnico

2.1 Gilma Jimenez:

A la fecha se presenta atraso en el inicio de las actividades del componente eléctrico, el contratista manifiesta que el viernes llegan la mayoría de materiales, para inicio de la parte eléctrica el próximo lunes. Se solicita coordinar la maquinaria requerida. El contratista manifiesta que el segundo Manlift llega mañana a UDS a atender las actividades en las torres altas. El primer Manlift es para Serviá, Gilma Jimenez se está trabajando con escalera, apenas salga la maquinaria de UDS se traslada para rematar las actividades en Gilma Jimenez. En cuanto a las luminarias de Softbol se aclara que el proveedor informó que presenta demoras en la entrega de las luminarias.

El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en la acometida.

La interventoria aclara que fútbol SA y B se intervendrán con luminarias dina, las wules ya se encuentran en el parque.

Los senderos y patinajes se presupuestaron pero por tema presupuestal

**TEMAS TRATADOS**

no se incluyen en el alcance del contrato.

- El acta de no previstos #6 se encuentra en trámite en la entidad, se está revisando por parte del asesor del nuevo subdirector de acuerdo con lo informado por el apoyo a la supervisión.

2.2 La Victoria:

66% Programado VS 40% Ejecutado.

- Se aclara que el programado es 63%.
- Aunque el presupuesto es bajo, el contratista no ha iniciado intervención en la zona de administración ni en la caseta, el contratista informa que la reilla se está fabricando y se intervendría el modulo de administración la próxima semana.

En el parque se presenta inconveniente por el horario reducido debido a los temas de seguridad, la idea es finalizar la intervención en 2 semanas.

2.3 Illimani:

- Se presenta atraso, ésta semana no se micaron las actividades pendientes del baño, el contratista manifiesta que tuvo un inconveniente con el proveedor y no ingresó el martes, estaría ingresando el próximo sabado de acuerdo con lo informado.
- Pendiente todavía el tema de las cajas, no se ha definido.

2.9. Tunal.

. Al día, esta en 88% VS 86%. → Sin atraso

- Se deben subsanar los detalles a las observaciones realizadas en interventoria.
- Se tenían compromisos de entrega de zonas a administración. porterias hoy y zonas del adulto mayor hoy.
- Porterias sólo se entregaría la 4, la 2 aún presenta observaciones, se entregaría mañana. Se aclara que la 2 y la 5 se entregaría el viernes.
- En caso del adulto mayor están pendientes las puertas que llegarían el sabado, la entrega se realizaría el lunes.
- Está pendiente el tablero de control que no se ha suministrado.
- El policarbonato llegó pero se solicitó cambio pues no es el adecuado.

El IDRD solicita subsanar y cerrar los frentes.

- En BMX se está haciendo orden y aseo, subsanación de observaciones.
- Se recuerda que se debe pintar la ruta de la vida, que se está trabajando en la otra zona pero no se ha iniciado la del lado de Parkour.

**TEMAS TRATADOS**

2.5 Nuevo Muzú:

Al día 59%. Programado ; 60% Ejecutado

- Se está finalizando la zona de baños, pendiente enchape.
- Se programó reunión para entrega de PPP para el viernes., se aclaro que Biblored tiene la potestad para dar apertura o no al módulo.
- Ya llegaron los módulos de la baranda para instalación.
- Se recuerda que la resina para piso caucho está en proceso de importación, está en puerto el 17 de marzo, el caucho llega el 6 de marzo.
- Se solicita remitir antes del comité el seguimiento a las adquisiciones.
- Solo faltan 2 juegos que llegan el 19 de marzo.

2.9 Fragua:

61% Programado | 70% Ejecutado:

- Se aplico subbase y base, los resultados dieron.
- Se inició instalación de bordillo en la pista de patinaje
- Pendiente segunda capa de la subbase en la zona infantil
- En baños ya se instalaron los espejos, las divisiones ya están instaladas, se revisará el tema de las bombas con administración, pues no hay presión en los sanitarios.
- Los juegos llegan el 20 de marzo.

* De Parkour se solicita ajustar la propuesta, para el tema de los circuitos del escenario.

- El asfalto debe programarse para el 8 de marzo, por el tiempo de curado, se aclara que se asfaltaria el lunes 11 de marzo por tarde.

2.5 Eduardo Santos

- 57%. Prog 60% Ejecutado
- Mañana se finaliza instalación de puertas y espejos baño de hombres, baño de mujeres se encuentra finalizado.

2.6. Virrey Sur:

128 Programado, 65%. ejecutado:

- Finalizada cubierta
- Se realizó aseo de canales.
- Ya se instalaron todas las bancas.

2.7. Villa alemana

53%. Programado 65%. Ejecutado

**TEMAS TRATADOS**

2.8) - Pendiente soldadura de los tapas y el cordón nuevo.

- El portón está podrido, no es posible realizar arreglos, se solicita revisar si no es viable para proponer cambio.

2.8. Cayetano Cañizares:

Las cuerdas llegarían el 6 de marzo, se iniciaría actividad el 8 de marzo

2.9. Las fachadas verdes se instalaron y se realizó acta de puesta en servicio.

2.10 UDS:

·I Programado: 21 ·I. Ejecutado: 29

- Ya se finalizó la obra civil de los baños
- En la parte eléctrica están trabajando en beisbol, desmontando las luminarias, se finalizaría la actividad en 2 días, se adelanta también el sistema de apantallamiento.
- Para el manejo de abejas en los 3 postes de softbol, se encuentra en ejecución la actividad.
- Philips informa que las luminarias de softbol llegan el primero de abril, se deben instalar las luminarias a partir del 2 de abril.

2.11. PRD

·I. Programado: 54 I. Ejecutado: 68

- Pendiente remate de zona administrativa, se trabaja en el cielo raso de la bodega
- Se solicita realizar acta de recibo.
- En tenis se socializó con administrador y veedor, la pintura se realizaría la próxima semana.
- Cancha de baloncesto, pendiente sintético, se funde la próxima semana, se toman las densidades ésta semana.
- Control de iluminación, Falta conexión de los tableros.
- Se realizó pintura de barandas en arenero.
- La conexión de las canchas antiguas se debe realizar, se programa inicio para la próxima semana
- Se solicita colocar tomas y bombillos en la cocina el día de mañana.
- Falta 1 espejo para los baños y un enchape para cocina.

2.12 Parque de los Niños:

- Se está instalando la gravilla
- Se presenta atraso en la demora de instalación de gravilla, ya se finalizaría ésta semana para ingreso arena.

**TEMAS TRATADOS**

- Se solicita acelerar actividades que se pueden ejecutar.
- La gravilla debe liberarse para poder instalar arena.
- La parte eléctrica no ha iniciado.
- El asfalto de parqueadero era hoy, no se cumplió, el contratista informa que ya se tomaron densidades, no se evidencia cumplimiento de los compromisos pactados. Se requiere cumplir con lo establecido.

2.13 Simón Bolivar:

- Se recuerda que la entrega es el 5 de marzo.
- Hoy no se ha iniciado la polyurea.
- Para el relleno en la zona del tanque se solicitan los ensayos de granulometria, proctor estándar y contenido de materia orgánica, acorde al concepto del especialista que remitió el contratista.
- Se solicita acta de puesta en servicio de los baños para el dia de hoy.
- El sábado se finalizaria la pintura de las caselas.
- Se solicita contingencia para la entrega del coliseo. (Polyurea, relleno)
- La polyurea se finalizaria el lunes, la prueba de estanqueidad se realizaria el lunes.
- Se solicita dar cumplimiento a los requisitos establecidos

2.14. Serviá:

Progr: 43 %. 56 %. Ejecutado.

- Se instalaron tapa registros
- Se solicitan los parales para la malla
- En la parte eléctrica se acordó inicio el lunes.
- El contacto con la comunidad se debe hacer con la profesional social unicamente

2.15. Navios:

31 % Programado, 42 % Ejecutado

- Fundir pedestales el viernes y las vigas.
- Las estructuras ya se pintaron
- La cimentación finaliza la próxima semana.
- Se solicita implementar jornadas de trabajo el domingo

2.16. Altablanca:

- El 12 de marzo finaliza la pulida de la pista.
- Pendiente un dispensador para el orinal.

2.17. Rio Negro:

**TEMAS TRATADOS**

- Se están remalando unas dados en la parte de abajo
- Se finalizaría el jueves de la próximo semana, se solicita acta de entrega.

2.18 Hippies:

- Se solicitan las actas de puesta en servicio.

2.19. San José de Bavarias:

- No se ha iniciado

2.20 Ciudad Montes

- Pendiente detalle de pintura
- El viernes se tiene reunión para entrega de cerramiento

2.21. San Carlos:

1.92 Progra. 35% Ejecutado

- Mañana se funde la zarpa.
- Pendiente piso de caucho hasta el 6 de marzo
- Pendientes rellenos zona infantil
- Ornamentación programada para la próxima semana.

2.22. Villa de los Alpes:

1.100 Programado 98% Ejecutado

- Pendiente la puerta, llegaría hoy y se instala hoy mismo.
- Se programa entrega para mañana.

2.23. Polvenir:

- En la programación no se incluye la conexión.
- Se solicita desglosar el presupuesto para identificar que valor se está contemplando.

2.24. Velódromo 1 mayo:

* 79%. Programado 75% Ejecutado

- A la espera de la llegada de postes el 6 de marzo.
- Se solicita trabajar lo eléctrico de la zona de los baños, se solicita acompañamiento de la profesional electricista del contratista.
- Los controles de iluminación no se han definido, se revisarán en sitio, por tema de distancia.

2.25. Nacional.

No se ha iniciado la actividad.

* Se solicita contingencia para el componente eléctrico, se manifiesta que se implementará trabajo continuo, aumentando horarios.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| 3. Social |
| - Se realizó reunión en Berulá, se programó obra con comunidad mañana a las 7:00 am, se solicita asistencia de los electricos y SST. |
| - Entrega de cerramiento a las 10:00 am en Ciudad Montes |
| - Se hizo reunión con Softbol el 23 de feb. |
| - Se está realizando entrega de los casetas en Simón Bolivar |
| - Se programará entrega de puesto en Tunal |
| - Fragua se programaría para el 20 de marzo |
| - El viernes se realiza reunión PPP en Nuevo Muzú. |
| - Se solicitan actas de puesta en servicio. |
| |
| 2.26 Canal Boyacá: |
| · I. Programado: 27 I. · I. Ejecutado: 25 I. |
| - Falta material para nivelación (relleno) base granular. |
| - El adoquín se manejará con modulación, se solicita la propuesta. |
| 2.27 Virrey Norte |
| I Programado: 33 I. Atraso 49 |
| - Se aclara que se finalizaron las actividades anticipadamente el sábado pasado. |
| 2.28. Fontanar: |
| · I Programado 21. · I. Ejecutado: 15 I. |
| - El 15 I. corresponde a los vinilos |
| - Se solicita aclaración a la distribución de circuito de ParKour de acuerdo con la secuencia (Ritmo). |
| - Los elementos llegan hasta el 23 de marzo, sólo se puede adelantar la nivelación. |
| - Se llevan 32 Vallas instaladas, 1 frente en el sur y otro en el norte. |
| - La emergencia de la valla de Florida se atenderá con recursos de conexiones hidraulicas como lo informó la supervisión. |
| - Se cumplió el compromiso de recorrido en la Plaza de los artesanos. |
| El contratista manifiesta "que se implementará contingencia con jornadas de trabajo más largas para mitigar el atraso. La interventoria solicita la remisión del plan de contingencia. Se solicita con cronograma y gestión de los compras para los inconvenientes con los proveedores. |

**TEMAS TRATADOS**

- Se recomienda mantener el personal y no retirarlo en los frentes.
- Se llama la atención pues no se atendió la emergencia eléctrica del fin de semana, se solicita al contratista informar quién es el encargado de las emergencias. El contratista presenta excusas por no atender la emergencia, sin embargo, aclara que en el comité anterior se definió que no se iban a atender más emergencias por temas de presupuesto, por ello no estaban organizadas para la atención de la emergencia. Interventoría aclara que la obligación sigue vigente, se solicita estar pendiente. El contratista manifiesta que ya se cuenta con la estructura de atención de nuevo.

* Parque Nacional ya inició.

·/. Programado del contrato 71/ ·/. Atraso :- 16·/.

·/. Ejecutado del contrato : 55·/.

4. Calidad.

- Se solicita incluir en el informe la acción correctiva para la atención de los compromisos, para todos los componentes pues no se están cumpliendo a tiempo.
- No se cumple el compromiso de entrega de ensayos de material de reciclados industriales, se aclara que la responsabilidad es exclusiva del contratista.
- No se cumple entrega de listado de insumos con proveedor, la fecha era el 23 y se entregó ayer, está en revisión de interventoría.
- No se cumple compromiso de entrega del listado semanal de materiales, se requiere el primer día hábil de la semana y no un día antes del comité, se revisará la correspondiente.
- Plan de inspección y ensayos se recibió ayer y el compromiso era el 24, se emitieron observaciones y se solicita subsanación para el viernes.
- Los manuales de mantenimiento se debían entregar 4 parques, se recibieron solo 2 y están en revisión.
- Se pueden adelantar los manuales de: Olaya, Techo, Río Negro, Hippies, Virrey Norte, las emergencias no requieren manual.
- Se solicita informe de mantenimiento de los ascensores.
- Se solicita realizar entregas parciales de manuales de mantenimiento.
- En cuanto al concepto de geotecnia de la cancha de tenis de PRD, se aclara que esta respuesta no evidencia las densidades tomadas en campo,

**TEMAS TRATADOS**

los cuales se tomaron con cono y arena, se solicita entonces reportar la muestra de los sobretamaños y pesos los cuales no están correctos. Se reitera finalmente por parte de interventoría lo expuesto vía oficio y es que la estabilidad de esa zona está bajo responsabilidad exclusiva del contratista pues no se está de acuerdo con el criterio con el que se tomaron las densidades en campo.

- Se solicitan los ensayos para Simón Bolivar como se expuso previamente.
- Se solicita verificar si el requerimiento por emergencias, oficio 271, requiere una salida no conforme.
- Arena de Rio, Arena de Peña se solicitan los ensayos.
- Arena de Rio es para concreto realizado en obra.
- Para densidades se solicita incluir en los resultados el nombre de la cantera.
- Se solicita programar auditoria para el 701., máximo el 20 de marzo.

* Pendiente entrega de diseño electrico - Estudio tecnico - económico, informe tipo RETILAP, el contratista informa que remitirá el 8 de marzo de 24.

* Se solicitan planos récord del componente eléctrico. y de obra civil, se solicita entrega de la primera versión.
* Se solicita remitir certificados de calidad del transformador, control de iluminación.
* Se solicita remitir simulación de los apuntallamientos realizados en el contrato.

5. Componente SST:

- Relación del personal, aproximadamente 105 trabajadores, se solicita la información desde el componente técnico, para validar el personal.
- Está pendiente la finalización de la parte de las obejas.
- Se solicita procedimiento de alturas y ambiental para las obejas en los postes, se entregará el documento hoy
- Son 11 personas avaladas para el componente eléctrico, con 1 ingreso de una persona.
- Se organizó el listado de personal de acuerdo con lo solicitado en el componente calidad.
- Se recomienda señalización y demarcación de andamios.

6. Componente ambiental:

TEMAS TRATADOS

- Se realizó procedimiento con apicultor para evacuar las abejas, consiste en sellar una salida y por la otra recolectar las abejas, se trasladan a un sitio acorde, se aclara que la idea es trasladar la abeja reina.
- Sólo se puede realizar una evacuación al día.
- Se solicita orden y aseo.
- Se realizó capacitación para el tema de la nueva normativa de RCD.
- El informe mensual se entrega a más tardar mañana.

* Para el tema financiero, se evidencia que el contratista remite documentación para legalización del anticipo. Una vez se valide se solicita proceder con la liquidación del anticipo.

* Del acta parcial, se aclara que se encuentra en elaboración, pendiente de firma los frentes del ing. Medrano, las wales se revisarán hoy. Al momento el acta va por unos 4 mil millones, se solicita amortizar como mínimo el 60% del costo directo para el anticipo.

* A la fecha está pendiente el acta NP 6, la cual está en trámite en IDRD, y el contratista debe subsanar las observaciones emitidas por interventoría a la NP 7.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Gilma Jimenez - Inicio obras eléctricas | Contratista | 4-3-24 |
| La Victoria - Finalización | Contratista | 28-3-24. |
| Tunal - Entrega porterias - cosa adulto mayor | Contratista | 5-3-24 |
| Tunal - Policarbonato - Tablero | Contratista | Pendiente. |
| Tunal - Entrega BMX | Contratista | 6-3-24 |
| Tunal - Inicio pintura ruta dela vida junto a Parkour | Contratista | 4-3-24. |
| Social - Entrega PPP Nuevo Muzú | Contratista | 1-3-24. |
| Social - Reunión avance Fragua | Contratista | 8-3-24 |
| Virrey Sur - Finalización | Contratista | 6-3-24 |
| Cayetano Cañizares - Inicio obras eléctricas | Contratista | 8-3-24 |
| Apantallamiento - informes | Contratista | Pendiente. |
| PRD - Asfalto Baloncesto | Contratista | Próx Semana. |
| PRD - Conexión tableros | Contratista | 1-3-24. |
| Niños - Finalizaoún grouilla | Contratista. | 2-3-24 |
| Niños - Fecha de entrega estructuras móviles | Contratista | Pendiente. |
| Niños - Asfalto parqueaderos | Contratista | 6-3-24 |
| Simón Bolívar - Aval uso de agua | Interv / Contratista / IDRD | 1-3-24. |
| Simón Bolivar - Finalización pintura KiosKos | Contratista | 2-3-24. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | | |
| Observaciones | | | | | | |
| | | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A. | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Agecivas Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Agecivas Castro. |
|---|---|

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Simón Bolivar - Resultados laboratorios (Lleno tanque) | Contratista | 6 - 3 - 24 |
| Simón Bolivar - Estanqueidad | Contratista | 4 - 3 - 24. |
| Seivitá - Inicio obra eléctrica | Contratista | 4 - 3 - 24 |
| Seivitá - Reunión con comunidad | Contratista / Interv | 29-02-24 9:00 am |
| Alta puesta en servicio - Baños SB - Hippies | Contratista | 5 - 3 - 24. |
| San José de Bavaria - Inicio | Contratista. | Pendiente. |
| Villa de los Alpes - Entrega | Contratista | 1 - 3 - 24. |
| Velódromo 1 Hoyo - Eléctrico | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Subsanación propuesta DarKour | Contratista | Próx Comité. |
| Calidad - Ensayos reciclados industriales | Contratista | Pendiente |
| Calidad - Subsanación PIE | Contratista | 1 - 3 - 24. |
| Calidad - Observaciones a manuales | Interventoria | 1 - 3 - 24. |
| Calidad - Manuales de mantenimiento | Contratista | 8 - 3 - 24 |
| Calidad - Auditoria 701. | Contratista | Semana del 18 al 22 de marzo. |
| Eléctrico - Estudio técnico - económico Seivitá, UDS, Gilma 8. | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Planos record civiles y eléctricos (Modelo eléctrico y Modelo civil). | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Estudios fotométricos | Contratista | 29 - 2 - 24. |
| Informes mensuales | Contratista | 1 - 3 - 24. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeuras C. | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro |
|---|---|

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #20 CCP 3099/23 FECHA: 28 02 2024

HORA INICIAL 8:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Oficina interventoria - Soluciones Ingeniería SAS.

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
| 1 | Luz Stella Quintero R. | Ing. Residente | Contratista | | Consultoría y Proyectos | ingluzstella23@ | 3163814594 |
| 2 | Mónica Rodríguez Cano | Ing Calidad | Contratista | | C.P Boy | cpaquelboy@gmail.com | 3103376144 |
| 3 | Yineth Cruz Rondón | Prof SST | Interventoría | | Soluc. | Yineth2088@soluc | 3224123456 |
| 4 | Jhon Alexander | Apoyo técnico | Interventoría | | Soluc | Jhon.Cruz1149@Gmail. | 3103493207 |
| 5 | FERNANDO X BARRERA | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLUCIONES ING SAS | proyectos2@solucionessas.co | 3134986632 |
| 6 | Mary Julieth Cardozo R. | Inspector | Contratista | | Consorcio Boyacá | C.paquelboy@gmail.com | 3138660780 |
| 7 | Luis Granados Donado | Dir. de obra Ant | Contratista | | Consorcio Porvenir | luisgdo@gmail.com | 3004842903 |
| 8 | Nelly Arturo Nova Camacho | Residente | Contratista | | Consorcio Pinzón | nellyn-nova@hotmail.com | 3007659709 |
| 9 | JOSE D PEÑA | IND. RESIDENTE | CONTRATISTA | | CONS P.806 | C.paquelboy@hotmail.com | 3112233445 |
| 10 | Ingrid Baez | Ing Residente | Contratista | | CONSORCIO P | residente3099@gmail.com | 3023569571 |
| 11 | Karen Adriana Algeuras Castro | Inspectora | Interventoría | | Soluciones Ing | proyectos2@solucionessas.com | 7653016 |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO Comité de seguimiento PT 20 CCP 3099/23 FECHA: 28 02 2024

HORA INICIAL 8 00 a.m. HORA FIN _____ LUGAR Oficina Interventoría - Soluciones Ingeniería SAS

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Yoney Paola Reyes C. | Ing. Electricista | Interventoría | | Solium Ing | proyectos@solium.co | 3144737872 |
| 2 | Jaime L. Cuellar S | Resid. Interv | Interventoría | | Solium Ing | — | 3208859481 |
| 3 | Yonney Leon | Ing Calidad | Interventoría | | Solium Ing | mayetros@solium.co | 3102749903 |
| 4 | Angelo Fonseca Hernandez | Apoyo Supervisión | SIP | | IDRD | — | — |
| 5 | Jose Patricio Cardenas | Prof Social | Interventoría | | Solium Ing | — | 3105269431 |
| 6 | Interno Cruz Garzon | Comunero | Contratista | | C. Parques BG | Cerrocruzparques@outlook.com | 3108235742 |
| 7 | LUIS ALBERTO MEDRANO | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLIUN ING | — | 3112123178 |
| 8 | Oswaldo Rodriguez Sanchez | Profesional | contabilidad | | C. PARQUES BG | contabilidad@parquesbogota.gov.co | 3137855 |
| 9 | Sebastian Salamanca Sarmiento | Contratista Prof Apoyo | Contratista | | C. PARQUES BG | cparquesbog@gmail.com | 3201624315 |
| 10 | Andrés Pulido | Guardia | Contratista | | C. Parques | cparquesbog@gmail.com | 3118221220 |
| 11 | Yeirco Agudelo G. | Res Social | contratista | | Contratista | gsrcparques@gmail.com | 3213902 |
| 12 | Duvan Arango Ceballos | Ing Electricista | contratista | | Contratista | Proyectos@solucionesi | 5003627624 |
| 13 | Diana Santamaria Sayra | ING Ambiental | Contratista | | C. Parques | cparquesbog@gmail.com | 3204569496 |
| 14 | Ivan Nicolas Chaparro Lopez | Prof Apoyo | Contratista | | C. Parques Bog | cparquesbog@gmail.com | 3228777112 |
| 15 | Edna Constanza Cepeda | Directora | Interventoría | | Solium Ing | proyectos@gmail.com | 3017404312 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL - V 4

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N/A | COMITÉ/REUNIÓN: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 Cto Int 3131/23 | 21 | 02 | 2024 |

LUGAR: Parque Metropolitano - Simón Bolivar HORA DE INICIO: 12:00 m HORA FIN:

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Aprobación actas anteriores | 4. Componente SST |
| 2. Componente ambiental | 5. Componente calidad |
| 3. Componente social | 6. Componente técnico |

**TEMAS TRATADOS**

1. Aprobación actas anteriores:

Se aprueba el acta por parte del contratista y la entidad pues no se tienen observaciones, la interventoria remitió el ajuste al acta de comite #18 solicitado por el constructor (contratista) por lo cuál se aprueba.

2. Componente ambiental:

- Al corte los informes se encuentran al dia.
- Se solicita al contratista no cerrar el informe tan pronto como se ha realizado ántes, pues quedan muchas dias por fuera de la trazabilidad RCD. Se solicita realizar el cierre posterior, más o menos el 25 pues de antemano se sabe que la interventoria los va a devolver si se cierra muy pronto, lo anterior, con el fin de finalizar la revisión sin hacer el reproceso de la devolución.
- Es necesario realizar los cruces con el componente de calidad.
- Se informa qué ya se gestionó el tema de las abejas y el dia de mañana se tendra presencia del gestor, se va a realizar el plan de trabajo con el componente eléctrico para la ejecución de la actividad que se requiere.
- Respecto al tema de obra se recomienda organizar los acopios en este frente de obra (Simón Bolivar), si se va a reutilizar el material se

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| recuerda que esta actividad no aporta al cumplimiento del aprovechamiento in situ (meta) por norma porque es material de excavación, se solicita organizar los acopios y realizar la protección de los individuos arboreos que se encuentran en el frente de obra. Se solicita la remisión del registro fotográfico el día de hoy a más tardar mañana con las acciones correctivas realizadas frente a este tema. |
| En el otro frente de obra se evidencian unas lonas cerca a una tapa, el residente de obra refiere que puede ser entre RCD y materiales, por lo cual se solicita separar y gestionar los RCD (Sacar). |
| Se solicita al contratista realizar la consulta con el estructural si el material se puede reutilizar para el relleno, si requiere compactación o si no es viable su utilización para ser evacuado rápidamente. |
| - Hace 8 días se trató el tema de proveedores en obra, se aclara que todos se encuentran avalados a través del PMA y el PGRCD, el día de hoy el contratista remitirá los documentos de un recuperador especifico que se usará como contingencia para disposición de unas puertas pues el avalado por interventoría no está siendo oportuno en la recolección (demoras en la ejecución) |
| - El lunes se programó capacitación con la SDA pues la normativa cambió frente al tema de reporte de materiales (indicadores), 2 temas como circularidad: 20% de material reciclado y el otro es aprovechamiento in situ únicamente por material de demolición y envío a planta de aprovechamiento. |
| - Se solicitan actividades continuas de orden y aseo. |
| - Para el tema del agua del lago se va a revisar el próximo primero de marzo pues de acuerdo con lo informado por el profesional ambiental del IDRD en el momento no es viable porque estamos en Sequía, además se aclara que el agua que se use no puede regresarse al lago por temas de bacterias y tratamiento químico del tanque. Se debe botar al alcantarillado, no a las aguas lluvias. |
| 3. Componente social: |
| - En compromisos se tenía la reunión de seguimiento en BMX Tunal se ejecutó, se cumplió el compromiso, no se presentaron observaciones, solicitaron un adicional pero frente a la demarcación y en las correcciones la comunidad mostró aceptación. Se solicita aclarar la fecha de entrega. |
| Para el profesional residente de obra se informa que solicitó permiso por 15 días por un tema personal. |

**TEMAS TRATADOS**

- Se tiene prevista finalización el 28 de Feb.
- En Hippies se realizó la reunión, se emitió concepto favorable por parte de las personas a las que se le retiraron los sillas, en las zonas en las que no se retiraron se solicita por la comunidad el retiro de las bancas, aunque las personas no asistieron a la reunión de socialización.
Se invitó a la Alcaldía Local pero no asistieron a la reunión.
- PRD: Hoy a las 3:00 pm se realizará la reunión con el veedor, en la reunión sólo se va a informar el tipo de pintura a usar. Se recomienda realizar sólo actuaciones generales sin puntualizar en marcas y especificaciones.
- Se solicita programar reunión este viernes en Softbol, con los esp. electricos.
- Se solicita programar reunión en Serviteú, con los esp. eléctricos.
- En Fragua se recuerda que se debe programar reunión de avance, en la cual se informe el tema de los juegos, se solicita tener pendiente el tema de los tiempos, se solicita presentación para la zona de juegos.
- En Nuevo Muzú, se solicita realizar acta de entrega del PPP.
- El PQR de Alta Blanca se remitió a la entidad y al contratista, se hizo entrega de borrador de respuesta, se solicita esperar a que IDRD remita respuesta oficial para emitir la respuesta del contratista.

4. Componente SST:

Revisado por interventoria se presenta relación de personal:

PRD, Niños, porqueadero, cancha: 19 trabajadores

Simón Bolivar: 4 trabajadores Tunal: 19 trabajadores

Fragua: 6 trabajadores Nuevo Muzú: 3 trabajadores

Ciudad Montes: 3 trabajadores Bosques de San Carlos: 6 trabajadores

Novios: 4 trabajadores

Cuadrilla electricos: 6 trabajadores + 1 trabajador. Total: 80 trabajadores.

Villa Alemana: 3 trabajadores

Eduardo Santos: 5 trabajadores

Fontanar del Río: 2 trabajadores Canal Boyacá: 4 trabajadores

Virrey Norte: 5 trabajadores. Río Negro: 5 trabajadores.

Nacional: No iniciado. Virrey Sur: 2 trabajadores.

Vallas: 4 trabajadores. Total: 96 trabajadores.

- Se recomienda realizar periodicamente las actividades de demarcación, señalización, orden y aseo.

**TEMAS TRATADOS**

-De los compromisos pactados el contratista remitió el listado de personal para trabajo en alturas del componente eléctrico y de las actividades de vallas.
- Se revisó cumplimiento de las cuadrillas mínimas requeridas, se solicita aclarar la cuadrilla de plameros, el contratista aclara que hoy 1 en Nuevo Muzú, 1 en novios y 1 en la UDS.
- Se realiza lectura del requisito establecido en el anexo técnico del contrato
- Se aclara que a la fecha la única cuadrilla que no se ha requerido es cuadrilla carpintería en madera pues no se ha requerido en la ejecución.
- La maquinaria se incluye en el informe de calidad, se revisará en el componente SST.
- Los trabajos en altura en UDS se iniciarán el día de hoy, se solicita acompañamiento de coordinador SST.
- El contratista manifiesta que se encuentra subsanando lo solicitado por interventoría, se ha remitido el informe con reporte de registro fotográfico semanalmente, el informe mensual se remitirá el 27 para revisión de interventoría.

5. Componente calidad:

-Dentro del compromiso pendiente se encuentra la remisión del listado maestro de materiales por parte del contratista, (actualizado con proveedores).
- Se reitera que todos los soportes deben revisarse y firmarse por parte del residente de obra y el director. Todos los soportes deben entregarse a tiempo.
- Se recuerda que la interventoría emitió las recomendaciones a tiempo, si el contratista no toma en cuenta las recomendaciones la responsabilidad es exclusiva del contratista pues no atendió lo solicitado por interventoría.
- El Proctor en PRD se tomó con densidad seca equivocada, se solicita el concepto técnico del geotecnista.
- La totalidad de la estabilidad del material es exclusiva del contratista.
- Se solicita remitir el concepto del especialista.
- Se remitieron las observaciones al plan de inspección y ensayos, el contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente el día sábado.
- Se solicita la remisión de los manuales de mantenimiento (Palestina, Techo, Naranjos, Olaya). El contratista manifiesta que los remitirá el viernes.
- Se realiza lectura del anexo técnico con respecto a la aceptación de obras para

**TEMAS TRATADOS**

el pago. Se debe cumplir con los criterios de calidad, especificaciones y demás para la aceptación de las obras por parte de interventoría.

- No se cumplió el compromiso de reporte semanal de adquisiciones, sin embargo, el contratista informa que hoy llegaron las luminarias de Serviá, las luminarias de Softbol no han llegado en su totalidad y el proveedor no ha confirmado la fecha de entrega. El piso de caucho llega a puerto la próx semana. Las luminarias de Gilma llegarían el viernes.
- El contratista remitió los BL que se tienen a la fecha, son 14 días estimados de transporte marítimo, se estima para el 20 de marzo.
- Se advierte por parte de IDRD que en marzo se debe amortizar todo el anticipo del contrato, se recomienda amortizar en esta acta el 60% del costo directo.

6. Componente técnico:

% Programado 55%. % Ejecutado 56%.

- Se realiza reporte con la programación actualizada, se verificó avance en taller y en soporte de importación, sin esta información el porcentaje disminuye 4 puntos aproximadamente.

Las visitas a taller se realizan bajo criterio de buena fé.

6.1. Simón Bolívar:

Presenta atraso: % Programado: 69%.
% Ejecutado: 48%.

- Se instalaron 9 de los 14 bebederos, actividad en ejecución
- Se han pintado 29 casetas de comidas de las 42 priorizadas
- En el manú ya se realizó resane interior de los tanques sépticos, la polyurea se programa para la próxima semana.
- Se deja un tiempo de fraguado para el mortero, se recuerda que IDRD requiere entrega de todo el 5 de marzo.
- El remate en la zona de Carbón debe entregarse el sábado.
- Para los juegos y las barandas se contrató una cuadrilla de metalmecánica adicional para terminar en el tiempo previsto.
- Se solicita por parte de interventoría implementar las contingencias necesarias (más personal, horario extendido) para cumplir con el compromiso de entrega al IDRD el 5 de marzo.

6.2. Niños:

- Se solicita de nuevo indicar las fechas de entrega de las estructuras móviles de la

**TEMAS TRATADOS**

el pago. Se debe cumplir con los criterios de calidad, especificaciones y demás para la aceptación de las obras por parte de interventoría.

- No se cumplió el compromiso de reporte semanal de adquisiciones, sin embargo, el contratista informa que hoy llegaron las luminarias de Servitá, las luminarias de Softbol no han llegado en su totalidad y el proveedor no ha confirmado la fecha de entrega. El piso de caucho llega a puerto la próx semana. Las luminarias de Gilma llegarían el viernes.
- El contratista remitió los BL que se tienen a la fecha, son 14 días estimados de transporte marítimo, se estima para el 20 de marzo.
- Se aclara por parte de IDRD que en marzo se debe amortizar todo el anticipo del contrato, se recomienda amortizar en esta acta el 60% del costo directo.

6. Componente técnico:

% Programado 55% % Ejecutado 56%

- Se realiza reporte con la programación actualizada, se verificó avance en taller y en soporte de importación, sin esta información el porcentaje disminuye 4 puntos aproximadamente.

Las visitas a taller se realizan bajo criterio de buena fé.

6.1. Simón Bolívar:

Presenta atraso: % Programado: 69%.
% Ejecutado: 48%.

- Se instalaron 9 de los 14 bebederos, actividad en ejecución
- Se han pintado 29 casetas de comidas de las 42 priorizadas
- En el manú ya se realizó resane interior de los tanques sépticos, la polyurea se programa para la próxima semana.
- Se deja un tiempo de fraguado para el mortero, se recuerda que IDRD requiere entrega de todo el 5 de marzo.
- El remate en la zona de Carbón debe entregarse el sábado.
- Para los juegos y las barandas se contrató una cuadrilla de metalmecánica adicional para terminar en el tiempo previsto.
- Se solicita por parte de interventoría implementar las contingencias necesarias (más personal, horario extendido) para cumplir con el compromiso de entrega al IDRD el 5 de marzo.

6.2. Niños:

- Se solicita de nuevo indicar las fechas de entrega de las estructuras móviles de la

TEMAS TRATADOS

zona de arena de parque de los niños.
- Se realizaron las actividades de limpieza de cajas, el pozo está pendiente por ejecutar.
- Se solicita evaluar si se puede adelantar la fecha de inicio de las obras eléctricas.
- El futurado llega el día de hoy
- Avance del 35%.
- Se verificará en taller el avance de los cerramientos requeridos.
- Tubería del empate de las canchas existentes al pozo nuevo no se ha iniciado, el contratista adora que sí se encuentra contemplada la actividad en el presupuesto.
- En parqueadero ya se compactó la subbase, se instaló el sardinel y se instaló la tubería del cárcamo, se asfaltaría dentro de 8 días.
- Está contemplada la demarcación en el presupuesto.
- Ya se conectó la red del arenero antiguo para las cajas.
- La arena llega apenas se instale la grava.
- El contratista propone entrega el 20 de marzo, pero es muy lejos, se solicita para el 10 de marzo.
- Para el cerramiento se inician labores el 1 de marzo.

6.3. PRD:

- La cancha de tennis: El muro se resanó, se finalizó el asfalto, faltan 2 cajas de drenaje, pendiente demarcación y malla en la parte superior.
- Cancha baloncesto: Se está sellando, pendiente instalación de bordillo y asfalto, se prevé finalización en 15 días.
- Restaurante: ya se terminó el cielo raso de ambos baños, pendiente baño de discapacitados, el fin de semana se finaliza el enchape de la cocina.
- Ejecutado: 57%.
- En apertura de sistemas ya se instalaron luminarias y se realizó pintura.
- Esta semana se inician actividades en la administración.
- Pendiente instalación de tablero de control, se llevó pero no se ha conectado
- La cubierta de protección se debe incluir en el PPTO.

6.4. Novios:

- Avance: 41%. Programado: 26%.
- Ya se aclaró lo del anclaje de la estructura (con pernos).
- Se realizó la búsqueda del punto eléctrico, no se encontró, pero ya se

TEMAS TRATADOS

definió como se va a realizar la conexión

- Ya se aclaró el tema hidraulico y sanitario

6.5. UDS:

- La obra civil debía finalizarse ayer, sólo fallan 2 piezas de enchape, se finalizaría el día de hoy.
- El contratista inicia hoy actividades del componente electrico, se trabaja beisbol y softbol en paralelo.

6.6. Altoblanco:

- Pendiente 7%. por terminar.
- Pendiente instalar un tramo de canal que llegó hoy.
- Se inició la pulida de la pista
- Para el APU, se aclarará lo correspondiente en mesa de trabajo el día de mañana

6.7. Río Negro:

- Fallan remates de sócalos, remates de pintura.
- Se solicita autorización de cambio de malla, el IDRD aclara que no se pinta nada roto y se debe evaluar si de alguna parte se dañaría la malla.
- Se entregaría el parque el 28/02/24
- Faltan los rododeros que se devolvieron por calidad de la pintura.

6.8. Hippies:

- Se instalaron los 4 bolardos solicitados por la comunidad, pendiente acta de entrega.

6.9. Virrey Norte:

En ejecución cambio de conexos y espaldar, se solicita finalizar lo antes posible.

6.10. Ciudad Montes:

- Se subsanaron los puntos de soldadura, se realizan pruebas de tintas en el cerramiento de ciudad Montes.
- Se estan instalando portones en la huerta
- Del mantenimiento de la ruta de la vida ya se finalizó la pintura el día de hoy.
- El miercoles se finaliza la intervención.
- Se solicita subsanar lo de las manchas de pintura en el piso caucho.

6.11. Bosque San Carlos:

%. Programado: 47%  %. Ejecutado: 38%.

- El contratista informa que ya se figuró el 70%. del acero del bordillo con zaipa para fundir el dia de mañana el bordillo, se realizó la instalación

TEMAS TRATADOS

en dados de los paroles para el cerramiento de la media luna, se aplico la base, se realizó mejoramiento de la placa en la zona de juegos, hay 6 trabajadores trabajando.

- No han llegado los biosaludables para instalar, llegarian mañana.
- Se hizo la regata para el piso de caucho.
- Falla instalación de piso de caucho (segunda semana de marzo) y los juegos pendientes.
- Pendiente estructura de la zona de juegos
- Se recuerda que se debe finalizar todo antes de semana Santa.

6.12. Laureles Naranjos: Finalizado

6.13. Villa de los Alpes: Finalizado, pendiente una puerta de la cafetería.

6.14. Porvenir:

- Se realizó visita, se solicita cotizar cuánto puede costar el traslado de los módulos a la zona de patinajes dónde se definió.
- Se debe realizar cimentación.

6.15. Coliseo Primero de Mayo

- La primera semana de marzo llegarian los postes.
- Avance 70%. Programado 40%.
- En el coliseo se solicitó cambio de luminarias en baños
- Pendiente control de iluminación en coliseo.

6.16. Canal Boyacá:

- Se demolió la placa
- Se desmontó uno de los juegos, de los de madera.
- No hay necesidad de hacer reunión.
- Se presenta propuesta IDRD, se avala en comité, se deben contemplar 2 mesas (1 ajedrez, 1 de parqués), 4 ocupaciones.

6.17. Serviá:

Ya llegaron las luminarias, el martes se realizaria la reunión para inicio de actividades el 24 de febrero. Se deja prevista fecha de entrega para la segunda semana de marzo.

6.18. Fontanar del Río:

Pendiente 1 vidrio, se instalaría la próxima semana.

- El Parkour llega hasta la tercera semana de marzo

6.19. Tunal: Avance 85%.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se entregó la zona de gimnasio |
| - No se ha entregado la zona de adulto mayor, pendiente instalación de puertas, se solicita entregar el muelles, el contratista actura que no es posible pues las puertas de acero llegan en 2 semanas. |
| - El próximo miercoles se entregarian zonas de senderos. (porterias) |
| - En BMX se presenta avance, se finalizaria todo menos la zona Parkour. |
| - Eléctrico, cancha de fútbol 11 se encuentra pendiente control de iluminación, el contratista actura que el tablero llegó mal. |
| 6.20. Cayetano Cañizares: |
| - Ya se incluyeron en el ppto 48 luminarias más |
| - Se iniciaria la actividad el 5 de marzo (primera semana de marzo). |
| 6.21. Fragua |
| · I. Ejecutado: 60 %. |
| - Se compactó nuevo material, se avanzó en zona infantil, pista y baños. |
| - Pendiente divisiones de baños. |
| 6.22. Eduardo Santos: |
| - En finalización pintura biosaludables |
| - Pendiente instalación de divisiones y puertas en acero. |
| - Cambio de luminarios en ejecución, se cambió iluminación en coliseo, baños y administración |
| - Pendiente marcar circuitos. |
| 6.23. Illimaní: |
| - Falta módulo de baños, pendiente la parte metálica en acompañamiento de seguridad, se espera finalizar en 15 días. |
| - Pendiente lo de las cajas pues no se ha definido por parte de IDRD. |
| * Se programa recorrido para medición de niveles de iluminación en los coliseos. |
| * Pendiente implantación de los Parkour. |
| 6.24. Nuevo Muzú: |
| - Se finalizó la instalación del PPP |
| - Se cambió la iluminación en el coliseo |
| - Se finalizó la parte hidrosanitaria y de enchapes en baños. |
| - Finalizada la placa para instalación de piso caucho |
| - Se instalaron 2 juegos: 1 balancín grande y uno pequeño. |
| 6.25. Virrey Sur: |

**TEMAS TRATADOS**

- Se finalizaría la próxima semana.
- Pendiente instalación de adhesivos.

6.26. Villa Alemana:

- Pendiente remate de muro.
- Portón no ha llegado.
- Pendiente instalación de tapas.

6.27. Victoria:

- Presenta atraso.
- Pendiente intervención en módulo y administración.

6.28. Gilma Jimenez:

- No se evidencia avance, la escalera llegó hoy para ejecución de la actividad, se evidencian inconvenientes en la coordinación del componente eléctrico tanto en la parte de obra como en la parte presupuestal.
- Se solicita inicio lo antes posible.
- El contratista informa que no ha llegado el transformador.

6.29. Emergencias

- En Atahualpa se están atendiendo los baños del parque, se instalaría el sanitario pendiente
- El tanque de Atahualpa no se va a atender por este contrato.

6.30. Conexiones hidraúlicas:

- Se cuentan con 89' aproximadamente, se solicita realizar la visita.

6.31. Las vallas llevan un avance de 20%.

* Se atenderá la emergencia de Tercer Milenio.
* La iluminación de la Concha de Eduardo Santos no se realizará en este contrato

- Se solicita remitir el presupuesto actualizado.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Ambiental - Capacitación SDA - Normativo RCD | Contratista - Interv | 26 - 02 - 24 |
| Simón Bolivar - Concepto estructural relleno tanque | Contratista | Próx Comité. |
| Simón Bolivar - Definición agua lago | Contratista - Interv - IDRD | 1 - 03 - 24. |
| Tunal - Finalización | Contratista | 28 - 02 - 24 |
| Social - Reunión muro PED (Veedor) | Contratista - Interv | 21 - 02 - 24 3:00 pm. |
| Social - Reunión Softbol (9:00 am). | Contratista | 23 - 02 - 24 |
| Social - Reunión Servitá | Contratista | 27 - 02 - 24 |
| Social - Reunión de avance Fragua | Contratista | 1 - 03 - 24 |
| Social - Acta de recibo PPP - Nuevo Muzú | Contratista | Pendiente. |
| Nacional - Inicio intervención | Contratista | 22 - 02 - 24 |
| Informes mensuales - | Contratista | 27 - 02 - 24. |
| Calidad - Listado maestro materiales | Contratista | 26 - 02 - 24. |
| PRD - Concepto geotecnista | Contratista | 23 - 02 - 24. |
| Calidad - Subsanación PIE | Contratista | 29 - 02 - 24 |
| Calidad - Manuales de mantenimiento y uso | Contratista | 23 - 02 - 24. |
| Calidad - Reporte semanal adquisiciones (mail) | Contratista | 21 - 02 - 24 |
| Calidad - Reporte semanal adquisiciones | Contratista | Próx Comité. |
| Calidad - Ensayos base y subbase reciclado | Contratista | 29 - 02 - 24. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A. | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeuras Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro |
|---|---|

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Simón Bolivar - Entrega obra | Contratista / Interv. | 4 - 3 - 2024 |
| Simón Bolivar - Entrega zona carbón | Contratista | 24 - 02 - 2024 |
| Simón Bolivar - Entrega pintura | Contratista | 2 - 3 - 2024. |
| Parque de los Niños - Fecha entrega estructuras | Contratista | 21 - 02 - 24 |
| Parque de los Niños - Actividades electricas inicio | Contratista | 6 - 03 - 24. |
| Parque de los Niños - Asfalto parqueaderos | Contratista | 28 - 02 - 24. |
| Parque de los Niños - Entrega | Contratista | 10 - 03 - 24. |
| PRD - Finalización | Contratista. | Primera semana de marzo. |
| PRD - Eléctrico - Conexión tablero y cubierta | Contratista | Próx comité. |
| Recorrido - Plaza de los artesanos | Contratista - Interv - IDRD | 22 - 03 - 24 11:00 am. |
| San José de Bavaria - Inicio | Contratista. | Próx Comité. |
| Ciudad Montes - Reunión entrega | Contratista | 28 - 02 - 24. |
| Villa de los Alpes - Entrega | Contratista | 26 - 02 - 24. |
| Virrey Norte - Finalización | Contratista | 1 - 03 - 24. |
| Tunal - Entrega admon - portería - casa adulto | Contratista | 28 - 02 - 24. |
| Tunal - Control de iluminación | Contratista | 28 - 02 - 24. |
| Cayetano Cañizares - Inicio electrico | Contratista | 6 - 03 - 24. |
| Tunal - Cambio policarbonato | Contratista | Pendiente. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | | |
| Observaciones | | | | | | |
| Gilma Jimenez - Inicio | Contratista | | | 26 - 02 - 24. | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A. | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeuras O. | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeuras Castro |
|---|---|

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 FECHA: 21 02 2024.

HORA INICIAL: 2:00 PM HORA FINAL: _____ LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar.

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALI ESPINOSA SERRA | ESP. AMBIENTAL | INTERVENTORIA | | S. ING SAS | — | 3295385 15 |
| 2 | LUIS ALBERTO MEDRANO | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLIUN ING | — | 3202213715 |
| 3 | FERNANDO RONDEROS. | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLIUN ING SAS | | 3134926632 |
| 4 | Lizeth Cruz Aranzales. | Profesional SST | Interventoria | | Soliunsas | [illegible] | 3221582815 |
| 5 | Pedro Aquilo O. | Residente Social. | Contratista | | Contratista | [illegible] | 3213905951 |
| 6 | Flor Dastanzo Cagueca. | Directora. | Interventoria | | Soliun Ing | proyectos2@soliunsas.com | 3017443572 |
| 7 | Angelica Maria Hernandez. | Apoyo supervisión | IDRD | | IDRD | — | — |
| 8 | Karen Adriana Algeciras Castro | Inspectora Interventoria | Interventoria | Karen A | Soliun Ing. | proyectos2@soliunsas.com | 7653016 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL - V 4

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO Comité de seguimiento # 19 COP 3099/23 FECHA: 21 02 2024.

HORA INICIAL 12:00 m HORA FINAL _____ LUGAR Parque Metropolitano Simón Bolívar

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
| 1 | Nefteri Arturo Noora Camargo | R. Emergencia | Contratista | | Consorcio Parque | ing.nefteri-noora@hotmail.com | 3007653709 |
| 2 | Luz Stella Quintero R. | R. Obra | Contratista | | Consorcio Parques | [illegible] | 31[illegible] |
| 3 | KATHERIN GOMEZ GARZON | COORDINADORA | CONTRATISTA | | CONSORCIO PARQUES | C.PARQUES@HOTMAIL.COM | 3175275342 |
| 4 | Luis Granados Dorado | Dir. obra Contratista | Contratista | | Consorcio Parques | luzgrado@gmail.com | 3008939103 |
| 5 | Diana Milagro Ceballos | Ing Electricista | Contratista | | Consorcio Parques | Proyectos@disdetucasa.com.co | 3006866771 |
| 6 | Jose D. Peña | Residente SST | Contratista | | Cons P Bog | c.pena@gmail.com | 3213932 |
| 7 | Ingrid Boez | Residente SST | Contratista | | cons P Bog | residentesst3099@gmail.com | 3013509 |
| 8 | Diana Santamaria | Residente Ambiental | Contratista | | Cons P Bog | residenteambiental[illegible] | 3702567 |
| 9 | Julieth Contreras | Inspector | Contratista | | Consorcio P. | Consorcioparquesbog@gmail.com | 3213860780 |
| 10 | Mayra Pacheco S. | Especialista SGP | Contratista | | Consorcio P. | Politicaparquesbog@gmail.com | 3013496 |
| 11 | Monica Rodriguez Gaona | Ing. Calidad | Contratista | | CP Bog | c.pbogota@gmail.com | 3103376144 |
| 12 | Sebastian Salamanca Sarmiento | Profesional de Apoyo | Contratista | | Contratista | Cparquebog@gmail.com | 3207624315 |
| 13 | Vianney Cepeda | Ing Calidad | Interventoria | | Consorcio | proyectos@disdetucasa.com | 3103249803 |
| 14 | Yenny Bibiana Reyes C | Ing. Ambiental | Interventoria | | Sicon | yennyreyes2@hotmail.com | 5442772 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N A | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #18 CCP 3099/23 Cto Int 3131/23 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 15 | 02 | 2024 |

LUGAR: Parque recreodeportivo el Salitre - PRD HORA DE INICIO: 09:00 am HORA FIN:

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Componente social. | 4. Componente Ambiental |
| 2. Componente calidad | 5. Componente técnico |
| 3. Componente SST | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Componente social:

- Del componente social se informa que se realizó la reunión con el líder de BMX en el parque Tunal el pasado lunes, atendiendo inquietudes y observaciones de los líderes frente a las intervenciones realizadas. Se programa para el lunes 19 de febrero reunión de seguimiento nuevamente con los líderes a las 9:00 am. La idea es para el lunes tener la subsanación a las observaciones realizadas, se solicitó acompañamiento diario del líder considerando que el ancho de la curva cambia (trazo) dependiendo de dónde se tome impulso, el líder fue delegado por los deportistas.

Se solicita por parte de IDRD imprimar la fecha de entrega de las obras completas para citar a comunicaciones.

- El día de ayer se realizó reunión con el líder de beisbol en horas de la mañana y en horas de la tarde se realizó acta de vecindad con registro fílmico del riego, el cuál no se podría intervenir.

- Se solicita coordinar parte técnica y social para informar a IDRD, con el fin de articular con los administradores de los escenarios. Se solicita coordinar previo a las citaciones con los administradores.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se solicita que los correos se remitan sólo de los correos oficiales de contratista e interventoria, la relación con los administradores debe ser desde el correo oficial del consorcio y la interventoria. (Ingresos, tramites y solicitudes) |
| - A la fecha se encuentran al día los informes mensuales. |
| - Se recibió el acta de vecindad de Bosque San Carlos, se remitieron observaciones por parte de interventoria y se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista. |
| - Se informa que en Hippies la comunidad no permitió instalar las bancas en los sitios donde estaban, razón por la cual el contratista realiza propuesta con la nueva ubicación de las bancas y con la instalación de bolardos para restringir el acceso vehicular, para el aval de la propuesta se requiere socalizar con la comunidad. Se coordinará la reunión. |
| - En PRD reunión con el voedor, una vez se resane el muro. |
| - La supervisión solicita el Chek list del estado de las actas de inicio, acta de terminación por parque, actas de vecindad de inicio y actos de vecindad de cierre. |
| 2. Componente calidad: |
| - De acuerdo con el recorrido realizado en el frente parque de los niños, se solicita realizar los ensayos correspondientes. |
| - En cuánto a los manuales de mantenimiento, la interventoria remitió la lista de Chequeo con la cual serán validados y se solicita al contratista remitir un avance de los documentos para los frentes finalizados. |
| - Se realizaron contramuestras de BG y SBG de constituror. |
| - Se aprueba y radica el informe mensual 4. (Se aclara que es el 5 Mes: Enero 29) |
| - En parque de los Niños la cantera es Agremax, se solicita canalizar la información para entregar datos correctos a la interventoria, se solicita incluir en el listado de materiales semanal el nombre del proveedor que despacha, para poder realizar el cruce. |
| - A la fecha, los materiales aprobados para instalar en obra son base agremax y subbase constituror, no se ha aprobado ningún otro material. Para la base reciclada se requieren los ensayos. |
| - Se realizó la auditoria en compañía de interventoria, se debe remitir el informe como anexo al informe mensual 6, se evidencia mejora en el proceso con detalles por subsanar. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - En cuánto a las actas de inspección preliminar se encuentra en revisión del componente técnico. |
| - Las actas de inspección de elementos existentes están en revisión, sin embargo, la de Oliuya se debe ajustar el registro fotográfico pues por error de impresión no se ven las fotos correctamente. |
| - El informe de gerencia debe ser ajustado y revisado por la profesional Nanyory Pasachova, seguirá entregándose como anexo al informe de calidad. |
| - Se solicita realizar el reporte de las cuadrillas mínimas requeridas, organizado por parte SST, se incluirá en el reporte de recursos humanos. |
| - El listado de herramienta y equipos, maquinaria, se encuentra incluido en el informe de calidad. |
| - En cuánto a los autoparqueaderos se solicita mandarlos hacer sin el sticker por el momento mientras se define su instalación como se tenía previsto en los frentes o en PTAR. |
| - Se anexará en los insumos el concreto mezclado en obra. |
| - En cuánto al plan de adquisiciones, se encuentra avalado por interventoría y para el informe 5 se soportará con las ordenes de giro y el estado de las importaciones. |
| - Se solicita presentar un corte del avance del plan de adquisiciones, cada comité. |
| 3. Componente SST: |
| Personal: 102 trabajadores |
| Tunal: 24. trabajadores Novios: 4 trab. Ciudad Montes: 3 trabajadores |
| Muzú: 3 trabajadores Bosque San Carlos: 5 trab. Gilma Jimenez 3 trab. |
| Simón Bolivar: 8 trabajadores Eduardo Santos: 2 trab. Seiuta' 4 trabajadores |
| PRD y Niños: 22 trabajadores Fragua: 5 trab. Virrey 2 trabajadores |
| Hippies: 5 trabajadores Coral Rio Negro 3 trab. Fontanar 4 trabajadores |
| Coral Bayacá: 3 trabajadores |
| Se realizó recorrido de parques, se emitieron recomendaciones, se reitera la recomendación y demarcación de andamios, señalización y dotación, en cuanto al tema del personal tratado en comité pasado se aclara por interventoría que se remitió oficio de respuesta por el contratista, no obstante, tal y como se evidenció la información se entregó posterior al ingreso del personal verificado en obra. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se recuerda que la información de ingreso debe allegarse previo y no cuando la interventoría evidencie personal sin documentación. |
| - Se solicita remitir el listado de personal de trabajo en alturas, pues es transversal a los frentes. |
| - Se cumplió el compromiso de entrega del plano de señalización del parque de los Niños a la entidad para el trámite correspondiente, el IDRD solicita mandar hacer las señales. |
| - Se cumplió el compromiso del reporte de actividades de riesgo. |
| - Se recuerda que en Niños se amplia la puerta a 2 hojas (2,5 m). |
| 4. Componente ambental: |
| - Al día con los informes mensuales, la próxima semana se inicia la elaboración del informe de febrero. |
| - Se realizan jornadas de aseo y limpieza constante y disposición de materiales |
| - Se realizó jornada de recolección de luminarias en velódromo |
| - Esta semana se programó recolección en Eduardo Santos y Tunal |
| - La próxima semana recolección en Urrey y Canal Río Negro. |
| - Se informa que se radicarón documentos agremax (Contera). |
| - Se recuerda que el informe se cierra mínimo el 25. |
| - Se solicita revisar el cumplimiento de circularidad. |
| 5. Componente Técnico: |
| 5.1. Ciudad Montes: |
| - Programado: 70% Ejecutado: 89% |
| - El cerramiento está terminado, pendiente subsanación de 2 puntos, se instalaron los portones nuevos y se entregaron los portones viejos (con acta a administración) se esta ligando la ruta de la vida. |
| - En cuánto al mantenimiento de la ubierta se aclara que se puede realizar pues es un mantenimiento, sin embargo, por el momento no se prioriza pues no hay presupuesto disponible suficiente. |
| 5.2. Bosque San Carlos |
| Programado 38%. Ejecutado 45%. |
| * Se aclara que se tienen 7 trabajadores, ingresaria la semana próxima el equipo metalmecánico y piso caucho, de la baranda se solicitan los datos para visita de taller por parte de interventoría. |
| * Los biosaludables y griegas están en taller, los módulos complementos |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| de los cerramientos de las puertas están en taller. |
| 5.3. Villa Alemana: (También hay elementos en taller). En Bosque San Carlos: |
| Se realizó armado del bordillo (refuerzo) de la zarpa y se están anclando los bases para fundir el próximo sábado, se está armando la formaleta. |
| - Se solicita por parte de interventoría remitir la información para realizar verificaciones en taller. En Bosque San Carlos: |
| - Las puertas y 1 sanitario hace falta. |
| - Zona infantil: Se hizo mejoramiento de la placa de juegos infantiles y se instaló un juego |
| 5.4. En Villa de los Alpes: |
| Prog: 79%. Ejecutado: 95%. |
| - Pendiente el marco de la puerta y la puerta de la cafetería, de resto ya se finalizó. |
| - El próximo lunes se finalizaría. |
| - Pendiente el control de iluminación, se solicita verificar pues se encuentra presupuestado. |
| 5.5. Parque Nacional. |
| - No se han iniciado actividades, en cuánto a los juegos se iniciaría el 21 |
| - Los baños no se han priorizado por el momento pues no hay presupuesto. |
| 5.6. Villey Norte: |
| Programado 7%. Ejecutado: 25%. |
| - Se ejecuta cambio de las canecas |
| - Cambio de los espaldares de las sillas. |
| - Se aclara que con la comunidad no se debe discutir o entregar información, sólo mediante los canales del componente social |
| 5.7. Canal Boyacá: |
| - Pendiente visita se realizaría el día de hoy después de comité. |
| - %. Programado: 11%. Ejecutado: 1. |
| 5.8. Servitá: |
| %. Programado 20%. %. Ejecutado: 37%. |
| - Se está trabajando la revisión hidrosanitaria. |
| - Se instalan los aros el próximo sábado. |
| - Se realiza cambio de tomas e instalación de salidas para las luminarias. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Llegó una parte de las luminarias Philips, las demás llegarían mañana, una vez lleguen las luminarias se revisará por parte de interventoría que sea la referencia para autorizar la socialización con la administración. |
| 5.9. Fontanar del Río: |
| Programado 3%. Ejecutado 7%. |
| - Se continúa con instalación de los vinilos, se solicita la remisión de la propuesta de implantación para socialización |
| - Se solicita evaluar el tema de los resortes en mal estado. |
| 5.10. PRD - Niños: |
| - La supervisión solicita agilizar los trabajos en estos frentes. |
| - Ayer empezó a llegar el cerramiento metálico |
| - La arena tiene orden de compra |
| - Las cantidades de estructuras móviles son las acordadas en el comité pasado, se solicita aclarar el tiempo de entrega. |
| - La grava llegaría hoy al igual que la tubería. |
| - La próxima semana se podría instalar iluminación. |
| %. Programado 16%. Ejecutado 10%. 24%. → Niños |
| - La entrega es el 6 de marzo (Crucetas.) |
| PRD: |
| %. Programado: 26%. Ejecutado: 40%. |
| - Se cumplió el compromiso de inicio en la zona de restaurante. |
| - La pintura de la baranda iniciaría la primera semana de marzo. |
| 5.11. Novios: |
| - Se están terminando los pedestales del túnel |
| - La estructura metálica está en taller, el color del acabado se define verde tipo IDRD. |
| - Se inició cimentación para módulo de baños |
| - Ya se finalizó intervención en la administración |
| - Pendiente remate de enchape en baños. |
| %. Programado: 6%. Avance: 19%. |
| - Se solicita realizar la búsqueda del punto de conexión, se solicita coordinar la actividad. |
| - Pendiente conexión tanques. |
| 5.12. UDS: |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se están realizando los cambios de fluxómetros, se finalizaría esta semana, incluyendo el enchape |
| - Se debe quitar un paral para que ingrese el equipo para el cambio de las luminarias, ya se inició dicha actividad. |
| 5.13 Alla Blanca: |
| - Se solicita realizar el arreglo de las placas que presentan fisuras, se informa que ya se corrigió con dilataciones pues el peso de vehículos pesados en vías aledañas la fracturan. |
| - Se solicita ajustar el rendimiento de la mano de obra con la debida justificación técnica pues interventoría no está de acuerdo con el APU. |
| *Se reitera que las conexiones hidráulicas de los módulos se deben realizar. |
| - Se prioriza la pulida de toda la pista. |
| - Se solicita revisar el presupuesto remitido en horas de la mañana por el contratista. |
| - Se solicita validar el presupuesto de las vallas. |
| - Se aclara que las obras grandes ya están en ejecución para verificación de los presupuestos. |
| - El contratista informa que actualizó el presupuesto anoche. |
| - Eduardo Santos, concha sintética no se contempló en el ppto, se aclara que cómo no hay recursos se realizara por otro contrato de IDRD. |
| - En Porvenir se propone trasladar los módulos a la pista de patinaje, dónde estaría la conexión. (hidráulica). |
| Se solicita coordinar el componente eléctrico con el componente presupuestal, pues no están actualizados los presupuestos. |
| - Se solicita remitir todos los APU's faltantes |
| - El IDRD informa que la NP 6 y la creación de los CIO's está en trámite en la entidad, con demora por la reorganización del equipo administrativo de IDRD. |
| - Se aclara que se debe cobrar por lo menos el 60%. del valor del contrato. |
| - Se solicita remitir el resumen de las actividades que se proyectan cobrar en la siguiente acta parcial. |
| 5.14. Canal Río Negro: |
| - Se está terminando el cerramiento en malla |
| - Se están instalando los resbaladeros, se finalizaría la próxima semana. |

**TEMAS TRATADOS**

5.15. Hippies:

- Programado 85%.
- Esta semana finalizaria, se están instalando las bancas.
- Se incluyó la pintura de las cintas alrededor de los árboles.

5.16. San José de Bavaria:

- No se ha iniciado la intervención
- Las máquinas se pintan del mismo tono existente

* Se aclara que no se incluyeron las luminarias de la fachada de Fragua.

5.17. Simón Bolivar:

- Se presenta breve atraso en la pintura del templete (baranda)
- Ya se instalaron los bebederos. (la mitad), la otra mitad ya se suministró
- 1.32 Programado, 23.1. Ejecutado.
- En el cañón se continuó en instalación hidráulica y sanitaria.
- En el manú se terminaron de enchapar los baños, en el tanque séptico ya se resanaron las fisuras y se programa la polyurea para la próxima semana.

* Se aclara que el toldo (módulo) en parque de los niños no se realiza por el momento pues no alcanza el presupuesto del contrato.

- Se reitera que el plazo de entrega de Simón Bolivar es el 5 de marzo, solo quedan 10 días para la entrega, se requiere ampliar el horario y vincular más personal.

* Se reitera que el presupuesto no se puede modificar, cualquier modificación del presupuesto por parte del contratista sin el aval de interventoría es responsabilidad del contratista exclusivamente. (Bebederos al botadero).

5.18 Tunal:

1. Programado: 60%. Avance: 72%.

- Hay avance en la estructura metálica de la fachada verde, ya está instalada.
- Se subsanaron las observaciones en BMX y se inició la demarcación, se conectó la Y.
- El adoquín se está rematando, instalando piezas y cintas.
- Pendiente adoquín en la cocina. (hundimiento).
- Porterías 2 y 3 finalizando.
- Remate de observaciones en la casa de adulto mayor.

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se hicieron dos rampas pendientes en la plazoleta de eventos |
| - Se reitera la solicitud del acta del módulo de café. |
| - Esta semana se instalan los vidrios en el módulo. |
| - En el CEFE se finaliza la emergencia con la instalación de la tapa. |
| 5.19. Coyelano Cañizares: |
| - Se aclara que se proyecta la ejecución de todo (32 luminarias) por si alcanzan los recursos, por el momento sólo lo que está contemplado en ppto. |
| * Se aclara que no se pueden atender más emergencias. |
| 5.20. Fragua. |
| % Programado: 42% % Ejecutado 60%. |
| - Se debe agilizar la excavación en la zona de juegos. |
| - Hay un reproceso pues por lluvias se dañó la base |
| - Se están enchapando los baños |
| - No se contempló mantenimiento del MS. |
| - No se incluye el sendero adicional. |
| - Cinta antideslizante del coliseo no quedó incluida en el presupuesto. |
| 5.21. Eduardo Santos: |
| % Prog: 36%. |
| - Se subsanaron los enchapes de los baños. |
| - Se verificó en taller las divisiones metálicas de los baños. |
| - Se trabaja en cambio de luminarias y tomas en la administración. |
| - Mañana se inician actividades eléctricas en Coliseo. |
| 5.22. Illimaní: Se continúan actividades en baños la próxima semana. |
| Avance: 50%. |
| - Pendiente ornamentación en un tramo. (Villa Alemana) |
| - En muros se avanza en conformación (Villa Alemana) |
| 5.23. Nuevo Nuzú: |
| Atraso: 1%. |
| - Se instalaron los juegos |
| - Se realizó cambio del enchape e hidrosanitario. |
| - Se trasladó el módulo PPP. |
| 5.24. Virrey Sur: |
| Adelanto, Se subsanó el tema de las aparatos hidrosanitarios, se instalan |

**TEMAS TRATADOS**

Ésta semana los policarbonatos

5.25. Villa Alemana

34 %. Ejecutado.

- Finalizar cerramiento, subsanar adoquín, instalación de portón nuevo grande y otro pequeño.

5.26 Victoria

%. Programado: 2% Ejecutado: 8%.

- Se solicita actualización del cronograma
- Se están pintando los biosaludables
- No se ha ingresado al mantenimiento de la administración.

5.26. Gilma Jimenez:

- Se realizó retiro de lamparas e instalación de nuevas.
- Se realizó retiro de cable.
- Se aclara que F11 no se incluye.
- Patinódromo sí se va a intervenir.
- Se programa inicio de la acometida la próxima semana.

* Se solicita que el presupuesto se actualice cada comité.
* No hay rubro de emergencias futuras.

De las vallas: No se ha recibido ninguna, presentan observaciones y por ello no se ha suscrito acta. El cronograma ajustado se remitirá con el cronograma general del proyecto.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Social - Tunal BMX - Reunión de seguimiento | Contralista - Interventoría | 19-02-24 |
| Social - Hippies - Reunión | Contratista - Interventoría | Pendiente |
| Social - PRD - Muro (Veedor) | Contratista - Interventoría | Por Definir. |
| Avance manuales de mantenimiento | Contratista | 21-02-24 |
| Calidad - Listado de materiales actualizado | Contratista | 16-02-24 |
| Calidad - Ensayos base reciclada | Contratista | Próx Comité. |
| Calidad - Reporte seguimiento adquisiciones | Contratista | Cada Comité. |
| SST - Listado de personal para trabajo en alturas | Contratista | 19-02-24 |
| Ambiental - Revisión cumplimiento RCD | Contratista | Pendiente |
| Alpes - Finalización y entrega | Contratista | 20-02-24 |
| Canal Boyacá - Visita | Contratista - Int - IDRD | 15-02-24 |
| Semilla - Reunión con administración | Contratista - Int | Por Definir. |
| Fontanar del Río - Propuesta implantación parkour | Contratista | 20-02-24. |
| Niños - Fecha entrega estructuras zona oriental | Contratista | Prox Comité. |
| Niños - Limpieza cajas - inspección | Contratista | 16-02-24. |
| Niños - Inicio obras eléctricas | Contratista | 6-03-24 |
| Novos - Busqueda punto eléctrico | Contratista | Próx Comité. |
| UDS - Finalización obra civil | Contratista | 19-02-24 |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | | |
| Observaciones | | | | | | |
| Cronograma actualizado | | | Contratista | | 15-02-24. | |
| Proyección pago acta parcial | | | Contratista | | 16-02-24. | |
| San Jose de Bavaria - Finalización. | | | Contratista | | Próx Comité. | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro. |
|---|---|

BOGOTÁ

**LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN**

EVENTO: Comité de seguimiento # 18 COP 3099/23 FECHA: 15 02 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque recreodeportivo el Salitre / Parque de los niños

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Vianney Cogollo | Ing Catastral | Interventoría | | Solunsas | proyectos@solunsas.com | 3103249803 |
| 2 | Yesica Agudelo | Res Social | Contratista | | Contratista | gs.parquesbt@gmail.com | 3213905[illegible] |
| 3 | Mabel Rangel Cardenas | Interventoría | Ase. Social | | Solun | social.solun@gmail.com | 3103726[illegible] |
| 4 | Yenny Paola Reyes C. | Interventoría | Apoy. Admtivo | | Solun | proyectos@edicun.com | 3144727712 |
| 5 | Luis Gerardo Bonilla | Dir. Obra - Contrat. | Contratista | | Contratista | Lgrado@gmail.com | 3008841403 |
| 6 | Jhonny Rodriguez S. | ING. PHP | contratista | | Contratista | rhonyr@gmail.com | 5033[illegible] |
| 7 | Rodney Gonzalez Donado | Ing Residente | Contratista | | Contratista | rodney7818@hotmail.com | 3118081957 |
| 8 | Yulieth Contreras Contreras | Inspector | Contratista | | Consorcio | Consorcio[illegible]@gmail.com | 3213860350 |
| 9 | Monica Rodriguez Gaona | Ing Calidad | Contratista | | C. Parques Bog | c.parques@gmail.com | 3103376144 |
| 10 | Ing Stella Cecilia Rodriguez | Ing Residente | Contratista | | C Parques Bog | C. parques@gmail.com | 3[illegible]5814084 |
| 11 | Yineth Cruz Arciniegas. | Profesional SST | Interventoría | | Solun Ing. | [illegible]@gmail.com | 3204825485 |
| 12 | [illegible] Pulido | Coordinador | Contratista | | Contratista | c.parque bog@gmail.com | 3118217327 |
| 13 | Ingrid Bibian | Conductor | Contratista | | Contratista | residentesst3099@gmail.com | 3023569513 |
| 14 | Diana Aragon Ceballos | Ing Electricista | Contratista | | Contratista | Proyectos@dielectrico.com | 3003868721 |
| 15 | JOHN L. Cubillos S | RESID. INTERVENT | Interventoría | | Solunsas | ——— | 3103889087 |
| 16 | KATHERIN CUBOS CORREA | CELADORA | C. PARQUES BOG | | C. PARQUES BOG | C.parquesbog@gmail.com | 3135825312 |
| 17 | Diana Santamaría Segura | Residente Ambiental | C. parques Bog | | C. parquesBog | C. parqueBog@gmail.com | 3702507940 |
| 18 | Sebastian Salamanca Sarmiento | Profesional Apoyo | C parquesBog | | C. Parques | C parquesbog@gmail.com | 3202624315 |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

**LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN**

EVENTO: Comité de seguimiento #18 COP 3099/23 FECHA: 15 02 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FIN: _____ LUGAR: Parque recreodeportivo el Salitre / Parque de los niños.

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
| 1 | Jeffrey Arturo Nossa Camargo | Resid. Civil | Contratista | | Consorcio Parque | bog.jeffrey.nossa@hotmail.c | 3007663704 |
| 2 | FERNANDO ANDRADE | RESIDENTE | INTERVENT | | SOLUN ING SAS | — | 3134126632 |
| 3 | LUIS A. MEDRANO B | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLUN ING | — | — |
| 4 | JOSE A. PEÑA B | RESIDENTE | CONTRATISTA | | CONS. P. BAT | c.parques.bog@gmail.com | 3123724428 |
| 5 | Angelica Blanco M | Apoyo Supervisión | STP | | IDRD | — | — |
| 6 | Edna Constanza Caicedo | Directora | Interventoría | | Solun Ing. | proyectos2@solunsas.com | 3011V48572 |
| 7 | Karen Adriana Algecíras Castro | Inspectora | Interventoría | | Solun Ing | proyectos2@solunsas.com | 7653016 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V-1

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque N/A | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 17 CDP 3099/23 CTO Int 3131/23 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 7 | 02 | 2024 |

LUGAR: Parque Zonal Fontanar del Río HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 11 30 am

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Recorrido Fontanar | 4. Componente técnico. |
| 2. Componente SST | 5. Componente social |
| 3. Componente calidad. | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1 Recorrido Fontanar:

Definición área para instalación de la zona de Parkour, se define la ubicación en la zona lateral de Skate, al lado del espejo de agua.

- Se solicita evaluar el arreglo de resortado y piso de caucho.

2. Componente SST:

Verificación de personal Total 92 trabajadores en 15 Parques (frentes de obra).

- Presentación del plano de señalización del parque de los Niños ya se subsanó por parte del contratista
- Se solicita al contratista tener siempre acompañamiento para realizar trabajos en alturas ya que se evidenció el incumplimiento de las normas de Seguridad (coordinador en alturas).
- Se aclaró el color del overol ya que a los trabajadores nuevos les han entregado color azul oscuro
- Se solicita de nuevo reportar documentos de personal previo a iniciar actividades y reportar a la SST del contratista donde se van a realizar trabajos en alturas, se le reiteró al contratista senalizar y demarcar las áreas de intervención incluyendo andamios.

**TEMAS TRATADOS**

- Se requiere realizar reporte de actividades de alto riesgo al igual que la remisión de todos los componentes para ingreso de personal, colocar un apoyo SST para el acompañamiento de trabajos de alto riesgo (Alturas)

3 Componente calidad:

Se requiere la subsanación a las observaciones del certificado Marshall de la IDC-12.

4 Componente técnico:

* Cayetano Cañizares.

Faltarían 10' por instalar, las luminarias son 36 de acuerdo con la fotometría.

* Bosque San Carlos:

Se aclara que en el presupuesto se incluyeron las 2 máquinas, el piso de caucho y la baranda para la zona de juegos infantiles.

* Hippies.

Se aclara que hay que incluir 12 bancas según lo solicitado por IDRD.

* Villa de los Alpes:

- 91% Ejecutado.
- Se solicita remitir registro fotográfico.

* Fragua:

- Obra ejecutada: 60%, se aclara que las lluvias no son justificación

* Eduardo Santos.

- Pendiente enchape y divisiones, pendiente pulida de piso
- Se finalizarían actividades el próximo viernes, para el 20 de febrero toda la obra civil y eléctrica.
- Se informa que el área de comunicaciones de IDRD realizará visita a los coliseos terminados.

* Primero de Mayo:

50% Ejecutado, no hay atraso, pendiente llegada de luminarias, Philips entrega las primeras mañana pero aún no se sabe para que escenario.

* Virrey Sur:

11% Ejecutado, ejecución al día.

- Se finalizaron biosaludables y se pasa a la zona de grecorómanos, soldadura de la baranda
- Pendiente enchapes, se presenta atraso en lo hidráulico y sanitario

* Simón Bolívar: Avance del 54%.

## TEMAS TRATADOS

* Ya se adelantó el tema de los baños
* Se solicita ajustar el cronograma a antes del 5 de marzo, por lo menos 5 días antes
* Hoy se inicia instalación de bebederos
- Se está trabajando en el tanque séptico → PRD.
- El material que se va a retirar de la cancha de baloncesto sirve para rellenar la parte externa del tanque.
- En el camión ya está el material para enchapar baños de mujeres.
- Continúa pintura de módulos

* Parque de los Niños:

Ejecutado 31%.

- Se refiere que no se paga reparación de rellenos afectados por lluvia
- En la zona del parqueadero se tiene la base expuesta a lluvia.

* PRD

- En baloncesto se definió retirar la base, se conserva la subbase.
- En PRD se va a instalar el tablero de control en Hockey el lunes.
* En el presupuesto de niños se incluyó la iluminación con luminaria Dino cumpliendo con 300 luxes.
- En PRD zona administración se está instalando el cielo raso esta semana se confirmaría el acceso por parte del Dr. Niño.

* Novios.

- Ya se realizaron las excavaciones del módulo de baños, pendiente terminación de ciclopeo.
- Hoy se retira el material de excavación.
- En el Tunel del amor se realiza excavación.
- Ya se cuenta con todo el acero y se está figurando en sitio.
- Se solicita buscar los puntos de conexión eléctricas e hidráulicas para conexión del módulo de baños.

* Ollla blanca:

- Avance de 96%, se solicita finalizar actividades pues la obra debía entregarse la semana pasada.
- Están pendientes los rejillas de los cárcamos
- Se aclara que no puede usarse la pista pues queda abierto el tema del cárcamo.

**TEMAS TRATADOS**

- Se revisará el presupuesto para ver si se puede pulir la pista.
- Para el cárcamo son 9 ladrillos cada metro.

* Canal Boyacá:
- Se inicia obra el lunes, el diseño propuesto se debe ajustar, se programan de 4 a 6 recorrido en el parque.

* Río Negro
- 3 t/l. Ejecutado, se está realizando el mantenimiento de las mallas, los resbaladeros son nuevos de acero (2) y 2 en fibra no han llegado. Se solicita incluir en el presupuesto los 2 de fibra que hacen falla. los de acero ya están en taller.
- Se solicita colocar la soldadura a la puerta que solicita el administrador.
- Se finalizarían las actividades el próximo viernes.

* Hippies.
65 l Ejecutado, faltan las 12 de bancas por instalar
- Donde hay 4 bancas se ponen 3, dónde hay 2 se pone 1 con un bolardo de ser posible.
- Para pintar sólamente los contenedores de los árboles colocando los mismos colores existentes.
- Las canecas plásticas se conservan como están pues son de UAESP.

* Virrey Norte:
Hoy inicia desinstalación de canecas y espaldares, se instalarían el viernes.

* Villa Alemana:
39 l ejecutado, se fundieron tapas y marcos; la instalación de las canecas se realizó y se aumentó la intervención en un sendero, se incluyo lo enunciado en el presupuesto, el cerramiento principal (portón) se realiza mantenimiento y el lateral se cambia pues estaba podrido.

© En Río Negro se aclara que se dan de baja los rodaderos.

* Soratá:
21 l Ejecutado, ya se pidieron los aros de la cancha, se revisaron las instalaciones sanitarias, se compraron los vidrios, de la parte eléctrica se inició revisión y cambio de las luminarias en los senderos pequeños que estaban en fotoceldas. Se programó instalación de tierras. Se instalarán 4 luminarias Dino en la fachada de la administración.

* Vallas:

**TEMAS TRATADOS**

El contratista remitió al día de hoy la programación ajustada.

5 El anticipo se desembolsó por completo, está en proceso de legalización de Facturas órdenes 1 y 2, se remitió al IDRD el Formato para el pago de rendimientos del mes de enero.

Se solicita por parte de interventoría legalizar la orden 3 apenas sea posible para iniciar con el proceso de liquidación de la fiducia.

6. Se solicita remitir los manuales de mantenimiento y los planos récord de los frentes que ya se finalizaron. Olaya Herrera, Estadio de Techo. (no es necesario).

* En Olaya ya se instalaron las colchonetas y las fundas de los parlantes del sistema de sonido, se evidencia que el arreglo puntual de la cubierta ha dado resultado hasta el momento.

7. Se solicita la remisión del UP del acompañamiento de los ascensores.

* Se requiere manual de mantenimiento de Olaya, Naranjos, Palestina, Ciudad Montes (cuando finalice), Bosque San Carlos (Al finalizar), Tunal (al finalizar), Cayetano Cañizares ya se puede entregar, Villa de los Alpes, Fragua, Eduardo Santos, Illimaní, Primero de mayo, Nuevo Muzú, Simón Bolívar.

* Tunal.

Ejecutado 72.1, se presenta filtración se solicita subsanar la gotera, pues el manto se cambió solo parcial en la casa del adulto mayor, se solicita revisar el presupuesto, en la portería 4 aparecieron filtraciones, se requiere manual de cada área intervenida. Se instalaron las piezas de los juegos infantiles. En BMX se presenta avance, las cajas están tapadas entonces se va a revisar con sonda, la próxima semana se finaliza el asfalto y se realiza la demarcación.

El ascensor del CEFE Tunal se autoriza mantenimiento pues no está en funcionamiento

Plano récord sin manual. Virrey Sur y Virrey Norte, Río Negro, Hippies, Villa Alemana.

Plano y manual: Niños, PRD, Novios, UDS, Altablanca, Soratá, Gilma Jimenez, Fontanar del Río, Canal Boyacá.

* En Illimaní se realizó visita para verificar la conexión eléctrica del módulo de café, se informa que se encuentra completamente vandalizado, se robaron el cableado y los demás elementos excepto el transformador.

Se cabra que no se conectará a energía, el módulo queda funcional

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| sin electricidad pues no hay tubos, tapas, está vandalizado, sólo queda conectado hidráulicamente. |
| |
| * Se solicita remitir la subsanación de los estudios técnico-económicos de la iluminación incluyendo 3 cotizaciones y las simulaciones. |
| |
| * Se solicita incluir el logo de Bogotá - IDRD en las colchonetas de los postes de Olaya. |
| * Se solicita actualizar el presupuesto de las vallas. |
| * Se reduce el rubro de emergencias a 100 millones. |
| * En Ciudad Montes se incluye el mantenimiento de la cubierta. |
| * En Niños se requiere colocar un nuevo pozo, la entidad propone que sólo se realce la caja, la interventoria manifiesta que la caja es muy pequeña para el caudal requerido, Se solicita por parte de la entidad conectar la 3 canchas existentes en arena al pozo nuevo propuesto. |
| * Se solicita verificar si se contempló cerramiento para la zona de Parkour en tunal, así como reinvelación de la zona de Parkour en Tunal y en Fontanar. |
| * Revisar los recortados de Fontanar. |
| * Se solicita actualizar el presupuesto del contrato. |
| |
| * Ciudad Montes: Tiene 83% Ejecutado |
| * Bosque San Carlos presenta atraso |
| * Tunal al día. |
| * Cayetano al día. |
| * Ya se definió la solución constructiva para la fachada de tunal. |
| * Cayetano Cañizares: |
| Se solicita actualizar el presupuesto con la mayor instalación de luminarias Dino, en la fotometria se evidencia que con 14 no es suficiente, se contemplan 26, se aclara que sube el ppto 4 millones más. |
| * En Gilma Jimenez está pendiente por definir si se interviene la iluminación del patinódromo en este contrato o en el de grandes escenarios. |

**TEMAS TRATADOS**

* Parque Nacional:
Se solicita el presupuesto para los baños, para poder definir si se interviene 1 o los 2 módulos.
* Gilma Jimenez: Grandes escenarios se interviene en el la cancha futbol 11, nosotros futbol 8 y 5, las luminarias de Futbol 8 y 5 se trasladan a patinódromo.
* Se remitirán reportes para mantenimiento de estructura de vallas (sin vinilo).
* El sendero de Fragua no se incluye.
* Se prioriza el arreglo de la red Piramidal de Virrey Sur, con el mantenimiento de piso de caucho.
* Se solicita incluir la pulida de la pista de velocidad en alto blanco.
* La victoria se encuentra en ejecución, el contratista informa que por temas de seguridad se trabaja hasta las 2 pues en el parque se disparan los altares en la zona, se están interviniendo el grecorromano y el NTD, se está programando la intervención de la cubierta de la administración.
* Gilma Jimenez, presenta atraso del 9%, no se ha conciliado el NP de la acometida y del transformador lo que genera atraso en el inicio de labores, pero sí se puede iniciar el cambio de luminarias. Se solicita solucionar con urgencia el tema del NP.
-Se solicita tomar las medidas fotométricas previas.
* Se aclara que se deben realizar los equipamentos deportivos del parque de los niños y el toldo.
* La conexión de los módulos excepto Porvenir, se priorizan.
* los equipamentos priorizados en la zona de arena de niños:
3 de tenis, 3 de voleyball y 1 de los demás deportes
* Se solicita verificar el tema de conexión electrica de los módulos en Porvenir pues no se contemplan paneles.
* Se autoriza la grabación de la reunión por parte de los asistentes.

Para el componente de calidad se emite aval por parte de interventoria al plan de adquisiciones, se requerido que los ensayos deben entregarse a la interventoria firmados por el residente y el director para la verificación.

**TEMAS TRATADOS**

- Se solicita subsanar los soportes del plan de adquisiciones en el informe mensual
- Se solicita informar fecha de llegada de granulares para realizar la contramuestra.
- Se remitió el día de hoy la documentación de Recicladas Industriales por cierre de Constituyan.
- El informe se recibió en la mañana y está en revisión.
- Se solicitan las fichas técnicas de los juegos instalados.

6. Componente social

- El 31 se realizó divulgación para inicio de obras en canal boyacá
- El 02 de febrero se realizó reunión en Complejo Acuático, se realizó acta de vecindad del acceso.
- Se realizó reunión con la administradora de C. Simón Bolivar para socialización de la propuesta de vinilo (numeración) de los módulos, se subsanaron las observaciones y se avaló por parte de administración.
- Reunión de inicio Canal Boyacá el 2 de febrero.
- El 2 de febrero se realizó acta de vecindad del espacio público en Bosque San Carlos.
- Ayer se realizó reunión con la administradora de Bosque San Carlos actualizando las intervenciones a realizar
- Se remitirán observaciones a las actas de inspección preliminar
- Las actas de baja están en revisión de interventoría.

Programación.

% Programado: 47% Atraso - 4%

% Ejecutado 43%

El día de hoy se allegó programación actualizado de acuerdo con el presupuesto actualizado (mayores y menores cantidades, actividades sin definir, actividades no priorizadas excluidas del presupuesto).

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| SST - Remisión plano emergencia niños | Interventoría | 9-2-24 |
| SST - Reporte actividades alto riesgo | Contratista | Semanal |
| Eduardo Santos - Finalización | Contratista | 20-02-24 |
| PRD - Inicio intervención zona comidas | Contratista - Interv | Próx Comité |
| Altablanco - Informar al administrador | Contratista - Interv | Próx Comité |
| Río Negro - Finalización | Contratista | 15-02-24 |
| Primera entrega manuales mantenimiento | Contratista | 21-02-24 |
| Precios NPIs | Contratista | 9-02-24 |
| Tunal - Finalización | Contratista | 14-02-24 |
| Estudios eléctricos técnico-económico | Contratista | Próx Comité |
| Parque Nacional - PPTO baños | Contratista | 8-02-24 |
| Galima Jimenez - Inicio | Contratista | 9-02-24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algecuas C. | |
| CARGO | | CARGO | Inspector interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algecuas Castro |
|---|---|

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra - Seguimiento FECHA: 7 de febrero 2024

HORA INICIAL: 9:05 HORA FIN: _____ LUGAR: Parque Fontanar del Río

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
| 1 | Angélica Lopez Herrera | Apoyo Interventoría | IDP | | IDRD | — | — |
| 2 | JOHN L. CUELLAR S | RESID. INTERV | INTERVENTORIA | | Solwin | — | 3207899087 |
| 3 | AUDITH RUEDA | COORDINADORA | Contratista | | Contratista | c.porras.bog@gmail.com | 3118243220 |
| 4 | Luis Granados Donado | Dir. Obra Contratista | Contratista | | Contratista | granadosdonadoluisfelipe@gmail.com | 3006894163 |
| 5 | Ingrid Baez Sanabria | Residente SST | Contratista | | contratista | residentesst3099@gmail.com | 3023509893 |
| 6 | Diana Santamaría | Profesional Ambiental | Contratista | | Contratista | residentembiental.parkesmi | 3232567916 |
| 7 | M. Juliette Contreras Cortes | Inspector | Contratista | | Contratista | c.parquebog@gmail.com | 3213860750 |
| 8 | FERNANDA MONDRAGÓN | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLUCIONES INTEGRALES | — | 3134926632 |
| 9 | KATHERINE GOMEZ LOPEZ | CONTRATISTA | CONTRATISTA | | C. INGES SAS | CGOMEZLOPEZ@HOTMAIL.COM | 3145835412 |
| 10 | Luz Stella Quintero L. | Residente | Contratista | | C. Parque Bog | C.parquebog@gmail.com | 3163211971 |
| 11 | Yenny Paola Reyes | Ing. Electricista | Interventoría | | Interventoría | proyectos2@solinsa.com | 3134720112 |
| 12 | Viannery Cuellar | Ing Calidad | Interventoría | | Solinsa | proyectos2@solinsa.com | 3103219603 |
| 13 | Ingrid Constanza Castañeda | Directora | Interventoría | | Solinsa | proyectos3@solinsa.com | 3017493021 |
| 14 | Yesica Acevedo | R. Social | Contratista | | Contratista | respaquesidrd@gmail.com | 3213900511 |
| 15 | Rodney Gronellos Donado | R. Obra | Contratista | | Contratista | rodney7889@hotmail.com | 3118681957 |
| 16 | Diana Aragon Ceballos | Ing Electrica | Contratista | | Contratista | Proyectos@delectricol.com.co | 3003462221 |
| 17 | LUIS A MEDRANO B | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLUCIONES | — | 3202121018 |
| 18 | NEIFER ALFONSO MOSQUERA CAMARGO | RESIDENTE ELECTRICO | CONTRATISTA | | Consorcio Parque | neifer-mosquera@hotmail.com | 3006811769 |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL -V 4

19 JOHN ORLANDO PEÑA B. RESIDENTE. CONTRATISTA — CONSOR P.BOG cjpena@gmail.com 3123726418

**ANEXO 4.** INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** **21** Interventor: SOLJUN INGENIERIA SAS

enero 28, 2024 al febrero 3, 2024

1. Datos Generales

| PARQUE | Código: | Localidad: / Barrio: | |
|---|---|---|---|

2. Contrato de Obra

Objeto:

| COP No. | 3099-2023 |
|---|---|

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

| F.I | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.961.251.399,00 | $ 41.864.509,00 | $ 77.343.733,00 | 144.066.622,00 | 1.118.810.201,00 | | |
| A.I.U. (25,08%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | 36.103.096,00 | 280.323.716,00 | | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.493,00 | 57.626.649,00 | 447.444.080,00 | | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | 122.543.069,00 | 951.489.837,00 | | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | 223.941.599,00 | 1.175.431.436,00 | | |

3. Contrato de Interventoría

Objeto:

| CI No. | 3131-2023 |
|---|---|

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLJUN INGENIERIA SAS

| F.I | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.863,00 | $ 65.419.199,00 | 67.883.654,00 | 103.448.492,00 | | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | 12.894.064,00 | 19.655.213,00 | | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | 76.322.867,00 | 77.848.847,00 | 80.757.748,00 | 123.103.705,00 | | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.867,00 | $ 77.848.847,00 | 80.757.748,00 | 123.103.705,00 | | |
| Retagarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | 8.075.775,00 | 12.310.371,00 | | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063.962,00 | 72.681.973,00 | 110.793.334,00 | | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | 211.436.515,00 | 322.229.849,00 | | |

4. 21 Fecha de corte: 3-feb-24

4.1. Datos Generales

| Nombre: | PRQ Parque Equipamiento Cancha/Canchas Techo y/ Administración | Código: | 12-091 | Localidad: / Barrio: | BARRIOS UNIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 60 # 53-75 | | | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 314.247.603,00 | 2,32% | 31,00% | 42,00% | -11,00% | $ 131.963.951,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 314.247.503,00 | | 31,00% | 42,00% | -11,00% | $ | 131.983.951,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 Datos Generales | Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ | |
| | Dirección: | Avenida Calle 63 # 68-45 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 713.841.585,00 | 5,29% | 41,00% | 54,00% | -13,00% | $ | 385.528.461,30 |
| TOTAL | | 713.841.585,00 | | 41,00% | 54,00% | -13,00% | $ | 385.528.461,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. Datos Generales | Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN | |
| | Dirección: | Carrera 5 A #158-04 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 37.180.607,00 | 0,27% | 94,00% | 96,00% | -2,00% | $ | 35.693.286,72 |
| TOTAL | | 37.180.607,00 | | 94,00% | 96,00% | -2,00% | $ | 35.693.286,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Datos Generales | Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 1.268.977.150,00 | 9,35% | 21,00% | 31,00% | -10,00% | $ | 393.382.916,50 |
| TOTAL | | 1.268.977.150,00 | | 21,00% | 31,00% | -10,00% | $ | 393.382.916,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. Datos Generales | Nombre: | Parque de los Novios | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | Avenida Calle 63 # 45-10 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 386.731.574,00 | 2,85% | 7,00% | 30,00% | -23,00% | $ | 118.019.472,20 |
| TOTAL | | 386.731.574,00 | | 7,00% | 30,00% | -23,00% | $ | 118.019.472,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. Datos Generales | Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 73.258.533,34 | 0,54% | 0,00% | 36,00% | -36,00% | $ | 26.373.072,00 |
| TOTAL | | 73.258.533,34 | | 0,00% | 36,00% | -36,00% | $ | 26.373.072,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7. Datos Generales | Nombre: | Parque Bavria | Código: | 01-023 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 537.285.811,89 | 3,06% | 20,00% | 21,00% | -1,00% | $ 112.830.020,50 |
| TOTAL | | 537.285.811,89 | | 20,00% | 21,00% | -1,00% | $ 112.830.020,50 |

4.8. Datos Generales

| Nombre: | Parque Sucre o Hippies | Código: | 02-010 | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 183.102.783,37 | 1,20% | 19,00% | 61,00% | -42,00% | $ 99.492.897,88 |
| TOTAL | | 183.102.783,37 | | 19,00% | 61,00% | -42,00% | $ 99.492.897,88 |

4.9. Datos Generales

| Nombre: | Parque UDS | Código: | | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.079.637.518,79 | 7,06% | 8,00% | 0,00% | 8,00% | $ - |
| TOTAL | | 1.079.637.518,79 | | 8,00% | 0,00% | 8,00% | $ - |

4.10. Datos Generales

| Nombre: | Parque Canal Boyacá | Código: | | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 588.837.946,48 | 4,34% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | $ 5.888.379,46 |
| TOTAL | | 588.837.946,48 | | 1,00% | 1,00% | 0,00% | $ 5.888.379,46 |

4.11. Datos Generales

| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 19,00% | 11,00% | 8,00% | $ 3.101.750,85 |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 19,00% | 11,00% | 8,00% | $ 3.101.750,85 |

4.12. Datos Generales

| Nombre: | Parque Fontanar del Río | Código: | | Localidad: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 405.377.889,00 | 2,98% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | $ - |
| TOTAL | | 405.377.889,00 | | 2,00% | 0,00% | 2,00% | $ - |

4.13. Datos Generales

| Nombre: | Batallón Olaya Herrera | Código: | 18-207 | Localidad: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 35 #3-50 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 568.410.344,64 | 4,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 568.410.344,64 |
| TOTAL | | 568.410.344,64 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 568.410.344,64 |

4.14. Datos Generales

| Nombre: | Parque Ciudad Montes | Código: | 16-112 | Localidad: | PUENTE ARANDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 10 Sur #39-29 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 284.600.389,68 | 2,10% | 68,00% | 83,00% | -15,00% | $ 236.218.323,43 |
| TOTAL | | 284.600.389,68 | | 68,00% | 83,00% | -15,00% | $ 236.218.323,43 |

4.15. Datos Generales

| Nombre: | Parque Bosque de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Dirección, Cra. 13 a # 30-15 S. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 797.309.179,30 | 5,87% | 50,00% | 44,00% | 6,00% | $ 350.816.038,93 |
| TOTAL | | 797.309.179,30 | | 50,00% | 44,00% | 6,00% | $ 350.816.038,93 |

4.16. Datos Generales

| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Transversal 78K No. 41 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 47.732.298,45 | 0,35% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 47.732.298,45 |
| TOTAL | | 47.732.298,45 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 47.732 298,45 |

4.17. Datos Generales

| Nombre: | Parque Lauretes Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 70 Bis Sur #80K-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 30.316.099,35 | 0,22% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 30.316.099,35 |
| TOTAL | | 30.316.099,35 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 30.316.099,35 |

4.18. Datos Generales

| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CARRERA 8A | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 191.283.837,74 | 1,41% | 89,00% | 91,00% | -2,00% | $ 174.050.183,34 |
| TOTAL | | 191.283.837,74 | | 89,00% | 91,00% | -2,00% | $ 174.050.183,34 |

4.19. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 151.270.444,50 | 1,11% | 0,00% | 100,00% | -100,00% | $ 151.270.444,50 |
| TOTAL | | 151.270.444,50 | | 0,00% | 100,00% | -100,00% | $ 151.270.444,50 |

4.20. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Primero de Mayo | Código: | 04-196 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | carrera 5 No #17-14 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 502.589.159,24 | 3,70% | 42,00% | 50,00% | -8,00% | $ 251.294.579,62 |
| TOTAL | | 502.589.159,24 | | 42,00% | 50,00% | -8,00% | $ 251.294.579,62 |

4.21. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Cra 190 #52B-15 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 1.255.280.381,45 | 9,25% | 71,00% | 72,00% | -1,00% | $ 903.801.880,24 |
| TOTAL | | 1.255.280.381,45 | | 71,00% | 72,00% | -1,00% | $ 903.801.880,24 |

4.22. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
| Dirección: | Cra. 31 #14B-57S | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 832.618.833,29 | 6,14% | 47,00% | 60,00% | -13,00% | $ 499.571.299,97 |
| TOTAL | | 832.618.833,29 | | 47,00% | 60,00% | -13,00% | $ 499.571.299,97 |

4.23. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Mirador Illimani | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
| Dirección: | Cra. 27b #1-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | $ 378.858.745,25 | 2,78% | 61,00% | 39,00% | 22,00% | $ 146.974.130,65 |
| TOTAL | 378.858.745,25 | | 61,00% | 39,00% | 22,00% | $ 146.974.130,65 |

4.24. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 152.660.186,95 | 1,12% | 25,00% | 46,00% | -21,00% | $ 70.223.686,00 |
| TOTAL | | 152.660.186,95 | | 25,00% | 46,00% | -21,00% | $ 70.223.686,00 |

4.25. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | 38 a 52a, Cra. 81B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 832.726.960,68 | 6,14% | 39,00% | 33,00% | 6,00% | $ 274.799.897,00 |
| TOTAL | | 832.726.960,68 | | 39,00% | 33,00% | 6,00% | $ 274.799.897,00 |

4.26. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 08-241 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 158.955.170,81 | 1,16% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.955.170,81 |
| TOTAL | | 158.955.170,81 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.955.170,81 |

4.27. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 41.059.732,56 | 0,30% | 34,00% | 34,00% | 0,00% | $ 13.980.309,07 |
| TOTAL | | 41.059.732,56 | | 34,00% | 34,00% | 0,00% | 13.980.309,07 |

4.28. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 10.794.931,80 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.794.931,80 |
| TOTAL | | 10.794.931,80 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.794.931,80 |

| 4.29. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Vimay Sur | Código: | 05-015 | Localidad: | TUNJUELITO | |
| Dirección: | | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 84.988.989,64 | 0,48% | 11,00% | 11,00% | 0,00% | $ 7.148.786,66 |
| TOTAL | | 84.988.989,64 | | 11,00% | 11,00% | 0,00% | 7.148.786,66 |

| 4.30. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gilma Jimenez | Código: | 05-015 | Localidad: | TUNJUELITO | |
| Dirección: | | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 403.234.310,35 | 2,07% | 17,00% | 8,00% | 9,00% | $ 32.258.744,83 |
| TOTAL | | 403.234.310,35 | | 17,00% | 8,00% | 9,00% | 32.258.744,83 |

| 4.31. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | | Localidad: | | |
| Dirección: | | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 38.597.967,68 | 0,28% | 21,00% | 8,00% | 13,00% | $ 3.087.837,41 |
| TOTAL | | 38.597.967,68 | | 21,00% | 8,00% | 13,00% | 3.087.837,41 |

| 5 | | | 6. |
|---|---|---|---|
| | Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 | |
| | Adición de tiempo en (meses): | | |
| | Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 | |

7. **Licencias:**

| Construcción: | | Ambiental: | N/A | Intervensión del Espacio Público | N/A |
|---|---|---|---|---|---|

8. **Servicios Públicos:**

| TELEFONOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMA | CODENSA | N/A | EAAB | Informe 50% | OTROS | Informe 75% | Informe 100% |

| 9. | PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10. **Observaciones:**

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se realizó recorrido en el parque con el apoyo a la supervisión del contrato donde se incluyeron nuevas actividades a ejecutar como: inclusión de otro módulo grecoromano, cambio de divisiones metalicas en los baño de mujeres, desmonte mantenimiento y pintura de los biosaludables, arreglo de fisuras en la placa de los biosaludables, pintura de materas azul por gris.
2.- PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Se solicita traer los biosaludables del taller y volvertos a instalar. terminar el fijado y pintutra de los elementos de la ruta de la vida, realizar el desmonte y suministro de marco y puerta zona de cafeteria.
3.- ESTADIO OLAYA HERRERA: Se debe acelerar el suministro e instalación de las colchonetas para la base de los postes de iluminación de la cancha de futbol.
4.- PARQUE CIUDAD MONTES: Se debe terminar el cerramiento perimetral en la zona de la huerta sobre la Diag 18 S, se debe realizra el suministro e instalación de los portones metalicos de la zona de la huerta. Se debe iniciar el fijado y pintyra ela ruta de la vida.
5.- PARQUE SIMON BOLIVAR (MANA): e avanza con la revisión del tanque septico y lavado al interior de los tanques sépticos, con equipos especiales.
6.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Esta pendiente el cambio de las luminarias de la zona del patinodromo,
7.- PARQUE SIMON BOLIVAR (CARBON): Se continuaron las actividades en baños del modulo el carbon..
8.- PARQUE ALTA BLANCA: Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.
9.- PARQUEADERO PARQUE NIÑOS:Se revisa la reconstrucción de pozo de alcantarillado de Aguas. lluvias
10.- PARQUE DE LOS NOVIOS,: Se realiza la reparación y cambio de fluxometros para push de sanitarios baños hombres.
11 PARQUE DE LOS NIÑOS: Se continua con la excavación para pilotes costados norte, sur y occidental. Se continua con la Figuración de hierro para pilotes.
12.- PARQUE EL TUNAL: Se avanza con la instalación del adoquin nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4
Casa del adulto mayor. Se avanza con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias,
13- PARQUE ILIMANI: Se avanza en la adecuacion del midulo de baños
14.- PARQUE EDUARDO SANTO:: Se avanza con la reinstalacion de enchape en baños de coliseo y la instalacion de biosaludables ya restaurados.
15,. PARQUE LA FRAGUA: Se avanza con la instalacion de geotextil en la excavacion de la pista de patinaje en asfalto.

11. INFORME TÉCNICO

L- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 05-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquin nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.
- Se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se avanza con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso.
- Actividades eléctricas realizadas al 98 %

RESANE Y PINTURA PORTERIAS:

- Se terminan los trabajos de resane y pintura de porteria # 1, se avanza en porteria #4, se inician trabajos en porteria #2.

PISTA DE BMX:

- Se avanza con la instalacion de asfalto en zona de llagada y co trabajos complementarios de mantenimiento y adecuacion de la pista y su contorno existante.

ZONA DE GIMNASIOS

- Se termina y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1

- PARQUE ILLIMANI:

- Se avanza en la adecuacion del midulo de baños

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalacion de enchape en baños de coliseo y la instalacion de biosaludables ya restaurados.

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalacion de geotextil en la excavacion de la pista de patinaje en asfalto.
- Se realiza retiro de escombros, se avanza con la excavacion de la zona de juegos infantiles.
- Se avanza con el mantenimientos hidrosanitario de los baños del coliseo
- Actividades realizadas al 100 %

- PARQUE CAYETANO CAÑIZARES:

- Se hace entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.
- Actividades eléctricas realizadas al 100 %

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con la actividade de fundida de tapas de cajas de inspeccion e instalacion de equipamiento urbano.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Llegan electricos a realizar retiro de cableado en mal estado.
- Actividades eléctricas realizadas al 20%.

• PARQUE LA VICTORIA:

- Se realiza la reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio.

• PARQUE VIRREY SUR:

- Se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

---

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se continua con el retiro del material que se excavó en zona exterior de los tanques.
- Se avanza con la revisión del tanque septico y lavado al interior de los tanques sépticos, con equipos especiales.
- Se termina la impermeabilización mediante la aplicación de IGOL denso por la parte externa e inferior de los tanques sépticos.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Se continúa con el enchape en cerámica al interior de los baños de hombres y mujeres.
- Se solicita terminar la construcción de la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico.
- Se solcita continuar con el cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø= 6".

En el Sector del lago

- Se continúa avanzando con la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.

En el Sector del Módulo del Carbón.

- En zona exteriores para los baños de mujeres, secontinua con la localizan las redes de agua potable para inicio de las prolongaciones en tubería de Ø 1 1/2",

---

•PARQUE DE LOS NIÑOS -PARQUEADERO.

- Se revisa la reconstrucción de pozo de alcantarillado de Aguas. lluvias
- Se termina la extendida y compactación de la subbase granular e=30 cm.
- Se revisa que la subbase granular compactada no presente fallos

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Se revisa que la base granular compactada no presenta fallos.
- Se termina la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Se continúa la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Actividades Electricas realizadas al 93.00%

• PRD - ÁREA ADMINISTRATIVA.

- Se continua la instalación de la estructura metálica, para el cielorraso en PVC para la oficina.
- Se inicia la instalación de las taminas de PVC

• CANAL RIO NEGRO

- Se realiza la instalacipon de pintura de los tableros de baloncetoy
- Se realiza la instalalcon de pintura de los arcos der microfutbol
- En fabricacion los deslizaderos metalicos en acero.
- Se estan realizando subsanacion de las observaciones al Contratista, referentes a la instatación de la malla eslabonada y a los remates de soldadura en los módulos del cerramiento

- PARQUE DE LOS NIÑOS

- Se continua con la excavación para pilotes costados norte, sur y occidental.
- Se continua con la Figuración de hierro para pilotes.
- Inicio armado de viga de amarre costado oriental y sur
- Se termina la construcción del pozo de alcantarillado de aguas lluvias..
- Setermina la instalación de tuberías de 6", por costrado norte.
- Se continua con la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Se continha con el acopio de material para conformar las gradarías.
- No se han realizado actividades eléctricas 0.00 %

- PARQUE ALTABLANCA

- Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.
- Se realiza aseo general de la pista de patinaje, recolecciпon de magterrial y llevada a diapoeición final.
- Se termina la ejeccción de pintura en muros y techos de la cocienta
- Se tiene en estudio de la propuesta por parte d ela inastitución de realizar l apulida de toda la palat de patinaje de velociodad

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se continua la aplicación da pintura en módulo de administración.
- Se realiza la reparación y cambio de fluxometros para push de sanitarios baños hombres.
- Se continua la instalación de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños.
- Se realiza replanteo topografico en el tunel del amor
- Se inlican excavacion para ejecución de pedestales para la instalación de la estructura metalica para el tunel del amor.

- PARQUE SERVITA

– Cancha múltiple 1. Se realiza el desmonte de 8 luminarias y montaje de 8 luminarias de "Dino".
- Cancha múltiple 2. Se realiza el desmonte de 8 luminarias y montaje de 8 luminarias de "Dino".
- Cancha futbol 5. Se realiza el desmonte de 2 luminarias y montaje de 2 luminarias Karlix , o sea de las existentes.
- Se detectó fallo en un luminarias de tenis. Se desmontaron 4 y se montaron 4 tipo karlix.
- Actividad eléctrica realizada al 50.00%

- PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Se continua realizando el mantenimiento da adoquín en área interna del parque. Está actividad ya se inició. (70%)
- Finaliza la actividda de la señalética y cambio de vinilos.
- Se instalan los protector metálico tipo M-90 del árbol circular - 2 unidades.
- En fabricacion de bancas para remplazo de existentes.
- Desmonte y retiro de rejilla tipo cárcamo ; son 42 unidades
- Instalación de rejilla en concreto para cárcamo 16.8 ml.
- Se terminba limpieza de cárcamo de h=20 cm, son 16,80 ml.

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Parque totalmente terminado
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.
- En este Estadio no se realizó actividad eléctrica. 0,00%

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100%
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 19-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Se realiza revisión de las divisiones metalicas instalados en los baños de hombres y mujres.
- Se realizó pintura con vinilo dentro de los baños de hombres y mujeres.

ZONA JUEGOS INFANTILES

- Se realizo la construcción de los dados en concreto para la instalación de los juegos.
- Llego juego infantil para su correspondinte instalación..

ZONA GRECOROMANOS

- Se realiza la colocalón de tubo PVC D=6" sobre la raiz del árbol paras u correspondiente protección.
- Se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto sobre la tuberia PVC de D=6".

- En este parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizaran actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD

Actividad eléctrica realizadas en el parque 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

ZONA DE LA HUERTA CERRAMIENTO.

- Se termina la instalación de los modulos en malla eslabonada h=2,5 mts, por la Diag. 16 Sur en zona de la huerta.
- Se realiza el desmewonte se instalacipon del porton metalico entrada a la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Cra 40.

ZONA RUTA DE LA VIDA

- Se continua con las actividades de fijado metálico en los módulos.

- Actividad eléctrica realizada al 100%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 19-207

Se revisan actividades terminadas por el contratista quedando pendiente los siguiente:

CANCHA DE FUTBOL

- El contratista suministro e instalación las colchonetas conicas y las coloco en la base de concreto de las luminarias de la cancha de futbol.
- El contratista suministro e instalación las fundas para protegerde la lluvia los bajos en gradertas.

Actividad eléctricasen el parque realizadas al 100%

•PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

BIOSALUDABLES

- El contratista realizó la instalación de los Biosaludable que estaban en taller en mantenimiento y pintura.

MODULO M-5 (COLUMPIOS)

- Se realiza la revisión por parte de Interventoría de los retoques de pintura solicitados en los modulos de juegos M-5 (Columpios). .

RUTA DE LA VIDA

- Se aplico pintura en los módulos ruta de la vida.

COLISEO

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 03 de febrero de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 03-02-2024 | 47.00 | 43.00 | - 4.00 |
| | | | |

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 03-2-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 47,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 43,00%, reflejando un atraso en la Programación de las Obras del - 4,00%. Este atraso puede ser causal de un presunto incumplimiento del contrato celebrado entre las partes. Se le ha solicitado al Contratista implementar todos los recursos (materiales, equipos y humanos) que estén a su alcance para que se ponga al día, y así evitar mayores atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por este incumplimiento.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con ocho (8) parques. Cautro (4) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Laureles Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Otaya Herrera, Parque Porvenir), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . dos (2) parques con actividades significativas (Parque Ciudad Montes, Parque Villa de los Alpes) con un avance superior al 80%, Los Parques (Primero de Mayo y Parque Bosque de San Carlos) con un avance superior del 44%.

FRENTE 2: Este frente cuanta con doce (12) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hipplas y Parque Altablanmca) tiene porcentajes superiores ta 61 %, los parques (Simón Bolivar y PRD) cuongtan con porcentajes suseperiores al 42%, los parques (Novios, Niños y Canal Rio Negro ) cventan con porcentajes superiorers al 30, los parques (Servita y Virrey Norte) cuengtan con porcentajes por encima del 11% mkengtaras que los parques (Canal Boyaca, fontanar y UDS) no ceuntan con porcetajes ya que estos parques hasta ahia se stan iniciando.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parque (Palestina, Cayetano) ya se encuentran terminados al 100%, los parques (Tunal y La Fragua) presntan un avance superior al 60 %, los parques (Eduardo Santos, Illimani. Nuevo Muzu y Villa Alemana) presnetan porcentajes superiores al 33%, y los parques (Virrey Sur La Victoria y Gilma Jimenez) presenatn porcentajes bajos superiores del 8%.

COMPONENTE SST

- Capacitación a todas y a todos
- Capacitación de Hidratación y Cuidado de la piel
- Permisos en Alturas
- Orden y Aseo
- Inspecciones de herramientas y Arnés

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante el periodo de reporte se realizó la revisión por parte de la interventoría del informe mensual de componente ambiental, en su versión 2 quedo no aprobado, por lo cual debe ser subsanado para su respectiva revisión nuevamnetre
- Revisón de las Acta de mobiliario presentadas por el Contratista de obra.
- Se recuerda alcontratista la entrega de los reportes de RCD, los cuales deben venir consignados en los informes mensuales.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza revisión del plan de adquisiciones el cual es aprobado desde el compoentne de calidad
- Se reciben resultados de adoquines de arcilla los cuales cumplen con las especificaciones técnicas
- Los resultados de las densidades tomadas en campo en PRD cumplen con los requisitos para liberación
- Se solicita incluir en informe las remisiones que evidencian las tomas de muestras en campo por frente
- Se recibe informa N° 5 d contratista el cual se devuelve con observaciones
- Se solicitan los resultados de la MD-12
- Se programará toma de contramuestra de material granular por interventoría para verificación de cumplimiento de especificaciones
- Se recibe plan de inspección y ensayo de contratista incluyendo los ítems de los NP aprobados el cual se encuentra en revisión por el profesional electricista
- Se realizan observaciones a las actas de baja en las cuales debe estar descrito claramente la disposición de los materiales enviados al gestor final

COMPONENTE SOCIAL


- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Revisión de Informe mensual no. 5 el cual presento observaciones las cuales fueron subsanadas por el contratista, se da aprobación y se requiere radicación.
- Entrega de informe mensual en el cual se presenta consolidado actividades ejecutadas en el periodo
- Asistencia a comite de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas por el componente social.
- Revisión de volante informativo para reunión de inicio parque Canal de Boyacá a realizar el día 02 de febrero.
- Revisión de presentación para reunión de inicio, la cual presento observaciones por el área técnica, las cuales se remitan al contratista quien ajusta de acuerdo a lo requimientos, el dia 31 de enero se remite a profesional de apoyo de la supervisión quien remite obervaciones.
- Asistencia a reunión de inicio parque Canal de Boyacá en la cual se contó con la asistencia de líderes de la zona, administrador del parque, profesionales de interventoría, contratista e IDRD, se presentan actividades a ejecutar por los componentes SST, Ambiental, Social y técnica.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA








Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 29 de enero al 04 de febrero de 2024 se describen a continuación:

El día 01 de febrero de 2024 mediante correo electrónico, el contratista remite reintegro de los rendimientos financieros de mes de diciembre del 2023 por valor de $ 1.732.731



REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO


| | |
|---|---|
| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) |
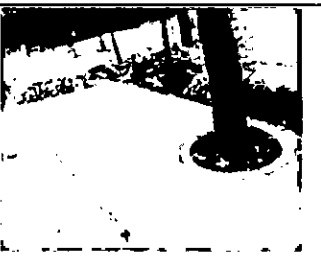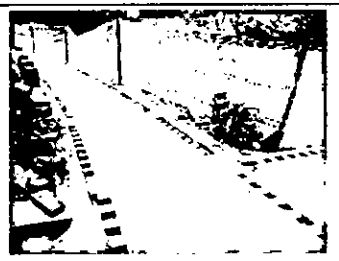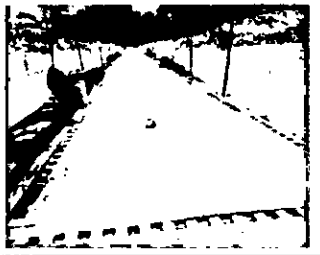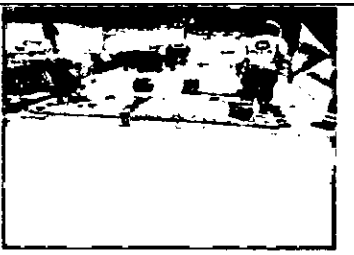
| | |
|---|---|
|   |   |
| se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4. | Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafeteria puerta # 4, se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos. |
| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) |
|   |   |
| se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4. | se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4. |
| PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | PARQUE TUNAL ( PORTERIAS ) |
|   |   |
| se avanza con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias | se terminan los trabajos de resane y pintura de porteria # 1, se avanza en porteria #4, se inician trabajos en porteria #2. |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX ) | PARQUE TUNAL (GIMNASIO) |




se avanza con la instalacion de asfalto en zona de llegada y co trabajos complementarios de mantenimiento y adecuacion de la pista y su contorno existente.

PARQUE ILLIMANI

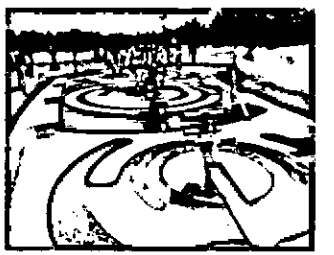
se termina y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1

PARQUE EDUARDO SANTOS





-se avanza en la adecuacion del midulo de baños

PARQUE LA FRAGUA

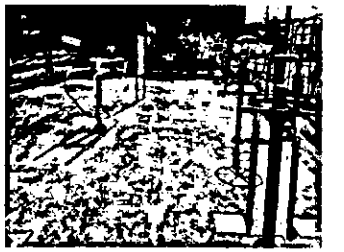
- se avanza con la reinstalacion de enchape en baños de coliseo y la instalacion de biosaludables ya restaurados.

PARQUE CAYETANO CAÑIZARES


- se avanza con la instalacion de geotextil en la excavacion de la pista de patinaje en asfalto.

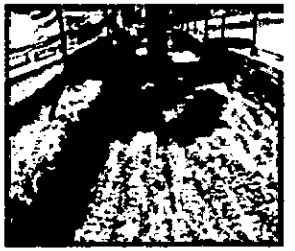
PARQUE NUEVO MUZU

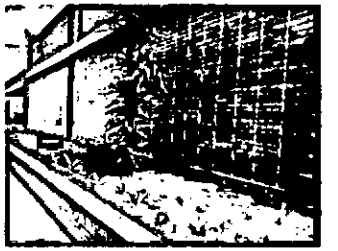


- se hace entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes.

PARQUE VILLA ALEMANA

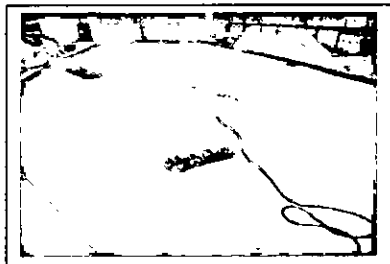

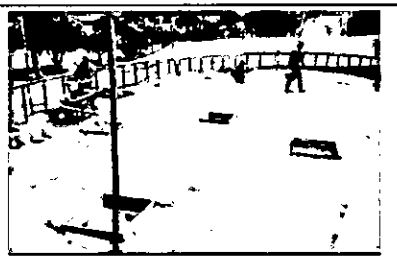

- se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.


PARQUE LA VICTORIA






- se realiza la reunion de socializacion de las actividades a realizar y acta de inicio.


PARQUE ALTABLANCA





Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.

PARQUE CANAL RIO NEGRO

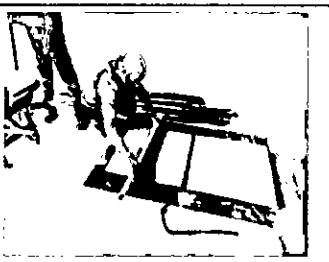



- se avanza con la actividada de fundida de tapas de cajas de inspeccion e instalacion de equipamiento urbano.


PARQUE VIRREY SUR





se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.



PRD CANCHA DE TENNIS










Se revisa que la base granular compactada no presente fallos.
- Se termina la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.

PARQUE LOS NIÑOS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Se estan realizando subsanacion de las observaciones al Contratista, referentes a la instalación de la malla eslabonada y a los remates de soldadura en los módulos del cerramiento | | Se esta realizando figuarción de hierro para viga y pilitnas - se realiza reconstrucción de pozo aguas lluvias | |
| PARQUE LOS NOVIOS | | PARQUEADERO LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Se continua la instalación de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños. - Se realiza replanteo topografico en el tunel del amor | | Se solicitya el rietkiro de agua y la recompactación del magterial - Se termina la extandida y compactación de la subbase granular e=30 cm. - Se revisa que la subbase granular compactada no presenta fallos | |
| PRD CANCHA DE BALONCESTO | | SIMÓN BOLÍAR (CARBÓN) | |
|  |  |  |  |
| Se solcito el retiro del agua y el secado y recompactación del metertal zoan acancha e baloncesto | | Se revisa la instalación externa e interna de tuberia PVC para los baños | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Sesolicisl el retiro del Agua para terminar la impermeabilización mediante la aplicación de IGOL denso por la parte externa e inferior de los tanques sépticos. - Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso | | Se realiza el suministro e instalación de las divisiones metalicas en baños hombtes y mujeres - se aplica nuevamengte silkaflex alrededor de los lavamanos baño de hombres | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |  |  |
| se realiza la protección de las raices de los árboles con tubefria PVC D=6" malla electrosoldada y concreto en zona de grecos | | Se realóo el suministro e instalación de juego en la zona infantil | |
| VILLA DE LOS ALPES | | ESTADIO OLAYA HERRERA | |
|  |  |  |  |
| Se realizo la instalación de los Biosaludable arregtados y pintados | | se realizo el suminaltro e instalación de las colchonetas para las base en concreto de las luminarias en la cancha de futbol | |
| ESTADIO OLAYA HERRERA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | N/A, | N/A |
| Suministro e instalación de forros para los bajos zona de graderia | | | |

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 22 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

(febrero.4..2024) al (febrero.10..2024)

1. **Datos Generales**

| PARQUE | Código: | Localidad: |
|---|---|---|
| | | Barrio: |

2. **Contrato de Obra**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

COP No. 3099-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ene-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.981.251.399,00 | $ 41.864.509,00 | $ 77.343.733,00 | 144.066.822,00 | 1.118.610.201,00 | | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.801,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | 36.103.096,00 | 280.323.716,00 | | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | 180.169.718,00 | 1.398.933.917,00 | | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.493,00 | 57.626.849,00 | 447.444.080,00 | | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | 122.543.069,00 | 951.489.837,00 | | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | 223.941.599,00 | 1.175.431.436,00 | | |

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

CI No. 3131-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-ene-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.863,00 | $ 65.419.199,00 | 67.863.654,00 | 103.448.492,00 | | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.848,00 | 12.894.094,00 | 19.655.213,00 | | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | 76.322.867,00 | 77.848.847,00 | 80.757.748,00 | 123.103.705,00 | | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.867,00 | $ 77.848.847,00 | 80.757.748,00 | 123.103.705,00 | | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | 8.075.775,00 | 12.310.371,00 | | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063.962,00 | 72.681.973,00 | 110.793.334,00 | | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | 211.436.515,00 | 322.229.849,00 | | |

4. 22 Fecha de corte: 45332

4.1. **Datos Generales**

| Nombre: | PRD- Muro aguas/Canchas sinte/Cerchas tanker/Administración | Código: | 12-091 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 60 # 63-75. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 320.267.357,00 | 2,35% | 28,00% | 40,00% | -14,00% | $ 128.106.942,80 |
| TOTAL | | 320.267.357,00 | | 28,00% | 40,00% | -14,00% | $ 128.106.942,80 |

444

| 4.2 | Datos Generales | Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Avenida Calle 63 # 59-45. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 672.133.668,00 | 6,43% | 32,00% | 29,00% | 3,00% | $ 252.918.783,14 |
| TOTAL | | 672.133.668,00 | | 32,00% | 29,00% | 3,00% | $ 252.918.783,14 |

| 4.3. | Datos Generales | Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 143.037.344,00 | 1,05% | 57,00% | 63,00% | -6,00% | $ 90.113.526,72 |
| TOTAL | | 143.037.344,00 | | 57,00% | 63,00% | -6,00% | $ 90.113.526,72 |

| 4.4. | Datos Generales | Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.496.096.259,00 | 11,02% | 16,00% | 24,00% | -8,00% | $ 359.063.102,16 |
| TOTAL | | 1.496.096.259,00 | | 16,00% | 24,00% | -8,00% | $ 359.063.102,16 |

| 4.5. | Datos Generales | Nombre: | Parque de los Novios | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Avenida Calle 53 # 45-10. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 184.173.532,00 | 1,36% | 6,00% | 19,00% | -13,00% | $ 34.992.971,08 |
| TOTAL | | 184.173.532,00 | | 6,00% | 19,00% | -13,00% | $ 34.992.971,08 |

| 4.6. | Datos Generales | Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Calle 89 A # 20-57. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 79.075.219,00 | 0,58% | 3,00% | 67,00% | -64,00% | $ 52.980.396,73 |
| TOTAL | | 79.075.219,00 | | 3,00% | 67,00% | -64,00% | $ 52.980.396,73 |

| 4.7. | Datos Generales | Nombre: | Parque Sucre o Niples | Código: | 02-019 | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | Calle 60 - Cra 7. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 97.866.625,00 | 0,72% | 39,00% | 85,00% | -46,00% | $ 83.186.631,25 |
| TOTAL | | 97.866.625,00 | | 39,00% | 85,00% | -46,00% | $ 83.186.631,25 |

4.8. Datos Generales

| Nombre: | Parque UD8 | Código: | | Localidad: | ENGATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 63 # 68 - 45 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.049.316.481,00 | 7,73% | 3,00% | 1,00% | 2,00% | $ 10.493.164,81 |
| TOTAL | | 1.049.316.481,00 | | 3,00% | 1,00% | 2,00% | $ 10.493.164,81 |

4.9. Datos Generales

| Nombre: | Parque San José de Bavaria | Código: | | Localidad: | SUBA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Ac.170 - Cra 65 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.536.645,00 | 0,19% | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.366,45 |
| TOTAL | | 25.536.645,00 | | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.366,45 |

4.10. Datos Generales

| Nombre: | Estadio Olaya Herrera | Código: | 18-207 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 35 #3-50 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 627.938.716,00 | 4,63% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 627.938.716,00 |
| TOTAL | | 627.938.716,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 627.938.716,00 |

4.11. Datos Generales

| Nombre: | Parque Ciudad Montes | Código: | 18-112 | Localidad: | PUENTE ARANDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 10 Sur #39-29 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 292.748.093,00 | 2,15% | 70,00% | 84,00% | -14,00% | $ 245.908.398,12 |
| TOTAL | | 292.748.093,00 | | 70,00% | 84,00% | -14,00% | $ 245.908.398,12 |

4.12. Datos Generales

| Nombre: | Parque Bosques de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Dirección. Cra. 13 a # 30-15 S. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 988.840.781,00 | 7,29% | 38,00% | 45,00% | -7,00% | $ 444.978.342,45 |
| TOTAL | | 988.840.781,00 | | 38,00% | 45,00% | -7,00% | $ 444.978.342,45 |

4.13. Datos Generales

| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Transversal 78K No. 41 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 47.732.299,00 | 0,35% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 47.732.299,00 |

114

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 47.732.299,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 47.732.299,00 |

4.14. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Laureles Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | CL 70 Bis Sur #80K-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 24.614.594,00 | 0,18% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 24.614.594,00 |
| TOTAL | | 24.614.594,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 24.614.594,00 |

4.15. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | CARRERA 6A | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 153.771.393,00 | 1,13% | 79,00% | 95,00% | -16,00% | $ 146.082.823,35 |
| TOTAL | | 153.771.393,00 | | 79,00% | 95,00% | -16,00% | $ 146.082.823,35 |

4.16. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Calle 52 Sur - Cra 97 C | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 46.088.512,00 | 0,34% | 0,00% | 100,00% | -100,00% | $ 46.088.512,00 |
| TOTAL | | 46.088.512,00 | | 0,00% | 100,00% | -100,00% | $ 46.088.512,00 |

4.17. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Primero de Mayo | Código: | 04-196 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | carrera 5 bis #17-14 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 532.805.951,00 | 3,93% | 19,00% | 50,00% | -31,00% | $ 268.402.975,50 |
| TOTAL | | 532.805.951,00 | | 19,00% | 50,00% | -31,00% | $ 268.402.975,50 |

4.18. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Nacional | Código: | | Localidad: | SANTA FE |
| Dirección: | Carrera 7 # 38 - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 101.000.192,00 | 0,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - |
| TOTAL | | 101.000.192,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - |

4.19. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Servita | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Calle 165 # 7 - 32 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 528.683.709,00 | 3,90% | 20,00% | 37,00% | -17,00% | $ 195.612.972,33 |
| TOTAL | | 528.683.709,00 | | 20,00% | 37,00% | -17,00% | $ 195.612.972,33 |

| 4.20. Datos Generales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Boyaca | Código: | | Localidad: FONTIBON |
| Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 98. | | | Barrio: |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 936.380.915,00 | 6,90% | 12,00% | 1,00% | 11,00% | $ 9.363.809,15 |
| TOTAL | | 936.380.915,00 | | 12,00% | 1,00% | 11,00% | $ 9.363.809,15 |

| 4.21. Datos Generales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | | Localidad: CHAPINERO |
| Dirección: | Calle 86 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 3,00% | 25,00% | -22,00% | $ 7.049.433,75 |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 3,00% | 25,00% | -22,00% | $ 7.049.433,75 |

| 4.22. Datos Generales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Fontanar del Rio | Código: | | Localidad: SUBA |
| Dirección: | Cle 145 # 138 A- 10 | | | Barrio: |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 399.999.719,00 | 2,95% | 3,00% | 6,00% | -3,00% | $ 23.999.983,14 |
| TOTAL | | 399.999.719,00 | | 3,00% | 6,00% | -3,00% | $ 23.999.983,14 |

| 4.23. Datos Generales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 08-063 | Localidad: TUNJUELITO |
| Dirección: | Cra.190 #52B-15. | | | Barrio: |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.083.858.342,00 | 7,99% | 60,00% | 72,00% | -12,00% | $ 760.376.568,24 |
| TOTAL | | 1.083.858.342,00 | | 60,00% | 72,00% | -12,00% | $ 760.376.568,24 |

| 4.24. Datos Generales | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Pradera | Código: | 15-040 | Localidad: ANTONIO NARIÑO |
| Dirección: | Cra. 31 #14B-57S. | | | Barrio: |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 868.515.423,00 | 6,40% | 42,00% | 60,00% | -18,00% | $ 521.109.253,80 |
| TOTAL | | 868.515.423,00 | | 42,00% | 60,00% | -18,00% | $ 521.109.253,80 |

4.25. Datos Generales

| Nombre: | Mirador Illimani | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra. 27b #1.1. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 220.195.135,00 | 1,62% | 45,00% | 39,00% | 6,00% | $ 85.876.102,65 |
| TOTAL | | 220.195.135,00 | | 45,00% | 39,00% | 6,00% | $ 85.876.102,65 |

4.26. Datos Generales

| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 152.660.187,00 | 1,12% | 5,00% | 46,00% | -41,00% | $ 70.223.686,02 |
| TOTAL | | 152.660.187,00 | | 5,00% | 46,00% | -41,00% | $ 70.223.686,02 |

4.27. Datos Generales

| Nombre: | Nuevo Muzo | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | 38 a 52a. Cra. 61B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 853.424.676,00 | 6,29% | 34,00% | 33,00% | 1,00% | $ 281.630.143,08 |
| TOTAL | | 853.424.676,00 | | 34,00% | 33,00% | 1,00% | $ 281.630.143,08 |

4.28. Datos Generales

| Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 08-241 | Localidad: | USME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 180.013.537,00 | 1,33% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 180.013.537,00 |
| TOTAL | | 180.013.537,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 180.013.537,00 |

4.29. Datos Generales

| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-067 | Localidad: | USME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra 5 Este # 5 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 42.314.778,00 | 0,31% | 3,00% | 34,00% | -31,00% | $ 14.387.024,52 |
| TOTAL | | 42.314.778,00 | | 3,00% | 34,00% | -31,00% | 14.387.024,52 |

4.30. Datos Generales

| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cle 67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.794.932,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.794.932,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | 10.794.932,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.794.932,00 |

**4.31.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-018 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 84.148.099,00 | 0,82% | 4,00% | 11,00% | -7,00% | $ 9.256.070,89 |
| TOTAL | | 84.148.099,00 | | 4,00% | 11,00% | -7,00% | 9.256.070,89 |

**4.32.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gilma Jiménez | Código: | 05-018 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 511.861.834,00 | 3,77% | 1,00% | 8,00% | -7,00% | $ 40.948.946,72 |
| TOTAL | | 511.861.834,00 | | 1,00% | 8,00% | -7,00% | 40.948.946,72 |

**4.33.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | | Localidad: | |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 38.597.968,00 | 0,28% | 2,00% | 8,00% | -6,00% | $ 3.087.837,44 |
| TOTAL | | 38.597.968,00 | | 2,00% | 8,00% | -6,00% | 3.087.837,44 |

**4.34** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gaitan Cortes | Código: | | Localidad: | |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

**5**

| | |
|---|---|
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

**6. OBSERVACIONES:**
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cual se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista el 05-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal el 09-02-2024.

**7.** Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | | Ambiental: | N/A | Intervención del Espacio Público | N/A |

**8.** Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

| CODENSA | | EAAB | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Informe 50% | | Informe 75% | | Informe 100% |

| **9.** | PAC 2023 | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se realizó recorrido en el parque con el apoyo e la supervisión del contrato donde se incluyeron nuevas actividades a ejecutar como: inclusión de otro módulo grecoromano, cambio de divisiones metalicas en los baño de mujeres, desmonte mantenimiento y pintura de los bioseludables, arreglo de fisuras en la placa de los bioseludables, pintura de materas azul por gris.
2.- PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Se debe revisar los elementos de la ruta de la vida, realizar el desmonte y suministro de marco y puerta zona de cafeteria.
3.- ESTADIO OLAYA HERRERA: Se realizó el suministro e instalación de las colchonetas para la base de los postes de iluminación de la cancha de futbol.
4.- PARQUE CIUDAD MONTES: Se terminó el cerramiento perimetral en la zona de la huerta sobre la Diag 16 B, se inicio el suministro e instalación de los portones metalicos de la zona de la huerta. Se debe terminar el lijado y pintura de los módulos de la ruta de la vida.
5.- PARQUE SIMON BOLIVAR: La cotización correspondiente a pintura para kioscos de comidas; tampoco se ha recibido.
6.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Esta pendiente el cambio de las luminarias de la zona del patinodromo.
7.- PARQUE SIMON BOLIVAR (CARBON): Se le ha solicitado al Contratista presentar la Cotización para la reparación de las instalaciones hidro sanitarias en baños del módulo El Carbón; no se ha recibido a la fecha.
8.- PARQUE ALTA BLANCA: Está pendiente por parte del contratista entregar el ajuste del item " pulida de piso en granito" de acuerdo con la última revisión de Interventoria.
9.- PARQUE CANAL BOYACA: Importante iniciar actividades ya que la programación ya empieza a reflejar atraso en este Escenario.
10.- PARQUE EL TUNAL: No se realizan actibvidades por lluvia.

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 05-003

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafeteria puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.
- Se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato electricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso.
- Actividades eléctricas realizadas al 98 %

RESANE Y PINTURA PORTERIAS:

- Se avanza con los trabajos en porteria #2 y #3

PISTA DE BMX:

- Se adecua zona de senderos en adoquin, se termina adecuacion de placas nuevas en concreto zona de juegos y zona del modulo de lectura y se procede al ensamble de modulo de lectura en sitio nuevo.

ZONA DE GIMNASIOS

- Se avanza con el mantenimiento de la zona de gimnasio # 2

- PARQUE ILUMANI:

- Se avanza en la adecuacion del modulo de baños en el taller, se hace aseo por debajo del modulo y se inician trabajos hidrosanitarios

- PARQUE EQUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalacion de enchapes nuevos en baños de coliseo y se termina la instalacion de bioseludables ya restaurados y pintados

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalacion de geotextil sobre la excavacion de la pista de patinaje en asfalto y la instalacion de subbases .
- llegan al frente de fragua bordillos y cañuelas.
- Se avanza con el mantenimientos hidrosanitario de los baños del coliseo, se inicia la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos
- Actividades realizadas al 100 %

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.
- Actividades eléctricas realizadas al 100 %

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con la instalacion de equipamiento urbano y el mantenimiento de cajas de inspeccion y senderos.

- PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

- PARQUE VIRREY SUR:

- Se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100%
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 16-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Se realiza revisión de las divisiones metalicas instalados en los baños de hombres y mujeres.
- Se realizó pintura con vinilo dentro de los baños de hombres y mujeres.

ZONA JUEGOS INFANTILES

- Se realizo la instalación de juego infantil.

ZONA BIOSALUDABLES

- Los biosaludables se encuentran en taller donde se les esta realizando su repectivo mantenimiento y pintura.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realiza la colocalón de tubo PVC D=6" sobre la raiz del árbol paras u correspondiente protección.
- Se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto sobre la tuberia PVC de D=6".

- En esta parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades terminadas la 100.00%
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizaran actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por erl IDRD

- Actividad eléctrica realizadas en el parque 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

ZONA DE LA HUERTA CERRAMIENTO.

- Se termina la instalación de los módulos en malla eslabonada h=2,5 mts, por la Diag. 16 Sur en zona de la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Diag 16 S.
- Se realiza el desmonte e instalación del portón metalico entrada a la huerta.
- Se realizan retoques de pintura en los puntos de soldadura de las mallas de cerramiento sobre la Cra 40.

ZONA RUTA DE LA VIDA

- Se continua con las actividades de fijado metálico en los módulos.
- Se inicia pintura de los módulos ruta de la vida.

- Actividad eléctrica realizada al 100%

ZONA ENTRADA AL PARQUE

- Se realizo revisión sobre la cubierta entrda al parque donde se presenta goteos para verificvar los arreglos a realizar.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

BIOSALUDABLES

- El contratista realizó la instalación de los Biosaludable que estaban en taller en mantenimiento y pintura.

MODULO M-6 (COLUMPIOS)

- Se realiza la revisión por parte de interventoría de los retoques de pintura solicitados en los modulos de juegos M-6 (Columpios). .

RUTA DE LA VIDA

- Se aplico pintura en los módulos ruta de la vida.

COLISEO

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD.

- Parque totalmente terminado
- Se realizó el Acta de puesta en servicio.
- En este Estadio no se realizó actividad eléctrica. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Se realizó el suministro e instalación de las colchonetas en la base en concreto de las bases luminarias cancha de futbol.
- Se realizó el suministro e instalación de los forros para tapar los bajos ubicados en las gradarias del estadio.
- En este Estadio se realizó actividad eléctricas al 100,00%

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Finaliza mantenimiento de adoquín en área interna del parque.
- Termina la aplicación de pintura e instalación de vinilos en la señalética.
- Instalación del protector metálico tipo M-00 del árbol circular - 2 unidades.
- Cambio vinilo señal IDG-6 Son 12 unidades.
- Se termina la limpieza del cárcamo
- Reparación de piso en adoquín (reemplazo de elmentos ).
- Cambio de rejillas en concreto para cárcamo.
- Desmonte y reinstalación de losata tipo IDU

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se inicia traslado de material para relleno al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Finaliza la limpieza y el lavado al interior de los tanques sépticos en muros y piso, con equipos especiales.
- Se inicia la retapada, sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos.
- Se tiene programado para la próxima semana, el inicio de la instalación de la pollurea en muros internos.
- Retiro de a gravilla/filtro existente en el compartimiento del tanque séptico.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Se termina el enchape en cerámica al interior de los baños de hombres y mujeres.
- En construcción la última caja de inspección, la cual vierta las aguas al pozo séptico.
- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø= 6".
- Se termina el enchape en cerámica en los baños donde se realizó cambio de fluxómetros de sanitarios.

En el Sector del lago

- Se avanza con la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos. 60% de avancce.
- Por costado norte y occidental (paralelo a la Av. 68), se termina la aplicación de pintura de dos kioscos de comidas y se continúa con la el kiosco ubicado frente al Templete.
- Lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se continuan realizando las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres.
- Terminan las prolongaciones con tubería de 1 1/4", agua potable; se realizan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Finaliza la Nivelación y sarlado de la base granular.
- Continúa la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Continúa la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Ensayo de densidades para la capa de base granular compactada; resultados satisfactorios.
- Liberación de la base granular.
- Imprimación de la base granular con emulsión asfáltica.
- Inicio de reparación para el muro que presenta la fisura.

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza el montaje e instalación de la estructura metálica, para el cielorraso en PVC para la oficina.
- Inicio de la colocación de las láminas de PVC, para el cielorraso en Area administrativa.

PRD - UCAD

- Reunión con el Administrador del UCAD, para coordinar y socializar el inicio de actividades en el Restaurante del UCAD
- Inicio de actividades en los baños del Restaurante - cielorraso. El material está en la obra.

PRD- Cancha de baloncesto

- Inicio de excavación para retiro de capa de base granular existente de 20 cm. Se acuerda disponer este material para ser reutilizado como relleno en el Parque Simón Bolivar (áreas externas de los tanques sépticos).
- Retiro de agua que ha sido producto de las lluvias que han ocurrido en la presente semana.

PRD- Cancha de Hockey

- En la cancha de hockey se instala y alambra el tablero de circuitos.

• PARQUE DE LOS NIÑOS

- Continúan las excavaciones manuales para instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur; cargue, transporte y retiro del material fuera de la obra.
- Avance en la excavación para pilotes ubicados en el perímetro de las canchas. Excavación para conformar el tramo de sendero por costado occidental.
- Amarre de hierro para viga de cimentación por costados sur y oriental.
- Continúa la figuración de hierro para canastillas de los pilotes.
- Finaliza la construcción del pozo de alcantarillado de aguas lluvias. Por disposiciones técnicas y constructivas de la obra, se aprueba en comité de obra la construcción de otro pozo de alcantarillado de aguas lluvias, el cual será el que capte finalmente todas las aguas de las canchas; adicionalmente efectuar la conexión de las canchas de arena existentes a la red, ya que actualmente carecen de una tubería de drenaje.
- Terminan las excavaciones para instalación de tuberías de 6", por costrado norte.
- Continúa la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Liberación por la interventoría de aceros de refuerzo para pilotes y viga, con el fin de aprobar la fundida de elementos en concreto.
- Fundida en concreto de tramo de concreto ciclopeo bajo viga de cimentación con refuerzo 30x30 cm
- Fundida en concreto de tramo de viga de cimentación en concreto 30x30 cm
- Toma de muestras para ensayos de la resistencia de los concretos llegados a la obra procedentes de planta. - Control de asentamientos en obra.

• PARQUEADERO DE LOS NIÑOS

- Finaliza la reconstrucción de pozo de alcantarillado de A. lluvias.
- Se realiza la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Se le hace la observación al Contratista de protegar adecuadamente y sellar las capas de la estructura que conforma el pavimento (subbase ), para no afectar la subrasante, principalmente por efecto de las lluvias que han ocurrido durante la semana.
- a evidenció que a los pozos existentes, les drena agua procedente de las edificaciones próximas al parqueadero; además una de las redes se encontró taponada con sedimentos de piedra de grandes proporciones que no dejaban pasar el agua al pozo de alcantarillado.
- Se sondea y revisa estado de taponamiento de la tubería entre pozos de red de alcantarillado de aguas lluvias en el parqueadero.

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Avance con la aplicación de pintura en el módulo de administración y baños.
- Termina la demolición de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños.
- Se realiza reunión con los Administradores del Complejo Acuático y del Parque de los Novios, para coordinar retiro de escombros y acceso de los materiales para las construcciones que se adelantan en el Escenario; esto obedece a la dificultad de poder disponer los materiales y equipos en el sitio de intervención.
- En el Tunel del Amor, se terminan las excavaciones para construir los pedestales que irán en concreto reforzado.
- Avanza la figurada de acero de refuerzo de los pedestales.

• FONTANAR DEL RIO

- Comité de Obra semanal celebrado en las instalaciones del CEFE, recorrido e inspección de obra.
- Inicio de retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida .
- Se define el sitio donde se construirá el Parkour.

• PARQUE SERVITA

- Instalación de lámparas Ledvance en cancha múltiple.
- Inicio en el mantenimiento desagues de lavamanos en baños.

• CANAL RIO NEGRO

- Aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Se le aplican puntos de soldadura a la puerta metálica que se encuentra suelta y que se está cayendo.
- Desmonta y retiro malla eslabonada en la parte baja sobre los tres módulos del cerramiento contraimpacto, la cual está deteriorada.
- Instalación de nueva malla eslabonada en la parte baja sobre los tres módulos del cerramiento contraimpacto.

• PARQUE ALTABLANCA

- Finaliza instalación y pulida en granito en los tramos de la pista de patinaje que estaban en mal estado.
- Termina la aplicación de pintura en cocineta y cornizas de techo en oficina y sala de reunión.
- Pendiente cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Limpieza de canales en la cubierta del edificio administrativo por costado sur.
- En Comité de obra, se acuerda solicitarle al Contratista presupuesto para poder pulir la totalidad de la pista de velocidad de este Escenario.

• CANAL BOYACA

- Reunión de socialización con la Comunidad del Sector, con la participación de la Cordinación del IDRD, el Contratista y la interventoría..

• VIRREY CHICO

- Se realiza el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se realiza el desmonte de bancas para realizar el cambio.

• UDS

- En los baños del velódromo se realizan las regatas para identificar daños de los puntos hidráulicos y realizar el listado de los materiales necesarios.
- Inicio de actividades con el cambio de un fluxómetro de palanca para baño.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 10 de febrero de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 10-02-2024 | 41.00 | 39.00 | - 2.00 |
| | | | |

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 10-02-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 41,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 39,00%, reflejando un atraso en la Programación de las Obras del - 2.00%,. Este atraso puede ser causal de un presunto incumplimiento del contrato celebrado entre las partes. Se le ha solicitado al Contratista implementar todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que están a su alcance para que se ponga al día, y así evitar mayores atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por este incumplimiento.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con ocho (8) parques. Cautro (4) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Laureles Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir), los cuales ya se encuentren terminados al 100,00% . dos (2) parques con actividades significativas (Parque Ciudad Montes, Parque Villa de los Alpes) con un avance superior al 80%, Los Parques (Primero de Mayo y Parque Bosque de San Carlos) con un avance superior del 44%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con trece (13) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippies) tiene un porcentaje de ejecución del 65%, los (Parque Servita y PRD) tiene porcentajes superiores la37 %, los parques (Simón Bolivar, Parque Los Niños, Parque Virrey Norte y Parque Los Novios) cuentan con porcentajes superiores al 20%, los parques (Novios, Niños y Canal Río Negro ) cventan con porcentajes superiorers al 30, los parques (Servita y Virrey Norte) cuentan con porcentajes por encima del 11%, mientras que los parques (Canal Boyaca, fontanar y UDS) cuentan con porcentajes bajos ya que hasta ahora se estan iniciando.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parque (Palestina, Cayetano) ya se encuentran terminados al 100%, los parques (Tunal y La Fregua) presntan un avance superior al 60 %, los parques (Eduardo Santos, Illimani, Nuevo Muzu y Villa Alemana) presnetan porcentajes superiores al 33%, y los parques (Virrey Sur La Victoria y Gilma Jimenez) presenetn porcentajes bajos superiores del 6%. ya que hasta ahora se estan iniciando.

**COMPONENTE SST**

- Verificación de Documentos personal (Ingreso)
- Recorridos a los Parques Activos

Actividades del Contratista

- Capacitación de Inspección de herramientas.
- Entrega de EPP (botas de caucho)
- Permiso de trabajo en alturas
- Inspección de arnés
- Limpieza de Baños y Limpieza en obra
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

**COMPONENTE AMBIENTAL**

- Durante el periodo de reporte se realizó la revisión por parte de la Interventoría de la segunda (2) versión del informe mensual No. 6 del contratista
- Revisión y verificacipon de las Acta de mobiliario presentadas por el Contratista de obra.
- Se recuerda alcontratista la entrega de los reportes de RCD, los cuales deben venir consignados en los informes mensuales.

**COMPONENTE DE CALIDAD**

- El contratista emite vieron 0.1 del informe N°5 el cual no cuenta con la atención de las observaciones iniciales por tanto se devuelve para corrección
- Se realiza la programación de contramuestra correspondientes a adoquines, base y subbase granular
- Se reitera la solicitud de entrega de las fichas técnicas de bioseluatables y juegos instalados y pendientes por instalar
- Se recibe respuesta de Marshall 1350 con soportes de pavi obras
- El contratista informa que se realizara cambio de cantera a recicladas industriales, por lo tanto, se solicita se realice la entrega de las caracterizaciones iniciales previo al ingreso de material a los frentes de obra
- Se informa al contratista que todos los certificados, fichas técnicas, resultados de laboratorio deben ser entregados a interventoría con la firma de director de obra, residente de frente y profesional de calidad
- Se envían revisiones reiterando las antes emitidas correspondiente a las actas de dada de baja entregadas por el contratista
- Se solicita realizar entrega del ensayo de la arena Peldar
- Se realiza acompañamiento de auditoría interna de calidad realizada por el contratista haciendo visita de obra a los parques EL TUNAL, BOSQUES DE SAN CARLOS y PARQUE DE LOS NIÑOS

Se realiza revisión del listado de materiales presentado por el contratista el cual no cuenta con reporte de la totalidad de materiales faltando reporte de adoquín, arena, grava, subbase granular, base granular, concretos premezclado y hecho en obra, geotextil, por lo cual se requiere por medio de oficio su actualización con proveedor correspondiente


**COMPONENTE SOCIAL**

- Atención ciudadana se recepcionan PQRS: señor Dario Corral por afectación amuable en acaro , está en seguimiento ( Parque Simón Bolívar , sector central ) .
- El viernes 6 de febrero: acercamiento a la administradora del Parque Bosques de San Carlos, para informar sobre nuevas actividades.

**INFORME ANTICIPO**


ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA


Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 05 al 09 de febrero de 2024 se describen a continuación:
La Interventoría informa que a la fecha ya se encuentra desembolsado el total del anticipo, y se encentra a la espera de legalización de las ordenes de operación aprobadas.



**REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO**

| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) |
|---|---|






se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4.


PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN )





se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4.

PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR )






se avanza con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias

PARQUE TUNAL (PISTA BMX )






Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetaria puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.

PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN )





se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4.




PARQUE TUNAL ( PORTERIAS )





se terminen los trrabajos de resane y pintura de porteria # 1, se avanza en porteria #4, se inician trabajos en porteria #2.

PARQUE TUNAL (GIMNASIO)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con la instalacion de asfalto en zona de llagada y co trabajos complementarios de mantenimiento y adecuacion de la plata y su contorno existente. | | se termine y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1 | |
| PARQUE ILLIMANI | | PARQUE EDUARDO SANTOS | |
|  |  |  |  |
| =C433-se avanza en la adecuacion del mdulo de baños | | - se avanza con la reinstalacion de enchape en baños de coliseo y la instalacion de biosaludables ya restaurados. | |
| PARQUE LA FRAGUA | | PARQUE LA FRAGUA | |
|  |  |  |  |
| - se avanza con la instalacion de geotextil en la excavacion de la plata de patinaje en asfalto. | | - se hace entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes. | |
| PARQUE NUEVO MUZU | | PARQUE VILLA ALEMANA | |

476







- se avanza con la fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.


PARQUE LA VICTORIA





- se realiza la reunion de socializacion de las actividades a realizar y acta de inicio.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS






se realiza instalación de pintura vinilo en pared dentro de los baños de hombres y mujeres

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS








- se avanza con la actividade de fundida de tapas de cajas de inspeccion e instalacion de equipamiento urbano.

PARQUE VIRREY SUR



se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS








Suministro e instalación de Pintura de Biosaludables en taller





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS







| | |
|---|---|
| Suministro e instalación de divisiones en acero baño de mujeres. | Suministro e instalación juego infantil zon amedis luna |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |
|   |   |
| Suministro e instalación de tubería PVC D=8" para protección raices de árboles | Corta y reparación de placa piso en zona de Biosaludables |
| VILLA DE LOS ALPES | VILLA DE LOS ALPES |
|   |   |
| Se realizo la instalación de los Biosaludable arregtados y pintados | Se realizó la instalación de pintura en los módulos ruta de la vida |
| ESTADIO OLAYA HERRERA | ESTADIO OLAYA HERRERA |
|   |   |
| Suministro e instalación de colchonetas para protección bases de concreto luminarias cancha de furbol | Suministro e instalación de forros para los bajos zona de graderia |
| CIUDAD MONTES | CIUDAD MONTES |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Suministro e instalación módulos malla de cerramiento Diag 18 S. | | Suministro e instalación de portón entrada posterior costado norte | Suministro e instalación de portón entrada a la huerta costado sur. |
| CIUDAD MONTES | | CIUDAD MONTES | |
|  |  |   |   |
| Lijado estructuras módulo ruta de la vida | | Revisión estado inicial cubierta entrada del parque. | |
| PARQUE ALTABLANCA | | PARQUE ALTABLANCA | |
|  |  |  |  |
| Recuperación de placa en granito pulido +dilatación en la pista de patinaje - área de velocidad. | | Pendiente instalación de las rejillas del cárcamo que estaban averiadas. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE LOS NOVIOS | |



Fijación de la malla eslabonada a la estructura metálica, con platinas y la aplicación de soldadura


PARQUE LOS NIÑOS






Excavación para zapatas en el sitio donde se ubicará el módulo de los baños.

PARQUEADERO LOS NIÑOS



Inicio excavaciones para pedestales en el Tunal del Amor.



Armare de hierro, armado, formaletas y acodalado de viga y pilotas.

PARQUE LOS NIÑOS





Suministro del concreto en mixer.

PARQUE LOS NIÑOS





Toma de muestras del concreto para estudios.


PARQUE SUCRE O HIPPIES






Excavación para conformar sendero por costado occidental.

PARQUE SUCRE O HIPPIES



Construcción de caja de inspección en sendero.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Reparación de piso en adoquín (reemplazo de elementos que están en mal estado o dañados). | | Instalación de rejillas para cárcamo. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Instalaciones hidrosanitarias en los baños de mujeres | Arreglo del desague en lavaplatos de la cocina del Módulo Maná. | Equipos para limpieza al interior de los tanques sépticos. | Equipos para limpieza al interior de los tanques sépticos. |
| PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Aplicación de la subbase granular- compactación con equipo mecánico. | | Transporte de materiales. | Pozo de alcantarillado que se encontraba tapado en el interior.. |
| FONTANAR DEL RIO | | FONTANAR DEL RIO | |



Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños.

SERVITA





Selección del sitio donde se ubicará el Parkourt

CANAL BOYACA



Comité de obra semanal.



Arreglo desagues de lavamanos



Conexiones eléctricas para alumbrado de lámparas en postes.

VIRREY CHICO





Reunión de socialización con la Comunidad.

VIRREY CHICO





Juegos existantes en el área perimetral



Desmonte de bancas y canecas





Desmonte d e canecas



BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 23 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

febrero 11, 2024 al febrero 17, 2024

1. Datos Generales — PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra — COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.981.251.399,00 | $ 41.864.508,00 | $ 77.343.733,00 | $ 144.066.622,00 | $ 1.118.610.261,00 | | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.248,00 | $ 19.382.339,00 | $ 36.103.096,00 | $ 280.323.716,00 | | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.756,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.493,00 | $ 57.626.649,00 | $ 447.444.080,00 | | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | | |

3. Contrato de Interventoría — CI No. 3131-2023

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.663,00 | $ 65.419.199,00 | $ 67.863.654,00 | $ 103.448.492,00 | | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | $ 12.894.094,00 | $ 19.655.213,00 | | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | $ 8.075.775,00 | $ 12.310.371,00 | | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.380,00 | $ 70.063.962,00 | $ 72.681.973,00 | $ 110.793.334,00 | | |
| | | $ 68.690.380,00 | $ 138.754.542,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | | |

4. 23 Fecha de corte: febrero 17, 2024

4.1. Datos Generales — Nombre: IRD" Mural Agasajo Hamacas Sendu/Canchas Hockey/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 83-75 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 311.705.259,49 | 2,30% | 41,00% | 57,00% | -16,00% | $ 177.723.297,91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 311.785.259,49 | | 41,00% | 57,00% | -16,00% | $ | 177.723.297,91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 Datos Generales | Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ | |
| | Dirección: | Avenida Calle 63 # 68-45 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 869.358.406,44 | 5,41% | 69,00% | 48,00% | 21,00% | $ 417.292.515,09 |
| TOTAL | | 869.358.406,44 | | 69,00% | 48,00% | 21,00% | $ 417.292.515,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. Datos Generales | Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN | |
| | Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 154.101.031,40 | 1,14% | 77,00% | 93,00% | -16,00% | $ 143.313.959,20 |
| TOTAL | | 154.101.031,40 | | 77,00% | 93,00% | -16,00% | $ 143.313.959,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Datos Generales | Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | Avenida Carrera 53 # 80-80 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.426.787.312,96 | 10,51% | 28,00% | 35,00% | -7,00% | $ 499.375.559,54 |
| TOTAL | | 1.426.787.312,96 | | 28,00% | 35,00% | -7,00% | $ 499.375.559,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. Datos Generales | Nombre: | Parque de los Novios | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS | |
| | Dirección: | Avenida Calle 63 # 45-10 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.512.436,02 | 1,58% | 15,00% | 41,00% | -26,00% | $ 87.950.098,77 |
| TOTAL | | 214.512.436,02 | | 15,00% | 41,00% | -26,00% | $ 87.950.098,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. Datos Generales | Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO | |
| | Dirección: | Calle 89 A # 20-57 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 79.062.034,43 | 0,58% | 18,00% | 93,00% | -77,00% | $ 73.527.992,02 |
| TOTAL | | 79.062.034,43 | | 18,00% | 93,00% | -77,00% | $ 73.527.992,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7. Datos Generales | Nombre: | Parque Buore o Hipolas | Código: | 02-019 | Localidad: | CHAPINERO | |
| | Dirección: | Calle 80 - Cra 7 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 115.668.151,09 | 0,85% | 49,00% | 96,00% | -47,00% | $ 111.039.505,05 |
| TOTAL | | 115.668.151,09 | | 49,00% | 96,00% | -47,00% | $ 111.039.505,05 |

| 4.8. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque UD8 | Código: | | Localidad: | ENGATIVA |
| Dirección: | Calle 63 # 68 - 45 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.033.341.233,11 | 7,61% | 12,00% | 70,00% | -58,00% | $ 723.338.863,18 |
| TOTAL | | 1.033.341.233,11 | | 12,00% | 70,00% | -58,00% | $ 723.338.863,18 |

| 4.9. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque San José de Bavaria | Código: | | Localidad: | SUBA |
| Dirección: | Ac 170 a Cra 55 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,03 | 0,19% | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.272,65 |
| TOTAL | | 25.527.265,03 | | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.272,65 |

| 4.10. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Estadio Olaya Herrera | Código: | 18-207 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| Dirección: | Cl. 35 #3-50 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 633.221.524,98 | 4,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 633.221.524,98 |
| TOTAL | | 633.221.524,98 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 633.221.524,98 |

| 4.11. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Ciudad Montes | Código: | 18-112 | Localidad: | PUENTE ARANDA |
| Dirección: | Cl. 10 Sur #39-29 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 293.631.774,68 | 2,16% | 65,00% | 90,00% | -25,00% | $ 264.268.597,21 |
| TOTAL | | 293.631.774,68 | | 65,00% | 90,00% | -25,00% | $ 264.268.597,21 |

| 4.12. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Bosques de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| Dirección: | Dirección Cra. 13 a # 30-15 S | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 985.049.225,87 | 7,25% | 38,00% | 47,00% | -9,00% | $ 482.973.137,57 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 865.649.228,67 | | 38,00% | 47,00% | -9,00% | $ 482.973.137,57 |

4.13. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
| Dirección: | Transversal 78K No. 41 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 66.643.578,47 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.643.578,47 |
| TOTAL | | 66.643.578,47 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.643.578,47 |

4.14. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Laureles Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cl. 70 Bis Sur #60k-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.843.251,73 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 25.843.251,73 |
| TOTAL | | 25.843.251,73 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 25.843.251,73 |

4.15. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | CARRERA 5A | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 153.730.679,06 | 1,13% | 99,00% | 99,00% | 0,00% | $ 152.193.570,27 |
| TOTAL | | 153.730.679,06 | | 99,00% | 99,00% | 0,00% | $ 152.193.570,27 |

4.16. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Calle 62 Sur - Cra 97 C | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 46.088.453,14 | 0,34% | 15,00% | 100,00% | -85,00% | $ 46.088.453,14 |
| TOTAL | | 46.088.453,14 | | 15,00% | 100,00% | -85,00% | $ 46.088.453,14 |

4.17. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Primero de Mayo | Código: | 04-196 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | carrera 5 bis #17-14 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 612.636.037,23 | 4,51% | 40,00% | 70,00% | -30,00% | $ 428.845.226,06 |
| TOTAL | | 612.636.037,23 | | 40,00% | 70,00% | -30,00% | $ 428.845.226,06 |

4.18. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Nacional | Código: | | Localidad: | SANTA FE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 7 # 38 - 10 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Ejecución Acumulado %/Total | Prog. %/Total | Real Prog. | Diferencia Real | % Inversión Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 41.000.192,00 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ | - |
| TOTAL | | 41.000.192,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ | - |

4.19. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Servita | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Calle 155 # 7 - 32 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 544.898.483,12 | 4,01% | 40,00% | 70,00% | -30,00% | $ | 381.427.524,18 |
| TOTAL | | 544.898.483,12 | | 40,00% | 70,00% | -30,00% | $ | 381.427.524,18 |

4.20. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Boyacá | Código: | | Localidad: | FONTIBON |
| Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 98 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 954.741.354,02 | 7,03% | 25,00% | 10,00% | 15,00% | $ | 95.474.135,40 |
| TOTAL | | 954.741.354,02 | | 25,00% | 10,00% | 15,00% | $ | 95.474.135,40 |

4.21. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | | Localidad: | CHAPINERO |
| Dirección: | Calle 85 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 28.197.735,02 | 0,21% | 23,00% | 35,00% | -12,00% | $ | 9.869.207,26 |
| TOTAL | | 28.197.735,02 | | 23,00% | 35,00% | -12,00% | $ | 9.869.207,26 |

4.22. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Fontanar del Río | Código: | | Localidad: | SUBA |
| Dirección: | Cll 145 B 139 A - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,33 | 3,74% | 2,00% | 8,00% | -6,00% | $ | 40.649.547,31 |
| TOTAL | | 508.119.341,33 | | 2,00% | 8,00% | -6,00% | $ | 40.649.547,31 |

4.23. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 08-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Cra 19D # 52B - 15 | | | Barrio: | |

| Ppto. | % Ejecución Acumulado |
|---|---|

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.158.419.102,67 | 6,54% | 82,00% | 85,00% | -3,00% | $ 984.656.237,27 |
| TOTAL | | 1.158.419.102,67 | | 82,00% | 85,00% | -3,00% | $ 984.656.237,27 |

| 4.24. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO | |
| Dirección: | Cra. 31 #148-57S. | | | Barrio: | | |

| | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | $ 876.915.651,93 | 5,46% | 59,00% | 68,00% | -9,00% | $ 596.302.643,31 |
| TOTAL | 876.915.651,93 | | 59,00% | 68,00% | -9,00% | $ 596.302.643,31 |

| 4.25. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Minuto Bimani | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR | |
| Dirección: | Cra. 27b #1-1 | | | Barrio: | | |

| | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | $ 224.051.965,92 | 1,65% | 61,00% | 61,00% | 0,00% | $ 136.671.609,21 |
| TOTAL | 224.051.965,92 | | 61,00% | 61,00% | 0,00% | $ 136.671.609,21 |

| 4.26. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES | |
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | | |

| | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | $ 163.358.078,34 | 1,20% | 35,00% | 60,00% | -25,00% | $ 98.014.845,80 |
| TOTAL | 163.358.078,34 | | 35,00% | 60,00% | -25,00% | $ 98.014.845,80 |

| 4.27. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO | |
| Dirección: | 38 a 52a, Cra. 61B | | | Barrio: | | |

| | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | $ 845.416.498,41 | 6,23% | 53,00% | 60,00% | -7,00% | $ 507.249.899,05 |
| TOTAL | 845.416.498,41 | | 53,00% | 60,00% | -7,00% | $ 507.249.899,05 |

| 4.28. Datos Generales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Ceysitano | Código: | 06-241 | Localidad: | USME | |
| Dirección: | | | | Barrio: | | |

| | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | $ 199.051.304,57 | 1,47% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 199.051.304,57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 199.051.304,57 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 199.051.304,57 |

4.29. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra 5 Este # 5 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 43.022.595,02 | 0,34% | 45,00% | 45,00% | 0,00% | $ 20.665.167,78 |
| TOTAL | | 43.022.595,02 | | 45,00% | 45,00% | 0,00% | 20.665.167,78 |

4.30. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cll 67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,08 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.797.573,08 |
| TOTAL | | 10.797.573,08 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.797.573,08 |

4.31. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.564,53 | 0,67% | 15,00% | 23,00% | -8,00% | $ 20.954.739,84 |
| TOTAL | | 91.107.564,53 | | 15,00% | 23,00% | -8,00% | 20.954.739,84 |

4.32. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gilma Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 423.185.333,00 | 3,12% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | $ 105.796.334,75 |
| TOTAL | | 423.185.333,00 | | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 105.796.334,75 |

4.33. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | | Localidad: | |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | % Ejecución Acumulado Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 50.851.448,77 | 0,37% | 35,00% | 30,00% | 5,00% | $ 15.255.434,03 |
| TOTAL | | 50.851.448,77 | | 35,00% | 30,00% | 5,00% | 15.255.434,03 |

4.34 Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gaitan Cortes | Código: | | Localidad: | |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

5

| | |
|---|---|
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

**6. OBSERVACIONES:**
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista el 05-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal el 09-02-2024.

7. Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | | Ambiental: | N/A | Intervenalón del Espacio Público | N/A |

8. Servicios Públicos:

| | CODENSA | | EAAB | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONOS | N/A | Informe 50% | | Informe 75% | | Informe 100% |
| DAMA | | | | | | |

| 9. PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se solicita continuar con las actividades constructivas en la zona de los grecoromanos y ruta de la vida, instalación de juegos infantiles e instalación del piso caucho. se deben agilizar los mantenimientos de los Biosaludables que estan en taller para ser instalados.
2.- PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Este parque esta listo para terminar solamengte esta pendiente realizar el desmonte y suministro de marco y puerta zona de cafeteria y retioque en los biosaludables instalados
3.- PARQUE CIUDAD MONTES: Se esta realizando el suministro e instalación de los portones metalicos de la zona de la huerta. se esta realizando el lijado y pintura en la zona ruta de la vida, por solicitud del apoyo a la supervisión se debe realizar el mantenimiento de la cubierta de la entrada al parque.
4.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad.
5.- PARQUE CANAL BOYACA: Importante realizar actividades para que la programación no comience fiejar atraso.
6.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con adelanto con respecto a lo proyectado vrs lo ejecutado debido al progreso en instalación de adoquin nuevo y en mantenimiento y pintura en Grecos 1, 2, y pista de BMX, atraso sin perjuicio en lo programado en la entrega de a casa del adulto mayor Terminada.
7.- PARQUE FRAGUA: Lleva adelanto en cuanto a las actividades eléctricas y en la aplicación de subbases compactas de la pista de patinaje.
8.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Lleva adelanto con respecto a la programación, pero deberia estar ya estar terminando los baños de coliseo, que fue un compromiso con la administración del parque y ya se deberia estar terminado la zona de biosaludables, actividad que ha estado quieta en estas dos ultimas semanas
9.- PARQUE MIRADOR ILLAMINI: Refleja atraso en cuanto que el modulo de baños es el que mas pesa en el presupuesto y en este No se han comenzado actividades en sitio.
10.- PARQUE NUEVO MUZU: Presenta un leve adelanto debido a el rendimiento de esta semana en la pintura del piso de la zona de juegos y el inicio de la instalación de juegos en la misma zona.
11.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Refleja adelanto debido al rendimiento en la actividad de mantenimiento y pintura de juegos infantiles y aparatos biosaludables
12.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Esta pendiente el cambio de las luminarias de la zona del patinodromo,
13.- PARQUE SIMON BOLIVAR (CARBON): Se le ha solicitado al Contratista presentar la Cotización para la reparación de las instalaciones hidro sanitarias en baños del módulo El Carbón; no se ha recibido a la fecha.
14.- PARQUE ALTA BLANCA: Está pendiente por parte del contratista entregar el ajuste del Item " pulida de piso en granito" de acuerdo con la última revisión de interventoria.

525

11. INFORME TÈCNICO

L- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÒD: 09-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se continua con la instalación del adoquin nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafatería puerta # 4. se avanza con la instalación de piezas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos.

SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO

- Se avanza con el remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquin reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4, se funden rampas en concreto en plazoleta de eventos.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias, se pintan rejas de ventanas y puertas de paso, se hacen aseos de los espacios para su respectiva puesta en servicio.

ZONA DE PORTERIAS:
se terminan trabajos de pintura en portería #2, esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta , se avanza con los trabajos de estuco y pintura en portería #3

- se avanza con la instalacion de estructura de fachada verde en la portería #1.

PISTA DE BMX:

- se continuna con los remates de asfalto, demarcacion y con la evacuacion de obeservaciones plantaadas por la liga de bmx, durante la reunion del dia lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administracion, el idrd, el contratista y la interventoria, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

ZONA DE GIMNASIOS

- Se avanza con el mantenimiento de la zona de ginasio # 2

- PARQUE ILLIMANI:

- Se avanza en el mantenimiento de senderos en adoquin de concreto y aseo por debajo del modulo de baños.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con la reinstalacion de enchapes nuevos en baños de coliseo, se inicia la instalacion de divisiones en los sanitarios e instalacion de puertas de ingreso a baños de coliseo.

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque.
- Se avanza con la instalacion de bases compactas sobre la excavacion de la pista de patinaje
- -Se avanza con la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos hidrosanitarios en los baños de coliseo

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se adecua zona de senderos en adoquin, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de modulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalacion de juegos infantiles.

- Se avanza con los arreglos hidrosanitarios en los baños del coliseo

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con el mantenimmiento de cajas de inspeccion y remates de senderos en adoquin.

- PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

- PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100%

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

ZONA JUEGOS INFANTILES

ZONA BIOSALUDABLES

- Se realiza corte en placa piso donde estaban las fisuras.
- Se barre bien y se coloca malla electrosoldada.
- Se realiza instalación de Sikadur 32 Primer
- Se realiza la colocación de concreto.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realiza el armado de hierro y flejes para la viga zarpa.

- En este parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades terminadas la 100.00%
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD

- Actividad eléctrica realizadas en el parque 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

ZONA DE LA HUERTA CERRAMIENTO.

- Se realiza el desmonte e instalación del portón metalico entrada a la huerta.
- Se realiza la instalación de portones metalicos entrada a la huerta costado norte y sur.
- Se realiza entrega con Acta de los portones viejos y en mal estado al administrador del parque y a la comunidad por solicitud del IDRD.

ZONA RUTA DE LA VIDA

- Se continua con las actividades de lijado metálico en los módulos.
- Se inicia pintura de los módulos ruta de la vida.

- Actividad eléctrica realizada al 100%

ZONA ENTRADA AL PARQUE

- Se realizó revisión sobre la cubierta entrda al parque donde se presenta goteras para verificvar los arreglos a realizar.

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

BIOSALUDABLES

- El contratista realizó en sitio retoques de pintura a los Biosaludable a solicitud de la interventoria.

RUTA DE LA VIDA

- Pendiente el cambio de un banca de abdominales

COLISEO

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

426

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Parque totalmente terminado
- En este Estadio no se realizó actividad eléctrica. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Parque totalmente terminado
- En este Estadio se realizó actividad eléctricas al 100,00%

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Finaliza el desmonte y reinstalación de loseta tipo IDU.
- Se realiza la instalacion de las bancas en concreto.
- Se realiza pintura en bordillo maceras de los árboles.

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se termina el traslado de material para relleno para utilizar al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Continúa la retapada, el sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos, en muros y piso.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Esta en construcción de la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. (se recomienda realizar la conexión definitiva, cuando se habilite el vertimiento de residuos al tanque séptico).
- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø6" (En ejecución).

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Avance en la aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos.
- Lijado y pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.
- Lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se terminan las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres. Pruebas hidrosanitarias para baños de mujeres.
- Continúan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.
- Se realizan resanes de pañete en muros, antes de iniciar la instalación del enchape.
- Instalación de bebederos en el sector de Juegos 2.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Se realiza la aplicación de la carpeta asfáltica Tipo 1350; remates y aseo general .
- Avance en la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Finaliza la instalación de cuneta prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.
- Toma de muestras del asfalto por parte de la interventoría, para realizar los ensayos correspondientes.
- Continúa la reparación para el muro que presenta la fisura. (anclajes para coser el muro)

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza la instalación de cielorraso en PVC para la oficina de sistemas en Atra administrativa del PRD.
- Inicio en la colocación e instalación de luminarias (hay solamente 4 luminarias que están buenas). Se realiza pedido de las 8 luminarias restantes.
- En Comité de Obra , se aprueba la determinación de pintar la oficina de sistemas - aplicar color blanco.

PRD - UCAD.

- Se inicia la estructuración de cielorrasos de baños y bodega para montaje de láminas en PVC, en el Restaurante.
- Corrección de la gotera que se presenta en la cubierta de la edificación, por el costado oriental.
- Inicio instalación cielorraso en PVC baños.

PRD- Cancha de baloncesto

- Finaliza la excavación retirando la capa de base granular existente de 20 cm. El material es transportado y dispuesto en el Parque Simón bolívar para ser reutilizado como relleno (áreas externas de los tanques sépticos).
- Compactación de la subbase existente; se retiran tres fallos que se encontraron durante el proceso; se retiran y se realiza el mejoramiento con rajón
- Colocación de geotextil tejido 2400, e inicio en la extendida y compactación de la base granular.
- Nivelación topográfica del terreno, para establecer pendientes y desniveles.
- Retiro de agua que ha sido producto de las lluvias que han ocurrido en la presente semana.

PRD- Cancha de Hockey

- En la cancha de hockey se realiza la instalación del tablero para control de circuitos.
- Instalación de estructura metálica y pie de amigos para asegurar el tablero de control.

---

<u>- PARQUE DE LOS NIÑOS</u>

- Se acuerda en Comité de Obra, realizar la construcción de otro pozo de alcantarillado en el sitio donde está la caja de inspección que se encontraba enterrada. Se determinó además, instalar tuberías para drenar las canchas de voleyplaya existentes, evacuando hacia el pozo construido inicialmente; esto en virtud de que estas canchas no tienen drenaje.
- Avance de excavaciones manuales para instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur; cargue, transporte y retiro del material fuera de la obra.
- Termina la excavación para pilotes ubicados en el perímetro de las canchas; así mismo la excavación para conformar el tramo de sendero por costado occidental.
- Finaliza el amarre de hierro para viga de cimentación por costados sur y oriental.
- Fundida en concreto para las vigas de cimentación y pilotes del costado oriental y sur- cerramiento.
- Se inicia la instalación de tuberías de 8", por costado norte, para efectos de conectar la arenera existente a la red, mediante cajas de inspección.
- Avance en la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Fundida de último tramo en concreto ciclópeo bajo viga del costado oriental.
- Toma de muestras de la interventoría, para ensayos de la resistencia de los concretos llegados a la obra procedentes de planta. - Control de asentamientos en obra.
- Finaliza construcción de la caja de inspección, cuya red es la que sirve para desaguar el arenero grande en el interior del parque, en razón a que la tubería de desague se ha encontrado tapada con arena.
- Fundida de pilotes en concreto h=1.50 m, que conforma con la viga el diafragama para cerramiento; instalación de camisas de 24" y parales metálicos. Viga del costado oriental
- Inicio de excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección externas a las canchas. Inicio de instalaciones de redes de aguas lluvias en tuberías corrugada de PVC.
- Inicio excavaciones para construcción del filtro francés
- Vaciado de concreto pobre para cajas de inspección.
- Inicia la construcción de cajas de inspección con ladrillo recosido.

<u>- CANAL RIO NEGRO</u>

- Instalación de deslizaderos metálicos
- Continúa la aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Termina la aplicación de pintura para la estructura de arcos de fútbol y baloncesto.

---

<u>- PARQUEADERO DE LOS NIÑOS</u>

- Inicio de excavaciones manuales para instalación de tubería que sirvan para drenar las aguas hacia el pozo de alcantarillado, por costado oriental (conexión del cárcamo).
- Continúa la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Excavación para construcción de cajas de inspección.
- Como se evidenció que a los pozos existentes, les drena agua procedente de las edificaciones próximas al parqueadero; además una de las redes se encontró taponada con sedimentos de piedra de grandes proporciones que no dejaban pasar el agua al pozo de alcantarillado. Se realizó sondeo y se destaparon las tuberías que estaban presentando esta inconveniente.
- Vaciado de concreto de limpieza para cajas de inspección.
- Inicia la construcción de cajas de inspección con ladrillo recosido.

<u>- PARQUE DE LOS NOVIOS</u>

- Finaliza la aplicación de pintura en el módulo de administración y baños.
- Se retiran los vidrios del Módulo de Administración para poder aplicar la pintura por la parte interna principalmente.
- Finaliza la figurada de acero de refuerzo de los pedestales; se termina la fijación de las platinas metálicas.
- En el Tunel del Amor, se termina la fundida en concreto reforzado de los pedestales donde se fijará finalmente la estructura metálica. Pedestales de (30x30x50) cm. Platinas metálicas de 20x20x1/4"
- En módulo de baños, se inicia el enchape de muros en los sitios donde se realizaron reparaciones hidrosanitarias.
- Finaliza el mantenimiento de los juegos infantiles.
- En el área de cimentación donde se ubicará el nuevo módulo de baños, finalizan las excavaciones y se inicia la cimentación para zapatas con el concreto ciclópeo.
- Se efectua el traslego de material excavado en Túnel y módulo de baños; se carga y transporta el material fuera de la obra.

<u>- PARQUE ALTABLANCA</u>

- FONTANAR DEL RIO

- Se continua con el retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida .
- Se continua con la instalación de los vinilos nuebvos en los módulos de baño y Comida .

PARQUE SERVITA

- Avance en la instalación de lámparas Ledvance en cancha múltiple.
- Continuó la ejecución del mantenimiento desagues de lavamanos en baños.

- PARQUE ALTABLANCA

- Pendiente cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Está en estudio la aprobación para poder pulir la totalidad de la pista de velocidad de este Escenario.
- Se termina la instalación de las rejillas del cárcamo para reposición, de aquellas que estaban deterioradas y/o faltantes.

- CANAL BOYACA

- Se realiza cerramiento de la zona a trabajar en polisombra
- Se inicia la demolición de la placa de piso en concreto.
- Se realiza recorrido en el parque entre contratista Interventoria y supervisor del IDRD

- VIRREY CHICO

- Se continua con el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se realiza instalación de canecas nuevas.
- Se realiza la instalacipon de espaldares de bancas.

- UDS

- En los baños del velódromo se realizan las regatas para identificar daños de los puntos hidráulicos y realizar el listado de los materiales necesarios.
- Inicio de actividades con el cambio de fluxómetros baños de 1° y 2° piso.
- Resanes de pañete en muros, donde se han cambiado los fluxómetros en baños.
- Se retiran módulos de cerramiento para el ingreso de manlift con el objeto de iniciar el desmonte y suministro de luminarias en la cancha de béisbol.
- Llegan a la obra las luminarias y se realiza la socialización de inicio y coordinación de actividades.
- Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas, Coordinación del IDRD,Contratista y la Interventoria.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 17 de febrero de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 17-02-2024 | 55.00 | 56.00 | +1.00 |
| | | | |

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el raporte semanal presentado a fecha del 17-02-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 55,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 56,00%, donde se refleja un adelanto en la Programación de las Obras, la cual da como resultado del + 1,00%,. Igualmnete se le solicita al Contratista continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que están a su alcance para que se adelanten las actividades de mangtenimeintos en todos los parques, y asi evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

**FRENTES DE TRABAJO :**

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con trece (13) parques. Cuatro (4) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Laureles Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . dos (2) parques con actividades significativas (Parque Ciudad Montes, Parque Villa de los Alpes) con un avance superior al 90%, Los Parques (Primero de Mayo y Servita) con un vance del 70 %. los Parque (Bosque de San Carlos, Virrey Norte ) con un avance superior del 35%..Los Parque S<Canal Boyaca y Fontanar el Rio ) con un avance bajo del 6% los cuales se estan inciando y Parque Nacional con un 0.00% ya que este por fecha no ha iniciado .

FRENTE 2: Este frente cuenta con nueve (9) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o HippiesCanal Rio Negro) los cuales tiene un porcentaje de ejecución por encima del 93%, Los parques (PRD y Simón Bolivar) tene porcentajes superiores al 48 %, los parques ( Niños y Novios) cuentan con porcentajes superiores al 35%, el parque (UDS) cuenta con un avance dle 70%, el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 1%,ya que e ste hasta ahora se esta iniciando.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parque (Palestina, Cayetano) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal ) presentan un avance superior al 84 %, los parques (Eduardo Santos, Fragua, Illimani y Nuevo Muzu) presentan porcentajes superiores al 60%, los parques (Villa Alemana y Virrey Sur, Villa Alemana y Gilma Jimenez) presentan porcentajes superiores al 23 % . el perqtue Galtan Cortez tiene un porcentaje dal 0.00% .

**COMPONENTE SST**

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra

Actividades del Contratista

- Capacitación de levantamiento de Cargas.
- Entrega de EPP (mono gafas)
- Procedimiento de trabajo (Alturas)
- Inspección de Herramientas
- limpieza de Baños y Limpieza en obra
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

**COMPONENTE AMBIENTAL**

- Durante el periodo de reporte se realizó la revisión por parte de la Interventoría de la segunda (2) versión del Informe mensual No. 5 del contratista
- Se realiza protección a los arboles, se pintan bordillos alrededor de las materas.
- Se realizo recolección de luminarias por parte del contratista de obra
- Se recuerda alcontratista la entrega de los reportes de RCD, los cuales deben venir consignados en los Informes mensuales.

**COMPONENTE DE CALIDAD**

- Los ensayos de arena a instalar en cancha de voleibol de PRD
- Se recuerda la entrega de acuerdo a compromiso de la version1 de los manuales de mantenimiento y uso de los parques entregados para revisión por Interventoría
- Se da aprobación a informe de enero para radicación
- Se reitera que se debe realizar la entrega del listado de materiales actualizado por frente de obra en el cual se refleja cantidad, unidad de medida, ubicación y proveedor
- Se recibe caracterización de materiales de Constrituras Sub base granular, y caracterización agremex base granular, esta pendiente la entrega de los resultados de la cantera Reciclados Industriales material que se está instalando en obra
- Por solicitud de IDRD el contratista debe presentar el avance al cumplimiento del plan de adquisiciones en cada comité.
- Se requiere por el IDRD que el contratista en los informes mensuales presente las evidencias y trazabilidad de cumplimiento de las cuadrillas de acuerdo al ofrecimiento contractual

**COMPONENTE SOCIAL**


- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS
- Revisión de acta de vecindad del parque San Carlos la cual presento observaciones las cuales se remiten a profesional social para proceso de subsanación.
- 12 febrero: Asistencia a reunion con lideres de BMX parque El Tunal en la cual se escucha observaciones e intervenciones realizadas y se establece ajustarlo de acuerdo a requerido por la comunidad y la norma. Se establecio reunión para el dia 19 de febrero para proceso de seguimiento
- 14 febreo: Asistencia a reunion de inicio parque UDS en la cual se conto con la asistencia de lider de la liga de beisbol, administradores del parque, profesionales de interventoria, contratista e IDRD, se socializa actividades a ejucutar y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.
- 15 febrero: Asistencia a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos para ejeutar proxima semana.
- Elaboración de actas de vecindad por equipo social y tecnico del contratista en UDS en la cual se establece estado de la cancha de beisbol, ingreso y areas de intervención.

426


INFORME ANTICIPO



ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA



Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 12 al 17 de febrero de 2024 se describen a continuación:
La interventoría informa que a la fecha ya se encuentra desembolsado el total del anticipo, y se encuentra a la espera de legalización de las ordenes de operación aprobadas. el día 13 de febrero el contratista envió por correo eléctronico los rendimientos del mes de enero del 2024



## REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4. | | se avanza con el remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquin reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4, | |

| PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | | PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias | | se hace aseo de los espacios para su respectiva puesta en servicio. | |



| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) |
|---|---|
|   |   |
| se terminan trabajos de pintura en porteria #2, esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta | esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | PARQUE TUNAL (PISTA BMX) |
|   |   |
| se continuna con los remates de asfalto, demarcacion y con la evacuacion de observaciones plantaedas por la liga de bmx, durante la reunion del dia lunes 12 de febrero del 2024 en compañia de la administracion, el idrd, el contratista y la interventoria, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso. | se avanza con el mantenimiento de la zoa de ginasio # 2 |
| PARQUE TUNAL (ZONA GIMNASIO) | PARQUE ILLIMANI |
|   |     |
| se avanza con el mantenimiento de la zona de ginasio # 2 | se avanza en el mantenimiento de senderos en adoquin de concreto y aseo por debajo del modulo de baños. |
| PARQUE EDUARDO SANTOS | PARQUE EDUARDO SANTOS |

429




- s, se inicia la instalacion de divisionas en los sanitarios e instalacion de puertas de ingreso a baños de coliseo.

PARQUE LA FRAGUA

Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo


PARQUE LA FRAGUA




- se continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque


PARQUE NUEVO MUZU







- se avanza con la instalacion de bases compactas sobre la excavacion de la pista de patinaje .

PARQUE VILLA ALEMANA






- se adecua zona de senderos en adoquin, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de modulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalacion de juegos infantiles.


PARQUE LA VICTORIA















- - se avanza con el mantenimiento de cajas de inspeccion y remates de senderos en adoquin.



PARQUE VIRREY SUR





| | | | |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| - se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio. | | se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas. | |
| PARQUE GRJMA JIMENEZ | | | |
|  |  | N/A | N/A |
| se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas | | | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |  |  |
| se realiza corte de placa y fundida de la misma en zona de biosaludables | | Se realiza corte y figuardo de hierro para fundir la viga zarpa zona grecoromanos | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |





| | |
|---|---|
|   |   |
| Se revisa por parte de interventoria las divisiones métalicas instaladas en el baño de mujeres. | Corte en piso para fundir viga de cerramiento parque infantil |
| VILLA DE LOS ALPES | VILLA DE LOS ALPES |
|    |   |
| Se realizo la instalación de los Biosaludable arreglados y pintados | Se realizó la instalación de pintura en los módulos ruta de la vida |
| CIUDAD MONTES | CIUDAD MONTES |
|   |   |
| Se realiza encintada, lijado de los elementos ruta de la vida. | Se realiza encintada, lijado de los elementos ruta de la vida. |
| CIUDAD MONTES | CIUDAD MONTES |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Soldadura módulos de cerramiento costado canal Diag 18 S | | Suministro e instalación portón de entrada zona de la huerta | |
| PARQUE ALTABLANCA | | PARQUE ALTABLANCA | |
|  |  |  |  |
| Recuperación de placa en granito pulido +dilatación en la pista de patinaje - área de velocidad. | | Pendiente instalación de las rejillas del cárcamo que estaban averiadas. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | | |
|  |  | N/A | N/A |
| Instalación de deslizaderos metálicos | | | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO LOS NIÑOS | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Fundida de viga con concreto premezclado | | Ramelón de concreto y toma de cilindros | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Vaciado de concreto para viga del carramiento por el costado oriental de la cancha. | | Ramlalón de Geotextil | Geotextil NT 4000 |
| PARQUE SUCRE O HIPPIES | | PARQUE SUCRE O HIPPIES | |
|  |  |  |  |
| Pintura de bordillo alrededor de los árboles | | Suministro e Instalacipon de bancas en concreto | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
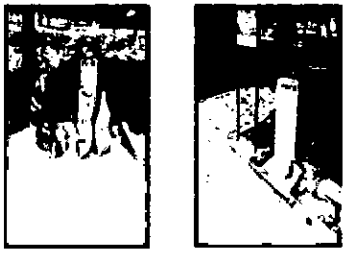
| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |   |  |
| El Carbón. Instalaciones hidraulicas del equipo de bombeo a baños. | | Aplicación de pintura en los Kioscos de comidas. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |   |   |
| Retapada de fisuras al interior de los tanques sépticos en Maná. | Instalación de bebederos. | Inicio en la pintura de juegos | Pintura baranda zona exterior Templete. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | | |
|   |   | N/A | N/A |
| Pintura barandas | Mantenimiento juegos | | |
| PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Instalación de sardinel prefabricado por costado norte | Compactación de la subbase granular | Concreto de limpieza para conformar base de caja de inspección. | construcción cajas de inspección. |
| PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | | PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | |
|  |  |  |  |
| Instalación de cielorraso en PVC blanco en ñuta de sistemas. | | nstalación cielorraso en baños del Restaurante. | |
| PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | | PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | |
|  |  |  |  |
| Colocación del geotaxtil | Extendida y nivelación topográfica y compactación de la base granular | | Extendida y compactación de rodadura asfáltica 1350 |
| PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | | PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Extendida y compactación de rodadura asfáltica 1350 | | Instalación de tablero eléctrico de control.en Pista de Hockey | Recorrido e Inspección Comité de obra. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Excavación para construcción de zapatas en el sitio donde se instalará el módulo de baños. | Refuerzo para pedestales | Fundida en concreto para pedestales | Estado actual enramada el interior del Túnel del Amor. (palos, pedazos de tuberías metálicas y de PVC) |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Pintura el Interior del Módulo de Administración. | | Pintura el interior del Módulo de Administración. | |
| FONTANAR DEL RIO | | FONTANAR DEL RIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. | | Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. | |
| UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) | | UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) | |
|  |  |  |  |
| Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas | | Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas, Coordinación del IDRD,Contratista y la Interventoria. | |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|  |  |  |  |
| Cerramiento en polisombra | Demolición placa de piso en concreto | Demolición placa de piso en concreto | Demolición placa de piso en concreto |
| VIRREY CHICO | | VIRREY CHICO | |





Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto





Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL









BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 24 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

febrero 18, 2024 al febrero 24, 2024

**1. Datos Generales**

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

**2. Contrato de Obra**

Objeto: COP No. 3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.981.251.399,00 | $ 41.884.509,00 | $ 77.343.733,00 | $ 144.068.622,00 | $ 1.118.610.201,00 | | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | $ 36.103.096,00 | $ 280.323.716,00 | | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.483,00 | $ 57.628.649,00 | $ 447.444.080,00 | | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | | |

**3. Contrato de Interventoría**

Objeto: CI No. 3131-2023

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.853,00 | $ 65.419.199,00 | $ 67.863.654,00 | $ 103.448.492,00 | | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | $ 12.894.094,00 | $ 19.655.213,00 | | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.857,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.857,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | $ 8.075.775,00 | $ 12.310.371,00 | | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063.962,00 | $ 72.681.973,00 | $ 110.793.334,00 | | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | | |

**4.** 24 Fecha de corte: febrero 24, 2024

**4.1. Datos Generales**

Nombre: PRD" Muro aguas lv/canchas tania/Canchas docker/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 63-75 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 330.780.258,00 | 2,44% | 54,00% | 68,00% | -14,00% | $ | 224.930.574,08 |
| TOTAL | | 330.780.258,00 | | 54,00% | 68,00% | -14,00% | $ | 224.930.574,08 |

4.2 Datos Generales

Nombre: Simón Bolívar — Código: 13-089 — Localidad: ENGATIVÁ

Dirección: Avenida Calle 63 # 68-15 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 889.358.406,00 | 5,41% | 74,00% | 63,00% | 11,00% | $ | 547.696.425,78 |
| TOTAL | | 889.358.406,00 | | 74,00% | 63,00% | 11,00% | $ | 547.696.425,78 |

4.3. Datos Generales

Nombre: Parque Alta Blanca — Código: 01-075 — Localidad: USAQUEN

Dirección: Carrera 8 A #158-04 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 154.101.031,00 | 1,14% | 82,00% | 89,00% | -7,00% | $ | 137.149.917,59 |
| TOTAL | | 154.101.031,00 | | 82,00% | 89,00% | -7,00% | $ | 137.149.917,59 |

4.4. Datos Generales

Nombre: Parque de los Niños — Código: 12-141 — Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Avenida Carrera 63 # 60-80 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.432.296.903,00 | 10,55% | 28,00% | 35,00% | -7,00% | $ | 501.303.916,05 |
| TOTAL | | 1.432.296.903,00 | | 28,00% | 35,00% | -7,00% | $ | 501.303.916,05 |

4.5. Datos Generales

Nombre: Parque de los Novios — Código: 12-092 — Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Avenida Calle 53 # 45-10 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.775.258,00 | 1,58% | 39,00% | 35,00% | 4,00% | $ | 75.171.339,60 |
| TOTAL | | 214.775.258,00 | | 39,00% | 35,00% | 4,00% | $ | 75.171.339,60 |

4.6. Datos Generales

Nombre: Parque Canal Río Negro — Código: 12-002 — Localidad: ANDES -RIO NEGRO

Dirección: Calle 89 A # 70-57 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 79.062.034,00 | 0,58% | 35,00% | 88,00% | -53,00% | $ | 69.574.589,92 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 79.062.034,00 | | 35,00% | 88,00% | -53,00% | $ | 69.574.589,92 |

4.7. Datos Generales — Nombre: Parque Sucre o Hippies — Código: 02-019 — Localidad: CHAPINERO — Dirección: Calle 60 a Cra 7 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 118.088.403,00 | 0,87% | 89,00% | 99,00% | -40,00% | $ 116.905.538,97 |
| TOTAL | | 118.088.403,00 | | 89,00% | 99,00% | -40,00% | $ 116.905.538,97 |

4.8. Datos Generales — Nombre: Parque UD6 — Código: — Localidad: ENGATIVA — Dirección: Calle 63 # 68 - 45 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.055.040.861,00 | 7,77% | 24,00% | 29,00% | -5,00% | $ 305.961.878,69 |
| TOTAL | | 1.055.040.861,00 | | 24,00% | 29,00% | -5,00% | $ 305.961.878,69 |

4.9. Datos Generales — Nombre: Parque San José de Baviera — Código: — Localidad: SUBA — Dirección: Ac 170 - Cra 65 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,00 | 0,19% | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.272,65 |
| TOTAL | | 25.527.265,00 | | 0,00% | 1,00% | -1,00% | $ 255.272,65 |

4.10. Datos Generales — Nombre: Estadio Olaya Herrera — Código: 18-207 — Localidad: RAFAEL URIBE — Dirección: Cl. 35 #3-50 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 600.483.302,00 | 4,42% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |
| TOTAL | | 600.483.302,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |

4.11. Datos Generales — Nombre: Parque Ciudad Montes — Código: 16-112 — Localidad: PUENTE ARANDA — Dirección: Cl. 10 Sur #39-29 — Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 295.993.778,00 | 2,18% | 72,00% | 100,00% | -28,00% | $ 295.993.778,00 |
| TOTAL | | 295.993.778,00 | | 72,00% | 100,00% | -28,00% | $ 295.993.778,00 |

4.12. Datos Generales

Nombre: Parque Bosques de San Carlos Código: 18-028 Localidad: RAFAEL URIBE

Dirección: Dirección: Cra. 13 e # 30-15 S Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 983.049.229,00 | 7,28% | 42,00% | 45,00% | -3,00% | $ 443.272.153,05 |
| TOTAL | | 983.049.229,00 | | 42,00% | 45,00% | -3,00% | $ 443.272.153,05 |

4.13. Datos Generales

Nombre: Estadio de Techo Código: 08-554 Localidad: KENNEDY

Dirección: Transversal 78K No. 41 A - 04 Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 68.643.578,00 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 68.643.578,00 |
| TOTAL | | 68.643.578,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 68.643.578,00 |

4.14. Datos Generales

Nombre: Parque Lauralas Naranjos Código: 07-035 Localidad: BOSA

Dirección: Cl. 70 Bis Sur #90k-1 Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 26.022.208,00 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |
| TOTAL | | 26.022.208,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |

4.15. Datos Generales

Nombre: Parque Villa de los Alpes Código: 04-075 Localidad: SAN CRISTOBAL

Dirección: CARRERA 6A Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 156.478.298,00 | 1,15% | 100,00% | 98,00% | 2,00% | $ 153.348.730,06 |
| TOTAL | | 156.478.298,00 | | 100,00% | 98,00% | 2,00% | $ 153.348.730,06 |

4.16. Datos Generales

Nombre: Parque el Porvenir Código: 07-391 Localidad: BOSA

Dirección: Calle 52 Sur - Cra 97 C Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 33.582.453,00 | 0,25% | 53,00% | 100,00% | -47,00% | $ 33.582.453,00 |
| TOTAL | | 33.582.453,00 | | 53,00% | 100,00% | -47,00% | $ 33.582.453,00 |

4.17. Datos Generales

Nombre: Parque Primero de Mayo Código: 04-196 Localidad: SAN CRISTOBAL

Dirección: carrera 5 bis #17-14 Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia Real | % Inversión Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | | | | |
| | | $ 615.714.752,00 | 4,54% | 74,00% | | 75,00% | -1,00% | $ 461.788.064,00 |
| TOTAL | | 615.714.752,00 | | 74,00% | | 75,00% | -1,00% | $ 461.788.064,00 |

4.18. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Nacional | Código: | | Localidad: | SANTA FE |
| Dirección: | Carrera 7 # 38 - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia Real | % Inversión Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | | | | |
| | | $ 41.000.192,00 | 0,30% | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | $ - |
| TOTAL | | 41.000.192,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | $ - |

4.19. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Servita | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Calle 165 # 7 - 32 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | | | |
| | | $ 601.246.287,00 | 4,43% | 43,00% | 50,00% | -7,00% | $ 300.623.143,50 |
| TOTAL | | 601.246.287,00 | | 43,00% | 50,00% | -7,00% | $ 300.623.143,50 |

4.20. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Boyacá | Código: | | Localidad: | FONTIBON |
| Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 96 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | | | |
| | | $ 910.502.844,00 | 8,71% | 27,00% | 25,00% | 2,00% | $ 227.625.681,00 |
| TOTAL | | 910.502.844,00 | | 27,00% | 25,00% | 2,00% | $ 227.625.681,00 |

4.21. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | | Localidad: | CHAPINERO |
| Dirección: | Calle 88 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | | | |
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 23,00% | 100,00% | -77,00% | $ 28.197.735,00 |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 23,00% | 100,00% | -77,00% | $ 28.197.735,00 |

4.22. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Fontanar del Río | Código: | | Localidad: | SUBA |
| Dirección: | Cle 145 # 138 A - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,00 | 3,74% | 2,00% | 15,00% | -13,00% | $ 76.217.901,15 |
| TOTAL | | 508.119.341,00 | | 2,00% | 15,00% | -13,00% | $ 76.217.901,15 |

4.23. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Cra 19D #52B-15 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.185.589.656,00 | 8,74% | 88,00% | 88,00% | 0,00% | $ 1.019.607.104,16 |
| TOTAL | | 1.185.589.656,00 | | 88,00% | 88,00% | 0,00% | $ 1.019.607.104,16 |

4.24. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
| Dirección: | Cra 31 #14B-57S | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 871.738.911,00 | 6,42% | 61,00% | 70,00% | -9,00% | $ 610.215.837,70 |
| TOTAL | | 871.738.911,00 | | 61,00% | 70,00% | -9,00% | $ 610.215.837,70 |

4.25. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Mirador Illimani | Código: | 19-758 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
| Dirección: | Cra 27b #1 1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 224.051.968,00 | 1,65% | 68,00% | 45,00% | 23,00% | $ 100.823.384,70 |
| TOTAL | | 224.051.968,00 | | 68,00% | 45,00% | 23,00% | $ 100.823.384,70 |

4.26. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 140.357.541,00 | 1,03% | 57,00% | 60,00% | -3,00% | $ 84.214.524,60 |
| TOTAL | | 140.357.541,00 | | 57,00% | 60,00% | -3,00% | $ 84.214.524,60 |

4.27. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | 38 a 52a Cra 61B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 848.409.817,00 | 8,24% | 59,00% | 60,00% | -1,00% | $ 507.845.890,20 |
| TOTAL | | 848.409.817,00 | | 59,00% | 60,00% | -1,00% | $ 507.845.890,20 |

4.28. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Cayetana | Código: | 08-241 | Localidad: | USME |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.611.043,00 | 1,58% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |
| TOTAL | | 214.611.043,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |

4.29. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra 5 Este # 5 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 45.922.595,00 | 0,34% | 53,00% | 65,00% | -12,00% | $ 29.849.686,75 |
| TOTAL | | 45.922.595,00 | | 53,00% | 65,00% | -12,00% | 29.849.686,75 |

4.30. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-185 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cll 67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.797.573,00 |
| TOTAL | | 10.797.573,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.797.573,00 |

4.31. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.565,00 | 0,67% | 28,00% | 65,00% | -37,00% | $ 59.219.917,25 |
| TOTAL | | 91.107.565,00 | | 28,00% | 65,00% | -37,00% | 59.219.917,25 |

4.32. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gilma Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 380.308.039,00 | 2,88% | 11,00% | 11,00% | 0,00% | $ 42.933.884,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 390.308.039,00 | | 11,00% | 11,00% | 0,00% | 42.933.884,29 |

4.33. Datos Generales

Nombre: Parque La Victoria Código: Localidad: SAN CRISTOBAL

Dirección: Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 60.851.447,00 | 0,37% | 63,00% | 40,00% | 23,00% | $ 20.340.578,80 |
| TOTAL | | 60.851.447,00 | | 63,00% | 40,00% | 23,00% | 20.340.578,80 |

4.34 Datos Generales

Nombre: Parque Gaitan Cortes Código: Localidad: SAN CRISTOBAL

Dirección: Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $ - |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

5

| | |
|---|---|
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

**6. OBSERVACIONES:**
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. **Licencias:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Construcción: | Ambiental: | N/A | Intervensión del Espacio Público | N/A |

8. **Servicios Públicos:**
TELEFONOS
DAMA

CODENSA N/A | EAAB Informe 50% | Informe 75% | OTROS Informe 100%

| 9. | PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10. **Observaciones por parques:**

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se solicita continuar con las actividades constructivas en la zona de los graeoromanos y ruta de la vida. Instalación de juegos infantiles e instalación del piso caucho. se deben agilizar los mantenimientos de los Biosaludables que estan en taller para ser instalados.
2.- PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Este parque esta listo para terminar solamente esta pendiente realizar el desmonte y suministro de marco y puerta zona de cafeteria
3.- PARQUE CIUDAD MONTES: Se esta terminonado la instalación de los portones metalicos de la zona de la huerta. se termina las actividades de mantenimiento en la zona ruta de la vida.
4.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad.
5.- PARQUE CANAL BOYACA: SE realizo el retiro de la placa en concreto demolida a botadero, llegaron materiales para iniciar activades constructivas.
6.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con adelanto con respecto a lo proyectado vrs lo ejecutado debido al progreso en instalación de adoquin nuevo y en mantenimiento y pintura en Graeos 1, 2, y pista de BMX, atraso sin perjuicio en lo programado en la entrega de a casa del adulto mayor Terminada.
7.- PARQUE FRAGUA: Lleva adelanto en cuanto a las actividades eléctricas y en la aplicación de subbases compactas de la pista de patinaje.
8.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Lleva adelanto con respecto a la programación, pero deberia estar ya estar terminando los baños de coliseo, que fue un compromiso con la administración del parque y ya se deberia estar terminado la zona de biosaludables, actividad que ha estado quieta en estas dos ultimas semanas
9.- PARQUE MIRADOR ILLAMINI: Refleja atraso en cuanto que el modulo de baños es el que mas pesa en el presupuesto y en esta No se han comenzado actividades en sitio.
10.- PARQUE NUEVO MUZU: Presenta un leve adelanto debido a el rendimiento de esta semana en la pintura del piso de la zona de juegos y el inicio de la instalación de juegos en la misma zona.
11.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Refleja adelanto debido el rendimiento en la actividad de mantenimiento y pintura de juegos infantiles y aparatos biosaludables
12.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Esta pendiente el cambio de las luminarias de la zona del patinodromo,
13.- PARQUE SIMON BOLIVAR (CARBON): Se le ha solicitado al Contratista presentar la Cotización para la reparación de las instalaciones hidro sanitarias en baños del módulo El Carbón; no se ha recibido a la fecha.
14.- PAFRQUE VIRREY NORTE: Se terminan actividades se recoge campamantio materiales sobrantes y se realiza aseo.

11. INFORME TÈCNICO

I.- ACTIVADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafeteria puerta # 4.

SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO

- Se avanza con la instalación de piezas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, se recibe la instalación de adoquín reutilizado y se dejan observaciones para que corrijan y entreguen ya los senderos.

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se avanza con los remates de observaciones, se instalan vidrios y espejos, se instalan puertas en baños de discapacitados.

ZONA DE PORTERIAS:

- Se terminan trabajos de pintura en porteria #2, esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta , se avanza con los trabajos de estuco y pintura en porteria #3 .
- se realiza la entrega y puesta en servicio de la fachada verde en la porteria #1.

-

PISTA DE BMX:

- Se contiunua con los remates de asfalto, demarcacion de la pista y se revisan al estado de observaciones plantaadas por la liga de bmx, durante la reunion del dia lunes 19 de febrero del 2024, en compañia de la administracion, el idrd, el contratista y la interventoria, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

ZONA DE CANCHAS

- se termina la instalacionde tapas de caja de inspeccion de valvula de cierre de riego de cancha futbol 11.

• PARQUE ILLIMANI:

- se realizó visita a proveedores para verificar la fabricación de los elementos en acero del módulo de baños y señales informativas que es lo único que falta en esta frente de trabajo.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- se avanza con la pintura de pisos de la zona de biosaludables.
- se realiza el cambio de luminarias del coliseo y de aparatos electricos de distintos espacios del coliseo.
- se avanza con la reinstalacion de enchapes nuevos en baños de coliseo, se inicia la instalacion de divisiones en los sanitarios.

• PARQUE LA FRAGUA:

- se avanza con la instalación de geotextil y subbase en la zona de jugos exterior del parque.
- se avanza con la instalacion de bases compactas sobre la sub bases de la pista de patinaje .
- se avanza con la instalación de enchapes donde se hicieron arreglos hidrosanitarios en los baños de coliseo y la instalación de luminarias, se instalan canecas en nuevo lugar elegido.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se tremina afinado y pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos, se inician la instalacion de juegos infantiles.
- Se avanza con los arreglos hidrosanitarios en los baños del coliseo.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con el mantenimmiento de cajas de inspeccion, se inicia el encorroce del muro de cerramiento parte inferior del parque

• PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y biosaludables

• PARQUE VIRREY SUR:

- se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de cubiertas.

PARQUE GILMA JIMENEZ:

- no se realizaron esta semana actividades en este parque, estamos a la espera de que llegue el trasformador para poder energizar y seguir avanzando con las actividades eléctricas, que son el objeto contractual del mismo.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD; 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Se realiza la instalación de baldosa negra en piso caja de inspección baño de hombres
- Se realiza la instalación de baldosin blanco en 'pared arreglo pendiente.

ZONA JUEGOS INFANTILES
- Se realiza la instalación de parales metalicos verticales para instalación de baranda cerca al sendero peatonal.
- Se tienen ya los dados fundidos para la instalación de los juegos infantiles.
- Se realiza visita a taller de ornamentación se verifica construccipon de módulos complementarios para cerramiento infantil

ZONA BIOSALUDABLES

- Se tiene pendiente la instalación de los modulos de los Biosaludables los cuales se estan arreglando en el taller.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realiza el suministro e intalacion del hierro para fundir la viga zarpa.
- Se realiza la instalación de formaleta metalica para fundir la viga zarpa..
- Se incia la fundida de la viga zarpa con concreto mezclado en sitio. se vibra el concreto con vibrador electrico.
- Se toman los respectivos cilindros en concreto para ser fallados en laboratorio.

ZONA EXTERNA DEL PARQUE

- Se realiza la instalación del juego infantil M3, donde staba el juego dañado en madera.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

- En este parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100,00%
- En este parque ya se colocarón los móduos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por erl .

- El IDRD realiza reubicación y movimiento de lo módulos sanitarios
- Se deben adecuar con las instalaciones hidraulicas, sanitaris y electricas.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

ZONA DE LA HUERTA CERRAMIENTO.

- Zona totalmente terminada.

ZONA RUTA DE LA VIDA

- Se termina la pintura de los módulos ruta de la vida.
- Se cambian banner de la zona.

Actividad eléctrica realizada al 100%

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

- En este parque ya se realizaron las actividades electricas al 100,00%

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

BIOSALUDABLES

- El contratista realizó en sitio retoques de pintura a los Biosaludable a solicitud de la interventoria.
- Ya se tiene la puesta en servició de estos elementos.

RUTA DE LA VIDA

- Se realizo el cambio de un banco de abdominales ns solicitud de la interventoria, ya que esta presentaba la malla parcialmente rota.

COLISEO

- Actividad eléctrica realizadas al 100%.

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En esta Estadio no se realizarón actividad eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio se realizaron actividades eléctricas al 100,00%

• CANAL BOYACA

- Se termina la demolición de la placa de piso en concreto.
- Se realiza desmonte de canecas dañadas.
- Se realiza desmonte de juegos en madera dañados existentsen el parque externos a la
- Se realiza desmonte de juego M3 existente

• FONTANAR DEL RIO

- Se termina el retiro de vinilos que están deteriorados en los módulos de baño y Comida .
- Esta pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

• VIRREY CHICO

- Se termina el desmonte de canecas que están en mal estado.
- Se termina la instalación de canecas nuevas.
- Se termina la instalación de espaldares de bancas.
- Se recogua campamento y se realiza aseo en la zona.

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se termina el traslado de material para relleno para utilizar al exterior de los tanques (el material proviene de la estructura existente en la cancha de baloncesto - capa superior).
- Continúa la retapada, el sellado de fisuras y la impermeabilización al interior de los tanques sépticos, en muros y piso.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Esta en construcción de la última caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. (se recomienda realizar la conexión definitiva, cuando se habilite el vertimiento de residuos al tanque séptico).
- Cambio y nivelación de la tubería PVC de Ø6" (En ejecución).

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Para aplicación de pintura bajo cubierta de los kioscos de comidas, se ha continuado con el desmonte del policarbonato que las cubre.
- Avance en la aplicación de pintura en esmalte rojo y gris para los muros de los kioscos.
- Lijado y pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el lijado de baranda metálica de cerramiento en el Templete.
- Lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se terminan las regatas zona exteriores para los baños de mujeres. Se instalan las tuberías y accesorios para agua potable. Instalaciones de redes hidrosanitarias para baños y lavamanos en baño de mujeres. Pruebas hidrosanitarias para baños de mujeres.
- Continúan pruebas de presión a las redes de tuberías que se están instalando.
- Se realizan resanes de pañete en muros, antes de iniciar la instalación del enchape.
- Instalación de bebederos en el sector de Juegos 2.

EMERGENCIA : A solicitud de la Administración del Parque, se realizaron investigaciones para determinar aposamiento de agua en un sector paralelo a la pista de trote y a la Av. 68. *** Evidencias de que personas externas que construyen tramo de ciclovía han intervenido al interior del Parque (cajas de inspección con tapa provisionales de madera y pozo de inspección sin tapa). *** Al retirar el tapon de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Continúa la reparación para el muro que presenta la fisura. (anclajes para coser el muro)
- Reunión con el Veedor, con los Apoyos de la Administración PRD, Contratista y la Interventoría. (definición de colores para el piso de la cancha).

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza la instalación de cielorraso en PVC para la oficina de sistemas en Atrs administrativa del PRD.
- Instalación de luminarias en la oficina de sistemas.
- Aplicación de pintura para los muros de la Oficina de sistemas
- Inicia desmonte de cielorraso en el deposito del área administrativa.

PRD - UCAD.

- Finaliza la estructuración de cielorrasos de baños y bodega para montaje de láminas en PVC, en el Restaurante.
- Continúa la instalación cielorraso en PVC baños.

PRD- Cancha de baloncesto

- Compactación de la base granular.
- Inicio instalación de bordillos prefabricados.

PRD- Cancha de Hockey

- En la cancha de hockey continúa la instalación del tablero para control de circuitos.
- En proceso la instalación de estructura metálica y pie de amigos para asegurar el tablero de control.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Cambio de fluxómetros baños de 1° y 2° piso; en el Velódromo
- Enchape de muros, en sitios donde se han cambiado los fluxómetros en baños.
- Se realizan protocolos para iniciar el desmonte y la instalación de nuevas luminarias en la cancha de béisbol.
- Se identifica en uno de los postes de energía un panal de abejas, el cual deberá ser tratado para realizar procedimientos de erradicación y traslado.

- PARQUE DE LOS NIÑOS

- Continuaron las excavaciones manuales para instalación de tubería que sirvan para drenar las aguas hacia el pozo de alcantarillado, por costado oriental (conexión del cárcamo).
- Finaliza la compactación de la subbase granular en capas de 15 cms.
- Terminan las excavaciones para construcción de cajas de inspección.
- Extendida y compactación de la subbase granular.
- Ensayos de densidades en el terreno, para establecer grado de compactación de la subbase.
- Continúa la construcción de cajas de inspección con ladrillo recosido.
- Inicio extendida y compactación de la base granular.

- CANAL RIO NEGRO

- Finaliza el anclaje y la instalación de deslizaderos en acero inoxidable (2 unidades). Pendiente la instalación de los otros dos (2).
- Termina la aplicación de soldadura en el cerramiento de malla eslabonada, por costado oriental y sur del parque.
- Aplicación de anticorrosivo para la malla eslabonada del cerramiento y la estructura metálica correspondiente.
- Aplicación de puntos de soldadura para la puerta metálica que se estaba cayendo. (costado norte).
- Arreglos de tubular metálicos que estaban podridos (encamisado).

PARQUE SUCRE O HIPPIES

- Termina la instalación de los bolardos metálicos, a solicitud de la Comunidad.
- Finaliza la demolición de las bancas existentes por el Costado Sur.
- Se termina la instalacion de las bancas en concreto, por el costado sur del Parque.

- PARQUEADERO DE LOS NIÑOS

- Instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur.
- Continúa la instalación de tuberías de 6", por costado norte, para efectos de conectar la arenera existente a la red, mediante cajas de inspección.
- Continúa la construcción de cajas de inspección por costado occidental.
- Finaliza la instalación de sardinel prefabricado por costado norte.
- Pedido de materiales (tuberías drenaje), para realizar conexión a las canchas de arena existentes.
- Avance de excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección externas a las canchas. Continúan las instalaciones de redes de aguas lluvias en tuberías corrugada de PVC.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Nivelación de la subrasante - revisión de pendientes.
- Instalación del material geotextil 4000 en la subrasante del terreno.
- Inicio en la extendida de la capa de triturado de rio 3/4" -1" (e=20 cm).

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Figuración de acero de refuerzo para las zapatas y pedestales de columnetas en la cimentación, para el Módulo de baños por costado sur.
- En el Tunel del Amor, se fabrica en taller la estructura metálica y rotada de la tubería de soporte.
- En módulo de baños, se termina el enchape de muros en los sitios donde se realizaron reparaciones hidrosanitarias.
- En el área de cimentación donde se ubicará el nuevo módulo de baños, se funde la cimentación para zapatas con el concreto ciclópeo.
- . Amarre de hierro para zapatas y pedestales de columnetas; fundida de las zapatas en concreto.
- Revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias en los baños de servicios.
- Se realiza visita a taller de ornamentación (contratista e interventoría).
- Limpieza de cajas de inspección existentes y sondeo de tuberías, para poder identificar y conectar desagues desde el sitio donde se instalará el nuevo Módulo de baños.

PARQUE SERVITA

- Instalación de espejo en baños.
- Finaliza la ejecución del mantenimiento desagues de lavamanos en baños.
- Se programa para próxima semana reunión de socialización para realizar intervencioón para cambio de luminarias en la Cancha de fútbol.

- PARQUE ALTABLANCA

- Se realiza el cambio de un tramo de canal en edificio de administración (costado norte).
- Se aprueba por parte de la Entidad la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Se realiza cambio de las rejillas del cárcamo, de aquellas que estaban deterioradas y/o faltantes.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 24 de febrero de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 24-02-2024 | 71.00 | 55.00 | - 16.00 |
| | | | |

**ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO**

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 24-02-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 71,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 55,00%, donde se refleja un atraso del - 16.00%,. igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia y continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que están a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y tres (33) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay tres (3) parques que presentan atraso, pero se aclara que los atrasos evidenciados se estan presentando por los siguientes motivos.

1.- Parque Simón Bolivar: Este parque presenta atraso en la reparación de los baños en los módulos y en los trabajos de impermeabilizaciones y acabados de los tanques.

2.- Parque La Victoria: Este parque presenta atraso debido a que el contratista no ha iniciado todavia las actividades concernientes a los módulos administrativos, cafetaia y baños.

3.- Parque Illimani:. Este parque presenta atraso debido a que las actividadas que comprenden la ejecución y terminación del módulo de baños no se han realizado en sitio, el contratista manifiesta que estas actividadas las esta trabajando en el taller y esta actividad es la mas representativa dentro del presupuesto de este parque.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con trece (13) parques. Cuatro (6) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Laureles Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte)), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . dos (2) parques con actividades significativas ( Parque Villa de los Alpes) con un avance superior al 97%, Los Parques (Primero de Mayo) con un vance del 75 %. los Parque (Bosque de San Carlo ) con un avance superior del 45%..Los Parque (Canal Boyaca y Fontanar al Rio ) con un avance superior del 20% los cuales se estan inclando y Parque Nacional con un 0.00% ya que este por fecha no ha iniciado .

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippies, Canal Rio Negro) los cuales tiene un porcentaje de ejecución por encima del 88%, Los parques (PRD y Simón Bolivar) tane porcentajes superiores al 63 %, el parque (Serevita) cuengta con un porcengtaje del 50%, los parques ( Niños y Novios) cuentan con porcentajes superiores al 35%, el parque (UDS) cuenta con un avance del 29%, el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 1%,ya que esta hasta ahora se esta iniciando.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parque (Palestina, Cayetano) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal ) presentan un avance superior al 84 %, los parques (Eduardo Santos, Fragua Virrey Sur, Villa Alemana y Nuevo Muzu) presentan porcentajes superiores al 60%, los parques ( Illimani y La Victoria) presentan porcentajes superiores al 40 % . el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 11% y el parque (Gaitan Cortez) tiena un porcentaje del 0.00% .

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria
- Verificación de Documentos ingreso de personal
- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas

Actividades del Contratista
- Capacitación de Reporte de accidentes e incidentes de Trabajo
- Entrega de EPP (Guantes)
- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Verificación de Punto de Hidratación
- Jornada de Limpieza en obra
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro).

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizó recolección de luminarias por parte del contratista de obra y se llevo a sitio dispuesto
- Se recuerda la importancia de recopilar en un solo sitio por separado los materiales sobrantes como bolsas de cemento, palos ,polisombra .
- Se deben proteger los árboles con polisombra que se encuentren dentro de las áreas de construcción.
- Se deben proteger los sumidero con polisombra que se encuentren dentro de las áreas de construcción.
- Se recuerda al contratista la entrega de los reportes de RCD, los cuales deben venir consignados en los informes mensuales.

COMPONENTE DE CALIDAD

- No se ha presentado por parte del contratista los ensayos de laboratorio del material proveniente de reciclados industriales, se establece compromiso de entrega para el 22 de febrero de 24, el cual no es cumplido
- Se envían observaciones correspondientes al plan de inspección y ensayo presentado por el contratista, dado a que no se atienden la totalidad de las observaciones, fecha de compromiso de entrega 24 de febrero de 2024, el cual debe ser presentado con la firma de director de obra y profesional de calidad
- Se establece compromiso de entrega del informe N°6 del contratista del 23 de febrero de 2024
- El contratista se compromete a realizar entrega de la primera versión de los manuales de mantenimiento y uso de los parques Olaya, techo, Naranjos y Palestina para revisión por interventoría par el día 23 de febrero de 2024


COMPONENTE SOCIAL


- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS
- 19 febrero: Asistencia a reunion con lideres de BMX parque El Tunal en la cual se escucha observaciones a intervenciones realizadas.
- 20 febrero: Asistencia a reunion de parque Hippie en la cual se conto con la asistencia de lideres de la comunidad, profesionales de interventoría, contratista, se socializa actividades a ejecutar y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.
- 21 febrero: reunión del con veedor de squach en donde se socializa actividades y se escucha inquietudes.
- 23 febrero: Asistencia a reunion de la UDS con la liga de sotfbol en la cual conto con la asistencia de lider de la liga, profesionales de interventoría, contratista, IDRD, se socializa actividades a ejecutar del componente electrico y se escucha las diferentes inquietudes del lider de la liga.
- Socializacion de pintura en casetas del parque Simon Bolivar.


INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 18 al 24 de febrero de 2024 se describen a continuación:
Durante la semana del 19 al 24 de febrero, el contratista remite legalización de las ordenes de operación No. 01 y 02, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de interventoría.















REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con el retiro de adoquin en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalacion en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4. | | se avanza con el remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquin reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosko de la puerta #4, | |
| PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | | PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | |
|  |  |  |  |
| se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias | | se hace aseo de los espacios para su respectiva puesta en servicio. | |
| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | |
|  |  |  |  |
| se terminan trabajos de pintura en portería #2, esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta | | esta pendiente el arreglo de goteras en las cubierta | |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | | PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | |

| | |
|---|---|
|   |   |
| se continuus con los remates de asfalto, demarcacion y con la evacuacion de observaciones plantaadas por la liga de bmx, durante la reunion del dia lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administracion, el idrd, el contratista y la interventoria, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso. | se avanza con el mantenimiento de la zoa de ginasio # 2 |
| PARQUE TUNAL (ZONA CANCHAS ) | PARQUE ILLIMANI |
|   |     |
| se avanza con el mantenimiento de la zona de ginasio # 2 | se avanza en el mantenimiento de senderos en adoquin de concreto y aseo por debajo del modulo de baños. |
| PARQUE EDUARDO SANTOS | PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) |
|   |     |
| - s, se inicia la instalacion de divisiones en los sanitarios e instalacion de puertas de ingreso a baños de coliseo. | Se evanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo |
| PARQUE LA FRAGUA | PARQUE LA FRAGUA |







- se continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque

PARQUE NUEVO MUZU






- se avanza con la instalacion de bases compactas sobre la excavacion de la pista de patinaje .

PARQUE VILLA ALEMANA






- se adecua zona de senderos en adoquin, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de modulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalacion de juegos infantiles.

PARQUE LA VICTORIA






- - se avanza con el mantenimmiento de cajas de inspeccion y remates de senderos en adoquin.

PARQUE VIRREY SUR











- se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.


PARQUE ORLMA JIMENEZ










se avanza actividades con mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas.





| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | N/A | N/A |
| se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas | | | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |   |   |
| Colocación de sellante piso zona infantil - colocación de parales metalicos para cerramiento zona juego,infantil | | Fabricación de estructuras metálicas para cerramientos. | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |  |   |
| Colocación de formaleta con hieropara fundir viga zarpa zoan grecoromana - materiales para fundir viga zarpa | mezcla de | Vibrado del concreto con vibrador y toma de cilindro de concreto para ser fallados en laboratorio | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Reinstalación de Módulo juego infantil M3 zona externa del parque | | Suministro e instalación de baldosín blanco y baldosa negra para el piso baño de hombres | |
| VILLA DE LOS ALPES | | VILLA DE LOS ALPES | |
|  |  |  |  |
| Se realizo la instalación de los Biosaludable arreglados y pintados | | Se realizó la instalación de pintura en los módulos ruta de la vida | |
| CIUDAD MONTES | | CIUDAD MONTES | |
|  |  |  |  |
| Se realiza instalación de bancas de abdominales en la ruta de la vida. | | Se terminan las actividad lijado, pintura anticorrosiva y pintura de los elementos ruta de la vida. | |
| CIUDAD MONTES | | CIUDAD MONTES | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Suministro e instalación portón de entrada zona de la huerta | | Instalación de soldadura módulos de cerramiento costado canal Diag 15 S | |
| PARQUE ALTABLANCA | | PARQUE ALTABLANCA | |
|  |  |  |  |
| Pulida del piso en granito pulido en los sitios donde se realizaron las reparaciones puntuales para la pista de velocidad. | | Pulida del piso en granito pulido en los sitios donde se realizaron las reparaciones puntuales para la pista de velocidad. Colocación de varilla de bronce como dilatador en juntas. - Cambio de tapas para cárcamo prefabricado en concreto, para aquellas que se encontraban más deterioradas o inexistentes. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|  |  |  |  |
| Fijación de la puerta existente, con la aplicación de puntos de soldadura. | Instalación del deslizadero en acero inoxidable. | Aplicación de anticorrosivo para el cerramiento de la malla eslabonada por costado oriental. | Pintura tablero , arcos de micicrofutbol y estructura de baloncesto.. |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO LOS NIÑOS | |





Shh



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Apertura de zanjas para instalación de filtro | Colocación y extendida de material granular para conformación del sendero peatonal | Pintura de barandas metálicas en canchas existentes de arena playa. | Pintura de barandas metálicas en canchas existentes de arena playa. |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Fabricación de las estructuras metálicas para cerramientos. | | Fabricación de las estructuras metálicas para cerramientos. | |
| PARQUE SUCRE O HIPPIES | | PARQUE SUCRE O HIPPIES | |
|  |  |  |  |
| Socialización con Miembros de la Comunidad, Contratista y la Interventoría. | Instalación de bancas en concreto - instaladas por el costado sur del parque | Instalación de bancas en concreto. | Instalación de bancas en concreto - instaladas por el costado sur del parque |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Durante la ejecución de las conexiones hidraulicas en los bebederos. | Instalación de bebederos | Lijada de elementos metálicos de los columpios. | Lijada de elementos metálicos de los columpios. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Aplicación de pintura en los bebederos | Aplicación de pintura en los Kioscos de comidas. | Aplicación de pintura para kiscos de comidas. | Recorrido e inspección durante Comité de Obra Semanal. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | | |
|  |  |   |   |
| Campamento para personal y protacción de equipos y materiales de obra. | Tanques sépticos | Instalación de enchape para los baños de hombres en el Sector El Carbón. | Investigaciones para determinar aposamiento de agua en un sector paralelo a la pista de trote y a la Av. 68. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |

ghh

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Al retirar el tapon de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada. | | Al retirar el tapon de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada. | |
| PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO DE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Extendida y compactación de la base granular | Extendida y compactación de la base granular | Humectación y compactación de la base granular | Registro de las densidades tomadas en el terreno para la subbase granular. |
| PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | | PARQUE PRD TENNIS (ADMON) | |
|  |  |  |  |
| Reunión con el Veedor, con los Apoyos de la Administración PRD, Contratista y la Interventoría. (definición de colores al piso de la cancha). | | Compactación de la base granular en Cancha de baloncesto. | |
| PARQUE PRD TENNIS ( BALONCESTO) | | PARQUE PRD TENNIS (TENIS) | |

| | |
|---|---|
|   |   |
| Extendida y compactación de la base granular en Cancha de baloncesto. | Reparación del muro en la Cancha de squash- Tenis. |
| PARQUE PRD TENNIS (MURO DE TENNIS)) | PARQUE PRD TENNIS (ADMON) |
|   |   |
| Reparación del muro en la Cancha de squash- Tenis. | Reparación del muro en la Cancha de squash- Tenis. |
| PARQUE PRD TENNIS (OFICINA SISTEMAS) | PARQUE PRD TENNIS (RESTAURANTE) |
|   |   |
| Instalación de lámparas para iluminación en el cielorraso de la oficina de Sistemas | Instalación de cielorraso en PVC, para los baños del Restaurante. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | PARQUE DE LOS NOVIOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Amarre de hierro para zapatas y pedestales. | Fundida en concreto para zapatas - módulo de baños | Amarre de hierro para zapatas y pedestales. | Fundida en concreto para zapatas - módulo de baños |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |
|  |  | N/A | N/A |
| Fabricación de la estructura metálica para instalar en el Túnel del Amor. | | | |
| FONTANAR DEL RIO | | FONTANAR DEL RIO | |
|  |  |  |  |
| Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. | | Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños. | |
| UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) | | UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Retiro de Luminarias en Canchas de Beisbol | | Retiro de Luminarias en Canchas de Beisbol | |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|  |  |  |  |
| Desmonte de juego en madera en mal estado | Retiro de juego en madera en mal estado | Demolición de placa en concreto | Retiro demolición placa de concreto |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|  |  |  |  |
| Llegada de materiales (Bordillos) | Llegada de materiales (Adoquines) | Realización de medidas zona de adoquines | Llegada de materiales (Adoquines) |
| VIRREY CHICO | | VIRREY CHICO | |





Suministro e instalación de canecas

VIRREY CHICO





Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto

VIRREY CHICO





Desmonte de Campamento - Retiro de materiales - aseo general






Desmonte de Campamento - Retiro de materiales - aseo general

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL









**ANEXO 5.** REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (1)




El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (2)

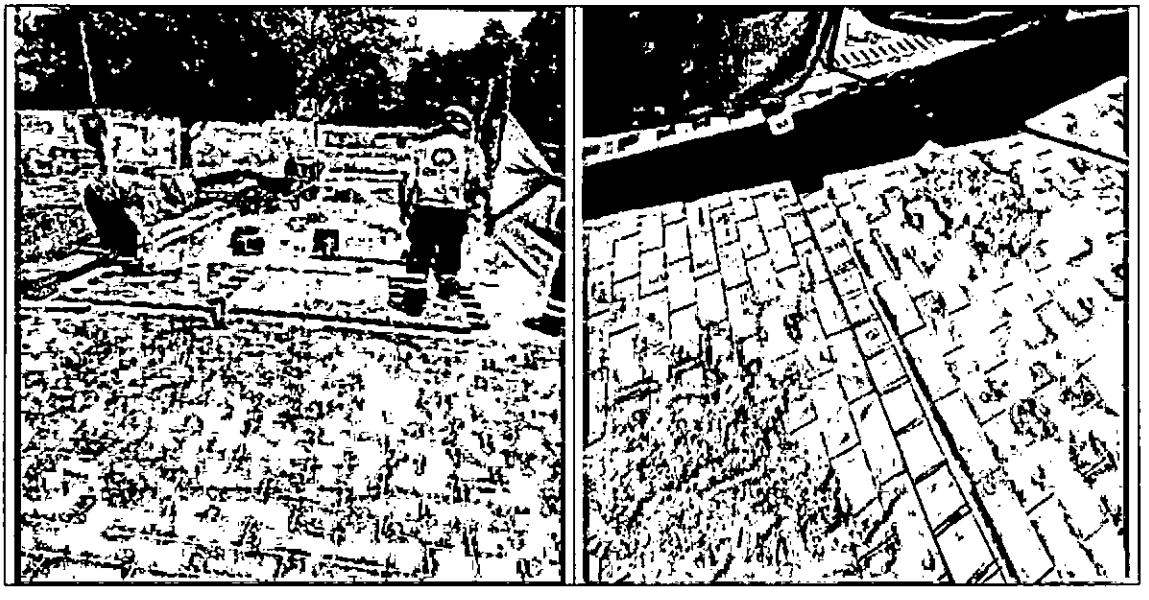


El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (3)

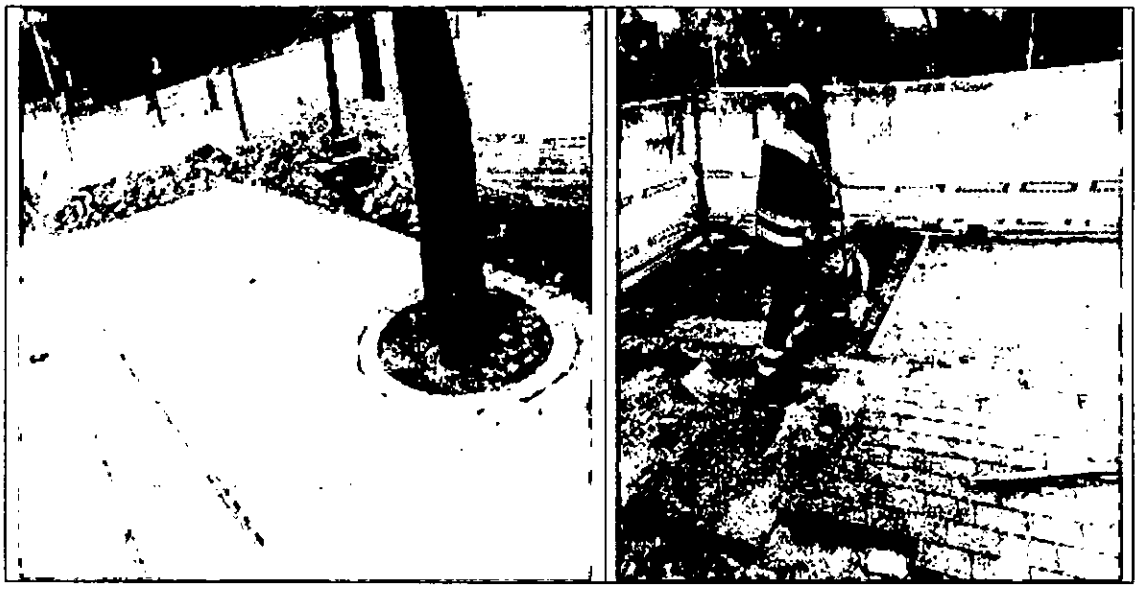


El Tunal. Instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (4)

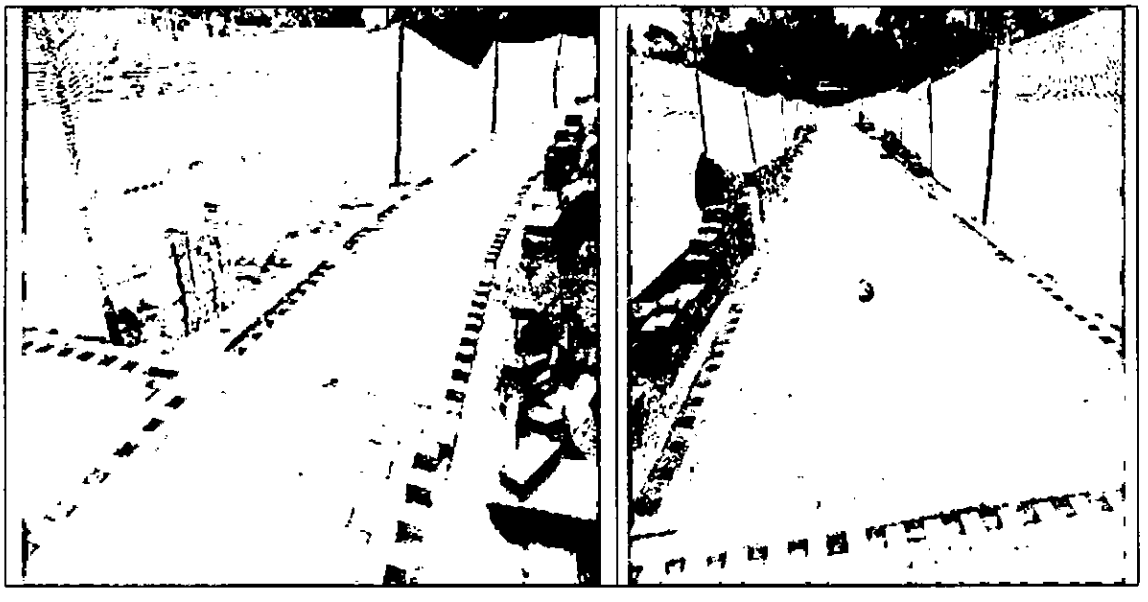


El Tunal. retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (5)

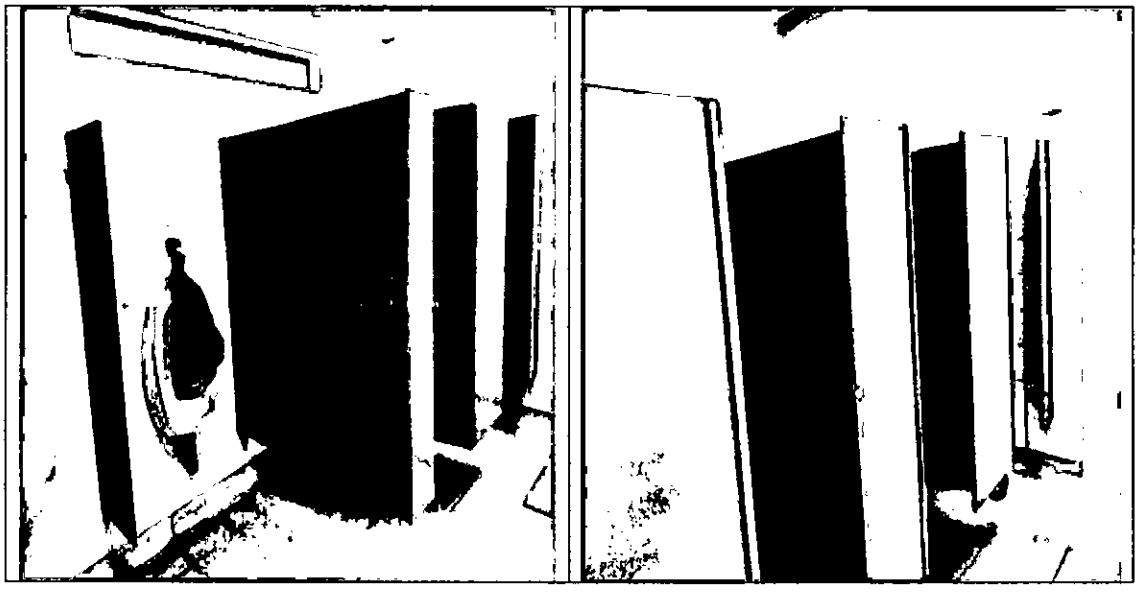

El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (6)




El Tunal. Resane y pintura de portería # 1, se avanza en portería #4, se inician trabajos en portería #2

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (7)

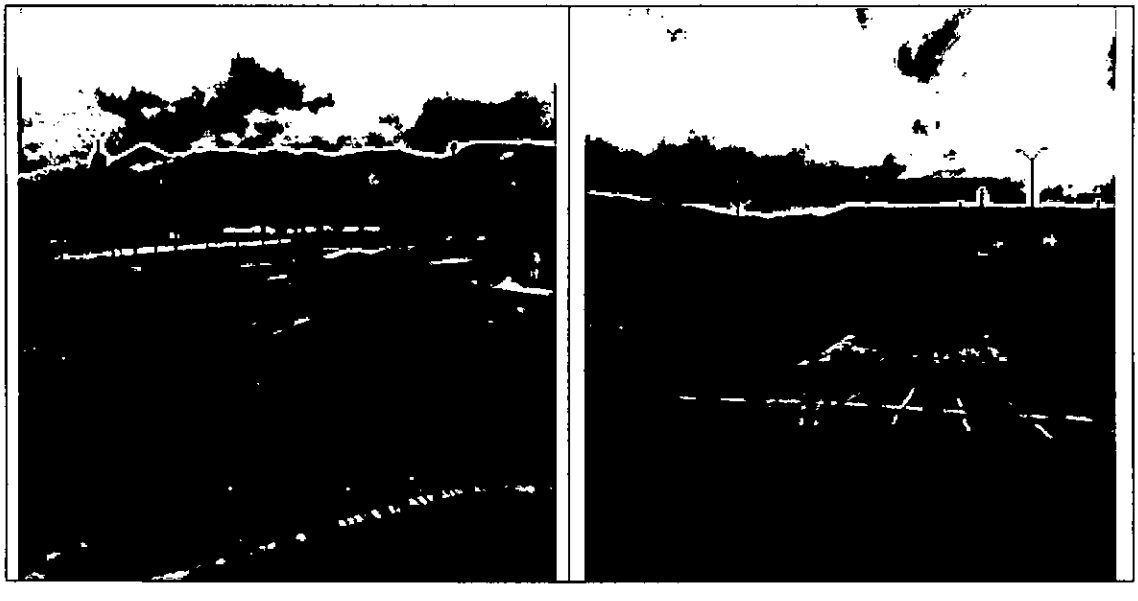


El Tunal. Instalación de asfalto en zona de llagada y con trabajos complementarios de mantenimiento y adecuación de la pista y su contorno existente.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (8)

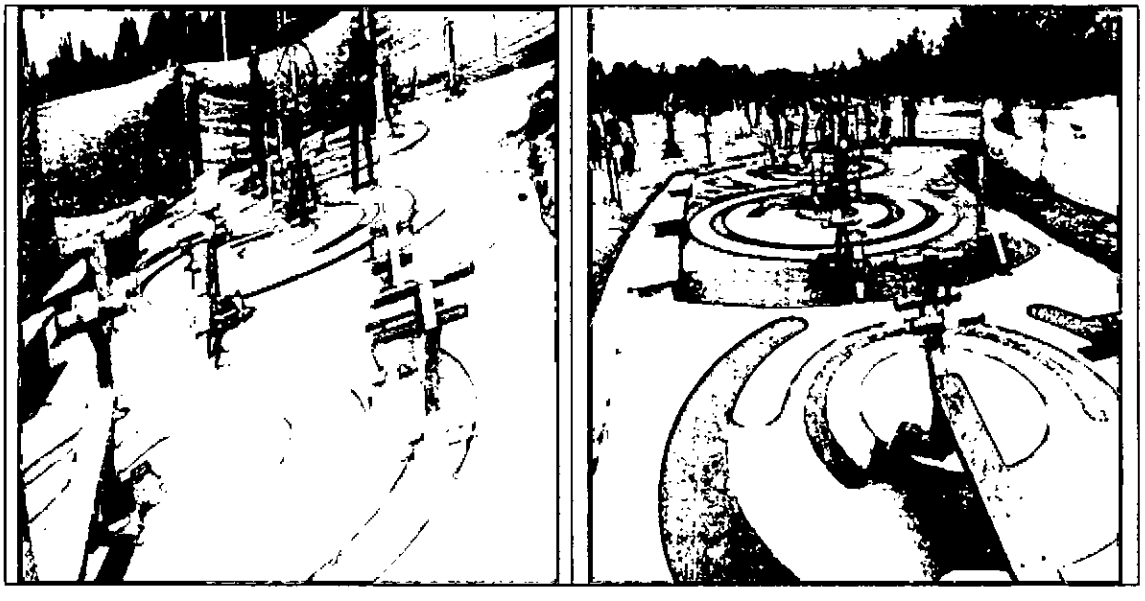


El Tunal. Gimnasio- Se pone en servicio la zona de gimnasios # 1.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (9)

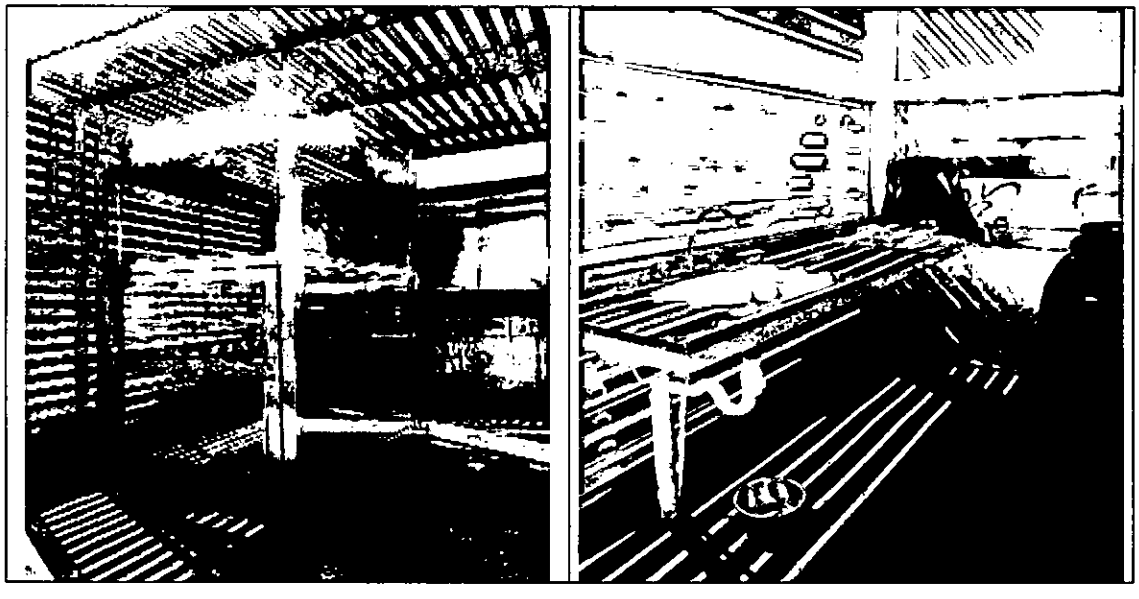

Parque Illimani. - Adecuación del módulo de baño.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (10)




Parque Eduardo Santos. Instalación de enchape en baños de coliseo y la instalación de biosaludables ya restaurados.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (11)

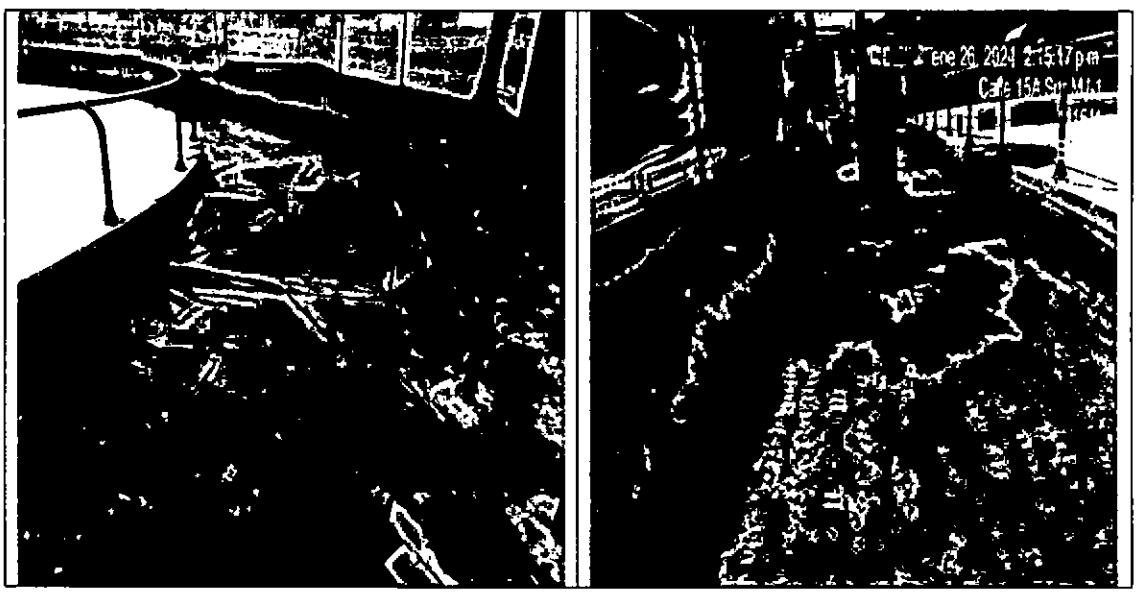


Parque La Fragua. Instalación de geotextil en la excavación de la pista de patinaje en asfalto.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (12)




Parque Cayetano Cañizares. Entrega y puesta en servicio de las fachadas verdes.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (13)

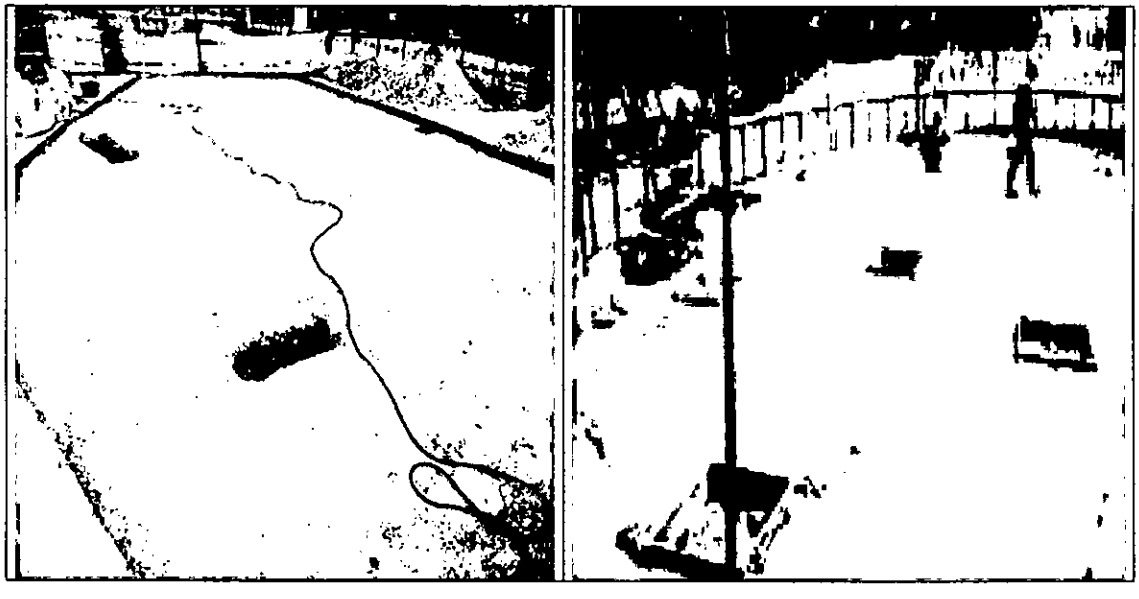


Parque Nuevo Muzu. Fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (14)

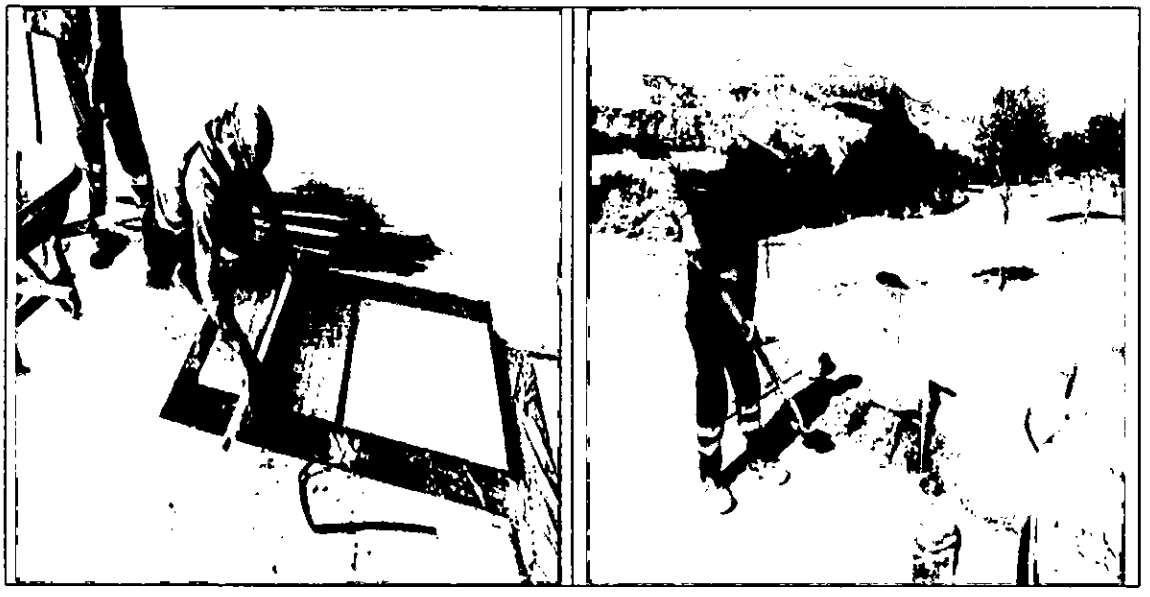

Parque Villa Alemana. Fundida de tapas de cajas de inspección e instalación de equipamiento urbano.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (15)




La Victoria. Reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (16)

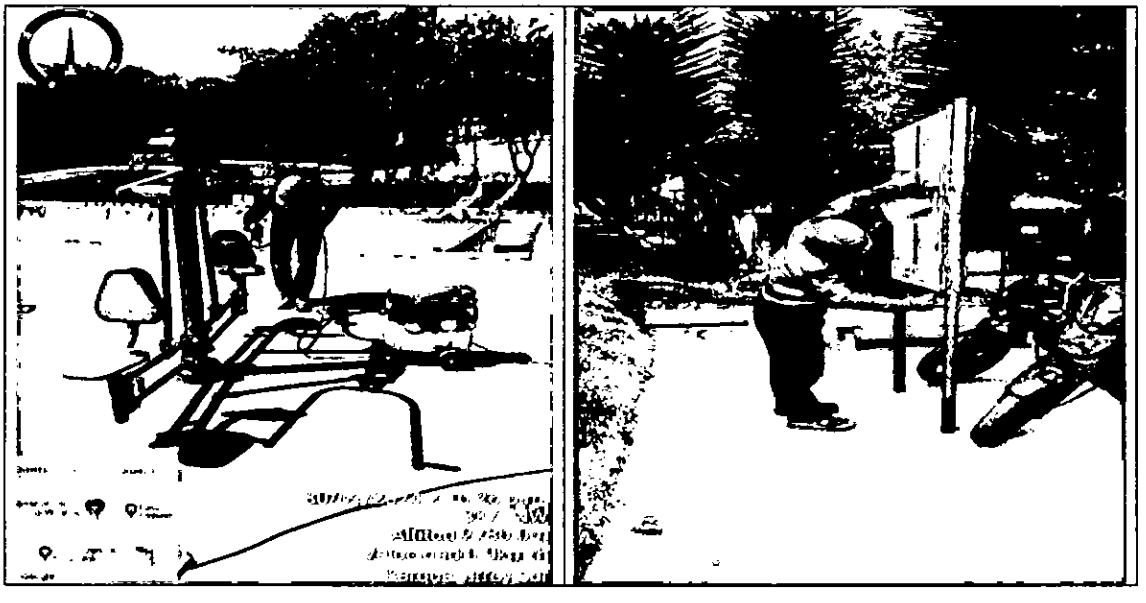


Virrey Sur. Mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (17)

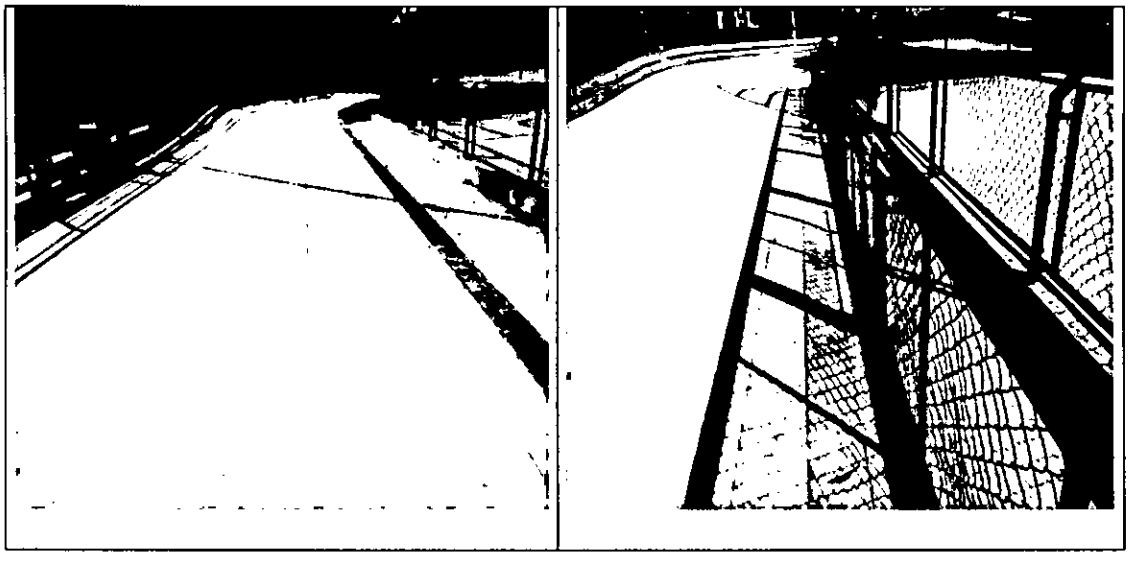


Alta Blanca. Se termina la pulida de los tramos que se realizaron en granito en la pista de patinaje.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (18)

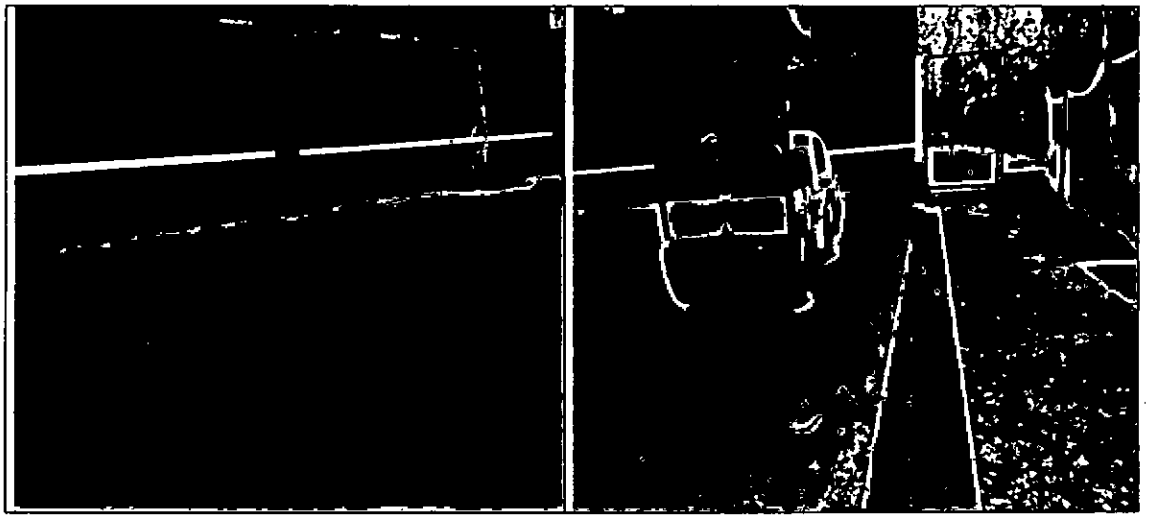

PDR. Cancha de Tenis- Se revisa que la base granular compactada no presenta fallos. Se termina la instalación de bordillo prefabricado en áreas perimetrales de la cancha de squash.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (19)



Canal Rio Negro. Subsanación de las observaciones al Contratista, referentes a la instalación de la malla eslabonada y a los remates de soldadura en los módulos del cerramiento.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (20)



Parque de los Niños. Se está realizando figuración de hierro para viga y pilotines - se realiza construcción de pozo aguas lluvias.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (21)



Parque de Los Novios. Se continua la demolición de cimientos enterrados para conformar las zapatas en el sitio donde se instalará módulo de baños. - Se realiza replanteo topográfico en el Túnel del amor.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (22)



Parqueadero del Parque de los Niños. Se solicita el retiro de agua y la recompactación del material. Se termina la extendida y compactación de la subbase granular e=30 cm. - Se revisa que la subbase granular compactada no presenta fallos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (23)



PDR- Cancha de baloncesto. Se solicitó el retiro del agua y el secado; la compactación del material.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (24)




Simón Bolívar. El Carbón - Se revisa la instalación externa e interna de tubería PVC para los baños

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (25)

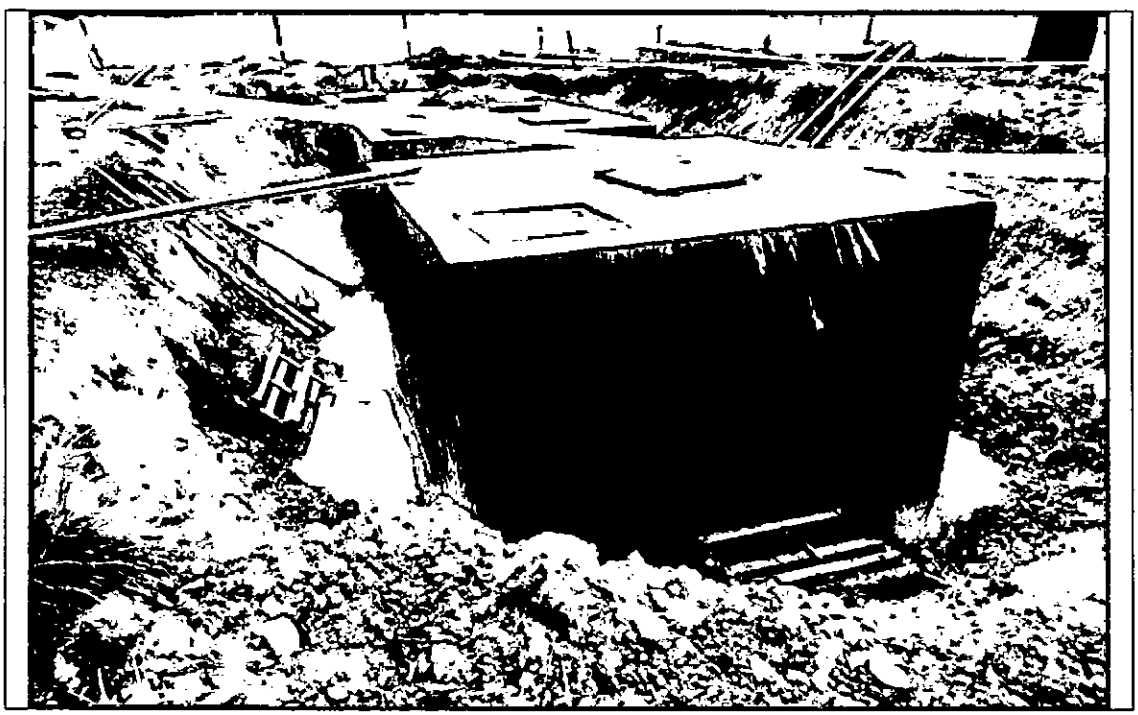


| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

Simón Bolívar Sector Maná- Retiro del agua para terminar la Impermeabilización mediante la aplicación de IGOL denso por la parte externa e inferior de los tanques sépticos.

## FOTOGRAFÍA (26)

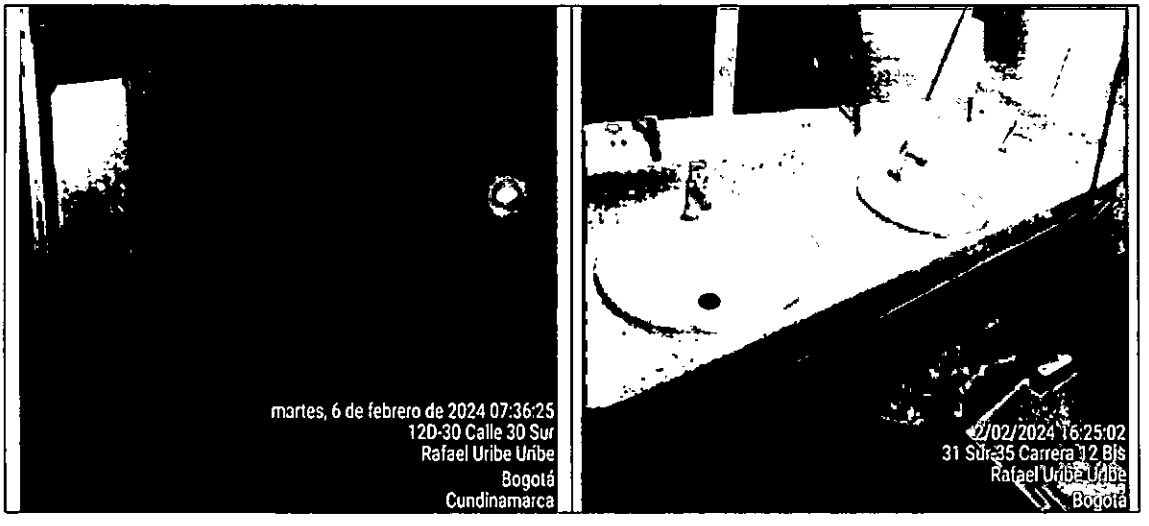


Bosques de San Carlos. Se realiza el suministro e instalación de las divisiones metálicas en baños hombres y mujeres – se aplica nuevamente Sika Flex alrededor de los lavamanos baño de hombres.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (27)




Bosques de San Carlos. Se realiza la protección de las raíces de los árboles con tubería PVC D=6" malla electrosoldada y concreto en zona de grecos.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (28)



Bosques de San Carlos. Se realizó el suministro e instalación de juego en la zona infantil.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (29)



Villa de Los Alpes. Se realizo la instalación de los biosaludables arreglados y pintados.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (30)




Olaya Herrera. Suministro e instalación de las colchonetas para la base en concreto de las luminarias en la cancha de futbol.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (31)

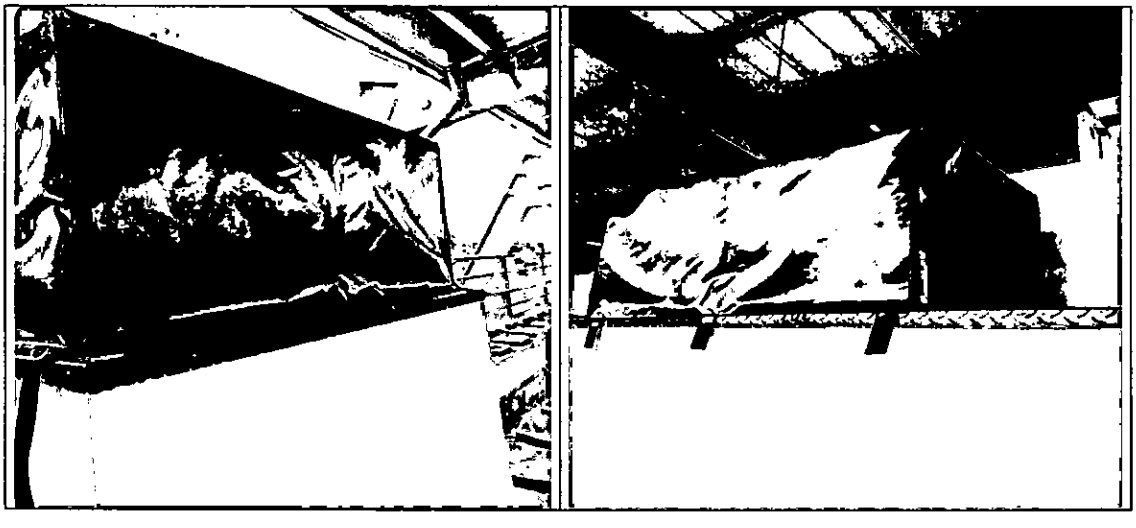

Olaya Herrera. Suministro e instalación de forros para los bajos zona de gradería.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (32)




Parque El Tunal. se avanza con el retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (33)

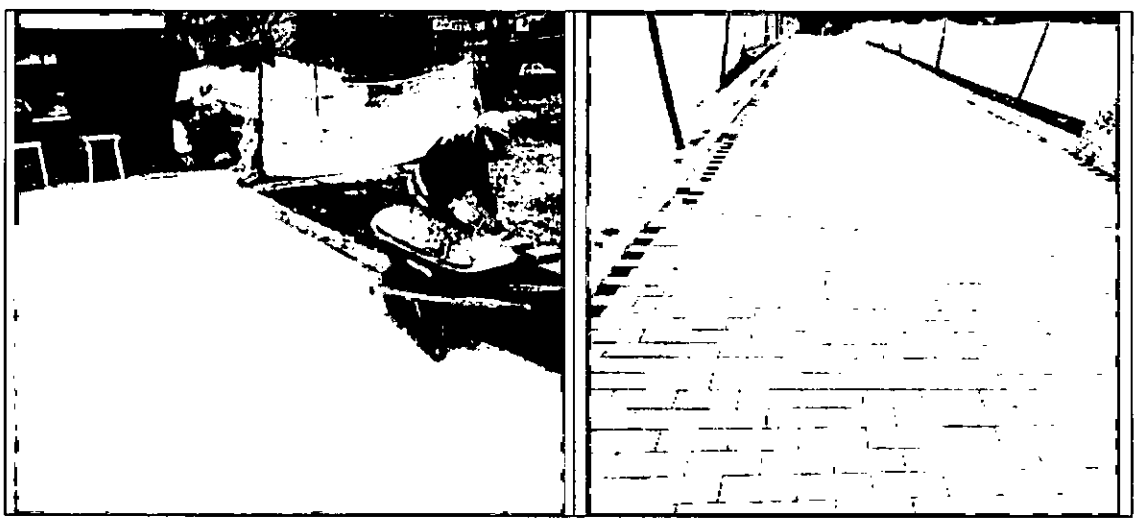


Parque Tunal. Senderos- Instalación del adoquín nuevo y remates en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con quiosco cafetería puerta # 4. se avanza con la instalación de medios y fundida de cintas de concreto, en estos tramos.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (34)

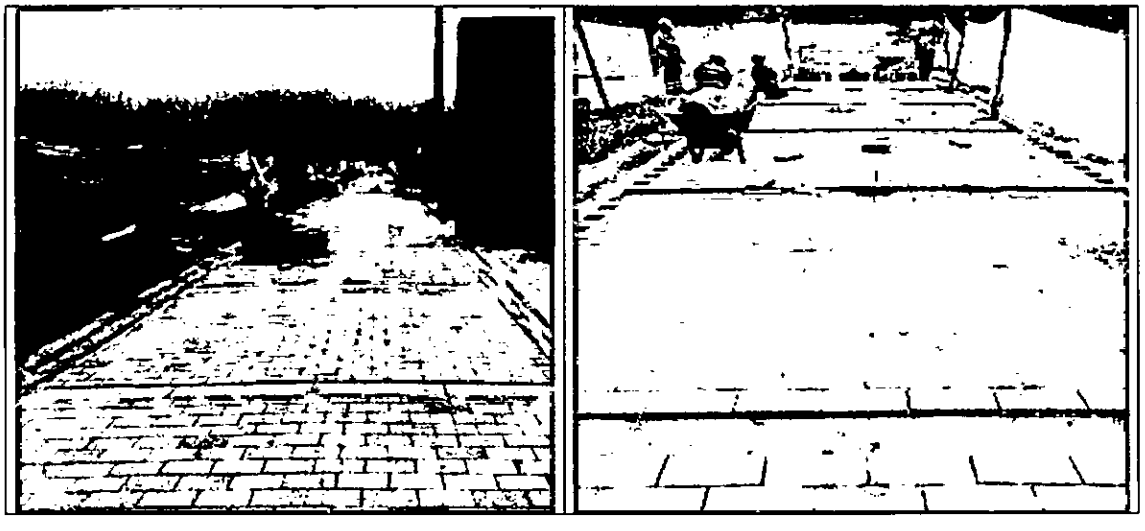


Parque El tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (35)

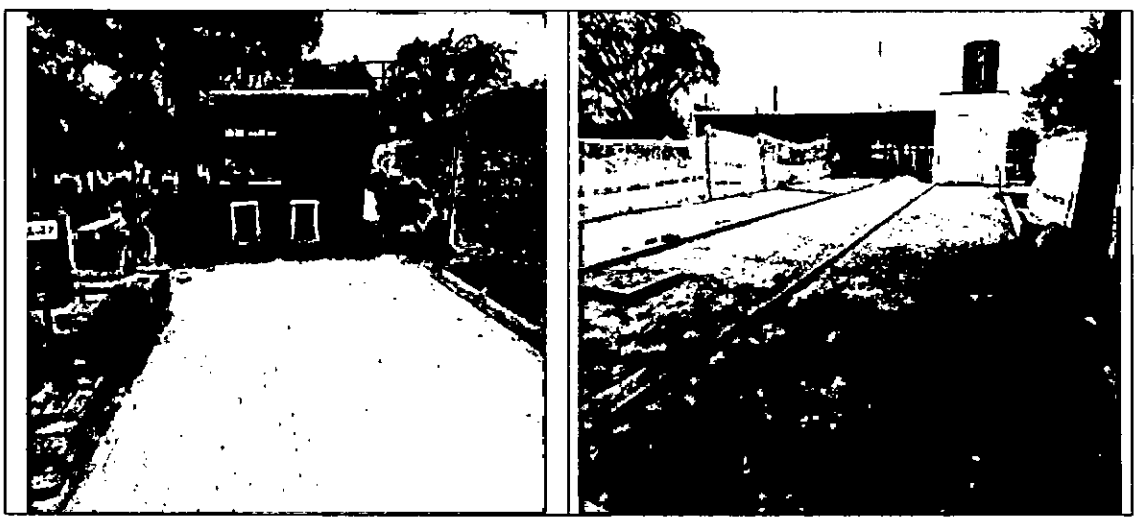

Parque El tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (36)



Parque El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (37)




Parque El Tunal. se terminan los trabajos de resane y pintura de portería # 1, se avanza en portería #4, se inician trabajos en portería #2.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (38)

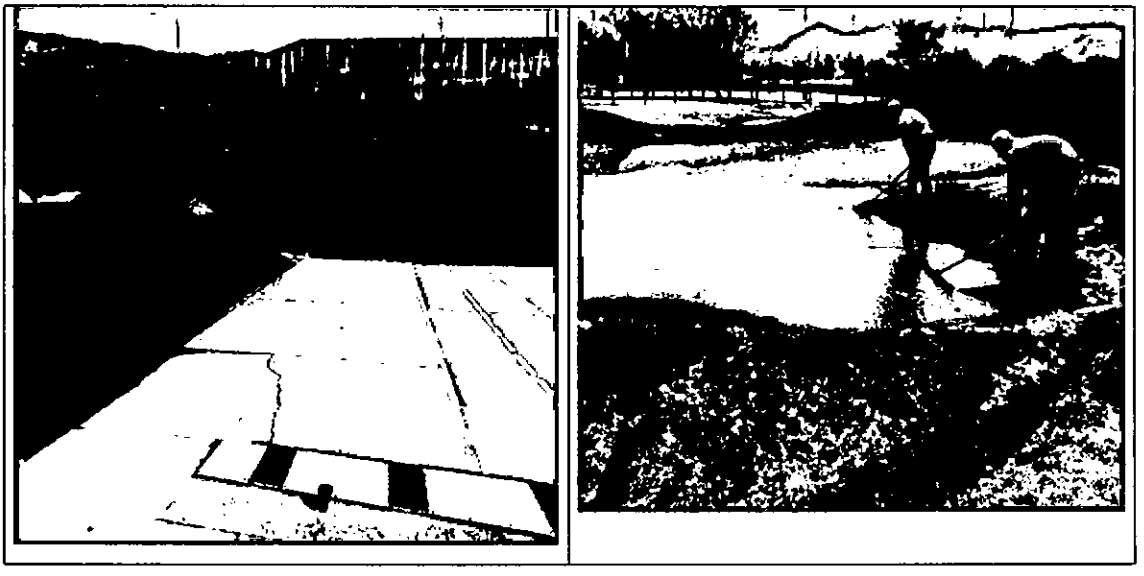


Parque El Tunal. se avanza con la instalación de asfalto en zona de llegada y con trabajos complementarios de mantenimiento y adecuación de la pista y su contorno existente.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (39)

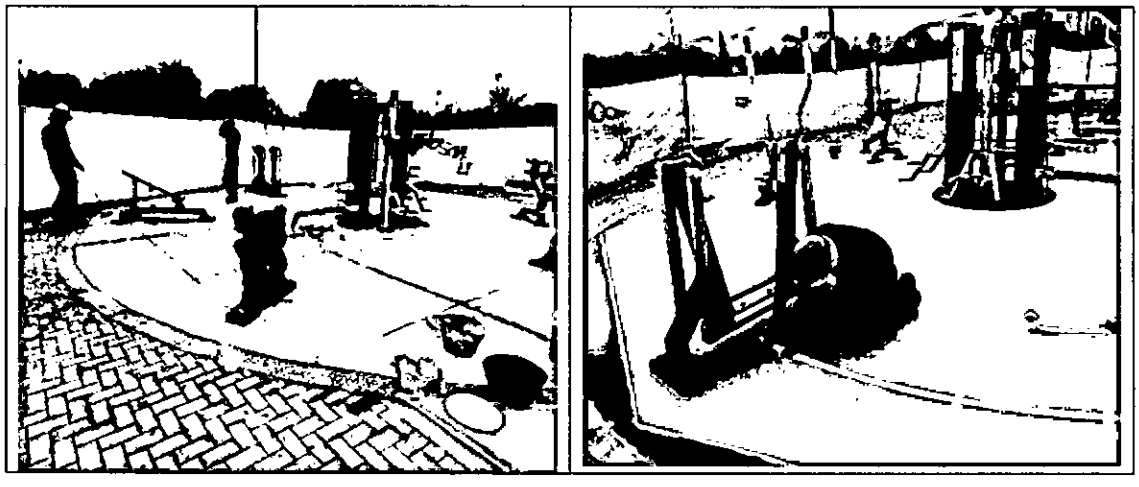

Parque El Tunal. Se termina y se pone en servicio la zona de gimnasios # 1

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (40)





Parque ILLIMANÍ. Se avanza en la adecuación del módulo de baños.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (41)

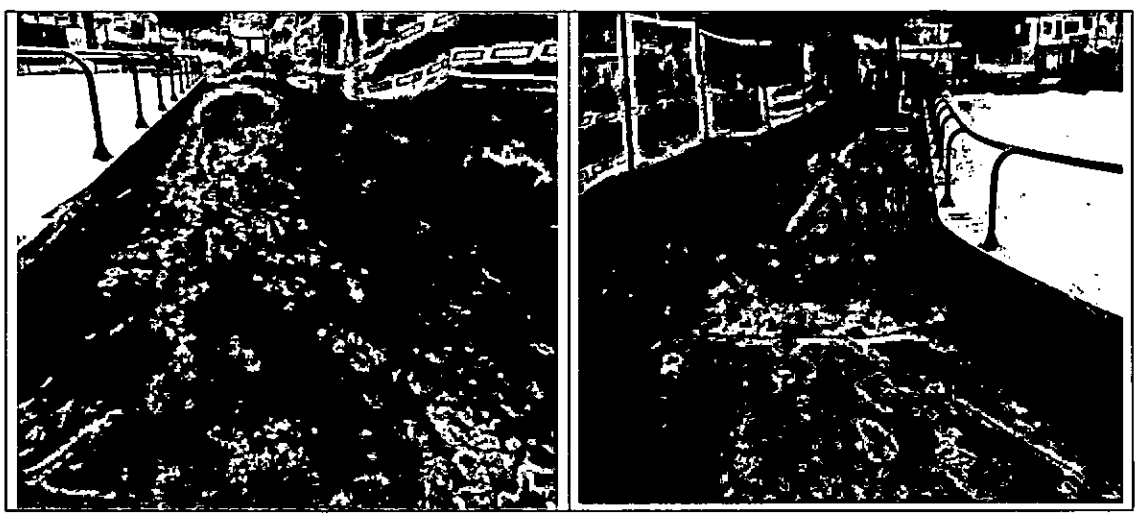

La Fragua. Instalación de geotextil en la excavación de la pista de patinaje en asfalto.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (42)




Nuevo Muzu. Fundida de la placa nueva en concreto en zona de juegos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (43)




Villa alemana. Fundida de tapas de cajas de inspección e instalación de equipamiento urbano.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (44)

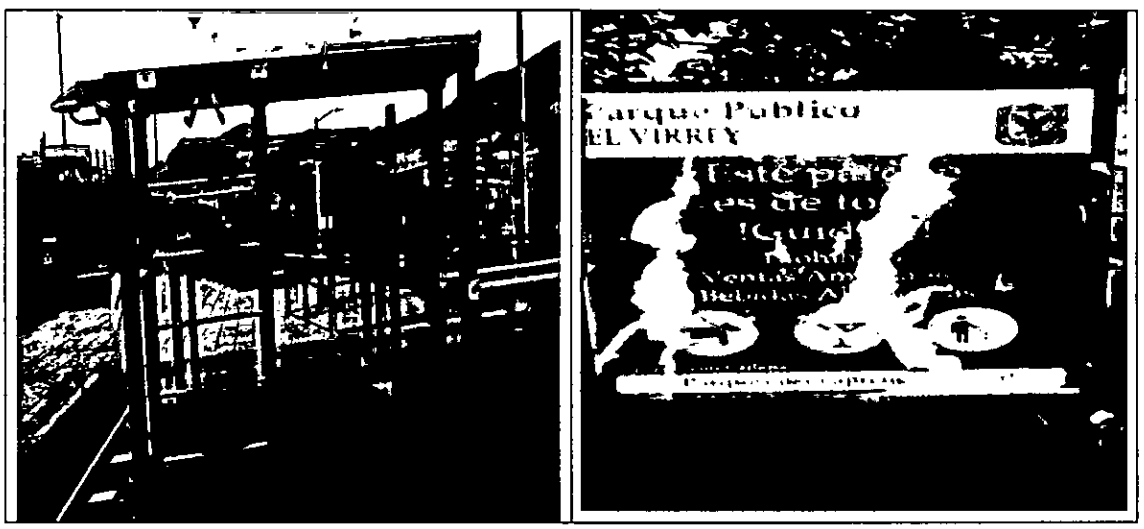


La Victoria. Se realiza la reunión de socialización de las actividades a realizar y acta de inicio.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (45)



Virrey Sur. se inician actividades con el mantenimiento y arreglos hidrosanitarios en baños y mantenimiento de biosaludables.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (46)



Bosques de San Carlos. Instalación de pintura vinilo en pared dentro de los baños de hombres y mujeres.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (47)




Bosques de San Carlos. Suministro e Instalación de Pintura de Biosaludables en taller.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (48)

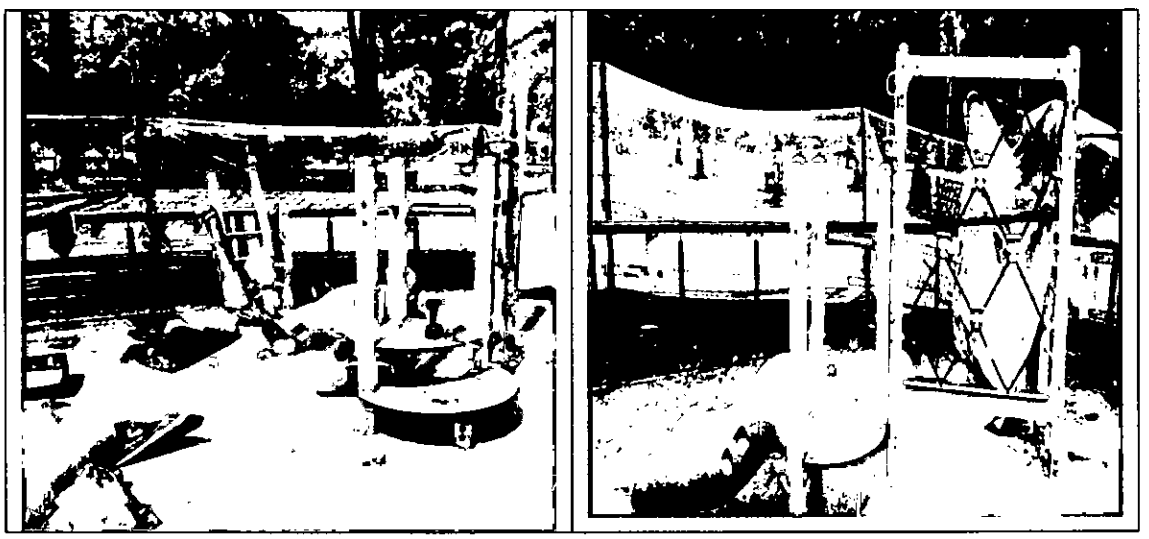


Bosques de San Carlos. Suministro e Instalación juego infantil zona media luna.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (49)

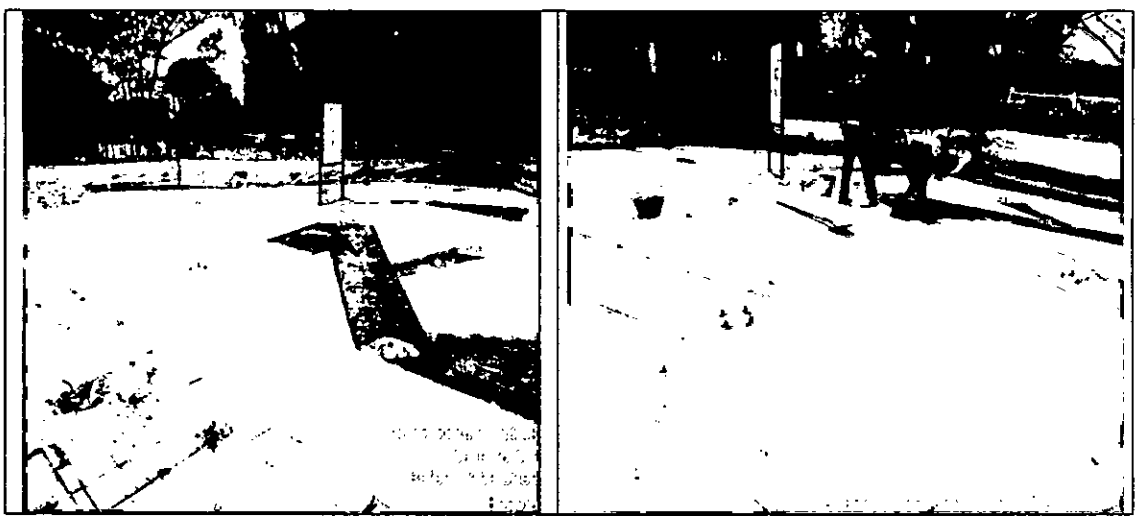


Bosques de San Carlos. Corte y reparación de placa piso en zona de Biosaludables.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (50)

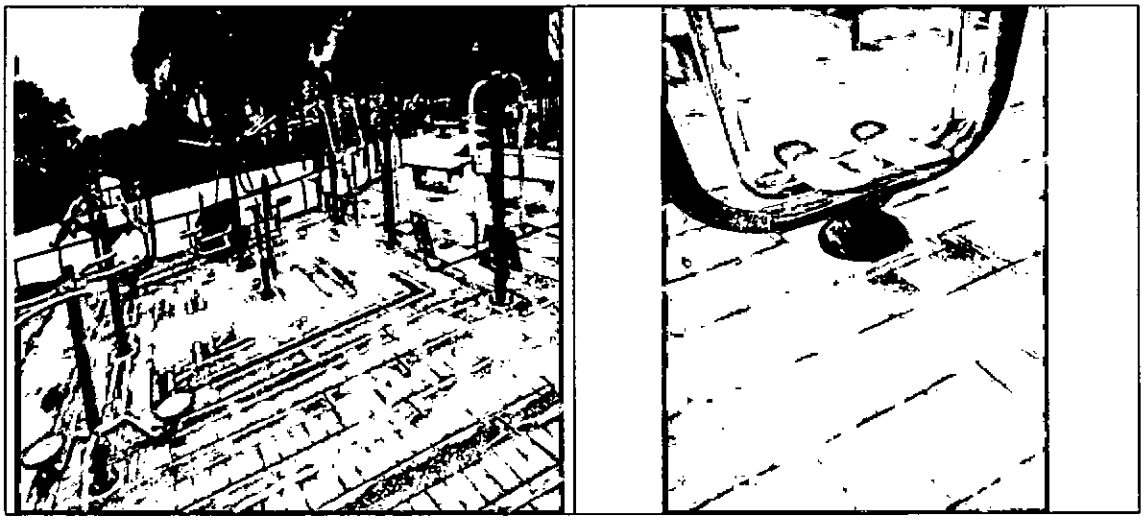


Villas de los Alpes. Se realizo la instalación de los Biosaludables arreglados y pintados.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (51)

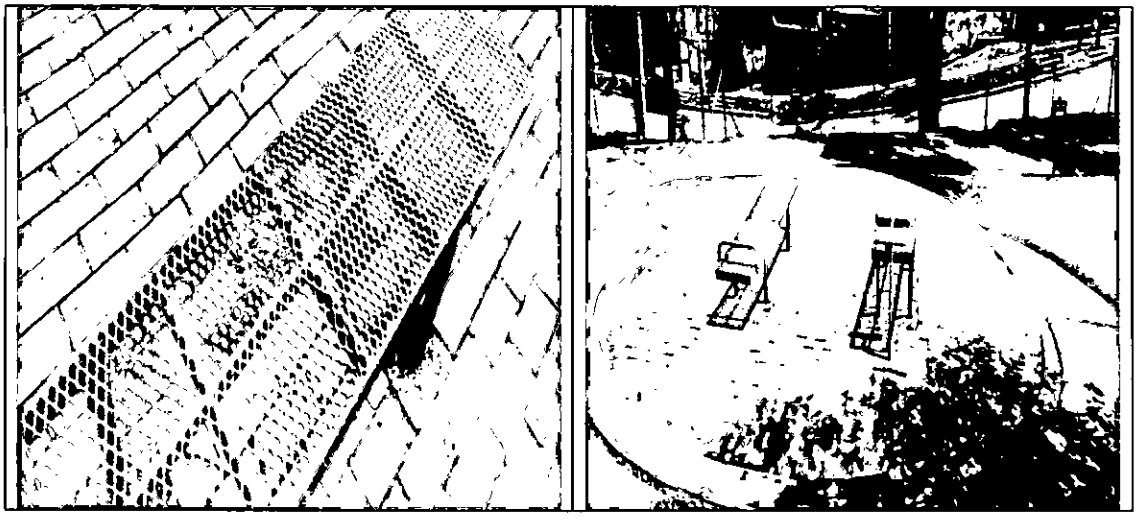

Villa de los Alpes. Se realizó la instalación de pintura en los módulos ruta da la vida.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (52)



Ciudad Montes. Suministro e instalación módulos malla de cerramiento Diag. 16 S.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (53)



Ciudad Montes. Suministro e Instalación de portones entrada posterior costado norte y entrada a la huerta costado sur.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (54)



Ciudad Montes. Lijado estructuras Módulo ruta de la vida.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (55)




Canal Rio Negro. Fijación de la malla eslabonada a la estructura metálica, con platinas y la aplicación de soldadura.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (56)

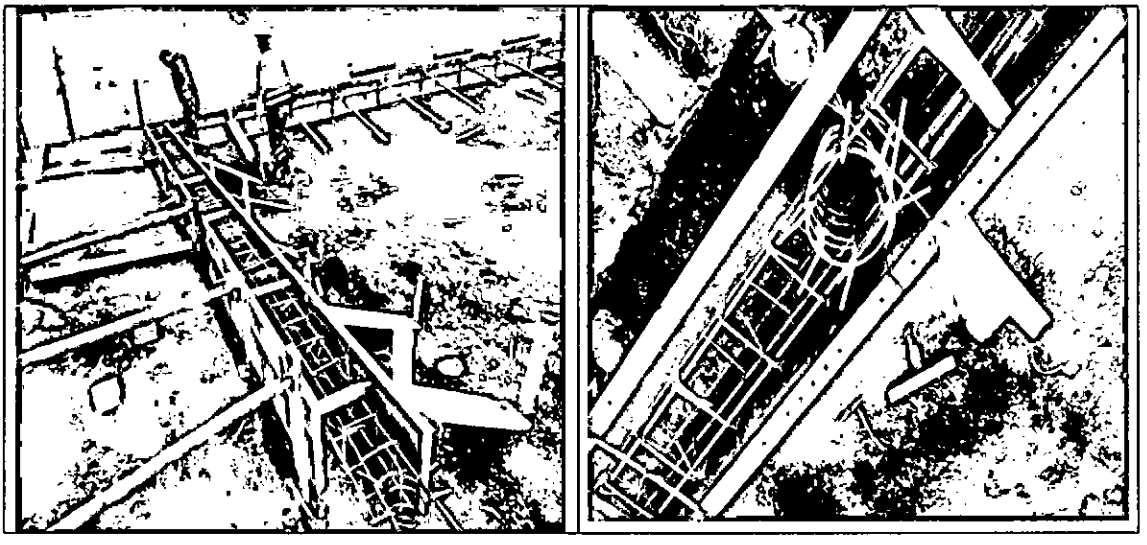

Parque de Los Niños. Armare de hierro, armado, Formaleteada y acodalado de viga y pilotes.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (57)




Parque de los Niños. Toma de muestras del concreto para estudios.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (58)

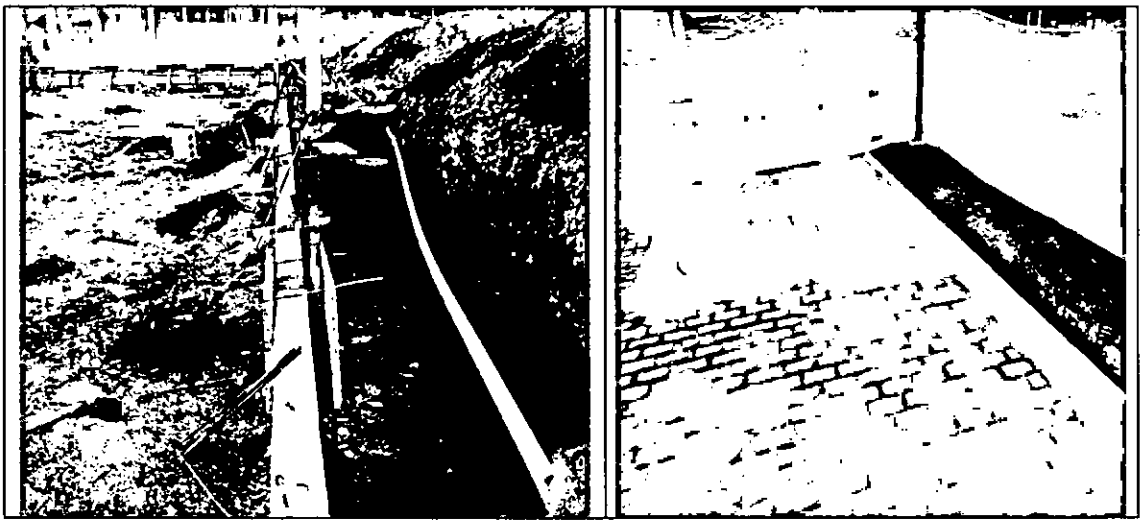

| | |
|---|---|
| Parque de Los Niños. Excavación para conformar sendero por costado occidental. | Parque de Los Niños. Construcción de caja de inspección en sendero. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (59)




Parque Sucre o Hippies. Reparación de piso en adoquín (reemplazo de elementos que están en mal estado o dañados.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (60)

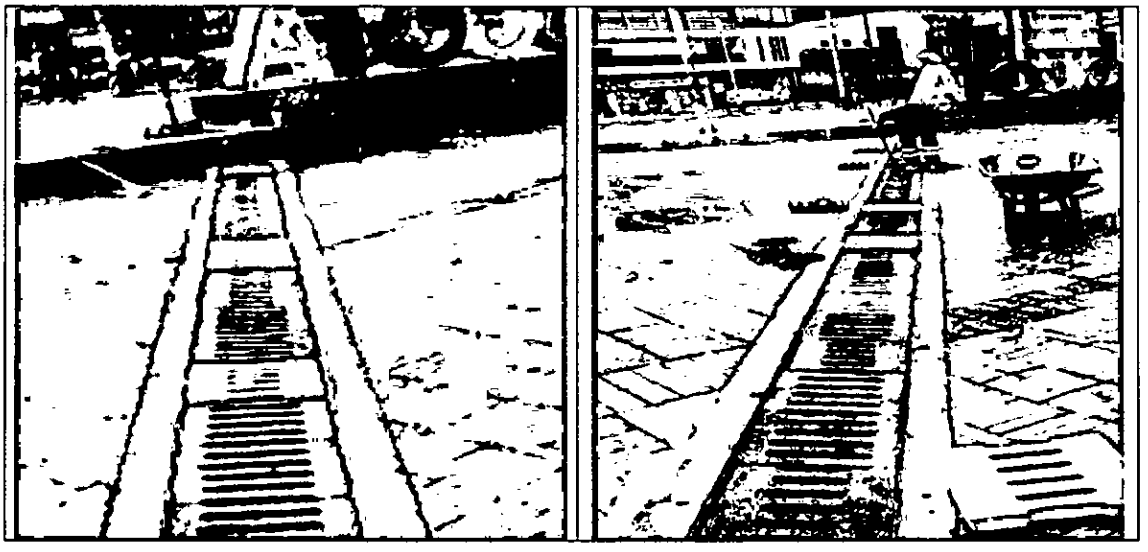


Parque Sucre o Hippies. Instalación de rejillas para cárcamo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (61)



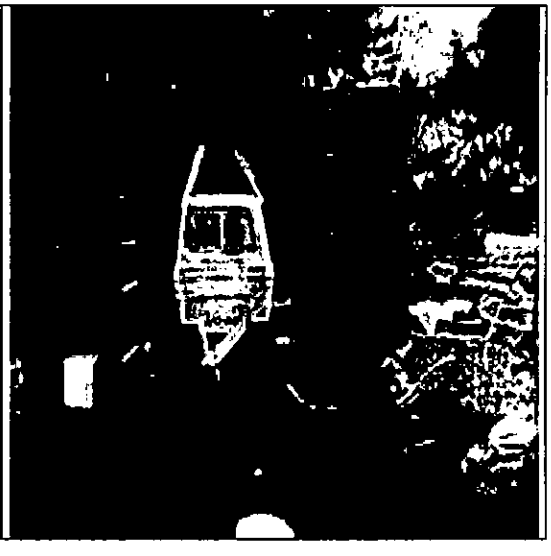

| | |
|---|---|
| Simón Bolívar- Maná. Proceso de repello al interior de los tanques sépticos. | Simón Bolívar- Maná. Equipos para limpieza al interior de los tanques sépticos. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (62)



Fontanar del rio. Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (63)



Fontanar del Rio. Comité de obra semanal. Selección del sitio donde se ubicará el Parkourt.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (64)



| | |
|---|---|
| Servitá .Arreglo desagües de lavamanos | Servitá. Conexiones eléctricas para alumbrado de lámparas en postes. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (65)




Canal Boyacá. Reunión de socialización con la Comunidad.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (66)

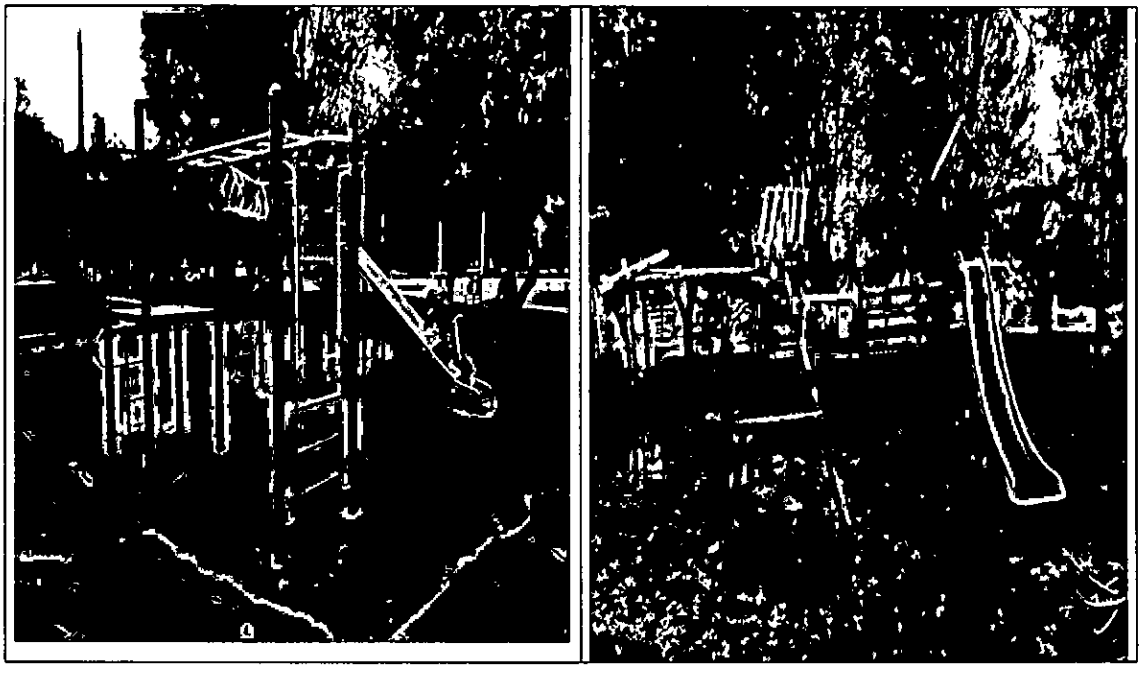

Canal Boyacá. Juegos existentes en el área perimetral.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (67)



Virrey Chicó. Desmonte de bancas y canecas

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (68)




Virrey Chicó. Desmonte de canecas.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (69)

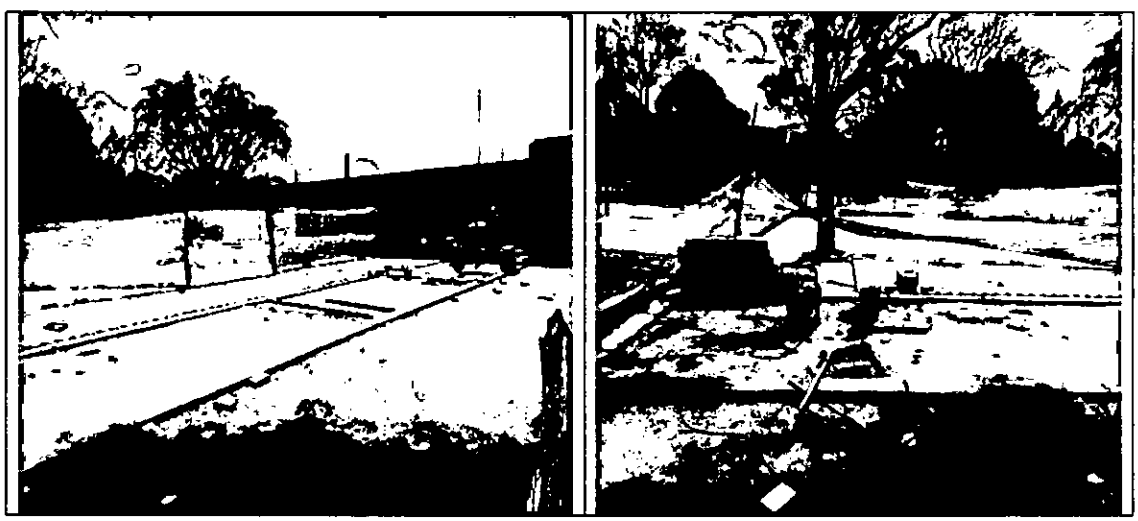


El Tunal. Retiro de adoquín en mal estado, su limpieza y nuevamente su reinstalación en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (70)

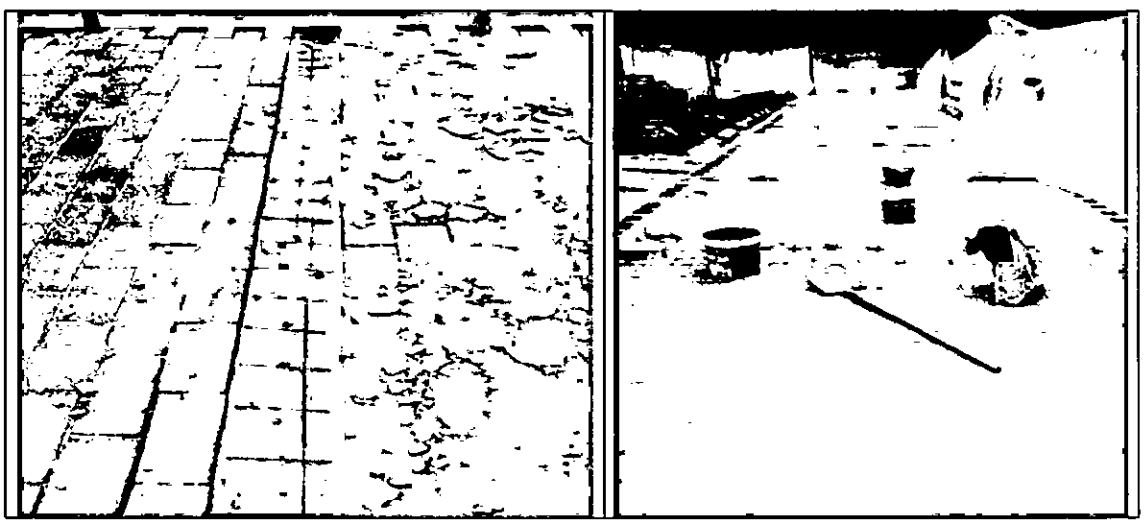

El Tunal. Remate y fundidas de cintas de confinamiento en concreto en estos tramos de adoquín reciclado, reinstalado nuevamente en sendero costado oriental casa del adulto mayor hacia el kiosco de la puerta #4,

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (71)




El Tunal. Remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (72)

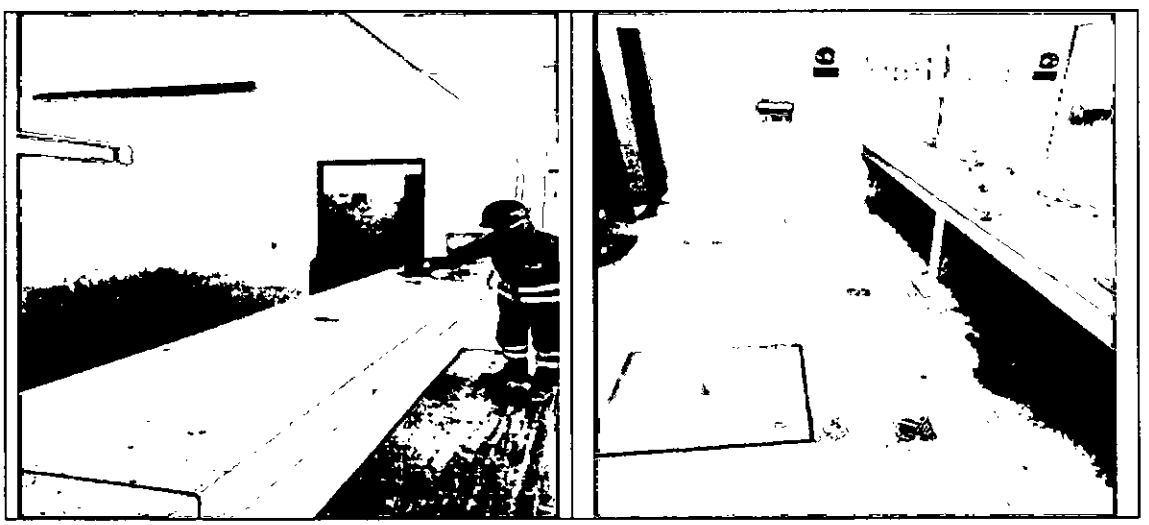

El Tunal. Aseo de los espacios para su respectiva puesta en servicio.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (73)



El Tunal. Remates de asfalto, demarcación y con la evacuación de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (74)



El Tunal. Mantenimiento de la zona de gimnasio # 2.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (75)



Eduardo Santos. Instalación de divisiones en los sanitarios y de puertas para ingreso a baños.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (76)




Eduardo Santos. Se avanza con la reinstalación de enchapes nuevos en baños de coliseo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (77)

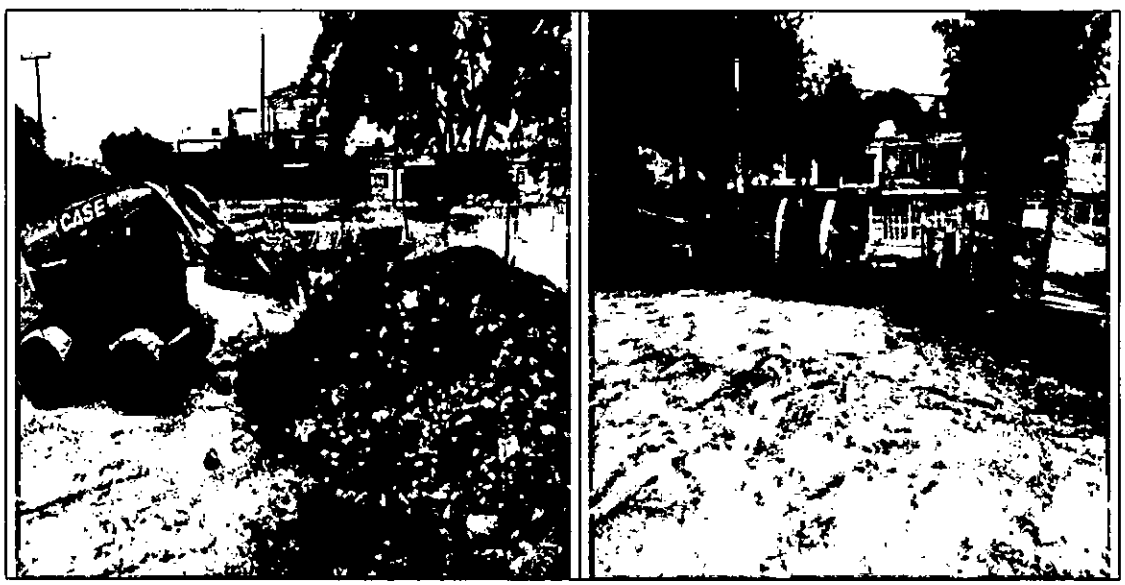


La Fragua. Excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (78)




La Fragua. Instalación de bases compactas sobre la excavación de la pista de patinaje .

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (79)

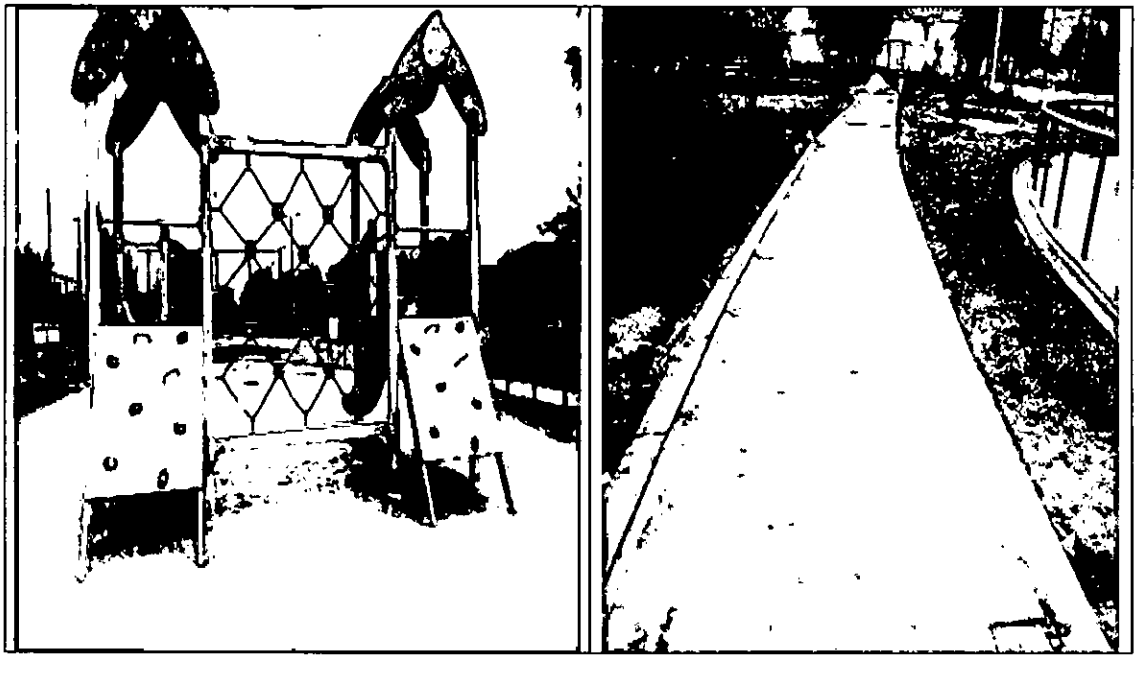

Nuevo Muzu. Adecuación de la zona de senderos en adoquín; inicio de pintura en placas nuevas de concreto en la zona de juegos y se termina el ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo; se inician la instalación de juegos infantiles.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (80)



Villa Alemana. Mantenimiento de cajas de inspección y remates de senderos en adoquín.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (81)



La Victoria. Mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (82)



Virrey Sur. Mantenimiento de biosaludables, mantenimiento de barandas

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (83)



Gilma Jiménez. Desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (84)





Bosques de San Carlos. Se realiza corte y figurado de hierro para fundir la viga zarpa zona grecorromanos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (85)

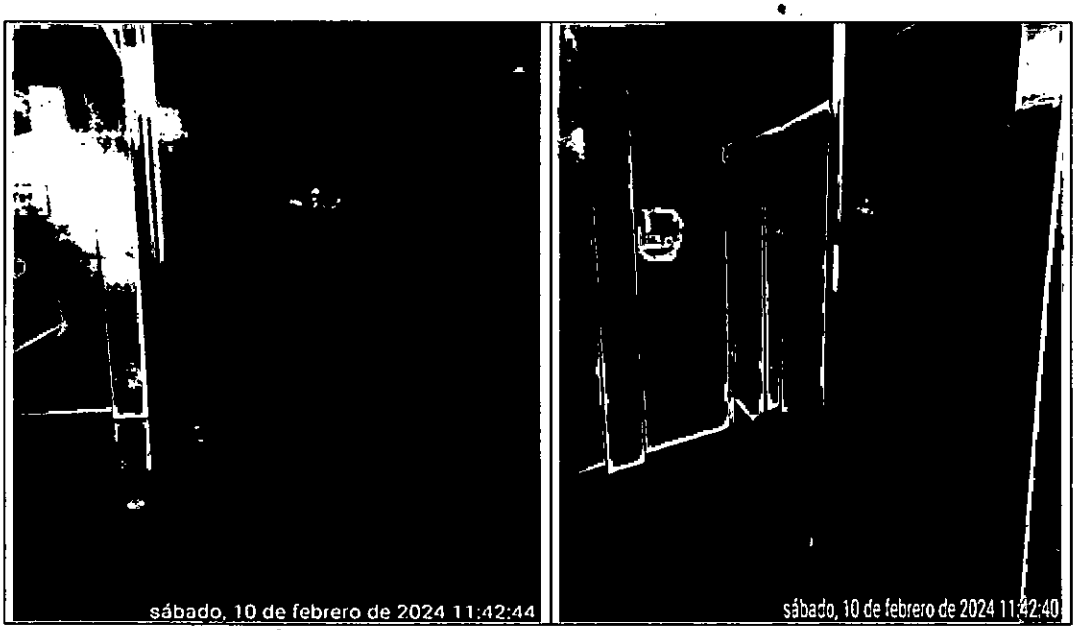



Bosques de San Carlos. Se revisan por parte de interventoría, las divisiones metálicas instaladas en el baño de mujeres.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (86)



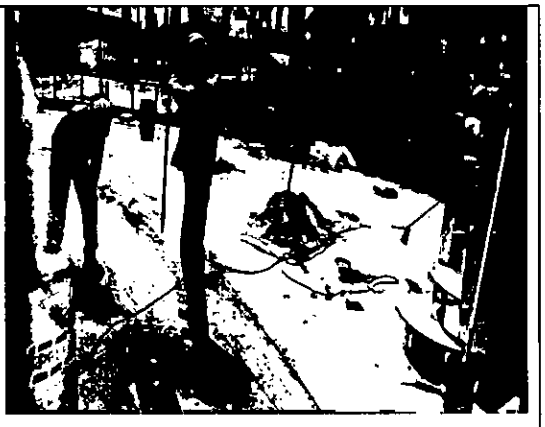

Bosques de San Carlos. Corte en piso para fundir viga de cerramiento parque infantil.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (87)



Villa de los Alpes. Se realizó la aplicación de pintura en los módulos ruta da la vida

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (88)




Ciudad Montes. Se realiza encintada, lijado de los elementos ruta de la vida.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (89)

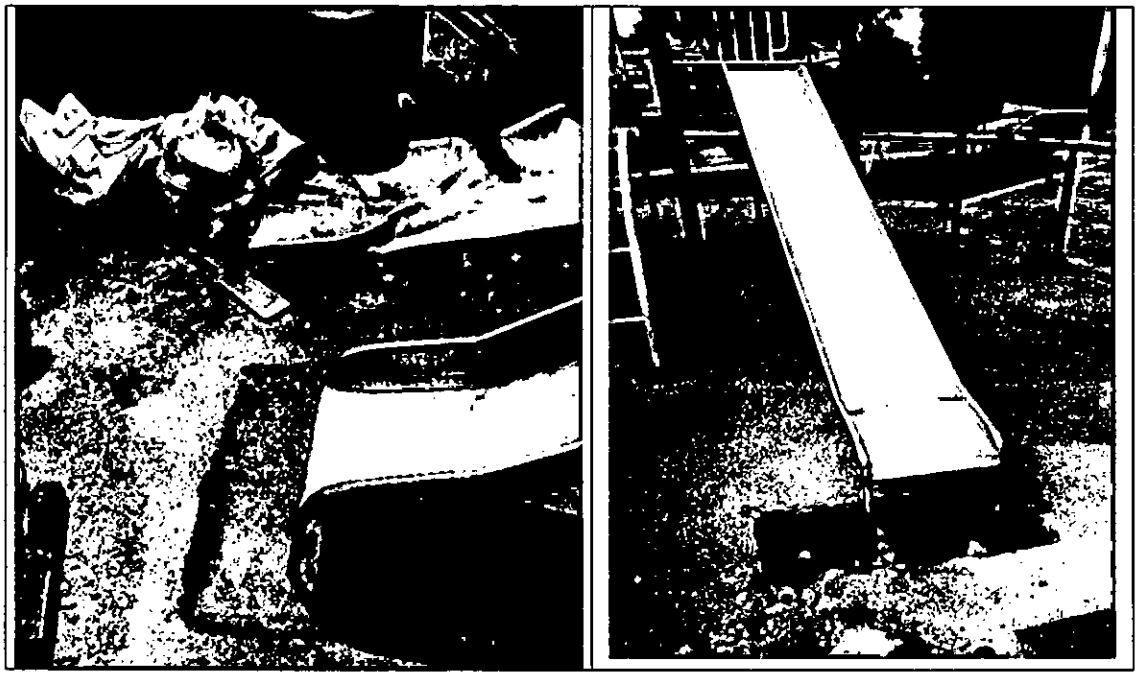

Canal Rio Negro. Instalación de deslizaderos metálicos

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (90)




Simón Bolívar. Tapada y repellada de fisuras al interior de los tanques sépticos en Maná.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (91)

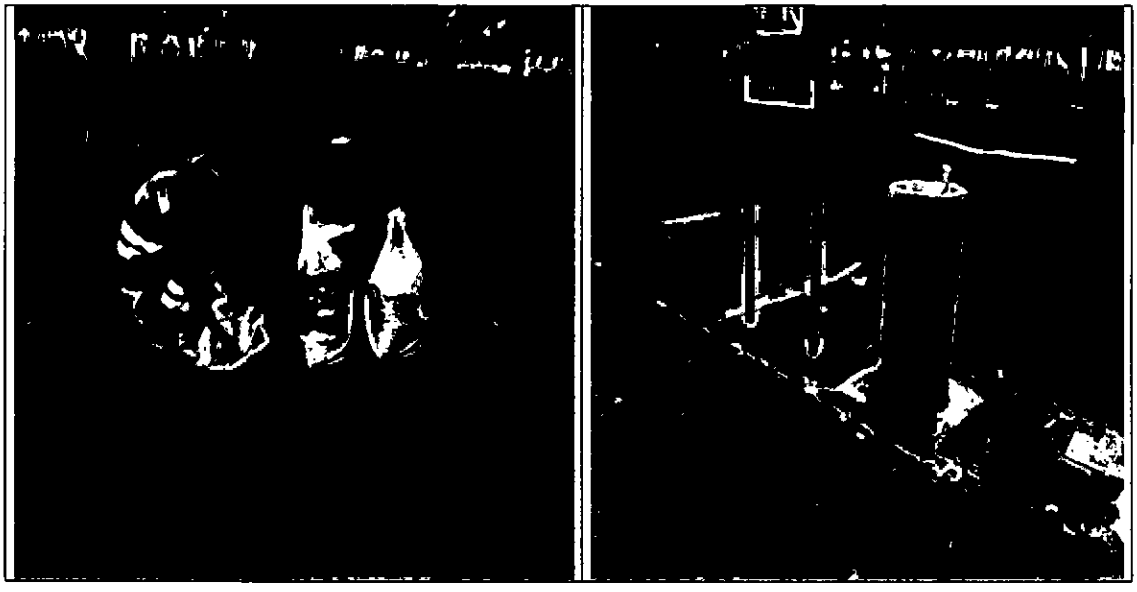

Simón Bolívar. Instalación de bebederos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (92)




Simón Bolívar. Inicio en la pintura de juegos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (93)

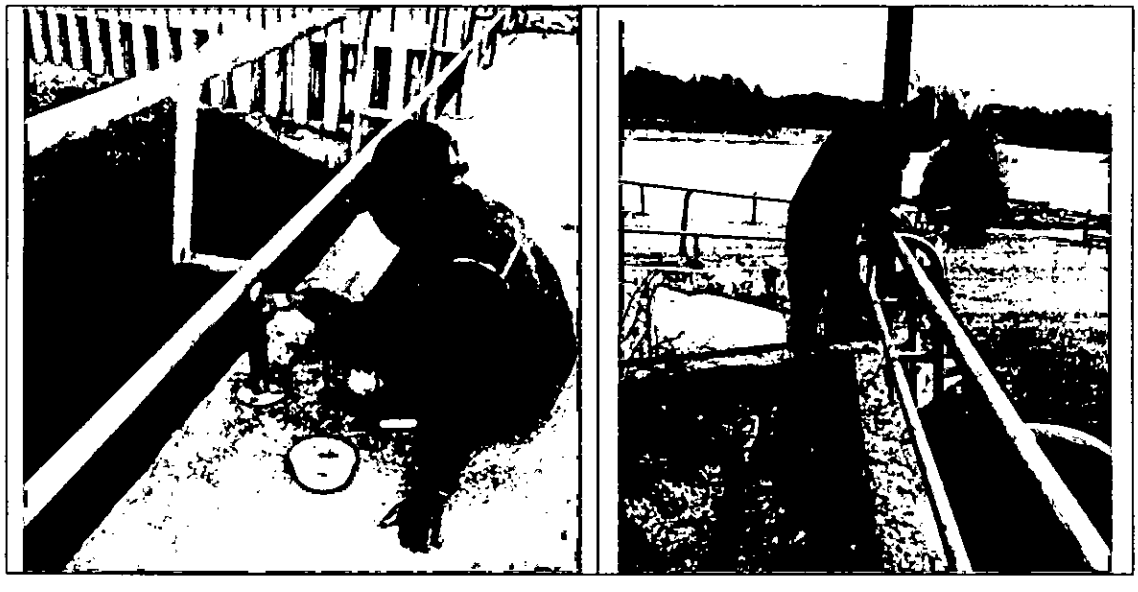


Simón Bolívar. Pintura barandas.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (94)

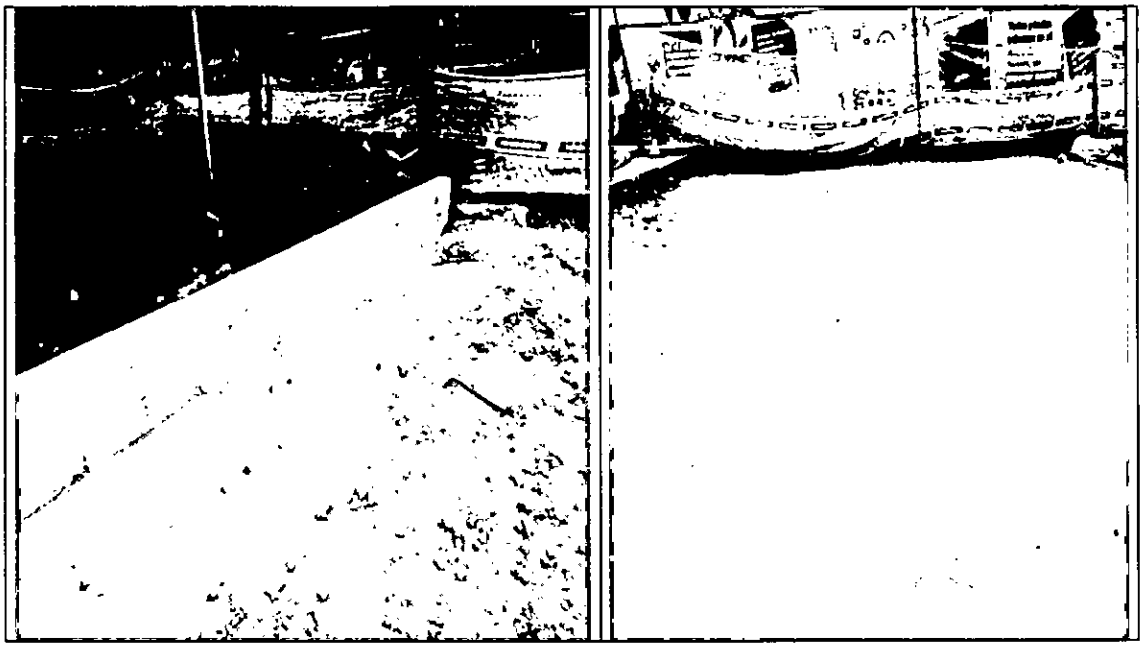


Parque de Los Niños. Instalación de sardinel prefabricado por costado norte y compactación de la subbase granular.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (95)

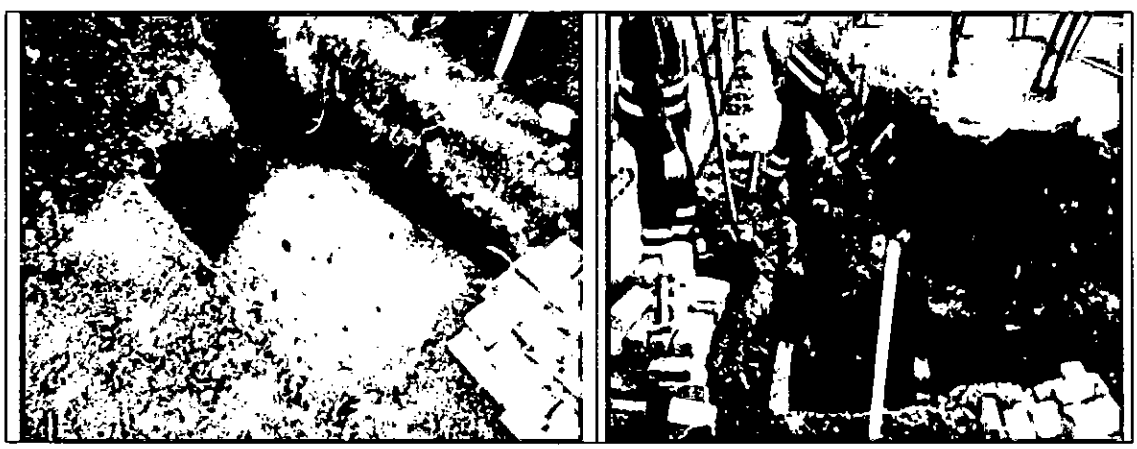


Parque de Los Niños-Parqueadero. Concreto de limpieza para conformar base de caja de inspección.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (96)

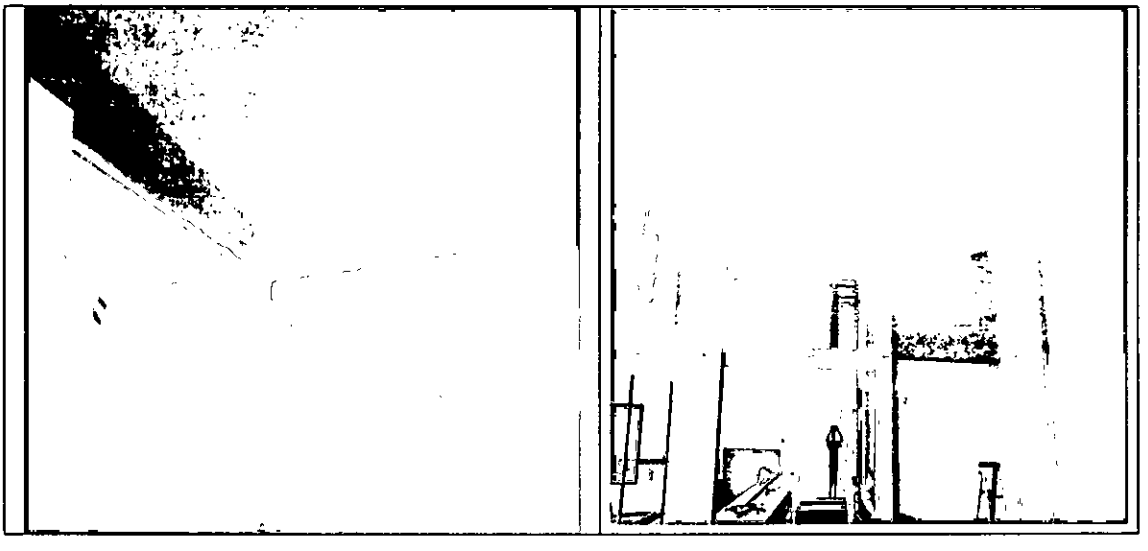

PRD- Administración. Instalación de cielorraso en PVC blanco en áula de sistemas.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (97)




PRD- Restaurante- Instalación cielorraso en baños del Restaurante.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (98)

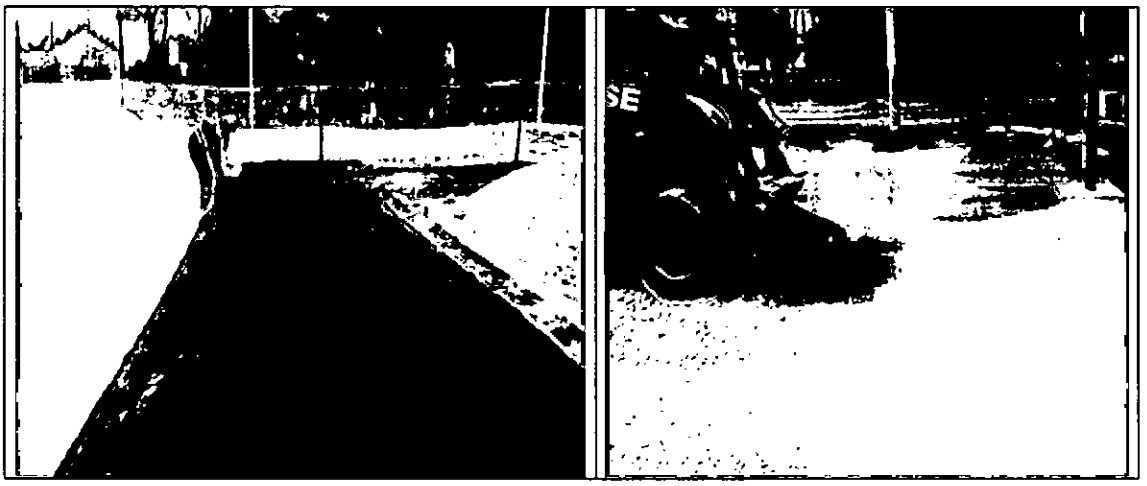

PRD- Canchas Baloncesto. Extendida y nivelación topográfica y compactación de la base granular.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (99)




PRD- Cancha de squash. Extendida y compactación de rodadura asfáltica 1350.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (100)

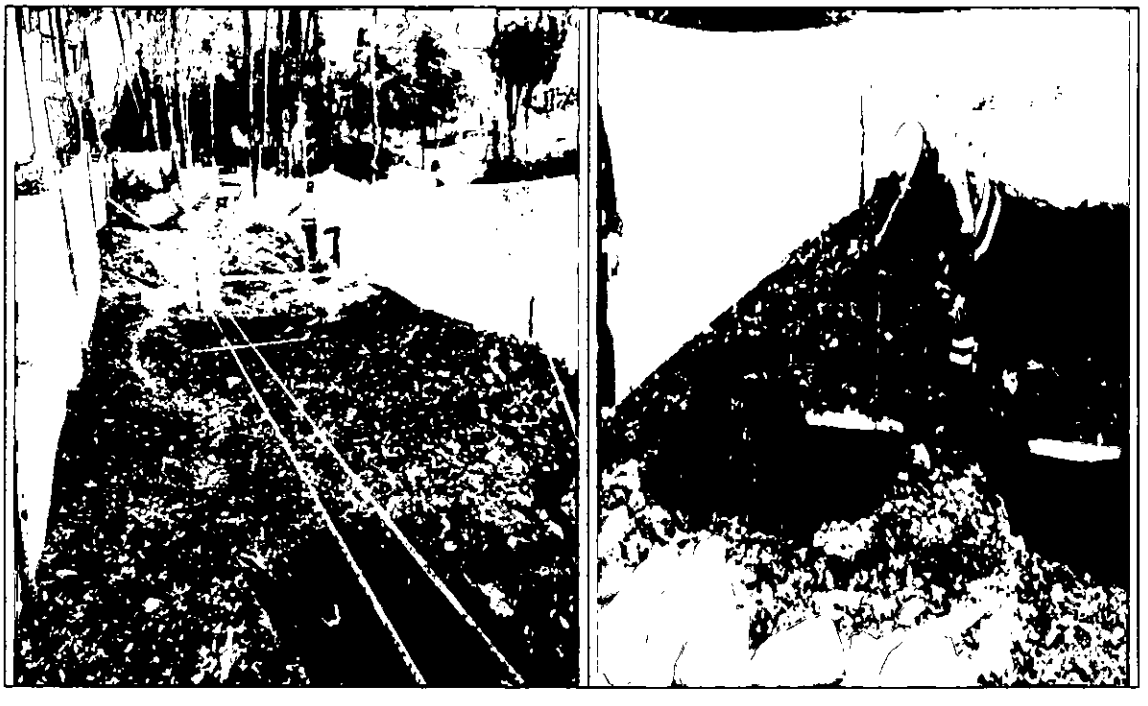

Parque de Los Novios. Excavación para construcción de zapatas en el sitio donde se instalará el módulo de baños.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (101)



Parque de Los Novios. Túnel. Fundida en concreto para pedestales

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (102)




Parque de Los Novios. Aplicación de pintura en el Módulo de Administración.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (103)

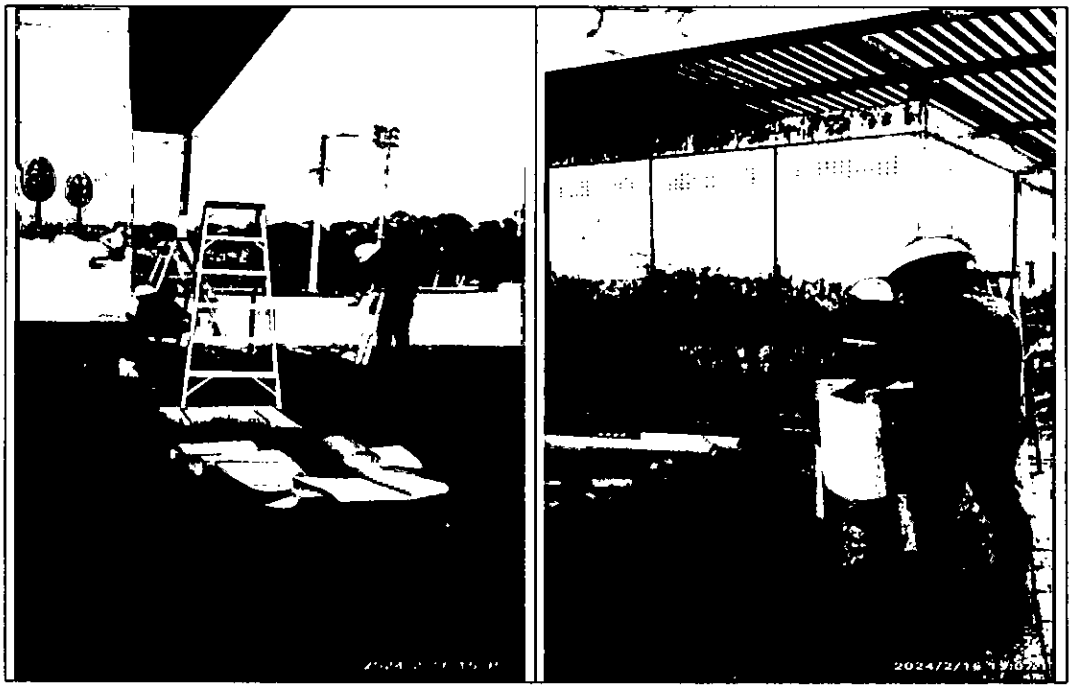


Fontanar del rio. Retiro de vinilos que están en mal estado en las Casetas de comidas y en el módulo de baños.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (104)

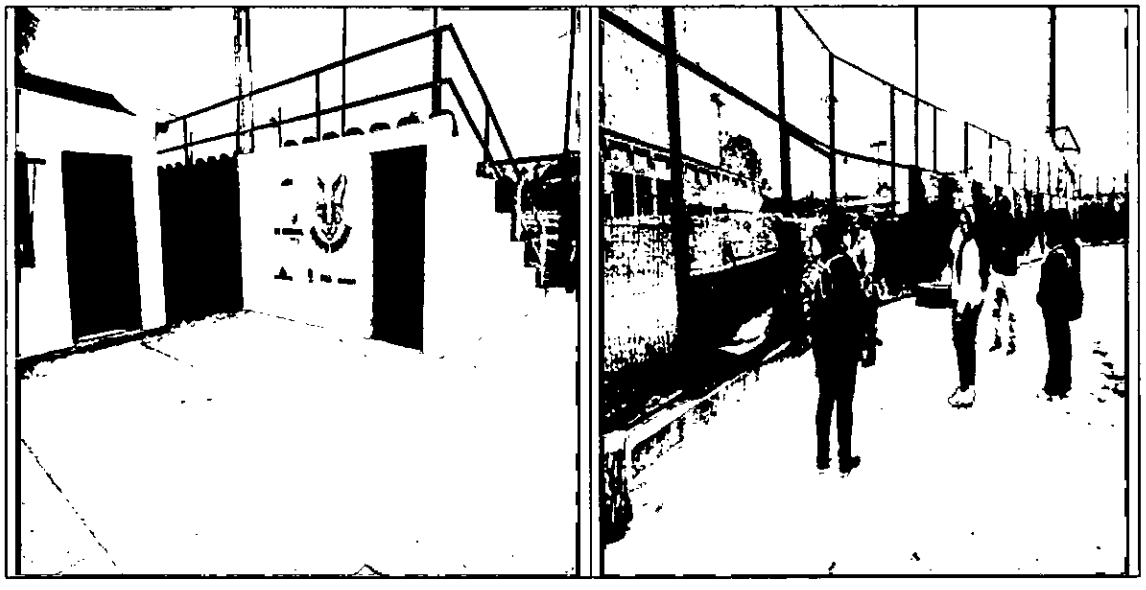

UDS. Beisbol. Reunión de socialización con administradores y representante de ligas deportivas, Coordinación del IDRD, Contratista y la Interventoría.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (105)



Canal Boyacá. Cerramiento en polisombra y demolición placa de piso en concreto

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (106)




Canal Boyacá. Demolición placa de piso en concreto

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (107)

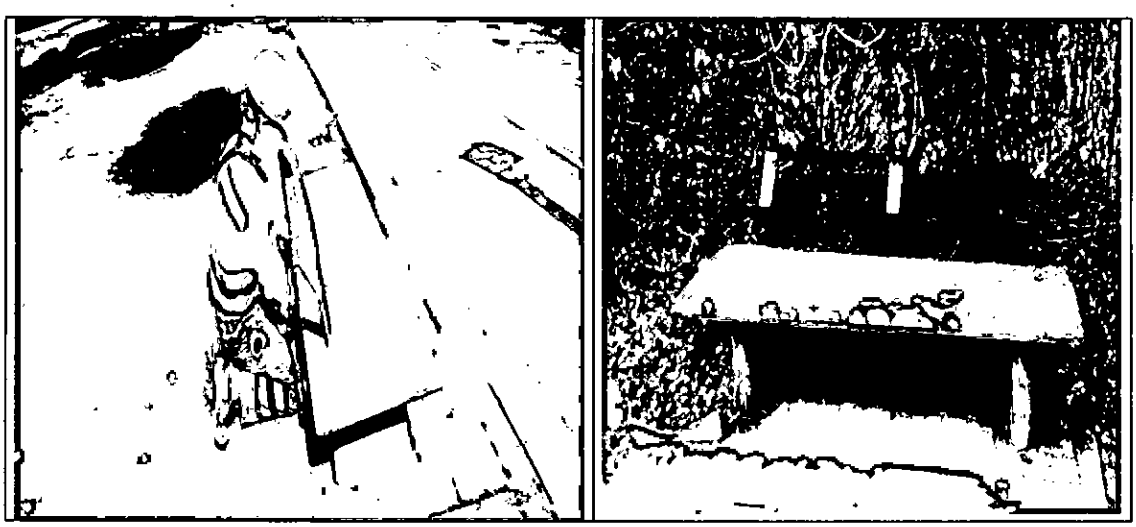

Virrey Chicó. Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (108)




Virrey Chicó - Suministro e instalación de espaldares bancas de concreto

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (109)

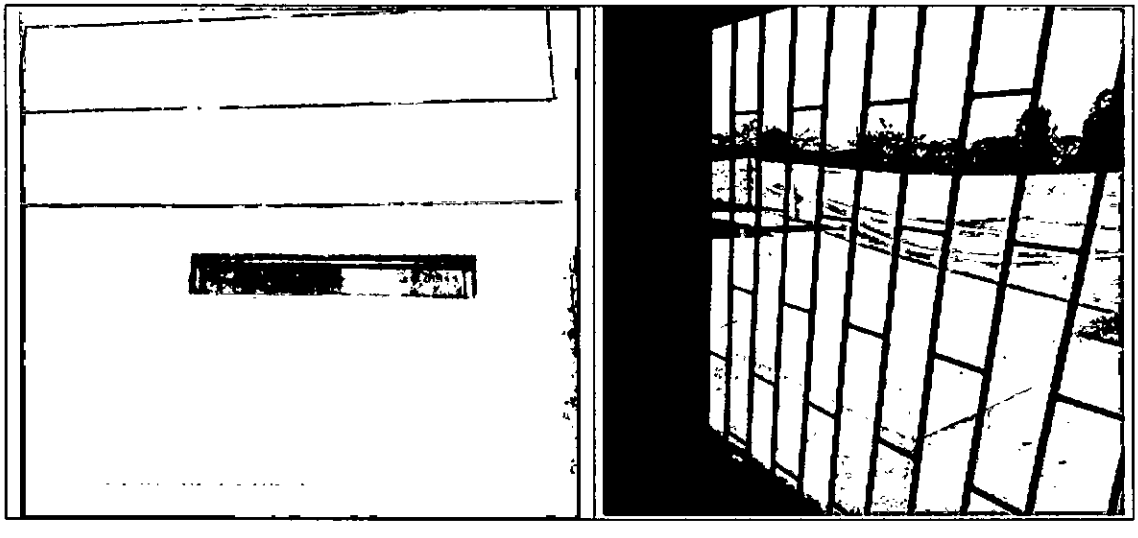

El Tunal. Se continua con los remates de pintura en muros y techos internos, instalación de aparato eléctricos e instalaciones hidrosanitarias

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (110)



El Tunal. Avance con remates de asfalto, demarcación y con la evacuación de observaciones planteadas por la liga de BMX, durante la reunión del día lunes 12 de febrero del 2024 en compañía de la administración, el IDRD, el contratista y la interventoría, en aras de hacer la puesta en servicio y la respectiva entrega para su uso.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (111)



Eduardo Santos. Inicia la instalación de divisiones en los sanitarios e instalación de puertas de ingreso a baños de coliseo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (112)




La Fragua. Continua con excavación y retiro de material de la zona de juegos exterior del parque

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (113)

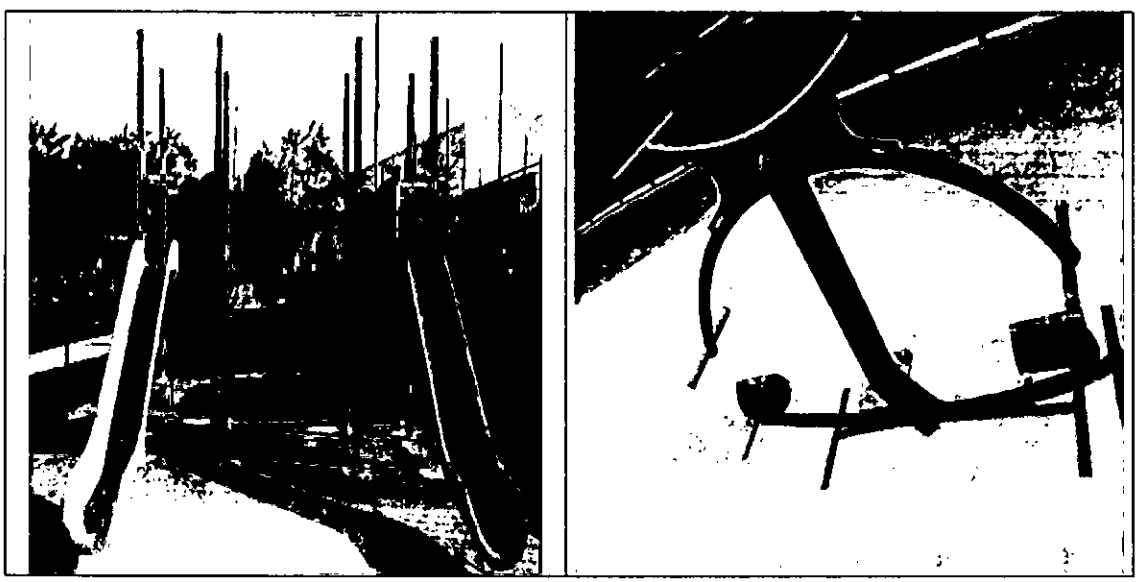


Nuevo Muzu. Se adecua zona de senderos en adoquín, se inicia pintura de placas nuevas en concreto en zona de juegos y se termina el ensamble de módulo de lectura en sitio nuevo, se inician la instalación de juegos infantiles.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (114)

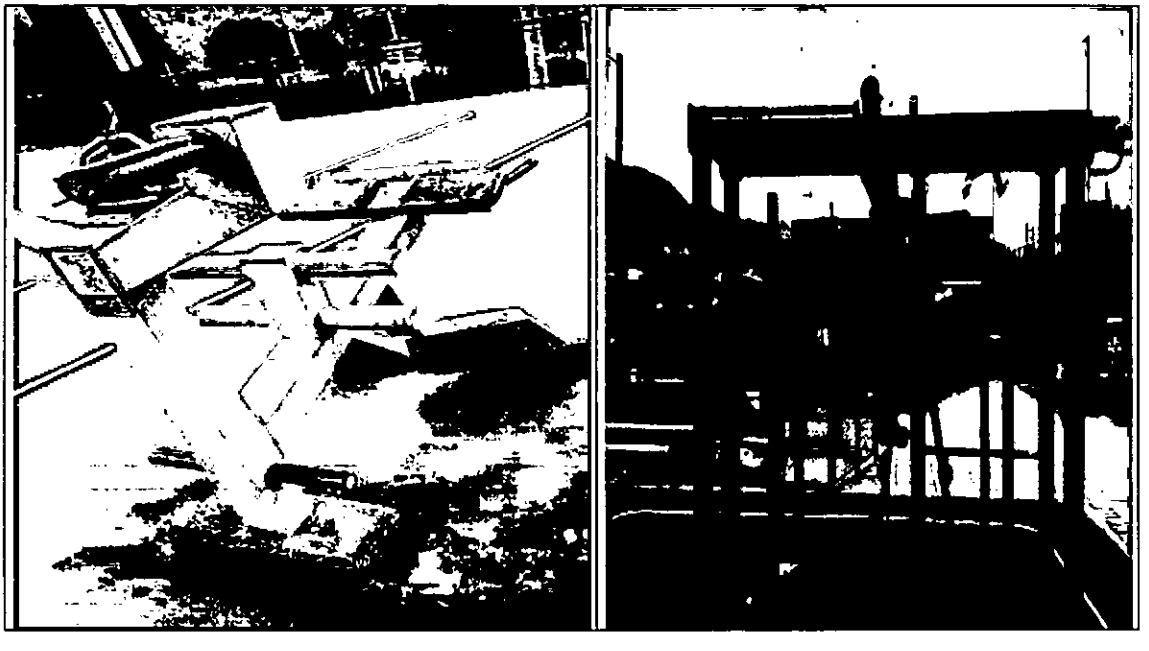


La Victoria. Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (115)

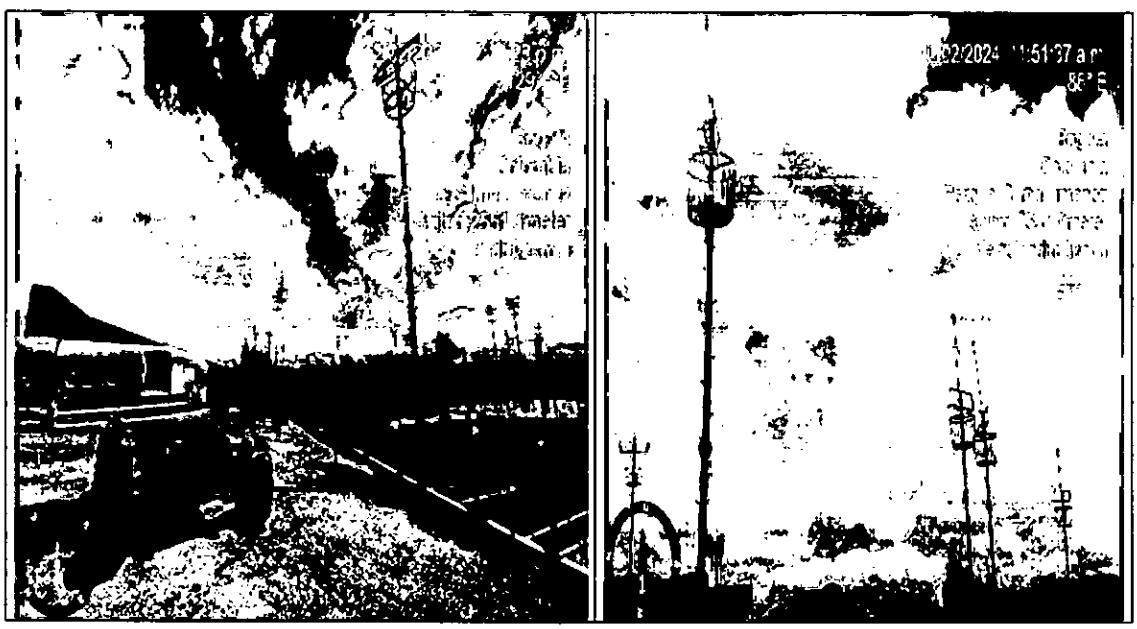

Gilma Jiménez. se inicia el desmonte y reinstalación de lámparas y luminarias en canchas sintéticas.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (116)




Bosques de San Carlos. Colocación de sellante piso zona infantil - colocación de parales metálicos para cerramiento zona juego, infantil.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (117)



Bosques de san Carlos. Colocación de formaleta con hiero para fundir viga zarpa en grecorromana - Mezcla de materiales para fundir viga zarpa

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (118)



Villa de los Alpes. Se realizo la instalación de los Biosaludables arreglados y pintados

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (119)



Ciudad Montes. Se realiza instalación de bancas de abdominales en la ruta de la vida.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (120)



Ciudad Montes. Suministro e instalación portón de entrada zona de la huerta.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (121)



Alta Blanca. Pulida del piso en granito pulido en los sitios donde se realizaron las reparaciones puntuales para la pista de velocidad.


| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (122)



Canal Rio Negro. Fijación de la puerta existente, con la aplicación de puntos de soldadura.

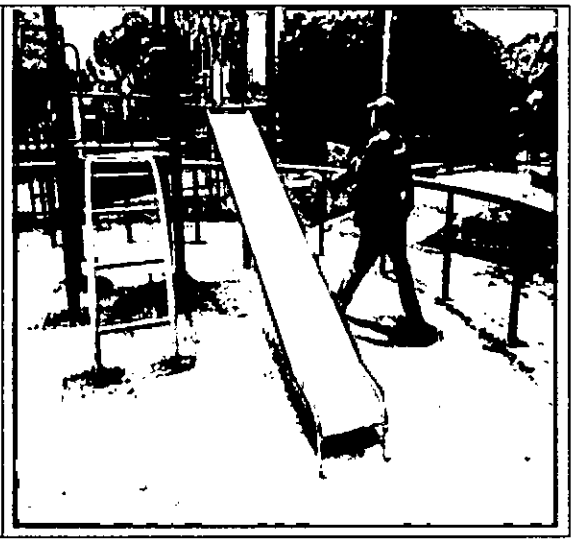

Canal Rio Negro. Instalación del deslizadero en acero inoxidable.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (123)



| | |
|---|---|
| Parque de los Niños. Apertura de zanjas para instalación de filtro | Parque de los Niños. Colocación y extendida de material granular para conformación del sendero peatonal. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (124)



Parque de los Niños. Fabricación de las estructuras metálicas para cerramientos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (125)



Sucre o Hippies. Socialización con Miembros de la Comunidad, Contratista y la Interventoría.



Sucre o Hippies. Instalación de bancas en concreto - instaladas por el costado sur del parque.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (126)



| | |
|---|---|
| Simón Bolívar. Durante la ejecución de las conexiones hidráulicas en los bebederos. | Simón Bolívar. Instalación de bebederos. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (127)





| | |
|---|---|
| Simón Bolívar. Cambio de bebederos. | Simón Bolívar. Aplicación de pintura en los Kioscos de comidas. |

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (128)

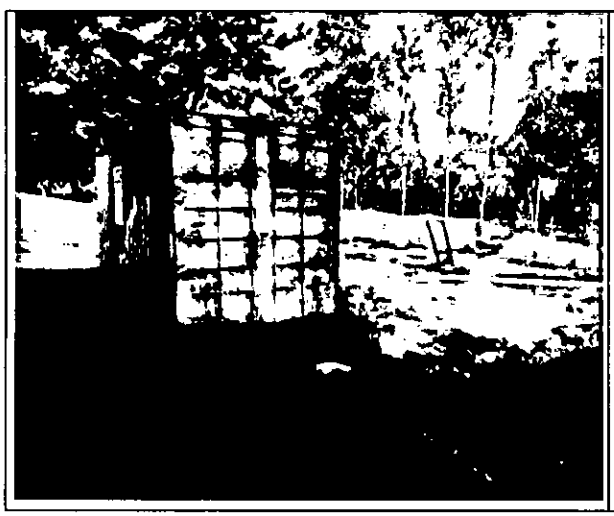

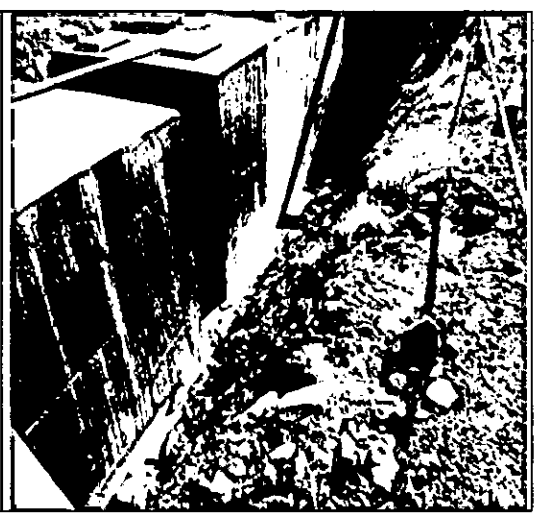

| | |
|---|---|
| Simón Bolívar. Campamento para personal y protección de equipos y materiales de obra. | Simón Bolívar. Tanques sépticos |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (129)



Simón Bolívar. Al retirar el tapón de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (130)



| | |
|---|---|
| Parqueadero Parque de los Niños. Extendida y compactación de la base granular | Parqueadero Parque de los Niños. Extendida y compactación de la base granular. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (131)




Reunión con el Veedor, con los Apoyos de la Administración PRD, Contratista y la Interventoría. (definición de colores al piso de la cancha).

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (132)

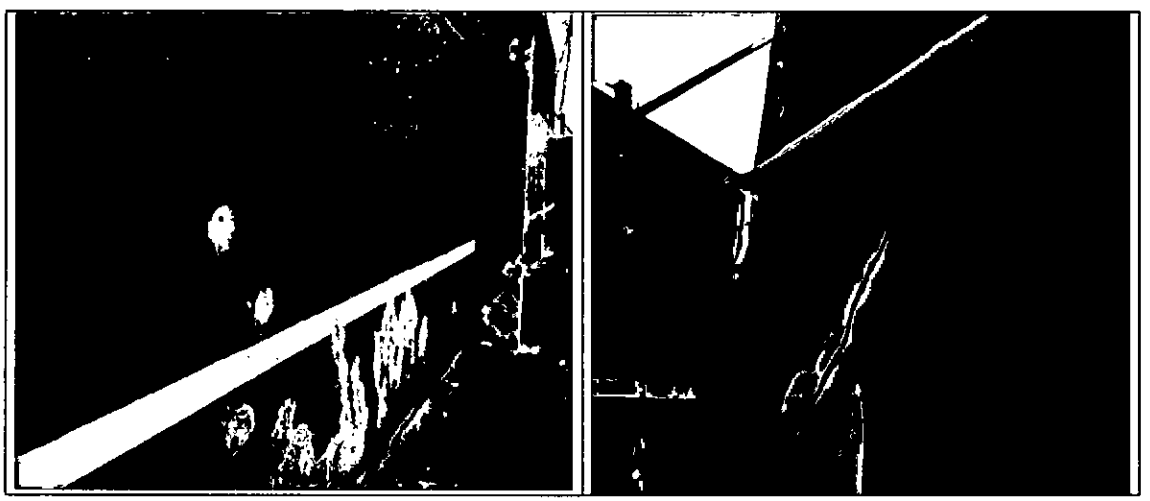

PRD TENIS (Muro). Reparación del muro en la Cancha de squash- Tenis.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (133)



PRD. Oficina Sistemas. Instalación de lámparas para iluminación en el cielorraso de la oficina de Sistemas.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (134)






| | |
|---|---|
| PARQUE DE LOS NOVIOS. Amarre de hierro para zapatas y pedestales. | PARQUE DE LOS NOVIOS. Fundida en concreto para zapatas - módulo de baños |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (135)

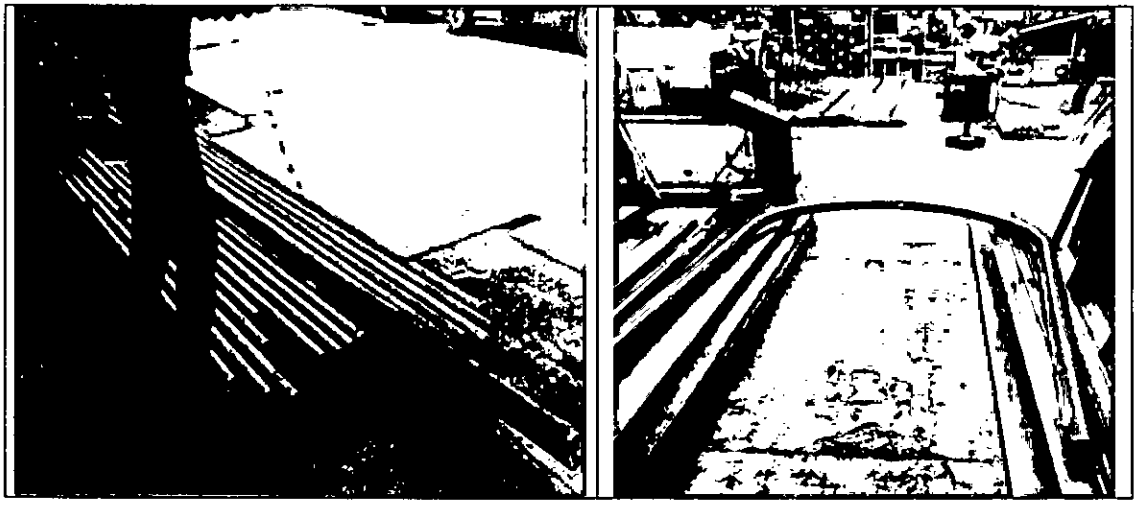


PARQUE DE LOS NOVIOS. Fabricación de la estructura metálica para instalar en el Túnel del Amor.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (136)

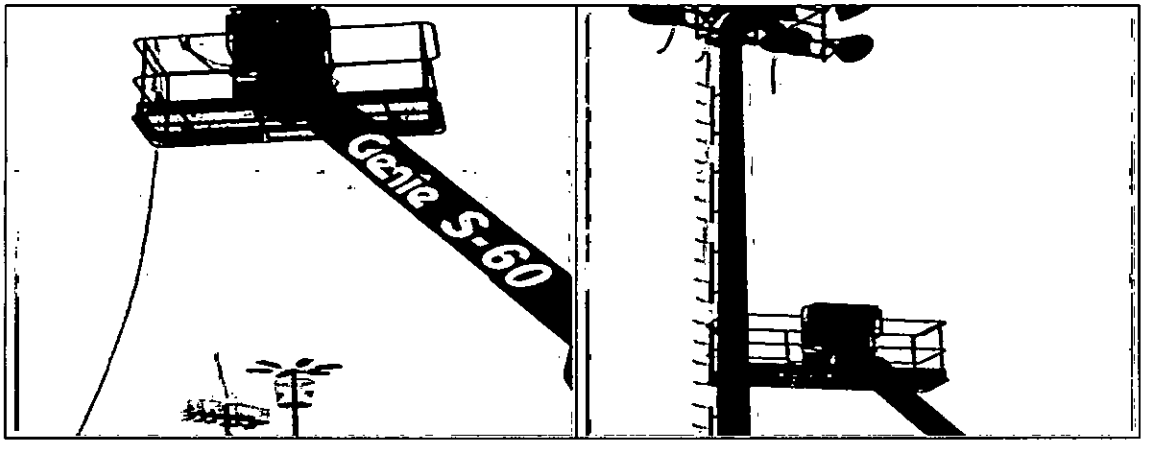



UDS. Retiro de Luminarias en Canchas de Beisbol.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (137)

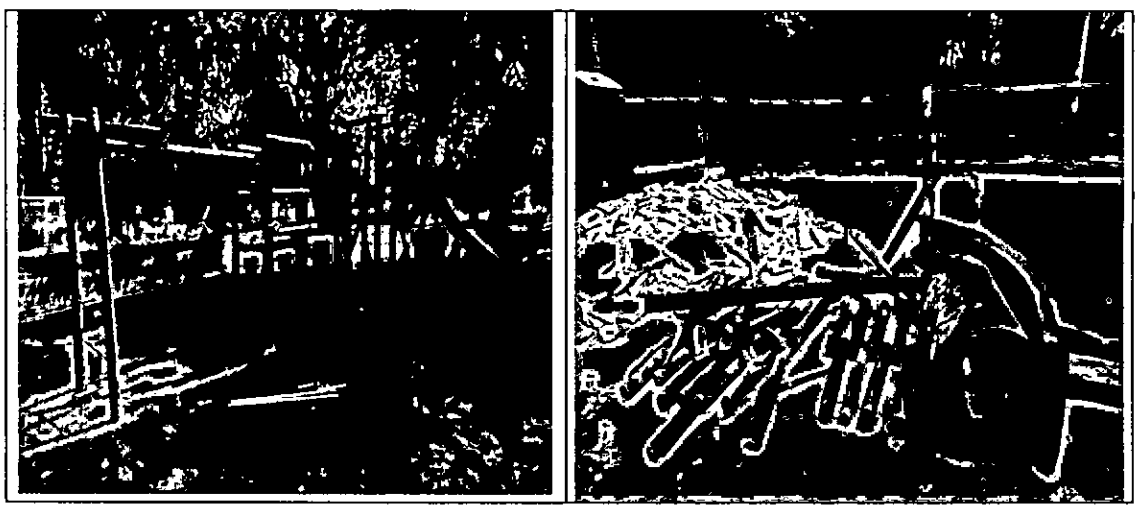

| | |
|---|---|
| Canal Boyacá. Desmonte de juego en madera en mal estado | Canal Boyacá. Retiro de juego en madera en mal estado |

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (138)



Canal Boyacá. Llegada de materiales (Adoquines y bordillos).

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (139)



Virrey Chicó. Suministro e instalación de canecas.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (140)



Virrey Chicó. Desmonte de Campamento - Retiro de materiales - aseo general.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (141)




Simón Bolívar. Instalación de enchape para los baños de hombres en el Sector El Carbón.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (142)

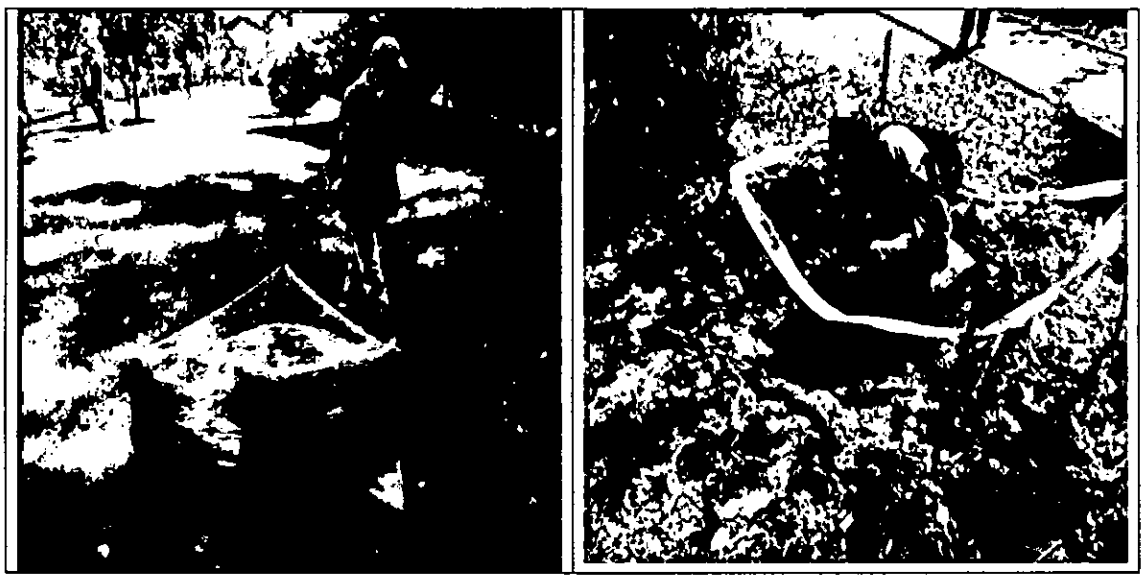


Simón Bolívar. Investigaciones para determinar aposamiento de agua en un sector paralelo a la pista de trote y a la Av. 68.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (143)

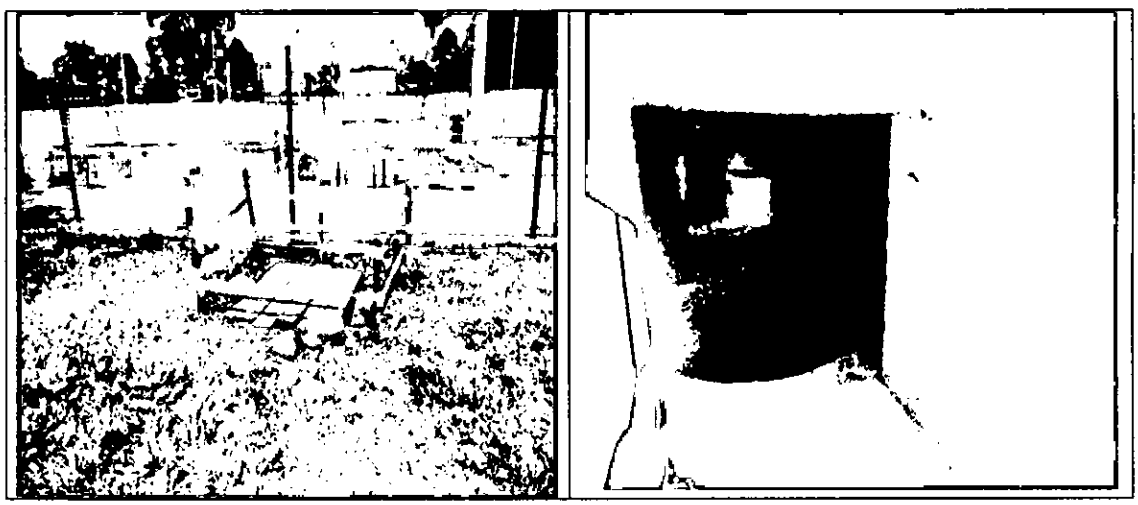


Simón Bolívar. Al retirar el tapón de una tubería que está al interior de la caja de inspección, el agua que estaba represada en la caja de inspección interna y cercano a la pista de trote, fue evacuada.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (144)

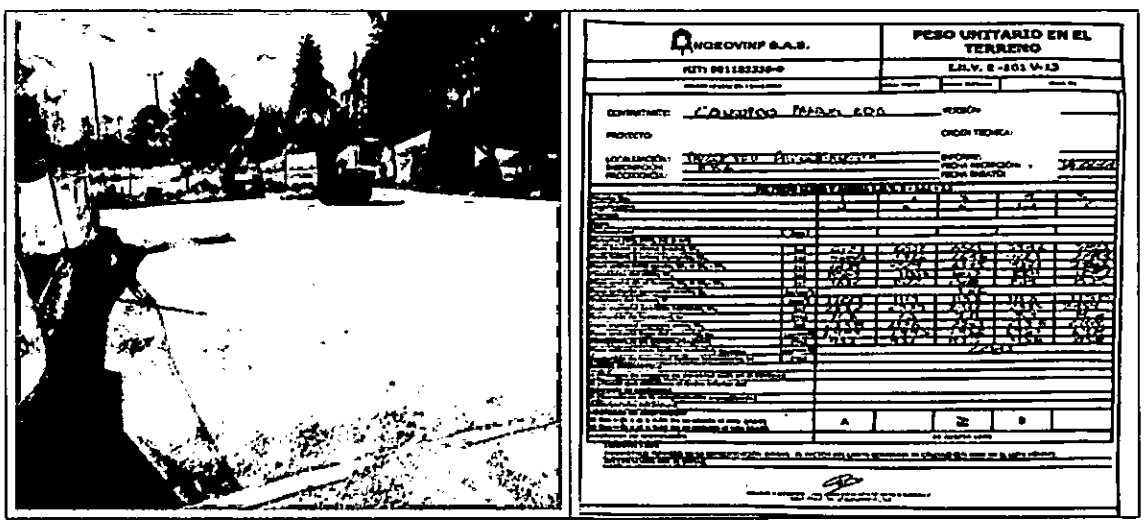


| | |
|---|---|
| Parqueadero del Parque de los Niños. Humectación y compactación de la base granular | Parqueadero del Parque de los Niños. Registro de las densidades tomadas en el terreno para la subbase granular. |

**ANEXO 6.** FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | |
| OBJETO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-2023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD |

| PERIODO: | 1° al 29 de Febrero de 2024 |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | PARQUE DE LOS NIÑOS |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 258 | Mampostería pozo de alcantarillado pluvial | liberación |
| 1/02/2024 | 261 | Extendida de la subbase granular parqueadero | en ejecución |
| 2/02/2024 | 266 | Instalación sardinel - Cancha arena | liberación |
| 2/02/2024 | 267 | Pañete y ejecución de cañuela pozo alcantarillado | liberación |
| 3/02/2024 | 276 | Instalación tubería 8" en Cancha arena | liberación |
| 5/02/2024 | 283 | Corte y figuración acero vigas y pilotes | en ejecución |
| 6/02/2024 | 292 | Caja inspección arenero grande | en ejecución |
| 7/02/2024 | 297 | Extendida y compactación de subbase granular | en ejecución |
| 8/02/2024 | 303 | Acero refuerzo cimentación - costado sur occidental | liberación |
| 8/02/2024 | 307 | Nivelación , extendida y compactación de sub base granular- parqueadero | en ejecución |
| 10/02/2024 | 320 | Instalación sardineles parqueadero | en ejecución |
| 13/02/2024 | 335 | Excavación sendero occidental Cancha arena | en ejecución |
| 14/02/2024 | 341 | Acero refuerzo vigas pilotes | liberación |
| 14/02/2024 | 345 | Instalación sardinel prefabricado parqueaderos | liberación |
| 14/02/2024 | 349 | Desencofrado viga cimentación cerramiento | en ejecución |
| 14/02/2024 | 361 | Toma densidades sub base granular- parqueadero | liberación |
| 19/02/2024 | 373 | Excavación sendero occidental | liberación |
| 20/02/2024 | 382 | Extendida y compactación Capa base granular | en ejecución |
| 22/02/2024 | 394 | Excavación filtro francés/ costado occidental | liberación |
| 23/02/2024 | 403 | Instalación de geotextil NT 4000 | en ejecución |
| 26/02/2024 | 417 | Instalación bordillo A80- sendero costado W | en ejecución |
| 26/02/2024 | 420 | Toma de densidades base granular parqueadero | liberación |
| 28/02/2024 | 433 | Amarre acero refuerzo vigas pilotes costado oriental. | liberación |
| 29/02/2024 | 439 | Instalación geotextil y tubería de drenaje | en ejecución |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma:
Nombre: ING. JOSÉ PEÑA
Cargo: RESIDENTE
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. LUIS A MEDRANO B.
Cargo: RESIDENTE
INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | |
| OBJETO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-2023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD |

| PERIODO: | 1° al 29 de Febrero de 2024 |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | PARQUE PRD UCAD |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 165 | Lleno compactado capa de base granular cancha squash | en ejecución |
| 3/02/2024 | 179 | Instalacion de bordillo y cañuela cancha squash | en ejecución |
| 3/02/2024 | 180 | Nivelacion de la capa de base granular cancha squash | liberación |
| 6/02/2024 | 192 | Estructuras del techo en pvc de of. Admon | en ejecucion |
| 8/02/2024 | 202 | Toma de densidades base granular cancha de squash | en ejecucion |
| 8/02/2024 | 203 | Capa de base granular cancha de squash | liberación |
| 10/02/2024 | 219 | Mejoramiento de sub rasante con rajon + sello de la cancha de baloncesto | en ejecucion |
| 13/02/2024 | 235 | Extendida de asfalto 81350 | liberación |
| 14/02/2024 | 244 | Instalacion de cielo raso pvc oficinas sistemas admon | en ejecucion |
| 15/02/2024 | 247 | Extendida de capa de base granular cancha baloncesto | en ejecucion |
| 15/02/2024 | 247 | Reparacion con anclajes de muro squash | en ejecucion |
| 17/02/2024 | 260 | Anclajes y pañete de muro squash | liberación |
| 20/02/2024 | 273 | Compactacion de fondo y niveles de excavacion de la cancha de baloncesto | liberación |
| 22/02/2024 | 285 | Niveles de base granular para instalacion de bordillos A80 | en ejecucion |
| 22/02/2024 | 287 | Retiro de acabados de barandas de cancha de arena oriental | liberación |
| 24/02/2024 | 304 | Niveles zona de anden cuneta para instalacion de bordillo A80 en cancha baloncesto | liberación |
| 26/02/2024 | 319 | Lijado de tuberia de barandas de cancha de arena oriental | liberación |
| 28/02/2024 | 326 | Aplicación de anticorrosivo a las barandas de cancha de arena oriental | liberación |
| 29/02/2024 | 331 | Lleno compactado de base granular de cancha de baloncesto | en ejecucion |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Firma: _____

Nombre: ING. JOSÉ PEÑA

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B.

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORIA

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-05 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | |
| OBJETO: | "Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y juridica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-2023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD |

| PERIODO: | 1° al 29 de Febrero de 2024 |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | PARQUE DE LOS NOVIOS |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 69 | Demolición viga y concreto ciclópeo existente Modulo WC | liberación |
| 2/02/2024 | 79 | Acta vecindad Complejo Acuático | liberación |
| 3/02/2024 | 84 | Prolongación cerramiento acceso vehículos | liberación |
| 6/02/2024 | 102 | Excavación dados cimentación Tunel del Amor | en ejecución |
| 7/02/2024 | 109 | Instalaciones hidráulicas- fluxómetros | liberado |
| 8/02/2024 | 114 | Excavación dados cimentación Tunel del Amor | liberado |
| 9/02/2024 | 121 | Revisión acero refuerzo dados cimentación Túnel del Amor | liberación |
| 10/02/2024 | 128 | Pintura ventanas y páneles Módulo Admon. | en ejecución |
| 12/02/2024 | 164 | Aplicación esmalte Oficina de Admón. | liberación |
| 13/02/2024 | 140 | Instalación vidrios Of. Admón | liberación |
| 16/02/2024 | 156 | Verificación niveles y sección de las zapatas | liberación |
| 17/02/2024 | 162 | Concreto ciclópeo zapatas | |
| 19/02/2024 | 166 | Instalación superboard para enchape muros de baños. | liberación |
| 19/02/2024 | 168 | Fundida concreto ciclópeo zapatas | liberación |
| 21/02/2024 | 182 | Enchape muros WC públicos | en ejecución |
| 22/02/2024 | 186 | Amarre acero refuerzo zapatas y pedestales | liberación |
| 22/02/2024 | 188 | Enchape muros WC públicos | liberación |
| 24/02/2024 | 197 | Rollado de tuberías en Taller Túnel del Amor. | en ejecución |
| 27/02/2024 | 209 | Limpieza cajas de inspección desagues. | liberación |
| 28/02/2024 | 216 | Replanteo pedestales y amarre acero | liberación |
| 29/02/2024 | 222 | Encofrado de pedestales | en ejecución |
| 29/02/2024 | 223 | Amarre viga de cimentación | en ejecución |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ING. JOSÉ PEÑA | Nombre: | ING. LUIS A. MEDRANO B. |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO. | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-2023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD |

| PERIODO: | 1° al 29 de Febrero de 2024 |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA | PARQUE SIMÓN BOLÍVAR |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 208 | Lavado tanques sépticos Maná | en ejecución |
| 3/02/2024 | 221 | Pintura kioscos comida | en ejecución |
| 7/02/2024 | 239 | Prologaciones red agua potable WC damas | en ejecución |
| 9/02/2024 | 257 | Desmonte, suministro e instalación bebederos | en ejecución |
| 10/02/2024 | 262 | lavado muros y pisos tanque séptico | liberado |
| 12/02/2024 | 263 | fijado barandas Templete | en ejecución |
| 23/02/2024 | 280 | aplicación mortero pisos y muos tanque séptico | liberación |
| 23/02/2024 | 282 | arreglo punto desague bebedero- juegos | en ejecución |
| 26/02/2024 | 295 | instalación prolongaciones desague tanque sépticos | en ejecución |
| 26/02/2024 | 299 | instalación 3 bebederos costado occidental | liberación |
| 27/02/2024 | 305 | Cambios enchape en Carbón -cambio fluxómetro | en ejecución |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ING. JOSÉ PEÑA | Nombre: | ING. LUIS A. MEDRANO B. |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | COBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | |
| OBJETO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-2023 |
| CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | 1° al 29 de Febrero de 2024 |

| FRENTE DE OBRA | UDS |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 9/02/2024 | 16 | Cambio de push de fluxometros | en ejecucion |
| 12/02/2024 | 24 | Cambio de push de fluxometros | liberación |
| 22/02/2024 | 33 | Desmonte y retiro de luminarias en cancha de beisbol | en ejecucion |
| 23/02/2024 | 37 | Instalacion de enchape por cambio de fluxometros | en ejecucion |
| 26/02/2024 | 47 | Desmonte y retiro de luminarias e instalacion de tuberia EMT de puesta a tierrra en cancha de beisbol | en ejecucion |
| 27/02/2024 | 51 | Desmonte y retiro de luminarias e instalacion de tuberia EMT de puesta a tierrra en cancha de beisbol | en ejecucion |
| 29/02/2024 | 61 | Desmonte y retiro de luminarias e instalacion de tuberia EMT de puesta a tierrra en cancha de beisbol | en ejecucion |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ING. JOSÉ PEÑA | Nombre: | ING. LUIS A. MEDRANO B. |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 | CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS | CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". | OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO | FRENTE DE OBRA | Parque Tunal |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 160 | RESANE Y PINTURA FACHADAS CASA ADULTO MAYOR | Se realiza liberacion de estuco y pintura de fachadas casa del adulto mayor |
| 1/02/2024 | 160 | RESANE Y PINTURA MUROS Y TECHOS PORTERIA # 1 | Se realiza liberacion de estuco y pintura de fachadas Y cielo rasos de la porteria # 1 |
| 1/02/2024 | 160 | ZONA DE GRECOS # 2 | Se realiza Liberacion de mantenimiento y pintura de maquinas y pintura recubrimiento de pisos Zona de Grecos # 2 |
| 2/02/2024 | 161 | RESANE Y PINTURA DE CIELO RASOS Y MUROS PORTERIA # 2 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/02/2024 | 163 | RESANE Y PINTURA DE CIELO RASOS Y MUROS PORTERIA # 3 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 8/02/2024 | 167 | INICIO DE ACTIVIDADES DE FACHADA VERDE EN PORTERIA # 1 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/02/2024 | 168 | SE HACE RECORRIDO DE VISITA AREA DE CALIDAD E IDRD | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 12/02/2024 | 170 | FUNDIDA DE CINTAS DE COFINMIENTO EN SENDERO DE ADOQUIN FRENTE A CASA DEL ADULTO MAYOR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 12/02/2024 | 170 | DEMARCACION DE PISTA DE BMX | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 13/02/2024 | 171 | FUNDIDA DE RAMPAS EN SECTOR PLAZOLETA DE EVENTOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 14/02/2024 | 172 | FUNDIDA DE RAMPAS EN SECTOR PLAZOLETA DE EVENTOS | se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades |
| 17/02/2024 | 175 | FACHADA VERDE | se realiza la liberacion de la actividad |
| 19/02/2024 | 177 | VIDRIOS Y ESPEJOS DE CASA ADULTO MAYOR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 20/02/2024 | 180 | FACHADA VERDE | se realiza la liberacion con la puesta en servico y entrega a la administracion del parque |
| 26/02/2024 | 185 | IMPERMEABILIZACIONCON MANTO EDIL, CUBIERTA PORTERIA # 4 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 29/02/2024 | 187 | INSTALACION ADOQUIN SENDERO DEL ARBOL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| PERIODO: [redacted] | [redacted] FEBRERO [redacted] |
|---|---|

| FRENTE DE OBRA : | [redacted] Parque Mirador Illimani [redacted] |
|---|---|

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | N/A | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE PARQUE, EN ESTE PERIODO, SE ESTA TRABAJANDO ESTRUCTURAS EN TALLERES | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Firma: | | Firma: | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO |
| FRENTE DE OBRA | ParqueVilla Alemana |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 3/02/2024 | 26 | SENDEROS EN ADOQUIN POR TRAMOS | Se libera la actividad para su uso |
| 5/02/2024 | | INSTALACION DE MARCOS METALICOS EN CAJAS DE INSP. | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 8/02/2024 | | FUNDIDA DE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 29/02/2024 | | ENCOROCE DE MURO POSTRIOR DE CERRAMIENTO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO |
| FRENTE DE OBRA | Fragua |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 44 | SE REALIZA INSTALACION DE GEOTEXTIL EN PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/02/2024 | 46 | SE REALIZA RETIRO DE GEOTEXTIL EN LA PISTA DE PATINAJE POR INUNDACION | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/02/2024 | 48 | SE INICIA REINSTALACION DE ENCHAPE EN ARREGLOS DE PUSH BAÑOS HOMBRES COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 5/02/2024 | 49 | SE INICIA REINSTALACION DE ENCHAPE EN ARREGLOS DE PUSH BAÑOS MUJERES COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 6/02/2024 | 51 | SE SOLICITA AL CONTRATISTA PLAN DE CONTINGENCIA POR INVIERNO EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE Y ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 6/02/2024 | 52 | SE SOLICITA AL CONTRATISTA RETIRAR TODO EL MATERIAL DE SUB BASE CONTAMINADO POR AGUA DE LA PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 7/02/2024 | 53 | SE SACA TODO EL BARRO Y SE REINSTALA GEOTEXTIL | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 8/02/2024 | 55 | SE INICIA LA INSTALACION DE SUB BASE SECA NUEVAMENTE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/02/2024 | 56 | LLEGAN BORDILLO Y CAÑUELAS NUEVA PARA PISTA DE PATINAJE | |
| 13/02/2024 | | SE DESMONTAN Y REUBICAN CANECAS DE LA PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 14/02/2024 | | EXCAVACION EN ZONA DE JUEGOS EXTERIOR | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 15/02/2024 | | SUBBASE PISTA DE PATINAJE | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 16/02/2024 | | GEOTEXTIL ZONA JUEGOS INFANTILES EXTRIORES | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/02/2024 | | TOMA DE DENSIDADES SUBBASES PISTA DE PATINAJE | Se realiza la liberacion de la actividad, con porcentajes de compactacion por encima del 95% |
| 20/02/2024 | | BASES COMPACTAS PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 20/02/2024 | | SUB BASES COMPACTAS ZONA DE JUEGOS INFANTILES EXTERIOR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 22/02/2024 | | INSTALACION DE DICISIONES DE BAÑO EN COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 23/02/2024 | | INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 26/02/2024 | | TOMA DE DENSIDADES A BASE EN PISTA DE PATINAJE | Toma de Densidades dan por encima del 95% de compactacion y se procede a liberar la actividad de Bases compactas |
| 26/02/2024 | | TOMA DE DENSIDADES A SUBBASES EN ZONA INFANTIL | Toma de Densidades dan por encima del 95% de compactacion y se procede a liberar la actividad de Sub Bases compactas en Zona Infantil. |
| 27/02/2024 | | INSTALACION DE BORDILLO EN PISTA DE PATINAJE | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 29/02/2024 | | RELLENOS CON BASES GRANULARES EN ZONA INFANTIL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO |
| FRENTE DE OBRA | Nuevo Muzú |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | | se instala malla de placa de contrapiso en zona de juegos | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 2/02/2024 | | SE REALIZA FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO EN ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad, se toman muestras de concreto. |
| 8/02/2024 | | SE REALIZA EL TRASLADO Y ENSAMBLE DEL MODULO DE LECTURA | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 13/02/2024 | | SE INICIA LA INSTALACION DE JUEGOS NUEVOS EN ZONA INFANTIL | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 14/02/2024 | | SE INICIA EL ALISTADO DE PISO DE LA PLACA DE ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 16/02/2024 | | REINSTALACION DE ADOQUIN EN SENDERO | Se recibe la actividad termonada y se libera |
| 17/02/2024 | | demolicion de enchape en arreglos hidrosanitarios | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/02/2024 | | INSTALACION DE PUSH SANITARIOS BAÑOS COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 19/02/2024 | | PRUEBAS DE PRESION HIDRAULICAS BAÑOS COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 23/02/2024 | | INSTALACION DE PUSH SANITARIOS BAÑOS COLISEO | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 23/02/2024 | | PRUEBAS DE PRESION HIDRAULICAS BAÑOS COLISEO | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 24/02/2024 | | PAÑETE Y RESANES MUROS DE BAÑOS COLISEO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 28/02/2024 | | PAÑETE Y RESANES MUROS DE BAÑOS COLISEO | Se realiza la liberacion de la actividad |
| 29/02/2024 | | INSTALACION DE COMPLEMENTO BARANDA M-80 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | LUZ STELLA QUINTERO | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO |
| FRENTE DE OBRA | Virrey Sur |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 1/02/2024 | 10 | PINTURA DE MESAS DE AJEDREZ | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 3/02/2024 | 12 | ARREGLOS HIDROSANITARIOS BAÑOS HOMBRES | Se libera la actividad para su uso |
| 5/02/2024 | 13 | ARREGLOS HIDROSANITARIOS BAÑOS MUJERES | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 7/02/2024 | 15 | ARREGLOS Y MANTENIMIENTO BARANDA M-83 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 7/02/2024 | 15 | INSTALACION DE BADOSIN ARREGLOS BAÑO MUJERES | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 10/02/2024 | 17 | BAÑOS HOMBRES Y MUJERES COUSEO | Se libera la actividad para su uso |
| 12/02/2024 | 18 | ARREGLOS JUEGOS M-5 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 13/02/2024 | 19 | CAMBIO DE CANALETA DE A.LL. CASA ADULTO MAYOR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 14/02/2024 | 20 | ARREGLO Y PINTURA BARANDAS ZONA DE JUEGOS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 17/02/2024 | 23 | MANTENIMIENTO Y PINTURA MESAS DE AJEDREZ | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 19/02/2024 | 25 | INSTALACION DE PISO CAUCHO | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 24/02/2024 | 31 | PINTURA BARANDAS M-80 | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 26/02/2024 | 34 | SUM, E INSTAL. BANCAS EN CONCRETO NUEVAS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 27/02/2024 | 35 | MANTENIMIENTO Y PINTURA APARATOS DE GRECOS | Se libera la actividad para su uso |
| 27/02/2024 | 35 | CAMBIO DE CANALETA DE A.LL. CASA ADULTO MAYOR | Se libera la actividad para su uso |
| 28/02/2024 | 36 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BICICLETEROS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 29/02/2024 | 38 | SUM, E INSTAL. BANCAS EN CONCRETO NUEVAS | Se libera la actividad para su uso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | 3131-2020 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099-20023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERIODO: | FEBRERO |
| FRENTE DE OBRA | Gilma Jimenez |

| Fecha | Nota Bitacora | Actividad ejecutada | Actividad liberada |
|---|---|---|---|
| 9/02/2024 | | DESMONTE DE LUMINARIAS VIEJAS E INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 9/02/2024 | | PRUEBAS FOROMETRICAS A CANCHAS FUTBOL 11- 5A- 5B | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 26/02/2024 | | INSTALACION DE LUMINARIAS ADICIONALES EN CANCHA FUTBOL 5A | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| 28/02/2024 | | EXCAVACION PARA PLACA DE PISO CUARTO DEL TRANSFORMADOR | La fecha corresponde al inicio de la actividad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | RODNEY GRANADOS | Nombre: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S. |
| Cargo: | RESIDENTE DE OBRA | Cargo: | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| | CONTRATISTA | | INTERVENTORIA |

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 3131-2023 |
| INTERVENTOR : | SOLUN INGENIERÍA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3029-2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |

| | |
|---|---|
| PERÍODO | |
| FRENTE DE OBRA | . |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | |
| 02-feb-24 | 31233 | LADRILLO COMUN RECOCIDO | UN | 1500 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | | X | Pozos parqueaderos y cajas de inspección Parqueaderos | |
| 08-feb-24 | 31264 | BLOQUE 20X35XX80-BORDILLO | UN | 110 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | PRD cancha Múltiple. | |
| 22-feb-24 | 31339 | TAPA POZO 1.70X25 | UN | 1 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | Parque Niños -Pozos arenero. | |
| 22-feb-24 | 31339 | PLACA FONDO 1.80X1.70 | UN | 1 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | Parque Niños -Pozos arenero. | |
| 22-feb-24 | 31339 | ARO TAPA POZO | UN | 1 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | Parque Niños -Pozos arenero. | |
| 22-feb-24 | 31339 | BLOQUE 20X50X80- SARDINEL | UN | 50 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | PRD- cancha Múltiple. | |
| 23-feb-24 | 31346 | BLOQUE 20X35X80-BORDILLO | UN | 100 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | Parque de los Niños- arenero y parqueadero | |
| 28-feb-24 | 31376 | BLOQUE 20X50X80- SARDINEL | UN | 45 | EL CONDOR PREFABRICADOS SAS | X | | Parque de los Niños- Parqueadero | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Firma:
Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:
INTERVENTORÍA

ING. JOSÉ O. PEÑA
CONTRATISTA

| | TRAZABILIDAD DE INSUMOS GRANULARES | CÓDIGO: | OBR-FR-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 3131-2023 |
| INTERVENTOR : | SOLUN INGENIERÍA SAS |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3099 -2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA |

| PERÍODO | MES DE FEBRERO 2024 | FRENTE DE OBRA | PDR/PARQUE DE LOS NIÑOS |
|---|---|---|---|

| NÚMERO DE VALE | PLACA | REMISIÓN | FECHA | MATERIAL | VOLUMEN | PROVEEDOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5180 | KNL 621 | 2771 | 05/02/2024 | Sub Base granular 1A | 14 | CONSTRITURAR SAS | |
| 2878 | KNL 621 | 5191 | 09/02/2024 | Base granular | 14 | CONSTRITURAR SAS | |
| 4085 | KNL 621 | 2897 | 12/02/2024 | Base granular | 14 | CONSTRITURAR SAS | |
| 5197 | KNL 621 | 791 | 20/02/2024 | Arena peña | 7 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5177 | KNL 622 | 124530 | 19/02/2024 | PEA | 14 | RECICLADOS DE LA 80 | |
| 5191 | KNL 621 | 2878 | 20/02/2024 | Arena peña | 7 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5254 | KNL 622 | 626 | 20/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5198 | KNL 621 | 797 | 21/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5199 | KNL 622 | 5199 | 22/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5258 | KNL 621 | 609 | 23/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5200 | KNL 621 | 601 | 23/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5259 | KNL 621 | 612 | 23/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5252 | KNL 622 | 627 | 26/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |
| 5176 | KNL 622 | 772 | 15/02/2024 | triturado | 7 | WILMAR G, RODRÍGUEZ | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5253 | KNL 622 | 623 | 26/02/2024 | triturado | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 5252 | KNL 622 | 620 | 26/02/2024 | grava de 1" | 7 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 5255 | KNL 622 | 630 | 27/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 4785 | KNL 621 | 647 | 28/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 5263 | KNL 622 | 805 | 29/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 5268 | KNL 621 | 804 | 29/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |
| 5264 | KNL 622 | 806 | 29/02/2024 | grava de 1" | 14 | WILMAR G. RODRÍGUEZ | |

Firma: 

Nombre:

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma: 

Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B,

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORIA**

**ANEXO 7.** ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP

| ESTADO | CONVENCION | |
|---|---|---|
| | APROBADO | AP |
| | RADICADO | RD |
| | OBSERVADO | OBS |
| | ANULADO | ANL |
| CIO | COTIZACION | COT2 |

| CONTROL DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS | | |
|---|---|---|
| CONTRATO OBRA | 3091 DE 2023 | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORIA | 3131 DE 2023 | SOLUN INGENIERIA SAS |

| CIO | ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | ESTADO | FECHA | No. RADICADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP01 | Espejo Cristal Incoloro 5mm (Sum+Inst) | M2 | $ 220.150,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP02 | Suministro E Instalacion De Banca Concretogrc21mpl-1.83mzoquín Diseño Banca Mc | UNO | $ 2.631.661,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP03 | Lijado, Limp Y Pintura (Estacion Ruta De La Vida) | UNO | $ 3.496.898,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP04 | Limpieza CercamaH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad) | ML | $ 25.658,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP05 | Demolic.PisoBaldosaGranoAtarmo33x33yConst.de nuevo | ML | $ 113.838,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP06 | Demolicion piso en granito pulido | M2 | $ 17.722,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP07 | GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT.BRONCE. | M2 | $ 151.435,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP08 | Fumigación (Fungicida+Adherente) ** | M2 | $ 187,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP09 | Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación | M3 | $ 195.982,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP10 | Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A | M3 | $ 160.881,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP11 | DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro) | M2 | $ 8.631,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP12 | Excavacion manual con retiro suelo blando** | M3 | $ 70.538,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP13 | CerramientoContraImpacto h=2.5 + MallaNylon+Pilot | ML | $ 1.194.967,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP14 | DESMONTE BEBEDEROS EXISTENTE INC RETIRO/ACARREO | UND | $ 41.755,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP15 | Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sum+ Instal) ** | UND | $ 3.218.827,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP16 | GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL | M2 | $ 21.267,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP17 | GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Mnc arena+caucho+lra | M2 | $ 183.458,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP18 | Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos | M2 | $ 64.583,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP19 | Desmonte carpintería metálica ** | M2 | $ 22.794,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP20 | MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+Inst) | M2 | $ 64.530,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP21 | Pise Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+Inst) | M2 | $ 883.139,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP22 | Juegos Infantiles Rueda (Instalac)** | UND | $ 463.338,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP23 | Lamina Policarbonato 8mm Colibeo(sum+Inst) | M2 | $ 86.383,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP24 | DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslego | M2 | $ 30.276,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP25 | SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS | M3 | $ 337.087,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP26 | DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA | M2 | $ 177.000,00 | AP | 6/12/2023 | Radicado físico IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023 | Acta de fijación de precios no previstos No. 1 |
| NP27 | Desmonte y reinstalacion, pintura general y arreglo, reposicion piezas biosaludables | UND | $ 854.388,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP28 | Desmonte e instalac bordillo prefabricado a-80 ** | ML | $ 50.738,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP29 | Limp. estruct. metalica y pintura esmalte+ anticor** | M2 | $ 25.418,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP30 | Demolicion cielo raso modular ligera (cargue y ret | M2 | $ 7.827,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP31 | Valla normas generales campos deportivos 3,00m x 1,00m (incluye dados en concreto) | UND | $ 6.984.140,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP32 | Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con sumin | M2 | $ 68.786,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP33 | Marco+tapa(lng+plat+acero+conc.3.000)caja 60x60cm (sum + inst) | UND | $ 223.488,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP34 | Llave grival jardín 1/2" 60400 | UND | $ 51.576,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP35 | Pulida de piso tablon en granito | M2 | $ 121.875,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP36 | Recuperacion de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce. | M2 | $ 211.368,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
| NP37 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 20 A | UND | $ 68.180,00 | AP | 4/01/2024 | Radicado físico IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024 | Acta de fijación de precios no previstos No. 2 |
