INFORME No. 8

CONVENIO No. 2339 - 2023

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES MEDIANTE SUBSIDIO DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS; OICATA, SANTA ROSA DE VITERBO, TOPAGA, MONGUI, MONGUA, FIRAVITOBA, CUCAITA, SAMACA, CALDAS, TUNJA.





PANORAMICA MUNICIPIO OICATA

FEBRERO 13 DE 2024

GENERALIDADES

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

Decreto 0389 de 27 de marzo del 2023.
"Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caidas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Mongui y Mongua del Departamento de Boyacá" mediante Decreto No. 0176 de 23 de febrero de 2023, emitido por el Gobernador de Boyacá se priorizó, aprobó y se designó a la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones intemas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Mongui y Mongua del Departamento de Boyacá" identificado con código BPIN 2022000050029, el cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

FASE

El proyecto se encuentra en fase I.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES

ENTIDAD EJECUTORA
Departamento de Boyacá

ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
Departamento de Boyacá – secretaria de Minas y Energía

AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO OICATA

La red de distribución avanza en un 60%, las inscripciones 73% y construcción de instalaciones internas en un 63%, Puesta en servicio el 33% para un total de 195 usuarios.

MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO

La red de distribución avanza en un 45%, las inscripciones 82% y construcción de instalaciones internas en un 44%, Puesta en servicio 28% para un total de125 usuarios.

MUNICIPIO MONGUI

La red de distribución avanza en un 32%, las inscripciones 74% y construcción de instalaciones internas en un 24%. Puesta en servicio el 21% para un total de 156 usuarios.

MUNICIPIO MONGUA

La red de distribución avanza en un 62%, las inscripciones 89% y construcción de instalaciones internas en un 54%. Puesta en servicio el 32% para un total de 181 usuarios.

MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS

La red de distribución avanza en un 63%, las inscripciones 94% y construcción de instalaciones internas en un 87%. Puesta en servicio 37% para un total de 84 usuarios.

MUNICIPIO SAMACA

La red de distribución avanza en un 80%, las inscripciones 128% y construcción de instalaciones internas en un 123%. Puesta en servicio 62% para un total de 246 usuarios.

MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO

La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%, puesta en servicio 0%.

MUNICIPIO TUNJA

La red de distribución avanza en un 35%, las inscripciones 30% y construcción de instalaciones internas en un 26%. Puesta en servicio el 24% para un total de 180 usuarios consumiendo.

AVANCE DE EJECUCION

Tabla No. 1. Descripción de las conexiones.

INFORME FEBRERO 13 DE 2024									
MUNICIPIO	ASIGNADOS	INSCRITOS	% AVANCE DE INSCRIPCIÒN	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	% AVANCE CONSTRUCCION INSTALACIONES	INSTALACIONES EN SERVICIO	% DE INSTALACIONES EN SERVICIO INFORME 8	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
OICATA	600	440	73%	380	63%	195	33%	$ 1.330.148	$ 259.378.860
STA ROSA DE	500	310	62%	35	7%	0	0%	$ 1.330.148	$ 0
TOPAGA	450	370	82%	200	44%	125	28%	$ 1.330.148	$ 166.268.500
MONGUI	750	555	74%	180	24%	156	21%	$ 1.330.148	$ 207.503.088
MONGUA	560	500	89%	300	54%	181	32%	$ 1.330.148	$ 240.756.788
FIRAVITOBA	400	50	13%	0	0%	0	0%	$ 1.330.148	$ 0
CUCAITA	230	217	94%	200	87%	84	37%	$ 1.330.148	$ 111.732.432
SAMACA	400	510	128%	490	123%	246	62%	$ 1.330.148	$ 327.216.408
CALDAS	220	150	68%	118	54%	0	0%	$ 1.330.148	$ 0
TUNJA	760	230	30%	200	26%	180	24%	$ 1.330.148	$ 239.426.640
TOTAL	4870	3332	68%	2103	43%	1167	24%	1330148	**$ 1.552.282.716**
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO									4870
VALOR TOTAL EJECUTADO									$ 1.552.282.716
VALOR POR EJECUTAR									$ 5.170.285.276
VALOR COBRADO INFORMES ANTERIORES									$ 1.235.707.492
VALOR A COBRAR INFORME Nª 8									$ 316.575.224

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION

Imagen 1. Tendido de red Municipio de Monguí.







Imagen 2. Construcción Troncal desde Tópaga hacia Mongua



Imagen 3. Medidor instalado Municipio de Monguí.




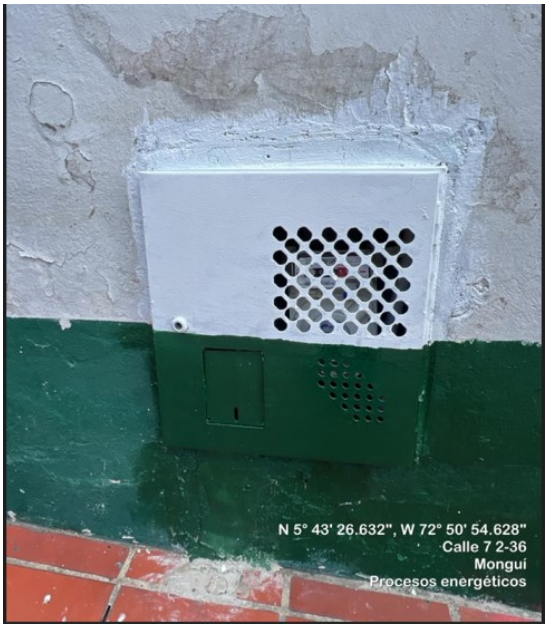




Imagen 2. Informe de inspección de instalaciones- puesta en Servicio.

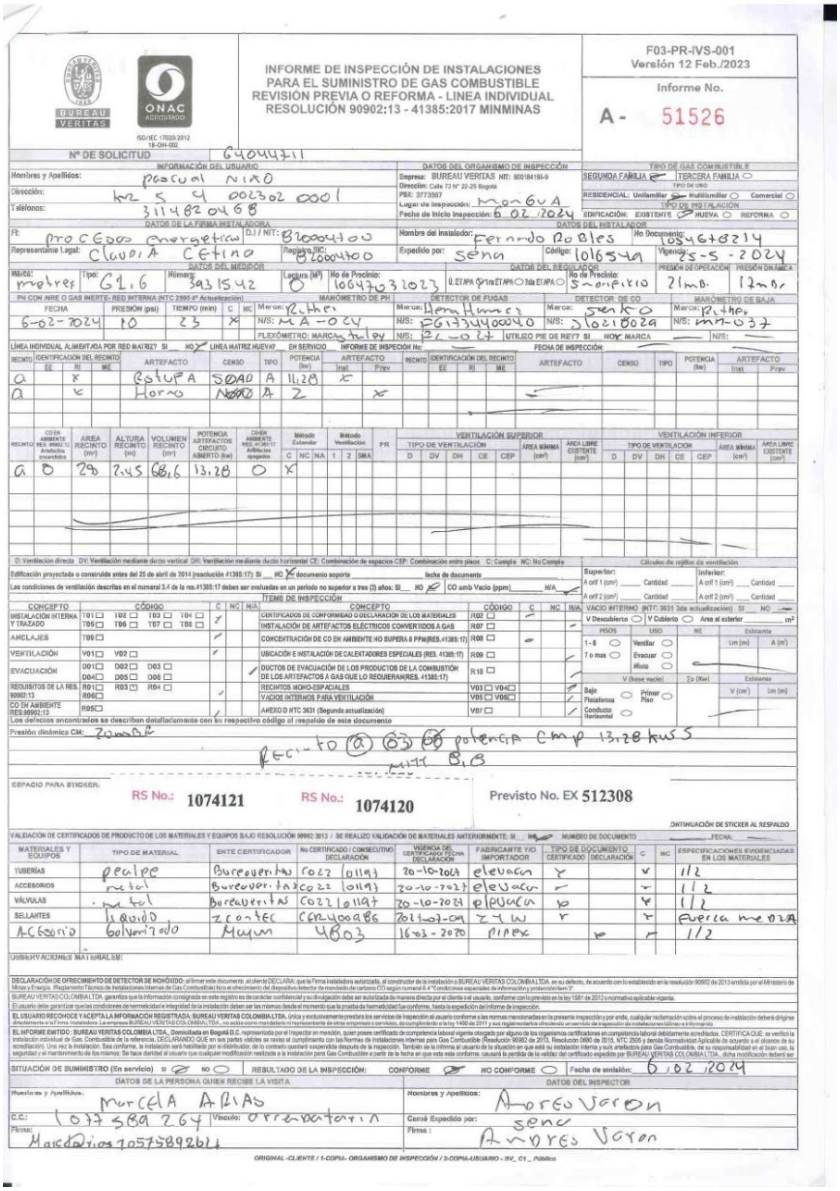

INFORME DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES
PARA EL SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE
REVISIÓN PREVIA O REFORMA - LINEA INDIVIDUAL
RESOLUCIÓN 90902:13 - 41385:2017 MINMINAS

F03-PR-IVS-001
Versión 12 Feb./2023

Informe No.
A - 51526

Cordialmente,

Gloria Marcela Muñoz Rojas
CC.36.479.006
Representante Legal
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
