


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
0	0	IDU-1712-2021-CONSERVACIÓN AV. BOYACÁ G1-CLB-11102023	899.1 días	lun 17/01/22	lun 16/12/24	$ 64,359,272,398	
1	1	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	899.1 días	lun 17/01/22	lun 16/12/24	$ 64,359,272,398	
2	1.1	ACTA DE INICIO	0 días	lun 17/01/22	lun 17/01/22	$ 0	
3	1.2	Inicio actividades previas	0 días	lun 17/01/22	lun 17/01/22	$ 0	2FC+1 día
4	1.3	ACTIVIDADES PREVIAS	25 días	lun 17/01/22	lun 14/02/22	$ 0	2
33	1.4	DIAGNOSTICOS y DISEÑOS DE LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	554 días	lun 17/01/22	mar 31/10/23	$ 1,870,341,110	2
34	1.4.1	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2021	0 días	lun 17/01/22	lun 17/01/22	$ 0	2
35	1.4.2	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2021 al 50% - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA S-N LENTA	67 días	lun 17/01/22	vie 1/04/22	$ 258,936,483	
36	1.4.2.1	Ensayos de Laboratorio	67 días	lun 17/01/22	vie 1/04/22	$ 61,654,927	34
37	1.4.2.2	Diagnósticos (Incluido Ajustes)	67 días	lun 17/01/22	vie 1/04/22	$ 197,281,556	34
38	1.4.3	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2021 al 50%	0 días	vie 1/04/22	vie 1/04/22	$ 0	36;37
39	1.4.4	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2021 al 100%	0 días	jue 3/03/22	jue 3/03/22	$ 0	2FC+41 días
40	1.4.5	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2021 al 100% - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA S-N RÁPIDA	35 días	jue 3/03/22	mar 12/04/22	$ 277,461,948	
41	1.4.5.1	Ensayos de Laboratorio	35 días	jue 3/03/22	mar 12/04/22	$ 58,953,970	39
42	1.4.5.2	Diagnósticos (Incluido Ajustes)	35 días	jue 3/03/22	mar 12/04/22	$ 218,507,978	39
43	1.4.6	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2021 al 100%	0 días	mar 12/04/22	mar 12/04/22	$ 0	41;42
44	1.4.7	Fin del plazo de Actividades Previas	0 días	mar 12/04/22	mar 12/04/22	$ 0	43
45	1.4.8	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2022 al 50%	0 días	lun 16/05/22	lun 16/05/22	$ 0	44FC+27 días
46	1.4.9	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2022 al 50% - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S RÁPIDA	38 días	lun 16/05/22	jue 30/06/22	$ 295,560,675	
47	1.4.9.1	Ensayos de Laboratorio	38 días	lun 16/05/22	jue 30/06/22	$ 84,755,309	45
48	1.4.9.2	Diagnósticos (Incluido Ajustes)	38 días	lun 16/05/22	jue 30/06/22	$ 210,805,366	45
49	1.4.10	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2022 al 50%	0 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	$ 0	47;48
50	1.4.11	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2022 al 100%	0 días	jue 30/06/22	jue 30/06/22	$ 0	49
51	1.4.12	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2022 al 100% - AVENIDA BOYACÁ (CONECTANTES, INTERCAMBIADORES Y SECTOR CARLOS LLERAS RESTREPO)	64 días	jue 30/06/22	mié 14/09/22	$ 93,351,380	
52	1.4.12.1	Ensayos de Laboratorio	64 días	jue 30/06/22	mié 14/09/22	$ 19,529,386	50
53	1.4.12.2	Diagnósticos (Incluido Ajustes)	64 días	jue 30/06/22	mié 14/09/22	$ 73,821,994	50
54	1.4.13	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2021 y 2022 al 50% y 100%	0 días	mié 14/09/22	mié 14/09/22	$ 0	52
55	1.4.14	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 170)	0 días	mié 1/02/23	mié 1/02/23	$ 0	53FC+5 mss
56	1.4.15	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% - CALLE 170 ENTRE AUTOPISTA NORTE Y CANAL CORDOBA CALZADA SUR	64 días	mié 1/02/23	mar 18/04/23	$ 39,622,259	
57	1.4.15.1	Ensayos de Laboratorio	64 días	mié 1/02/23	mar 18/04/23	$ 11,364,749	55
58	1.4.15.2	Diagnósticos (Incluido Ajustes)	64 días	mié 1/02/23	mar 18/04/23	$ 28,257,510	55
59	1.4.16	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 170)	0 días	mar 18/04/23	mar 18/04/23	$ 0	57;58
60	1.4.17	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 138)	0 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 0	53FC+6 mss
61	1.4.18	Elaborar Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% - CALLE 138 ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ (CALZADAS SUR Y NORTE)	128 días	mié 1/03/23	mié 2/08/23	$ 189,097,573	
62	1.4.18.1	Presentar Información Previa al Diagnóstico	2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 0	60
63	1.4.18.1.1	Ejecutar Informe del resultado de los análisis interdisciplinarios previos	2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 0	102
64	1.4.18.1.1.1	Identificar tramos afectados por redes (Pozos y sumideros)	2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 0	102
65	1.4.18.1.1.2	Identificar tramos afectados por individuos arbóreos (potencial de cambio volumétrico de los suelos y la succión de la vegetación).	2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 0	64CC
66	1.4.18.2	Elaborar y presentar la Información del Diagnóstico	58 días	mié 15/03/23	jue 25/05/23	$ 76,605,435	62CC+13 días
67	1.4.18.2.1	Ejecutar inventario de deterioros	8 días	mié 15/03/23	vie 24/03/23	$ 0	62CC+4 días
68	1.4.18.2.1.1	Procesar y calcular datos del PCI a nivel de calzada (GU-IC-13)	8 días	mié 15/03/23	vie 24/03/23	$ 0	62CC+4 días
69	1.4.18.2.2	Ejecutar Ensayos de Deflectometría y realizar el Análisis respectivo	5 días	jue 30/03/23	mar 4/04/23	$ 0	68CC+12 días
70	1.4.18.2.3	Realizar exploraciones geotécnicas (Apiques) y Ensayos de Laboratorio	40 días	mié 5/04/23	jue 25/05/23	$ 76,605,435	69FC+1 día
71	1.4.18.2.3.1	Apiques	2 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23	$ 15,956,710	69FC+1 día
72	1.4.18.2.3.2	Ensayo de Contenido de Agua	10 días	mar 11/04/23	sáb 22/04/23	$ 1,335,180	71FC+1 día
73	1.4.18.2.3.3	Ensayo de Granulometría	10 días	mar 11/04/23	sáb 22/04/23	$ 19,635,000	71FC+1 día
74	1.4.18.2.3.4	Ensayo de Límites de Atterberg	10 días	mar 11/04/23	sáb 22/04/23	$ 7,539,840	71FC+1 día
75	1.4.18.2.3.5	Ensayo de CBR	10 días	mar 11/04/23	sáb 22/04/23	$ 16,372,972	71FC+1 día
76	1.4.18.2.3.6	Toma de deflexiones con equipo deflectómetro de impacto (FWD/HWD) para pavimento con superficie flexible. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento y entrega de resultados. Norma técnica: INV E – 798 - 13 ASTM D469	2 días	mié 10/05/23	vie 12/05/23	$ 1,623,160	75FC+15 días
77	1.4.18.2.3.7	Determinación de espesores en estructura de pavimento con equipo Georradar, equipado mínimo con dos antenas de operación, con frecuencias: la primera como mínimo 1000 mhz y la segunda entre 300 y 600. Norma técnica: ASTM D4748.	10 días	vie 12/05/23	jue 25/05/23	$ 1,911,453	76
78	1.4.18.2.3.8	IVA 19%	1 día	mié 5/04/23	lun 10/04/23	$ 12,231,120	
79	1.4.18.3	Información del diseño de intervenciones	107 días	sáb 25/03/23	mié 2/08/23	$ 112,492,138	
80	1.4.18.3.1	Presentar Informe de Tránsito (Contiene: aforo, volúmenes vehiculares proyectados, cálculo de repeticiones por eje, cálculo de ejes equivalente de 8.2 T y 13 T)	20 días	sáb 25/03/23	mié 19/04/23	$ 0	6Z
81	1.4.18.3.2	Elaborar el Informe de Diseño	33 días	vie 23/06/23	mié 2/08/23	$ 112,492,138	72;73;74;75;77;78;80CC
82	1.4.18.3.2.1	Definir de sectores homogéneos de diseño	8 días	vie 23/06/23	mar 4/07/23	$ 0	80CC+74 días
83	1.4.18.3.2.2	Elaborar las Memorias de Cálculo inverso y directo de módulos respecto a deflexiones medidas para el diagnóstico	6 días	mié 5/07/23	mié 12/07/23	$ 0	82FC+1 día
84	1.4.18.3.2.3	Calcular la vida residual del pavimento para las secciones homogéneas de diseño respecto al numeral 3.2.2	5 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	$ 0	83CC+4 días
85	1.4.18.3.2.4	Realizar el Análisis de la subrasante (Resistencia mecánica, módulo resiliente, mejoramientos, potencial de expansión, recomendaciones de estabilización, diseño de mezclas para estabilización química)	5 días	sáb 8/07/23	jue 13/07/23	$ 0	83CC+3 días
86	1.4.18.3.2.5	Definir de módulos dinámicos/resilientes de los materiales propuestos	5 días	vie 14/07/23	mié 19/07/23	$ 0	84CC+3 días;85CC+5 días
87	1.4.18.3.2.6	Ejecutar el Dimensionamiento preliminar de pavimentos flexibles (Método AASHTO/1993).	4 días	mié 19/07/23	mar 25/07/23	$ 0	86
88	1.4.18.3.2.7	Ejecutar el Diseño empírico-mecanicista de pavimentos flexibles (Cálculo de respuestas críticas, repeticiones admisibles y del daño relativo acumulado).	5 días	mié 19/07/23	mié 26/07/23	$ 0	87CC
89	1.4.18.3.2.8	Proponer y Evaluar de alternativas (Comparación técnica y económica que involucre costos de mantenimiento y definición de la recomendada).	5 días	mar 25/07/23	lun 31/07/23	$ 0	87
90	1.4.18.3.2.9	Cuantificar y analizar Cantidades de obra para la alternativa recomendada.	5 días	mié 26/07/23	mar 1/08/23	$ 0	89CC+1 día
91	1.4.18.3.2.10	Ejecutar el Análisis de fuentes y plantas de suministro de materiales y mezclas de materiales. (conforme a lo dispuesto en el numeral 16 del presente documento).	5 días	mié 26/07/23	mar 1/08/23	$ 0	90CC
92	1.4.18.3.2.11	Emitir Recomendaciones técnicas y constructivas.	5 días	jue 27/07/23	mié 2/08/23	$ 0	91CC+1 día
93	1.4.18.3.2.12	Estructurar el Concepto técnico que contenga el análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (ver obligaciones del capítulo 3).	5 días	jue 27/07/23	mié 2/08/23	$ 0	92CC
94	1.4.18.3.2.13	Generar Conclusiones.	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 89,501,239	93CC
95	1.4.18.3.2.14	VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 5,985,664	93CC
96	1.4.18.3.2.15	IVA 19%	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 17,005,235	93CC
97	1.4.19	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 138)	0 días	lun 17/01/22	lun 17/01/22	$ 0	
98	1.4.20	Inicio actividades de Diagnosticos Levantamiento de Daños Segmentos Conservación por reacción	0 días	lun 17/01/22	lun 17/01/22	$ 0	
99	1.4.21	Elaborar Levantamiento de Daños Segmentos Conservación por reacción	128 días	lun 17/01/22	mar 14/06/22	$ 335,020,150	
100	1.4.21.1	Levantamiento de Daños PKID Reporte Ciudadano priorizados al contrato de obra IDU 1712 de 2021 (Incluido Ajustes)	128 días	lun 17/01/22	mar 14/06/22	$ 335,020,150	98
101	1.4.22	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 138)	0 días	mar 14/06/22	mar 14/06/22	$ 0	100
102	1.4.23	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2023 al 100% (AVENIDA FERROCARRIL DEL SUR)	0 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 0	53FC+6 mss
103	1.4.24	Elaborar Diagnósticos y Diseños Vigencia 2023 al 100% - AVENIDA FERROCARRIL DEL SUR ENTRE CALLE 45 SUR Y AVENIDA BOYACÁ	105 días	mar 18/04/23	mié 23/08/23	$ 188,094,623	
104	1.4.24.1	Presentar Información Previa al Diagnóstico	2 días	mar 18/04/23	jue 20/04/23	$ 0	102FC+40 días
105	1.4.24.1.1	Ejecutar Informe del resultado de los análisis interdisciplinarios previos	2 días	mar 18/04/23	jue 20/04/23	$ 0	102
106	1.4.24.1.1.1	Identificar tramos afectados por redes (Pozos y sumideros)	2 días	mar 18/04/23	jue 20/04/23	$ 0	102
107	1.4.24.1.1.2	Identificar tramos afectados por individuos arbóreos (potencial de cambio volumétrico de los suelos y la succión de la vegetación).	2 días	mar 18/04/23	jue 20/04/23	$ 0	106CC
108	1.4.24.2	Elaborar y presentar la Información del Diagnóstico	58 días	jue 4/05/23	jue 13/07/23	$ 56,352,213	104CC+13 días
109	1.4.24.2.1	Ejecutar inventario de deterioros	8 días	jue 4/05/23	vie 12/05/23	$ 0	104CC+4 días
110	1.4.24.2.1.1	Procesar y calcular datos del PCI a nivel de calzada (GU-IC-13)	8 días	jue 4/05/23	vie 12/05/23	$ 0	104CC+4 días
111	1.4.24.2.2	Ejecutar Ensayos de Deflectometría y realizar el Análisis respectivo	5 días	mié 17/05/23	mié 24/05/23	$ 0	110CC+12 días
112	1.4.24.2.3	Realizar exploraciones geotécnicas (Apiques) y Ensayos de Laboratorio	40 días	jue 25/05/23	jue 13/07/23	$ 56,352,213	111FC+1 día
113	1.4.24.2.3.1	Apiques (9 unidades)	2 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23	$ 2,709,630	111FC+1 día
114	1.4.24.2.3.2	Ensayo de Contenido de Agua (20 unidades)	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23	$ 222,530	113FC+1 día
115	1.4.24.2.3.3	Ensayo de Granulometría (20 unidades)	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23	$ 3,272,500	113FC+1 día
116	1.4.24.2.3.4	Ensayo de Límites de Atterberg (20 unidades)	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23	$ 1,256,640	113FC+1 día
117	1.4.24.2.3.5	Ensayo de CBR (9 unidades)	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23	$ 2,780,316	113FC+1 día
118	1.4.24.2.3.6	Inspección de redes de alcantarillado con sistema CCTV para diámetros entre 6" y 36". Incl mano de obra idónea, informe escrito de diagnóstico y DVD con video. Incl IVA	2 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23	$ 4,832,095	117FC+15 días
119	1.4.24.2.3.7	Inspección de redes de alcantarillado con sistema cctv para diámetros mayores a 36". incl mano de obra idónea, informe escrito de diagnóstico y dvd con video. incl iva	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 3,651,639	118
120	1.4.24.2.3.8	Lavado y sondeo de redes de alcantarillado entre 6" y 18" de diámetro y con grado de colmatación menor del 30%. incl mano de obra idónea, señalización básica, sumin de combustible y agua. incl. iva	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 0	119CC
121	1.4.24.2.3.9	Lavado y sondeo de redes de alcantarillado entre 16" y 36" de diámetro y con grado de colmatación menor del 30%. Incluye mano de obra idónea, señalización básica, sumin de combustible y agua. incl iva	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 8,113,516	120CC
122	1.4.24.2.3.10	Equipo vactor - sondeo - limpieza - recolección de lodos no peligrosos	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 12,193,335	121CC
123	1.4.24.2.3.11	Tratamiento y disposición final de lodos no peligrosos provenientes de alcantarillado	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 4,719,000	121CC
124	1.4.24.2.3.12	Agua	10 días	vie 30/06/23	jue 13/07/23	$ 3,603,600	121CC
125	1.4.24.2.3.13	IVA 19%	1 día	vie 30/06/23	sáb 1/07/23	$ 8,997,412	121CC
126	1.4.24.3	Información del diseño de intervenciones	83 días	vie 12/05/23	mié 23/08/23	$ 131,742,410	
127	1.4.24.3.1	Presentar Informe de Tránsito (Contiene: aforo, volúmenes vehiculares proyectados, cálculo de repeticiones por eje, cálculo de ejes equivalente de 8.2 T y 13 T)	20 días	vie 12/05/23	mar 6/06/23	$ 0	109
128	1.4.24.3.2	Elaborar el Informe de Diseño	33 días	jue 13/07/23	mié 23/08/23	$ 131,742,410	127CC;114;115;116;117;119
129	1.4.24.3.2.1	Definir de sectores homogéneos de diseño	8 días	jue 13/07/23	lun 24/07/23	$ 0	127CC
130	1.4.24.3.2.2	Elaborar las Memorias de Cálculo inverso y directo de módulos respecto a deflexiones medidas para el diagnóstico	6 días	mar 25/07/23	lun 31/07/23	$ 0	129FC+1 día
131	1.4.24.3.2.3	Calcular la vida residual del pavimento para las secciones homogéneas de diseño respecto al numeral 3.2.2	5 días	vie 28/07/23	jue 3/08/23	$ 0	130CC+4 días
132	1.4.24.3.2.4	Realizar el Análisis de la subrasante (Resistencia mecánica, módulo resiliente, mejoramientos, potencial de expansión, recomendaciones de estabilización, diseño de mezclas para estabilización química)	5 días	jue 27/07/23	mié 2/08/23	$ 0	130CC+3 días
133	1.4.24.3.2.5	Definir de módulos dinámicos/resilientes de los materiales propuestos	5 días	mié 2/08/23	mié 9/08/23	$ 0	131CC+3 días;132CC+5 días
134	1.4.24.3.2.6	Ejecutar el Dimensionamiento preliminar de pavimentos flexibles (Método AASHTO/1993).	4 días	mié 9/08/23	lun 14/08/23	$ 0	133
135	1.4.24.3.2.7	Ejecutar el Diseño empírico-mecanicista de pavimentos flexibles (Cálculo de respuestas críticas, repeticiones admisibles y del daño relativo acumulado).	5 días	mié 9/08/23	mar 15/08/23	$ 0	134CC
136	1.4.24.3.2.8	Proponer y Evaluar de alternativas (Comparación técnica y económica que involucre costos de mantenimiento y definición de la recomendada).	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23	$ 0	134
137	1.4.24.3.2.9	Cuantificar y analizar Cantidades de obra para la alternativa recomendada.	5 días	mar 15/08/23	mar 22/08/23	$ 0	136CC+1 día
138	1.4.24.3.2.10	Ejecutar el Análisis de fuentes y plantas de suministro de materiales y mezclas de materiales. (conforme a lo dispuesto en el numeral 16 del presente documento).	5 días	mar 15/08/23	mar 22/08/23	$ 0	137CC

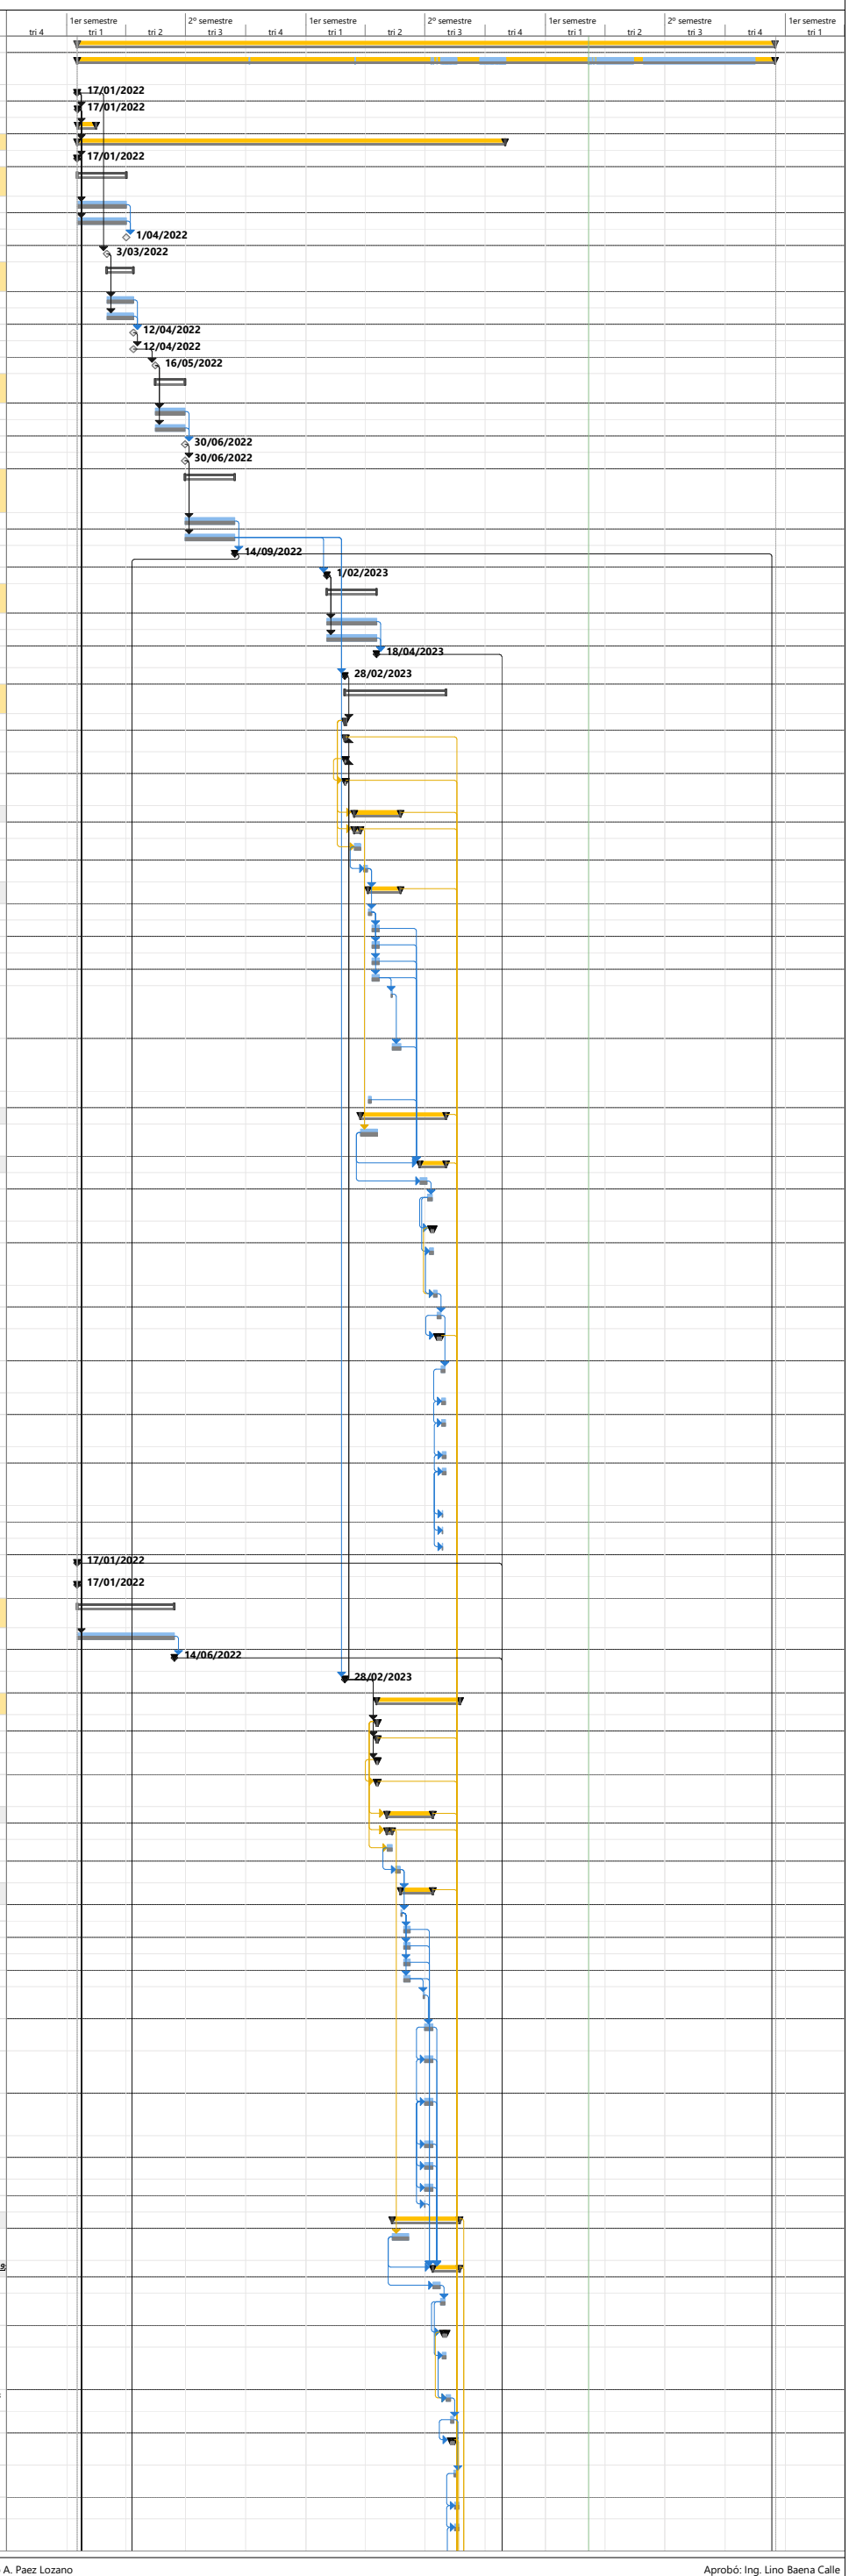


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
139	1.4.24.3.2.11	Emitir Recomendaciones técnicas y constructivas.	5 días	mié 16/08/23	mié 23/08/23	$ 0	138CC+1 día
140	1.4.24.3.2.12	Estructurar el Concepto técnico que contenga el análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (ver obligaciones del capítulo 3).	5 días	mié 16/08/23	mié 23/08/23	$ 0	139CC
141	1.4.24.3.2.13	Generar Conclusiones. (Diseño para rehabilitación o Reconstrucción de vías de 7613.82 m2, incluye IVA y Ajustes por Cambio de Vigencia)	1 día	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 106,281,314	140CC
142	1.4.24.3.2.14	VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA	1 día	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 5,267,646	140CC
143	1.4.24.3.2.15	IVA 19%	1 día	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 20,193,450	140CC
144	**1.4.24.4**	**Revisión de interventoria del 100% de los Diagnósticos (Vigencia 2023) - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S LENTA**	**5 días**	**jue 17/08/23**	**mié 23/08/23**	**$ 0**	**141;142;143**
145	1.4.24.5	Aprobación del diseño de intervención	0 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	$ 0	144
146	1.4.25	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% (AVENIDA FERROCARRIL DEL SUR)	0 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	$ 0	145;105;107;108;109;112;12
147	1.4.26	Inicio actividades de Diagnosticos Vigencia 2023 al 100% (CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE)	0 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	$ 0	146
148	**1.4.27**	**Elaborar Diagnósticos Vigencia 2023 al 100% - (CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE)**	**57 días**	**jue 24/08/23**	**vie 27/10/23**	**$ 193,196,019**	
149	**1.4.27.1**	**Presentar Información Previa al Diagnóstico**	**2 días**	**jue 24/08/23**	**vie 25/08/23**	**$ 0**	
150	1.4.27.1.1	Ejecutar Informe del resultado de los análisis interdisciplinarios previos	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23	$ 0	
151	1.4.27.1.1.1	Identificar tramos afectados por redes (Pozos y sumideros)	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23	$ 0	147
152	1.4.27.1.1.2	Identificar tramos afectados por individuos arbóreos (potencial de cambio volumétrico de los suelos y la succión de la vegetación).	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23	$ 0	151CC
153	**1.4.27.2**	**Elaborar y presentar la Información del Diagnóstico**	**10 días**	**jue 7/09/23**	**mar 19/09/23**	**$ 193,196,019**	**149CC+13 días**
154	1.4.27.2.1	Ejecutar inventario de deterioros	8 días	jue 7/09/23	vie 15/09/23	$ 113,949,347	149CC
155	1.4.27.2.1.1	Procesar y calcular datos del PCI a nivel de calzada (GU-IC-13) (Incluye Ajustes por cambio de Vigencia e IVA)	8 días	jue 7/09/23	vie 15/09/23	$ 113,949,347	149CC
156	**1.4.27.2.2**	**Realizar exploraciones geotécnicas (Apiques) y Ensayos de Laboratorio**	**10 días**	**jue 7/09/23**	**mar 19/09/23**	**$ 79,246,672**	
157	1.4.27.2.2.1	Apiques (58 unidades)	2 días	jue 7/09/23	sáb 9/09/23	$ 17,462,060	155CC
158	1.4.27.2.2.2	Ensayo de Contenido de Agua (116 unidades)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 1,290,674	157FC+1 día
159	1.4.27.2.2.3	Ensayo de Granulometría (116 unidades)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 18,980,500	157FC+1 día
160	1.4.27.2.2.4	Ensayo de Límites de Atterberg (116 unidades)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 7,288,512	157FC+1 día
161	1.4.27.2.2.5	Ensayo de CBR (58 unidades)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 17,917,592	157FC+1 día
162	1.4.27.2.2.6	Ensayo de FWD (65 PTO 3R)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 1,701,700	157FC+1 día
163	1.4.27.2.2.7	Ensayo de Georadar (8.99 Km-Carril)	7 días	lun 11/09/23	mar 19/09/23	$ 1,952,804	157FC+1 día
164	1.4.27.2.2.8	Costos causados por IVA y cambio de Vigencia	7 días	jue 7/09/23	vie 15/09/23	$ 12,652,830	151CC
165	**1.4.27.3**	**Información del diseño de intervenciones**	**35 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 26/10/23**	**$ 0**	
166	1.4.27.3.1	Presentar Informe de Tránsito (Contiene: aforo, volúmenes vehiculares proyectados, cálculo de repeticiones por eje, cálculo de ejes equivalente de 8.2 T y 13 T)	20 días	sáb 16/09/23	lun 9/10/23	$ 0	154
167	**1.4.27.3.2**	**Elaborar el Informe de Diseño**	**33 días**	**mar 19/09/23**	**jue 26/10/23**	**$ 0**	**158;159;160;161;164;166CC**
168	1.4.27.3.2.1	Definir de sectores homogéneos de diseño	8 días	mar 19/09/23	mié 27/09/23	$ 0	166CC
169	1.4.27.3.2.2	Elaborar las Memorias de Cálculo inverso y directo de módulos respecto a deflexiones medidas para el diagnóstico	6 días	jue 28/09/23	jue 5/10/23	$ 0	168FC+1 día
170	1.4.27.3.2.3	Calcular la vida residual del pavimento para las secciones homogéneas de diseño respecto al numeral 3.2.2	5 días	mar 3/10/23	lun 9/10/23	$ 0	169CC+4 días
171	1.4.27.3.2.4	Realizar el Análisis de la subrasante (Resistencia mecánica, módulo resiliente, mejoramientos, potencial de expansión, recomendaciones de estabilización, diseño de mezclas para estabilización química)	5 días	lun 2/10/23	sáb 7/10/23	$ 0	169CC+3 días
172	1.4.27.3.2.5	Definir de módulos dinámicos/resilientes de los materiales propuestos	5 días	sáb 7/10/23	vie 13/10/23	$ 0	170CC+3 días;171CC+5 días
173	1.4.27.3.2.6	Ejecutar el Dimensionamiento preliminar de pavimentos flexibles (Método AASHTO/1993).	4 días	vie 13/10/23	jue 19/10/23	$ 0	172
174	1.4.27.3.2.7	Ejecutar el Diseño empírico-mecanicista de pavimentos flexibles (Cálculo de respuestas críticas, repeticiones admisibles y del daño relativo acumulado).	5 días	vie 13/10/23	jue 19/10/23	$ 0	173CC
175	1.4.27.3.2.8	Proponer y Evaluar de alternativas (Comparación técnica y económica que involucre costos de mantenimiento y definición de la recomendada).	5 días	jue 19/10/23	mar 24/10/23	$ 0	173
176	1.4.27.3.2.9	Cuantificar y analizar Cantidades de obra para la alternativa recomendada.	5 días	vie 20/10/23	mié 25/10/23	$ 0	175CC+1 día
177	1.4.27.3.2.10	Ejecutar el Análisis de fuentes y plantas de suministro de materiales y mezclas de materiales. (conforme a lo dispuesto en el numeral 16 del presente documento).	5 días	vie 20/10/23	mié 25/10/23	$ 0	176CC
178	1.4.27.3.2.11	Emitir Recomendaciones técnicas y constructivas.	5 días	vie 20/10/23	jue 26/10/23	$ 0	177CC+1 día
179	1.4.27.3.2.12	Estructurar el Concepto técnico que contenga el análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (ver obligaciones del capítulo 3).	5 días	vie 20/10/23	jue 26/10/23	$ 0	178CC
180	1.4.27.3.2.13	Generar Conclusiones. (Diseño para rehabilitación o Reconstrucción de vías de 7613.82 m2, incluye IVA y Ajustes por Cambio de Vigencia)	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	$ 0	179CC
181	**1.4.27.4**	**Revisión de interventoria del 100% de los Diagnósticos (Vigencia 2023) - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S LENTA**	**5 días**	**lun 23/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 0**	**180**
182	1.4.27.5	Aprobación del 100% de los Diagnósticos Vigencia 2023 AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S LENTA (Fin del mes 15 del plazo)	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 0	181
183	1.4.28	Fin de Actividades de Diagnósticos Vigencia 2023 al 100%	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 0	150;152;153;154;156;165;16
184	1.4.29	Elaborar y Entregar CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRA PARA VIGENCIA 2023 al termino del 100% de diagnosticos (Tres días háb tras aprobación 100% diag V.2023)	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 0	146FC+3 días;183FC+3 días;59;97;101
185	**1.5**	**OBRAS DE CONSERVACIÓN**	**898.1 días**	**lun 17/01/22**	**lun 16/12/24**	**$ 62,488,931,288**	
186	1.5.1	Valor Componente SSTA - Obras ejecutadas entre el 27 de Abril y 31 de Diciembre de 2022	210 días	lun 17/01/22	mié 21/09/22	$ 64,512,134	3
187	1.5.2	Valor Componente SOCIAL - Obras ejecutadas entre el 27 de Abril y 31 de Diciembre de 2022	210 días	lun 17/01/22	mié 21/09/22	$ 8,374,570	3
188	1.5.3	Valor Componente PMT - Obras ejecutadas entre el 27 de Abril y 31 de Diciembre de 2022	210 días	lun 17/01/22	mié 21/09/22	$ 157,218,667	3
189	1.5.4	Valor Componente BIOSEGURIDAD - Obras ejecutadas entre el 27 de Abril y 20 de Junio de 2022	123 días	lun 17/01/22	jue 9/06/22	$ 6,472,894	3
190	1.5.5	Valor AJUSTES CAUSADOS - Obras ejecutadas entre el 27 de Abril y 31 de Diciembre de 2022	210 días	lun 17/01/22	mié 21/09/22	$ 1,903,599,474	3
191	**1.5.6**	**OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO SEGÚN VIGENCIAS 2021 Y 2022 AL 100%**	**786.1 días**	**mié 27/04/22**	**vie 15/11/24**	**$ 55,394,844,783**	
192	**1.5.6.1**	**OBRAS DE CONSERVACIÓN PROGRAMADA Y CONSERVACIÓN POR REACCIÓN**	**629.55 días**	**mié 27/04/22**	**mar 14/05/24**	**$ 35,691,945,910**	
193	**1.5.6.1.1**	**FRENTE DE OBRA No. 1 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA LENTA)**	**264.65 días**	**mié 27/04/22**	**vie 3/03/23**	**$ 1,739,140,783**	
194	1.5.6.1.1.1	PMTs para intervención en Frente de obra No. 1 TRAMO 1 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 13 A CALLE 26) aprobados por la SDM	0 días	mié 27/04/22	mié 27/04/22	$ 0	54FC-118 días
195	1.5.6.1.1.2	Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 1 TRAMO 1 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 13 A CALLE 26) aprobadas por interventoría (Actas de Vecindad y socializaciones)	0 días	mié 27/04/22	mié 27/04/22	$ 0	194
196	1.5.6.1.1.3	Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 1 TRAMO 1 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 13 A CALLE 26) aprobadas por interventoría (Verificación de campamento, señalización de obra, protecciones a sumidero)	0 días	mié 27/04/22	mié 27/04/22	$ 0	195
197	1.5.6.1.1.4	INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 1 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 13 A CALLE 26)	0 días	mié 27/04/22	mié 27/04/22	$ 0	194;195;196
198	**1.5.6.1.1.5**	**ITEM - 36 / CIV 9003935 PKID 602431 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**246.65 días**	**mié 27/04/22**	**sáb 11/02/23**	**$ 182,121,482**	
199	1.5.6.1.1.5.1	ITEM - 36 / CIV 9003935 PKID 602431 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mié 27/04/22	vie 29/04/22	$ 179,326,354	197
200	1.5.6.1.1.5.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 36 / CIV 9003935 PKID 602431 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	$ 2,795,128	270FC+10 días
201	**1.5.6.1.1.6**	**ITEM - 14 / CIV 9003885 PKID 602420 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**243.39 días**	**lun 2/05/22**	**lun 13/02/23**	**$ 76,007,307**	
202	1.5.6.1.1.6.1	ITEM - 14 / CIV 9003885 PKID 602420 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	lun 2/05/22	mié 4/05/22	$ 75,885,572	199FC+2 días
203	1.5.6.1.1.6.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 14 / CIV 9003885 PKID 602420 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	sáb 11/02/23	lun 13/02/23	$ 121,735	200
204	**1.5.6.1.1.7**	**ITEM - 62 / CIV 8014520 PKID 91033821 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 13 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**243.39 días**	**mar 3/05/22**	**mar 14/02/23**	**$ 90,205,774**	
205	1.5.6.1.1.7.1	ITEM - 62 / CIV 8014520 PKID 91033821 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 13 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 3/05/22	jue 5/05/22	$ 89,146,761	202CC+1 día
206	1.5.6.1.1.7.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 62 / CIV 8014520 PKID 91033821 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 13 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	lun 13/02/23	mar 14/02/23	$ 1,059,013	203
207	**1.5.6.1.1.8**	**ITEM - 69 / CIV 9003744 PKID 602387 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**241.13 días**	**vie 6/05/22**	**mié 15/02/23**	**$ 238,695,137**	
208	1.5.6.1.1.8.1	ITEM - 69 / CIV 9003744 PKID 602387 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	vie 6/05/22	mar 10/05/22	$ 235,837,948	205FC+1 día
209	1.5.6.1.1.8.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 69 / CIV 9003744 PKID 602387 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mar 14/02/23	mié 15/02/23	$ 2,857,189	206
210	**1.5.6.1.1.9**	**ITEM - 46 / CIV 9005047 PKID 91033862 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**237.87 días**	**mié 11/05/22**	**jue 16/02/23**	**$ 31,867,812**	
211	1.5.6.1.1.9.1	ITEM - 46 / CIV 9005047 PKID 91033862 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mié 11/05/22	vie 13/05/22	$ 31,111,146	208FC+2 días
212	1.5.6.1.1.9.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 46 / CIV 9005047 PKID 91033862 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mié 15/02/23	jue 16/02/23	$ 756,666	209
213	**1.5.6.1.1.10**	**ITEM - 19 / CIV 9003735 PKID 389418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**211.61 días**	**lun 13/06/22**	**jue 16/02/23**	**$ 118,060,406**	
214	1.5.6.1.1.10.1	ITEM - 19 / CIV 9003735 PKID 389418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	$ 116,190,623	211FC+25 días
215	1.5.6.1.1.10.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 19 / CIV 9003735 PKID 389418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	jue 16/02/23	jue 16/02/23	$ 1,869,783	212
216	**1.5.6.1.1.11**	**ITEM - 256 / CIV 10009721 PKID 528064 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**210.35 días**	**mié 15/06/22**	**vie 17/02/23**	**$ 146,669,706**	
217	1.5.6.1.1.11.1	ITEM - 256 / CIV 10009721 PKID 528064 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	$ 143,754,434	214
218	1.5.6.1.1.11.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 256 / CIV 10009721 PKID 528064 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	jue 16/02/23	vie 17/02/23	$ 2,915,272	215
219	**1.5.6.1.1.12**	**ITEM - 86 / CIV 9004700 PKID 91024697 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**2.26 días**	**vie 17/06/22**	**mar 21/06/22**	**$ 71,851,478**	**217**
220	**1.5.6.1.1.13**	**ITEM - 17 / CIV 9003658 PKID 522043 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**209.09 días**	**vie 17/06/22**	**lun 20/02/23**	**$ 98,959,147**	
221	1.5.6.1.1.13.1	ITEM - 17 / CIV 9003658 PKID 522043 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22	$ 97,312,941	219CC
222	1.5.6.1.1.13.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 17 / CIV 9003658 PKID 522043 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	vie 17/02/23	lun 20/02/23	$ 1,646,206	218
223	**1.5.6.1.1.14**	**ITEM - 25 / CIV 9003634 PKID 602365 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**210.09 días**	**vie 17/06/22**	**mar 21/02/23**	**$ 138,921,632**	
224	1.5.6.1.1.14.1	ITEM - 25 / CIV 9003634 PKID 602365 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22	$ 136,360,426	221CC
225	1.5.6.1.1.14.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 25 / CIV 9003634 PKID 602365 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	lun 20/02/23	mar 21/02/23	$ 2,561,206	222
226	**1.5.6.1.1.15**	**ITEM - 81 / CIV 9004950 PKID 91035078 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**211.09 días**	**vie 17/06/22**	**mar 21/02/23**	**$ 26,033,203**	

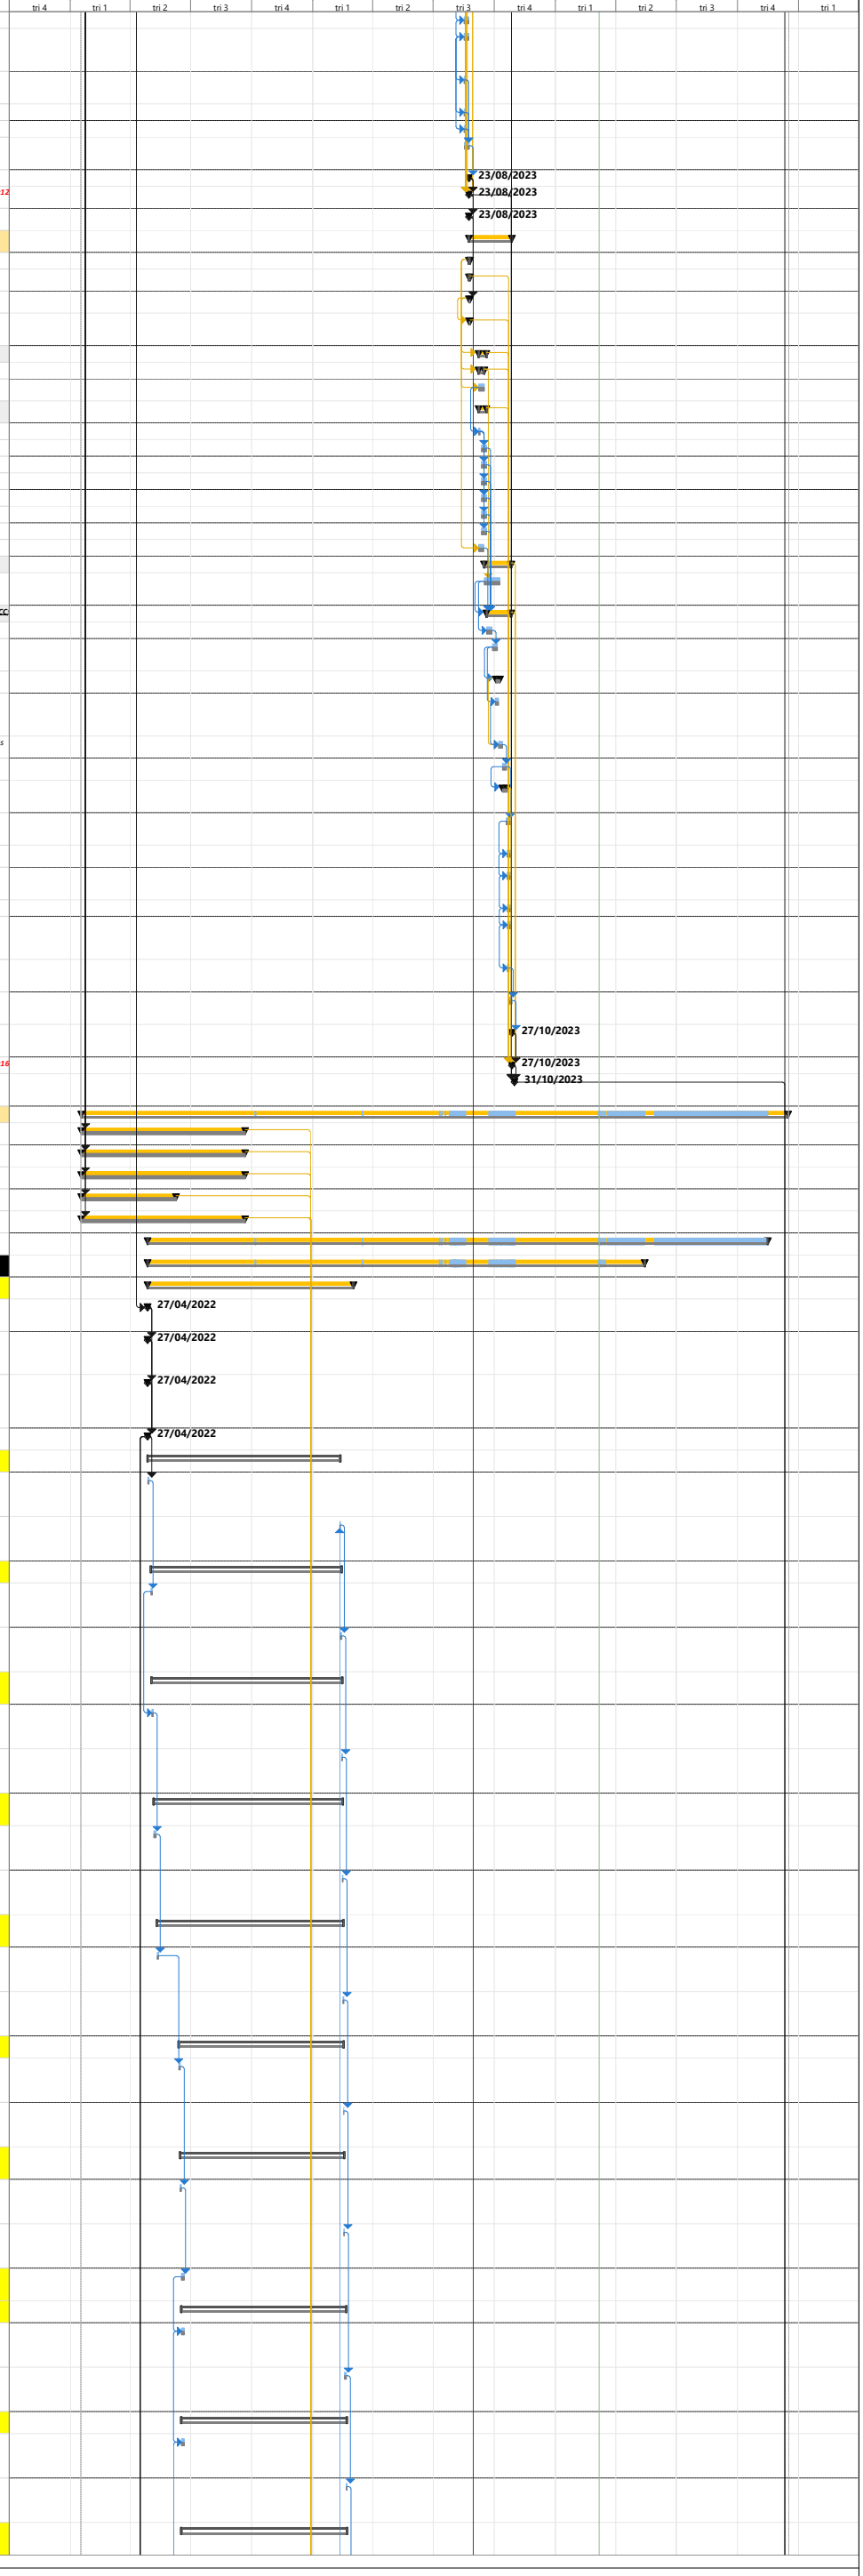


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
227	1.5.6.1.1.15.1	ITEM - 81 / CIV 9004950 PKID 91035078 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22	$ 25,173,898	224CC
228	1.5.6.1.1.15.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 81 / CIV 9004950 PKID 91035078 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mar 21/02/23	mar 21/02/23	$ 859,305	225
229	**1.5.6.1.1.16**	**ITEM - 91 / CIV 9005075 PKID 91035088 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**209.83 días**	**mar 21/06/22**	**mié 22/02/23**	**$ 34,879,912**	
230	1.5.6.1.1.16.1	ITEM - 91 / CIV 9005075 PKID 91035088 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	$ 33,649,833	227
231	1.5.6.1.1.16.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 91 / CIV 9005075 PKID 91035088 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mar 21/02/23	mié 22/02/23	$ 1,230,079	228
232	**1.5.6.1.1.17**	**ITEM - 82 / CIV 9005076 PKID 91035089 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**210.83 días**	**mar 21/06/22**	**jue 23/02/23**	**$ 49,766,786**	
233	1.5.6.1.1.17.1	ITEM - 82 / CIV 9005076 PKID 91035089 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	$ 48,470,668	230CC
234	1.5.6.1.1.17.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 82 / CIV 9005076 PKID 91035089 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mié 22/02/23	jue 23/02/23	$ 1,296,118	231
235	**1.5.6.1.1.18**	**ITEM - 57 / CIV 9003518 PKID 602343 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**211.83 días**	**mar 21/06/22**	**vie 24/02/23**	**$ 41,030,593**	
236	1.5.6.1.1.18.1	ITEM - 57 / CIV 9003518 PKID 602343 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	$ 40,003,405	233CC
237	1.5.6.1.1.18.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 57 / CIV 9003518 PKID 602343 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 1,027,188	234
238	**1.5.6.1.1.19**	**ITEM - 67 / CIV 9003463 PKID 602789 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**212.83 días**	**mar 21/06/22**	**sáb 25/02/23**	**$ 94,441,949**	
239	1.5.6.1.1.19.1	ITEM - 67 / CIV 9003463 PKID 602789 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	$ 92,470,322	236CC
240	1.5.6.1.1.19.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 67 / CIV 9003463 PKID 602789 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	vie 24/02/23	sáb 25/02/23	$ 1,971,627	237
241	**1.5.6.1.1.20**	**ITEM - 32 / CIV 9003418 PKID 91024866 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**211.57 días**	**jue 23/06/22**	**lun 27/02/23**	**$ 8,189,347**	
242	1.5.6.1.1.20.1	ITEM - 32 / CIV 9003418 PKID 91024866 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22	$ 7,532,138	239
243	1.5.6.1.1.20.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 32 / CIV 9003418 PKID 91024866 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	sáb 25/02/23	lun 27/02/23	$ 657,209	240
244	**1.5.6.1.1.21**	**ITEM - 88 / CIV 9004933 PKID 91024383 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**211.57 días**	**vie 24/06/22**	**mar 28/02/23**	**$ 24,153,538**	
245	1.5.6.1.1.21.1	ITEM - 88 / CIV 9004933 PKID 91024383 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	vie 24/06/22	mié 29/06/22	$ 23,766,851	242CC+1 día
246	1.5.6.1.1.21.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 88 / CIV 9004933 PKID 91024383 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 386,687	243
247	**1.5.6.1.1.22**	**ITEM - 24 / CIV 9004932 PKID 91024384 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25C BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**151.57 días**	**mar 6/09/22**	**mié 1/03/23**	**$ 75,590,787**	
248	1.5.6.1.1.22.1	ITEM - 24 / CIV 9004932 PKID 91024384 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25C BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	mar 6/09/22	jue 8/09/22	$ 73,791,021	245CC+2 días;1999CC+2 días
249	1.5.6.1.1.22.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 24 / CIV 9004932 PKID 91024384 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25C BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 1,799,766	246
250	**1.5.6.1.1.23**	**ITEM - 28 / CIV 9003852 PKID 602409 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**101.31 días**	**jue 3/11/22**	**jue 2/03/23**	**$ 53,045,535**	
251	1.5.6.1.1.23.1	ITEM - 28 / CIV 9003852 PKID 602409 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.26 días	jue 3/11/22	mar 8/11/22	$ 52,424,926	248FC+49 días;2000FC+49 días
252	1.5.6.1.1.23.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 28 / CIV 9003852 PKID 602409 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 620,609	249
253	**1.5.6.1.1.24**	**ITEM - / CIV 9005046 PKID 91033863 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**2.26 días**	**mar 8/11/22**	**jue 10/11/22**	**$ 15,549,464**	**251**
254	**1.5.6.1.1.25**	**ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**97.79 días**	**jue 10/11/22**	**vie 3/03/23**	**$ 123,099,788**	
255	1.5.6.1.1.25.1	ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 10/11/22	sáb 12/11/22	$ 120,992,900	253
256	1.5.6.1.1.25.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	1 día	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 2,106,888	252;255
257	*1.5.6.1.2*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 1 (AV. BOYACÁ CZSN lento, DESDE CALLE 13 A CALLE 26)*	*0 días*	*vie 3/03/23*	*vie 3/03/23*	*$ 0*	*252;256*
258	**1.5.6.1.3**	**FRENTE DE OBRA No. 2 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA LENTA)**	**333.6 días**	**vie 6/05/22**	**sáb 3/06/23**	**$ 2,531,281,454**	
259	*1.5.6.1.3.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 2 TRAMO 2 (AV. BOYACÁ CZSN lento, DESDE CALLE 26 A CALLE 72) aprobados por la SDM*	*0 días*	*vie 6/05/22*	*vie 6/05/22*	*$ 0*	*197CC+8 días*
260	*1.5.6.1.3.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 2 TRAMO 2 (AV. BOYACÁ CZSN lento, DESDE CALLE 26 A CALLE 72) aprobadas por interventoría (Actas de Vecindad y socializaciones)*	*0 días*	*vie 6/05/22*	*vie 6/05/22*	*$ 0*	*197CC+8 días*
261	*1.5.6.1.3.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 2 TRAMO 2 (AV. BOYACÁ CZSN lento, DESDE CALLE 26 A CALLE 72) aprobadas por interventoría (Verificación de campamento, señalización de obra, protecciones a sumidero)*	*0 días*	*vie 6/05/22*	*vie 6/05/22*	*$ 0*	*197CC+8 días*
262	*1.5.6.1.3.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 2 (AV. BOYACÁ CZSN lento, DESDE CALLE 26 A CALLE 72))*	*0 días*	*sáb 7/05/22*	*sáb 7/05/22*	*$ 0*	*197CC+9.5 días;259;260;261*
263	**1.5.6.1.3.5**	**ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**237.15 días**	**sáb 7/05/22**	**sáb 11/02/23**	**$ 55,301,169**	
264	1.5.6.1.3.5.1	ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 7/05/22	mar 10/05/22	$ 43,885,645	262
265	1.5.6.1.3.5.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.2 días	sáb 28/01/23	sáb 28/01/23	$ 84,021	264FC+9.3 mss
266	1.5.6.1.3.5.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 28/01/23	sáb 28/01/23	$ 993,898	265
267	1.5.6.1.3.5.4	3.022 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	$ 408,855	266
268	1.5.6.1.3.5.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	$ 455,719	267
269	1.5.6.1.3.5.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD25 - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	$ 4,049,883	268
270	1.5.6.1.3.5.7	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	lun 30/01/23	lun 30/01/23	$ 4,380,047	269
271	1.5.6.1.3.5.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 151 / CIV 10011506 PKID 24122903 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	vie 10/02/23	sáb 11/02/23	$ 1,043,101	270FC+10 días
272	**1.5.6.1.3.6**	**ITEM - 196 / CIV 10011505 PKID 24122907 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52 BIS HASTA CALLE 52B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**sáb 7/05/22**	**mar 10/05/22**	**$ 55,390,759**	**264CC**
273	**1.5.6.1.3.7**	**ITEM - 130 / CIV 10009623 PKID 522747 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 51 HASTA CALLE 52B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 10/05/22**	**mié 11/05/22**	**$ 102,231,370**	**272**
274	**1.5.6.1.3.8**	**ITEM - 187 / CIV 10009566 PKID 522722 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52 HASTA CALLE 52 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 10/05/22**	**mié 11/05/22**	**$ 38,438,937**	**273CC**
275	**1.5.6.1.3.9**	**ITEM - 293 / CIV 10011510 PKID 24122885 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 50 HASTA CALLE 51 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**vie 13/05/22**	**lun 16/05/22**	**$ 75,140,722**	**274FC+2 días**
276	**1.5.6.1.3.10**	**ITEM - 237 / CIV 10011509 PKID 24122889 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 50 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**vie 13/05/22**	**lun 16/05/22**	**$ 41,172,503**	**275CC**
277	**1.5.6.1.3.11**	**ITEM - 107 / CIV 10011508 PKID 24122893 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 49A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**lun 16/05/22**	**mié 18/05/22**	**$ 80,552,304**	**276**
278	**1.5.6.1.3.12**	**ITEM - 173 / CIV 10011507 PKID 24122899 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 48 HASTA CALLE 49 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mié 18/05/22**	**jue 19/05/22**	**$ 87,716,283**	**277CC+1 día**
279	**1.5.6.1.3.13**	**ITEM - 198 / CIV 10009389 PKID 522666 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54 BIS HASTA CALLE 54A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**jue 19/05/22**	**vie 20/05/22**	**$ 31,018,057**	**278**
280	**1.5.6.1.3.14**	**ITEM - 138 / CIV 10009370 PKID 522646 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54A HASTA CALLE 55 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**jue 19/05/22**	**vie 20/05/22**	**$ 36,030,480**	**279CC**
281	**1.5.6.1.3.15**	**ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**229.15 días**	**jue 19/05/22**	**lun 13/02/23**	**$ 131,744,308**	
282	1.5.6.1.3.15.1	ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 19/05/22	vie 20/05/22	$ 115,697,706	280CC
283	1.5.6.1.3.15.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.2 días	mar 31/01/23	mar 31/01/23	$ 113,980	282FC+9 mss
284	1.5.6.1.3.15.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 31/01/23	mar 31/01/23	$ 1,352,002	283
285	1.5.6.1.3.15.4	3.001- TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 31/01/23	mar 31/01/23	$ 556,168	284
286	1.5.6.1.3.15.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 31/01/23	mar 31/01/23	$ 619,876	285
287	1.5.6.1.3.15.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD25 - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 31/01/23	mié 1/02/23	$ 5,507,492	286
288	1.5.6.1.3.15.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 31/01/23	mié 1/02/23	$ 5,956,487	286
289	1.5.6.1.3.15.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 259 / CIV 10009437 PKID 522680 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	sáb 11/02/23	lun 13/02/23	$ 1,940,597	288FC+8 días;271
290	**1.5.6.1.3.16**	**ITEM - 207 / CIV 10011514 PKID 24122775 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 56A HASTA CALLE 63 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**jue 19/05/22**	**vie 20/05/22**	**$ 22,424,649**	**282CC**
291	**1.5.6.1.3.17**	**ITEM - 216 / CIV 10011513 PKID 24122778 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 55 HASTA CALLE 56A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**sáb 21/05/22**	**lun 23/05/22**	**$ 111,057,966**	**290FC+0.5 días**
292	**1.5.6.1.3.18**	**ITEM - 160 / CIV 10009236 PKID 522609 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 HASTA CALLE 63 BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**sáb 21/05/22**	**lun 23/05/22**	**$ 55,347,804**	**291CC**
293	**1.5.6.1.3.19**	**ITEM - 121 / CIV 10009186 PKID 522594 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 BIS HASTA CALLE 63A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 24/05/22**	**jue 26/05/22**	**$ 49,191,790**	**292FC+1 día**
294	**1.5.6.1.3.20**	**ITEM - 206 / CIV 10009132 PKID 522577 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63A HASTA CALLE 63B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 24/05/22**	**jue 26/05/22**	**$ 50,944,949**	**293CC**
295	**1.5.6.1.3.21**	**ITEM - 274 / CIV 10009084 PKID 522552 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63B HASTA CALLE 63D / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mié 25/05/22**	**jue 26/05/22**	**$ 48,710,019**	**294CC+1 día**
296	**1.5.6.1.3.22**	**ITEM - 210 / CIV 10009040 PKID 522535 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63D HASTA CALLE 63F / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mié 25/05/22**	**jue 26/05/22**	**$ 22,957,425**	**295CC**

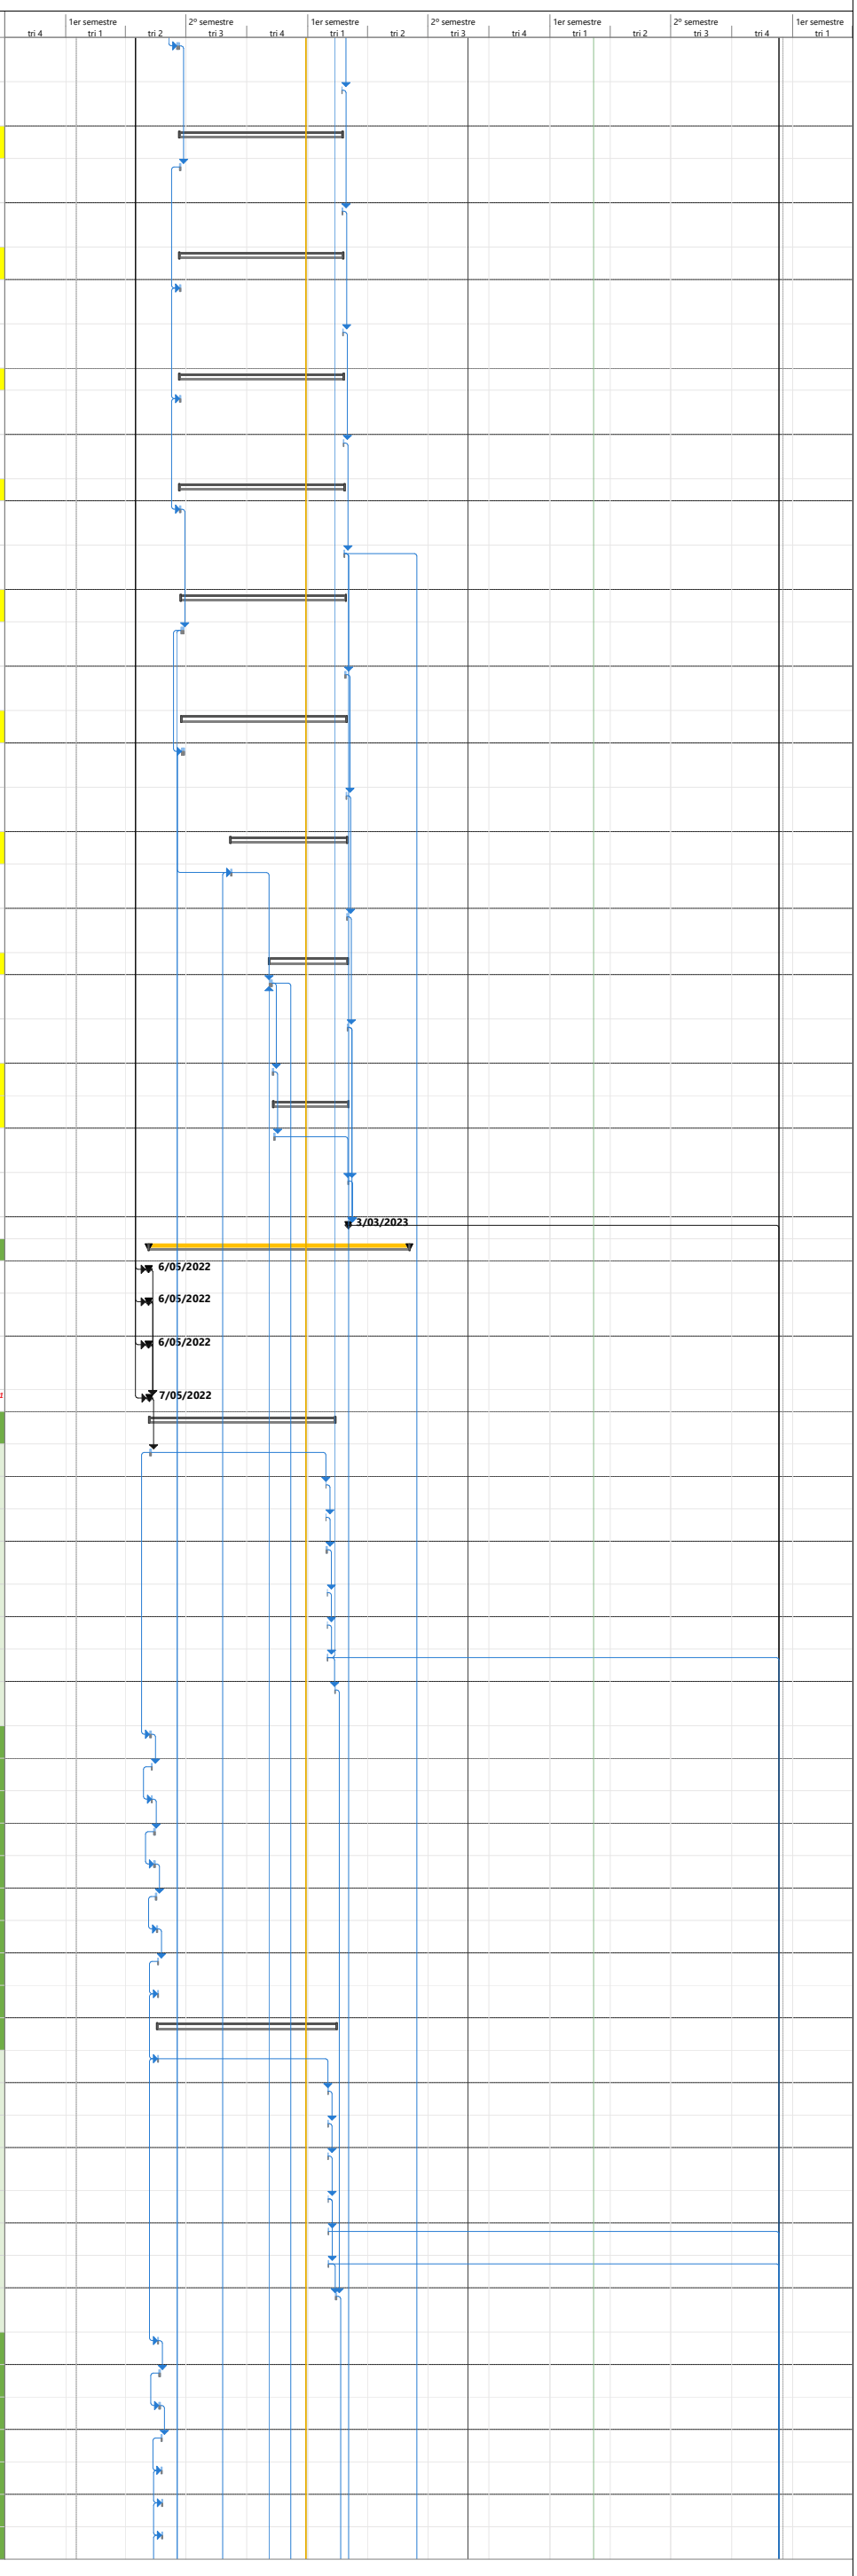


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
297	1.5.6.1.3.23	ITEM - 102 / CIV 10009018 PKID 522521 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63F HASTA CALLE 64 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	$ 35,621,054	296CC
298	1.5.6.1.3.24	ITEM - 161 / CIV 10008970 PKID 522510 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64 HASTA CALLE 64B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	$ 67,786,110	297CC
299	1.5.6.1.3.25	ITEM - 233 / CIV 10008900 PKID 522499 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64B HASTA CALLE 64C / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	vie 27/05/22	lun 30/05/22	$ 46,278,668	298FC+0.5 días
300	1.5.6.1.3.26	ITEM - 158 / CIV 10008844 PKID 522479 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64C HASTA CALLE 64F / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 31/05/22	mié 1/06/22	$ 83,743,580	299FC+1 día
301	1.5.6.1.3.27	ITEM - 170 / CIV 10008764 PKID 522462 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64H / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 31/05/22	mié 1/06/22	$ 61,487,679	300CC
302	1.5.6.1.3.28	ITEM - 225 / CIV 10008698 PKID 522445 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64H HASTA CALLE 65 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 31/05/22	mié 1/06/22	$ 92,408,374	301CC
303	1.5.6.1.3.29	ITEM - 221 / CIV 10008594 PKID 522419 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65 HASTA CALLE 65A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$ 25,765,705	302FC+1 día
304	1.5.6.1.3.30	ITEM - 136 / CIV 10008558 PKID 522408 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 65B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 4/06/22	lun 6/06/22	$ 21,283,018	303FC+0.5 días
305	1.5.6.1.3.31	ITEM - 142 / CIV 10008532 PKID 522394 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65B HASTA CALLE 66 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 4/06/22	lun 6/06/22	$ 57,770,726	304CC
306	1.5.6.1.3.32	ITEM - 99 / CIV 10008458 PKID 522377 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66 HASTA CALLE 66A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 4/06/22	lun 6/06/22	$ 66,809,617	305CC
307	1.5.6.1.3.33	ITEM - 245 / CIV 10011882 PKID 91060012 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 48 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	$ 130,312,741	306FC+4 días
308	1.5.6.1.3.34	ITEM - 180 / CIV 10008212 PKID 522354 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 67 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 9/08/22	mié 10/08/22	$ 238,666,771	307FC+47 días
309	1.5.6.1.3.35	ITEM - 280 / CIV 10008150 PKID 522337 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 68B HASTA CALLE 69A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	vie 12/08/22	mar 16/08/22	$ 82,970,702	308FC+2 días
310	1.5.6.1.3.36	ITEM - 192 / CIV 10008010 PKID 522310 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69A HASTA CALLE 69B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 13/08/22	mar 16/08/22	$ 39,681,653	309CC+0.5 días
311	1.5.6.1.3.37	ITEM - 218 / CIV 10010137 PKID 522826 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69B HASTA CALLE 70 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 29/11/22	mié 30/11/22	$ 51,671,074	310FC+90 días
312	1.5.6.1.3.38	ITEM - 285 / CIV 10007937 PKID 522294 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 70 HASTA CALLE 71 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 29/11/22	mié 30/11/22	$ 100,865,988	311CC
313	1.5.6.1.3.39	ITEM - 113 / CIV 10007798 PKID 522267 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71 HASTA CALLE 71A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 1/12/22	sáb 3/12/22	$ 96,065,757	312FC+1 día
314	1.5.6.1.3.40	ITEM - 202 / CIV 10007678 PKID 91060016 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71A HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 1/12/22	sáb 3/12/22	$ 59,105,883	313CC
315	1.5.6.1.3.41	ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	156.6 días	jue 1/12/22	sáb 3/06/23	$ 77,614,860	
316	1.5.6.1.3.41.1	ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 1/12/22	sáb 3/12/22	$ 41,320,513	314CC
317	1.5.6.1.3.41.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.2 días	jue 1/06/23	jue 1/06/23	$ 288,800	316FC+6.35 mss
318	1.5.6.1.3.41.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.5 días	jue 1/06/23	jue 1/06/23	$ 3,216,502	317
319	1.5.6.1.3.41.4	3.001 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.5 días	jue 1/06/23	vie 2/06/23	$ 1,323,162	318
320	1.5.6.1.3.41.5	3.009. RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.5 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 1,473,725	319
321	1.5.6.1.3.41.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD25 - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.5 días	vie 2/06/23	sáb 3/06/23	$ 13,092,294	320
322	1.5.6.1.3.41.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.5 días	sáb 3/06/23	sáb 3/06/23	$ 14,159,636	321
323	1.5.6.1.3.41.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 240 / CIV 10011883 PKID 522248 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1 día	lun 13/02/23	mar 14/02/23	$ 2,740,228	289
324	1.5.6.1.4	FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 2 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 26 A CALLE 72))	0 días	sáb 3/06/23	sáb 3/06/23	$ 0	316;322;323
325	1.5.6.1.5	FRENTE DE OBRA No. 3 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA)	260.5 días	mar 30/08/22	mar 4/07/23	$ 1,090,606,527	
326	1.5.6.1.5.1	PMTs para intervención en Frente de obra No. 3 TRAMO 3 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE) aprobados por la SDM	0 días	mar 30/08/22	mar 30/08/22	$ 0	310FC+12 días
327	1.5.6.1.5.2	Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 3 TRAMO 3 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE) aprobadas por interventoria (Actas de Vecindad y socializaciones)	0 días	mar 30/08/22	mar 30/08/22	$ 0	326
328	1.5.6.1.5.3	Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 3 TRAMO 3 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 72 A CA aprobadas por interventoria (Verificación de campamento, señalización de obra, protecciones a sumidero)	0 días	mar 30/08/22	mar 30/08/22	$ 0	327
329	1.5.6.1.5.4	INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 3 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE))	0 días	mar 30/08/22	mar 30/08/22	$ 0	326;327;328
330	1.5.6.1.5.5	ITEM - 242 / CIV 10010119 PKID 91014813 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 81B HASTA CALLE 86A / CALZADA Sur-Norte Lenta	260.25 días	mar 30/08/22	mar 4/07/23	$ 53,852,817	
331	1.5.6.1.5.5.1	ITEM - 242 / CIV 10010119 PKID 91014813 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 81B HASTA CALLE 86A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 30/08/22	mié 31/08/22	$ 52,633,877	329
332	1.5.6.1.5.5.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 242 / CIV 10010119 PKID 91014813 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 81B HASTA CALLE 86A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 1,218,940	346
333	1.5.6.1.5.6	ITEM - 212 / CIV 10006601 PKID 522105 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Lenta	258.75 días	mié 31/08/22	mar 4/07/23	$ 361,377,110	
334	1.5.6.1.5.6.1	ITEM - 212 / CIV 10006601 PKID 522105 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 31/08/22	vie 2/09/22	$ 356,101,137	331;2012
335	1.5.6.1.5.6.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 212 / CIV 10006601 PKID 522105 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 5,275,973	346
336	1.5.6.1.5.7	ITEM - 255 / CIV 10010140 PKID 2501946 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 81B / CALZADA Sur-Norte Lenta	257.75 días	jue 1/09/22	mar 4/07/23	$ 104,928,471	
337	1.5.6.1.5.7.1	ITEM - 255 / CIV 10010140 PKID 2501946 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 81B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 1/09/22	vie 2/09/22	$ 103,758,862	334CC+1 día
338	1.5.6.1.5.7.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 255 / CIV 10010140 PKID 2501946 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 81B / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 1,169,609	346
339	1.5.6.1.5.8	ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	251.25 días	jue 8/09/22	mar 4/07/23	$ 31,864,872	
340	1.5.6.1.5.8.1	ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 8/09/22	sáb 10/09/22	$ 22,510,562	337FC+5 días
341	1.5.6.1.5.8.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 72,634	340FC+248 días;2010FC+248 días
342	1.5.6.1.5.8.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 868,454	341
343	1.5.6.1.5.8.4	3.001 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 357,254	342
344	1.5.6.1.5.8.5	3.009. RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 397,986	343
345	1.5.6.1.5.8.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD25 - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 3,534,920	344
346	1.5.6.1.5.8.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	$ 3,823,101	345
347	1.5.6.1.5.8.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 299,961	346
348	1.5.6.1.5.9	ITEM - 231 / CIV 10011793 PKID 91032700 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte Lenta	249.75 días	sáb 10/09/22	mar 4/07/23	$ 46,003,343	
349	1.5.6.1.5.9.1	ITEM - 231 / CIV 10011793 PKID 91032700 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	sáb 10/09/22	lun 12/09/22	$ 45,384,325	340;2010
350	1.5.6.1.5.9.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 231 / CIV 10011793 PKID 91032700 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 619,018	346
351	1.5.6.1.5.10	ITEM - 129 / CIV 10007085 PKID 522149 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Lenta	254.25 días	mar 6/09/22	mar 4/07/23	$ 188,952,614	
352	1.5.6.1.5.10.1	ITEM - 129 / CIV 10007085 PKID 522149 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 6/09/22	mié 7/09/22	$ 186,486,091	337FC+2 días
353	1.5.6.1.5.10.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 129 / CIV 10007085 PKID 522149 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 2,466,523	346
354	1.5.6.1.5.11	ITEM - 167 / CIV 10007526 PKID 522224 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Lenta	246.75 días	mié 14/09/22	mar 4/07/23	$ 83,065,821	
355	1.5.6.1.5.11.1	ITEM - 167 / CIV 10007526 PKID 522224 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 14/09/22	jue 15/09/22	$ 81,863,590	352FC+6 días
356	1.5.6.1.5.11.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 167 / CIV 10007526 PKID 522224 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 1,202,231	346
357	1.5.6.1.5.12	ITEM - 112 / CIV 10007477 PKID 522208 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Lenta	247 días	mié 14/09/22	mar 4/07/23	$ 58,817,913	
358	1.5.6.1.5.12.1	ITEM - 112 / CIV 10007477 PKID 522208 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 14/09/22	jue 15/09/22	$ 57,789,929	355CC
359	1.5.6.1.5.12.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 112 / CIV 10007477 PKID 522208 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 1,027,984	356
360	1.5.6.1.5.13	ITEM - 275 / CIV 10007434 PKID 522197 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Lenta	247 días	mié 14/09/22	mar 4/07/23	$ 71,792,284	
361	1.5.6.1.5.13.1	ITEM - 275 / CIV 10007434 PKID 522197 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mié 14/09/22	jue 15/09/22	$ 70,859,779	358CC
362	1.5.6.1.5.13.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 275 / CIV 10007434 PKID 522197 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 932,505	356
363	1.5.6.1.5.14	ITEM - 140 / CIV 10007207 PKID 522166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Lenta	235.25 días	mar 27/09/22	mar 4/07/23	$ 49,145,342	
364	1.5.6.1.5.14.1	ITEM - 140 / CIV 10007207 PKID 522166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 27/09/22	mié 28/09/22	$ 48,243,867	361FC+10 días

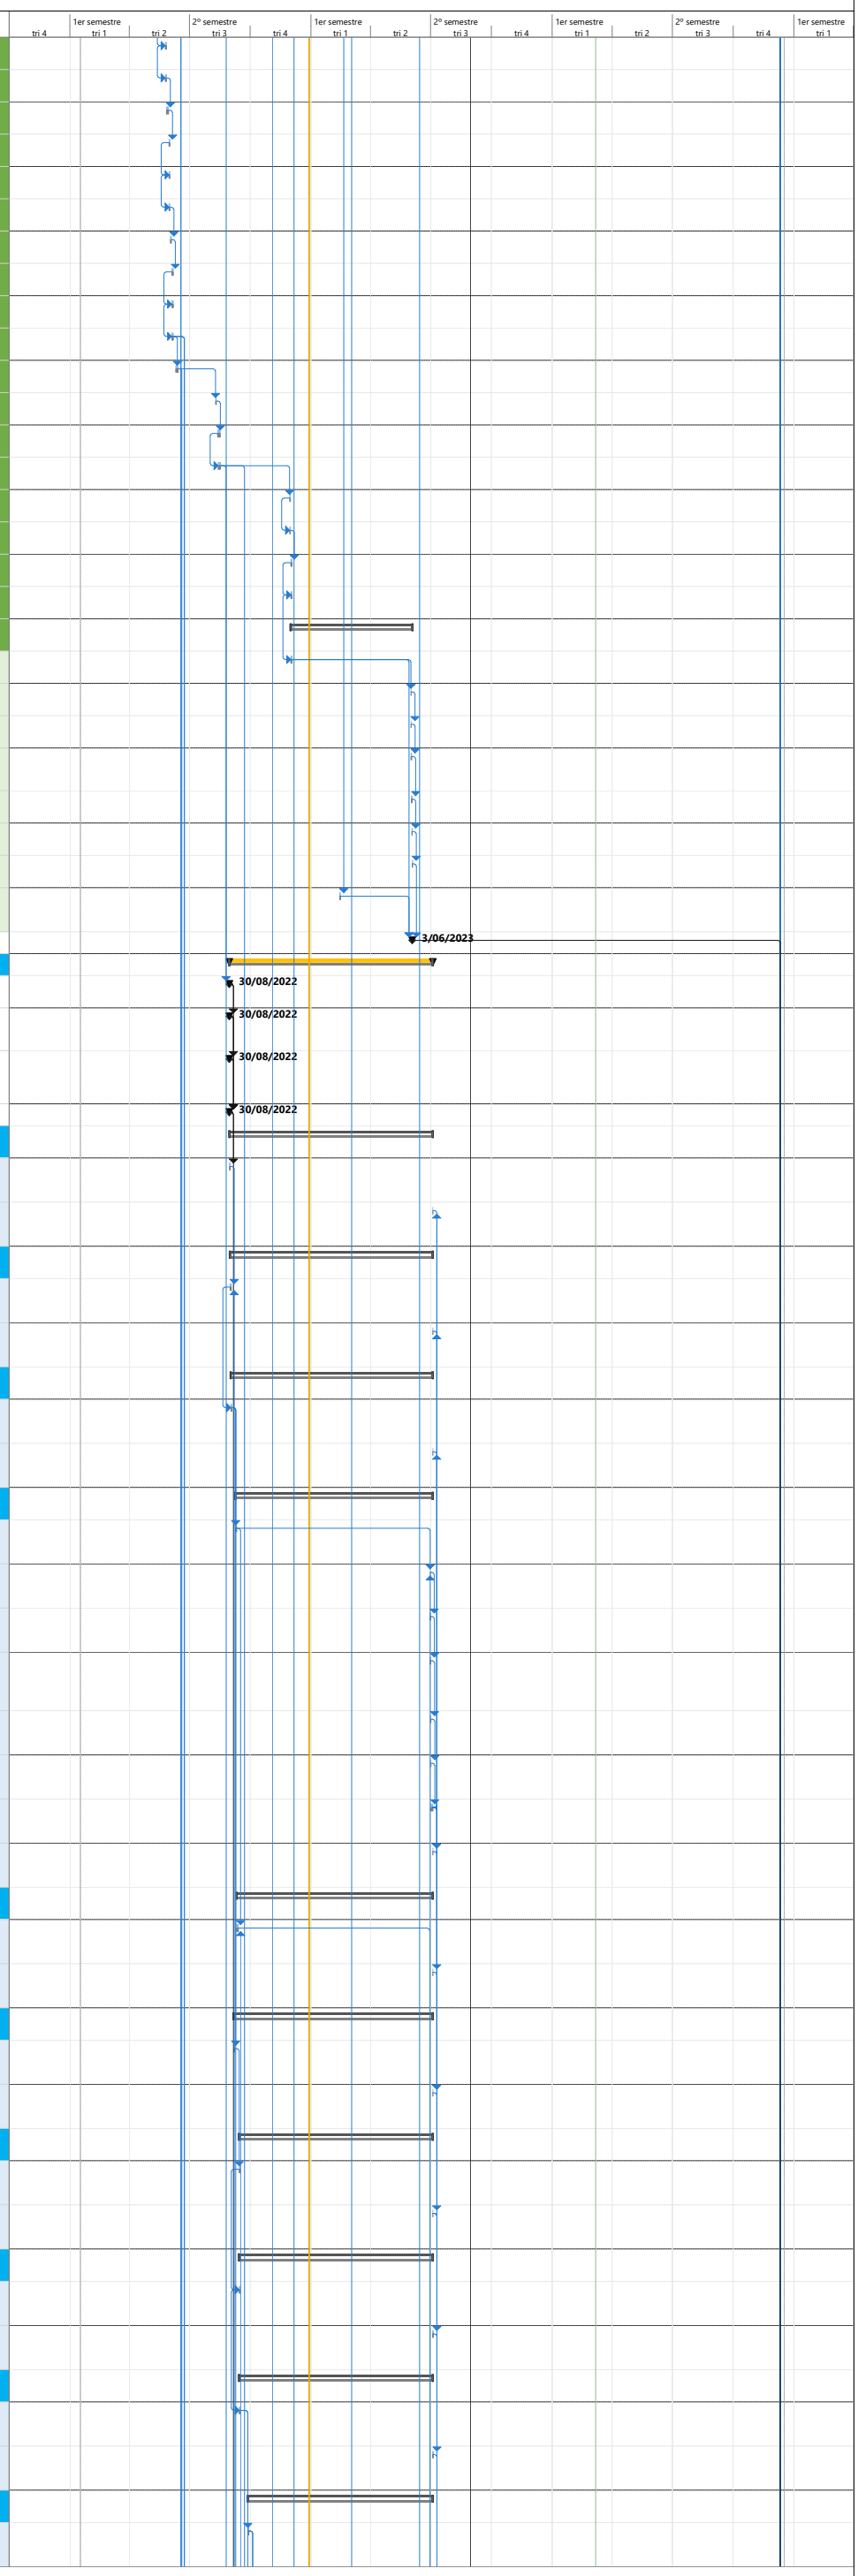


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
365	1.5.6.1.5.14.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 140 / CIV 10007207 PKID 522166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 901,475	346
366	**1.5.6.1.5.15**	**ITEM - 270 / CIV 10011794 PKID 91032701 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**228.75 días**	**mar 4/10/22**	**mar 4/07/23**	**$ 6,708,162**	
367	1.5.6.1.5.15.1	ITEM - 270 / CIV 10011794 PKID 91032701 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	mar 4/10/22	mié 5/10/22	$ 6,460,714	364FC+5 días;2005FC+5 días
368	1.5.6.1.5.15.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 270 / CIV 10011794 PKID 91032701 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 247,448	346
369	**1.5.6.1.5.16**	**ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**226.25 días**	**jue 6/10/22**	**mar 4/07/23**	**$ 32,955,221**	
370	1.5.6.1.5.16.1	ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 6/10/22	sáb 8/10/22	$ 10,129,262	367FC+1 día;2007FC+1 día
371	1.5.6.1.5.16.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 184,887	370FC+223 días;2008FC+223 días
372	1.5.6.1.5.16.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 2,161,965	371
373	1.5.6.1.5.16.4	3.001 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 889,359	372
374	1.5.6.1.5.16.5	3.009. RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 990,760	373
375	1.5.6.1.5.16.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD25 - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 8,799,958	374
376	1.5.6.1.5.16.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	$ 9,517,369	375
377	1.5.6.1.5.16.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 281,661	376
378	**1.5.6.1.5.17**	**ITEM - 278 / CIV 10007387 PKID 522186 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**vie 3/02/23**	**lun 6/02/23**	**$ 901,474**	**370FC+100 días;2008FC+100 días**
379	**1.5.6.1.5.18**	**CIV 11014793 - PKID 91027130 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 86A Y CALLE 86A CZLsn**	**0.25 días**	**vie 16/06/23**	**vie 16/06/23**	**$ 241,083**	**378FC+110 días**
380	*1.5.6.1.6*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 3 (AV. BOYACÁ CZSN lenta, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE))*	*0 días*	*mar 4/07/23*	*mar 4/07/23*	*$ 0*	*378;349;2006;377;379*
381	**1.5.6.1.7**	**FRENTE DE OBRA No. 4 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA)**	**167.45 días**	**mié 21/09/22**	**mié 5/04/23**	**$ 270,048,392**	
382	*1.5.6.1.7.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 4 TRAMO 4 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 13 A CALLE 26) aprobados por la SDM*	*0 días*	*mar 27/09/22*	*mar 27/09/22*	*$ 0*	*310FC+37 días*
383	*1.5.6.1.7.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 4 TRAMO 4 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 13 A CALLE 26) aprobadas por interventoría (Actas de Vecindad y socializaciones)*	*0 días*	*mar 27/09/22*	*mar 27/09/22*	*$ 0*	*382*
384	*1.5.6.1.7.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 4 TRAMO 4 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 13 A CALLE 26)aprobadas por interventoría (Verificación de campamento, señalización de obra, protección a sumideros)*	*0 días*	*mar 27/09/22*	*mar 27/09/22*	*$ 0*	*383*
385	*1.5.6.1.7.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 4 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 13 A CALLE 26)*	*0 días*	*mar 27/09/22*	*mar 27/09/22*	*$ 0*	*384*
386	**1.5.6.1.7.5**	**ITEM - 26 / CIV 9003744 PKID 602385 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mar 27/09/22**	**jue 29/09/22**	**$ 66,463,373**	**385**
387	**1.5.6.1.7.6**	**ITEM - 64 / CIV 9003735 PKID 389416 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**0.5 días**	**lun 24/10/22**	**lun 24/10/22**	**$ 52,513**	**1971FC+16 días**
388	**1.5.6.1.7.7**	**ITEM - 13 / CIV 9004949 PKID 24122824 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**1.2 días**	**mié 26/10/22**	**jue 27/10/22**	**$ 1,759,984**	**387FC+2 días**
389	**1.5.6.1.7.8**	**ITEM - 58 / CIV 9005047 PKID 91033860 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.45 días**	**jue 20/10/22**	**sáb 22/10/22**	**$ 20,237,877**	
390	1.5.6.1.7.8.1	ITEM - 58 / CIV 9005047 PKID 91033860 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 20/10/22	vie 21/10/22	$ 20,182,181	1987CC-3 días;387CC-3 días
391	1.5.6.1.7.8.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 58 / CIV 9005047 PKID 91033860 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	vie 21/10/22	sáb 22/10/22	$ 55,696	390
392	**1.5.6.1.7.9**	**ITEM - / CIV 9005046 PKID 91033866 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mié 21/09/22**	**vie 23/09/22**	**$ 13,390,202**	**390CC-24 días;1994CC-24 días**
393	**1.5.6.1.7.10**	**ITEM - 20 / CIV 9004932 PKID 91024382 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25G / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mié 21/09/22**	**vie 23/09/22**	**$ 48,239,835**	**392CC**
394	**1.5.6.1.7.11**	**ITEM - 257 / CIV 10009721 PKID 528062 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**6.8 días**	**vie 23/09/22**	**sáb 1/10/22**	**$ 106,911,408**	
395	1.5.6.1.7.11.1	ITEM - 257 / CIV 10009721 PKID 528062 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 29/09/22	sáb 1/10/22	$ 106,705,334	386
396	1.5.6.1.7.11.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 257 / CIV 10009721 PKID 528062 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 26 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	vie 23/09/22	sáb 24/09/22	$ 206,074	392
397	**1.5.6.1.7.12**	**ITEM - 27 / CIV 9003634 PKID 602363 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**140.45 días**	**lun 24/10/22**	**mié 5/04/23**	**$ 12,993,200**	
398	1.5.6.1.7.12.1	ITEM - 27 / CIV 9003634 PKID 602363 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	$ 12,718,700	395FC+18 días
399	1.5.6.1.7.12.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 27 / CIV 9003634 PKID 602363 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	mar 4/04/23	mié 5/04/23	$ 274,500	398FC+138 días
400	*1.5.6.1.8*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 4 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 13 A CALLE 26)*	*0 días*	*mié 5/04/23*	*mié 5/04/23*	*$ 0*	*399;393;388*
401	**1.5.6.1.9**	**FRENTE DE OBRA No. 5 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA)**	**171.1 días**	**mar 28/06/22**	**lun 16/01/23**	**$ 2,703,983,524**	
402	*1.5.6.1.9.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 5 TRAMO 5 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 26 A CALLE 72) aprobados por la SDM*	*0 días*	*mar 28/06/22*	*mar 28/06/22*	*$ 0*	*306FC+17 días*
403	*1.5.6.1.9.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 5 TRAMO 5 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 26 A CALLE 72) aprobadas por interventoría (Actas de Vecindad y socializaciones)*	*0 días*	*mar 28/06/22*	*mar 28/06/22*	*$ 0*	*306FC+17 días*
404	*1.5.6.1.9.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 5 TRAMO 5 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 26 A CALLE 72)aprobadas por interventoría (Verificación de campamento, señalización de obra, protección a sumideros)*	*0 días*	*mar 28/06/22*	*mar 28/06/22*	*$ 0*	*403CC*
405	*1.5.6.1.9.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 5 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 26 A CALLE 72)*	*0 días*	*mar 28/06/22*	*mar 28/06/22*	*$ 0*	*404CC;402*
406	**1.5.6.1.9.5**	**ITEM - 223 / CIV 10011507 PKID 24122896 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 48A HASTA CALLE 49 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mar 28/06/22**	**jue 30/06/22**	**$ 94,401,148**	**405**
407	**1.5.6.1.9.6**	**ITEM - 111 / CIV 10011508 PKID 24122892 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 49A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mar 28/06/22**	**jue 30/06/22**	**$ 69,411,040**	**406CC**
408	**1.5.6.1.9.7**	**ITEM - 182 / CIV 10011509 PKID 24122888 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 50 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mié 29/06/22**	**jue 30/06/22**	**$ 39,500,273**	**407CC+1 día**
409	**1.5.6.1.9.8**	**ITEM - 105 / CIV 10011510 PKID 24122884 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 50 HASTA CALLE 51 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mié 29/06/22**	**jue 30/06/22**	**$ 78,528,332**	**408CC**
410	**1.5.6.1.9.9**	**ITEM - 250 / CIV 10009623 PKID 522745 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 51 HASTA CALLE 52 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**sáb 2/07/22**	**mié 6/07/22**	**$ 91,890,410**	**409FC+1.5 días**
411	**1.5.6.1.9.10**	**ITEM - 235 / CIV 10009566 PKID 522720 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52 HASTA CALLE 52 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**sáb 2/07/22**	**mié 6/07/22**	**$ 47,985,526**	**410CC**
412	**1.5.6.1.9.11**	**ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**163.6 días**	**jue 7/07/22**	**lun 16/01/23**	**$ 120,350,965**	
413	1.5.6.1.9.11.1	ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	jue 7/07/22	sáb 9/07/22	$ 108,922,757	411FC+1 día
414	1.5.6.1.9.11.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.15 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 98,396	411FC+6.8 mss
415	1.5.6.1.9.11.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 1,059,301	414
416	1.5.6.1.9.11.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS- ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 435,761	415
417	1.5.6.1.9.11.5	3.009 - RIEGO DE LIGA - ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	sáb 14/01/23	sáb 14/01/23	$ 269,574	416
418	1.5.6.1.9.11.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MD19 - ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	sáb 14/01/23	lun 16/01/23	$ 9,326,480	417
419	1.5.6.1.9.11.7	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 211 / CIV 10009437 PKID 522678 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	lun 16/01/23	lun 16/01/23	$ 238,696	418
420	**1.5.6.1.9.12**	**ITEM - 163 / CIV 10009389 PKID 522664 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54 BIS HASTA CALLE 54A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**jue 7/07/22**	**sáb 9/07/22**	**$ 27,531,815**	**413CC**
421	**1.5.6.1.9.13**	**ITEM - 145 / CIV 10009370 PKID 522644 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54A HASTA CALLE 55 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**jue 7/07/22**	**sáb 9/07/22**	**$ 31,955,215**	**420CC**
422	**1.5.6.1.9.14**	**ITEM - 291 / CIV 10011513 PKID 24122776 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 55 HASTA CALLE 56A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**sáb 9/07/22**	**mar 12/07/22**	**$ 105,037,859**	**421**
423	**1.5.6.1.9.15**	**ITEM - 241 / CIV 10011514 PKID 24122774 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 56A HASTA CALLE 63 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**lun 11/07/22**	**mié 13/07/22**	**$ 23,396,615**	**422CC+1 día**
424	**1.5.6.1.9.16**	**ITEM - 134 / CIV 10009236 PKID 522607 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 HASTA CALLE 63 BIS / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**lun 11/07/22**	**mié 13/07/22**	**$ 49,471,380**	**423CC**
425	**1.5.6.1.9.17**	**ITEM - 166 / CIV 10009186 PKID 522592 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 BIS HASTA CALLE 63A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mié 13/07/22**	**vie 15/07/22**	**$ 55,378,888**	**424**
426	**1.5.6.1.9.18**	**ITEM - 181 / CIV 10009132 PKID 522575 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63A HASTA CALLE 63B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mié 13/07/22**	**vie 15/07/22**	**$ 64,147,982**	**425CC**
427	**1.5.6.1.9.19**	**ITEM - 249 / CIV 10009084 PKID 522550 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63B HASTA CALLE 63D / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**mié 13/07/22**	**vie 15/07/22**	**$ 58,179,981**	**426CC**
428	**1.5.6.1.9.20**	**ITEM - 251 / CIV 10009040 PKID 522533 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63D HASTA CALLE 63F / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**jue 14/07/22**	**vie 15/07/22**	**$ 34,292,088**	**427CC+1 día**
429	**1.5.6.1.9.21**	**ITEM - 267 / CIV 10009018 PKID 522519 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63F HASTA CALLE 64 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**vie 15/07/22**	**lun 18/07/22**	**$ 46,898,782**	**427CC+2 días**
430	**1.5.6.1.9.22**	**ITEM - 271 / CIV 10008970 PKID 522508 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64 HASTA CALLE 64B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**vie 15/07/22**	**lun 18/07/22**	**$ 79,245,161**	**429CC**
431	**1.5.6.1.9.23**	**ITEM - 194 / CIV 10008900 PKID 522497 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64B HASTA CALLE 64C / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**vie 15/07/22**	**lun 18/07/22**	**$ 52,639,856**	**430CC**
432	**1.5.6.1.9.24**	**ITEM - 228 / CIV 10008844 PKID 522477 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64C HASTA CALLE 64F / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**lun 18/07/22**	**jue 21/07/22**	**$ 112,547,210**	**431CC+2 días**
433	**1.5.6.1.9.25**	**ITEM - 213 / CIV 10008764 PKID 522460 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64H / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**lun 18/07/22**	**jue 21/07/22**	**$ 78,841,928**	**432CC**
434	**1.5.6.1.9.26**	**ITEM - 162 / CIV 10008698 PKID 522443 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64H HASTA CALLE 65 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**jue 21/07/22**	**vie 22/07/22**	**$ 118,387,784**	**433**
435	**1.5.6.1.9.27**	**ITEM - 282 / CIV 10008594 PKID 522417 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65 HASTA CALLE 65A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2 días**	**vie 22/07/22**	**mar 26/07/22**	**$ 33,491,982**	**434**

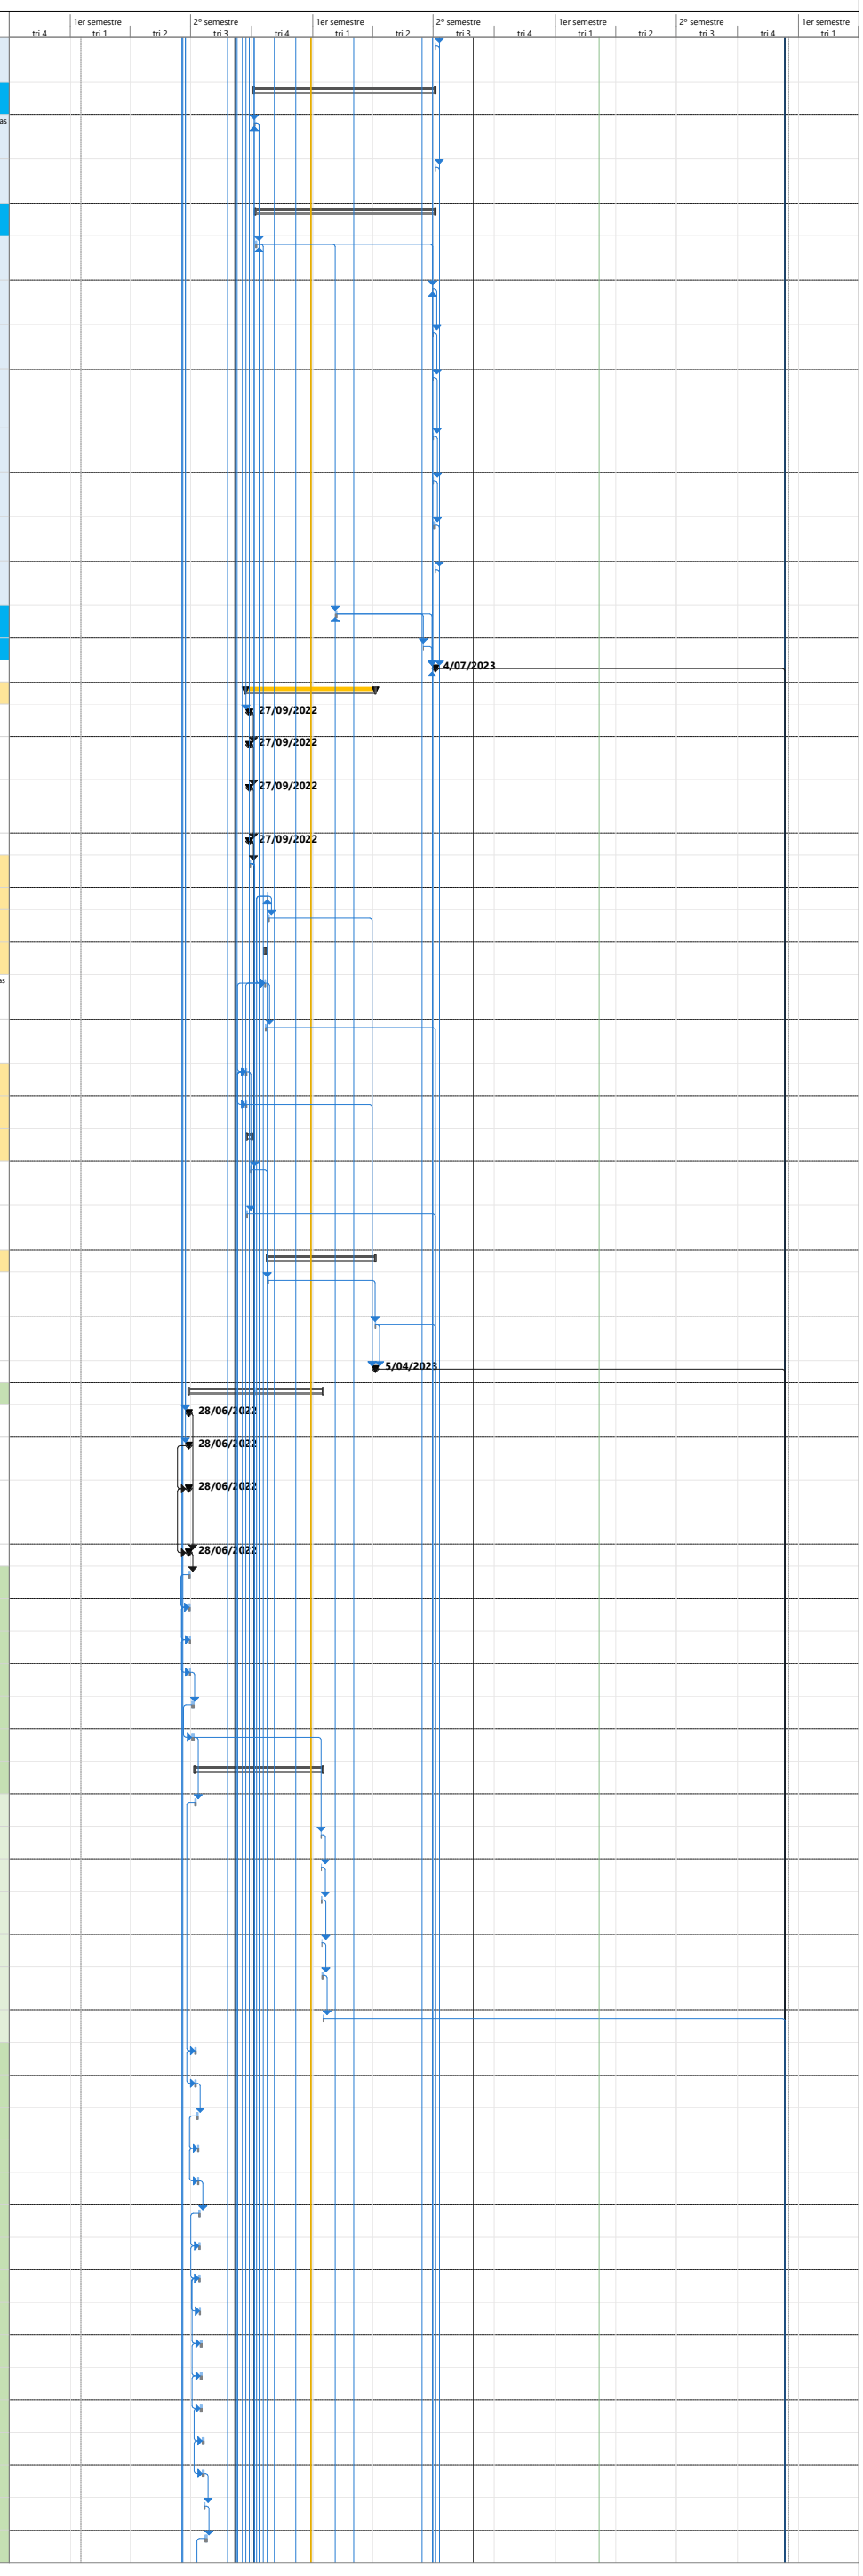

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
436	1.5.6.1.9.28	ITEM - 230 / CIV 10008558 PKID 522406 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 65B / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	vie 22/07/22	mar 26/07/22	$ 24,675,797	435CC
437	1.5.6.1.9.29	ITEM - 124 / CIV 10008532 PKID 522392 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65B HASTA CALLE 66 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	vie 22/07/22	mar 26/07/22	$ 73,294,915	436CC
438	1.5.6.1.9.30	ITEM - 261 / CIV 10008458 PKID 522375 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66 HASTA CALLE 66A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	lun 25/07/22	mar 26/07/22	$ 88,108,213	437CC+1 día
439	1.5.6.1.9.31	ITEM - 260 / CIV 10008212 PKID 522352 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 68B / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	lun 25/07/22	mar 26/07/22	$ 283,831,577	438CC
440	1.5.6.1.9.32	ITEM - 177 / CIV 10008150 PKID 522335 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 68B HASTA CALLE 69A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	mié 27/07/22	vie 29/07/22	$ 111,821,117	439FC+1 día
441	1.5.6.1.9.33	ITEM - 168 / CIV 10008010 PKID 522308 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69A HASTA CALLE 69B / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	sáb 30/07/22	mar 2/08/22	$ 42,928,306	440FC+0.5 días
442	1.5.6.1.9.34	ITEM - / CIV 10010137 PKID 522824 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69B HASTA CALLE 70 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	sáb 30/07/22	mar 2/08/22	$ 67,690,608	441CC
443	1.5.6.1.9.35	ITEM - 159 / CIV 10007937 PKID 522292 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 70 HASTA CALLE 71 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	mié 3/08/22	jue 4/08/22	$ 108,752,173	442FC+1 día
444	1.5.6.1.9.36	ITEM - 144 / CIV 10007798 PKID 522265 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71 HASTA CALLE 71A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	mié 3/08/22	jue 4/08/22	$ 106,120,368	443CC
445	1.5.6.1.9.37	ITEM - 239 / CIV 10007678 PKID 91060015 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71A HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22	$ 58,939,856	444FC+1 día
446	1.5.6.1.9.38	ITEM - 238 / CIV 10011883 PKID 522246 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	vie 5/08/22	mar 9/08/22	$ 59,800,343	445CC
447	1.5.6.1.9.39	ITEM - 246 / CIV 10011882 PKID 91060011 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 48 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2 días	mar 4/10/22	mié 5/10/22	$ 71,825,704	446FC+49 días
448	1.5.6.1.9.40	ITEM - 232 / CIV 10011505 PKID 24122908 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52 BIS HASTA CALLE 52B / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.7 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 41,330,374	447
449	1.5.6.1.9.41	ITEM - 188 / CIV 10011506 PKID 24122902 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52B HASTA CALLE 53 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.7 días	jue 6/10/22	vie 7/10/22	$ 51,351,953	448
450	*1.5.6.1.10*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 5 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 26 A CALLE 72)*	*0 días*	*vie 7/10/22*	*vie 7/10/22*	*$ 0*	*449*
451	1.5.6.1.11	FRENTE DE OBRA No. 6 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA)	284.55 días	mar 16/08/22	mar 18/07/23	$ 1,271,204,049	
452	*1.5.6.1.11.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 6 TRAMO 6 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE) aprobados por la SDM*	*0 días*	*mar 16/08/22*	*mar 16/08/22*	*$ 0*	*446FC+6 días*
453	*1.5.6.1.11.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 6 TRAMO 6 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE) aprobadas por Interventoría (Actas de Vecindad y socializaciones)*	*0 días*	*mar 16/08/22*	*mar 16/08/22*	*$ 0*	*452*
454	*1.5.6.1.11.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 6 TRAMO 6 AV. BOYACÁ CZSN rápida, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE) aprobadas por int. (Verificación de campamento, señalización de obra, protección a sumideros)*	*0 días*	*mar 16/08/22*	*mar 16/08/22*	*$ 0*	*453*
455	*1.5.6.1.11.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO 6 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE)*	*0 días*	*mar 16/08/22*	*mar 16/08/22*	*$ 0*	*454*
456	1.5.6.1.11.5	ITEM - 117 / CIV 10007434 PKID 522195 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22	$ 60,042,671	455
457	1.5.6.1.11.6	ITEM - 286 / CIV 10007387 PKID 522184 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte Rápida	150.25 días	mar 16/08/22	mar 7/02/23	$ 116,116,773	
458	1.5.6.1.11.6.1	ITEM - 286 / CIV 10007387 PKID 522184 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22	$ 115,353,742	456CC
459	1.5.6.1.11.6.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 286 / CIV 10007387 PKID 522184 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 763,031	458CC+150 días
460	1.5.6.1.11.7	ITEM - 224 / CIV 10007207 PKID 522164 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22	$ 229,886,460	
461	1.5.6.1.11.7.1	ITEM - 224 / CIV 10007207 PKID 522164 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22	$ 228,136,024	458CC
462	1.5.6.1.11.7.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 224 / CIV 10007207 PKID 522164 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 16/08/22	jue 18/08/22	$ 1,750,436	458CC
463	1.5.6.1.11.8	ITEM - 191 / CIV 10007085 PKID 522147 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Rápida	148.05 días	jue 18/08/22	mar 7/02/23	$ 131,381,725	
464	1.5.6.1.11.8.1	ITEM - 191 / CIV 10007085 PKID 522147 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 18/08/22	lun 22/08/22	$ 130,773,846	461
465	1.5.6.1.11.8.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 191 / CIV 10007085 PKID 522147 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 607,879	458CC+150 días
466	1.5.6.1.11.9	ITEM - 283 / CIV 10011793 PKID 91032703 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 19/08/22	mar 23/08/22	$ 67,042,905	464CC+1 día;2013CC+1 día
467	1.5.6.1.11.10	ITEM - 229 / CIV 10011794 PKID 91032704 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 19/08/22	mar 23/08/22	$ 23,078,031	466CC
468	1.5.6.1.11.11	ITEM - 172 / CIV 10006772 PKID 522112 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Rápida	146.05 días	lun 22/08/22	mar 7/02/23	$ 89,384,444	
469	1.5.6.1.11.11.1	ITEM - 172 / CIV 10006772 PKID 522112 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	lun 22/08/22	mié 24/08/22	$ 88,580,835	467CC+1 día;2015CC+1 día
470	1.5.6.1.11.11.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 172 / CIV 10006772 PKID 522112 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.25 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 803,609	458CC+150 días
471	1.5.6.1.11.12	ITEM - 183 / CIV 10006601 PKID 522103 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22	$ 144,586,134	469CC+1 día;2017CC+1 día
472	1.5.6.1.11.13	ITEM - 156 / CIV 10010119 PKID 2501945 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 81B HASTA CALLE 86A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	lun 31/10/22	mié 2/11/22	$ 200,909,332	471;2019
473	1.5.6.1.11.14	ITEM - 263 / CIV 11014793 PKID 91027130 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 86A HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 3/11/22	mar 8/11/22	$ 91,577,764	472FC+1 día
474	1.5.6.1.11.15	ITEM - 215 / CIV 10007526 PKID 522222 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 24/11/22	lun 28/11/22	$ 18,804,898	473FC+14.5 días
475	1.5.6.1.11.16	ITEM - 122 / CIV 10007477 PKID 522206 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 24/11/22	lun 28/11/22	$ 60,116,347	474CC
476	1.5.6.1.11.17	ITEM - 292 / CIV 10006857 PKID 522121 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 14/07/23	mar 18/07/23	$ 38,179,495	475FC+22 días;2021FC+22 días
477	1.5.6.1.11.18	ITEM - 179 / CIV 11013818 PKID 91034041 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 14/07/23	mar 18/07/23	$ 97,070	476CC;2022CC
478	*1.5.6.1.12*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO 6 (AV. BOYACÁ CZSN Rápida, DESDE CALLE 72 A CANAL SALITRE)*	*0 días*	*mar 18/07/23*	*mar 18/07/23*	*$ 0*	*464;471;475;477;2013;2019;*
479	1.5.6.1.13	FRENTE DE OBRA No. 7 - CONECTANTES E INTERCAMBIADORES DE CALZADAS	241.06 días	jue 29/09/22	jue 13/07/23	$ 743,201,067	
480	*1.5.6.1.13.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 10 (CONECTANTES E INTERCAMBIADORES)*	*0 días*	*jue 29/09/22*	*jue 29/09/22*	*$ 0*	*450FC-7 días*
481	*1.5.6.1.13.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 10 (CONECTANTES E INTERCAMBIADORES)*	*0 días*	*jue 29/09/22*	*jue 29/09/22*	*$ 0*	*480*
482	*1.5.6.1.13.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 10 (CONECTANTES E INTERCAMBIADORES) aprobadas por int. (Verificación de campamento, señalización de obra, protección a sumideros)*	*0 días*	*jue 29/09/22*	*jue 29/09/22*	*$ 0*	*481*
483	*1.5.6.1.13.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 10 (CONECTANTES E INTERCAMBIADORES)*	*0 días*	*jue 29/09/22*	*jue 29/09/22*	*$ 0*	*482*
484	1.5.6.1.13.5	ITEM - 39 / CIV 9003735 PKID 24120124 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	1.5 días	jue 29/09/22	vie 30/09/22	$ 17,905,837	483
485	1.5.6.1.13.6	ITEM - / CIV 9004340 PKID 91063373 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CALZADA Conectante SE Conectante	1.5 días	lun 10/10/22	mié 12/10/22	$ 59,852,714	484FC+8 días
486	1.5.6.1.13.7	ITEM - 294 / CIV 10010277 PKID 91016797 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SW Conectante	2 días	vie 14/10/22	mar 18/10/22	$ 242,588,863	
487	1.5.6.1.13.7.1	ITEM - 294 / CIV 10010277 PKID 91016797 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SW Conectante	1.5 días	vie 14/10/22	sáb 15/10/22	$ 236,971,555	485FC+2 días;1888FC+2 días
488	1.5.6.1.13.7.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 294 / CIV 10010277 PKID 91016797 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SW Conectante	0.5 días	sáb 15/10/22	mar 18/10/22	$ 5,617,308	487
489	1.5.6.1.13.8	ITEM - 4 / CIV 9004381 PKID 24120166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17A HASTA CALLE 18 / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	1.5 días	mar 18/10/22	jue 20/10/22	$ 912,121	487FC+1 día
490	1.5.6.1.13.9	ITEM - 11 / CIV 9003935 PKID 24120133 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 18A / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	1.5 días	mar 18/10/22	jue 20/10/22	$ 29,229,630	489CC
491	1.5.6.1.13.10	ITEM - 73 / CIV 9003852 PKID 602398 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	1.5 días	vie 21/10/22	lun 24/10/22	$ 5,392,024	490FC+2 días
492	1.5.6.1.13.11	ITEM - 3 / CIV 9004374 PKID 91026634 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SE Conectante	2 días	mar 25/10/22	jue 27/10/22	$ 101,069,092	
493	1.5.6.1.13.11.1	ITEM - 3 / CIV 9004374 PKID 91026634 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SE Conectante	1.5 días	mar 25/10/22	mié 26/10/22	$ 99,248,639	491FC+1 día
494	1.5.6.1.13.11.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 3 / CIV 9004374 PKID 91026634 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante SE Conectante	0.5 días	mié 26/10/22	jue 27/10/22	$ 1,820,453	493
495	1.5.6.1.13.12	ITEM - 1 / CIV 9004939 PKID 24122804 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NW Conectante	2 días	jue 27/10/22	sáb 29/10/22	$ 139,213,840	
496	1.5.6.1.13.12.1	ITEM - 1 / CIV 9004939 PKID 24122804 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NW Conectante	1.5 días	jue 27/10/22	sáb 29/10/22	$ 136,202,295	493FC+1 día
497	1.5.6.1.13.12.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 1 / CIV 9004939 PKID 24122804 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NW Conectante	0.5 días	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	$ 3,011,545	496
498	1.5.6.1.13.13	ITEM - 18 / CIV 9004951 PKID 24122812 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NE Conectante	2 días	mar 1/11/22	jue 3/11/22	$ 65,101,500	
499	1.5.6.1.13.13.1	ITEM - 18 / CIV 9004951 PKID 24122812 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NE Conectante	1.5 días	mar 1/11/22	mié 2/11/22	$ 63,570,664	496FC+2 días
500	1.5.6.1.13.13.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 18 / CIV 9004951 PKID 24122812 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NE Conectante	0.5 días	mié 2/11/22	jue 3/11/22	$ 1,530,836	499
501	1.5.6.1.13.14	ITEM - 288 / CIV 10010167 PKID 91018823 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante NW Conectante	2 días	mié 2/11/22	vie 4/11/22	$ 61,765,200	
502	1.5.6.1.13.14.1	ITEM - 288 / CIV 10010167 PKID 91018823 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante NW Conectante	1.5 días	mié 2/11/22	jue 3/11/22	$ 60,664,812	499
503	1.5.6.1.13.14.2	3.013 - SELLADO DE JUNTAS - ITEM - 288 / CIV 10010167 PKID 91018823 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CALZADA Conectante NW Conectante	0.5 días	jue 3/11/22	vie 4/11/22	$ 1,100,388	502
504	1.5.6.1.13.15	ITEM - 185 / CIV 10010144 PKID 515439 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 80 / CALZADA Conectante SW Conectante	1.5 días	vie 4/11/22	mar 8/11/22	$ 210,848	503
505	1.5.6.1.13.16	ITEM - 9 / CIV 9004949 PKID 24122820 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24	0.81 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 7,240,865	504
506	1.5.6.1.13.16.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 49,278	504
507	1.5.6.1.13.16.2	3.021 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.25 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 288,038	506
508	1.5.6.1.13.16.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 266,615	507CC+0.01 días
509	1.5.6.1.13.16.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.15 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 135,005	508
510	1.5.6.1.13.16.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 5,706,276	509
511	1.5.6.1.13.16.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 795,653	510
512	1.5.6.1.13.17	ITEM - XX / CIV 9003463 PKID 24120110 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25A	0.75 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	$ 12,718,533	504
513	1.5.6.1.13.17.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 111,865	511FC+207 días
514	1.5.6.1.13.17.2	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 495,303	513
515	1.5.6.1.13.17.3	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.15 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 306,474	514

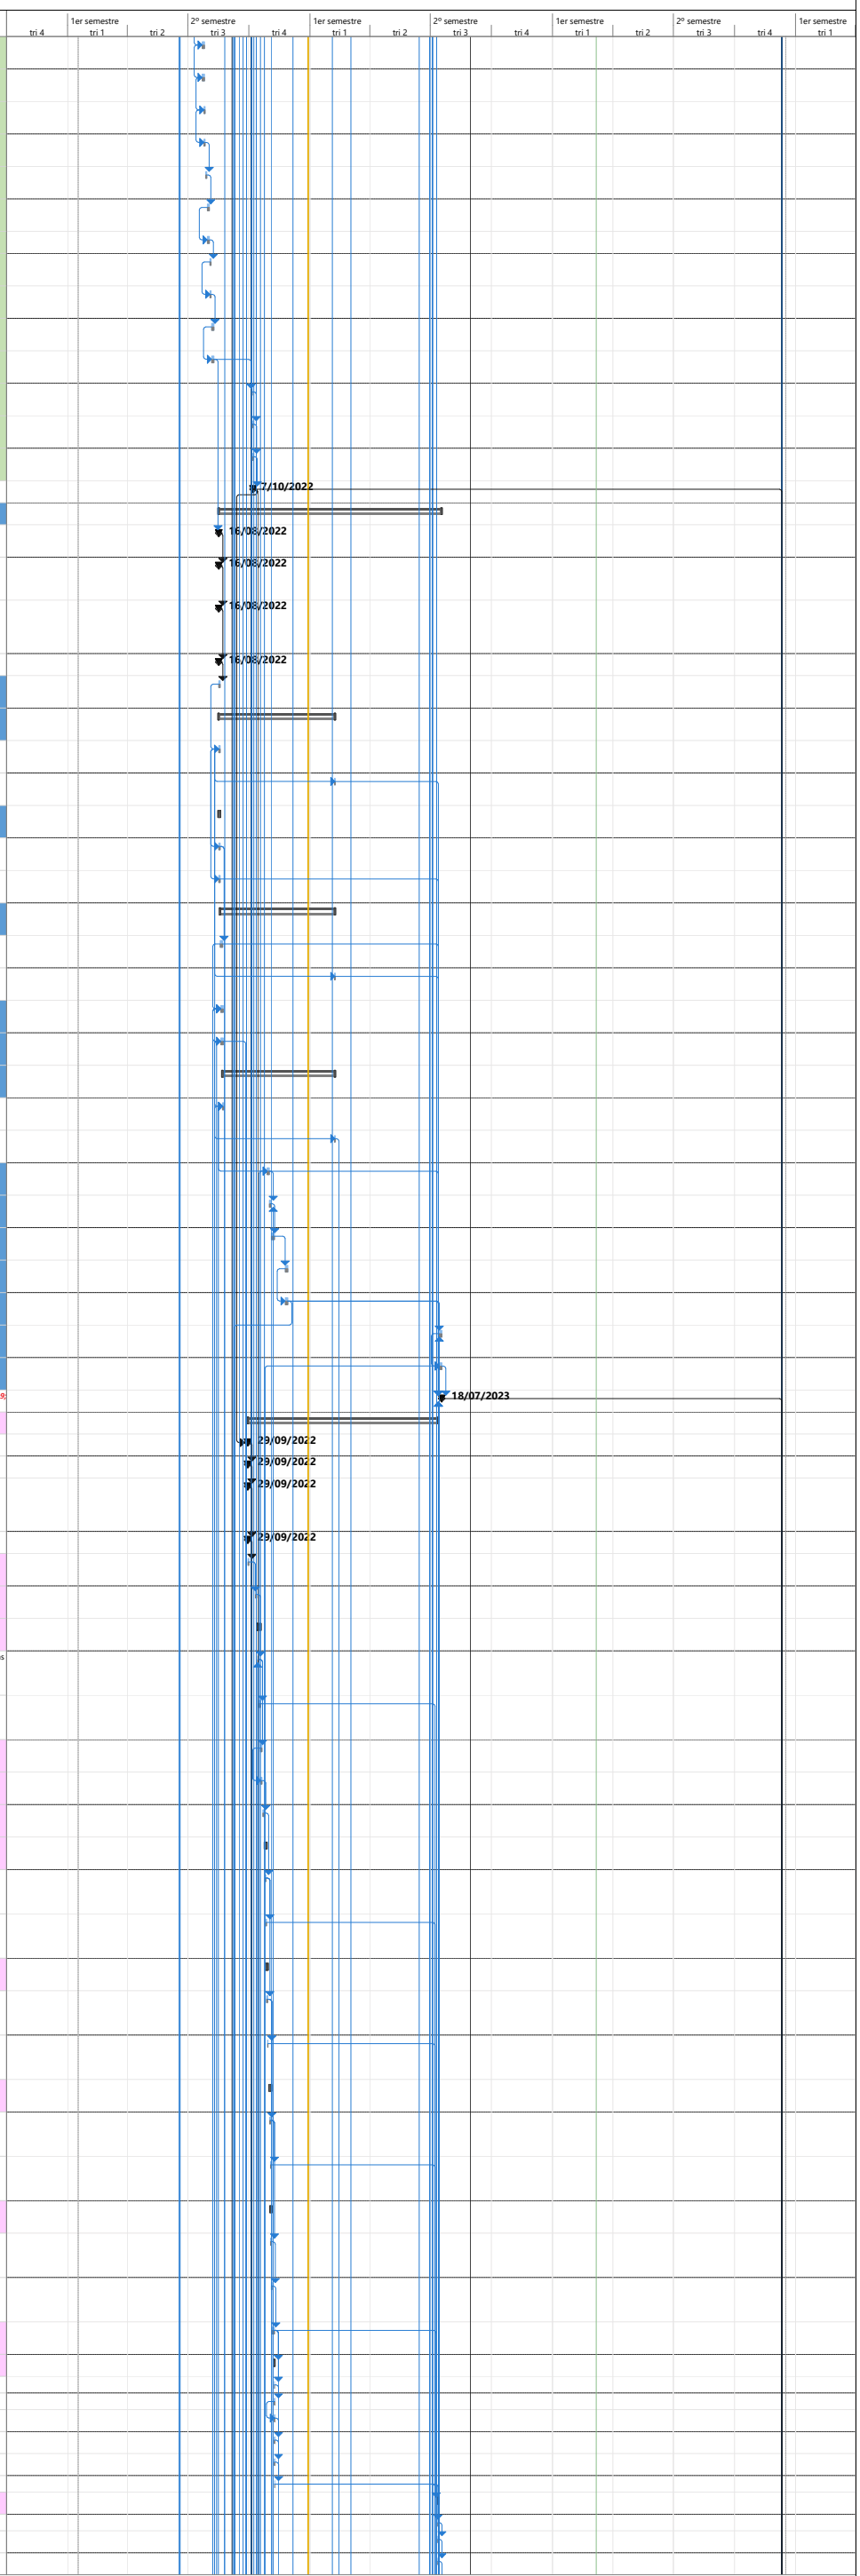

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
516	1.5.6.1.13.17.4	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO1	0.15 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 1,204,043	515
517	1.5.6.1.13.17.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	$ 10,600,848	516
518	*1.5.6.1.14*	*FIN DE INTERVENCIÓN FRENTE No. 7 (CONECTANTES E INTERCAMBIADORES)*	*0 días*	*jue 13/07/23*	*jue 13/07/23*	*$ 0*	*511;488;494;497;500;517*
519	*1.5.6.1.15*	*INICIO DE INTERVENCIONES FRENTE 8 - PARALELA AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 22D Y CALLE 23C - CARLOS LLERAS RESTREPO*	*0 días*	*vie 30/09/22*	*vie 30/09/22*	*$ 0*	*483FC+1 día*
520	**1.5.6.1.16**	**FRENTE 8 - PARALELA AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 22D Y CALLE 23C - CARLOS LLERAS RESTREPO**	**357.56 días**	**lun 26/09/22**	**jue 23/11/23**	**$ 328,176,047**	
521	**1.5.6.1.16.1**	**ITEM - 31 / CIV 9004717 PKID 522045 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**7.6 días**	**lun 26/09/22**	**mar 4/10/22**	**$ 112,050,981**	**467FC+30 días**
522	**1.5.6.1.16.2**	**ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**139.85 días**	**mar 8/11/22**	**jue 20/04/23**	**$ 18,435,700**	**504**
523	1.5.6.1.16.2.1	ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	7.6 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	$ 7,246,208	521CC+1 día
524	1.5.6.1.16.2.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 93,249	470
525	1.5.6.1.16.2.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	mar 7/02/23	mar 7/02/23	$ 1,003,549	524
526	1.5.6.1.16.2.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	mié 8/02/23	mié 8/02/23	$ 412,826	525
527	1.5.6.1.16.2.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	mié 8/02/23	mié 8/02/23	$ 255,473	526
528	1.5.6.1.16.2.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	mié 8/02/23	mié 8/02/23	$ 8,835,613	527
529	1.5.6.1.16.2.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras	0.25 días	jue 20/04/23	jue 20/04/23	$ 588,782	528FC+60 días
530	**1.5.6.1.16.3**	**ITEM - 98 / CIV 9009714 PKID 24120123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22D / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**7.6 días**	**mié 9/11/22**	**vie 18/11/22**	**$ 29,923,501**	**523CC+1 día**
531	**1.5.6.1.16.4**	**ITEM - 44 / CIV 9004715 PKID 91024700 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 23 / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**7.6 días**	**mié 9/11/22**	**sáb 19/11/22**	**$ 71,182,552**	**530CC+1 día**
532	**1.5.6.1.16.5**	**ITEM - 95 / CIV 9004716 PKID 91024699 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**7.6 días**	**vie 11/11/22**	**mar 22/11/22**	**$ 65,573,132**	**531CC+2 días**
533	**1.5.6.1.16.6**	**ITEM - 43 / CIV 9004700 PKID 24120159 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.61 días**	**jue 27/07/23**	**vie 28/07/23**	**$ 27,668,440**	
534	1.5.6.1.16.6.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 243,420	532FC+8.7 mss
535	1.5.6.1.16.6.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.25 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 2,619,302	534
536	1.5.6.1.16.6.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.2 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 1,077,495	535CC+0.01 días
537	1.5.6.1.16.6.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.15 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 666,897	536
538	1.5.6.1.16.6.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 23,061,326	537
539	**1.5.6.1.16.7**	**ITEM - 98 / CIV 9009714 PKID 24120123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22D / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.5 días**	**mar 21/11/23**	**mar 21/11/23**	**$ 397,826**	
540	1.5.6.1.16.7.1	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mar 21/11/23	mar 21/11/23	$ 397,826	517FC+110 días
541	**1.5.6.1.16.8**	**ITEM - 31 / CIV 9004717 PKID 522045 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.5 días**	**mar 21/11/23**	**mié 22/11/23**	**$ 1,273,044**	
542	1.5.6.1.16.8.1	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mar 21/11/23	mié 22/11/23	$ 1,273,044	540
543	**1.5.6.1.16.9**	**ITEM - 95 / CIV 9004716 PKID 91024699 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.5 días**	**mié 22/11/23**	**mié 22/11/23**	**$ 556,957**	
544	1.5.6.1.16.9.1	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23	$ 556,957	542
545	**1.5.6.1.16.10**	**ITEM - 44 / CIV 9004715 PKID 91024700 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 23 / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.5 días**	**mié 22/11/23**	**jue 23/11/23**	**$ 676,305**	
546	1.5.6.1.16.10.1	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mié 22/11/23	jue 23/11/23	$ 676,305	544
547	**1.5.6.1.16.11**	**ITEM - 96 / CIV 9004718 PKID 24120119 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**0.5 días**	**jue 23/11/23**	**jue 23/11/23**	**$ 437,609**	
548	1.5.6.1.16.11.1	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 437,609	546
549	*1.5.6.1.17*	*FIN DE INTERVENCIONES FRENTE 8 - PARALELA AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 22D Y CALLE 23C - CARLOS LLERAS RESTREPO*	*0 días*	*jue 23/11/23*	*jue 23/11/23*	*$ 0*	*538;529;548*
550	**1.5.6.1.18**	**FRENTE 9 - ACTIVIDADES ESPECIALES - ACCIONES POR REACCIÓN (EMERGENCIAS)**	**557.26 días**	**vie 24/06/22**	**mié 17/04/24**	**$ 8,489,381,384**	
551	*1.5.6.1.18.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 9 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA (EMERGENCIAS) - aprobados por la SDM*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*307FC+10 días*
552	*1.5.6.1.18.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 9 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA (EMERGENCIAS) - (Actas de Vecindad y socializaciones)*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*551*
553	*1.5.6.1.18.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 9 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA (EMERGENCIAS) - (Verificación de campamento, señalización de obra, protecciones a sumidero)*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*552*
554	*1.5.6.1.18.4*	*Presupuestos específicos aprobados por INTERVENTORÍA previo a intervención en Frente de obra No. 9 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA (EMERGENCIAS)*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*553*
555	*1.5.6.1.18.5*	*Presupuestos específicos aprobados por el IDU previo a intervención en Frente de obra No. 9 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA (EMERGENCIAS)*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*554*
556	*1.5.6.1.18.6*	*Inicio de actividades de Conservación por reacción*	*0 días*	*vie 24/06/22*	*vie 24/06/22*	*$ 0*	*555*
557	**1.5.6.1.18.7**	**ITEM - 36 / CIV 9004409 PKID 528133 - AV. CARRERA 86 DESDE AV. CIUDAD DE CALI HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Conectante SW Conectante**	**224.2 días**	**vie 24/06/22**	**mar 14/03/23**	**$ 19,525,486**	
558	1.5.6.1.18.7.1	ITEM - 36 / CIV 9004409 PKID 528133 - AV. CARRERA 86 DESDE AV. CIUDAD DE CALI HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Conectante SW Conectante	3 días	vie 24/06/22	mié 29/06/22	$ 15,731,827	556
559	1.5.6.1.18.7.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9004409 PKID 528133	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 279,274	558FC+9.2 mss
560	1.5.6.1.18.7.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9004409 PKID 528133	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 1,192,900	559CC;570CC;575CC;580CC
561	1.5.6.1.18.7.4	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 9004409 PKID 528133	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 2,321,485	560
562	**1.5.6.1.18.8**	**ITEM - 58 / CIV 9003515 PKID 527889 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 20 / CALZADA Sur-Norte N.A**	**357.8 días**	**mar 28/06/22**	**sáb 26/08/23**	**$ 45,368,956**	
563	1.5.6.1.18.8.1	ITEM - 58 / CIV 9003515 PKID 527889 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 20 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mar 28/06/22	vie 1/07/22	$ 44,924,982	558CC+2 días
564	1.5.6.1.18.8.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003515 PKID 527889	0.2 días	sáb 26/08/23	sáb 26/08/23	$ 443,974	561FC+90 días;572FC+90 días
565	**1.5.6.1.18.9**	**ITEM - 59 / CIV 9004413 PKID 528118 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 20 HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte N.A**	**356 días**	**jue 30/06/22**	**lun 28/08/23**	**$ 11,823,116**	
566	1.5.6.1.18.9.1	ITEM - 59 / CIV 9004413 PKID 528118 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 20 HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	jue 30/06/22	mar 5/07/22	$ 11,366,411	563CC+2 días
567	1.5.6.1.18.9.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9004413 PKID 528118	0.2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23	$ 456,705	564
568	**1.5.6.1.18.10**	**ITEM - 60 / CIV 9003412 PKID 603242 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 82 HASTA CARRERA 83 / CALZADA Oriente-Occidente N.A**	**182.6 días**	**mar 16/08/22**	**mié 15/03/23**	**$ 174,018,624**	
569	1.5.6.1.18.10.1	ITEM - 60 / CIV 9003412 PKID 603242 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 82 HASTA CARRERA 83 / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mar 16/08/22	vie 19/08/22	$ 171,891,076	566FC+35 días
570	1.5.6.1.18.10.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003412 PKID 603242	0.2 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 1,903,997	569FC+6.9 mss
571	1.5.6.1.18.10.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003412 PKID 603242	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 124,002	561
572	1.5.6.1.18.10.4	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 9003412 PKID 603242	0.2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	$ 99,549	571
573	**1.5.6.1.18.11**	**ITEM - / CIV 9003428 PKID 606339 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 83 HASTA CARRERA 85 BIS / CALZADA Oriente-Occidente N.A**	**218.6 días**	**jue 25/08/22**	**mar 9/05/23**	**$ 206,784,075**	
574	1.5.6.1.18.11.1	ITEM - / CIV 9003428 PKID 606339 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 83 HASTA CARRERA 85 BIS / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	jue 25/08/22	lun 29/08/22	$ 204,252,274	569FC+6 días
575	1.5.6.1.18.11.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003428 PKID 606339	0.2 días	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 2,410,828	570
576	1.5.6.1.18.11.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003428 PKID 606339	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 41,334	561FC+45 días
577	1.5.6.1.18.11.4	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 9003428 PKID 606339	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 79,639	576;581
578	**1.5.6.1.18.12**	**ITEM - / CIV 9003435 PKID 603247 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 81D HASTA CARRERA 82 / CALZADA Oriente-Occidente N.A**	**208.4 días**	**mar 6/09/22**	**mar 9/05/23**	**$ 90,236,933**	
579	1.5.6.1.18.12.1	ITEM - / CIV 9003435 PKID 603247 - AV. CALLE 22 DESDE CARRERA 81D HASTA CARRERA 82 / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mar 6/09/22	vie 9/09/22	$ 89,375,281	574FC+7 días
580	1.5.6.1.18.12.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003435 PKID 603247	0.2 días	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 820,318	570
581	1.5.6.1.18.12.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003435 PKID 603247	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 41,334	561FC+45 días
582	**1.5.6.1.18.13**	**ITEM - / CIV 9004405 PKID 91014295 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CALZADA Conectante ES Conectante**	**206 días**	**vie 9/09/22**	**mar 9/05/23**	**$ 105,256,183**	
583	1.5.6.1.18.13.1	ITEM - / CIV 9004405 PKID 91014295 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CALZADA Conectante ES Conectante	3 días	vie 9/09/22	mar 13/09/22	$ 102,709,524	579
584	1.5.6.1.18.13.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9004405 PKID 91014295	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 1,676,440	560;571;576;581
585	1.5.6.1.18.13.3	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 9004405 PKID 91014295	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 773,497	584
586	1.5.6.1.18.13.4	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9004405 PKID 91014295	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 96,722	585
587	**1.5.6.1.18.14**	**ITEM - / CIV 9003291 PKID 23000226 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 22 HASTA AVENIDA CALLE 22 / CALZADA Conectante NE Conectante**	**147.4 días**	**mar 13/09/22**	**vie 3/03/23**	**$ 13,268,404**	
588	1.5.6.1.18.14.1	ITEM - / CIV 9003291 PKID 23000226 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 22 HASTA AVENIDA CALLE 22 / CALZADA Conectante NE Conectante	3 días	mar 13/09/22	vie 16/09/22	$ 7,173,014	583
589	1.5.6.1.18.14.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - 9003291 PKID 23000226	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 671,531	580FC+3 días
590	1.5.6.1.18.14.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - 9003291 PKID 23000226	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 5,423,859	589
591	**1.5.6.1.18.15**	**ITEM - 10 / CIV 9001643 PKID 384270 - DIAGONAL 25G DESDE TRANSVERSAL 95 BIS A HASTA TRANSVERSAL 95A / CALZADA Única N.A**	**145.8 días**	**jue 15/09/22**	**vie 3/03/23**	**$ 197,767,449**	
592	1.5.6.1.18.15.1	ITEM - 10 / CIV 9001643 PKID 384270 - DIAGONAL 25G DESDE TRANSVERSAL 95 BIS A HASTA TRANSVERSAL 95A / CALZADA Única N.A	3 días	jue 15/09/22	lun 19/09/22	$ 193,695,911	583CC+5 días;588FC-1 día
593	1.5.6.1.18.15.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9001643 PKID 384270	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 3,833,454	590
594	1.5.6.1.18.15.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9001643 PKID 384270	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 238,084	593
595	**1.5.6.1.18.16**	**ITEM - 56 / CIV 9001915 PKID 385041 - DIAGONAL 25G DESDE TRANSVERSAL 95 BIS A HASTA AV. CIUDAD DE CALI / CALZADA Única N.A**	**130.4 días**	**vie 30/09/22**	**jue 2/03/23**	**$ 343,699,120**	
596	1.5.6.1.18.16.1	ITEM - 56 / CIV 9001915 PKID 385041 - DIAGONAL 25G DESDE TRANSVERSAL 95 BIS A HASTA AV. CIUDAD DE CALI / CALZADA Única N.A	3 días	vie 30/09/22	mar 4/10/22	$ 341,495,634	592FC+11 días
597	1.5.6.1.18.16.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9001915 PKID 385041	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,813,292	596FC+5.3 mss
598	1.5.6.1.18.16.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9001915 PKID 385041	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 390,194	597CC
599	**1.5.6.1.18.17**	**ITEM - / CIV 9004824 PKID 91033001 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 22 HASTA CALLE 22F / CALZADA Sur-Norte N.A**	**124.8 días**	**vie 7/10/22**	**jue 2/03/23**	**$ 79,035,802**	
600	1.5.6.1.18.17.1	ITEM - / CIV 9004824 PKID 91033001 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CALLE 22 HASTA CALLE 22F / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	vie 7/10/22	mar 11/10/22	$ 49,500,388	596FC+3 días
601	1.5.6.1.18.17.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9004824 PKID 91033001	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 11,538,554	598
602	1.5.6.1.18.17.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9004824 PKID 91033001	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 17,996,860	601
603	**1.5.6.1.18.18**	**ITEM - / CIV 3000539 PKID 506795 - CALLE 19 DESDE CARRERA 10 HASTA CARRERA 12 / CALZADA Occidente-Oriente N.A**	**275 días**	**mar 11/10/22**	**lun 4/09/23**	**$ 8,606,339**	
604	1.5.6.1.18.18.1	ITEM - / CIV 3000539 PKID 506795 - CALLE 19 DESDE CARRERA 10 HASTA CARRERA 12 / CALZADA Occidente-Oriente N.A	3 días	mar 11/10/22	vie 14/10/22	$ 7,310,928	600
605	1.5.6.1.18.18.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 1,295,411	602FC+153 días

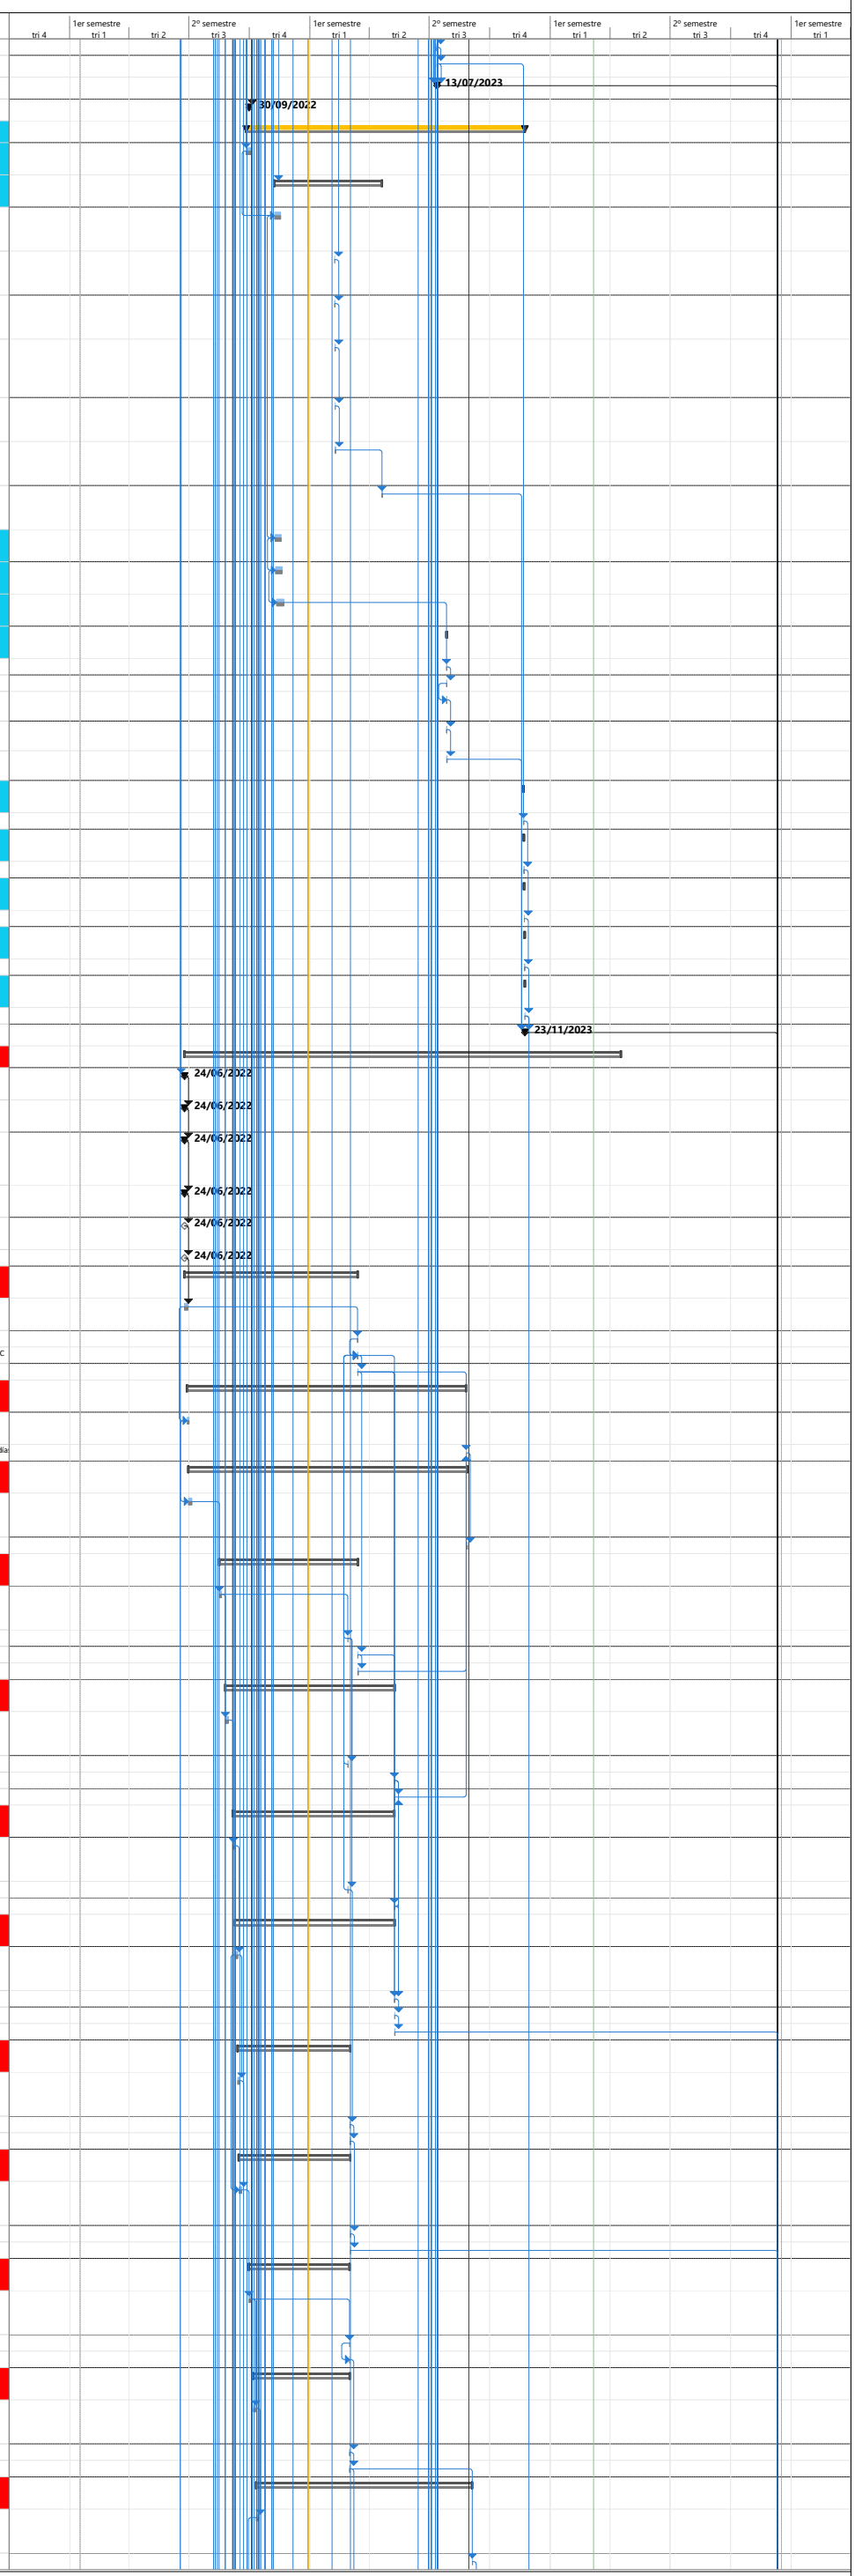


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
606	1.5.6.1.18.19	ITEM - / CIV 9002693 PKID 524730 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte N.A	122.2 días	mar 11/10/22	jue 2/03/23	$ 22,701,851	
607	1.5.6.1.18.19.1	ITEM - / CIV 9002693 PKID 524730 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mar 11/10/22	vie 14/10/22	$ 19,491,193	604CC
608	1.5.6.1.18.19.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9002693 PKID 524730	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,933,435	602
609	1.5.6.1.18.19.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9002693 PKID 524730	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,277,223	608
610	1.5.6.1.18.20	ITEM - / CIV 9004823 PKID 24122874 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23A BIS / CALZADA Norte-Sur N.A	101.6 días	vie 4/11/22	vie 3/03/23	$ 53,159,640	
611	1.5.6.1.18.20.1	ITEM - / CIV 9004823 PKID 24122874 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23A BIS / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	vie 4/11/22	mié 9/11/22	$ 46,201,519	607FC+18 días
612	1.5.6.1.18.20.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9004823 PKID 24122874	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 3,668,754	609
613	1.5.6.1.18.20.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9004823 PKID 24122874	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 3,289,367	612
614	1.5.6.1.18.21	ITEM - / CIV 11014833 PKID 91034570 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 132 HASTA CALLE 131 / CALZADA Norte-Sur N.A	104.8 días	mié 9/11/22	vie 10/03/23	$ 131,834,546	
615	1.5.6.1.18.21.1	ITEM - / CIV 11014833 PKID 91034570 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 132 HASTA CALLE 131 / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	mié 9/11/22	sáb 12/11/22	$ 127,236,648	611
616	1.5.6.1.18.21.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11014833 PKID 91034570	0.2 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 4,115,116	613FC+6 días;617FC+6 días
617	1.5.6.1.18.21.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 11014833 PKID 91034570	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 482,782	612
618	1.5.6.1.18.22	ITEM - / CIV 11007244 PKID 518663 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 130B HASTA CALLE 129 / CALZADA Norte-Sur N.A	130.2 días	mié 16/11/22	lun 17/04/23	$ 229,652,572	
619	1.5.6.1.18.22.1	ITEM - / CIV 11007244 PKID 518663 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 130B HASTA CALLE 129 / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	mié 16/11/22	sáb 19/11/22	$ 222,949,570	615FC+2 días
620	1.5.6.1.18.22.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11007244 PKID 518663	0.2 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 6,416,143	616
621	1.5.6.1.18.22.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 11007244 PKID 518663	0.2 días	lun 17/04/23	lun 17/04/23	$ 286,859	620FC+30 días
622	1.5.6.1.18.23	ITEM - 243 / CIV 11005911 PKID 91013652 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 132 HASTA CALLE 132 / CALZADA Conectante WS Conectante	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	$ 5,889,428	619CC+1 día
623	1.5.6.1.18.24	ITEM - / CIV 11007470 PKID 518563 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 128C HASTA CALLE 128B / CALZADA Norte-Sur N.A	126.4 días	lun 21/11/22	mar 18/04/23	$ 44,962,515	
624	1.5.6.1.18.24.1	ITEM - / CIV 11007470 PKID 518563 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 128C HASTA CALLE 128B / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	lun 21/11/22	jue 24/11/22	$ 44,305,699	622
625	1.5.6.1.18.24.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11007470 PKID 518563	0.2 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23	$ 646,070	621
626	1.5.6.1.18.24.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 11007470 PKID 518563	0.2 días	lun 17/04/23	lun 17/04/23	$ 10,746	620FC+30 días
627	1.5.6.1.18.25	ITEM - / CIV 10003394 PKID 515720 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 87 BIS HASTA CALLE 89 / CALZADA Sur-Norte N.A	124.6 días	mié 23/11/22	mar 18/04/23	$ 102,402,475	
628	1.5.6.1.18.25.1	ITEM - / CIV 10003394 PKID 515720 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 87 BIS HASTA CALLE 89 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22	$ 101,268,267	624CC+2 días
629	1.5.6.1.18.25.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10003394 PKID 515720	0.2 días	mar 18/04/23	mar 18/04/23	$ 1,134,208	625;626
630	1.5.6.1.18.26	ITEM - / CIV 10003040 PKID 515746 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 89 HASTA AVENIDA MORISCA / CALZADA Sur-Norte N.A	136.2 días	vie 25/11/22	vie 5/05/23	$ 42,265,415	
631	1.5.6.1.18.26.1	ITEM - / CIV 10003040 PKID 515746 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 89 HASTA AVENIDA MORISCA / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	vie 25/11/22	mar 29/11/22	$ 39,025,650	628
632	1.5.6.1.18.26.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10003040 PKID 515746	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 3,239,765	620FC+45 días
633	1.5.6.1.18.27	ITEM - / CIV 11012293 PKID 518287 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	231.8 días	jue 1/12/22	lun 4/09/23	$ 330,910,044	
634	1.5.6.1.18.27.1	ITEM - / CIV 11012293 PKID 518287 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	jue 1/12/22	lun 5/12/22	$ 319,540,734	631FC+2 días
635	1.5.6.1.18.27.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11012293 PKID 518287	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 8,596,231	632
636	1.5.6.1.18.27.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 11012293 PKID 518287	0.2 días	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 1,240,023	635FC+100 días
637	1.5.6.1.18.27.4	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 11012293 PKID 518287	0.2 días	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 1,533,056	636;666
638	1.5.6.1.18.28	ITEM - / CIV 11012293 PKID 518289 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	123.6 días	lun 12/12/22	vie 5/05/23	$ 513,432,583	
639	1.5.6.1.18.28.1	ITEM - / CIV 11012293 PKID 518289 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 12/12/22	jue 15/12/22	$ 498,862,592	634FC+5 días
640	1.5.6.1.18.28.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11012293 PKID 518289	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 14,569,991	635
641	1.5.6.1.18.29	ITEM - / CIV 9003679 PKID 389227 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69D HASTA TRANSVERSAL 69F / CALZADA Oriente-Occidente N.A	162.2 días	mié 14/12/22	vie 23/06/23	$ 43,704,280	
642	1.5.6.1.18.29.1	ITEM - / CIV 9003679 PKID 389227 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69D HASTA TRANSVERSAL 69F / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mié 14/12/22	sáb 17/12/22	$ 15,231,167	639CC+2 días
643	1.5.6.1.18.29.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 304,254	642FC+23 días
644	1.5.6.1.18.29.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 2,710,439	643
645	1.5.6.1.18.29.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 1,114,983	644
646	1.5.6.1.18.29.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 827,981	645
647	1.5.6.1.18.29.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	sáb 14/01/23	sáb 14/01/23	$ 22,064,878	646
648	1.5.6.1.18.29.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003679 PKID 389227	0.2 días	vie 24/02/23	vie 24/02/23	$ 896,701	647FC+1.5 mss
649	1.5.6.1.18.29.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 553,877	764
650	1.5.6.1.18.30	ITEM - / CIV 11012647 PKID 24120710 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CARRERA 91 / CALZADA Sur-Norte N.A	119.8 días	vie 16/12/22	vie 5/05/23	$ 47,793,532	
651	1.5.6.1.18.30.1	ITEM - / CIV 11012647 PKID 24120710 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CARRERA 91 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	vie 16/12/22	mar 20/12/22	$ 46,864,210	642CC+2 días
652	1.5.6.1.18.30.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11012647 PKID 24120710	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 929,322	640;648
653	1.5.6.1.18.31	ITEM - / CIV 11014749 PKID 91033219 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 93 HASTA CARRERA 95A / CALZADA Sur-Norte N.A	119 días	sáb 17/12/22	vie 5/05/23	$ 38,031,491	
654	1.5.6.1.18.31.1	ITEM - / CIV 11014749 PKID 91033219 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 93 HASTA CARRERA 95A / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	sáb 17/12/22	mié 21/12/22	$ 16,214,766	651CC+1 día
655	1.5.6.1.18.31.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 232,248	654FC+3.04 mss
656	1.5.6.1.18.31.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 2,082,684	655
657	1.5.6.1.18.31.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	$ 856,746	656
658	1.5.6.1.18.31.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	$ 636,286	657
659	1.5.6.1.18.31.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	$ 16,954,521	658
660	1.5.6.1.18.31.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11014749 PKID 91033219	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 1,054,240	659FC+6 días;652
661	1.5.6.1.18.32	ITEM - 206 / CIV 11012646 PKID 24120708 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CARRERA 91A / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	sáb 17/12/22	mié 21/12/22	$ 12,879,632	654CC
662	1.5.6.1.18.33	ITEM - 255 / CIV 11012647 PKID 24120709 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CARRERA 91 HASTA CARRERA 91 / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	sáb 17/12/22	mié 21/12/22	$ 6,017,591	661CC
663	1.5.6.1.18.34	ITEM - 202 / CIV 10002723 PKID 515739 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AV. MORISCA HASTA CALLE 90A / CALZADA Sur-Norte N.A	217.6 días	lun 19/12/22	lun 4/09/23	$ 27,347,998	
664	1.5.6.1.18.34.1	ITEM - 202 / CIV 10002723 PKID 515739 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE AV. MORISCA HASTA CALLE 90A / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 19/12/22	jue 22/12/22	$ 26,146,023	662CC+1 día
665	1.5.6.1.18.34.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10002723 PKID 515739	0.2 días	mar 28/03/23	mar 28/03/23	$ 869,648	660CC-32 días
666	1.5.6.1.18.34.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10002723 PKID 515739	0.2 días	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 332,327	635FC+100 días
667	1.5.6.1.18.35	ITEM - 203 / CIV 10002627 PKID 515732 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 90A HASTA DIAGONAL 91 / CALZADA Sur-Norte N.A	86.2 días	lun 19/12/22	mar 28/03/23	$ 61,894,251	
668	1.5.6.1.18.35.1	ITEM - 203 / CIV 10002627 PKID 515732 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 90A HASTA DIAGONAL 91 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 19/12/22	jue 22/12/22	$ 59,999,802	664CC
669	1.5.6.1.18.35.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10002627 PKID 515732	0.2 días	mar 28/03/23	mar 28/03/23	$ 1,894,449	665
670	1.5.6.1.18.36	ITEM - 204 / CIV 10010210 PKID 518284 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE DIAGONAL 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	86.4 días	lun 19/12/22	mar 28/03/23	$ 23,873,331	
671	1.5.6.1.18.36.1	ITEM - 204 / CIV 10010210 PKID 518284 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE DIAGONAL 91 HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 19/12/22	jue 22/12/22	$ 23,162,018	668CC
672	1.5.6.1.18.36.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10010210 PKID 518284	0.2 días	mar 28/03/23	mar 28/03/23	$ 711,313	669
673	1.5.6.1.18.37	ITEM - 205 / CIV 0 PKID 22151679 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	86.6 días	lun 19/12/22	mar 28/03/23	$ 87,771,066	
674	1.5.6.1.18.37.1	ITEM - 205 / CIV 0 PKID 22151679 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 19/12/22	jue 22/12/22	$ 84,209,725	671CC
675	1.5.6.1.18.37.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 0 PKID 22151679	0.2 días	mar 28/03/23	mar 28/03/23	$ 3,561,341	672
676	1.5.6.1.18.38	ITEM - / CIV 9003747 PKID 389452 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69B / CALZADA Oriente-Occidente N.A	94 días	mar 20/12/22	lun 10/04/23	$ 75,581,216	
677	1.5.6.1.18.38.1	ITEM - / CIV 9003747 PKID 389452 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69B / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mar 20/12/22	vie 23/12/22	$ 72,812,457	674CC+1 día
678	1.5.6.1.18.38.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003747 PKID 389452	0.2 días	sáb 8/04/23	sáb 8/04/23	$ 1,860,236	675FC+8 días
679	1.5.6.1.18.38.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003747 PKID 389452	0.2 días	sáb 8/04/23	lun 10/04/23	$ 908,523	678
680	1.5.6.1.18.39	ITEM - / CIV 9003722 PKID 389362 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69B HASTA CARRERA 69C BIS / CALZADA Oriente-Occidente N.A	94.4 días	mar 20/12/22	lun 10/04/23	$ 56,045,266	
681	1.5.6.1.18.39.1	ITEM - / CIV 9003722 PKID 389362 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69B HASTA CARRERA 69C BIS / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mar 20/12/22	vie 23/12/22	$ 51,453,718	677CC
682	1.5.6.1.18.39.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003722 PKID 389362	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 1,946,166	679
683	1.5.6.1.18.39.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003722 PKID 389362	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 2,645,382	682
684	1.5.6.1.18.40	ITEM - / CIV 9003763 PKID 389505 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69 HASTA CARRERA 69A / CALZADA Oriente-Occidente N.A	216.2 días	mié 21/12/22	lun 4/09/23	$ 57,142,755	
685	1.5.6.1.18.40.1	ITEM - / CIV 9003763 PKID 389505 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69 HASTA CARRERA 69A / CALZADA Oriente-Occidente N.A	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	$ 55,935,143	681CC+1 día
686	1.5.6.1.18.40.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - 9003763 PKID 389505	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 979,448	683
687	1.5.6.1.18.40.3	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 4/09/23	lun 4/09/23	$ 228,164	605
688	1.5.6.1.18.41	ITEM - 257 / CIV 10010210 PKID 518282 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE DIAGONAL 91 HASTA DIAGONAL 91 / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	$ 32,304,576	685CC
689	1.5.6.1.18.42	ITEM - 258 / CIV 10002627 PKID 515730 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE DIAGONAL 91 HASTA CALLE 90A / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	$ 67,146,895	688CC

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
690	1.5.6.1.18.43	ITEM - 259 / CIV 10002723 PKID 515737 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 90A HASTA AVENIDA MORISCA / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	mié 21/12/22	vie 23/12/22	$ 36,063,103	689CC
691	1.5.6.1.18.44	ITEM - / CIV 9003763 PKID 91014676 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69 HASTA CARRERA 69A / CALZADA Bifurcación N.A	93 días	jue 22/12/22	lun 10/04/23	$ 26,110,762	
692	1.5.6.1.18.44.1	ITEM - / CIV 9003763 PKID 91014676 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69 HASTA CARRERA 69A / CALZADA Bifurcación N.A	3 días	jue 22/12/22	lun 26/12/22	$ 24,157,782	690CC+1 día
693	1.5.6.1.18.44.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003763 PKID 91014676	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 1,856,258	686
694	1.5.6.1.18.44.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003763 PKID 91014676	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 96,722	693
695	1.5.6.1.18.45	ITEM - / CIV 9003747 PKID 91014293 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69B / CALZADA Bifurcación N.A	93 días	jue 22/12/22	lun 10/04/23	$ 23,402,293	
696	1.5.6.1.18.45.1	ITEM - / CIV 9003747 PKID 91014293 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69B / CALZADA Bifurcación N.A	3 días	jue 22/12/22	lun 26/12/22	$ 21,272,411	692CC
697	1.5.6.1.18.45.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003747 PKID 91014293	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 2,047,214	686
698	1.5.6.1.18.45.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003747 PKID 91014293	0.2 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 82,668	697
699	1.5.6.1.18.46	ITEM - / CIV 0 PKID 2214995 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Norte-Sur N.A	163.4 días	jue 22/12/22	mar 4/07/23	$ 6,479,131	
700	1.5.6.1.18.46.1	ITEM - / CIV 0 PKID 2214995 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Norte-Sur N.A	3 días	jue 22/12/22	lun 26/12/22	$ 5,205,473	696CC
701	1.5.6.1.18.46.2	4.003 - SELLO DE GRIETAS - CIV 0 PKID 2214995	0.2 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 446,976	698FC+70 días
702	1.5.6.1.18.46.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 0 PKID 2214995	0.2 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 826,682	701
703	1.5.6.1.18.47	ITEM - / CIV 9003763 PKID 389543 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69 / CALZADA Occidente-Oriente N.A	160.4 días	lun 26/12/22	mar 4/07/23	$ 41,565,124	
704	1.5.6.1.18.47.1	ITEM - / CIV 9003763 PKID 389543 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69A HASTA CARRERA 69 / CALZADA Occidente-Oriente N.A	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	$ 40,052,020	700
705	1.5.6.1.18.47.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003763 PKID 389543	0.2 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 946,827	698CC;702CC
706	1.5.6.1.18.47.3	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 566,277	649
707	1.5.6.1.18.48	ITEM - / CIV 9003747 PKID 389450 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69B HASTA CARRERA 69A / CALZADA Occidente-Oriente N.A	160.8 días	lun 26/12/22	mié 5/07/23	$ 73,940,009	
708	1.5.6.1.18.48.1	ITEM - / CIV 9003747 PKID 389450 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69B HASTA CARRERA 69A / CALZADA Occidente-Oriente N.A	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	$ 61,753,762	704CC
709	1.5.6.1.18.48.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	lun 20/02/23	lun 20/02/23	$ 110,744	694FC-1.7 mss
710	1.5.6.1.18.48.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	lun 20/02/23	lun 20/02/23	$ 992,826	709
711	1.5.6.1.18.48.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	lun 20/02/23	mar 21/02/23	$ 408,416	710
712	1.5.6.1.18.48.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	$ 303,403	711
713	1.5.6.1.18.48.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	$ 8,082,309	712
714	1.5.6.1.18.48.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23	$ 1,327,944	705;713
715	1.5.6.1.18.48.8	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 9003747 PKID 389450	0.2 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	$ 253,792	714
716	1.5.6.1.18.48.9	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 23/06/23	sáb 24/06/23	$ 706,813	706
717	1.5.6.1.18.49	ITEM - / CIV 10005398 PKID 518036 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76A HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte N.A	150.8 días	lun 26/12/22	jue 22/06/23	$ 59,951,445	
718	1.5.6.1.18.49.1	ITEM - / CIV 10005398 PKID 518036 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76A HASTA CALLE 77 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	$ 59,146,245	708CC
719	1.5.6.1.18.49.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10005398 PKID 518036	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 805,200	715CC-10 días
720	1.5.6.1.18.50	ITEM - / CIV 10005459 PKID 518043 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76A HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte N.A	151 días	lun 26/12/22	jue 22/06/23	$ 38,820,085	
721	1.5.6.1.18.50.1	ITEM - / CIV 10005459 PKID 518043 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76A HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	$ 38,267,902	718CC
722	1.5.6.1.18.50.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10005459 PKID 518043	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 552,183	719
723	1.5.6.1.18.51	ITEM - / CIV 10000040 PKID 517994 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75A / CALZADA Sur-Norte N.A	151.2 días	lun 26/12/22	jue 22/06/23	$ 41,002,457	
724	1.5.6.1.18.51.1	ITEM - / CIV 10000040 PKID 517994 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75A / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	lun 26/12/22	mié 28/12/22	$ 39,348,165	721CC
725	1.5.6.1.18.51.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10000040 PKID 517994	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 1,460,022	722CC
726	1.5.6.1.18.51.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10000040 PKID 517994	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 194,270	725
727	1.5.6.1.18.52	ITEM - 181 / CIV 10005914 PKID 517966 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 74A HASTA CALLE 74 BIS / CALZADA Sur-Norte N.A	149.6 días	mié 28/12/22	vie 23/06/23	$ 17,088,272	
728	1.5.6.1.18.52.1	ITEM - 181 / CIV 10005914 PKID 517966 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 74A HASTA CALLE 74 BIS / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	$ 12,540,673	724
729	1.5.6.1.18.52.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 40,800	694FC-1.45 mss
730	1.5.6.1.18.52.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 365,609	729
731	1.5.6.1.18.52.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 150,400	730
732	1.5.6.1.18.52.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 111,780	731
733	1.5.6.1.18.52.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 2,976,315	732
734	1.5.6.1.18.52.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	$ 552,182	725;733;726
735	1.5.6.1.18.52.8	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10005914 PKID 517966	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 350,513	734
736	1.5.6.1.18.53	ITEM - 182 / CIV 10011799 PKID 517973 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 74A / CALZADA Sur-Norte N.A	149.6 días	mié 28/12/22	vie 23/06/23	$ 22,937,153	
737	1.5.6.1.18.53.1	ITEM - 182 / CIV 10011799 PKID 517973 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 74A / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	$ 21,976,435	728CC
738	1.5.6.1.18.53.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10011799 PKID 517973	0.2 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	$ 844,983	734CC
739	1.5.6.1.18.53.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10011799 PKID 517973	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 115,735	734
740	1.5.6.1.18.54	ITEM - 183 / CIV 10005700 PKID 517917 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte N.A	149.6 días	mié 28/12/22	vie 23/06/23	$ 23,291,200	
741	1.5.6.1.18.54.1	ITEM - 183 / CIV 10005700 PKID 517917 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	$ 10,779,353	737CC
742	1.5.6.1.18.54.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 130,256	738CC-1 ms
743	1.5.6.1.18.54.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	$ 1,167,590	742
744	1.5.6.1.18.54.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 480,307	743
745	1.5.6.1.18.54.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 356,861	744
746	1.5.6.1.18.54.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 9,505,005	745
747	1.5.6.1.18.54.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 559,343	746;738
748	1.5.6.1.18.54.8	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10005700 PKID 517917	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 312,485	734
749	1.5.6.1.18.55	ITEM - / CIV 10005619 PKID 518001 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75A HASTA CALLE 75 BIS / CALZADA Sur-Norte N.A	149.8 días	mié 28/12/22	vie 23/06/23	$ 1,900,191	
750	1.5.6.1.18.55.1	ITEM - / CIV 10005619 PKID 518001 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75A HASTA CALLE 75 BIS / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	$ 1,710,054	741CC
751	1.5.6.1.18.55.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10005619 PKID 518001	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 190,137	748
752	1.5.6.1.18.56	ITEM - / CIV 10005585 PKID 518050 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75A HASTA CALLE 75A / CALZADA Sur-Norte N.A	149.8 días	mié 28/12/22	vie 23/06/23	$ 21,441,967	
753	1.5.6.1.18.56.1	ITEM - / CIV 10005585 PKID 518050 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 75A HASTA CALLE 75A / CALZADA Sur-Norte N.A	3 días	mié 28/12/22	vie 30/12/22	$ 21,284,897	750CC
754	1.5.6.1.18.56.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10005585 PKID 518050	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 157,070	748
755	1.5.6.1.18.57	ITEM - 247 / CIV 11014698 PKID 91032271 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 128B HASTA CARRERA 102 / CALZADA Norte-Sur N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 18,087,142	753CC+1 día
756	1.5.6.1.18.58	ITEM - / CIV 9003696 PKID 389284 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69C BIS HASTA CARRERA 69D / CALZADA Oriente-Occidente N.A	149 días	jue 29/12/22	vie 23/06/23	$ 37,526,418	
757	1.5.6.1.18.58.1	ITEM - / CIV 9003696 PKID 389284 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69C BIS HASTA CARRERA 69D / CALZADA Oriente-Occidente N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 21,633,377	755CC
758	1.5.6.1.18.58.2	3.022 - REPLANTEO GENERAL - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	$ 165,891	742CC-5 días
759	1.5.6.1.18.58.3	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 1,468,869	758
760	1.5.6.1.18.58.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 604,243	759
761	1.5.6.1.18.58.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 448,913	760
762	1.5.6.1.18.58.6	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25 - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 11,957,629	761
763	1.5.6.1.18.58.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 9003696 PKID 389284	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 825,888	747;762
764	1.5.6.1.18.58.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 421,608	763
765	1.5.6.1.18.59	ITEM - / CIV 10006340 PKID 517938 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 72A HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte N.A	148.8 días	jue 29/12/22	vie 23/06/23	$ 20,108,108	
766	1.5.6.1.18.59.1	ITEM - / CIV 10006340 PKID 517938 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 72A HASTA CALLE 72 / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 19,165,691	757CC
767	1.5.6.1.18.59.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10005585 PKID 518050	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 942,417	748
768	1.5.6.1.18.60	ITEM - / CIV 10006128 PKID 517924 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte N.A	148.8 días	jue 29/12/22	vie 23/06/23	$ 9,784,512	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
769	1.5.6.1.18.60.1	ITEM - / CIV 10006128 PKID 517924 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 9,610,909	766CC
770	1.5.6.1.18.60.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10006128 PKID 517924	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 173,603	748
771	1.5.6.1.18.61	ITEM - / CIV 10010224 PKID 517971 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 16,174,696	769CC
772	1.5.6.1.18.62	ITEM - / CIV 10006057 PKID 517952 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte N.A	148.8 días	jue 29/12/22	vie 23/06/23	$ 3,102,418	
773	1.5.6.1.18.62.1	ITEM - / CIV 10006057 PKID 517952 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 2,919,721	771CC
774	1.5.6.1.18.62.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 10006057 PKID 517952	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 182,697	748
775	1.5.6.1.18.63	ITEM - / CIV 9004694 PKID 91014693 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 23 J BIS / CALZADA Sur-Norte N.A	2 días	mar 11/10/22	jue 13/10/22	$ 7,577,515	773CC-2.75 mss
776	1.5.6.1.18.64	ITEM - / CIV 11014835 PKID 910134574 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 130D BIS HASTA CALLE 130C BIS / CALZADA Norte - Sur N.A	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	$ 48,915,786	775FC+27 días
777	1.5.6.1.18.65	ITEM - / CIV 11014834 PKID 910134572 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 130D BIS HASTA CALLE 131 / CALZADA Norte-Sur N.A	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	$ 22,458,231	776CC
778	1.5.6.1.18.66	ITEM - / CIV 11014836 PKID 910134578 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 130B HASTA CALLE 130C BIS / CALZADA Norte-Sur N.A	2 días	vie 18/11/22	lun 21/11/22	$ 51,670,416	777
779	1.5.6.1.18.67	ITEM - / CIV 11007371 PKID 518618 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 129 HASTA CALLE 128C / CALZADA Norte-Sur N.A	181.8 días	lun 21/11/22	vie 23/06/23	$ 73,209,052	
780	1.5.6.1.18.67.1	ITEM - / CIV 11007371 PKID 518618 - AV. CIUDAD DE CALI DESDE CALLE 129 HASTA CALLE 128C / CALZADA Norte-Sur N.A	2 días	lun 21/11/22	mié 23/11/22	$ 69,227,287	778
781	1.5.6.1.18.67.2	3.013 - SELLO DE JUNTAS - CIV 11007371 PKID 518618	0.2 días	mar 14/02/23	mar 14/02/23	$ 2,595,419	780FC+3 mss
782	1.5.6.1.18.67.3	4.004 - SELLO DE FISURAS - CIV 11007371 PKID 518618	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 1,386,346	748
783	1.5.6.1.18.68	CIV 9003722 PKID 389360 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69C BIS HASTA CARRERA 69B / CALZADA Occidente-Oriente N.A	138.8 días	mié 11/01/23	sáb 24/06/23	$ 30,831,907	
784	1.5.6.1.18.68.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23	$ 332,320	773FC+9 días
785	1.5.6.1.18.68.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 11/01/23	jue 12/01/23	$ 2,962,397	784
786	1.5.6.1.18.68.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 12/01/23	vie 13/01/23	$ 1,218,631	785
787	1.5.6.1.18.68.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 904,876	786
788	1.5.6.1.18.68.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.7 días	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 24,116,005	787
789	1.5.6.1.18.68.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 24/02/23	vie 24/02/23	$ 238,696	788FC+1.54 mss
790	1.5.6.1.18.68.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 24/02/23	sáb 25/02/23	$ 248,007	789
791	1.5.6.1.18.68.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	$ 810,975	716
792	1.5.6.1.18.69	CIV 9003696 PKID 389282 - CALLE 24A DESDE CARRERA 69D HASTA CARRERA 69C BIS / CALZADA Occidente-Oriente N.A	139 días	mié 11/01/23	sáb 24/06/23	$ 12,994,510	
793	1.5.6.1.18.69.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23	$ 121,477	784CC
794	1.5.6.1.18.69.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 11/01/23	jue 12/01/23	$ 1,089,321	793
795	1.5.6.1.18.69.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 12/01/23	vie 13/01/23	$ 448,111	794
796	1.5.6.1.18.69.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 332,810	795
797	1.5.6.1.18.69.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.7 días	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 8,867,848	796
798	1.5.6.1.18.69.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 25/02/23	sáb 25/02/23	$ 369,978	797;789;790
799	1.5.6.1.18.69.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 25/02/23	sáb 25/02/23	$ 1,133,380	798CC
800	1.5.6.1.18.69.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	$ 631,585	791
801	1.5.6.1.18.70	CIV 11000479 PKID 510527 - AV. CALLE 170 DESDE AV. BOYACÁ HASTA CARRERA 69 / CALZADA Occidente-Oriente N.A	42.16 días	mié 11/01/23	mar 28/02/23	$ 195,229,453	
802	1.5.6.1.18.70.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23	$ 2,022,182	793CC
803	1.5.6.1.18.70.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 11/01/23	jue 12/01/23	$ 19,308,655	802
804	1.5.6.1.18.70.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 12/01/23	vie 13/01/23	$ 7,942,933	803
805	1.5.6.1.18.70.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	1 día	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 5,536,869	804
806	1.5.6.1.18.70.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1.5 días	sáb 25/02/23	mar 28/02/23	$ 157,186,079	805;798;799
807	1.5.6.1.18.70.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 3,232,735	806
808	1.5.6.1.18.71	CIV 9003679 PKID 389225 - CALLE 24A DESDE TRANSVERSAL 69F HASTA CARRERA 69D / CALZADA Occidente-Oriente N.A	100.24 días	jue 23/02/23	lun 26/06/23	$ 11,179,500	
809	1.5.6.1.18.71.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 104,646	807CC-3 días
810	1.5.6.1.18.71.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	vie 24/02/23	sáb 25/02/23	$ 939,219	809
811	1.5.6.1.18.71.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	sáb 25/02/23	sáb 25/02/23	$ 386,363	810
812	1.5.6.1.18.71.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	sáb 25/02/23	lun 27/02/23	$ 286,697	811
813	1.5.6.1.18.71.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.7 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 7,645,900	812
814	1.5.6.1.18.71.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.1 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 539,452	813;806
815	1.5.6.1.18.71.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.1 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 764,680	814
816	1.5.6.1.18.71.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	$ 512,543	800
817	1.5.6.1.18.72	CIV 11000559 PKID 510534 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 69 HASTA CARRERA 68 / CALZADA Occidente-Oriente N.A	3.3 días	vie 24/02/23	mié 1/03/23	$ 98,073,109	
818	1.5.6.1.18.72.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 24/02/23	sáb 25/02/23	$ 946,952	807CC-2 días
819	1.5.6.1.18.72.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 25/02/23	lun 27/02/23	$ 9,530,490	818
820	1.5.6.1.18.72.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 3,920,525	819
821	1.5.6.1.18.72.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 2,580,031	820
822	1.5.6.1.18.72.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.7 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 77,584,933	821
823	1.5.6.1.18.72.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 2,138,714	822;814;815
824	1.5.6.1.18.72.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 1/03/23	mié 1/03/23	$ 1,371,464	823
825	1.5.6.1.18.73	CIV 11000757 PKID 510541 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 68 HASTA CARRERA 67	2.7 días	lun 27/02/23	mié 1/03/23	$ 124,290,824	
826	1.5.6.1.18.73.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 27/02/23	lun 27/02/23	$ 1,341,795	818CC+1 día
827	1.5.6.1.18.73.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	lun 27/02/23	mar 28/02/23	$ 12,006,124	826
828	1.5.6.1.18.73.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 4,938,916	827
829	1.5.6.1.18.73.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 3,667,882	828
830	1.5.6.1.18.73.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 98,000,180	829
831	1.5.6.1.18.73.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 1/03/23	mié 1/03/23	$ 3,349,698	830;823;824
832	1.5.6.1.18.73.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 1/03/23	mié 1/03/23	$ 986,229	831
833	1.5.6.1.18.74	CIV 11006273 PKID 517987 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 72A Y CALLE 72B	2.3 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	$ 24,137,644	
834	1.5.6.1.18.74.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 256,136	826CC+1 día;850CC+1 día
835	1.5.6.1.18.74.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 2,296,581	834
836	1.5.6.1.18.74.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 944,737	835
837	1.5.6.1.18.74.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 701,733	836
838	1.5.6.1.18.74.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 18,695,795	837
839	1.5.6.1.18.74.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 759,053	838;832
840	1.5.6.1.18.74.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 483,609	838;832
841	1.5.6.1.18.75	CIV 11006191 PKID 517945 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 72B Y CALLE 73	2.7 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	$ 36,548,207	
842	1.5.6.1.18.75.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 403,018	834CC
843	1.5.6.1.18.75.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 3,531,717	842
844	1.5.6.1.18.75.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,452,830	843
845	1.5.6.1.18.75.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,079,056	844
846	1.5.6.1.18.75.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 28,750,679	845
847	1.5.6.1.18.75.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 806,791	846;839;840
848	1.5.6.1.18.75.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 3/03/23	vie 3/03/23	$ 524,116	847
849	1.5.6.1.18.76	CIV 11014316 PKID 91011976 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 67 HASTA CARRERA 67	11.6 días	mar 28/02/23	lun 13/03/23	$ 69,726,669	
850	1.5.6.1.18.76.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/02/23	mar 28/02/23	$ 773,896	826CC+1 día
851	1.5.6.1.18.76.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	3 días	mar 28/02/23	jue 2/03/23	$ 6,750,362	850
852	1.5.6.1.18.76.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2.5 días	jue 2/03/23	lun 6/03/23	$ 2,776,870	851
853	1.5.6.1.18.76.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	2.2 días	lun 6/03/23	mié 8/03/23	$ 2,061,763	852
854	1.5.6.1.18.76.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	2.5 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 54,952,722	853
855	1.5.6.1.18.76.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.6 días	vie 10/03/23	sáb 11/03/23	$ 2,150,649	854
856	1.5.6.1.18.76.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.6 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23	$ 260,407	855;848;847
857	1.5.6.1.18.77	CIV 11005987 PKID 517959 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 74 Y CALLE 74BIS	2.3 días	mar 28/02/23	vie 3/03/23	$ 2,092,477	
858	1.5.6.1.18.77.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 17,486	842CC
859	1.5.6.1.18.77.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 146,887	858
860	1.5.6.1.18.77.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 60,424	859
861	1.5.6.1.18.77.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 45,130	860
862	1.5.6.1.18.77.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1,195,763	861
863	1.5.6.1.18.77.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 101,844	862
864	1.5.6.1.18.77.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 524,943	862
865	1.5.6.1.18.78	CIV 11001000 PKID 510496 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 67 HASTA CARRERA 65	9.7 días	mié 1/03/23	lun 13/03/23	$ 29,163,788	
866	1.5.6.1.18.78.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 303,169	850CC+2 días
867	1.5.6.1.18.78.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	3 días	jue 2/03/23	lun 6/03/23	$ 2,720,088	866
868	1.5.6.1.18.78.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2.5 días	lun 6/03/23	mié 8/03/23	$ 1,118,954	867
869	1.5.6.1.18.78.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	1.8 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 830,588	868
870	1.5.6.1.18.78.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1.8 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23	$ 22,143,432	869
871	1.5.6.1.18.78.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 1,911,155	870;863;864
872	1.5.6.1.18.78.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 136,402	871
873	1.5.6.1.18.79	CIV 11001182 PKID 509750 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 65 HASTA CARRERA 62	10.1 días	mié 1/03/23	lun 13/03/23	$ 92,296,255	
874	1.5.6.1.18.79.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 1,046,353	866CC
875	1.5.6.1.18.79.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 9,056,592	874
876	1.5.6.1.18.79.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 3,725,578	875
877	1.5.6.1.18.79.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 2,766,934	876
878	1.5.6.1.18.79.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.4 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 73,727,069	877
879	1.5.6.1.18.79.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 1,939,006	878;872
880	1.5.6.1.18.79.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 34,723	879
881	1.5.6.1.18.80	CIV 11001427 PKID 509781 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 62 HASTA CARRERA 58	10.5 días	mié 1/03/23	mar 14/03/23	$ 124,375,841	
882	1.5.6.1.18.80.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 1,322,732	874CC
883	1.5.6.1.18.80.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 12,279,527	882
884	1.5.6.1.18.80.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1.5 días	vie 3/03/23	lun 6/03/23	$ 5,051,385	883


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
885	1.5.6.1.18.80.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	2 días	lun 6/03/23	mié 8/03/23	$ 3,623,857	884
886	1.5.6.1.18.80.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	2 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 99,964,027	885
887	1.5.6.1.18.80.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23	$ 2,124,393	886;880
888	1.5.6.1.18.80.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 13/03/23	mar 14/03/23	$ 9,920	887
889	1.5.6.1.18.81	CIV 11014463 PKID 91032887 - CARRERA 76 DESDE TV75 HASTA CALLE 146A	18.04 días	mié 1/03/23	jue 23/03/23	$ 218,114,809	
890	1.5.6.1.18.81.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 1/03/23	jue 2/03/23	$ 2,351,587	882CC
891	1.5.6.1.18.81.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23	$ 20,942,636	890
892	1.5.6.1.18.81.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1.5 días	vie 3/03/23	lun 6/03/23	$ 8,615,099	891
893	1.5.6.1.18.81.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	2 días	lun 6/03/23	mié 8/03/23	$ 6,398,162	892
894	1.5.6.1.18.81.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	2 días	mié 8/03/23	vie 10/03/23	$ 170,487,846	893
895	1.5.6.1.18.81.6	3.013-SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 9,319,479	920
896	1.5.6.1.18.82	CIV 11001537 PKID 509729 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 58 HASTA CARRERA 56	7.9 días	sáb 4/03/23	mar 14/03/23	$ 52,877,046	
897	1.5.6.1.18.82.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 4/03/23	lun 6/03/23	$ 581,319	882CC+3 días
898	1.5.6.1.18.82.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 5,194,648	897
899	1.5.6.1.18.82.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 2,136,905	898
900	1.5.6.1.18.82.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 1,587,054	899
901	1.5.6.1.18.82.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.3 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	$ 42,288,108	900
902	1.5.6.1.18.82.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 1,074,131	901;888
903	1.5.6.1.18.82.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 14,881	902
904	1.5.6.1.18.83	CIV 11001568 PKID 509722 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 56 HASTA CARRERA 55A	8.3 días	sáb 4/03/23	mar 14/03/23	$ 99,157,359	
905	1.5.6.1.18.83.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 4/03/23	lun 6/03/23	$ 1,090,597	897CC
906	1.5.6.1.18.83.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 9,726,695	905
907	1.5.6.1.18.83.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 4,001,238	906
908	1.5.6.1.18.83.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 2,971,159	907
909	1.5.6.1.18.83.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.3 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23	$ 79,182,190	908
910	1.5.6.1.18.83.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 1,766,349	909;903
911	1.5.6.1.18.83.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 419,131	910
912	1.5.6.1.18.84	CIV 11001504 PKID 91028918 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 58 HASTA CARRERA 57	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 254,609	
913	1.5.6.1.18.84.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 254,609	903
914	1.5.6.1.18.85	CIV 11006856 PKID 517120 - TV 75 DESDE CALLE 138 HASTA CRA 76	12.14 días	mié 8/03/23	jue 23/03/23	$ 102,539,720	
915	1.5.6.1.18.85.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 1,078,251	894CC
916	1.5.6.1.18.85.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.5 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 9,608,759	915
917	1.5.6.1.18.85.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 3,952,721	916
918	1.5.6.1.18.85.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	1 día	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 2,935,539	917
919	1.5.6.1.18.85.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1 día	vie 10/03/23	sáb 11/03/23	$ 78,222,089	918
920	1.5.6.1.18.85.6	3.013-SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23	$ 6,742,361	927
921	1.5.6.1.18.86	CIV 11012203 PKID 517010 - CALLE 138 DESDE CARRERA 74 HASTA TRANSVERSAL 75	11.94 días	mié 8/03/23	mié 22/03/23	$ 39,165,647	
922	1.5.6.1.18.86.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 409,251	894CC
923	1.5.6.1.18.86.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.5 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 3,668,957	922
924	1.5.6.1.18.86.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 1,509,287	923
925	1.5.6.1.18.86.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	1.5 días	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 1,121,214	924
926	1.5.6.1.18.86.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1.5 días	vie 10/03/23	lun 13/03/23	$ 29,867,884	925
927	1.5.6.1.18.86.6	3.013-SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 2,589,054	1951
928	1.5.6.1.18.87	CIV 11001589 PKID 507646 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 55A HASTA CARRERA 55	7.2 días	mar 7/03/23	mar 14/03/23	$ 57,816,895	
929	1.5.6.1.18.87.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 7/03/23	mar 7/03/23	$ 638,870	901
930	1.5.6.1.18.87.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mar 7/03/23	mar 7/03/23	$ 5,671,766	929
931	1.5.6.1.18.87.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mar 7/03/23	mar 7/03/23	$ 2,333,172	930
932	1.5.6.1.18.87.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	mar 7/03/23	mié 8/03/23	$ 1,732,664	931
933	1.5.6.1.18.87.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 46,172,155	932
934	1.5.6.1.18.87.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 1,268,268	933;911
935	1.5.6.1.18.88	CIV 11001606 PKID 507639 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 55 HASTA CARRERA 54D	6.6 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23	$ 28,246,538	
936	1.5.6.1.18.88.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 308,514	929CC+1 día
937	1.5.6.1.18.88.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 2,758,685	936
938	1.5.6.1.18.88.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 1,134,830	937
939	1.5.6.1.18.88.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 842,895	938
940	1.5.6.1.18.88.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.3 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 22,457,648	939
941	1.5.6.1.18.88.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	$ 679,485	940;934
942	1.5.6.1.18.88.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	$ 64,481	941
943	1.5.6.1.18.89	CIV 11001626 PKID 507632 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 54D HASTA CARRERA 54A	6.8 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23	$ 50,892,883	
944	1.5.6.1.18.89.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 563,180	936CC
945	1.5.6.1.18.89.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 5,004,876	944
946	1.5.6.1.18.89.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 2,058,838	945
947	1.5.6.1.18.89.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 1,529,003	946
948	1.5.6.1.18.89.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.5 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 40,743,217	947
949	1.5.6.1.18.89.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	$ 993,769	948;942
950	1.5.6.1.18.90	CIV 11001651 PKID 507625 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 54A HASTA CARRERA 54	7 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23	$ 36,821,635	
951	1.5.6.1.18.90.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 401,906	944CC
952	1.5.6.1.18.90.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 3,569,242	951
953	1.5.6.1.18.90.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 8/03/23	mié 8/03/23	$ 1,468,266	952
954	1.5.6.1.18.90.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	mié 8/03/23	jue 9/03/23	$ 1,090,409	953
955	1.5.6.1.18.90.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.5 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 29,056,163	954
956	1.5.6.1.18.90.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23	$ 1,235,649	955;949
957	1.5.6.1.18.91	CIV 11001503 PKID 91011974 - AV. CALLE 170 DESDE CARRERA 58 HASTA CARRERA 57	6.1 días	jue 9/03/23	jue 16/03/23	$ 42,980,202	
958	1.5.6.1.18.91.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 478,181	955
959	1.5.6.1.18.91.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 4,172,875	958
960	1.5.6.1.18.91.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 1,716,580	959
961	1.5.6.1.18.91.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 1,310,061	960
962	1.5.6.1.18.91.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.5 días	mié 15/03/23	jue 16/03/23	$ 33,970,137	961;956
963	1.5.6.1.18.91.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 1,299,301	962
964	1.5.6.1.18.91.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 33,067	963
965	1.5.6.1.18.92	CIV 11011811 PKID 91033298 - CARRERA 114 ENTRE CALLE 80 Y CALLE 81	54.1 días	mar 14/03/23	jue 18/05/23	$ 113,765,188	
966	1.5.6.1.18.92.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 1,237,638	926FC+1 día
967	1.5.6.1.18.92.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1.5 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23	$ 11,061,547	966
968	1.5.6.1.18.92.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1.5 días	mié 15/03/23	vie 17/03/23	$ 4,550,349	967
969	1.5.6.1.18.92.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	1.5 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23	$ 3,379,515	968
970	1.5.6.1.18.92.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1.2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	$ 90,048,793	969
971	1.5.6.1.18.92.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 3,487,346	970FC+2 mss
972	1.5.6.1.18.93	CIV 10000276 PKID 162984 - CARRERA 104 ENTRE DIAGONAL 86A Y CALLE 87	51.3 días	vie 17/03/23	jue 18/05/23	$ 112,147,212	
973	1.5.6.1.18.93.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 1,228,450	966CC+3 días
974	1.5.6.1.18.93.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	$ 11,005,793	973
975	1.5.6.1.18.93.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	sáb 18/03/23	mar 21/03/23	$ 4,527,415	974
976	1.5.6.1.18.93.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 3,362,292	975
977	1.5.6.1.18.93.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.8 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	$ 89,594,930	976
978	1.5.6.1.18.93.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 2,428,332	971
979	1.5.6.1.18.94	CIV 9003022 PKID 603447 - CALLE 22 ENTRE CARRERA 89 Y CARRERA 91	2.1 días	jue 16/03/23	sáb 18/03/23	$ 107,622,269	
980	1.5.6.1.18.94.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 1,159,626	977CC-3 días
981	1.5.6.1.18.94.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 16/03/23	vie 17/03/23	$ 10,813,874	980
982	1.5.6.1.18.94.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 4,448,466	981
983	1.5.6.1.18.94.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 3,167,721	982
984	1.5.6.1.18.94.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	$ 88,032,582	983
985	1.5.6.1.18.95	CIV 9002220 PKID 603423 - CALLE 22 ENTRE CARRERA 97 Y CARRERA 97B	50.8 días	mar 21/03/23	vie 19/05/23	$ 43,855,428	
986	1.5.6.1.18.95.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 478,691	984FC+0.5 días
987	1.5.6.1.18.95.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 21/03/23	mié 22/03/23	$ 4,284,379	986
988	1.5.6.1.18.95.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 1,762,449	987
989	1.5.6.1.18.95.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 1,308,685	988
990	1.5.6.1.18.95.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 34,877,871	989
991	1.5.6.1.18.95.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 19/05/23	vie 19/05/23	$ 1,143,353	978FC+1 día
992	1.5.6.1.18.96	CIV 9002026 PKID 385331 - CARRERA 97 ENTRE CALLE 22K Y CALLE 22L	2.3 días	mar 21/03/23	jue 23/03/23	$ 17,534,300	
993	1.5.6.1.18.96.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 21/03/23	mié 22/03/23	$ 192,075	986CC+1 día
994	1.5.6.1.18.96.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 22/03/23	jue 23/03/23	$ 1,722,972	993
995	1.5.6.1.18.96.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 708,773	994
996	1.5.6.1.18.96.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 526,225	995
997	1.5.6.1.18.96.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 14,026,210	996
998	1.5.6.1.18.96.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 358,045	997
999	1.5.6.1.18.97	CIV 10011789 PKID 91033026 - CALLE 63 ENTRE TRANSVERSAL 85 Y CARRERA 85I	51.3 días	mié 22/03/23	mié 24/05/23	$ 148,002,336	
1000	1.5.6.1.18.97.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23	$ 1,550,737	990
1001	1.5.6.1.18.97.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 13,814,868	1000
1002	1.5.6.1.18.97.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 23/03/23	vie 24/03/23	$ 5,682,972	1001
1003	1.5.6.1.18.97.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	$ 4,220,636	1002
1004	1.5.6.1.18.97.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.8 días	vie 24/03/23	sáb 25/03/23	$ 112,462,804	1003
1005	1.5.6.1.18.97.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 6,398,639	1004FC+2 mss
1006	1.5.6.1.18.97.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 2,592,474	1005;998
1007	1.5.6.1.18.97.8	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 1,279,206	1005;998
1008	1.5.6.1.18.98	CIV 9004916 PKID 24122917 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A	51.7 días	mié 22/03/23	mié 24/05/23	$ 44,388,745	
1009	1.5.6.1.18.98.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23	$ 466,289	1000CC
1010	1.5.6.1.18.98.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 4,181,450	1009
1011	1.5.6.1.18.98.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 23/03/23	vie 24/03/23	$ 1,720,109	1010

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1012	1.5.6.1.18.98.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	$ 1,277,485	1011
1013	1.5.6.1.18.98.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	$ 34,039,963	1012
1014	1.5.6.1.18.98.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 2,517,446	1007;1006
1015	1.5.6.1.18.98.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 186,003	1014
1016	1.5.6.1.18.99	CIV 9004406 PKID 91014291 - AV. CIUDAD DE CALI CONECTANTE SW A CALLE 17 (AV. CENTENARIO)	50 días	vie 24/03/23	jue 25/05/23	$ 147,752,261	
1017	1.5.6.1.18.99.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	$ 1,555,749	1013
1018	1.5.6.1.18.99.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	vie 24/03/23	lun 27/03/23	$ 14,591,123	1017
1019	1.5.6.1.18.99.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 27/03/23	lun 27/03/23	$ 6,002,297	1018
1020	1.5.6.1.18.99.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 27/03/23	lun 27/03/23	$ 4,262,256	1019
1021	1.5.6.1.18.99.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23	$ 118,782,017	1020
1022	1.5.6.1.18.99.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	$ 2,495,167	1015
1023	1.5.6.1.18.99.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 63,652	1022
1024	1.5.6.1.18.100	CIV 10010312 PKID 902244 - CALLE 66A POR ALO (INTERSECCIÓN)	2.9 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23	$ 21,632,996	
1025	1.5.6.1.18.100.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/03/23	mar 28/03/23	$ 250,290	1021
1026	1.5.6.1.18.100.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 2,167,922	1025
1027	1.5.6.1.18.100.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	mié 29/03/23	mié 29/03/23	$ 891,811	1026
1028	1.5.6.1.18.100.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 29/03/23	mié 29/03/23	$ 674,561	1027
1029	1.5.6.1.18.100.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.8 días	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 17,648,412	1028
1030	1.5.6.1.18.101	CIV 10006700 PKID 158924 - CALLE 66A ENTRE CARRERA 95 Y ALO	2.9 días	mar 28/03/23	vie 31/03/23	$ 35,241,202	
1031	1.5.6.1.18.101.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 28/03/23	mié 29/03/23	$ 416,604	1025CC+1 día
1032	1.5.6.1.18.101.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 3,527,643	1031
1033	1.5.6.1.18.101.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 30/03/23	jue 30/03/23	$ 1,451,155	1032
1034	1.5.6.1.18.101.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 30/03/23	jue 30/03/23	$ 1,128,290	1033
1035	1.5.6.1.18.101.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.8 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	$ 28,717,510	1034
1036	1.5.6.1.18.102	CIV 11009694 PKID 167699 - CARRERA 58 ENTRE CALLE 128B Y CALLE 128B BIS	3.1 días	mié 29/03/23	lun 3/04/23	$ 83,747,079	
1037	1.5.6.1.18.102.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 29/03/23	jue 30/03/23	$ 917,297	1031CC+1 día
1038	1.5.6.1.18.102.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 30/03/23	jue 30/03/23	$ 8,225,881	1037
1039	1.5.6.1.18.102.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.5 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23	$ 3,383,850	1038
1040	1.5.6.1.18.102.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 31/03/23	vie 31/03/23	$ 2,513,108	1039
1041	1.5.6.1.18.102.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.8 días	vie 31/03/23	sáb 1/04/23	$ 66,964,464	1040
1042	1.5.6.1.18.102.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 1/04/23	lun 3/04/23	$ 1,742,479	1041
1043	1.5.6.1.18.103	CIV 10003968 PKID 515512 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 84A BIS Y CALLE 85	2.5 días	vie 31/03/23	mar 4/04/23	$ 76,392,781	
1044	1.5.6.1.18.103.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 31/03/23	vie 31/03/23	$ 847,500	1021FC+4 días
1045	1.5.6.1.18.103.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	vie 31/03/23	lun 3/04/23	$ 7,475,123	1044
1046	1.5.6.1.18.103.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23	$ 3,075,014	1045
1047	1.5.6.1.18.103.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23	$ 2,283,898	1046
1048	1.5.6.1.18.103.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23	$ 60,852,775	1047
1049	1.5.6.1.18.103.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23	$ 1,481,504	1048
1050	1.5.6.1.18.103.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 376,967	1049
1051	1.5.6.1.18.104	CIV 10004242 PKID 515477 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 83 BIS Y DG 83A	2.1 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23	$ 73,253,718	
1052	1.5.6.1.18.104.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23	$ 805,964	1048
1053	1.5.6.1.18.104.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 4/04/23	mié 5/04/23	$ 7,178,973	1052
1054	1.5.6.1.18.104.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 5/04/23	mié 5/04/23	$ 2,953,188	1053
1055	1.5.6.1.18.104.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 5/04/23	mié 5/04/23	$ 2,193,264	1054
1056	1.5.6.1.18.104.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 5/04/23	mié 5/04/23	$ 58,441,911	1055
1057	1.5.6.1.18.104.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 1,680,418	1050;1049
1058	1.5.6.1.18.105	CIV 11012156 PKID 91013825 - AV. CALLE 170 - TRANSVERSAL 91 (SECTOR CONEJERA)	2.4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23	$ 393,911,226	
1059	1.5.6.1.18.105.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 1/04/23	lun 3/04/23	$ 4,308,466	1041
1060	1.5.6.1.18.105.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23	$ 38,812,835	1059
1061	1.5.6.1.18.105.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 3/04/23	lun 3/04/23	$ 15,966,301	1060
1062	1.5.6.1.18.105.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23	$ 11,801,879	1061
1063	1.5.6.1.18.105.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.5 días	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 315,963,874	1062
1064	1.5.6.1.18.105.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 5,640,382	1063
1065	1.5.6.1.18.105.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 4/04/23	mar 4/04/23	$ 680,916	1064
1066	1.5.6.1.18.105.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 4/04/23	mié 5/04/23	$ 736,573	1065
1067	1.5.6.1.18.106	CIV 1004580 PKID 515588 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 81 BIS Y CALLE 83	2.7 días	mié 5/04/23	mar 11/04/23	$ 92,234,731	
1068	1.5.6.1.18.106.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 5/04/23	sáb 8/04/23	$ 1,006,020	1056
1069	1.5.6.1.18.106.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 8/04/23	lun 10/04/23	$ 8,949,109	1068
1070	1.5.6.1.18.106.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 3,681,364	1069
1071	1.5.6.1.18.106.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 10/04/23	lun 10/04/23	$ 2,734,457	1070
1072	1.5.6.1.18.106.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	lun 10/04/23	mar 11/04/23	$ 72,852,067	1071
1073	1.5.6.1.18.106.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 2,653,502	1072
1074	1.5.6.1.18.106.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 216,022	1073
1075	1.5.6.1.18.106.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 142,190	1074
1076	1.5.6.1.18.107	CIV 10004308 PKID 515498 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83	2.1 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23	$ 26,728,388	
1077	1.5.6.1.18.107.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 301,295	1072
1078	1.5.6.1.18.107.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 11/04/23	mié 12/04/23	$ 2,638,604	1077
1079	1.5.6.1.18.107.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 1,085,433	1078
1080	1.5.6.1.18.107.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 806,045	1079
1081	1.5.6.1.18.107.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 21,480,089	1080
1082	1.5.6.1.18.107.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 416,922	1074
1083	1.5.6.1.18.108	CIV 10003843 PKID 515519 - AV. CIUDAD ENTRE DG 85 Y CALLE 86	3.6 días	mar 11/04/23	vie 14/04/23	$ 11,948,017	
1084	1.5.6.1.18.108.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 13/04/23	jue 13/04/23	$ 126,167	1081
1085	1.5.6.1.18.108.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 1,112,909	1084
1086	1.5.6.1.18.108.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 14/04/23	vie 14/04/23	$ 457,813	1085
1087	1.5.6.1.18.108.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 14/04/23	vie 14/04/23	$ 340,057	1086
1088	1.5.6.1.18.108.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 14/04/23	vie 14/04/23	$ 9,059,868	1087
1089	1.5.6.1.18.108.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 541,044	1082
1090	1.5.6.1.18.108.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	$ 186,157	1089
1091	1.5.6.1.18.108.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 124,002	1090
1092	1.5.6.1.18.109	CIV 10011433 PKID 91026692 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 80 Y CALLE 81	2.1 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23	$ 6,117,289	
1093	1.5.6.1.18.109.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 14/04/23	sáb 15/04/23	$ 71,827	1088
1094	1.5.6.1.18.109.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 15/04/23	lun 17/04/23	$ 613,279	1093
1095	1.5.6.1.18.109.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 17/04/23	lun 17/04/23	$ 252,283	1094
1096	1.5.6.1.18.109.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23	$ 187,373	1095
1097	1.5.6.1.18.109.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mar 18/04/23	mar 18/04/23	$ 4,992,527	1096
1098	1.5.6.1.18.110	CIV 10003723 PKID 515595 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 86 Y CALLE 87	7.8 días	mar 11/04/23	jue 20/04/23	$ 18,437,455	
1099	1.5.6.1.18.110.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 18/04/23	mar 18/04/23	$ 194,497	1097
1100	1.5.6.1.18.110.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 18/04/23	mié 19/04/23	$ 1,554,643	1099
1101	1.5.6.1.18.110.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 19/04/23	mié 19/04/23	$ 639,528	1100
1102	1.5.6.1.18.110.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 19/04/23	mié 19/04/23	$ 474,979	1101
1103	1.5.6.1.18.110.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23	$ 12,655,883	1102
1104	1.5.6.1.18.110.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 11/04/23	mar 11/04/23	$ 271,318	1082
1105	1.5.6.1.18.110.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23	$ 1,489,254	1104
1106	1.5.6.1.18.110.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 1,157,353	1105
1107	1.5.6.1.18.111	CIV 10003471 PKID 515526 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 87 Y CALLE 87 BIS	9.3 días	mié 12/04/23	vie 21/04/23	$ 33,375,639	
1108	1.5.6.1.18.111.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 20/04/23	jue 20/04/23	$ 367,293	1103
1109	1.5.6.1.18.111.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 20/04/23	vie 21/04/23	$ 3,104,994	1108
1110	1.5.6.1.18.111.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 1,277,290	1109
1111	1.5.6.1.18.111.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 948,656	1110
1112	1.5.6.1.18.111.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 21/04/23	vie 21/04/23	$ 25,276,854	1111
1113	1.5.6.1.18.111.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 1,693,149	1106
1114	1.5.6.1.18.111.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 169,233	1113
1115	1.5.6.1.18.111.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 538,170	1114
1116	1.5.6.1.18.112	CIV 10003394 PKID 515718 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 87BIS Y CALLE 89	10.8 días	mié 12/04/23	mar 25/04/23	$ 138,037,821	
1117	1.5.6.1.18.112.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 21/04/23	sáb 22/04/23	$ 1,527,294	1112
1118	1.5.6.1.18.112.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 22/04/23	lun 24/04/23	$ 13,505,014	1117
1119	1.5.6.1.18.112.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	$ 5,555,510	1118
1120	1.5.6.1.18.112.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	$ 4,125,736	1119
1121	1.5.6.1.18.112.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 109,940,357	1120
1122	1.5.6.1.18.112.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 12/04/23	mié 12/04/23	$ 3,383,910	1115
1123	1.5.6.1.18.113	CIV 11000339 PKID 510524 - AV. CALLE 170 ENTRE AV. BOYACÁ Y CARRERA 76 (SECTOR CONEJERA)	13.1 días	mié 12/04/23	jue 27/04/23	$ 61,318,694	
1124	1.5.6.1.18.113.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 682,101	1121
1125	1.5.6.1.18.113.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 5,984,835	1124
1126	1.5.6.1.18.113.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 2,461,961	1125
1127	1.5.6.1.18.113.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	mar 25/04/23	mié 26/04/23	$ 1,828,203	1126
1128	1.5.6.1.18.113.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1 día	mié 26/04/23	jue 27/04/23	$ 48,720,787	1127
1129	1.5.6.1.18.113.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 1,551,522	1128
1130	1.5.6.1.18.113.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 12/04/23	jue 13/04/23	$ 89,285	1122
1131	1.5.6.1.18.114	CIV 11000327 PKID 510517 - AV. CALLE 170 ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 78(SECTOR CONEJERA)	15.4 días	jue 13/04/23	mar 2/05/23	$ 38,362,189	
1132	1.5.6.1.18.114.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 408,003	1129
1133	1.5.6.1.18.114.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 3,658,500	1132
1134	1.5.6.1.18.114.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23	$ 1,504,984	1133
1135	1.5.6.1.18.114.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 1,117,799	1134
1136	1.5.6.1.18.114.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1 día	vie 28/04/23	sáb 29/04/23	$ 29,782,785	1135
1137	1.5.6.1.18.114.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 29/04/23	mar 2/05/23	$ 1,390,802	1136
1138	1.5.6.1.18.114.7	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 13/04/23	jue 13/04/23	$ 499,316	1130
1139	1.5.6.1.18.115	CIV 11000308 PKID 510510 - AV. CALLE 170 ENTRE CARRERA 78 Y CARRERA 81 (SECTOR CONEJERA)	2.9 días	mar 2/05/23	jue 4/05/23	$ 73,204,246	
1140	1.5.6.1.18.115.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 788,298	1137

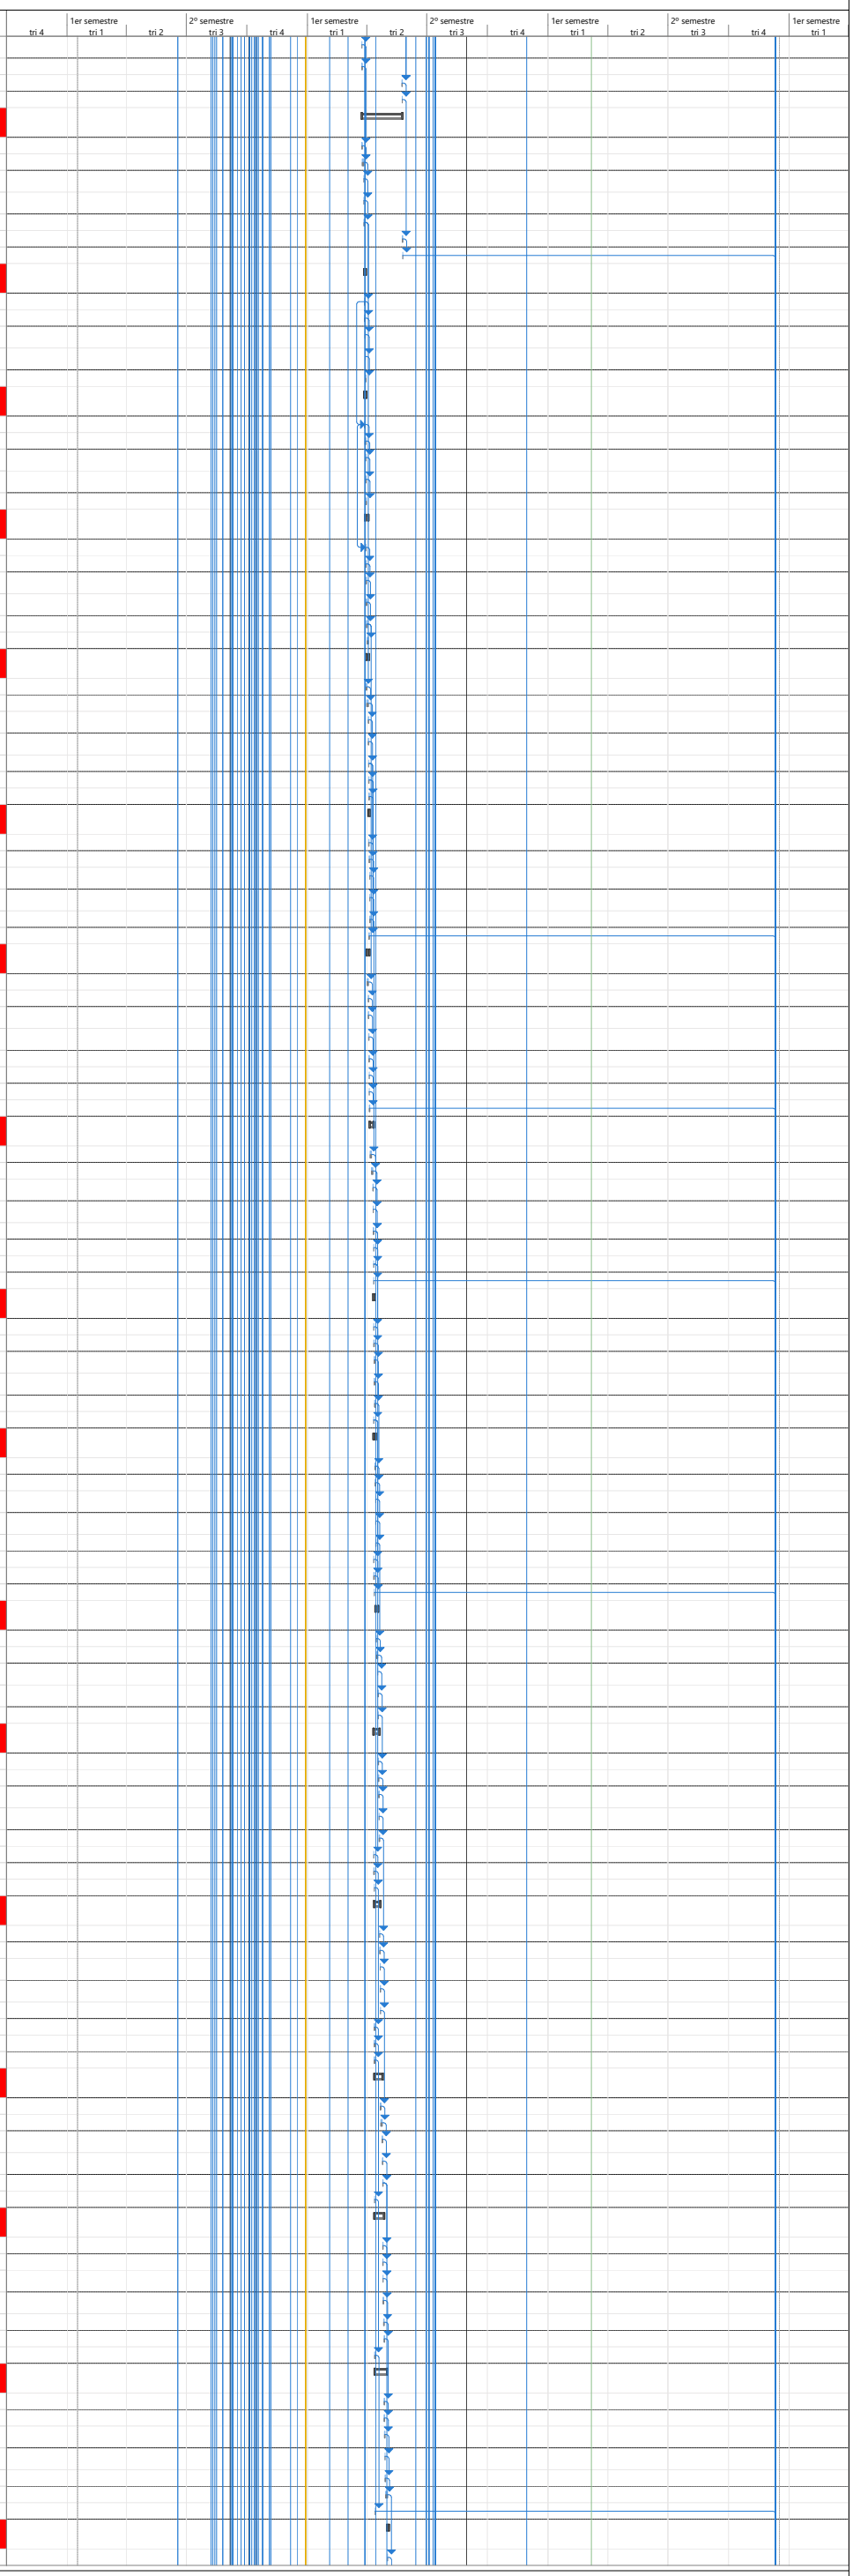

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1141	1.5.6.1.18.115.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 7,070,137	1140
1142	1.5.6.1.18.115.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 2,908,418	1141
1143	1.5.6.1.18.115.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 2,159,688	1142
1144	1.5.6.1.18.115.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1 día	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 57,555,904	1143
1145	1.5.6.1.18.115.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 2,306,597	1144
1146	1.5.6.1.18.115.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 249,868	1145
1147	1.5.6.1.18.115.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 165,336	1146
1148	1.5.6.1.18.116	CIV 11012157 PKID 519901 - AV. CALLE 170 ENTRE TV 91 Y AV. LA CONEJERA (SECTOR CONEJERA)	2.5 días	jue 4/05/23	lun 8/05/23	$ 96,114,915	
1149	1.5.6.1.18.116.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 1,004,137	1145;1154
1150	1.5.6.1.18.116.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.3 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 9,004,593	1149
1151	1.5.6.1.18.116.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 3,704,187	1150
1152	1.5.6.1.18.116.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.5 días	vie 5/05/23	sáb 6/05/23	$ 2,751,014	1151
1153	1.5.6.1.18.116.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	1 día	sáb 6/05/23	lun 8/05/23	$ 73,303,752	1152
1154	1.5.6.1.18.116.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,680,418	1147
1155	1.5.6.1.18.116.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 2,662,938	1154
1156	1.5.6.1.18.116.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 2,003,876	1155
1157	1.5.6.1.18.117	CIV 10003040 PKID 515744 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 89 Y CALLE 90	2.3 días	mar 25/04/23	jue 27/04/23	$ 100,746,493	
1158	1.5.6.1.18.117.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 1,117,386	1121
1159	1.5.6.1.18.117.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 25/04/23	mié 26/04/23	$ 9,900,389	1158
1160	1.5.6.1.18.117.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 26/04/23	mié 26/04/23	$ 4,072,687	1159
1161	1.5.6.1.18.117.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 26/04/23	mié 26/04/23	$ 3,024,594	1160
1162	1.5.6.1.18.117.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23	$ 80,596,159	1161
1163	1.5.6.1.18.117.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 2,035,278	1162
1164	1.5.6.1.18.118	CIV 10004580 PKID 515590 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 82A Y DG 82 BIS	2.7 días	jue 27/04/23	mar 2/05/23	$ 93,190,740	
1165	1.5.6.1.18.118.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 1,024,435	1163
1166	1.5.6.1.18.118.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 27/04/23	vie 28/04/23	$ 9,091,359	1165
1167	1.5.6.1.18.118.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 3,739,882	1166
1168	1.5.6.1.18.118.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 2,777,524	1167
1169	1.5.6.1.18.118.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 28/04/23	sáb 29/04/23	$ 74,010,081	1168
1170	1.5.6.1.18.118.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 29/04/23	sáb 29/04/23	$ 2,476,867	1169
1171	1.5.6.1.18.118.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	sáb 29/04/23	sáb 29/04/23	$ 45,792	1170
1172	1.5.6.1.18.118.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 29/04/23	mar 2/05/23	$ 24,800	1171
1173	1.5.6.1.18.119	CIV 10004308 PKID 515500 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 82A BIS Y CALLE 83A	2.1 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	$ 23,100,603	
1174	1.5.6.1.18.119.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 29/04/23	sáb 29/04/23	$ 260,111	1169
1175	1.5.6.1.18.119.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 29/04/23	mar 2/05/23	$ 2,234,261	1174
1176	1.5.6.1.18.119.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 919,099	1175
1177	1.5.6.1.18.119.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 682,593	1176
1178	1.5.6.1.18.119.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 18,188,470	1177
1179	1.5.6.1.18.119.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 705,744	1172
1180	1.5.6.1.18.119.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 60,724	1179
1181	1.5.6.1.18.119.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 49,601	1180
1182	1.5.6.1.18.120	CIV 10004242 PKID 515479 - AV. CIUDAD ENTRE DG83 Y CALLE 83A	3.2 días	mar 2/05/23	vie 5/05/23	$ 8,817,370	
1183	1.5.6.1.18.120.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 77,512	1178
1184	1.5.6.1.18.120.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 695,086	1183
1185	1.5.6.1.18.120.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 285,935	1184
1186	1.5.6.1.18.120.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 212,359	1185
1187	1.5.6.1.18.120.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 5,658,490	1186
1188	1.5.6.1.18.120.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 494,100	1187
1189	1.5.6.1.18.120.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 883,001	1181
1190	1.5.6.1.18.120.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 510,887	1189
1191	1.5.6.1.18.121	CIV 10004072 PKID 515507 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 84A BIS Y DG 83A	0.4 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 964,801	
1192	1.5.6.1.18.121.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 634,128	1190
1193	1.5.6.1.18.121.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 330,673	1192
1194	1.5.6.1.18.122	CIV 10003968 PKID 515514 - AV. CIUDAD ENTRE DG85 Y CALLE 84A BIS	4.7 días	mié 3/05/23	lun 8/05/23	$ 23,268,477	
1195	1.5.6.1.18.122.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23	$ 240,157	1188
1196	1.5.6.1.18.122.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	vie 5/05/23	lun 8/05/23	$ 2,137,445	1195
1197	1.5.6.1.18.122.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	lun 8/05/23	lun 8/05/23	$ 879,273	1196
1198	1.5.6.1.18.122.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 8/05/23	lun 8/05/23	$ 653,016	1197
1199	1.5.6.1.18.122.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	lun 8/05/23	lun 8/05/23	$ 17,400,313	1198
1200	1.5.6.1.18.122.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 8/05/23	lun 8/05/23	$ 625,383	1199
1201	1.5.6.1.18.122.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 269,777	1193
1202	1.5.6.1.18.122.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 1,063,113	1201
1203	1.5.6.1.18.123	CIV 10003471 PKID 515528 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 86 Y CALLE 87	6.6 días	mié 3/05/23	jue 11/05/23	$ 29,164,342	
1204	1.5.6.1.18.123.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 8/05/23	mar 9/05/23	$ 294,569	1200
1205	1.5.6.1.18.123.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 9/05/23	mié 10/05/23	$ 2,641,551	1204
1206	1.5.6.1.18.123.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	$ 1,086,645	1205
1207	1.5.6.1.18.123.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	$ 807,027	1206
1208	1.5.6.1.18.123.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	$ 21,504,092	1207
1209	1.5.6.1.18.123.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	$ 2,575,528	1208
1210	1.5.6.1.18.123.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 89,594	1202
1211	1.5.6.1.18.123.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 165,336	1210
1212	1.5.6.1.18.124	CIV 10003723 PKID 515597 - AV. CIUDAD ENTRE CALLE 87 BIS Y CALLE 87	2.7 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23	$ 57,954,439	
1213	1.5.6.1.18.124.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	$ 629,311	1209
1214	1.5.6.1.18.124.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 5,594,539	1213
1215	1.5.6.1.18.124.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 2,301,404	1214
1216	1.5.6.1.18.124.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 1,709,200	1215
1217	1.5.6.1.18.124.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 45,543,509	1216
1218	1.5.6.1.18.124.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 12/05/23	sáb 13/05/23	$ 797,244	1217;1211
1219	1.5.6.1.18.124.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	sáb 13/05/23	sáb 13/05/23	$ 567,430	1218
1220	1.5.6.1.18.124.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 13/05/23	sáb 13/05/23	$ 811,802	1219
1221	1.5.6.1.18.125	CIV 10008104 PKID 158443 - CARRERA 68C ENTRE CALLE 79 Y CALLE 68B	45.08 días	jue 9/03/23	jue 4/05/23	$ 17,764,150	
1222	1.5.6.1.18.125.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 186,983	1209CC-2.12 mss
1223	1.5.6.1.18.125.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 1,677,728	1222
1224	1.5.6.1.18.125.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 690,163	1223
1225	1.5.6.1.18.125.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 10/03/23	sáb 11/03/23	$ 512,273	1224
1226	1.5.6.1.18.125.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23	$ 13,657,881	1225
1227	1.5.6.1.18.125.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,039,122	1226;1211
1228	1.5.6.1.18.126	CIV 10011419 PKID 91026551 - CARRERA 68C ENTRE CALLE 79 Y CALLE 80	45.08 días	jue 9/03/23	jue 4/05/23	$ 49,648,507	
1229	1.5.6.1.18.126.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 534,681	1209CC-2.12 mss
1230	1.5.6.1.18.126.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 4,794,755	1229
1231	1.5.6.1.18.126.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 10/03/23	vie 10/03/23	$ 1,972,401	1230
1232	1.5.6.1.18.126.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	vie 10/03/23	sáb 11/03/23	$ 1,464,857	1231
1233	1.5.6.1.18.126.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23	$ 39,032,716	1232
1234	1.5.6.1.18.126.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,849,097	1233;1211
1235	1.5.6.1.18.127	CIV 10004072 PKID 515505 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 83A Y CALLE 83	59.88 días	mar 21/02/23	jue 4/05/23	$ 52,620,874	
1236	1.5.6.1.18.127.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	$ 592,100	1229FC-15 días
1237	1.5.6.1.18.127.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 21/02/23	mié 22/02/23	$ 5,101,371	1236
1238	1.5.6.1.18.127.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 22/02/23	mié 22/02/23	$ 2,098,531	1237
1239	1.5.6.1.18.127.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 22/02/23	jue 23/02/23	$ 1,558,434	1238
1240	1.5.6.1.18.127.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 23/02/23	jue 23/02/23	$ 41,528,754	1239
1241	1.5.6.1.18.127.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,741,684	1240;1211
1242	1.5.6.1.18.128	CIV 10003843 PKID 515521 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 87 Y CALLE 85	45.28 días	jue 9/03/23	jue 4/05/23	$ 14,182,777	
1243	1.5.6.1.18.128.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	$ 153,786	1236CC+15 días
1244	1.5.6.1.18.128.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	jue 9/03/23	vie 10/03/23	$ 1,342,566	1243
1245	1.5.6.1.18.128.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	vie 10/03/23	sáb 11/03/23	$ 552,287	1244
1246	1.5.6.1.18.128.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23	$ 410,171	1245
1247	1.5.6.1.18.128.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23	$ 10,929,447	1246
1248	1.5.6.1.18.128.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 375,548	1247;1211
1249	1.5.6.1.18.128.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 145,341	1248
1250	1.5.6.1.18.128.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 273,631	1249
1251	1.5.6.1.18.129	CIV 11012645 PKID 24120706 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 91 Y CALLE 91A	41.28 días	mar 14/03/23	jue 4/05/23	$ 2,754,448	
1252	1.5.6.1.18.129.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 14/03/23	mar 14/03/23	$ 25,825	1243CC+4 días
1253	1.5.6.1.18.129.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mar 14/03/23	mié 15/03/23	$ 231,588	1252
1254	1.5.6.1.18.129.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	mié 15/03/23	jue 16/03/23	$ 95,268	1253
1255	1.5.6.1.18.129.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 70,753	1254
1256	1.5.6.1.18.129.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 1,885,290	1255
1257	1.5.6.1.18.129.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 120,144	1256;1211
1258	1.5.6.1.18.129.7	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 199,098	1257
1259	1.5.6.1.18.129.8	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 126,482	1258
1260	1.5.6.1.18.130	CIV 9004739 PKID 24122878 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 23D Y CALLE 23D	0.4 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 908,314	
1261	1.5.6.1.18.130.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 641,296	1259
1262	1.5.6.1.18.130.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 267,018	1261
1263	1.5.6.1.18.131	CIV 11014834 PKID 91034572 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 131 Y CALLE 130DBIS	0.4 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 2,336,551	
1264	1.5.6.1.18.131.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 626,974	1259
1265	1.5.6.1.18.131.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,709,577	1264
1266	1.5.6.1.18.132	CIV 11014835 PKID 91034574 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 130D BIS Y CALLE 130C BIS	0.4 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 2,684,394	
1267	1.5.6.1.18.132.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,649,388	1259
1268	1.5.6.1.18.132.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,035,006	1267
1269	1.5.6.1.18.133	CIV 11014836 PKID 91034578 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 130C BIS Y CALLE 130B	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,712,245	
1270	1.5.6.1.18.133.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,712,245	1259


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1271	1.5.6.1.18.134	CIV 11014698 PKID 91032269 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 127 Y CALLE 127	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,239,386	
1272	1.5.6.1.18.134.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,239,386	1259
1273	1.5.6.1.18.135	CIV 11010224 PKID 517931 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 73A Y CALLE 74	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 330,673	
1274	1.5.6.1.18.135.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 330,673	1259
1275	1.5.6.1.18.136	CIV 10000039 PKID 518015 - AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 75 Y CALLE 75BIS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 347,206	
1276	1.5.6.1.18.136.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 347,206	1259
1277	1.5.6.1.18.137	CIV 10008104 PKID 91026552 - CARRERA 68C ENTRE CALLE 78 Y CALLE 78	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 652,435	
1278	1.5.6.1.18.137.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 652,435	1259
1279	1.5.6.1.18.138	CIV 10010119 PKID 2501944 - AV. BOYACA ENTRE CALLE 86A Y CALLE 81B	0.2 días	vie 1/09/23	vie 1/09/23	$ 1,494,236	
1280	1.5.6.1.18.138.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 1/09/23	vie 1/09/23	$ 1,494,236	1278FC+99 días
1281	1.5.6.1.18.139	CIV 10010140 PKID 509609 - AV. BOYACA ENTRE CALLE 81B Y CALLE 80 CR	0.2 días	vie 1/09/23	vie 1/09/23	$ 1,354,996	
1282	1.5.6.1.18.139.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 1/09/23	vie 1/09/23	$ 1,354,996	1280
1283	1.5.6.1.18.140	ITEM 71 / CIV 9003918 PKID 389984 - CARRERA 68A ENTRE CALLE 23B Y CALLE 24	2.1 días	mié 24/01/24	vie 26/01/24	$ 36,293,804	
1284	1.5.6.1.18.140.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 24/01/24	mié 24/01/24	$ 412,047	1282FC+121 días
1285	1.5.6.1.18.140.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 24/01/24	jue 25/01/24	$ 3,640,007	1284
1286	1.5.6.1.18.140.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.3 días	jue 25/01/24	jue 25/01/24	$ 1,497,377	1285
1287	1.5.6.1.18.140.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	jue 25/01/24	vie 26/01/24	$ 1,112,149	1286
1288	1.5.6.1.18.140.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA MD25	0.2 días	vie 26/01/24	vie 26/01/24	$ 29,632,224	1287
1289	1.5.6.1.18.141	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA A EJECUTAR (PTE POR DEFINIR)	7 días	vie 8/03/24	vie 15/03/24	$ 48,172,549	1288FC+37 días
1290	1.5.6.1.18.142	ACTIVIDADES ESPECIALES	15 días	sáb 30/03/24	mié 17/04/24	$ 170,000,000	1289FC+10 días
1291	*1.5.6.1.19*	*FIN DE INTERVENCIONES A ELEMENTOS DE REDES HUMEDASRENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA*	*0 días*	*mié 17/04/24*	*mié 17/04/24*	*$ 0*	*1289;1290*
1292	*1.5.6.1.20*	*INICIO DE INTERVENCIONES A ELEMENTOS DE REDES HUMEDASRENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA*	*0 días*	*mié 19/10/22*	*mié 19/10/22*	*$ 0*	450FC+9 días
1293	1.5.6.1.21	FRENTE DE OBRA No. 10 - RENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA	228.25 días	mié 19/10/22	lun 17/07/23	$ 162,542,052	
1294	1.5.6.1.21.1	CIV 9003658 - PKID 522043 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23C CZLsn	3.3 días	mié 19/10/22	sáb 22/10/22	$ 1,921,978	
1295	1.5.6.1.21.1.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	$ 2,546	1292
1296	1.5.6.1.21.1.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	$ 26,531	1295
1297	1.5.6.1.21.1.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	$ 13,342	1296
1298	1.5.6.1.21.1.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	$ 15,987	1297
1299	1.5.6.1.21.1.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 19/10/22	mié 19/10/22	$ 42,366	1298
1300	1.5.6.1.21.1.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 19/10/22	jue 20/10/22	$ 1,435,725	1299FC+0.05 días
1301	1.5.6.1.21.1.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 21/10/22	vie 21/10/22	$ 9,778	1300FC+2 días
1302	1.5.6.1.21.1.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 21/10/22	sáb 22/10/22	$ 375,703	1301
1303	1.5.6.1.21.2	CIV 10007207 - PKIF 522166 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 74A BIS Y CALLE 75 CZLsn	3.3 días	sáb 22/10/22	mié 26/10/22	$ 4,063,692	
1304	1.5.6.1.21.2.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	sáb 22/10/22	sáb 22/10/22	$ 5,491	1302
1305	1.5.6.1.21.2.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	sáb 22/10/22	sáb 22/10/22	$ 57,308	1304
1306	1.5.6.1.21.2.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	sáb 22/10/22	sáb 22/10/22	$ 33,639	1305
1307	1.5.6.1.21.2.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	sáb 22/10/22	lun 24/10/22	$ 40,310	1306
1308	1.5.6.1.21.2.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 24/10/22	lun 24/10/22	$ 84,732	1307
1309	1.5.6.1.21.2.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 24/10/22	lun 24/10/22	$ 2,871,450	1308FC+0.05 días
1310	1.5.6.1.21.2.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 24,624	1309FC+2 días
1311	1.5.6.1.21.2.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 946,138	1310
1312	1.5.6.1.21.3	CIV 10007387 - PKID 522186 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 73A Y CALLE 74 CZLsn	3.3 días	mié 26/10/22	sáb 29/10/22	$ 1,930,457	
1313	1.5.6.1.21.3.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 2,709	1311
1314	1.5.6.1.21.3.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 27,062	1313
1315	1.5.6.1.21.3.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 13,342	1314
1316	1.5.6.1.21.3.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$ 15,987	1315
1317	1.5.6.1.21.3.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 26/10/22	jue 27/10/22	$ 25,676	1316
1318	1.5.6.1.21.3.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 27/10/22	jue 27/10/22	$ 1,435,725	1317FC+0.05 días
1319	1.5.6.1.21.3.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	$ 10,399	1318FC+2 días
1320	1.5.6.1.21.3.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	$ 399,557	1319
1321	1.5.6.1.21.4	CIV 10007434 - PKIF 522197 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 73 Y CALLE 73A CZLsn	3.3 días	sáb 29/10/22	mié 2/11/22	$ 4,031,817	
1322	1.5.6.1.21.4.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	$ 4,043	1320
1323	1.5.6.1.21.4.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	sáb 29/10/22	sáb 29/10/22	$ 55,450	1322
1324	1.5.6.1.21.4.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	$ 40,883	1323
1325	1.5.6.1.21.4.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	$ 48,989	1324
1326	1.5.6.1.21.4.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	$ 128,380	1325
1327	1.5.6.1.21.4.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	$ 2,871,450	1326FC+0.05 días
1328	1.5.6.1.21.4.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 2/11/22	mié 2/11/22	$ 22,388	1327FC+2 días
1329	1.5.6.1.21.4.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 2/11/22	mié 2/11/22	$ 860,234	1328
1330	1.5.6.1.21.5	CIV 10007477 - PKIF 522208 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72B Y CALLE 73 CZLsn	3.2 días	mié 2/11/22	mar 8/11/22	$ 3,924,458	
1331	1.5.6.1.21.5.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 2/11/22	mié 2/11/22	$ 3,649	1329
1332	1.5.6.1.21.5.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 2/11/22	jue 3/11/22	$ 29,352	1331
1333	1.5.6.1.21.5.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 3/11/22	jue 3/11/22	$ 35,172	1332
1334	1.5.6.1.21.5.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 3/11/22	jue 3/11/22	$ 77,029	1333
1335	1.5.6.1.21.5.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 3/11/22	jue 3/11/22	$ 2,871,450	1334FC+0.05 días
1336	1.5.6.1.21.5.6	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 5/11/22	sáb 5/11/22	$ 23,027	1335FC+2 días
1337	1.5.6.1.21.5.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 5/11/22	mar 8/11/22	$ 884,779	1336
1338	1.5.6.1.21.6	CIV 10008150 - PKID 522337 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 68B Y CALLE 69 CZLsn	3.3 días	mar 8/11/22	jue 10/11/22	$ 7,025,061	
1339	1.5.6.1.21.6.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 12,635	1337
1340	1.5.6.1.21.6.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 54,655	1339
1341	1.5.6.1.21.6.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 71,378	1340
1342	1.5.6.1.21.6.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 85,531	1341
1343	1.5.6.1.21.6.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 213,112	1342
1344	1.5.6.1.21.6.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mar 8/11/22	mar 8/11/22	$ 5,742,900	1343FC+0.05 días
1345	1.5.6.1.21.6.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 10/11/22	jue 10/11/22	$ 21,430	1344FC+2 días
1346	1.5.6.1.21.6.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 10/11/22	jue 10/11/22	$ 823,420	1345
1347	1.5.6.1.21.7	CIV 10008212 - PKID 522354 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 66A Y CALLE 68B CZLsn	3.3 días	jue 10/11/22	mié 16/11/22	$ 3,948,832	
1348	1.5.6.1.21.7.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	jue 10/11/22	vie 11/11/22	$ 1,910	1346
1349	1.5.6.1.21.7.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 53,858	1348
1350	1.5.6.1.21.7.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 33,354	1349
1351	1.5.6.1.21.7.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 39,968	1350
1352	1.5.6.1.21.7.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 128,380	1351
1353	1.5.6.1.21.7.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 2,871,450	1352FC+0.05 días
1354	1.5.6.1.21.7.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 20,798	1353FC+2 días
1355	1.5.6.1.21.7.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 799,114	1354
1356	1.5.6.1.21.8	CIV 10008532 - PKID 522394 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 65B Y CALLE 66 CZLsn	3.3 días	mié 16/11/22	sáb 19/11/22	$ 2,276,231	
1357	1.5.6.1.21.8.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 986	1355
1358	1.5.6.1.21.8.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 33,217	1357
1359	1.5.6.1.21.8.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 15,724	1358
1360	1.5.6.1.21.8.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 16/11/22	mié 16/11/22	$ 18,842	1359
1361	1.5.6.1.21.8.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 16/11/22	jue 17/11/22	$ 42,793	1360
1362	1.5.6.1.21.8.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 17/11/22	jue 17/11/22	$ 1,435,725	1361FC+0.05 días
1363	1.5.6.1.21.8.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22	$ 18,489	1362FC+2 días
1364	1.5.6.1.21.8.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22	$ 710,455	1363
1365	1.5.6.1.21.9	CIV 10008594 - PKID 522419 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65A CZLsn	3.3 días	sáb 19/11/22	mié 23/11/22	$ 2,149,161	
1366	1.5.6.1.21.9.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22	$ 1,973	1364
1367	1.5.6.1.21.9.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22	$ 27,062	1366
1368	1.5.6.1.21.9.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	sáb 19/11/22	lun 21/11/22	$ 47,173	1367
1369	1.5.6.1.21.9.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 21/11/22	lun 21/11/22	$ 56,527	1368
1370	1.5.6.1.21.9.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 21/11/22	lun 21/11/22	$ 170,746	1369
1371	1.5.6.1.21.9.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 21/11/22	lun 21/11/22	$ 1,435,725	1370FC+0.05 días
1372	1.5.6.1.21.9.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22	$ 10,399	1371FC+2 días
1373	1.5.6.1.21.9.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22	$ 399,556	1372
1374	1.5.6.1.21.10	CIV 10009040 - PKID 522535 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 63D Y CALLE 63F CZLsn	3.3 días	mié 23/11/22	lun 28/11/22	$ 4,628,572	
1375	1.5.6.1.21.10.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22	$ 3,721	1373
1376	1.5.6.1.21.10.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22	$ 67,921	1375
1377	1.5.6.1.21.10.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22	$ 66,231	1376
1378	1.5.6.1.21.10.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 24/11/22	jue 24/11/22	$ 79,367	1377
1379	1.5.6.1.21.10.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 24/11/22	jue 24/11/22	$ 213,967	1378
1380	1.5.6.1.21.10.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 24/11/22	jue 24/11/22	$ 2,871,450	1379FC+0.05 días
1381	1.5.6.1.21.10.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 26/11/22	sáb 26/11/22	$ 39,020	1380FC+2 días
1382	1.5.6.1.21.10.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	$ 1,286,895	1381
1383	1.5.6.1.21.11	CIV 10009132 - PKID 522577 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 63A Y CALLE 63B CZLsn	3.3 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	$ 2,131,899	
1384	1.5.6.1.21.11.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 1,570	1382
1385	1.5.6.1.21.11.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 28,122	1384
1386	1.5.6.1.21.11.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 33,355	1385
1387	1.5.6.1.21.11.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 39,969	1386
1388	1.5.6.1.21.11.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 128,380	1387
1389	1.5.6.1.21.11.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 28/11/22	lun 28/11/22	$ 1,435,725	1388FC+0.05 días
1390	1.5.6.1.21.11.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 11,670	1389FC+2 días
1391	1.5.6.1.21.11.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 453,108	1390
1392	1.5.6.1.21.12	CIV 10009186 - PKID 522594 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 63BIS Y CALLE 63A CZLsn	3.3 días	mié 30/11/22	lun 5/12/22	$ 2,051,805	
1393	1.5.6.1.21.12.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 30/11/22	jue 1/12/22	$ 1,284	1391
1394	1.5.6.1.21.12.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 19,898	1393
1395	1.5.6.1.21.12.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 27,160	1394
1396	1.5.6.1.21.12.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 32,546	1395
1397	1.5.6.1.21.12.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 128,380	1396
1398	1.5.6.1.21.12.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22	$ 1,435,725	1397FC+0.05 días
1399	1.5.6.1.21.12.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 10,342	1398FC+2 días
1400	1.5.6.1.21.12.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 396,470	1399

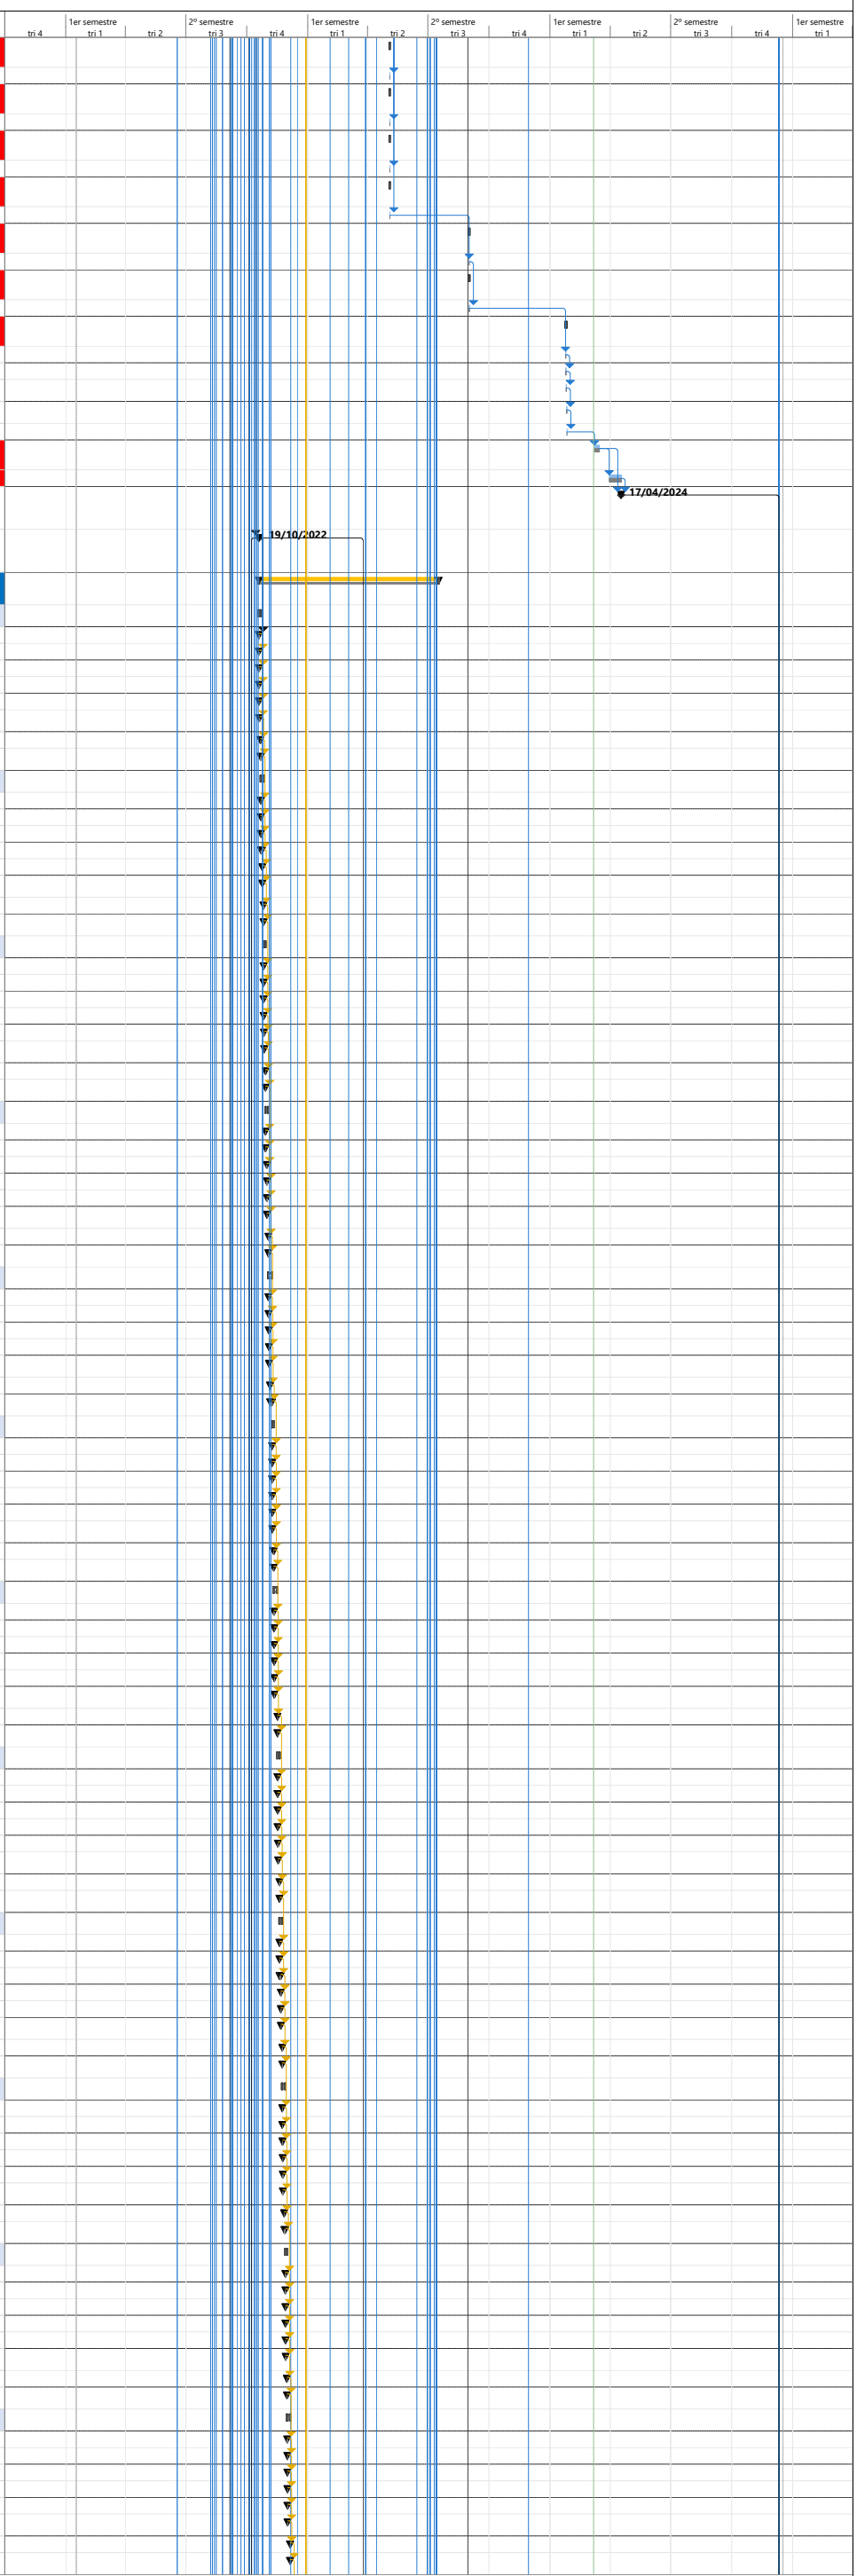

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1401	**1.5.6.1.21.13**	**CIV 9003518 - PKID 602343 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24B Y CALLE 24C CZLsn**	**3.3 días**	**lun 5/12/22**	**vie 9/12/22**	**$ 1,922,405**	
1402	1.5.6.1.21.13.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 2,546	1400
1403	1.5.6.1.21.13.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 26,531	1402
1404	1.5.6.1.21.13.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 13,342	1403
1405	1.5.6.1.21.13.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 5/12/22	lun 5/12/22	$ 15,987	1404
1406	1.5.6.1.21.13.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 5/12/22	mar 6/12/22	$ 42,793	1405
1407	1.5.6.1.21.13.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mar 6/12/22	mar 6/12/22	$ 1,435,725	1406FC+0.05 días
1408	1.5.6.1.21.13.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 9,778	1407FC+2 días
1409	1.5.6.1.21.13.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 375,703	1408
1410	**1.5.6.1.21.14**	**CIV 9003634 - PKID 602365 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 23C Y CALLE 23D CZLsn**	**3.3 días**	**vie 9/12/22**	**mar 13/12/22**	**$ 3,055,841**	
1411	1.5.6.1.21.14.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 7,299	1409
1412	1.5.6.1.21.14.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 81,133	1411
1413	1.5.6.1.21.14.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 99,113	1412
1414	1.5.6.1.21.14.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 118,763	1413
1415	1.5.6.1.21.14.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22	$ 84,732	1414
1416	1.5.6.1.21.14.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 10/12/22	sáb 10/12/22	$ 1,435,725	1415FC+0.05 días
1417	1.5.6.1.21.14.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 13/12/22	mar 13/12/22	$ 31,171	1416FC+2 días
1418	1.5.6.1.21.14.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 13/12/22	mar 13/12/22	$ 1,197,905	1417
1419	**1.5.6.1.21.15**	**CIV 9003463 - PKID 602789 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24C Y CALLE 25B CZLsn**	**3.3 días**	**mar 13/12/22**	**vie 16/12/22**	**$ 10,020,765**	
1420	1.5.6.1.21.15.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 13/12/22	mar 13/12/22	$ 18,455	1418
1421	1.5.6.1.21.15.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 13/12/22	mar 13/12/22	$ 73,225	1420
1422	1.5.6.1.21.15.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 13/12/22	mié 14/12/22	$ 80,621	1421
1423	1.5.6.1.21.15.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	$ 96,608	1422
1424	1.5.6.1.21.15.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	$ 254,195	1423
1425	1.5.6.1.21.15.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	$ 8,614,350	1424FC+0.05 días
1426	1.5.6.1.21.15.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 22,406	1425FC+2 días
1427	1.5.6.1.21.15.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 860,905	1426
1428	**1.5.6.1.21.16**	**CIV 10010119 - PKID 2501945 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 81B Y CALLE 86A CZRsn**	**3.3 días**	**vie 16/12/22**	**mar 20/12/22**	**$ 2,897,126**	
1429	1.5.6.1.21.16.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 11,234	1427
1430	1.5.6.1.21.16.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 40,858	1429
1431	1.5.6.1.21.16.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	$ 59,371	1430
1432	1.5.6.1.21.16.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 16/12/22	sáb 17/12/22	$ 71,143	1431
1433	1.5.6.1.21.16.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 17/12/22	sáb 17/12/22	$ 68,042	1432
1434	1.5.6.1.21.16.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 17/12/22	sáb 17/12/22	$ 1,435,725	1433FC+0.05 días
1435	1.5.6.1.21.16.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 20/12/22	mar 20/12/22	$ 30,783	1434FC+2 días
1436	1.5.6.1.21.16.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 20/12/22	mar 20/12/22	$ 1,179,970	1435
1437	**1.5.6.1.21.17**	**CIV 10010140 - PKID 2501946 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 80 Y CALLE 81B CZRsn**	**3.3 días**	**mar 20/12/22**	**vie 23/12/22**	**$ 1,982,987**	
1438	1.5.6.1.21.17.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	$ 2,815	1436
1439	1.5.6.1.21.17.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	$ 27,593	1438
1440	1.5.6.1.21.17.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	$ 18,011	1439
1441	1.5.6.1.21.17.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	$ 21,582	1440
1442	1.5.6.1.21.17.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	$ 42,366	1441
1443	1.5.6.1.21.17.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 21/12/22	mié 21/12/22	$ 1,435,725	1442FC+0.05 días
1444	1.5.6.1.21.17.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	$ 11,031	1443FC+2 días
1445	1.5.6.1.21.17.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	$ 423,864	1444
1446	**1.5.6.1.21.18**	**CIV 10011507 - PKID 24122896 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 48A Y CALLE 49 Y CZRsn**	**1.25 días**	**vie 23/12/22**	**lun 26/12/22**	**$ 2,109,914**	
1447	1.5.6.1.21.18.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22	$ 2,815	1445
1448	1.5.6.1.21.18.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	sáb 24/12/22	sáb 24/12/22	$ 26,531	1447
1449	1.5.6.1.21.18.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	sáb 24/12/22	sáb 24/12/22	$ 40,312	1448
1450	1.5.6.1.21.18.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	sáb 24/12/22	sáb 24/12/22	$ 48,304	1449
1451	1.5.6.1.21.18.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 24/12/22	lun 26/12/22	$ 170,746	1450
1452	1.5.6.1.21.18.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 1,435,725	1451
1453	1.5.6.1.21.18.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 9,778	1452
1454	1.5.6.1.21.18.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 375,703	1453
1455	**1.5.6.1.21.19**	**CIV 9004716 - PKID 91024699 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23 CZLsn**	**3.3 días**	**lun 26/12/22**	**jue 29/12/22**	**$ 3,977,977**	
1456	1.5.6.1.21.19.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 5,151	1454
1457	1.5.6.1.21.19.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 55,186	1456
1458	1.5.6.1.21.19.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 41,717	1457
1459	1.5.6.1.21.19.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 26/12/22	lun 26/12/22	$ 49,990	1458
1460	1.5.6.1.21.19.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 27/12/22	mar 27/12/22	$ 84,732	1459
1461	1.5.6.1.21.19.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mar 27/12/22	mar 27/12/22	$ 2,871,450	1460FC+0.05 días
1462	1.5.6.1.21.19.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 22,061	1461FC+2 días
1463	1.5.6.1.21.19.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 847,690	1462
1464	**1.5.6.1.21.20**	**CIV 11014793 - PKID 91027130 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 86A Y CALLE 86A CZLsn**	**3.3 días**	**jue 29/12/22**	**lun 2/01/23**	**$ 1,970,886**	
1465	1.5.6.1.21.20.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 2,815	1463
1466	1.5.6.1.21.20.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 27,593	1465
1467	1.5.6.1.21.20.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 16,010	1466
1468	1.5.6.1.21.20.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 19,185	1467
1469	1.5.6.1.21.20.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 29/12/22	vie 30/12/22	$ 34,663	1468
1470	1.5.6.1.21.20.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	$ 1,435,725	1469FC+0.05 días
1471	1.5.6.1.21.20.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 11,031	1470FC+2 días
1472	1.5.6.1.21.20.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 423,864	1471
1473	**1.5.6.1.21.21**	**CIV 9005047 - PKID 91033862 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 CZLsn**	**1.05 días**	**lun 2/01/23**	**mar 3/01/23**	**$ 746,469**	
1474	1.5.6.1.21.21.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 4,439	1472
1475	1.5.6.1.21.21.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 27,593	1474
1476	1.5.6.1.21.21.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 2/01/23	mar 3/01/23	$ 88,628	1475
1477	1.5.6.1.21.21.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 106,202	1476
1478	1.5.6.1.21.21.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 84,731	1477
1479	1.5.6.1.21.21.6	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 11,031	1478
1480	1.5.6.1.21.21.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 423,845	1479
1481	**1.5.6.1.21.22**	**CIV 9005076 - PKID 91035076 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 CZLsn**	**1.05 días**	**mar 3/01/23**	**mié 4/01/23**	**$ 3,115,148**	
1482	1.5.6.1.21.22.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 5,953	1480
1483	1.5.6.1.21.22.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 49,555	1482
1484	1.5.6.1.21.22.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 3/01/23	mié 4/01/23	$ 59,383	1483
1485	1.5.6.1.21.22.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	$ 128,807	1484
1486	1.5.6.1.21.22.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	$ 2,871,450	1485FC+0.05 días
1487	**1.5.6.1.21.23**	**CIV 9004950 - PKID 91035078 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 23D Y CALLE 24 CZLsn**	**3.4 días**	**mié 4/01/23**	**mar 10/01/23**	**$ 1,921,969**	
1488	1.5.6.1.21.23.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	$ 2,538	1486
1489	1.5.6.1.21.23.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	$ 26,531	1488
1490	1.5.6.1.21.23.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 4/01/23	mié 4/01/23	$ 13,342	1489
1491	1.5.6.1.21.23.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 5/01/23	jue 5/01/23	$ 15,987	1490
1492	1.5.6.1.21.23.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 5/01/23	jue 5/01/23	$ 42,366	1491
1493	1.5.6.1.21.23.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	jue 5/01/23	jue 5/01/23	$ 1,435,725	1492FC+0.05 días
1494	1.5.6.1.21.23.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 7/01/23	sáb 7/01/23	$ 9,778	1493FC+2 días
1495	1.5.6.1.21.23.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 7/01/23	mar 10/01/23	$ 375,702	1494
1496	**1.5.6.1.21.24**	**CIV 9005075 - PKID 91035088 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24B CZLsn**	**3.4 días**	**mar 10/01/23**	**vie 13/01/23**	**$ 5,378,765**	
1497	1.5.6.1.21.24.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 10/01/23	mar 10/01/23	$ 7,937	1495
1498	1.5.6.1.21.24.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 10/01/23	mar 10/01/23	$ 70,041	1497
1499	1.5.6.1.21.24.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 10/01/23	mar 10/01/23	$ 46,696	1498
1500	1.5.6.1.21.24.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 10/01/23	mar 10/01/23	$ 55,956	1499
1501	1.5.6.1.21.24.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 10/01/23	mar 10/01/23	$ 144,214	1500
1502	1.5.6.1.21.24.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mar 10/01/23	mié 11/01/23	$ 4,307,175	1501FC+0.05 días
1503	1.5.6.1.21.24.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 12/01/23	jue 12/01/23	$ 18,942	1502FC+2 días
1504	1.5.6.1.21.24.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 12/01/23	vie 13/01/23	$ 727,804	1503
1505	**1.5.6.1.21.25**	**CIV 9005076 - PKID 91035089 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 CZLsn**	**0.35 días**	**vie 13/01/23**	**vie 13/01/23**	**$ 824,022**	
1506	1.5.6.1.21.25.1	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 53,062	1504
1507	1.5.6.1.21.25.2	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 19,556	1506
1508	1.5.6.1.21.25.3	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 751,404	1507
1509	**1.5.6.1.21.26**	**CIV 10007678 - PKID 91060016 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 71A Y CALLE 72 CZLsn**	**3.4 días**	**vie 13/01/23**	**mar 17/01/23**	**$ 1,925,234**	
1510	1.5.6.1.21.26.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 834	1508
1511	1.5.6.1.21.26.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 26,638	1510
1512	1.5.6.1.21.26.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 13,342	1511
1513	1.5.6.1.21.26.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 13/01/23	vie 13/01/23	$ 15,987	1512
1514	1.5.6.1.21.26.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 13/01/23	sáb 14/01/23	$ 42,366	1513
1515	1.5.6.1.21.26.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	sáb 14/01/23	sáb 14/01/23	$ 1,435,725	1514FC+0.05 días
1516	1.5.6.1.21.26.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	$ 9,901	1515FC+2 días
1517	1.5.6.1.21.26.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	$ 380,441	1516
1518	**1.5.6.1.21.27**	**CIV 10011509 - PKID 24122888 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 49A Y CALLE 50 CZRsn**	**3.3 días**	**mar 17/01/23**	**vie 20/01/23**	**$ 2,093,047**	
1519	1.5.6.1.21.27.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	$ 2,817	1517
1520	1.5.6.1.21.27.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 18/01/23	mié 18/01/23	$ 28,653	1519
1521	1.5.6.1.21.27.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 18/01/23	mié 18/01/23	$ 25,254	1520
1522	1.5.6.1.21.27.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 18/01/23	mié 18/01/23	$ 30,262	1521
1523	1.5.6.1.21.27.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 18/01/23	mié 18/01/23	$ 86,014	1522
1524	1.5.6.1.21.27.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 18/01/23	mié 18/01/23	$ 1,435,725	1523FC+0.05 días
1525	1.5.6.1.21.27.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 20/01/23	vie 20/01/23	$ 12,333	1524FC+2 días
1526	1.5.6.1.21.27.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 20/01/23	vie 20/01/23	$ 471,989	1525
1527	**1.5.6.1.21.28**	**CIV 10011506 - PKID 24122903 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 52B Y CALLE 53 CZLsn**	**3.3 días**	**sáb 13/05/23**	**mié 17/05/23**	**$ 2,083,369**	
1528	1.5.6.1.21.28.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	sáb 13/05/23	sáb 13/05/23	$ 3,106	1526FC+4 mss
1529	1.5.6.1.21.28.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	sáb 13/05/23	sáb 13/05/23	$ 27,062	1528
1530	1.5.6.1.21.28.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	sáb 13/05/23	lun 15/05/23	$ 55,273	1529
1531	1.5.6.1.21.28.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	$ 66,233	1530
1532	1.5.6.1.21.28.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	$ 86,014	1531
1533	1.5.6.1.21.28.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	$ 1,435,725	1532FC+0.05 días
1534	1.5.6.1.21.28.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 10,399	1533FC+2 días
1535	1.5.6.1.21.28.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 399,557	1534
1536	**1.5.6.1.21.29**	**CIV 10009360 - PKID 522644 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55 CZRsn**	**3.3 días**	**mié 17/05/23**	**mar 23/05/23**	**$ 1,991,538**	
1537	1.5.6.1.21.29.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 3,106	1535


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1538	1.5.6.1.21.29.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 27,062	1537
1539	1.5.6.1.21.29.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	$ 33,355	1538
1540	1.5.6.1.21.29.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 39,969	1539
1541	1.5.6.1.21.29.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 42,366	1540
1542	1.5.6.1.21.29.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 18/05/23	jue 18/05/23	$ 1,435,725	1541FC+0.05 días
1543	1.5.6.1.21.29.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 20/05/23	sáb 20/05/23	$ 10,399	1542FC+2 días
1544	1.5.6.1.21.29.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 20/05/23	mar 23/05/23	$ 399,556	1543
1545	**1.5.6.1.21.30**	**CIV 10009018 - PKID 522521 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 63F Y CALLE 64 CZLsn**	**3.3 días**	**mar 23/05/23**	**jue 25/05/23**	**$ 2,099,429**	
1546	1.5.6.1.21.30.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 3,409	1544
1547	1.5.6.1.21.30.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 27,327	1546
1548	1.5.6.1.21.30.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 56,704	1547
1549	1.5.6.1.21.30.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 67,946	1548
1550	1.5.6.1.21.30.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 86,014	1549
1551	1.5.6.1.21.30.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	$ 1,435,725	1550FC+0.05 días
1552	1.5.6.1.21.30.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 10,712	1551FC+2 días
1553	1.5.6.1.21.30.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 411,592	1552
1554	**1.5.6.1.21.31**	**CIV 10008594 - PKID 522417 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 65 Y CALLE 65A CZRsn**	**3.3 días**	**jue 25/05/23**	**mar 30/05/23**	**$ 4,383,033**	
1555	1.5.6.1.21.31.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23	$ 5,634	1553
1556	1.5.6.1.21.31.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	$ 79,860	1555
1557	1.5.6.1.21.31.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	$ 78,144	1556
1558	1.5.6.1.21.31.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	$ 93,640	1557
1559	1.5.6.1.21.31.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	$ 84,732	1558
1560	1.5.6.1.21.31.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	$ 2,871,450	1559FC+0.05 días
1561	1.5.6.1.21.31.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 29,667	1560FC+2 días
1562	1.5.6.1.21.31.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 1,139,906	1561
1563	**1.5.6.1.21.32**	**CIV 10011883 - PKID 522248 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CALLE 72 CZLsn**	**3.3 días**	**mar 30/05/23**	**vie 2/06/23**	**$ 4,319,814**	
1564	1.5.6.1.21.32.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 5,634	1562
1565	1.5.6.1.21.32.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 44,573	1564
1566	1.5.6.1.21.32.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 24,778	1565
1567	1.5.6.1.21.32.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 30/05/23	mar 30/05/23	$ 29,692	1566
1568	1.5.6.1.21.32.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 30/05/23	mié 31/05/23	$ 84,732	1567
1569	1.5.6.1.21.32.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 31/05/23	mié 31/05/23	$ 2,871,450	1568FC+0.05 días
1570	1.5.6.1.21.32.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 31,789	1569FC+2 días
1571	1.5.6.1.21.32.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 1,227,166	1570
1572	**1.5.6.1.21.33**	**CIV 10009437 - PKID 522680 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 53 Y CALLE 54BIS CZLsn**	**1.25 días**	**vie 2/06/23**	**sáb 3/06/23**	**$ 1,891,348**	
1573	1.5.6.1.21.33.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.1 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 5,357	1571
1574	1.5.6.1.21.33.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 23,347	1573
1575	1.5.6.1.21.33.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 55,273	1574
1576	1.5.6.1.21.33.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 79,936	1575
1577	1.5.6.1.21.33.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 42,793	1576
1578	1.5.6.1.21.33.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 3/06/23	sáb 3/06/23	$ 1,435,725	1577
1579	1.5.6.1.21.33.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 3/06/23	sáb 3/06/23	$ 6,316	1578
1580	1.5.6.1.21.33.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 3/06/23	sáb 3/06/23	$ 242,601	1579
1581	**1.5.6.1.21.34**	**CIV 10008458 PKID 522377 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66 HASTA CALLE 66A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.65 días**	**sáb 3/06/23**	**mar 6/06/23**	**$ 2,571,209**	
1582	1.5.6.1.21.34.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	sáb 3/06/23	lun 5/06/23	$ 2,278	1580
1583	1.5.6.1.21.34.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 55,185	1582
1584	1.5.6.1.21.34.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 36,212	1583
1585	1.5.6.1.21.34.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 43,396	1584
1586	1.5.6.1.21.34.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 128,380	1585
1587	1.5.6.1.21.34.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	lun 5/06/23	mar 6/06/23	$ 1,435,725	1586
1588	1.5.6.1.21.34.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 6/06/23	mar 6/06/23	$ 22,069	1587
1589	1.5.6.1.21.34.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 6/06/23	mar 6/06/23	$ 847,964	1588
1590	**1.5.6.1.21.35**	**CIV 10007526 PKID 522224 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.65 días**	**mar 6/06/23**	**mié 7/06/23**	**$ 4,032,252**	
1591	1.5.6.1.21.35.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 6/06/23	mar 6/06/23	$ 5,348	1589
1592	1.5.6.1.21.35.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 6/06/23	mar 6/06/23	$ 56,776	1591
1593	1.5.6.1.21.35.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23	$ 31,209	1592
1594	1.5.6.1.21.35.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 37,400	1593
1595	1.5.6.1.21.35.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 84,732	1594
1596	1.5.6.1.21.35.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 2,871,450	1595
1597	1.5.6.1.21.35.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 23,979	1596
1598	1.5.6.1.21.35.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 921,358	1597
1599	**1.5.6.1.21.36**	**CIV 10007085 PKID 522149 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.65 días**	**mié 7/06/23**	**vie 9/06/23**	**$ 5,592,366**	
1600	1.5.6.1.21.36.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 7/06/23	jue 8/06/23	$ 8,178	1598
1601	1.5.6.1.21.36.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 56,512	1600
1602	1.5.6.1.21.36.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 75,285	1601
1603	1.5.6.1.21.36.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 83,364	1602
1604	1.5.6.1.21.36.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 128,380	1603
1605	1.5.6.1.21.36.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	jue 8/06/23	vie 9/06/23	$ 4,307,175	1604
1606	1.5.6.1.21.36.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 23,678	1605
1607	1.5.6.1.21.36.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 909,794	1606
1608	**1.5.6.1.21.37**	**CIV 10011507 PKID 24122899 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 48 HASTA CALLE 49 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.65 días**	**vie 9/06/23**	**mar 13/06/23**	**$ 2,174,602**	
1609	1.5.6.1.21.37.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 3,106	1607
1610	1.5.6.1.21.37.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 28,920	1609
1611	1.5.6.1.21.37.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 53,367	1610
1612	1.5.6.1.21.37.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 9/06/23	sáb 10/06/23	$ 63,950	1611
1613	1.5.6.1.21.37.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	$ 86,014	1612
1614	1.5.6.1.21.37.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	$ 1,435,725	1613
1615	1.5.6.1.21.37.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	$ 12,652	1614
1616	1.5.6.1.21.37.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 490,868	1615
1617	**1.5.6.1.21.38**	**CIV 10008844 PKID 522473 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64c / CALZADA Norte - Sur Lenta**	**1.65 días**	**mar 13/06/23**	**mié 14/06/23**	**$ 2,224,044**	
1618	1.5.6.1.21.38.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 2,815	1616
1619	1.5.6.1.21.38.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 30,511	1618
1620	1.5.6.1.21.38.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 44,315	1619
1621	1.5.6.1.21.38.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	$ 53,101	1620
1622	1.5.6.1.21.38.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 14/06/23	mié 14/06/23	$ 86,014	1621
1623	1.5.6.1.21.38.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mié 14/06/23	mié 14/06/23	$ 1,435,725	1622
1624	1.5.6.1.21.38.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 14/06/23	mié 14/06/23	$ 14,618	1623
1625	1.5.6.1.21.38.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 14/06/23	mié 14/06/23	$ 556,945	1624
1626	**1.5.6.1.21.39**	**CIV 11012201 - PKID 516204 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 59A Y CARRERA 58D**	**1.75 días**	**mié 14/06/23**	**vie 16/06/23**	**$ 1,087,407**	
1627	1.5.6.1.21.39.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 14/06/23	jue 15/06/23	$ 2,542	1625
1628	1.5.6.1.21.39.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 55,186	1627
1629	1.5.6.1.21.39.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 13,492	1628
1630	1.5.6.1.21.39.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 16,166	1629
1631	1.5.6.1.21.39.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 128,380	1630
1632	1.5.6.1.21.39.6	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 22,063	1631
1633	1.5.6.1.21.39.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.5 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	$ 849,578	1632
1634	**1.5.6.1.21.40**	**CIV 11007601 - PKID 516207 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58A Y CARRERA 58**	**1.75 días**	**vie 16/06/23**	**mar 20/06/23**	**$ 1,973,704**	
1635	1.5.6.1.21.40.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 2,542	1633
1636	1.5.6.1.21.40.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 27,593	1635
1637	1.5.6.1.21.40.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 13,492	1636
1638	1.5.6.1.21.40.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 16/06/23	sáb 17/06/23	$ 16,166	1637
1639	1.5.6.1.21.40.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 17/06/23	sáb 17/06/23	$ 42,366	1638
1640	1.5.6.1.21.40.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	sáb 17/06/23	sáb 17/06/23	$ 1,435,725	1639
1641	1.5.6.1.21.40.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 17/06/23	sáb 17/06/23	$ 11,031	1640
1642	1.5.6.1.21.40.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 424,789	1641
1643	**1.5.6.1.21.41**	**CIV 11014180 - PKID 24123200 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58D Y CARRERA 58A**	**1.4 días**	**mar 20/06/23**	**mié 21/06/23**	**$ 1,540,344**	
1644	1.5.6.1.21.41.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 2,546	1642
1645	1.5.6.1.21.41.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 27,160	1644
1646	1.5.6.1.21.41.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 32,546	1645
1647	1.5.6.1.21.41.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mar 20/06/23	mié 21/06/23	$ 42,366	1646
1648	1.5.6.1.21.41.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 21/06/23	mié 21/06/23	$ 1,435,726	1647
1649	**1.5.6.1.21.42**	**ITEM 38 - CIV 11008253 - PKID 516171 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 52A Y CARRERA 50**	**1.75 días**	**mié 21/06/23**	**jue 22/06/23**	**$ 2,063,411**	
1650	1.5.6.1.21.42.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 21/06/23	mié 21/06/23	$ 2,542	1648
1651	1.5.6.1.21.42.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 21/06/23	mié 21/06/23	$ 27,593	1650
1652	1.5.6.1.21.42.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23	$ 35,027	1651
1653	1.5.6.1.21.42.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 41,973	1652
1654	1.5.6.1.21.42.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 84,731	1653
1655	1.5.6.1.21.42.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 1,435,725	1654
1656	1.5.6.1.21.42.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 11,031	1655
1657	1.5.6.1.21.42.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 424,789	1656
1658	**1.5.6.1.21.43**	**ITEM 39 - CIV 11008304 - PKID 516176 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 49**	**1.75 días**	**jue 22/06/23**	**sáb 24/06/23**	**$ 3,985,890**	
1659	1.5.6.1.21.43.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	$ 5,357	1657
1660	1.5.6.1.21.43.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 55,186	1659
1661	1.5.6.1.21.43.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 43,780	1660
1662	1.5.6.1.21.43.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	$ 52,463	1661
1663	1.5.6.1.21.43.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 23/06/23	sáb 24/06/23	$ 86,014	1662

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1664	1.5.6.1.21.43.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	$ 2,871,450	1663
1665	1.5.6.1.21.43.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	$ 22,062	1664
1666	1.5.6.1.21.43.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23	$ 849,578	1665
1667	**1.5.6.1.21.44**	**ITEM 40 - CIV 11008378 - PKID 516181 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 49 Y CARRERA 47**	**1.75 días**	**sáb 24/06/23**	**mar 27/06/23**	**$ 4,092,725**	
1668	1.5.6.1.21.44.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	$ 5,084	1666
1669	1.5.6.1.21.44.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23	$ 27,593	1668
1670	1.5.6.1.21.44.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23	$ 70,054	1669
1671	1.5.6.1.21.44.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23	$ 83,946	1670
1672	1.5.6.1.21.44.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23	$ 127,097	1671
1673	1.5.6.1.21.44.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 2,871,450	1672
1674	1.5.6.1.21.44.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 22,996	1673
1675	1.5.6.1.21.44.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 884,505	1674
1676	**1.5.6.1.21.45**	**ITEM 43 - CIV 11008531 - PKID 516215 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 45 (AUTOPISTA NORTE)**	**1.4 días**	**mar 27/06/23**	**mié 28/06/23**	**$ 3,145,050**	
1677	1.5.6.1.21.45.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 5,084	1675
1678	1.5.6.1.21.45.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 27/06/23	mié 28/06/23	$ 64,331	1677
1679	1.5.6.1.21.45.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 77,088	1678
1680	1.5.6.1.21.45.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 127,097	1679
1681	1.5.6.1.21.45.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 2,871,450	1680
1682	**1.5.6.1.21.46**	**ITEM 41 - CIV 11008427 - PKID 516191 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 47 Y CARRERA 46A**	**1.65 días**	**mié 28/06/23**	**vie 30/06/23**	**$ 2,034,874**	
1683	1.5.6.1.21.46.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 28/06/23	jue 29/06/23	$ 2,542	1681
1684	1.5.6.1.21.46.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	$ 35,027	1683
1685	1.5.6.1.21.46.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	$ 41,973	1684
1686	1.5.6.1.21.46.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	$ 84,731	1685
1687	1.5.6.1.21.46.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23	$ 1,435,725	1686
1688	1.5.6.1.21.46.6	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 11,031	1687
1689	1.5.6.1.21.46.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 423,845	1688
1690	**1.5.6.1.21.47**	**ITEM XX - CIV 11011895 - PKID 518368 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 57**	**1.75 días**	**vie 30/06/23**	**mar 4/07/23**	**$ 2,036,222**	
1691	1.5.6.1.21.47.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 2,542	1689
1692	1.5.6.1.21.47.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 28,654	1691
1693	1.5.6.1.21.47.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 18,526	1692
1694	1.5.6.1.21.47.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 30/06/23	sáb 1/07/23	$ 22,200	1693
1695	1.5.6.1.21.47.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 42,366	1694
1696	1.5.6.1.21.47.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	$ 1,435,725	1695
1697	1.5.6.1.21.47.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 12,333	1696
1698	1.5.6.1.21.47.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 473,876	1697
1699	**1.5.6.1.21.48**	**ITEM 31 - CIV 11012221 - PKID 516186 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 54D Y CARRERA 54C**	**1.4 días**	**mar 4/07/23**	**mié 5/07/23**	**$ 1,553,961**	
1700	1.5.6.1.21.48.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 2,546	1698
1701	1.5.6.1.21.48.2	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 33,355	1700
1702	1.5.6.1.21.48.3	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23	$ 39,969	1701
1703	1.5.6.1.21.48.4	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	$ 42,366	1702
1704	1.5.6.1.21.48.5	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	$ 1,435,725	1703
1705	**1.5.6.1.21.49**	**ITEM - 98 / CIV 9009714 PKID 24120123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22D / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**1.75 días**	**mié 5/07/23**	**vie 7/07/23**	**$ 2,183,365**	
1706	1.5.6.1.21.49.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	$ 2,542	1704
1707	1.5.6.1.21.49.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mié 5/07/23	jue 6/07/23	$ 30,670	1706
1708	1.5.6.1.21.49.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 18,526	1707
1709	1.5.6.1.21.49.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 22,200	1708
1710	1.5.6.1.21.49.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 84,732	1709
1711	1.5.6.1.21.49.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 1,435,725	1710
1712	1.5.6.1.21.49.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 14,939	1711
1713	1.5.6.1.21.49.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	jue 6/07/23	vie 7/07/23	$ 574,031	1712
1714	**1.5.6.1.21.50**	**ITEM - 31 / CIV 9004717 PKID 522045 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Paralela Carlos Lleras**	**1.65 días**	**vie 7/07/23**	**sáb 8/07/23**	**$ 2,009,540**	
1715	1.5.6.1.21.50.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 2,542	1713
1716	1.5.6.1.21.50.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 28,123	1715
1717	1.5.6.1.21.50.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 18,526	1716
1718	1.5.6.1.21.50.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 22,200	1717
1719	1.5.6.1.21.50.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23	$ 42,366	1718
1720	1.5.6.1.21.50.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 8/07/23	sáb 8/07/23	$ 1,435,725	1719
1721	1.5.6.1.21.50.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	sáb 8/07/23	sáb 8/07/23	$ 11,670	1720
1722	1.5.6.1.21.50.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	sáb 8/07/23	sáb 8/07/23	$ 448,388	1721
1723	**1.5.6.1.21.51**	**ITEM - 155 / CIV 10008900 PKID 522495 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64C HASTA CALLE 64B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA**	**1.65 días**	**sáb 8/07/23**	**mar 11/07/23**	**$ 5,665,776**	
1724	1.5.6.1.21.51.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	sáb 8/07/23	lun 10/07/23	$ 7,626	1722
1725	1.5.6.1.21.51.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 59,538	1724
1726	1.5.6.1.21.51.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 26,943	1725
1727	1.5.6.1.21.51.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 32,289	1726
1728	1.5.6.1.21.51.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23	$ 127,098	1727
1729	1.5.6.1.21.51.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 4,307,175	1728
1730	1.5.6.1.21.51.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 28,031	1729
1731	1.5.6.1.21.51.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 1,077,076	1730
1732	**1.5.6.1.21.52**	**ITEM - 135 / CIV 10009040 PKID 522531 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63F HASTA CALLE 63D / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA**	**1.75 días**	**mar 11/07/23**	**mié 12/07/23**	**$ 1,940,173**	
1733	1.5.6.1.21.52.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 2,542	1731
1734	1.5.6.1.21.52.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 19,634	1733
1735	1.5.6.1.21.52.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	$ 8,981	1734
1736	1.5.6.1.21.52.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 10,763	1735
1737	1.5.6.1.21.52.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 128,381	1736
1738	1.5.6.1.21.52.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 1,435,725	1737
1739	1.5.6.1.21.52.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 8,476	1738
1740	1.5.6.1.21.52.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 325,671	1739
1741	**1.5.6.1.21.53**	**ITEM - 189 / CIV 10009084 PKID 522548 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63D HASTA CALLE 63B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA**	**1.75 días**	**mar 11/07/23**	**mié 12/07/23**	**$ 1,912,388**	
1742	1.5.6.1.21.53.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 2,542	1731
1743	1.5.6.1.21.53.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 26,531	1742;1733
1744	1.5.6.1.21.53.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	$ 8,981	1743
1745	1.5.6.1.21.53.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 10,763	1744;1735
1746	1.5.6.1.21.53.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 42,366	1745
1747	1.5.6.1.21.53.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.3 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 1,435,725	1746
1748	1.5.6.1.21.53.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 9,778	1747;1738
1749	1.5.6.1.21.53.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 375,702	1748
1750	**1.5.6.1.21.54**	**ITEM - 116 / CIV 10009132 PKID 522573 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63B HASTA CALLE 63 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA**	**1.65 días**	**mié 12/07/23**	**vie 14/07/23**	**$ 1,979,498**	
1751	1.5.6.1.21.54.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	$ 2,542	1749
1752	1.5.6.1.21.54.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 27,062	1751
1753	1.5.6.1.21.54.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 8,981	1752
1754	1.5.6.1.21.54.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 10,763	1753
1755	1.5.6.1.21.54.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	jue 13/07/23	vie 14/07/23	$ 84,731	1754
1756	1.5.6.1.21.54.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 1,435,725	1755
1757	1.5.6.1.21.54.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 10,392	1756
1758	1.5.6.1.21.54.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 399,302	1757
1759	**1.5.6.1.21.55**	**ITEM - 18 / CIV 9004951 PKID 24122812 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante NE Conectante**	**1.65 días**	**vie 14/07/23**	**lun 17/07/23**	**$ 5,948,202**	
1760	1.5.6.1.21.55.1	3.022 - REPLEANTEO GENERAL	0.5 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 8,187	1758
1761	1.5.6.1.21.55.2	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.1 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 82,777	1760
1762	1.5.6.1.21.55.3	3.021 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 14/07/23	sáb 15/07/23	$ 51,189	1761
1763	1.5.6.1.21.55.4	5.002 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	0.2 días	sáb 15/07/23	sáb 15/07/23	$ 61,338	1762
1764	1.5.6.1.21.55.5	5,010 - RENIVELACIÓN DE POZOS EN MAMPOSTERÍA	0.2 días	sáb 15/07/23	sáb 15/07/23	$ 127,098	1763
1765	1.5.6.1.21.55.6	5,008 - PLACA CUBIERTA D = 1.70 M PARA POZO DE INSPECCIÓN	0.2 días	sáb 15/07/23	lun 17/07/23	$ 4,307,175	1764
1766	1.5.6.1.21.55.7	3.009 - RIEGO DE LIGA	0.05 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	$ 33,240	1765
1767	1.5.6.1.21.55.8	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.2 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	$ 1,277,198	1766
1768	*1.5.6.1.22*	*FIN DE INTERVENCIONES A ELEMENTOS DE REDES HUMEDASRENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA*	*0 días*	*lun 17/07/23*	*lun 17/07/23*	*$ 0*	*1767*
1769	*1.5.6.1.23*	*APROBACIÓN DE PMT SOBRE VIA Y ANDÉN , JUNTO A MODELACIONES DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL PARA INICIO DE FRENTE DE RECALCE DE SARDINELES*	*0 días*	*jue 24/11/22*	*jue 24/11/22*	*$ 0*	*1292CC+30.5 días*
1770	*1.5.6.1.24*	*INICIO DE INTERVENCIONES A SARDINELES (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA*	*0 días*	*jue 30/03/23*	*jue 30/03/23*	*$ 0*	*1292FC+5.8 mss*
1771	**1.5.6.1.25**	**FRENTE DE OBRA No. 11 - RECALCE DE SARDINELES (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA**	**102.28 días**	**mar 30/05/23**	**jue 28/09/23**	**$ 280,023,023**	
1772	**1.5.6.1.25.1**	**ITEM 69 CIV - 9003744 - PKID 602387 AV. BOYACÁ DESDE CL 21 HASTA CL 22**	**10.2 días**	**mar 30/05/23**	**sáb 10/06/23**	**$ 24,459,473**	
1773	1.5.6.1.25.1.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	2.6 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23	$ 2,676,564	1770FC+50 días;1769
1774	1.5.6.1.25.1.2	3.015 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2.6 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23	$ 165,082	1773
1775	1.5.6.1.25.1.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	5 días	lun 5/06/23	sáb 10/06/23	$ 21,617,827	1774
1776	**1.5.6.1.25.2**	**ITEM 46 CIV - 9005047 - PKID 91033862 AV. BOYACÁ DESDE CL 21 HASTA CL 22**	**0.55 días**	**sáb 10/06/23**	**sáb 10/06/23**	**$ 3,435,039**	

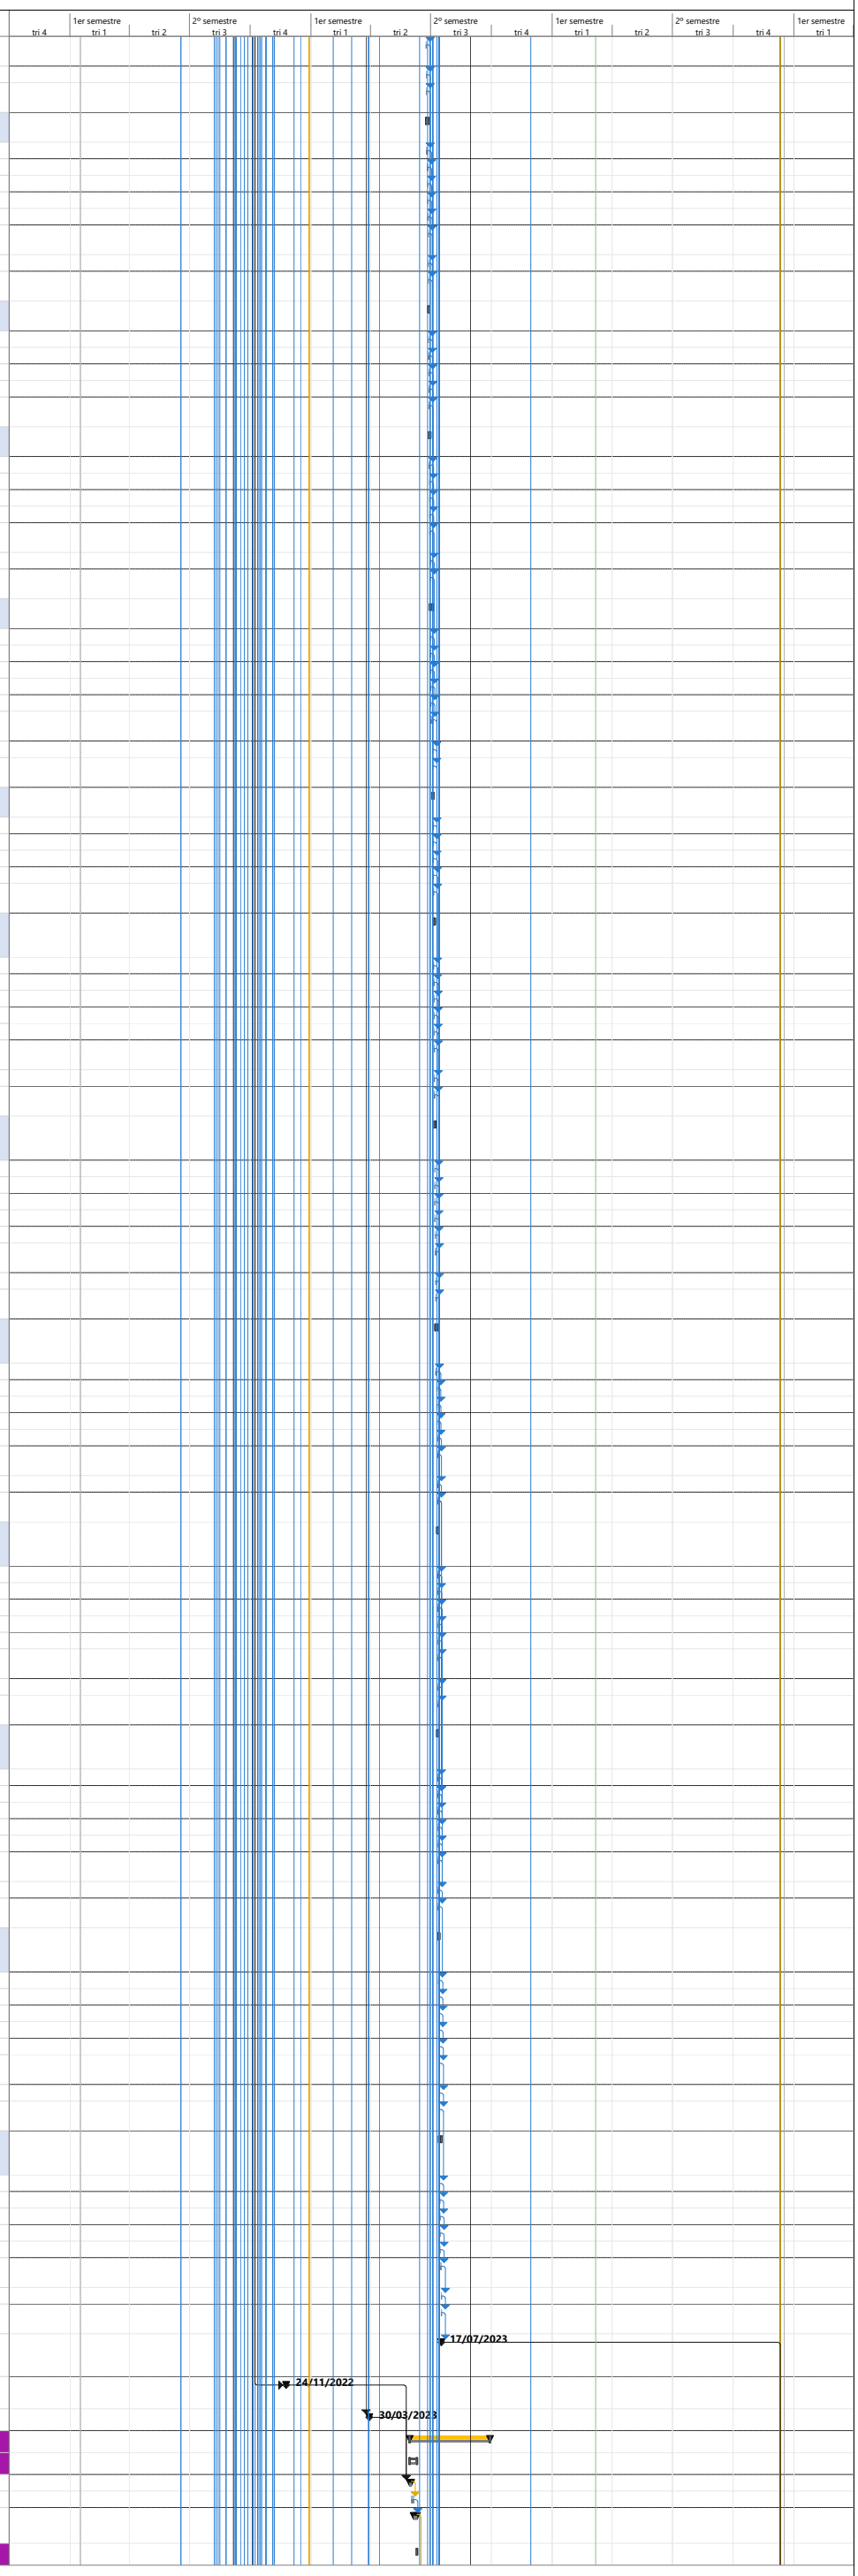


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1777	1.5.6.1.25.2.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.25 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	$ 379,871	1775
1778	1.5.6.1.25.2.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	0.3 días	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	$ 3,055,168	1777
1779	1.5.6.1.25.3	ITEM 19 CIV - 9003735 - PKID 389418 AV. BOYACÁ DESDE CL 22 E HASTA CL 22D	2.3 días	sáb 10/06/23	jue 15/06/23	$ 18,733,636	
1780	1.5.6.1.25.3.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.55 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 2,040,045	1778
1781	1.5.6.1.25.3.2	3.015 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	0.55 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 220,308	1780
1782	1.5.6.1.25.3.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.2 días	mar 13/06/23	jue 15/06/23	$ 16,473,283	1781
1783	1.5.6.1.25.4	ITEM 81 CIV - 9004950 - PKID 91035078 AV. BOYACÁ DESDE CL 23D HASTA CL 24	2.25 días	jue 15/06/23	sáb 17/06/23	$ 2,474,189	
1784	1.5.6.1.25.4.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.85 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 314,308	1782
1785	1.5.6.1.25.4.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.4 días	jue 15/06/23	sáb 17/06/23	$ 2,159,881	1784
1786	1.5.6.1.25.5	ITEM 82 CIV - 9005076 - PKID 91035089 AV. BOYACÁ DESDE CL 24 HASTA CL 24	2.25 días	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	$ 7,170,252	
1787	1.5.6.1.25.5.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.85 días	sáb 17/06/23	mar 20/06/23	$ 911,076	1785
1788	1.5.6.1.25.5.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.4 días	mar 20/06/23	mié 21/06/23	$ 6,259,176	1787
1789	1.5.6.1.25.6	ITEM 91 CIV - 9005075 - PKID 91035088 AV. BOYACÁ DESDE CL 24 HASTA CL 24B	2.25 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23	$ 6,647,481	
1790	1.5.6.1.25.6.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.85 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23	$ 816,924	1788
1791	1.5.6.1.25.6.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.4 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	$ 5,830,557	1790
1792	1.5.6.1.25.7	ITEM 57 CIV - 9003518 - PKID 602343 AV. BOYACÁ DESDE CL 24B HASTA CL 24C	4.7 días	vie 23/06/23	jue 29/06/23	$ 4,489,556	
1793	1.5.6.1.25.7.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	1.8 días	vie 23/06/23	lun 26/06/23	$ 494,336	1791
1794	1.5.6.1.25.7.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	2.9 días	lun 26/06/23	jue 29/06/23	$ 3,995,220	1793
1795	1.5.6.1.25.8	ITEM 67 CIV - 9003463 - PKID 602789 AV. BOYACÁ DESDE CL 24C HASTA CL 25B	6.15 días	jue 29/06/23	jue 6/07/23	$ 13,279,944	
1796	1.5.6.1.25.8.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	2 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23	$ 1,462,153	1794
1797	1.5.6.1.25.8.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	4.15 días	vie 30/06/23	jue 6/07/23	$ 11,817,791	1796
1798	1.5.6.1.25.9	ITEM 32 CIV - 9003418 - PKID 91024866 AV. BOYACÁ DESDE CL 25B HASTA CL 25B	6.15 días	vie 7/07/23	jue 13/07/23	$ 3,271,571	
1799	1.5.6.1.25.9.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	2 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23	$ 361,888	1797
1800	1.5.6.1.25.9.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	4.15 días	lun 10/07/23	jue 13/07/23	$ 2,909,683	1799
1801	1.5.6.1.25.10	ITEM 24 CIV - 9004932 - PKID 91024384 AV. BOYACÁ DESDE CL 25B HASTA CL 26	1.75 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	$ 5,786,713	
1802	1.5.6.1.25.10.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.55 días	jue 13/07/23	vie 14/07/23	$ 638,812	1800
1803	1.5.6.1.25.10.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.2 días	vie 14/07/23	sáb 15/07/23	$ 5,147,901	1802
1804	1.5.6.1.25.11	ITEM 259 CIV - 10009437 - PKID 522680 AV. BOYACÁ DESDE CL 53 HASTA CL 54BIS	3.4 días	sáb 15/07/23	mié 19/07/23	$ 17,985,159	
1805	1.5.6.1.25.11.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	1.2 días	sáb 15/07/23	lun 17/07/23	$ 1,981,901	1803
1806	1.5.6.1.25.11.2	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	2.2 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23	$ 16,003,258	1805
1807	1.5.6.1.25.12	ITEM 198 CIV - 10009389 - PKID 522666 AV. BOYACÁ DESDE CL 54BIS HASTA CL 54A	8.6 días	mié 19/07/23	lun 31/07/23	$ 853,520	
1808	1.5.6.1.25.12.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	2.6 días	mié 19/07/23	lun 24/07/23	$ 126,774	1806
1809	1.5.6.1.25.12.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	1 día	lun 24/07/23	mar 25/07/23	$ 32,899	1808
1810	1.5.6.1.25.12.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	5 días	mar 25/07/23	lun 31/07/23	$ 693,847	1809
1811	1.5.6.1.25.13	ITEM 216 CIV - 10011513 - PKID 24122778 AV. BOYACÁ DESDE CL 55 HASTA CL 56A	3.25 días	lun 31/07/23	jue 3/08/23	$ 13,600,222	
1812	1.5.6.1.25.13.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.85 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23	$ 1,995,725	1810
1813	1.5.6.1.25.13.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	1 día	mar 1/08/23	mié 2/08/23	$ 525,319	1812
1814	1.5.6.1.25.13.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.4 días	mié 2/08/23	jue 3/08/23	$ 11,079,178	1813
1815	1.5.6.1.25.14	ITEM - 14 / CIV 9003885 PKID 602420 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Lenta	5.5 días	jue 3/08/23	jue 10/08/23	$ 14,413,258	
1816	1.5.6.1.25.14.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 1,857,777	1814
1817	1.5.6.1.25.14.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23	$ 291,844	1816
1818	1.5.6.1.25.14.3	3.015 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	1 día	vie 4/08/23	sáb 5/08/23	$ 76,540	1817
1819	1.5.6.1.25.14.4	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	sáb 5/08/23	jue 10/08/23	$ 12,187,097	1818
1820	1.5.6.1.25.15	ITEM - 28 / CIV 9003852 PKID 602409 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Lenta	5.5 días	jue 10/08/23	jue 17/08/23	$ 29,086,521	
1821	1.5.6.1.25.15.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23	$ 4,294,224	1819
1822	1.5.6.1.25.15.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	vie 11/08/23	vie 11/08/23	$ 488,174	1821
1823	1.5.6.1.25.15.3	3.015 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	1 día	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	$ 19,457	1822
1824	1.5.6.1.25.15.4	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	sáb 12/08/23	jue 17/08/23	$ 24,284,666	1823
1825	1.5.6.1.25.16	ITEM - 225 / CIV 10008698 PKID 522445 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64H HASTA CALLE 65 / CALZADA Sur-Norte Lenta	4.5 días	jue 17/08/23	mié 23/08/23	$ 12,273,318	
1826	1.5.6.1.25.16.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 1,723,775	1824
1827	1.5.6.1.25.16.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 477,563	1826
1828	1.5.6.1.25.16.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	jue 17/08/23	mié 23/08/23	$ 10,071,980	1827
1829	1.5.6.1.25.17	ITEM - 170 / CIV 10008764 PKID 522462 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64H / CALZADA Sur-Norte Lenta	4.5 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	$ 4,809,406	
1830	1.5.6.1.25.17.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	$ 706,806	1828
1831	1.5.6.1.25.17.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	$ 185,719	1830
1832	1.5.6.1.25.17.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	jue 24/08/23	lun 28/08/23	$ 3,916,881	1831
1833	1.5.6.1.25.18	ITEM - 170 / CIV 10008558 PKID 522408 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 65B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	lun 28/08/23	jue 31/08/23	$ 2,749,028	
1834	1.5.6.1.25.18.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	$ 404,685	1832
1835	1.5.6.1.25.18.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mar 29/08/23	mar 29/08/23	$ 106,125	1834
1836	1.5.6.1.25.18.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	$ 2,238,218	1835
1837	1.5.6.1.25.19	ITEM - 221 / CIV 10008594 PKID 522419 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65 HASTA CALLE 65A / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	jue 31/08/23	sáb 2/09/23	$ 3,410,566	
1838	1.5.6.1.25.19.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	$ 480,137	1836
1839	1.5.6.1.25.19.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	jue 31/08/23	vie 1/09/23	$ 132,656	1838
1840	1.5.6.1.25.19.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23	$ 2,797,773	1839
1841	1.5.6.1.25.20	ITEM - 142 / CIV 10008532 PKID 523394 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65B HASTA CALLE 66 / CALZADA Sur-Norte Lenta	4.5 días	jue 17/08/23	mié 23/08/23	$ 7,075,776	
1842	1.5.6.1.25.20.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 1,039,092	1824
1843	1.5.6.1.25.20.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 273,272	1842
1844	1.5.6.1.25.20.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	jue 17/08/23	mié 23/08/23	$ 5,763,412	1843
1845	1.5.6.1.25.21	ITEM - 99 / CIV 10008458 PKID 522377 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66 HASTA CALLE 66A / CALZADA Sur-Norte Lenta	4.5 días	mié 23/08/23	lun 28/08/23	$ 7,007,097	
1846	1.5.6.1.25.21.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	$ 1,029,022	1844
1847	1.5.6.1.25.21.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mié 23/08/23	jue 24/08/23	$ 270,619	1846
1848	1.5.6.1.25.21.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	jue 24/08/23	lun 28/08/23	$ 5,707,456	1847
1849	1.5.6.1.25.22	ITEM - 180 / CIV 10008212 PKID 522354 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 67 / CALZADA Sur-Norte Lenta	4.5 días	lun 28/08/23	vie 1/09/23	$ 30,526,413	
1850	1.5.6.1.25.22.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	$ 4,480,765	1848
1851	1.5.6.1.25.22.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mar 29/08/23	mar 29/08/23	$ 1,179,047	1850
1852	1.5.6.1.25.22.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	3.5 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	$ 24,866,601	1851
1853	1.5.6.1.25.23	ITEM - 274 / CIV 10009084 PKID 522552 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63B HASTA CALLE 63D / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	vie 1/09/23	mar 5/09/23	$ 2,062,266	
1854	1.5.6.1.25.23.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23	$ 304,009	1852
1855	1.5.6.1.25.23.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	sáb 2/09/23	lun 4/09/23	$ 79,594	1854
1856	1.5.6.1.25.23.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	lun 4/09/23	mar 5/09/23	$ 1,678,663	1855
1857	1.5.6.1.25.24	ITEM - 233 / CIV 10008900 PKID 522499 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64B HASTA CALLE 64C / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	mar 5/09/23	jue 7/09/23	$ 13,050,827	
1858	1.5.6.1.25.24.1	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mar 5/09/23	mié 6/09/23	$ 504,094	1856
1859	1.5.6.1.25.24.2	4.005 RECALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20M E= 0.20M	0.5 días	mié 6/09/23	mié 6/09/23	$ 10,631,534	1858
1860	1.5.6.1.25.24.3	AD-002 ACERO DE 3/8" FY 6000	1.5 días	mié 6/09/23	jue 7/09/23	$ 1,915,199	1859;1840
1861	1.5.6.1.25.25	ITEM - 158 / CIV 10008844 PKID 522479 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64C HASTA CALLE 64F / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23	$ 3,710,505	
1862	1.5.6.1.25.25.1	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 143,269	1642
1863	1.5.6.1.25.25.2	4.005 RECALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20M E= 0.20M	0.5 días	mar 20/06/23	mié 21/06/23	$ 3,021,593	1862
1864	1.5.6.1.25.25.3	AD-002 ACERO DE 3/8" FY 6000	1.5 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23	$ 545,643	1863
1865	1.5.6.1.25.26	ITEM - 280 / CIV 10008150 PKID 522337 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 68B HASTA CALLE 69A / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	$ 5,633,525	
1866	1.5.6.1.25.26.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	vie 15/09/23	vie 15/09/23	$ 827,623	1864FC+12 días
1867	1.5.6.1.25.26.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	vie 15/09/23	vie 15/09/23	$ 217,556	1866
1868	1.5.6.1.25.26.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	vie 15/09/23	lun 18/09/23	$ 4,588,346	1867
1869	1.5.6.1.25.27	ITEM - 192 / CIV 10008010 PKID 522310 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69A HASTA CALLE 69B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	lun 18/09/23	mié 20/09/23	$ 3,987,121	
1870	1.5.6.1.25.27.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	lun 18/09/23	mar 19/09/23	$ 587,822	1868

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1871	1.5.6.1.25.27.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 153,881	1870
1872	1.5.6.1.25.27.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	mar 19/09/23	mié 20/09/23	$ 3,245,418	1871
1873	1.5.6.1.25.28	ITEM - 167 / CIV 10007526 PKID 522224 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	mié 20/09/23	sáb 23/09/23	$ 4,259,956	
1874	1.5.6.1.25.28.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23	$ 626,224	1872
1875	1.5.6.1.25.28.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	jue 21/09/23	jue 21/09/23	$ 164,494	1874
1876	1.5.6.1.25.28.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	jue 21/09/23	sáb 23/09/23	$ 3,469,238	1875
1877	1.5.6.1.25.29	ITEM - 112 / CIV 10007477 PKID 522208 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	sáb 23/09/23	mar 26/09/23	$ 7,213,132	
1878	1.5.6.1.25.29.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	sáb 23/09/23	sáb 23/09/23	$ 1,059,231	1876
1879	1.5.6.1.25.29.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23	$ 278,578	1878
1880	1.5.6.1.25.29.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	lun 25/09/23	mar 26/09/23	$ 5,875,323	1879
1881	1.5.6.1.25.30	ITEM - 275 / CIV 10007434 PKID 522197 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Lenta	2.5 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	$ 6,567,553	
1882	1.5.6.1.25.30.1	AD-002 - ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI	0.5 días	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 964,574	1880
1883	1.5.6.1.25.30.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.5 días	mié 27/09/23	mié 27/09/23	$ 253,638	1882
1884	1.5.6.1.25.30.3	4,005 - RECALCE DE SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, PERFORACIONES, EPÓXICO Y ANCLAJES	1.5 días	mié 27/09/23	jue 28/09/23	$ 5,349,341	1883
1885	*1.5.6.1.26*	*FIN DE INTERVENCIONES A SARDINELES (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDAY LENTA*	*0 días*	*jue 28/09/23*	*jue 28/09/23*	*$ 0*	*1884*
1886	*1.5.6.1.27*	*INICIO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLOS DE JUNTAS (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDA Y LENTA*	*0 días*	*lun 26/09/22*	*lun 26/09/22*	*$ 0*	*475FC-2.2 mss*
1887	1.5.6.1.28	FRENTE DE OBRA No. 12 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLOS DE JUNTAS (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDA Y LENTA	373.68 días	jue 18/08/22	jue 2/11/23	$ 181,981,410	
1888	1.5.6.1.28.1	CIV 9004340 PKID 91063373 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CALZADA Conectante SE Conectante	1.5 días	lun 26/09/22	mar 27/09/22	$ 6,395,882	1886
1889	1.5.6.1.28.2	ITEM - 72 / CIV 9004946 PKID 91031743 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante SW Conectante	1.5 días	mar 27/09/22	mié 28/09/22	$ 2,817,240	1888
1890	1.5.6.1.28.3	ITEM - 185 / CIV 10010144 PKID 515439 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 80 / CALZADA Conectante SW Conectante	1.5 días	mar 27/09/22	mié 28/09/22	$ 4,089,477	1889CC
1891	1.5.6.1.28.4	ITEM - 7 / CIV 9004354 PKID 91031742 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante SW Conectante	1 día	mié 28/09/22	jue 29/09/22	$ 2,942,164	
1892	1.5.6.1.28.4.1	4.003 SELLO DE GRIETAS - ITEM - 7 / CIV 9004354 PKID 91031742 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante SW Conectante	0.5 días	mié 28/09/22	jue 29/09/22	$ 2,086,548	1890
1893	1.5.6.1.28.4.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 7 / CIV 9004354 PKID 91031742 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Conectante SW Conectante	0.5 días	jue 29/09/22	jue 29/09/22	$ 855,616	1892
1894	1.5.6.1.28.5	CIV 9003735 - PKID 389418 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22D (CZLsn)	0.4 días	jue 29/09/22	vie 30/09/22	$ 4,326,264	
1895	1.5.6.1.28.5.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 29/09/22	vie 30/09/22	$ 1,395,677	1893
1896	1.5.6.1.28.5.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 2,930,587	1895
1897	1.5.6.1.28.6	CIV 9003518 - PKID 602343 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24B Y CALLE 24C (CZLsn)	1 día	vie 30/09/22	sáb 1/10/22	$ 2,971,950	
1898	1.5.6.1.28.6.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.5 días	vie 30/09/22	vie 30/09/22	$ 814,311	1896
1899	1.5.6.1.28.6.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.5 días	vie 30/09/22	sáb 1/10/22	$ 2,157,639	1898
1900	1.5.6.1.28.7	CIV 9003935 - PKID 602431 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19 (CZLsn)	1 día	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	$ 3,437,135	
1901	1.5.6.1.28.7.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.5 días	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	$ 3,021,315	1899
1902	1.5.6.1.28.7.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.5 días	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	$ 415,820	1901
1903	1.5.6.1.28.8	CIV 9004950 - PKID 91035078 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 23F Y CALLE 24 (CZLsn)	0.4 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	$ 552,288	
1904	1.5.6.1.28.8.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	$ 302,630	1902
1905	1.5.6.1.28.8.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	$ 249,658	1904
1906	1.5.6.1.28.9	CIV 9005076 - PKID 91035089 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 (CZL)	0.2 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	$ 54,561	
1907	1.5.6.1.28.9.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	$ 54,561	1905
1908	1.5.6.1.28.10	CIV 10011882 - PKID 91060012 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 48A (CZLsn)	0.4 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	$ 158,244	
1909	1.5.6.1.28.10.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	$ 99,549	1907
1910	1.5.6.1.28.10.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 58,695	1909
1911	1.5.6.1.28.11	CIV 9003744 PKID 602385 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CANAL SAN FRANCISCO (CZRsn)	0.4 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 3,817,585	
1912	1.5.6.1.28.11.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 511,684	1910
1913	1.5.6.1.28.11.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 3,305,901	1912
1914	1.5.6.1.28.12	CIV 9003941 PKID 91033595 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17 HASTA CALLE 18 (CZRsn)	0.4 días	mar 4/10/22	mié 5/10/22	$ 4,269,725	
1915	1.5.6.1.28.12.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 1,349,885	1913
1916	1.5.6.1.28.12.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mar 4/10/22	mié 5/10/22	$ 2,919,840	1915
1917	1.5.6.1.28.13	CIV 10007207 PKID 522164 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 (CZRsn)	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 16,534	
1918	1.5.6.1.28.13.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 16,534	1916
1919	1.5.6.1.28.14	CIV 10007526 PKID 522222 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72B (CZRsn)	0.4 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 5,332,069	
1920	1.5.6.1.28.14.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 1,082,099	1918
1921	1.5.6.1.28.14.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 4,249,970	1920
1922	1.5.6.1.28.15	CIV 10010140 PKID 509611 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 81B (CZRsn)	0.4 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 5,874,203	
1923	1.5.6.1.28.15.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 3,118,873	1921
1924	1.5.6.1.28.15.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	$ 2,755,330	1923
1925	1.5.6.1.28.16	CIV 9004381 PKID 24120166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17A HASTA CALLE 18 / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	0.4 días	mié 5/10/22	jue 6/10/22	$ 3,002,445	
1926	1.5.6.1.28.16.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 5/10/22	jue 6/10/22	$ 2,588,277	1924
1927	1.5.6.1.28.16.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 414,168	1926
1928	1.5.6.1.28.17	CIV 9003852 PKID 602398 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 21 / CALZADA Sur-Norte Intercambiador	0.4 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 1,456,340	
1929	1.5.6.1.28.17.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 300,639	1927
1930	1.5.6.1.28.17.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 6/10/22	jue 6/10/22	$ 1,155,701	1929
1931	1.5.6.1.28.18	ITEM - 117 / CIV 10007434 PKID 522195 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73 HASTA CALLE 73A / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 1,863,340	
1932	1.5.6.1.28.18.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 1,863,340	1929FC+45 días
1933	1.5.6.1.28.19	CIV 8014520 PKID 91033802 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 16 HASTA CALLE 17 / CZRns	0.4 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 3,221,599	
1934	1.5.6.1.28.19.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 1,569,890	1930;1932
1935	1.5.6.1.28.19.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 1,651,709	1934
1936	1.5.6.1.28.20	CIV 11013818 PKID 91034041 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CZRns	0.4 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 5,505,726	
1937	1.5.6.1.28.20.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 765,533	1935
1938	1.5.6.1.28.20.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	$ 4,740,193	1937
1939	1.5.6.1.28.21	CIV 11013818 PKID 528053 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CZLns	0.4 días	vie 27/01/23	sáb 28/01/23	$ 3,989,908	
1940	1.5.6.1.28.21.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	vie 27/01/23	sáb 28/01/23	$ 2,088,540	1938FC+50 días
1941	1.5.6.1.28.21.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 28/01/23	sáb 28/01/23	$ 1,901,368	1940;1948
1942	1.5.6.1.28.22	CIV 9004381 PKID 529944 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 17 HASTA CALLE 17 / CZLsn	0.4 días	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	$ 1,694,141	
1943	1.5.6.1.28.22.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	sáb 28/01/23	sáb 28/01/23	$ 1,025,356	1941
1944	1.5.6.1.28.22.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	$ 668,785	1943
1945	1.5.6.1.28.23	CIV 9003744 PKID 602387 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 21 HASTA CALLE 22 / CZLsn	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 454,675	
1946	1.5.6.1.28.23.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 454,675	1944FC+45 días
1947	1.5.6.1.28.24	CIV 9005075 PKID 91035088 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CZLsn	46.2 días	vie 27/01/23	mié 22/03/23	$ 2,244,852	
1948	1.5.6.1.28.24.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	vie 27/01/23	sáb 28/01/23	$ 733,677	1938FC+50 días
1949	1.5.6.1.28.24.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 1,511,175	1946
1950	1.5.6.1.28.25	CIV 9003463 PKID 602789 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25B / CZLsn	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 911,829	
1951	1.5.6.1.28.25.1	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23	$ 911,829	1949
1952	1.5.6.1.28.26	CIV 10009721 PKID 528064 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 26 / CZLsn	0.4 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 921,041	
1953	1.5.6.1.28.26.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 507,700	895
1954	1.5.6.1.28.26.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 413,341	1953
1955	1.5.6.1.28.27	CIV 9003658 PKID 24120120 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CZLsn	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 241,904	
1956	1.5.6.1.28.27.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.2 días	jue 23/03/23	jue 23/03/23	$ 241,904	1954
1957	1.5.6.1.28.28	ITEM - 61 / CIV 8014520 PKID 91033815 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	153.1 días	mar 27/09/22	vie 24/03/23	$ 2,435,763	
1958	1.5.6.1.28.28.1	ITEM - 61 / CIV 8014520 PKID 91033815 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 27/09/22	jue 29/09/22	$ 1,435,336	385
1959	1.5.6.1.28.28.2	4.003 SELLO DE GRIETAS ITEM - 61 / CIV 8014520 PKID 91033815 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	jue 23/03/23	vie 24/03/23	$ 751,596	1956
1960	1.5.6.1.28.28.3	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 61 / CIV 8014520 PKID 91033815 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	$ 248,831	1959
1961	1.5.6.1.28.29	ITEM - 74 / CIV 9003835 PKID 602418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Rápida	153.6 días	mar 27/09/22	sáb 25/03/23	$ 843,389	
1962	1.5.6.1.28.29.1	ITEM - 74 / CIV 9003835 PKID 602418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mar 27/09/22	jue 29/09/22	$ 509,410	385
1963	1.5.6.1.28.29.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 74 / CIV 9003835 PKID 602418 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19 HASTA CALLE 19A / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	vie 24/03/23	sáb 25/03/23	$ 333,979	1960
1964	1.5.6.1.28.30	ITEM - 89 / CIV 9003852 PKID 602407 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 20 / CALZADA Sur-Norte Rápida	151.9 días	jue 29/09/22	sáb 25/03/23	$ 2,623,479	
1965	1.5.6.1.28.30.1	ITEM - 89 / CIV 9003852 PKID 602407 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 20 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 29/09/22	sáb 1/10/22	$ 2,449,876	1962
1966	1.5.6.1.28.30.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 89 / CIV 9003852 PKID 602407 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 19A HASTA CALLE 20 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	sáb 25/03/23	sáb 25/03/23	$ 173,603	1963
1967	1.5.6.1.28.31	ITEM - 16 / CIV 9003935 PKID 602429 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Rápida	152.4 días	jue 29/09/22	lun 27/03/23	$ 3,025,376	
1968	1.5.6.1.28.31.1	ITEM - 16 / CIV 9003935 PKID 602429 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	jue 29/09/22	sáb 1/10/22	$ 2,768,278	1965CC
1969	1.5.6.1.28.31.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 16 / CIV 9003935 PKID 602429 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 18 HASTA CALLE 19 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	sáb 25/03/23	lun 27/03/23	$ 257,098	1966
1970	1.5.6.1.28.32	ITEM - 64 / CIV 9003735 PKID 389416 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Rápida	150.9 días	sáb 1/10/22	lun 27/03/23	$ 2,116,126	
1971	1.5.6.1.28.32.1	ITEM - 64 / CIV 9003735 PKID 389416 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	sáb 1/10/22	mar 4/10/22	$ 1,535,796	1979CC+1 día

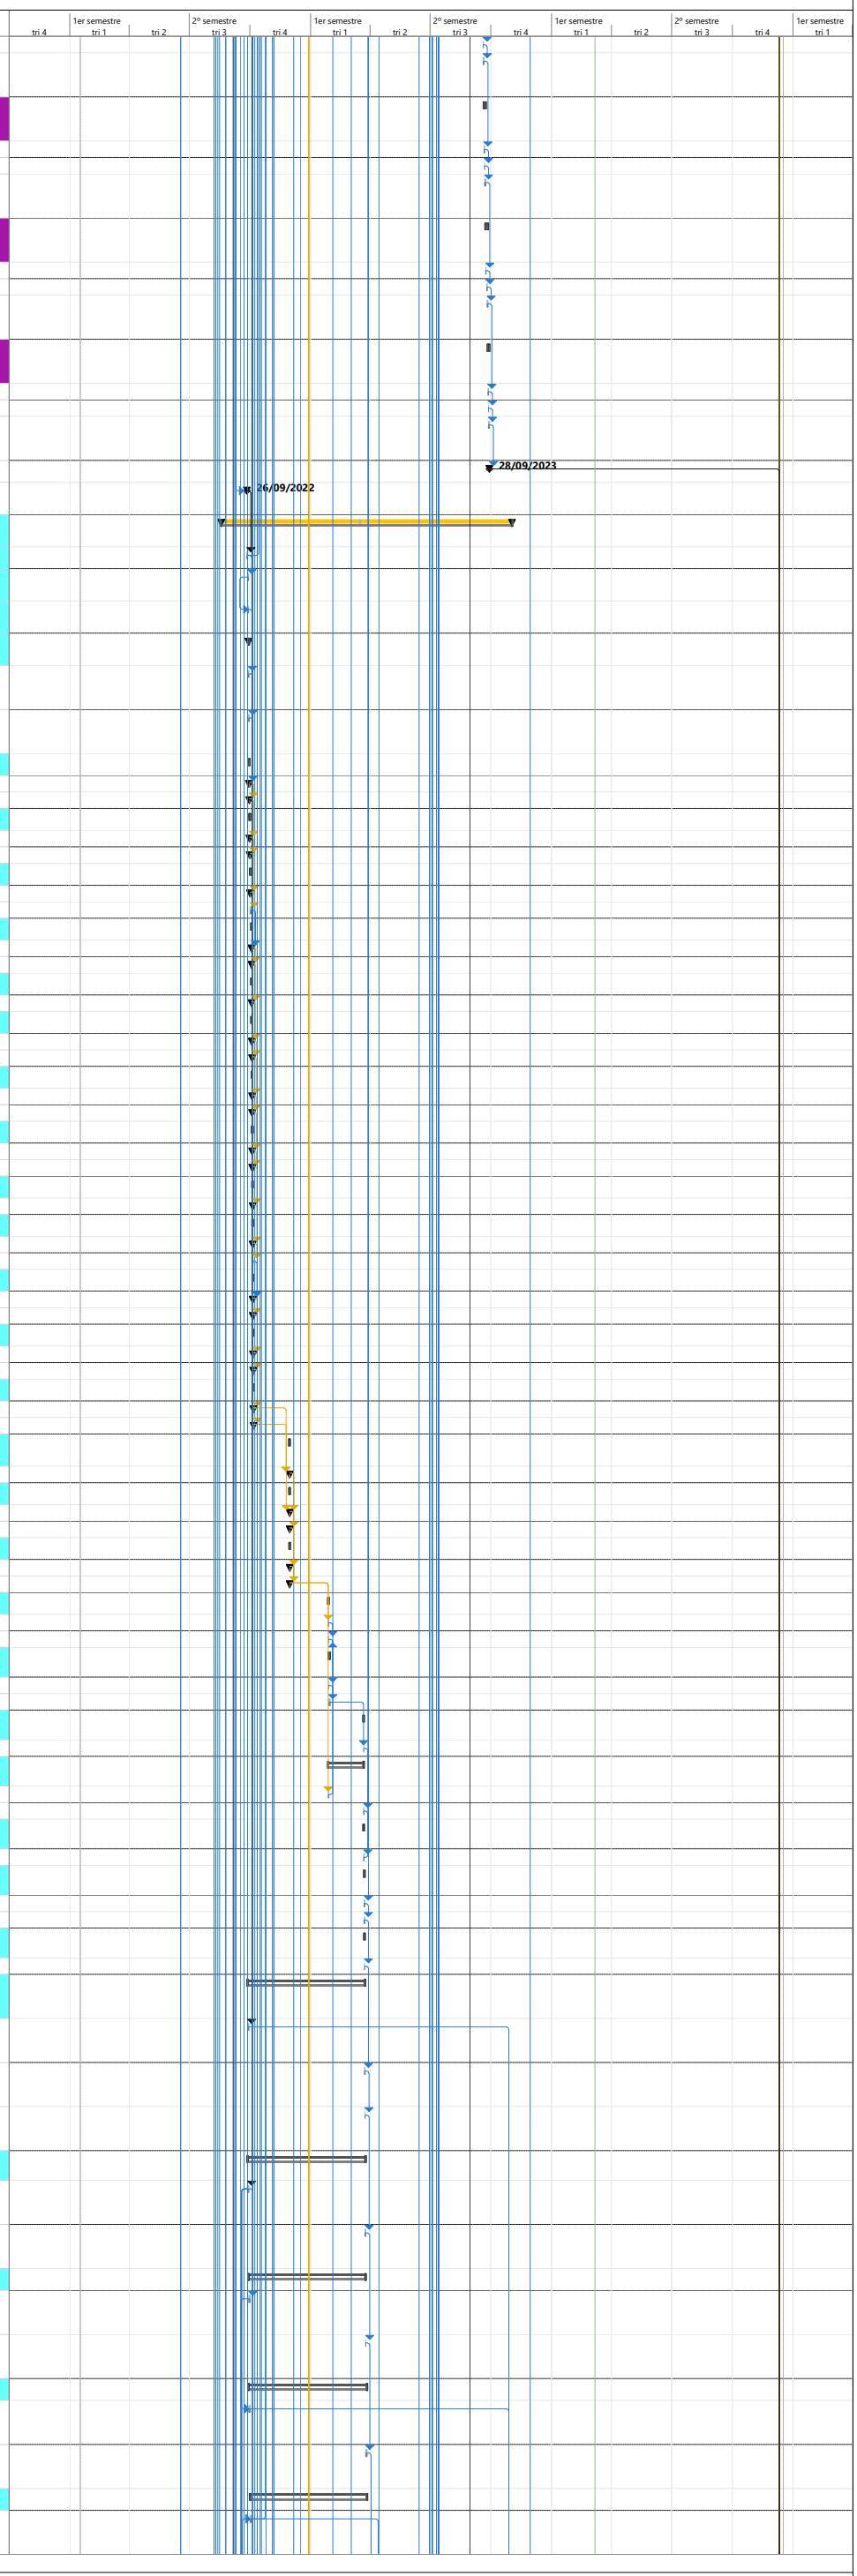


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1972	1.5.6.1.28.32.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 64 / CIV 9003735 PKID 389416 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22 HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	lun 27/03/23	lun 27/03/23	$ 580,330	1969
1973	**1.5.6.1.28.33**	**ITEM - 33 / CIV 9003418 PKID 91024380 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**lun 27/03/23**	**mié 29/03/23**	**$ 77,527**	**1972**
1974	**1.5.6.1.28.34**	**ITEM - 38 / CIV 9003463 PKID 602787 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24C HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**vie 30/09/22**	**lun 3/10/22**	**$ 2,694,178**	**386FC+1 día;1962CC+1 día**
1975	**1.5.6.1.28.35**	**ITEM - 41 / CIV 9003518 PKID 602341 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.7 días**	**vie 30/09/22**	**mar 4/10/22**	**$ 1,595,329**	
1976	1.5.6.1.28.35.1	ITEM - 41 / CIV 9003518 PKID 602341 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 30/09/22	lun 3/10/22	$ 1,375,431	386FC+1 día;1962CC+1 día
1977	1.5.6.1.28.35.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 41 / CIV 9003518 PKID 602341 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24B HASTA CALLE 24C / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	$ 219,898	1976
1978	**1.5.6.1.28.36**	**ITEM - 65 / CIV 9003658 PKID 24120121 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**3.2 días**	**vie 30/09/22**	**mar 4/10/22**	**$ 3,291,208**	
1979	1.5.6.1.28.36.1	ITEM - 65 / CIV 9003658 PKID 24120121 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 30/09/22	lun 3/10/22	$ 3,026,670	386FC+1 día;1962CC+1 día
1980	1.5.6.1.28.36.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 65 / CIV 9003658 PKID 24120121 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23C / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	$ 264,538	1977
1981	**1.5.6.1.28.37**	**ITEM - 84 / CIV 9004330 PKID 91024696 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mar 4/10/22**	**jue 6/10/22**	**$ 660,134**	**1980**
1982	**1.5.6.1.28.38**	**ITEM - 48 / CIV 9004700 PKID 91024695 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 23 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**165.7 días**	**vie 30/09/22**	**vie 14/04/23**	**$ 1,570,115**	
1983	1.5.6.1.28.38.1	ITEM - 48 / CIV 9004700 PKID 91024695 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 23 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 30/09/22	lun 3/10/22	$ 1,435,366	386FC+1 día;1962CC+1 día
1984	1.5.6.1.28.38.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 48 / CIV 9004700 PKID 91024695 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 23 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23	$ 134,749	1971FC+162 días
1985	**1.5.6.1.28.39**	**ITEM - 40 / CIV 9004933 PKID 91024381 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**jue 29/09/22**	**sáb 1/10/22**	**$ 547,264**	**386**
1986	**1.5.6.1.28.40**	**ITEM - 13 / CIV 9004949 PKID 24122824 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**119.7 días**	**mié 28/09/22**	**mié 15/02/23**	**$ 2,086,574**	
1987	1.5.6.1.28.40.1	ITEM - 13 / CIV 9004949 PKID 24122824 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida	1.2 días	mié 28/09/22	jue 29/09/22	$ 1,930,282	1985CC-1 día
1988	1.5.6.1.28.40.2	4.003 SELLO DE GRIETAS - ITEM - 13 / CIV 9004949 PKID 24122824 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	mié 15/02/23	mié 15/02/23	$ 156,292	1987FC+118 días
1989	**1.5.6.1.28.41**	**ITEM - 93 / CIV 9004950 PKID 91035077 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23D HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**	**$ 1,702,849**	**1988**
1990	**1.5.6.1.28.42**	**ITEM - 78 / CIV 9005075 PKID 91035075 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.7 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**	**$ 1,781,641**	
1991	1.5.6.1.28.42.1	ITEM - 78 / CIV 9005075 PKID 91035075 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	$ 1,651,026	1989
1992	1.5.6.1.28.42.2	4.004 SELLO DE FISURAS - ITEM - 78 / CIV 9005075 PKID 91035075 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24B / CALZADA Sur-Norte Rápida	0.5 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	$ 130,615	1991
1993	**1.5.6.1.28.43**	**ITEM - 80 / CIV 9005076 PKID 91035076 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 24 HASTA CALLE 24 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**mar 21/02/23**	**jue 23/02/23**	**$ 381,676**	**1992**
1994	**1.5.6.1.28.44**	**ITEM - 58 / CIV 9005047 PKID 91033860 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 22 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**jue 20/10/22**	**vie 21/10/22**	**$ 260,405**	**1987CC-3 días;387CC-3 días**
1995	**1.5.6.1.28.45**	**ITEM - 20 / CIV 9004932 PKID 91024382 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25G / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**3.2 días**	**mié 21/09/22**	**lun 26/09/22**	**$ 2,028,729**	
1996	1.5.6.1.28.45.1	ITEM - 20 / CIV 9004932 PKID 91024382 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25G / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	mié 21/09/22	vie 23/09/22	$ 1,686,483	392CC
1997	1.5.6.1.28.45.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - ITEM - 20 / CIV 9004932 PKID 91024382 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25G / CALZADA Sur-Norte Rápida	1 día	vie 23/09/22	lun 26/09/22	$ 342,246	1996
1998	**1.5.6.1.28.46**	**ITEM - 27 / CIV 9003634 PKID 602363 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23D / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**lun 26/09/22**	**mié 28/09/22**	**$ 1,573,817**	**1997**
1999	**1.5.6.1.28.47**	**ITEM - 88 / CIV 9004933 PKID 91024383 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25B / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**2.26 días**	**sáb 3/09/22**	**mar 6/09/22**	**$ 2,065,351**	**242CC+60 días**
2000	**1.5.6.1.28.48**	**ITEM - 24 / CIV 9004932 PKID 91024384 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25B HASTA CALLE 25C BIS / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**2.26 días**	**mar 6/09/22**	**jue 8/09/22**	**$ 3,563,807**	**245CC+2 días;1999CC+2 días**
2001	**1.5.6.1.28.49**	**ITEM - 10 / CIV 9004330 PKID 91024698 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22D / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**2.26 días**	**mar 6/12/22**	**vie 9/12/22**	**$ 2,927,246**	**251FC+24 días**
2002	**1.5.6.1.28.50**	**ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**125.75 días**	**lun 3/10/22**	**lun 27/02/23**	**$ 1,884,166**	
2003	1.5.6.1.28.50.1	ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	lun 3/10/22	mié 5/10/22	$ 1,487,359	1974
2004	1.5.6.1.28.50.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - ITEM - 55 / CIV 9003941 PKID 91033597 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 13 HASTA AVENIDA CALLE 17 / CALZADA Sur-Norte Rápida	1 día	sáb 25/02/23	lun 27/02/23	$ 396,807	240
2005	**1.5.6.1.28.51**	**ITEM - 140 / CIV 10007207 PKID 522166 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 74 HASTA CALLE 75 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 27/09/22**	**mié 28/09/22**	**$ 3,068,001**	**361FC+10 días**
2006	**1.5.6.1.28.52**	**ITEM - 278 / CIV 10007387 PKID 522186 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 73A HASTA CALLE 74 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 18/10/22**	**mié 19/10/22**	**$ 1,484,137**	**370FC+7 días;2008FC+7 días**
2007	**1.5.6.1.28.53**	**ITEM - 270 / CIV 10011794 PKID 91032701 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 4/10/22**	**mié 5/10/22**	**$ 842,388**	**364FC+5 días;2005FC+5 días**
2008	**1.5.6.1.28.54**	**ITEM - 175 / CIV 10006857 PKID 522123 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**jue 6/10/22**	**sáb 8/10/22**	**$ 1,834,406**	**367FC+1 día;2007FC+1 día**
2009	**1.5.6.1.28.55**	**ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**251.75 días**	**jue 8/09/22**	**mar 4/07/23**	**$ 2,577,415**	
2010	1.5.6.1.28.55.1	ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	1.5 días	jue 8/09/22	sáb 10/09/22	$ 2,344,470	337FC+5 días
2011	1.5.6.1.28.55.2	4.003 - SELLO DE GRIETAS - ITEM - 262 / CIV 10006772 PKID 522114 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Lenta	0.25 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 232,945	347;365;368;332;335;338;35
2012	**1.5.6.1.28.56**	**ITEM - 242 / CIV 10010119 PKID 91014813 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 81B HASTA CALLE 86A / CALZADA Sur-Norte Lenta**	**1.5 días**	**mar 30/08/22**	**mié 31/08/22**	**$ 3,350,540**	**329**
2013	**1.5.6.1.28.57**	**ITEM - 191 / CIV 10007085 PKID 522147 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 75 HASTA CALLE 76 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**jue 18/08/22**	**lun 22/08/22**	**$ 4,137,348**	**461**
2014	**1.5.6.1.28.58**	**ITEM - 229 / CIV 10011794 PKID 91032704 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**270.55 días**	**vie 19/08/22**	**mié 5/07/23**	**$ 1,586,402**	
2015	1.5.6.1.28.58.1	ITEM - 229 / CIV 10011794 PKID 91032704 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 19/08/22	mar 23/08/22	$ 1,148,261	466CC
2016	1.5.6.1.28.58.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - ITEM - 229 / CIV 10011794 PKID 91032704 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 77A / CALZADA Sur-Norte Rápida	1 día	mar 4/07/23	mié 5/07/23	$ 438,141	2011
2017	**1.5.6.1.28.59**	**ITEM - 172 / CIV 10006772 PKID 522112 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79 HASTA CALLE 79A / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**jue 27/10/22**	**sáb 29/10/22**	**$ 2,541,454**	**467CC+60 días;2015CC+1 día**
2018	**1.5.6.1.28.60**	**ITEM - 183 / CIV 10006601 PKID 522103 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**193.95 días**	**vie 28/10/22**	**jue 15/06/23**	**$ 5,758,843**	
2019	1.5.6.1.28.60.1	ITEM - 183 / CIV 10006601 PKID 522103 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Rápida	2.2 días	vie 28/10/22	lun 31/10/22	$ 5,183,472	469CC+1 día;2017CC+1 día
2020	1.5.6.1.28.60.2	4.004 - SELLO DE FISURAS - ITEM - 183 / CIV 10006601 PKID 522103 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 80 / CALZADA Sur-Norte Rápida	1 día	mié 14/06/23	jue 15/06/23	$ 575,371	240FC+90 días
2021	**1.5.6.1.28.61**	**ITEM - 122 / CIV 10007477 PKID 522206 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72B HASTA CALLE 73 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 17/06/23**	**$ 418,301**	**2020**
2022	**1.5.6.1.28.62**	**ITEM - 292 / CIV 10006857 PKID 522121 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 79 / CALZADA Sur-Norte Rápida**	**2.2 días**	**lun 31/10/22**	**mié 2/11/22**	**$ 3,254,645**	**2019**
2023	**1.5.6.1.28.63**	**ITEM - 152 / CIV 10006601 PKID 522101 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 79A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**1 día**	**sáb 17/06/23**	**mar 20/06/23**	**$ 648,064**	**2021**
2024	**1.5.6.1.28.64**	**ITEM - 247 / CIV 10011882 PKID 91060010 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 48 HASTA CALLE 26 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.4 días**	**jue 16/03/23**	**jue 16/03/23**	**$ 701,386**	
2025	1.5.6.1.28.64.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS / CIV 10011882 PKID 91060010	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 387,247	2004FC+15 días
2026	1.5.6.1.28.64.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 10011882 PKID 91060010	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 314,139	2025
2027	**1.5.6.1.28.65**	**ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.4 días**	**jue 16/03/23**	**jue 16/03/23**	**$ 735,482**	
2028	1.5.6.1.28.65.1	4.004 - SELLO DE FISURAS - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 337,286	2026
2029	1.5.6.1.28.65.2	4.003 - SELLO DE GRIETAS - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 398,196	2028
2030	**1.5.6.1.28.66**	**ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.4 días**	**jue 16/03/23**	**vie 17/03/23**	**$ 2,688,336**	
2031	1.5.6.1.28.66.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS / CIV 10011507 PKID 24122898	0.2 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 1,364,818	2029
2032	1.5.6.1.28.66.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 10011507 PKID 24122898	0.2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23	$ 1,323,518	2031
2033	**1.5.6.1.28.67**	**ITEM 171 / CIV 10011505 - PKID 24122906 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 52B Y CALLE 52 BIS**	**0.7 días**	**lun 23/10/23**	**mar 24/10/23**	**$ 157,417**	
2034	1.5.6.1.28.67.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	$ 99,549	2237FC+3 mss
2035	1.5.6.1.28.67.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 57,868	2034
2036	**1.5.6.1.28.68**	**ITEM 295 / CIV 10009623 - PKID 522743 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 52 Y CALLE 51**	**0.7 días**	**mar 24/10/23**	**mar 24/10/23**	**$ 186,287**	
2037	1.5.6.1.28.68.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 128,419	2035
2038	1.5.6.1.28.68.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 57,868	2037
2039	**1.5.6.1.28.69**	**ITEM 226 / CIV 10011510 - PKID 24122887 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 51 Y CALLE 50**	**0.7 días**	**mar 24/10/23**	**mié 25/10/23**	**$ 471,146**	
2040	1.5.6.1.28.69.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	mar 24/10/23	mié 25/10/23	$ 219,008	2038
2041	1.5.6.1.28.69.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 252,138	2040
2042	**1.5.6.1.28.70**	**ITEM 90 / CIV 9004933 - PKID 91024385 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 25B Y CALLE 25B**	**0.7 días**	**mié 25/10/23**	**jue 26/10/23**	**$ 395,294**	
2043	1.5.6.1.28.70.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 229,958	2041
2044	1.5.6.1.28.70.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	$ 165,336	2043
2045	**1.5.6.1.28.71**	**ITEM 94 / CIV 9003418 - PKID 91024377 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 25B Y CALLE 25**	**0.7 días**	**jue 26/10/23**	**jue 26/10/23**	**$ 322,893**	
2046	1.5.6.1.28.71.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 139,369	2044
2047	1.5.6.1.28.71.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 183,524	2046
2048	**1.5.6.1.28.72**	**ITEM 30 / CIV 9003463 - PKID 91024378 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24C**	**0.7 días**	**jue 26/10/23**	**vie 27/10/23**	**$ 523,546**	
2049	1.5.6.1.28.72.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	jue 26/10/23	vie 27/10/23	$ 216,022	2047
2050	1.5.6.1.28.72.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 307,524	2049
2051	**1.5.6.1.28.73**	**ITEM 42 / CIV 9003518 - PKID 602339 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 24C Y CALLE 24B**	**0.7 días**	**vie 27/10/23**	**sáb 28/10/23**	**$ 1,203,390**	
2052	1.5.6.1.28.73.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 446,976	2050

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2053	1.5.6.1.28.73.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	vie 27/10/23	sáb 28/10/23	$ 756,414	2052
2054	**1.5.6.1.28.74**	**ITEM 79 / CIV 9005075 - PKID 91035072 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 24B Y CALLE 24**	**0.7 días**	**sáb 28/10/23**	**lun 30/10/23**	**$ 794,019**	
2055	1.5.6.1.28.74.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	sáb 28/10/23	sáb 28/10/23	$ 353,398	2053
2056	1.5.6.1.28.74.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	sáb 28/10/23	lun 30/10/23	$ 440,621	2055
2057	**1.5.6.1.28.75**	**ITEM 77 / CIV 9005076 - PKID 91035073 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24**	**0.7 días**	**lun 30/10/23**	**lun 30/10/23**	**$ 296,542**	
2058	1.5.6.1.28.75.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	$ 169,233	2056
2059	1.5.6.1.28.75.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	$ 127,309	2058
2060	**1.5.6.1.28.76**	**ITEM 92 / CIV 9004950 - PKID 91035074 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 24 Y CALLE 23F**	**0.7 días**	**lun 30/10/23**	**mar 31/10/23**	**$ 304,099**	
2061	1.5.6.1.28.76.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	$ 155,296	2059
2062	1.5.6.1.28.76.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 148,803	2061
2063	**1.5.6.1.28.77**	**ITEM 75 / CIV 9004949 - PKID 24122822 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 23F Y CALLE 23D**	**0.7 días**	**mar 31/10/23**	**mié 1/11/23**	**$ 232,831**	
2064	1.5.6.1.28.77.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 105,522	2062
2065	1.5.6.1.28.77.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mar 31/10/23	mié 1/11/23	$ 127,309	2064
2066	**1.5.6.1.28.78**	**ITEM 37 / CIV 9003634 - PKID 602361 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 23D Y CALLE 23C**	**0.7 días**	**mié 1/11/23**	**mié 1/11/23**	**$ 1,175,261**	
2067	1.5.6.1.28.78.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 583,357	2065
2068	1.5.6.1.28.78.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 591,904	2067;2016
2069	**1.5.6.1.28.79**	**ITEM 34 / CIV 9003744 - PKID 602383 AV. BOYACÁ ENTRE CANAL SAN FRANCISCO Y CALLE 21**	**0.7 días**	**jue 16/03/23**	**jue 16/03/23**	**$ 1,967,556**	
2070	1.5.6.1.28.79.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 536,570	2026
2071	1.5.6.1.28.79.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	jue 16/03/23	jue 16/03/23	$ 1,430,986	2070
2072	**1.5.6.1.28.80**	**ITEM 15 / CIV 9003852 - PKID 602405 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19A**	**0.1 días**	**vie 17/03/23**	**vie 17/03/23**	**$ 3,226,901**	
2073	1.5.6.1.28.80.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.05 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 1,430,520	2071
2074	1.5.6.1.28.80.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.05 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 1,796,381	2073
2075	**1.5.6.1.28.81**	**ITEM 49 / CIV 9003885 - PKID 602416 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 19A Y CALLE 19**	**0.7 días**	**vie 17/03/23**	**vie 17/03/23**	**$ 1,892,656**	
2076	1.5.6.1.28.81.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 441,002	2074
2077	1.5.6.1.28.81.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	vie 17/03/23	vie 17/03/23	$ 1,451,654	2076
2078	**1.5.6.1.28.82**	**ITEM 68 / CIV 9003935 - PKID 602427 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18**	**0.7 días**	**vie 17/03/23**	**sáb 18/03/23**	**$ 3,578,675**	
2079	1.5.6.1.28.82.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	vie 17/03/23	sáb 18/03/23	$ 1,223,459	2077
2080	1.5.6.1.28.82.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	sáb 18/03/23	sáb 18/03/23	$ 2,355,216	2079
2081	**1.5.6.1.28.83**	**ITEM 54 / CIV 9003941 - PKID 91033598 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 18 Y CALLE 13**	**0.7 días**	**sáb 18/03/23**	**mar 21/03/23**	**$ 3,173,716**	
2082	1.5.6.1.28.83.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS	0.35 días	sáb 18/03/23	mar 21/03/23	$ 1,541,020	2080
2083	1.5.6.1.28.83.2	4.004 - SELLO DE FISURAS	0.35 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 1,632,696	2082
2084	**1.5.6.1.28.84**	**ITEM - 56 / CIV 9004932 PKID 91024386 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 25B / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**189.23 días**	**mar 21/03/23**	**mié 1/11/23**	**$ 1,099,715**	
2085	1.5.6.1.28.84.1	4.003 - SELLO DE GRIETAS / CIV 9004932 PKID 91024386	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 586,345	2083
2086	1.5.6.1.28.84.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9004932 PKID 91024386	0.2 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 513,370	2085;2068
2087	**1.5.6.1.28.85**	**ITEM - 23 / CIV 9004700 PKID 91024693 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**121.1 días**	**sáb 29/10/22**	**mar 21/03/23**	**$ 2,807,724**	
2088	1.5.6.1.28.85.1	ITEM - 23 / CIV 9004700 PKID 91024693 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 23 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	sáb 29/10/22	lun 31/10/22	$ 2,473,432	2017
2089	1.5.6.1.28.85.2	4.003 - SELLO DE GRIETAS / CIV 9004700 PKID 91024693	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 89,594	2082
2090	1.5.6.1.28.85.3	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9004700 PKID 91024693	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 244,698	2089
2091	**1.5.6.1.28.86**	**ITEM - 85 / CIV 9004330 PKID 91024694 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 22D / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**120.6 días**	**lun 31/10/22**	**mar 21/03/23**	**$ 2,278,334**	
2092	1.5.6.1.28.86.1	ITEM - 85 / CIV 9004330 PKID 91024694 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23 HASTA CALLE 22D / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 31/10/22	mar 1/11/22	$ 2,142,759	2088
2093	1.5.6.1.28.86.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9004330 PKID 91024694	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 135,575	2090
2094	**1.5.6.1.28.87**	**ITEM - 22 / CIV 9003658 PKID 522041 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**120.8 días**	**lun 31/10/22**	**mar 21/03/23**	**$ 1,879,048**	
2095	1.5.6.1.28.87.1	ITEM - 22 / CIV 9003658 PKID 522041 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 23C HASTA CALLE 23 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 31/10/22	mar 1/11/22	$ 1,745,952	2088
2096	1.5.6.1.28.87.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9003658 PKID 522041	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 133,096	2093
2097	**1.5.6.1.28.88**	**ITEM - 66 / CIV 9003735 PKID 389414 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**121 días**	**lun 31/10/22**	**mar 21/03/23**	**$ 3,730,815**	
2098	1.5.6.1.28.88.1	ITEM - 66 / CIV 9003735 PKID 389414 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 31/10/22	mar 1/11/22	$ 3,626,653	2092CC
2099	1.5.6.1.28.88.2	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9003735 PKID 389414	0.2 días	mar 21/03/23	mar 21/03/23	$ 104,162	2096
2100	**1.5.6.1.28.89**	**ITEM - 66 / CIV 9003744 PKID 24123530 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 22D HASTA CALLE 22 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**mié 1/11/23**	**jue 2/11/23**	**$ 357,127**	
2101	1.5.6.1.28.89.1	4.004 - SELLO DE FISURAS / CIV 9003735 PKID 389414	0.2 días	mié 1/11/23	jue 2/11/23	$ 357,127	2099FC+110 días;2086
2102	***1.5.6.1.29***	***FIN DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLOS DE JUNTAS (AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE) CZ RÁPIDA Y LENTA***	***0 días***	***jue 2/11/23***	***jue 2/11/23***	***$ 0***	***2101;2095;2098;1998;2001;***
2103	**1.5.6.1.30**	**FRENTE DE OBRA No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CANAL SALITRE Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)**	**285.63 días**	**mié 2/11/22**	**vie 6/10/23**	**$ 2,137,086,875**	
2104	***1.5.6.1.30.1***	***PMTs para intervención en Frente de obra No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA NS)***	***0 días***	***mié 2/11/22***	***mié 2/11/22***	***$ 0***	***496FC+3 días***
2105	***1.5.6.1.30.2***	***Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA NS)***	***0 días***	***mié 2/11/22***	***mié 2/11/22***	***$ 0***	***2104***
2106	***1.5.6.1.30.3***	***Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previos a intervención en Frente de obra No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA NS)***	***0 días***	***mié 2/11/22***	***mié 2/11/22***	***$ 0***	***2105***
2107	***1.5.6.1.30.4***	***INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA NS)***	***0 días***	***mié 2/11/22***	***mié 2/11/22***	***$ 0***	***2106***
2108	**1.5.6.1.30.5**	**ITEM - 178 / CIV 11013818 PKID 91034040 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**1.04 días**	**mié 2/11/22**	**jue 3/11/22**	**$ 51,041,327**	**2107**
2109	1.5.6.1.30.5.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 178 / CIV 11013818 PKID 91034040 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CANAL SALITRE / CALZADA Norte-Sur Rápida	1.04 días	mié 2/11/22	jue 3/11/22	$ 1,592,101	
2110	**1.5.6.1.30.6**	**ITEM - 234 / CIV 11014793 PKID 91027129 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CALLE 86A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**6.49 días**	**jue 3/11/22**	**vie 11/11/22**	**$ 19,938,077**	**2109**
2111	1.5.6.1.30.6.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 234 / CIV 11014793 PKID 91027129 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SALITRE HASTA CALLE 86A / CALZADA Norte-Sur Rápida	6.49 días	jue 3/11/22	vie 11/11/22	$ 358,044	
2112	**1.5.6.1.30.7**	**ITEM - 152 / CIV 10006601 PKID 522101 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 79A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**6.49 días**	**vie 11/11/22**	**sáb 19/11/22**	**$ 179,668,951**	**2111**
2113	1.5.6.1.30.7.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 152 / CIV 10006601 PKID 522101 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 80 HASTA CALLE 79A / CALZADA Norte-Sur Rápida	6.49 días	vie 11/11/22	sáb 19/11/22	$ 1,580,962	
2114	**1.5.6.1.30.8**	**ITEM - 252 / CIV 10006772 PKID 522110 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 79 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**6.49 días**	**mar 20/06/23**	**mar 27/06/23**	**$ 171,149,578**	**2112CC+1 día**
2115	1.5.6.1.30.8.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 252 / CIV 10006772 PKID 522110 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 79A HASTA CALLE 79 / CALZADA Norte-Sur Rápida	6.49 días	mar 20/06/23	mar 27/06/23	$ 1,479,914	2023
2116	**1.5.6.1.30.9**	**ITEM 141 / CIV 10006857 - PKID 522119 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 78 Y CALLE 77A**	**6.49 días**	**mar 27/06/23**	**jue 6/07/23**	**$ 126,231,916**	**2114**
2117	1.5.6.1.30.9.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM 141 / CIV 10006857 - PKID 522119 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 78 Y CALLE 77A	6.49 días	mar 27/06/23	jue 6/07/23	$ 1,090,839	2113
2118	**1.5.6.1.30.10**	**ITEM - 128 / CIV 10011794 PKID 91034619 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 77 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**6.49 días**	**jue 6/07/23**	**jue 13/07/23**	**$ 71,989,376**	**2116**
2119	1.5.6.1.30.10.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 128 / CIV 10011794 PKID 91034619 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77A HASTA CALLE 77 / CALZADA Norte-Sur Rápida	6.49 días	jue 6/07/23	jue 13/07/23	$ 527,518	
2120	**1.5.6.1.30.11**	**ITEM - 284 / CIV 10011793 PKID 91034620 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 76 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**6.49 días**	**jue 6/07/23**	**jue 13/07/23**	**$ 69,580,380**	**2118CC**
2121	1.5.6.1.30.11.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 284 / CIV 10011793 PKID 91034620 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 77 HASTA CALLE 76 / CALZADA Norte-Sur Rápida	6.49 días	jue 6/07/23	jue 13/07/23	$ 480,574	
2122	**1.5.6.1.30.12**	**ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**2.05 días**	**vie 7/07/23**	**lun 10/07/23**	**$ 263,860,317**	**2120CC+1 día**
2123	1.5.6.1.30.12.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 231,667	
2124	1.5.6.1.30.12.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.4 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 2,769,959	2123
2125	1.5.6.1.30.12.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.45 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23	$ 1,139,468	2124
2126	1.5.6.1.30.12.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	sáb 8/07/23	sáb 8/07/23	$ 1,269,377	2125
2127	1.5.6.1.30.12.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD25 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	sáb 8/07/23	sáb 8/07/23	$ 11,274,712	2126
2128	1.5.6.1.30.12.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	sáb 8/07/23	lun 10/07/23	$ 12,193,878	2127
2129	1.5.6.1.30.12.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 2,815,019	2128
2130	**1.5.6.1.30.13**	**ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74**	**2.05 días**	**vie 11/08/23**	**mar 15/08/23**	**$ 192,654,994**	
2131	1.5.6.1.30.13.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.2 días	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	$ 1,531,998	2117FC+31 días
2132	1.5.6.1.30.13.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.4 días	sáb 12/08/23	sáb 12/08/23	$ 18,303,528	2131
2133	1.5.6.1.30.13.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.45 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	$ 7,529,456	2132
2134	1.5.6.1.30.13.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.25 días	lun 14/08/23	lun 14/08/23	$ 8,388,161	2133
2135	1.5.6.1.30.13.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD25 - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.25 días	lun 14/08/23	lun 14/08/23	$ 74,502,615	2134
2136	1.5.6.1.30.13.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 -ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.25 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 80,576,396	2135
2137	1.5.6.1.30.13.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM 148 / CIV 10007207 - PKID 522162 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 75 Y CALLE 74	0.25 días	mar 15/08/23	mar 15/08/23	$ 1,822,840	2136
2138	**1.5.6.1.30.14**	**ITEM 220 / CIV 10010119 - PKID 2501944 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 86A Y CALLE 81B**	**2.3 días**	**lun 10/07/23**	**mié 12/07/23**	**$ 302,735,711**	
2139	1.5.6.1.30.14.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 2,287,080	2129
2140	1.5.6.1.30.14.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.4 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 27,351,300	2139
2141	1.5.6.1.30.14.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.45 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23	$ 11,251,401	2140
2142	1.5.6.1.30.14.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 12,520,583	2141
2143	1.5.6.1.30.14.5	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD25 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 85,832,640	2142
2144	1.5.6.1.30.14.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 120,239,859	2143
2145	1.5.6.1.30.14.7	3.030 MEZCLA ASFÁLTICA CON GCR - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	$ 40,984,442	2144

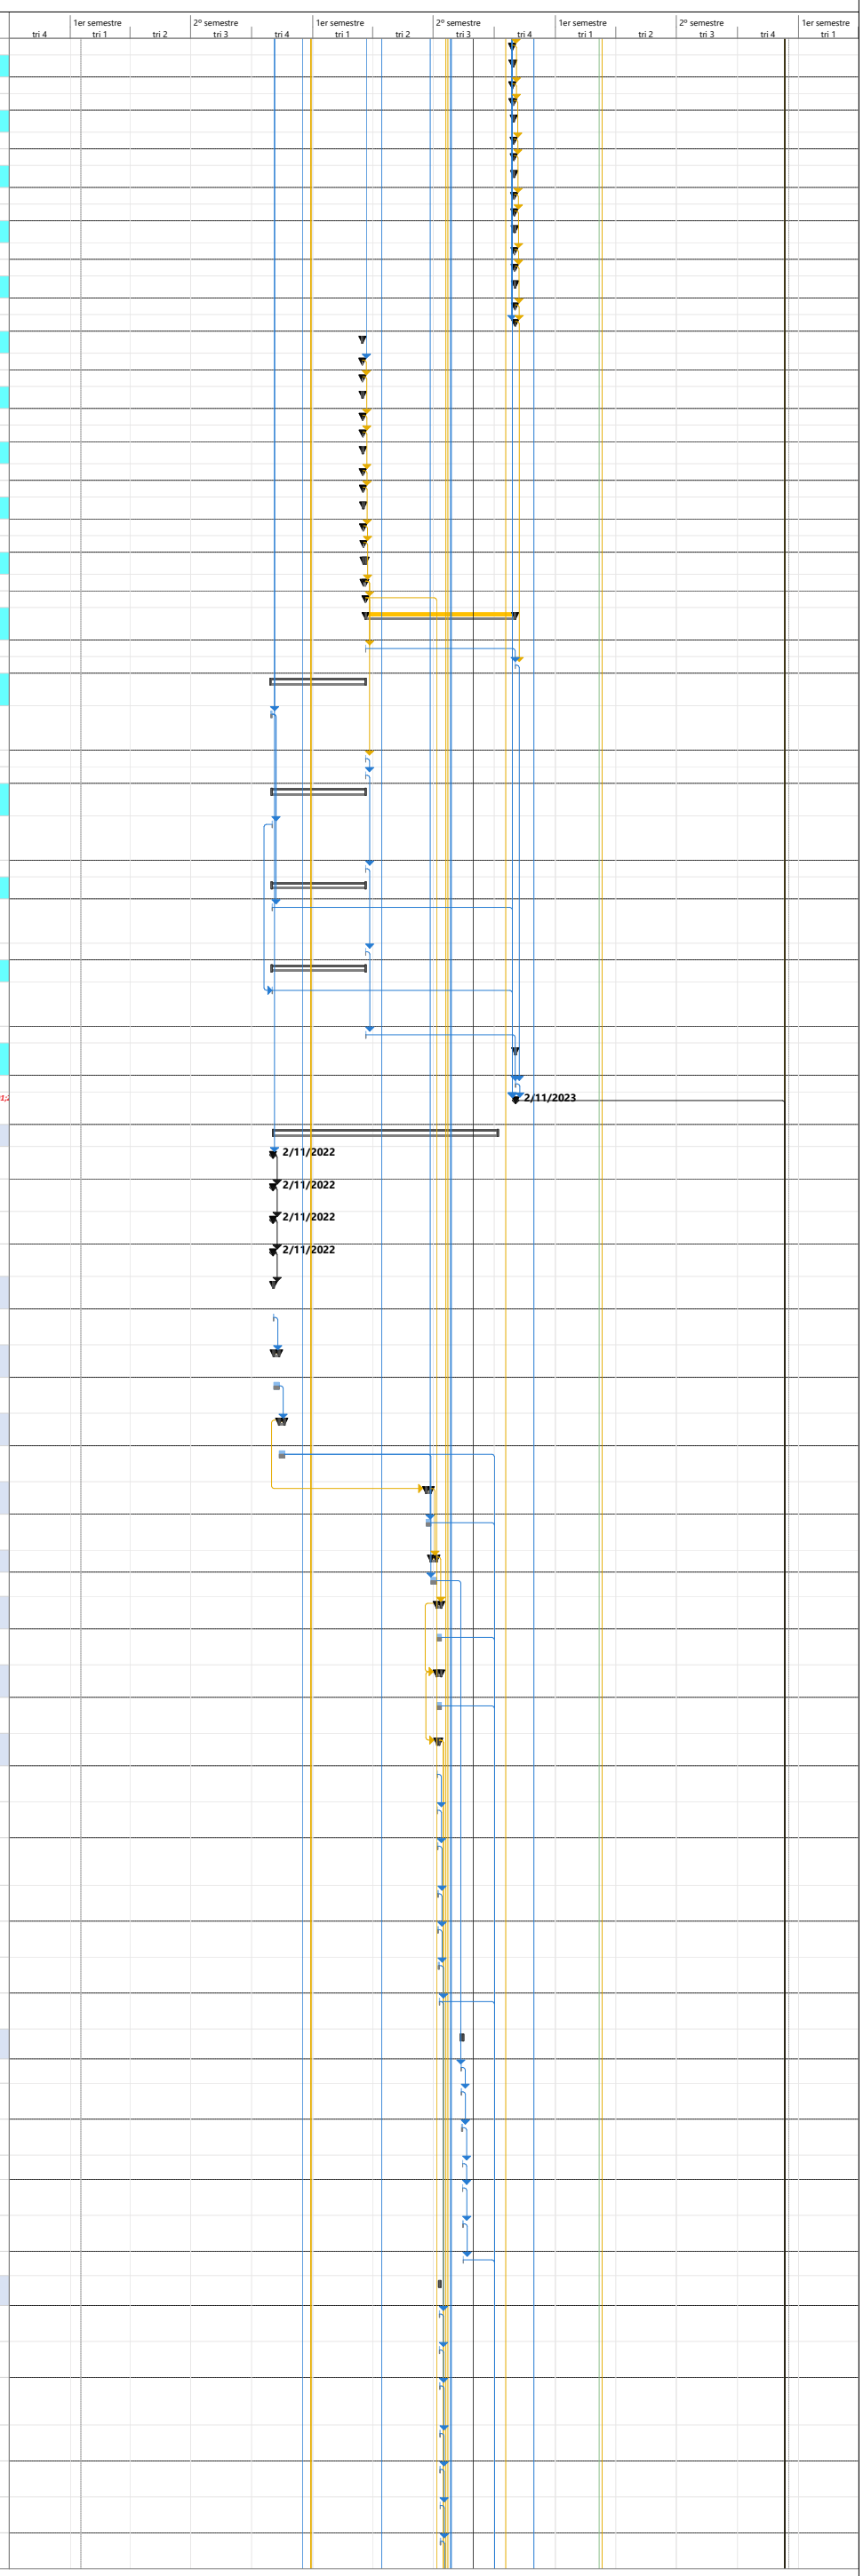


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2146	1.5.6.1.30.14.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 195 / CIV 10007085 PKID 522145 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 76 HASTA CALLE 75 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 2,268,406	2145
2147	**1.5.6.1.30.15**	**ITEM 157 / CIV 10010140 - PKID 509609 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 81B Y CARRERA 72B**	**3.2 días**	**sáb 12/08/23**	**mié 16/08/23**	**$ 145,568,330**	
2148	1.5.6.1.30.15.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.6 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	$ 1,036,802	2146FC+26 días
2149	1.5.6.1.30.15.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	$ 12,541,728	2148CC+0.1 días
2150	1.5.6.1.30.15.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.8 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	$ 5,159,246	2149CC+0.05 días
2151	1.5.6.1.30.15.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	lun 14/08/23	lun 14/08/23	$ 5,681,028	2150
2152	1.5.6.1.30.15.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 39,943,662	2151
2153	1.5.6.1.30.15.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.8 días	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 54,572,649	2152
2154	1.5.6.1.30.15.7	3.028 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD25	0.25 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23	$ 26,633,215	2153
2155	**1.5.6.1.30.16**	**ITEM 184 / CIV 10007387 - PKID 522182 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 74 Y CALLE 73A (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)**	**3.4 días**	**vie 22/09/23**	**mar 26/09/23**	**$ 167,760,942**	
2156	1.5.6.1.30.16.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.6 días	vie 22/09/23	vie 22/09/23	$ 761,776	2154FC+32 días
2157	1.5.6.1.30.16.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	$ 13,265,536	2156CC+0.1 días
2158	1.5.6.1.30.16.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.8 días	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	$ 5,456,996	2157CC+0.05 días
2159	1.5.6.1.30.16.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	sáb 23/09/23	sáb 23/09/23	$ 4,174,035	2158
2160	1.5.6.1.30.16.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	$ 79,629,675	2159
2161	1.5.6.1.30.16.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23	$ 10,871,841	2160
2162	1.5.6.1.30.16.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.8 días	lun 25/09/23	mar 26/09/23	$ 52,297,008	2161
2163	1.5.6.1.30.16.8	3.014 - SELLADO DE JUNTAS	0.05 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23	$ 1,304,075	2162
2164	**1.5.6.1.30.17**	**ITEM 272 / CIV 10007434 - PKID 522193 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 73A Y CALLE 73**	**3.85 días**	**mar 26/09/23**	**sáb 30/09/23**	**$ 143,332,527**	
2165	1.5.6.1.30.17.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.8 días	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 523,802	2163
2166	1.5.6.1.30.17.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	1.2 días	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 11,870,485	2165CC+0.1 días
2167	1.5.6.1.30.17.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1.2 días	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 4,883,119	2166CC+0.05 días
2168	1.5.6.1.30.17.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 27/09/23	jue 28/09/23	$ 2,863,065	2167
2169	1.5.6.1.30.17.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	jue 28/09/23	jue 28/09/23	$ 59,567,640	2168
2170	1.5.6.1.30.17.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	jue 28/09/23	jue 28/09/23	$ 15,238,557	2168
2171	1.5.6.1.30.17.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	1.2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	$ 48,038,159	2170
2172	1.5.6.1.30.17.8	3.014 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	vie 29/09/23	sáb 30/09/23	$ 347,700	2171
2173	**1.5.6.1.30.18**	**ITEM 127 / CIV 10007477 - PKID 522204 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 73 Y CALLE 72B**	**2 días**	**sáb 30/09/23**	**mar 3/10/23**	**$ 111,264,602**	
2174	1.5.6.1.30.18.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	sáb 30/09/23	sáb 30/09/23	$ 447,028	2172
2175	1.5.6.1.30.18.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.6 días	sáb 30/09/23	lun 2/10/23	$ 8,700,399	2174CC+0.1 días
2176	1.5.6.1.30.18.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.6 días	sáb 30/09/23	lun 2/10/23	$ 3,579,027	2175CC+0.05 días
2177	1.5.6.1.30.18.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.2 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	$ 2,442,415	2176
2178	1.5.6.1.30.18.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	$ 58,266,788	2177
2179	1.5.6.1.30.18.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.6 días	lun 2/10/23	mar 3/10/23	$ 37,153,437	2178
2180	1.5.6.1.30.18.7	3.014 - SELLADO DE JUNTAS	0.05 días	mar 3/10/23	mar 3/10/23	$ 675,508	2179
2181	**1.5.6.1.30.19**	**ITEM 110 / CIV 10007526 - PKID 522220 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 73 Y CALLE 72B**	**3.4 días**	**mar 3/10/23**	**vie 6/10/23**	**$ 120,309,847**	
2182	1.5.6.1.30.19.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.6 días	mar 3/10/23	mar 3/10/23	$ 647,873	2180
2183	1.5.6.1.30.19.2	3.017 - FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mar 3/10/23	mié 4/10/23	$ 10,144,746	2182CC+0.1 días
2184	1.5.6.1.30.19.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	0.8 días	mar 3/10/23	mié 4/10/23	$ 4,173,208	2183CC+0.05 días
2185	1.5.6.1.30.19.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA INSTALACIÓN DE CAPA DE BASE ASFÁLTICA	0.4 días	mié 4/10/23	mié 4/10/23	$ 3,542,885	2184
2186	1.5.6.1.30.19.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 4/10/23	jue 5/10/23	$ 34,962,904	2185
2187	1.5.6.1.30.19.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 25,333,763	2186
2188	1.5.6.1.30.19.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico	0.8 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 40,843,280	2187
2189	1.5.6.1.30.19.8	3.014 - SELLADO DE JUNTAS	0.05 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 661,188	2188
2190	*1.5.6.1.31*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 13 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 72 Y CANAL SALITRE (CALZADA RÁPIDA NS)*	*0 días*	*vie 6/10/23*	*vie 6/10/23*	*$ 0*	*2189;2113;2129;2119;2121;*
2191	**1.5.6.1.32**	**FRENTE DE OBRA No. 14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)**	**212.95 días**	**lun 10/07/23**	**sáb 16/03/24**	**$ 3,673,305,058**	
2192	*1.5.6.1.32.1*	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)*	*0 días*	*lun 10/07/23*	*lun 10/07/23*	*$ 0*	*2122*
2193	*1.5.6.1.32.2*	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)*	*0 días*	*lun 10/07/23*	*lun 10/07/23*	*$ 0*	*2192*
2194	*1.5.6.1.32.3*	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previos a intervención en Frente de obra No.14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)*	*0 días*	*lun 10/07/23*	*lun 10/07/23*	*$ 0*	*2193*
2195	*1.5.6.1.32.4*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)*	*0 días*	*lun 10/07/23*	*lun 10/07/23*	*$ 0*	*2194*
2196	**1.5.6.1.32.5**	**ITEM - 176 / CIV 10009186 PKID 522590 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 HASTA CALLE 63 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**lun 10/07/23**	**lun 10/07/23**	**$ 43,420,132**	**2195**
2197	1.5.6.1.32.5.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009186 PKID 522590	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 810,770	
2198	**1.5.6.1.32.6**	**ITEM - 290 / CIV 10011514 PKID 24122773 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 HASTA CALLE 56A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**lun 10/07/23**	**lun 10/07/23**	**$ 20,915,570**	**2196CC**
2199	1.5.6.1.32.6.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011514 PKID 24122773	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 268,135	2197
2200	**1.5.6.1.32.7**	**ITEM - 143 / CIV 10009236 PKID 522605 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63 BIS HASTA CALLE 63 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**lun 10/07/23**	**lun 10/07/23**	**$ 50,696,971**	**2198CC**
2201	1.5.6.1.32.7.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009236 PKID 522605	0.2 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 591,170	2199
2202	**1.5.6.1.32.8**	**ITEM - 165 / CIV 10011513 PKID 24122779 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 56A HASTA CALLE 55 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**mar 11/07/23**	**mar 11/07/23**	**$ 102,794,213**	**2200FC+1 día**
2203	1.5.6.1.32.8.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011513 PKID 24122779	0.2 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 1,153,696	2201
2204	**1.5.6.1.32.9**	**ITEM - 248 / CIV 10009370 PKID 522642 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 55 HASTA CALLE 54A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**jue 13/07/23**	**jue 13/07/23**	**$ 34,826,883**	**2202FC+2 días**
2205	1.5.6.1.32.9.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009370 PKID 522642	0.2 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 408,170	2203
2206	**1.5.6.1.32.10**	**ITEM - 174 / CIV 10009389 PKID 522662 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54A HASTA CALLE 54 BIS / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**jue 13/07/23**	**vie 14/07/23**	**$ 27,989,208**	**2204CC**
2207	1.5.6.1.32.10.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009389 PKID 522662	0.2 días	jue 13/07/23	vie 14/07/23	$ 309,509	2205
2208	**1.5.6.1.32.11**	**ITEM - 104 / CIV 10009437 PKID 522676 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 54 BIS HASTA CALLE 53 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**vie 14/07/23**	**vie 14/07/23**	**$ 125,254,564**	**2206CC**
2209	1.5.6.1.32.11.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 522676	0.2 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 1,499,805	2207
2210	**1.5.6.1.32.12**	**ITEM - 247 / CIV 10011882 PKID 91060010 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 48 HASTA CALLE 26 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**mié 19/07/23**	**mié 19/07/23**	**$ 23,574,635**	**2208FC+4 días**
2211	1.5.6.1.32.12.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011882 PKID 91060010	0.2 días	mié 19/07/23	mié 19/07/23	$ 910,227	2209
2212	**1.5.6.1.32.13**	**ITEM - 146 / CIV 10011509 PKID 24122891 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 50 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**mar 25/07/23**	**mar 25/07/23**	**$ 24,032,670**	**2210FC+4 días;2024FC+4 días**
2213	1.5.6.1.32.13.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011509 PKID 24122891	0.2 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	$ 700,174	2211
2214	**1.5.6.1.32.14**	**ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**1.75 días**	**mar 25/07/23**	**jue 27/07/23**	**$ 38,023,462**	
2215	1.5.6.1.32.14.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	$ 327,837	2212
2216	1.5.6.1.32.14.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.4 días	mar 25/07/23	mié 26/07/23	$ 3,515,045	2215
2217	1.5.6.1.32.14.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.45 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	$ 1,445,973	2216
2218	1.5.6.1.32.14.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	$ 894,910	2217
2219	1.5.6.1.32.14.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	$ 30,947,771	2218
2220	1.5.6.1.32.14.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS - ITEM - 106 / CIV 10011508 PKID 24122895 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49A HASTA CALLE 49 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23	$ 891,926	2219
2221	**1.5.6.1.32.15**	**ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**1.55 días**	**jue 27/07/23**	**vie 28/07/23**	**$ 25,617,515**	**2220**
2222	1.5.6.1.32.15.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL -ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 193,690	2220
2223	1.5.6.1.32.15.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.4 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 2,084,294	2222
2224	1.5.6.1.32.15.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS -ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.45 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 857,408	2223
2225	1.5.6.1.32.15.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 -ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 530,647	2224
2226	1.5.6.1.32.15.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 - ITEM - 277 / CIV 10011507 PKID 24122898 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 49 HASTA CALLE 48A / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 18,350,889	2225
2227	1.5.6.1.32.15.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011507 PKID 24122898	0.2 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 1,063,787	2028
2228	**1.5.6.1.32.16**	**ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**1.55 días**	**vie 28/07/23**	**lun 31/07/23**	**$ 27,837,935**	**2221;2030**
2229	1.5.6.1.32.16.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL -ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 60,976	2226
2230	1.5.6.1.32.16.2	3.017 - FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA - ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.4 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	$ 656,166	2229
2231	1.5.6.1.32.16.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS - ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.45 días	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	$ 269,924	2230
2232	1.5.6.1.32.16.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1 - ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	$ 167,056	2231
2233	1.5.6.1.32.16.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MD19 - ITEM - 193 / CIV 10011506 PKID 24122901 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 52B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.25 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 5,777,131	2232
2234	1.5.6.1.32.16.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10011506 PKID 24122901	0.2 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 699,379	2032
2235	**1.5.6.1.32.17**	**ITEM - 258 / CIV 10009566 PKID 522718 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 52A HASTA CALLE 52 / CALZADA Norte-Sur Rápida**	**0.2 días**	**vie 28/07/23**	**vie 28/07/23**	**$ 7,027,594**	**2228CC**
2236	1.5.6.1.32.17.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 522676	0.2 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 1,070,153	2234

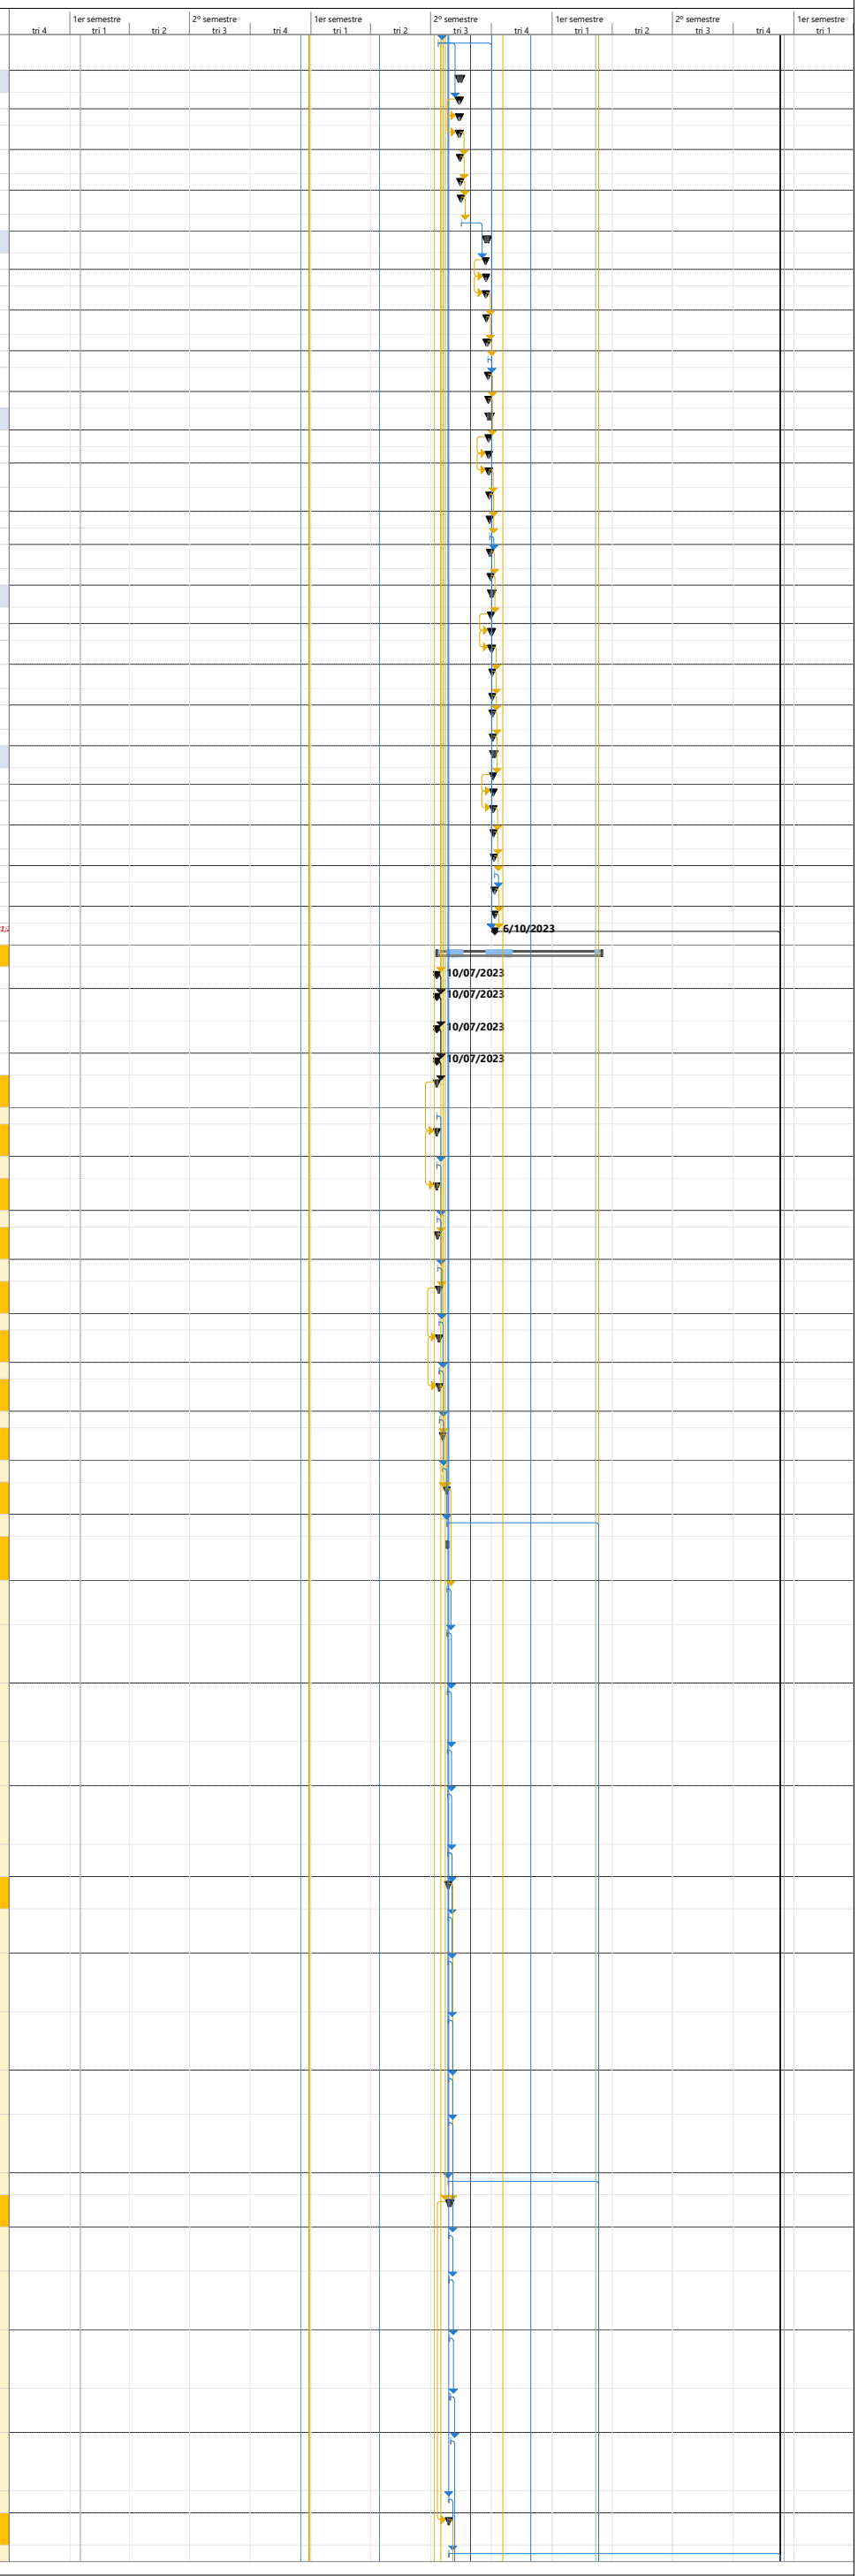


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2237	1.5.6.1.32.18	ITEM - 287 / CIV 10009437 PKID 91016795 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 53 HASTA CALLE 53 / CALZADA Norte-Sur N.A	1.2 días	vie 28/07/23	lun 31/07/23	$ 9,695,647	2235
2238	1.5.6.1.32.18.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	$ 44,727	
2239	1.5.6.1.32.18.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	$ 481,403	2238
2240	1.5.6.1.32.18.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	sáb 29/07/23	sáb 29/07/23	$ 198,034	2239
2241	1.5.6.1.32.18.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1 / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	$ 122,540	2240
2242	1.5.6.1.32.18.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 4,238,450	2241
2243	1.5.6.1.32.18.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 510,809	2242
2244	1.5.6.1.32.19	ITEM 226 / CIV 10011510 - PKID 24122887 AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 51 Y CALLE 50	1.2 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23	$ 30,168,364	
2245	1.5.6.1.32.19.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL / CIV 10011510 - PKID 24122887	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 251,079	2233
2246	1.5.6.1.32.19.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO / CIV 10011510 - PKID 24122887	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 2,701,862	2245
2247	1.5.6.1.32.19.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS / CIV 10011510 - PKID 24122887	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 1,111,454	2246
2248	1.5.6.1.32.19.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1 / CIV 10011510 - PKID 24122887	0.2 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23	$ 687,876	2247
2249	1.5.6.1.32.19.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19 / CIV 10011510 - PKID 24122887	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 23,788,188	2248
2250	1.5.6.1.32.19.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 1,627,905	2249
2251	1.5.6.1.32.20	ITEM - 186 / CIV 10008458 PKID 522373 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 66A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	mar 1/08/23	mié 2/08/23	$ 86,195,111	
2252	1.5.6.1.32.20.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 743,150	2250
2253	1.5.6.1.32.20.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 7,961,409	2252
2254	1.5.6.1.32.20.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 3,275,057	2253
2255	1.5.6.1.32.20.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mar 1/08/23	mié 2/08/23	$ 2,026,924	2254
2256	1.5.6.1.32.20.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 70,095,209	2255
2257	1.5.6.1.32.20.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 2,093,362	2256
2258	1.5.6.1.32.21	ITEM - 123 / CIV 10008532 PKID 522390 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 65B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	mié 2/08/23	jue 3/08/23	$ 75,118,086	
2259	1.5.6.1.32.21.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 655,720	2256
2260	1.5.6.1.32.21.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 7,056,198	2259
2261	1.5.6.1.32.21.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	$ 2,902,683	2260
2262	1.5.6.1.32.21.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mié 2/08/23	jue 3/08/23	$ 1,796,465	2261
2263	1.5.6.1.32.21.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 62,125,399	2262
2264	1.5.6.1.32.21.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 581,621	2263
2265	1.5.6.1.32.22	ITEM - 219 / CIV 10008558 PKID 522404 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65B HASTA CALLE 65A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23	$ 25,843,239	
2266	1.5.6.1.32.22.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 218,574	2264
2267	1.5.6.1.32.22.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 2,352,066	2266
2268	1.5.6.1.32.22.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 967,562	2267
2269	1.5.6.1.32.22.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23	$ 598,822	2268
2270	1.5.6.1.32.22.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	$ 20,708,468	2269
2271	1.5.6.1.32.22.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	$ 997,747	2270
2272	1.5.6.1.32.23	ITEM - 190 / CIV 10008594 PKID 522415 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 65 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	vie 4/08/23	sáb 5/08/23	$ 35,373,968	
2273	1.5.6.1.32.23.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	$ 306,272	2271
2274	1.5.6.1.32.23.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	$ 3,282,978	2273
2275	1.5.6.1.32.23.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	$ 1,350,507	2274
2276	1.5.6.1.32.23.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	vie 4/08/23	sáb 5/08/23	$ 835,827	2275
2277	1.5.6.1.32.23.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	sáb 5/08/23	sáb 5/08/23	$ 28,904,575	2276
2278	1.5.6.1.32.23.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	sáb 5/08/23	sáb 5/08/23	$ 693,809	2277
2279	1.5.6.1.32.24	ITEM - 147 / CIV 10008698 PKID 522441 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 64H / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	sáb 5/08/23	mié 9/08/23	$ 137,491,404	
2280	1.5.6.1.32.24.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 5/08/23	mar 8/08/23	$ 1,194,351	2278
2281	1.5.6.1.32.24.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 12,829,300	2280
2282	1.5.6.1.32.24.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 5,277,544	2281
2283	1.5.6.1.32.24.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 3,266,258	2282
2284	1.5.6.1.32.24.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	$ 112,953,915	2283
2285	1.5.6.1.32.24.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	0.2 días	mar 8/08/23	mié 9/08/23	$ 1,970,036	2284
2286	1.5.6.1.32.25	ITEM - 204 / CIV 10008764 PKID 522458 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64H / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23	$ 65,488,262	
2287	1.5.6.1.32.25.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 567,282	2285
2288	1.5.6.1.32.25.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 6,085,116	2287
2289	1.5.6.1.32.25.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 2,503,213	2288
2290	1.5.6.1.32.25.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 1,549,233	2289
2291	1.5.6.1.32.25.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	mié 9/08/23	mié 9/08/23	$ 53,575,617	2290
2292	1.5.6.1.32.25.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10008764 PKID 522458	0.2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23	$ 1,207,801	2291
2293	1.5.6.1.32.26	ITEM - 266 / CIV 10008844 PKID 522475 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64F HASTA CALLE 64C / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	1.2 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23	$ 114,203,506	
2294	1.5.6.1.32.26.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	$ 994,340	2292
2295	1.5.6.1.32.26.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	$ 10,627,032	2294
2296	1.5.6.1.32.26.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	$ 4,371,604	2295
2297	1.5.6.1.32.26.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	$ 2,705,576	2296
2298	1.5.6.1.32.26.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.2 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	$ 93,564,356	2297
2299	1.5.6.1.32.26.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10008844 PKID 522475	0.2 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23	$ 1,940,598	2298
2300	1.5.6.1.32.27	ITEM - 120 / CIV 10008212 PKID 522350 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 66A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	7.2 días	vie 11/08/23	sáb 19/08/23	$ 9,775,561	
2301	1.5.6.1.32.27.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	1.2 días	vie 11/08/23	sáb 12/08/23	$ 82,631	2299
2302	1.5.6.1.32.27.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1.2 días	sáb 12/08/23	lun 14/08/23	$ 889,201	2301
2303	1.5.6.1.32.27.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	1.2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 365,788	2302
2304	1.5.6.1.32.27.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	1.2 días	mar 15/08/23	mié 16/08/23	$ 225,574	2303
2305	1.5.6.1.32.27.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	1.2 días	mié 16/08/23	jue 17/08/23	$ 7,828,862	2304
2306	1.5.6.1.32.27.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009437 PKID 91016795	1.2 días	jue 17/08/23	sáb 19/08/23	$ 383,505	2305
2307	1.5.6.1.32.28	ITEM - 100 / CIV 10007798 PKID 522263 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71A HASTA CALLE 71 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	51.83 días	vie 22/09/23	jue 23/11/23	$ 390,346,924	
2308	1.5.6.1.32.28.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.5 días	vie 22/09/23	sáb 23/09/23	$ 1,005,967	2306FC+30 días
2309	1.5.6.1.32.28.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	$ 32,019,054	2308
2310	1.5.6.1.32.28.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.5 días	lun 25/09/23	mar 26/09/23	$ 13,171,560	2309
2311	1.5.6.1.32.28.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.5 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23	$ 5,505,027	2310
2312	1.5.6.1.32.28.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	1 día	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 135,665,638	2311
2313	1.5.6.1.32.28.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	1 día	mié 27/09/23	jue 28/09/23	$ 178,676,430	2312
2314	1.5.6.1.32.28.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.6 días	jue 28/09/23	jue 28/09/23	$ 23,813,922	2313
2315	1.5.6.1.32.28.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 489,326	548
2316	1.5.6.1.32.29	ITEM - 254 / CIV 10007678 PKID 91060014 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 71A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	2.8 días	jue 28/09/23	lun 2/10/23	$ 118,531,875	
2317	1.5.6.1.32.29.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 28/09/23	vie 29/09/23	$ 521,993	2314
2318	1.5.6.1.32.29.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 9,176,247	2317
2319	1.5.6.1.32.29.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 3,774,800	2318
2320	1.5.6.1.32.29.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 2,856,678	2319
2321	1.5.6.1.32.29.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 38,617,669	2320
2322	1.5.6.1.32.29.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	vie 29/09/23	sáb 30/09/23	$ 62,287,574	2321
2323	1.5.6.1.32.29.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	1.2 días	sáb 30/09/23	lun 2/10/23	$ 1,296,914	2322
2324	1.5.6.1.32.30	ITEM - 227 / CIV 10007937 PKID 522290 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 71 HASTA CALLE 70 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	44.43 días	lun 2/10/23	vie 24/11/23	$ 265,586,608	
2325	1.5.6.1.32.30.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.6 días	lun 2/10/23	mar 3/10/23	$ 969,093	2323
2326	1.5.6.1.32.30.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.6 días	mar 3/10/23	mar 3/10/23	$ 23,377,965	2325
2327	1.5.6.1.32.30.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	mar 3/10/23	mié 4/10/23	$ 9,616,911	2326
2328	1.5.6.1.32.30.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.6 días	mié 4/10/23	mié 4/10/23	$ 5,302,991	2327
2329	1.5.6.1.32.30.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.6 días	mié 4/10/23	jue 5/10/23	$ 97,820,044	2328
2330	1.5.6.1.32.30.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.6 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23	$ 71,821,073	2329
2331	1.5.6.1.32.30.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.6 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 55,375,252	2330
2332	1.5.6.1.32.30.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	jue 23/11/23	vie 24/11/23	$ 1,303,279	2315
2333	1.5.6.1.32.31	ITEM - 243 / CIV 10011883 PKID 522244 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 72 HASTA CALLE 72 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	2.8 días	vie 6/10/23	mar 10/10/23	$ 139,425,583	
2334	1.5.6.1.32.31.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 564,067	2331
2335	1.5.6.1.32.31.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	vie 6/10/23	sáb 7/10/23	$ 10,656,721	2334
2336	1.5.6.1.32.31.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	sáb 7/10/23	lun 9/10/23	$ 4,383,815	2335
2337	1.5.6.1.32.31.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.4 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	$ 3,028,182	2336
2338	1.5.6.1.32.31.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	$ 40,728,789	2337
2339	1.5.6.1.32.31.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 9/10/23	mar 10/10/23	$ 78,769,482	2338
2340	1.5.6.1.32.31.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	mar 10/10/23	mar 10/10/23	$ 1,294,527	2339
2341	1.5.6.1.32.32	ITEM - 139 / CIV 10010137 PKID 522822 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 70 HASTA CALLE 69B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	37.93 días	mar 10/10/23	vie 24/11/23	$ 139,147,445	
2342	1.5.6.1.32.32.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	mar 10/10/23	mar 10/10/23	$ 594,573	2340
2343	1.5.6.1.32.32.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	$ 10,783,234	2342
2344	1.5.6.1.32.32.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 4,435,861	2343
2345	1.5.6.1.32.32.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.4 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 3,250,856	2344
2346	1.5.6.1.32.32.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	mié 11/10/23	jue 12/10/23	$ 45,527,004	2345
2347	1.5.6.1.32.32.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 74,006,917	2346
2348	1.5.6.1.32.32.7	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 549,000	2332
2349	1.5.6.1.32.33	ITEM - 214 / CIV 10008010 PKID 522306 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69B HASTA CALLE 69A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	36.03 días	jue 12/10/23	sáb 25/11/23	$ 85,384,721	
2350	1.5.6.1.32.33.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 403,645	2347
2351	1.5.6.1.32.33.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 6,618,413	2350


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2352	1.5.6.1.32.33.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 12/10/23	vie 13/10/23	$ 2,722,593	2351
2353	1.5.6.1.32.33.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	vie 13/10/23	vie 13/10/23	$ 2,208,206	2352
2354	1.5.6.1.32.33.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	vie 13/10/23	vie 13/10/23	$ 27,557,879	2353
2355	1.5.6.1.32.33.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	vie 13/10/23	sáb 14/10/23	$ 45,359,198	2354
2356	1.5.6.1.32.33.7	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	vie 24/11/23	sáb 25/11/23	$ 514,787	2348
2357	1.5.6.1.32.34	ITEM - 268 / CIV 10008150 PKID 522333 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 69A HASTA CALLE 68B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA (AJUSTE DE DIAGNOSTICO)	34.93 días	sáb 14/10/23	lun 27/11/23	$ 191,592,973	
2358	1.5.6.1.32.34.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.6 días	sáb 14/10/23	mar 17/10/23	$ 941,813	2355
2359	1.5.6.1.32.34.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.6 días	mar 17/10/23	mar 17/10/23	$ 15,168,942	2358
2360	1.5.6.1.32.34.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	$ 6,239,993	2359
2361	1.5.6.1.32.34.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.6 días	mié 18/10/23	mié 18/10/23	$ 5,147,159	2360
2362	1.5.6.1.32.34.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.6 días	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 65,739,463	2361
2363	1.5.6.1.32.34.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.6 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	$ 88,818,948	2362
2364	1.5.6.1.32.34.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	jue 19/10/23	jue 19/10/23	$ 8,399,667	2363
2365	1.5.6.1.32.34.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	sáb 25/11/23	lun 27/11/23	$ 1,136,988	2356
2366	1.5.6.1.32.35	ITEM - 189 / CIV 10009084 PKID 522548 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63D HASTA CALLE 63B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	33.63 días	jue 19/10/23	mié 29/11/23	$ 89,766,547	
2367	1.5.6.1.32.35.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 486,196	2364
2368	1.5.6.1.32.35.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 8,510,122	2367
2369	1.5.6.1.32.35.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 3,500,779	2368
2370	1.5.6.1.32.35.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 2,654,978	2369
2371	1.5.6.1.32.35.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	$ 30,831,416	2370
2372	1.5.6.1.32.35.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	vie 20/10/23	sáb 21/10/23	$ 7,026,739	2371
2373	1.5.6.1.32.35.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	sáb 21/10/23	sáb 21/10/23	$ 36,372,017	2372
2374	1.5.6.1.32.35.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23	$ 384,300	2401
2375	1.5.6.1.32.36	ITEM - 116 / CIV 10009132 PKID 522573 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63B HASTA CALLE 63 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	32.33 días	sáb 21/10/23	mié 29/11/23	$ 128,866,275	
2376	1.5.6.1.32.36.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 21/10/23	lun 23/10/23	$ 688,674	2373
2377	1.5.6.1.32.36.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	$ 11,094,761	2376
2378	1.5.6.1.32.36.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	$ 4,564,013	2377
2379	1.5.6.1.32.36.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	$ 3,766,469	2378
2380	1.5.6.1.32.36.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	$ 47,028,773	2379
2381	1.5.6.1.32.36.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 23/10/23	mar 24/10/23	$ 37,475,938	2380
2382	1.5.6.1.32.36.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 23,374,020	2381
2383	1.5.6.1.32.36.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mié 29/11/23	mié 29/11/23	$ 873,627	2374
2384	1.5.6.1.32.37	ITEM - 154 / CIV 10009018 PKID 522517 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64 HASTA CALLE 63F / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	29.03 días	mar 24/10/23	mar 28/11/23	$ 92,773,450	
2385	1.5.6.1.32.37.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 407,949	2382
2386	1.5.6.1.32.37.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	$ 8,024,235	2385
2387	1.5.6.1.32.37.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 24/10/23	mié 25/10/23	$ 3,300,901	2386
2388	1.5.6.1.32.37.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 2,215,899	2387
2389	1.5.6.1.32.37.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 34,234,988	2388
2390	1.5.6.1.32.37.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 27,835,642	2389
2391	1.5.6.1.32.37.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	mié 25/10/23	jue 26/10/23	$ 16,241,436	2390
2392	1.5.6.1.32.37.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 512,400	2418
2393	1.5.6.1.32.38	ITEM - 135 / CIV 10009040 PKID 522531 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 63F HASTA CALLE 63D / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	27.73 días	jue 26/10/23	mar 28/11/23	$ 56,687,978	
2394	1.5.6.1.32.38.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 276,699	2391
2395	1.5.6.1.32.38.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 4,730,318	2394
2396	1.5.6.1.32.38.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 1,945,894	2395
2397	1.5.6.1.32.38.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	$ 1,502,123	2396
2398	1.5.6.1.32.38.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	jue 26/10/23	vie 27/10/23	$ 22,354,448	2397
2399	1.5.6.1.32.38.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 15,554,466	2398
2400	1.5.6.1.32.38.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 9,864,143	2399
2401	1.5.6.1.32.38.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 459,887	2392
2402	1.5.6.1.32.39	ITEM - 155 / CIV 10008900 PKID 522495 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64C HASTA CALLE 64B / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	24.43 días	vie 27/10/23	lun 27/11/23	$ 85,727,682	
2403	1.5.6.1.32.39.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	$ 443,067	2400
2404	1.5.6.1.32.39.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 27/10/23	sáb 28/10/23	$ 6,553,648	2403
2405	1.5.6.1.32.39.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	sáb 28/10/23	sáb 28/10/23	$ 2,695,950	2404
2406	1.5.6.1.32.39.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	sáb 28/10/23	sáb 28/10/23	$ 2,398,809	2405
2407	1.5.6.1.32.39.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	sáb 28/10/23	lun 30/10/23	$ 26,914,680	2406
2408	1.5.6.1.32.39.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	$ 45,469,171	2407
2409	1.5.6.1.32.39.7	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	$ 1,252,357	2365
2410	1.5.6.1.32.40	ITEM - 118 / CIV 10008970 PKID 522506 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 64B HASTA CALLE 64 / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	23.33 días	lun 30/10/23	mar 28/11/23	$ 128,382,771	
2411	1.5.6.1.32.40.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	$ 703,156	2408
2412	1.5.6.1.32.40.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	$ 11,235,174	2411
2413	1.5.6.1.32.40.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 30/10/23	mar 31/10/23	$ 4,621,775	2412
2414	1.5.6.1.32.40.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	0.2 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 3,839,649	2413
2415	1.5.6.1.32.40.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	0.4 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 47,963,595	2414
2416	1.5.6.1.32.40.6	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	$ 30,531,108	2415
2417	1.5.6.1.32.40.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	mar 31/10/23	mié 1/11/23	$ 28,000,444	2416
2418	1.5.6.1.32.40.8	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.5 días	lun 27/11/23	mar 28/11/23	$ 1,487,870	2409
2419	1.5.6.1.32.41	ITEM - 120 / CIV 10008212 PKID 522350 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 66A HASTA CALLE 66A / CALZADA Norte-Sur RÁPIDA	10.4 días	mar 5/03/24	sáb 16/03/24	$ 619,719,726	
2420	1.5.6.1.32.41.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.8 días	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 2,525,710	2417FC+105 días
2421	1.5.6.1.32.41.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 48,303,060	2420
2422	1.5.6.1.32.41.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	2 días	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 25,831,057	2421
2423	1.5.6.1.32.41.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR-1	1.5 días	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 13,836,497	2422
2424	1.5.6.1.32.41.5	3.030 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO	2 días	lun 11/03/24	mié 13/03/24	$ 314,053,910	2423
2425	1.5.6.1.32.41.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE MD19	1.5 días	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 212,638,523	2424
2426	1.5.6.1.32.41.7	3.011 - CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO)	0.8 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 51,095	2425
2427	1.5.6.1.32.41.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.8 días	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 2,479,874	2426
2428	1.5.6.1.33	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 14 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 26 Y CALLE 72 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24	$ 0	2041;2213;2227;2243;2257;2
2429	1.5.6.1.34	FRENTE DE OBRA No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)	18.1 días	lun 10/07/23	lun 31/07/23	$ 278,782,119	
2430	1.5.6.1.34.1	*PMTs para intervención en Frente de obra No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 0	2122
2431	1.5.6.1.34.2	*Actividades sociales para intervención en Frente de obra No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 0	2430
2432	1.5.6.1.34.3	*Listas de chequeo ambientales, sst y sociales previas a intervención en Frente de obra No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 0	2431
2433	1.5.6.1.34.4	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 0	2432
2434	1.5.6.1.34.5	ITEM - / CIV 9005046 PKID 91033865 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CANAL SAN FRANCISCO / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 13,718,686	2433
2435	1.5.6.1.34.6	ITEM - 34 / CIV 9003744 PKID 602383 - AV. BOYACÁ DESDE CANAL SAN FRANCISCO HASTA CALLE 21 / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 10/07/23	lun 10/07/23	$ 80,206,470	2434CC
2436	1.5.6.1.34.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 9003744 PKID 602383	0.2 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23	$ 1,398,757	2435
2437	1.5.6.1.34.8	ITEM - 203 / CIV 10009721 PKID 528060 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 26 HASTA CALLE 25G / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.2 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	$ 158,134,025	2435FC+16.5 días
2438	1.5.6.1.34.8.1	3.013 - SELLO DE JUNTAS / CIV 10009721 PKID 528060	0.2 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	$ 2,347,175	2435
2439	1.5.6.1.34.9	ITEM - 56 / CIV 9004932 PKID 91024386 - AV. BOYACÁ DESDE CALLE 25G HASTA CALLE 25B / CALZADA Norte-Sur Rápida	0.7 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 25,324,181	2438
2440	1.5.6.1.35	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 15 - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26 (CALZADA RÁPIDA NS)*	0 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 0	2083;2436
2441	1.5.6.1.36	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 16 - CALLE 170 ENTRE CANAL CORDOBA Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	0 días	mié 19/04/23	mié 19/04/23	$ 0	923FC+34 días
2442	1.5.6.1.37	FRENTE DE OBRA No. 16 - CALLE 170 ENTRE CANAL CÓRDOBA Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)	29.8 días	mié 19/04/23	jue 25/05/23	$ 666,520,150	
2443	1.5.6.1.37.1	CIV 11001738 - PKID 507618 - CALLE 170 ENTRE CANAL CORDOBA Y CARRERA 51A	4.1 días	mié 19/04/23	lun 24/04/23	$ 190,743,801	
2444	1.5.6.1.37.1.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23	$ 1,788,797	2441
2445	1.5.6.1.37.1.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 20/04/23	jue 20/04/23	$ 21,362,613	2444
2446	1.5.6.1.37.1.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23	$ 8,787,859	2445
2447	1.5.6.1.37.1.4	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 21/04/23	sáb 22/04/23	$ 2,183,657	2446
2448	1.5.6.1.37.1.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	sáb 22/04/23	lun 24/04/23	$ 4,972,112	2447
2449	1.5.6.1.37.1.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	$ 147,993,535	2448
2450	1.5.6.1.37.1.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	$ 3,655,228	2449
2451	1.5.6.1.37.2	CIV 11014043 - PKID 91011972 - CALLE 170 ENTRE CARRERA 51A Y CARRERA 49B	4.1 días	lun 24/04/23	vie 28/04/23	$ 110,481,754	
2452	1.5.6.1.37.2.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23	$ 725,336	2450
2453	1.5.6.1.37.2.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mar 25/04/23	mar 25/04/23	$ 8,614,681	2452
2454	1.5.6.1.37.2.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 25/04/23	mié 26/04/23	$ 3,543,793	2453
2455	1.5.6.1.37.2.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23	$ 3,756,983	2454
2456	1.5.6.1.37.2.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	jue 27/04/23	jue 27/04/23	$ 50,594,986	2455
2457	1.5.6.1.37.2.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23	$ 41,590,222	2456
2458	1.5.6.1.37.2.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 1,655,753	2457
2459	1.5.6.1.37.3	CIV 11001853 - PKID 507611 - CALLE 170 ENTRE CARRERA 49B Y CARRERA 49A	4.1 días	vie 28/04/23	jue 4/05/23	$ 46,968,942	
2460	1.5.6.1.37.3.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	$ 340,873	2458
2461	1.5.6.1.37.3.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 28/04/23	sáb 29/04/23	$ 4,075,686	2460
2462	1.5.6.1.37.3.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	sáb 29/04/23	mar 2/05/23	$ 1,676,600	2461
2463	1.5.6.1.37.3.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 1,233,431	2462
2464	1.5.6.1.37.3.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 3/05/23	mié 3/05/23	$ 8,499,914	2463
2465	1.5.6.1.37.3.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23	$ 30,128,777	2464
2466	1.5.6.1.37.3.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,013,661	2465
2467	1.5.6.1.37.4	CIV 11012160 - PKID 509698 - CALLE 170 ENTRE CARRERA 49A Y AUTOPISTA NORTE	4.1 días	jue 4/05/23	mar 9/05/23	$ 188,288,676	
2468	1.5.6.1.37.4.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 1,406,115	2466
2469	1.5.6.1.37.4.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23	$ 16,813,801	2468
2470	1.5.6.1.37.4.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 5/05/23	sáb 6/05/23	$ 6,916,636	2469
2471	1.5.6.1.37.4.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	sáb 6/05/23	lun 8/05/23	$ 3,852,313	2470
2472	1.5.6.1.37.4.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	lun 8/05/23	lun 8/05/23	$ 27,777,575	2471
2473	1.5.6.1.37.4.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 8/05/23	mar 9/05/23	$ 129,215,639	2472

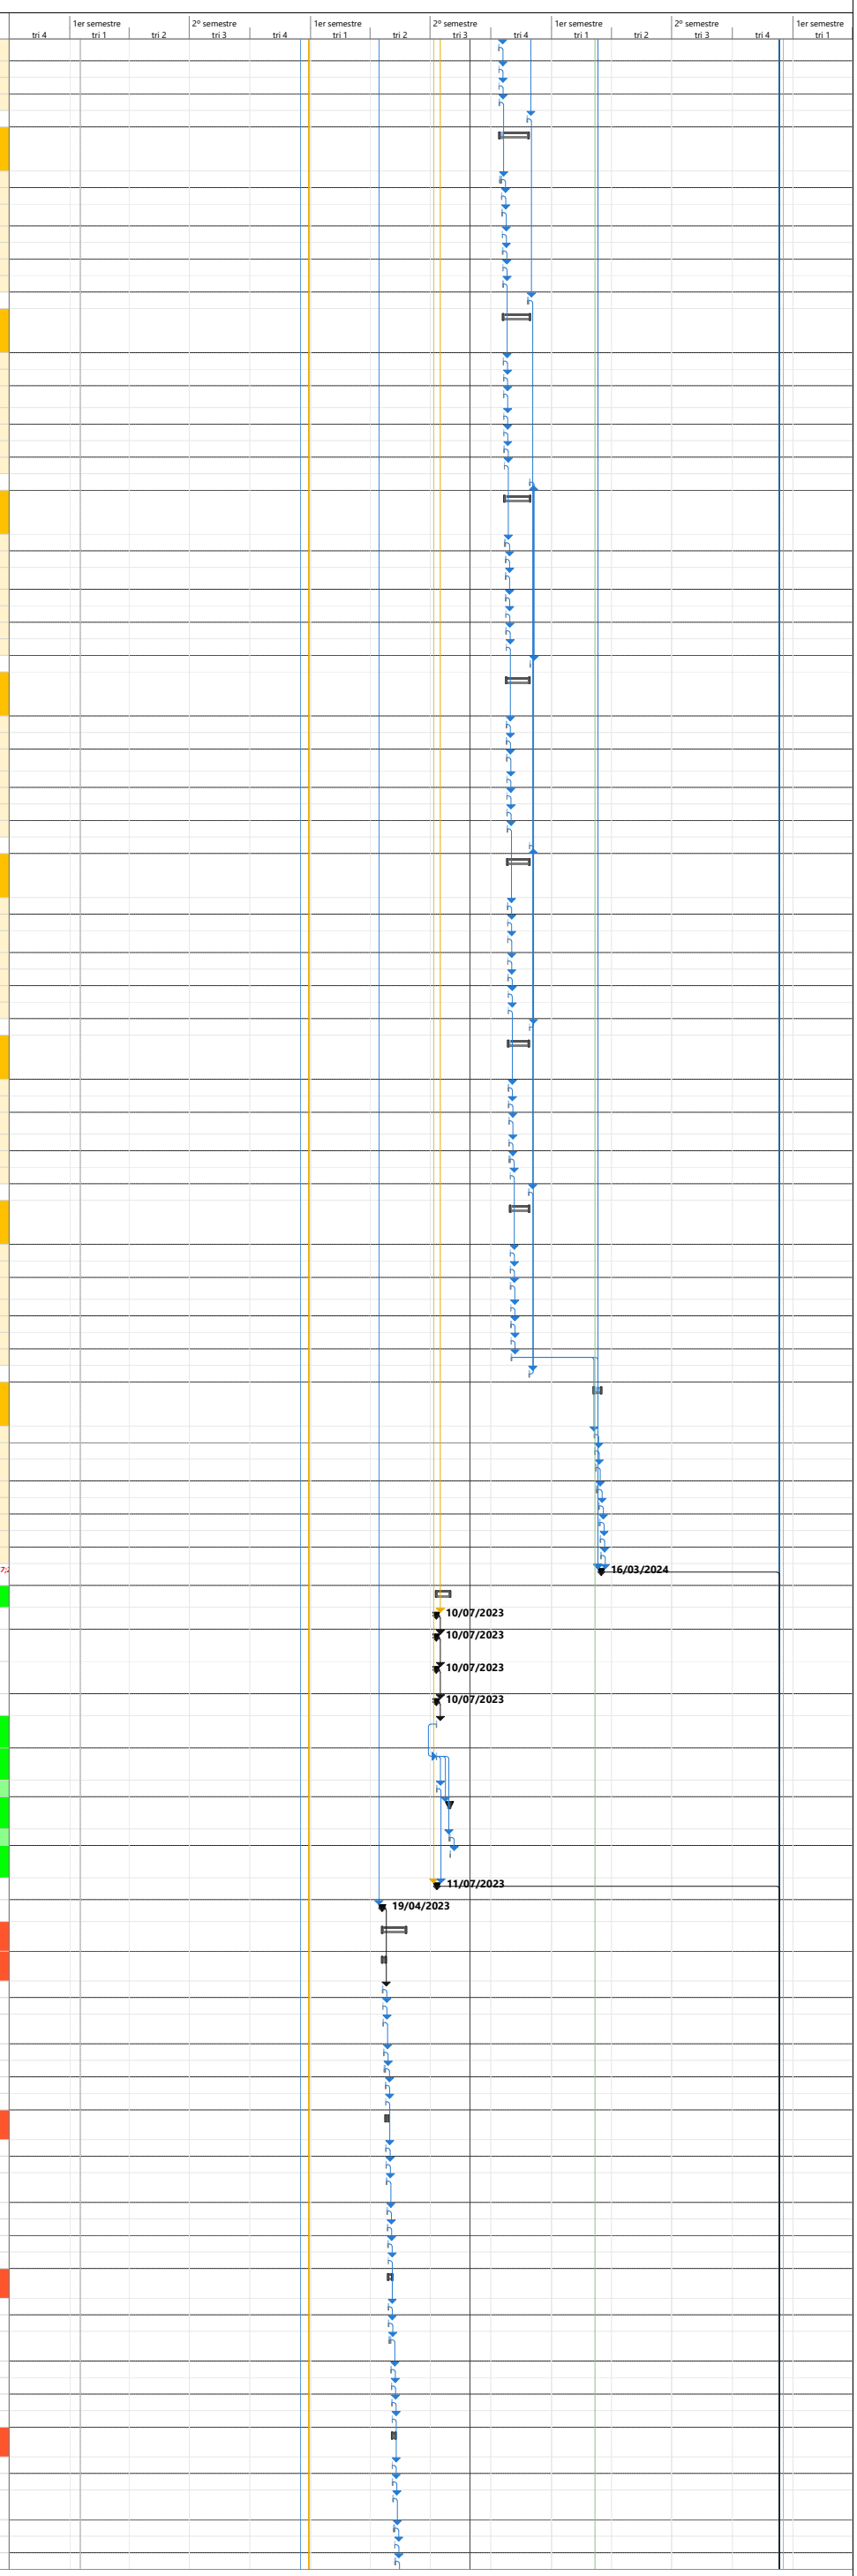


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2474	1.5.6.1.37.4.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 2,306,597	2473
2475	**1.5.6.1.37.5**	**CIV 11012275 - PKID 509712 - CALLE 170 ENTRE CARRERA 49A Y AUTOPISTA NORTE (CONECTANTE WS)**	**3.3 días**	**mar 9/05/23**	**vie 12/05/23**	**$ 60,158,934**	
2476	1.5.6.1.37.5.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 588,921	2474
2477	1.5.6.1.37.5.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mar 9/05/23	mié 10/05/23	$ 5,632,840	2476
2478	1.5.6.1.37.5.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	$ 2,317,160	2477
2479	1.5.6.1.37.5.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 11/05/23	jue 11/05/23	$ 1,613,456	2478
2480	1.5.6.1.37.5.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 49,593,613	2479
2481	1.5.6.1.37.5.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 412,944	2480
2482	**1.5.6.1.37.6**	**CIV 11002105- PKID 169143 - CALLE 169 ENTRE CARRERA 45A Y AUTOPISTA NORTE (CONECTANTE WS)**	**3.3 días**	**vie 12/05/23**	**mié 17/05/23**	**$ 47,159,633**	
2483	1.5.6.1.37.6.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	$ 460,345	2481
2484	1.5.6.1.37.6.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23	$ 4,290,796	2483
2485	1.5.6.1.37.6.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	lun 15/05/23	lun 15/05/23	$ 1,765,087	2484
2486	1.5.6.1.37.6.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	lun 15/05/23	mar 16/05/23	$ 1,229,772	2485
2487	1.5.6.1.37.6.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 16/05/23	mar 16/05/23	$ 37,777,771	2486
2488	1.5.6.1.37.6.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 1,635,862	2487
2489	**1.5.6.1.37.7**	**CIV 11001568- PKID 24120332 - CALLE 170 RETORNO CARRERA 56 AL OCCIDENTE**	**3.3 días**	**mié 17/05/23**	**sáb 20/05/23**	**$ 855,484**	
2490	1.5.6.1.37.7.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 7,578	2488
2491	1.5.6.1.37.7.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mié 17/05/23	mié 17/05/23	$ 72,478	2490
2492	1.5.6.1.37.7.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23	$ 29,815	2491
2493	1.5.6.1.37.7.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23	$ 20,760	2492
2494	1.5.6.1.37.7.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	vie 19/05/23	vie 19/05/23	$ 638,127	2493
2495	1.5.6.1.37.7.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 19/05/23	sáb 20/05/23	$ 86,726	2494
2496	**1.5.6.1.37.8**	**CIV 11001503- PKID 24120330 - CALLE 170 RETORNO CARRERA 58 AL OCCIDENTE**	**3.5 días**	**sáb 20/05/23**	**jue 25/05/23**	**$ 21,862,926**	
2497	1.5.6.1.37.8.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 20/05/23	sáb 20/05/23	$ 214,359	2495
2498	1.5.6.1.37.8.2	3.011 CORTE DE PAVIMENTO	0.2 días	sáb 20/05/23	sáb 20/05/23	$ 16,051	2497
2499	1.5.6.1.37.8.3	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	sáb 20/05/23	mar 23/05/23	$ 2,016,103	2498
2500	1.5.6.1.37.8.4	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 23/05/23	mié 24/05/23	$ 829,356	2499
2501	1.5.6.1.37.8.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 24/05/23	mié 24/05/23	$ 577,447	2500
2502	1.5.6.1.37.8.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23	$ 17,750,518	2501
2503	1.5.6.1.37.8.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 25/05/23	jue 25/05/23	$ 459,092	2502
2504	*1.5.6.1.38*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 16 - CALLE 170 ENTRE CANAL CORDOBA Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*jue 25/05/23*	*jue 25/05/23*	*$ 0*	*2503*
2505	*1.5.6.1.39*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 17 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*sáb 6/05/23*	*sáb 6/05/23*	*$ 0*	*2504FC-16 días*
2506	**1.5.6.1.40**	**FRENTE DE OBRA No. 17 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)**	**187.5 días**	**sáb 6/05/23**	**vie 15/12/23**	**$ 2,064,904,067**	
2507	**1.5.6.1.40.1**	**CIV 11007370 - PKID 516242 - CALLE 138 ENTRE AVENIDA BOYACÁ Y CARRERA 59A**	**4.1 días**	**sáb 6/05/23**	**jue 11/05/23**	**$ 76,088,332**	
2508	1.5.6.1.40.1.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 6/05/23	sáb 6/05/23	$ 487,810	2505
2509	1.5.6.1.40.1.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	sáb 6/05/23	lun 8/05/23	$ 5,775,243	2508
2510	1.5.6.1.40.1.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	lun 8/05/23	mar 9/05/23	$ 2,375,740	2509
2511	1.5.6.1.40.1.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 9/05/23	mar 9/05/23	$ 2,646,612	2510
2512	1.5.6.1.40.1.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mar 9/05/23	mié 10/05/23	$ 37,549,234	2511
2513	1.5.6.1.40.1.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 10/05/23	mié 10/05/23	$ 25,423,692	2512
2514	1.5.6.1.40.1.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23	$ 1,830,001	2513
2515	**1.5.6.1.40.2**	**CIV 11012201 - PKID 516204 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 59A Y CARRERA 58D**	**4.9 días**	**lun 5/06/23**	**vie 9/06/23**	**$ 162,159,337**	
2516	1.5.6.1.40.2.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 1,112,109	2514;2684
2517	1.5.6.1.40.2.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 5/06/23	mar 6/06/23	$ 13,236,628	2516
2518	1.5.6.1.40.2.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23	$ 5,445,103	2517
2519	1.5.6.1.40.2.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 6,065,930	2518
2520	1.5.6.1.40.2.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 7/06/23	jue 8/06/23	$ 57,676,965	2519
2521	1.5.6.1.40.2.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 8/06/23	vie 9/06/23	$ 58,270,104	2520
2522	1.5.6.1.40.2.7	3.028 MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.8 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 17,770,606	2521
2523	1.5.6.1.40.2.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 2,581,892	2522
2524	**1.5.6.1.40.3**	**CIV 11007601 - PKID 516207 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58A Y CARRERA 58**	**4.1 días**	**vie 9/06/23**	**vie 16/06/23**	**$ 86,362,461**	
2525	1.5.6.1.40.3.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 9/06/23	sáb 10/06/23	$ 556,616	2523;2692
2526	1.5.6.1.40.3.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 6,632,609	2525
2527	1.5.6.1.40.3.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 2,728,431	2526
2528	1.5.6.1.40.3.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	$ 3,039,517	2527
2529	1.5.6.1.40.3.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 14/06/23	jue 15/06/23	$ 43,123,626	2528
2530	1.5.6.1.40.3.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 29,197,983	2529
2531	1.5.6.1.40.3.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23	$ 1,083,679	2530
2532	**1.5.6.1.40.4**	**CIV 11014812 - PKID 91034469 - CALLE 138 ENTRE CANAL CORDOBA Y CARRERA 53A**	**4.1 días**	**vie 16/06/23**	**jue 22/06/23**	**$ 29,445,898**	
2533	1.5.6.1.40.4.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 194,586	2531;2700
2534	1.5.6.1.40.4.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 16/06/23	vie 16/06/23	$ 2,271,921	2533
2535	1.5.6.1.40.4.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 16/06/23	mar 20/06/23	$ 934,593	2534
2536	1.5.6.1.40.4.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	$ 1,041,150	2535
2537	1.5.6.1.40.4.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mar 20/06/23	mié 21/06/23	$ 14,771,487	2536
2538	1.5.6.1.40.4.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 21/06/23	mié 21/06/23	$ 10,001,422	2537
2539	1.5.6.1.40.4.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23	$ 230,739	2538
2540	**1.5.6.1.40.5**	**CIV 11008157 - PKID 516228 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 53A Y CARRERA 53**	**4.1 días**	**jue 22/06/23**	**mar 27/06/23**	**$ 20,707,849**	
2541	1.5.6.1.40.5.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 131,816	2539
2542	1.5.6.1.40.5.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	$ 1,571,959	2541
2543	1.5.6.1.40.5.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	$ 646,651	2542
2544	1.5.6.1.40.5.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 23/06/23	sáb 24/06/23	$ 720,380	2543
2545	1.5.6.1.40.5.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23	$ 10,220,499	2544
2546	1.5.6.1.40.5.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 26/06/23	mar 27/06/23	$ 6,920,057	2545
2547	1.5.6.1.40.5.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 496,487	2546
2548	**1.5.6.1.40.6**	**CIV 11018198 - PKID 516210 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 52A**	**4.1 días**	**mar 27/06/23**	**vie 30/06/23**	**$ 95,269,196**	
2549	1.5.6.1.40.6.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	$ 615,144	2547
2550	1.5.6.1.40.6.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mar 27/06/23	mié 28/06/23	$ 7,341,126	2549
2551	1.5.6.1.40.6.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 3,019,893	2550
2552	1.5.6.1.40.6.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 28/06/23	jue 29/06/23	$ 3,364,208	2551
2553	1.5.6.1.40.6.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	$ 47,730,234	2552
2554	1.5.6.1.40.6.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23	$ 32,317,008	2553
2555	1.5.6.1.40.6.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 30/06/23	vie 30/06/23	$ 881,583	2554
2556	**1.5.6.1.40.7**	**CIV 11008253 - PKID 516171 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 52A Y CARRERA 50**	**4.1 días**	**vie 30/06/23**	**jue 6/07/23**	**$ 95,206,768**	
2557	1.5.6.1.40.7.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 30/06/23	sáb 1/07/23	$ 612,499	2555
2558	1.5.6.1.40.7.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	$ 7,286,553	2557
2559	1.5.6.1.40.7.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 4/07/23	mar 4/07/23	$ 2,997,444	2558
2560	1.5.6.1.40.7.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23	$ 3,339,199	2559
2561	1.5.6.1.40.7.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 5/07/23	jue 6/07/23	$ 47,375,409	2560
2562	1.5.6.1.40.7.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 32,076,763	2561
2563	1.5.6.1.40.7.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 6/07/23	jue 6/07/23	$ 1,518,901	2562
2564	**1.5.6.1.40.8**	**CIV 11008304 - PKID 516176 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 49**	**4.1 días**	**jue 6/07/23**	**mié 12/07/23**	**$ 81,821,794**	
2565	1.5.6.1.40.8.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 6/07/23	vie 7/07/23	$ 585,328	2563
2566	1.5.6.1.40.8.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 6,899,608	2565
2567	1.5.6.1.40.8.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23	$ 2,838,267	2566
2568	1.5.6.1.40.8.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	sáb 8/07/23	lun 10/07/23	$ 2,422,406	2567
2569	1.5.6.1.40.8.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23	$ 23,876,969	2568
2570	1.5.6.1.40.8.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 44,580,197	2569
2571	1.5.6.1.40.8.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	$ 619,019	2570
2572	**1.5.6.1.40.9**	**CIV 11008378 - PKID 516181 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 49 Y CARRERA 47**	**4.1 días**	**mié 12/07/23**	**lun 17/07/23**	**$ 86,438,555**	
2573	1.5.6.1.40.9.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 587,526	2571
2574	1.5.6.1.40.9.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 7,198,263	2573
2575	1.5.6.1.40.9.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	$ 2,961,122	2574
2576	1.5.6.1.40.9.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 13/07/23	vie 14/07/23	$ 2,422,344	2575
2577	1.5.6.1.40.9.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 24,242,248	2576
2578	1.5.6.1.40.9.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	vie 14/07/23	sáb 15/07/23	$ 46,962,333	2577
2579	1.5.6.1.40.9.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 15/07/23	lun 17/07/23	$ 2,064,719	2578
2580	**1.5.6.1.40.10**	**CIV 11008427 - PKID 516191 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 47 Y CARRERA 46A**	**4.1 días**	**lun 17/07/23**	**vie 21/07/23**	**$ 70,701,712**	
2581	1.5.6.1.40.10.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	$ 439,191	2579
2582	1.5.6.1.40.10.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	$ 5,768,473	2581
2583	1.5.6.1.40.10.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	lun 17/07/23	mar 18/07/23	$ 2,372,957	2582
2584	1.5.6.1.40.10.4	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23	$ 24,706,514	2583
2585	1.5.6.1.40.10.5	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 19/07/23	mié 19/07/23	$ 1,955,435	2584
2586	1.5.6.1.40.10.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 19/07/23	vie 21/07/23	$ 34,059,589	2585
2587	1.5.6.1.40.10.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 21/07/23	vie 21/07/23	$ 1,399,553	2586
2588	**1.5.6.1.40.11**	**CIV 11008450 - PKID 516196 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 46A Y CARRERA 46**	**4.1 días**	**vie 21/07/23**	**mié 26/07/23**	**$ 45,924,816**	
2589	1.5.6.1.40.11.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 21/07/23	vie 21/07/23	$ 280,195	2587
2590	1.5.6.1.40.11.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 21/07/23	lun 24/07/23	$ 3,504,591	2589
2591	1.5.6.1.40.11.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	lun 24/07/23	lun 24/07/23	$ 1,441,674	2590
2592	1.5.6.1.40.11.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	lun 24/07/23	mar 25/07/23	$ 1,535,293	2591
2593	1.5.6.1.40.11.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	$ 22,786,010	2592
2594	1.5.6.1.40.11.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 25/07/23	mié 26/07/23	$ 15,430,226	2593
2595	1.5.6.1.40.11.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	$ 946,827	2594
2596	**1.5.6.1.40.12**	**CIV 11008531 - PKID 516215 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 45 (AUTOPISTA NORTE)**	**4.1 días**	**mié 26/07/23**	**lun 31/07/23**	**$ 98,097,514**	
2597	1.5.6.1.40.12.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23	$ 714,436	2595
2598	1.5.6.1.40.12.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 8,486,629	2597
2599	1.5.6.1.40.12.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 3,491,117	2598

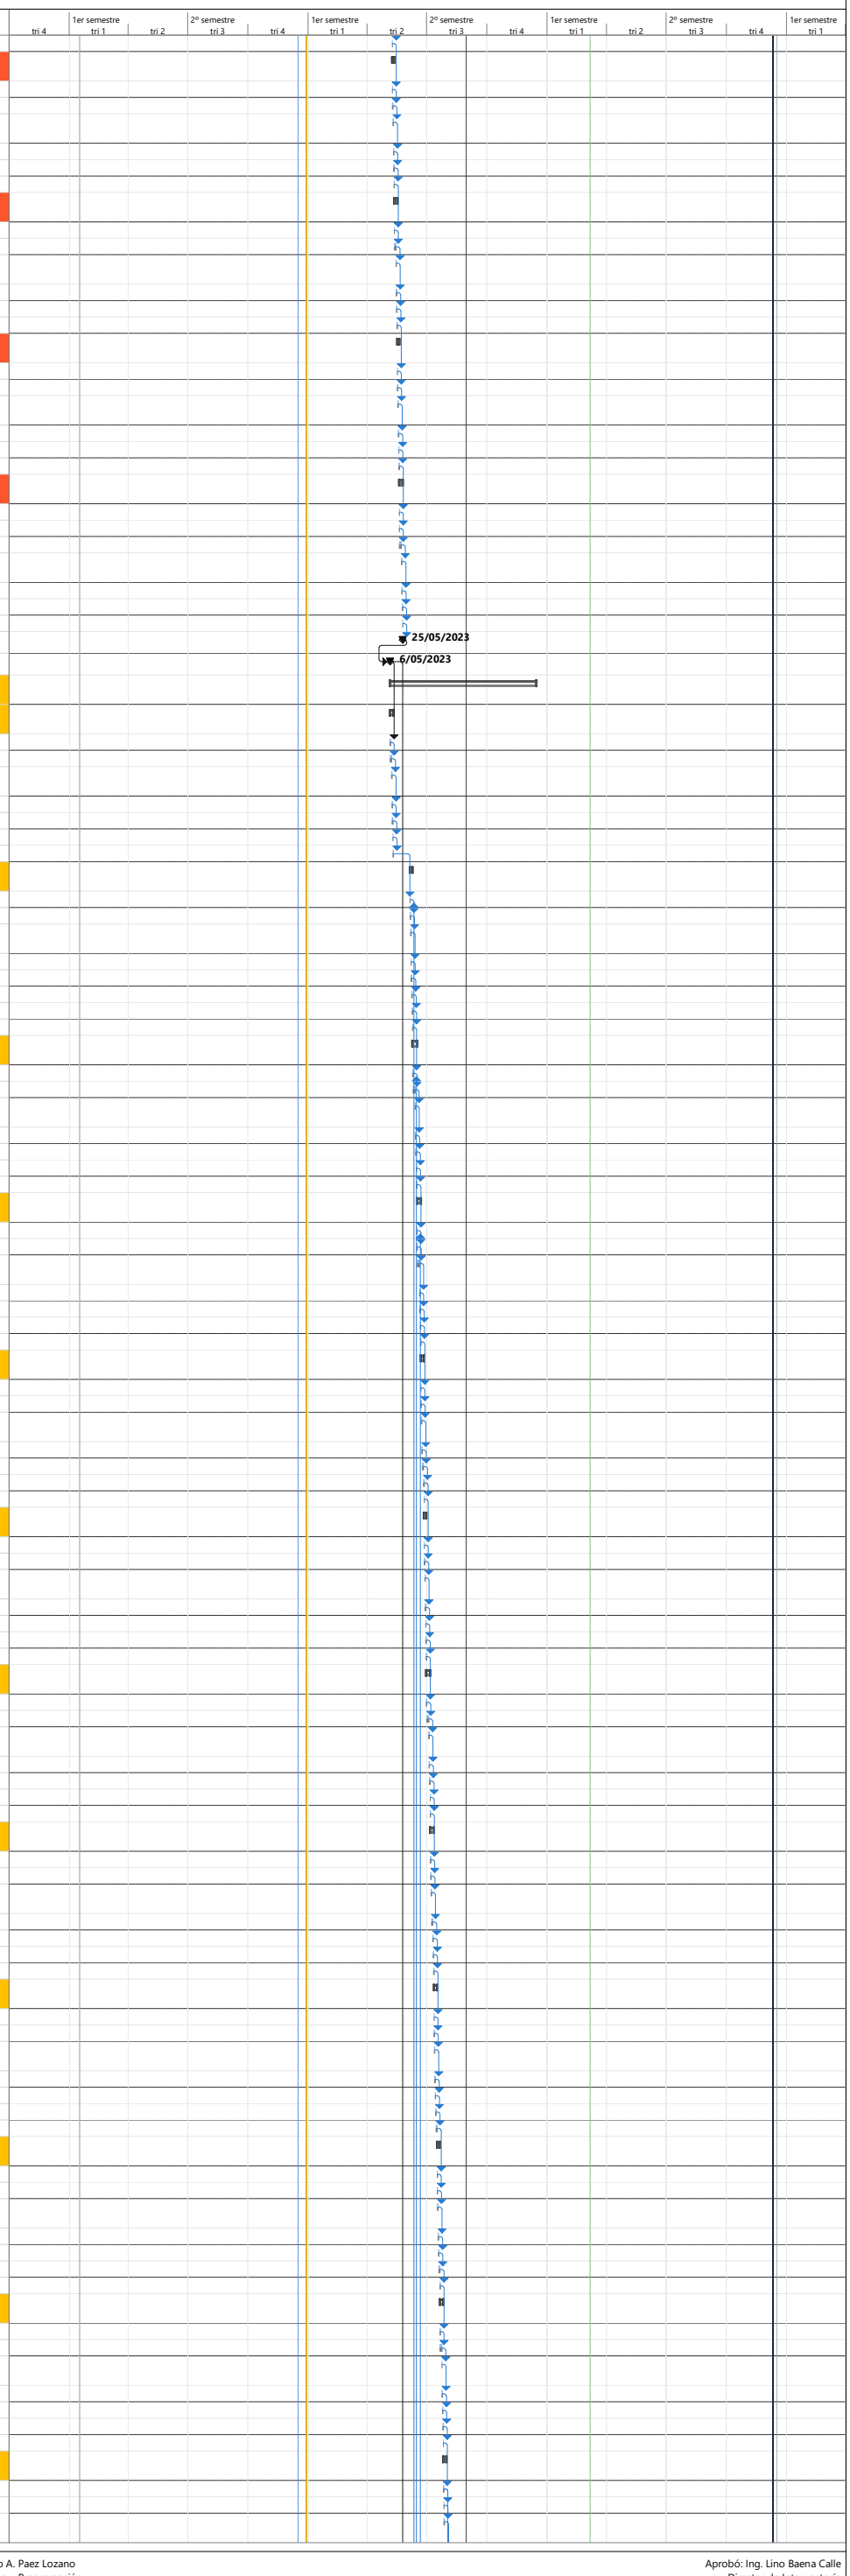


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2600	1.5.6.1.40.12.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	$ 2,635,032	2599
2601	1.5.6.1.40.12.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 28/07/23	lun 31/07/23	$ 19,591,914	2600
2602	1.5.6.1.40.12.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 61,456,594	2601
2603	1.5.6.1.40.12.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 1,721,792	2602
2604	**1.5.6.1.40.13**	**CIV 11014180 - PKID 24123200 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58D Y CARRERA 58A**	**4.9 días**	**jue 27/07/23**	**mar 1/08/23**	**$ 276,092,712**	
2605	1.5.6.1.40.13.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 1,211,189	2597
2606	1.5.6.1.40.13.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	$ 23,130,500	2605
2607	1.5.6.1.40.13.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 27/07/23	vie 28/07/23	$ 9,515,112	2606
2608	1.5.6.1.40.13.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 28/07/23	sáb 29/07/23	$ 6,636,535	2607
2609	1.5.6.1.40.13.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	sáb 29/07/23	lun 31/07/23	$ 92,274,735	2608
2610	1.5.6.1.40.13.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	$ 92,426,547	2609
2611	1.5.6.1.40.13.7	3.028 MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.8 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23	$ 45,071,530	2610
2612	1.5.6.1.40.13.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 5,826,564	2611
2613	**1.5.6.1.40.14**	**CIV 11007601 - PKID 24120409 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58**	**3.9 días**	**mar 1/08/23**	**sáb 5/08/23**	**$ 26,033,386**	
2614	1.5.6.1.40.14.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	$ 129,898	2612
2615	1.5.6.1.40.14.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mar 1/08/23	mié 2/08/23	$ 2,019,083	2614
2616	1.5.6.1.40.14.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mié 2/08/23	jue 3/08/23	$ 830,583	2615
2617	1.5.6.1.40.14.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 3/08/23	jue 3/08/23	$ 711,756	2616
2618	1.5.6.1.40.14.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23	$ 14,137,407	2617
2619	1.5.6.1.40.14.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	vie 4/08/23	sáb 5/08/23	$ 8,204,659	2618
2620	**1.5.6.1.40.15**	**ITEM 18 - CIV 11011895 - PKID 518368 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 57**	**8.6 días**	**jue 17/08/23**	**lun 28/08/23**	**$ 175,099,796**	
2621	1.5.6.1.40.15.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	$ 1,202,632	2619FC+9 días
2622	1.5.6.1.40.15.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1.6 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23	$ 14,334,384	2621
2623	1.5.6.1.40.15.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	1.6 días	vie 18/08/23	mar 22/08/23	$ 5,896,686	2622
2624	1.5.6.1.40.15.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	1 día	mar 22/08/23	mié 23/08/23	$ 6,568,971	2623
2625	1.5.6.1.40.15.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	1.6 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	$ 37,411,427	2624
2626	1.5.6.1.40.15.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1.6 días	vie 25/08/23	sáb 26/08/23	$ 77,816,382	2625
2627	1.5.6.1.40.15.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23	$ 28,878,456	2626
2628	1.5.6.1.40.15.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	$ 2,990,858	2627
2629	**1.5.6.1.40.16**	**ITEM 31 - CIV 11012221 - PKID 516186 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 54D Y CARRERA 54C**	**2 días**	**lun 28/08/23**	**mié 30/08/23**	**$ 46,615,386**	
2630	1.5.6.1.40.16.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	$ 324,242	2628
2631	1.5.6.1.40.16.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	$ 3,816,004	2630
2632	1.5.6.1.40.16.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 29/08/23	mar 29/08/23	$ 1,569,777	2631
2633	1.5.6.1.40.16.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	mar 29/08/23	mar 29/08/23	$ 1,748,757	2632
2634	1.5.6.1.40.16.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	mar 29/08/23	mar 29/08/23	$ 12,252,178	2633
2635	1.5.6.1.40.16.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	$ 16,798,762	2634
2636	1.5.6.1.40.16.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.2 días	mié 30/08/23	mié 30/08/23	$ 9,447,661	2635
2637	1.5.6.1.40.16.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 30/08/23	mié 30/08/23	$ 658,005	2636
2638	**1.5.6.1.40.17**	**ITEM 32 - CIV 11013326 - PKID 91019782 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 54C Y CARRERA 54 (AJUSTE DIAGNOSTICO)**	**3.2 días**	**jue 7/09/23**	**lun 11/09/23**	**$ 127,695,597**	
2639	1.5.6.1.40.17.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	jue 7/09/23	jue 7/09/23	$ 639,749	2637FC+7 días
2640	1.5.6.1.40.17.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	jue 7/09/23	jue 7/09/23	$ 9,903,544	2639
2641	1.5.6.1.40.17.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23	$ 4,073,986	2640
2642	1.5.6.1.40.17.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.4 días	vie 8/09/23	vie 8/09/23	$ 3,491,141	2641
2643	1.5.6.1.40.17.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 8/09/23	sáb 9/09/23	$ 69,343,564	2642
2644	1.5.6.1.40.17.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	sáb 9/09/23	lun 11/09/23	$ 40,243,613	2643
2645	**1.5.6.1.40.18**	**ITEM 27 - CIV 11012287 - PKID 517487 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 57 Y CARRERA 57**	**1.6 días**	**mar 5/12/23**	**jue 7/12/23**	**$ 19,227,425**	
2646	1.5.6.1.40.18.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 126,436	2644FC+73 días
2647	1.5.6.1.40.18.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 5/12/23	mié 6/12/23	$ 1,495,352	2646
2648	1.5.6.1.40.18.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 615,137	2647
2649	1.5.6.1.40.18.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 685,272	2648
2650	1.5.6.1.40.18.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 9,722,413	2649
2651	1.5.6.1.40.18.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mié 6/12/23	jue 7/12/23	$ 6,582,815	2650
2652	**1.5.6.1.40.19**	**ITEM 28 - CIV 11007803 - PKID 516245 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 57 Y CARRERA 56A**	**1.6 días**	**jue 7/12/23**	**sáb 9/12/23**	**$ 58,550,723**	
2653	1.5.6.1.40.19.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 380,868	2651
2654	1.5.6.1.40.19.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 4,553,921	2653
2655	1.5.6.1.40.19.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 1,873,331	2654
2656	1.5.6.1.40.19.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 2,086,895	2655
2657	1.5.6.1.40.19.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	jue 7/12/23	sáb 9/12/23	$ 29,608,497	2656
2658	1.5.6.1.40.19.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	sáb 9/12/23	sáb 9/12/23	$ 20,047,211	2657
2659	**1.5.6.1.40.20**	**ITEM 29 - CIV 11007850 - PKID 516223 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 56A Y CARRERA 56**	**1.6 días**	**sáb 9/12/23**	**mar 12/12/23**	**$ 54,407,142**	
2660	1.5.6.1.40.20.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	$ 353,949	2658
2661	1.5.6.1.40.20.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 4,231,628	2660
2662	1.5.6.1.40.20.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 1,740,751	2661
2663	1.5.6.1.40.20.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 1,939,371	2662
2664	1.5.6.1.40.20.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 27,513,026	2663
2665	1.5.6.1.40.20.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	$ 18,628,417	2664
2666	**1.5.6.1.40.21**	**ITEM 30 - CIV 11007937 - PKID 516250 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 56 Y CARRERA 54D**	**4 días**	**mar 12/12/23**	**vie 15/12/23**	**$ 332,957,668**	
2667	1.5.6.1.40.21.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.5 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	$ 2,184,861	2665
2668	1.5.6.1.40.21.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.5 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	$ 25,895,071	2667
2669	1.5.6.1.40.21.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.5 días	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 10,652,363	2668
2670	1.5.6.1.40.21.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 13/12/23	jue 14/12/23	$ 11,866,897	2669
2671	1.5.6.1.40.21.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 168,363,529	2670
2672	1.5.6.1.40.21.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 113,994,947	2671
2673	*1.5.6.1.41*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 17 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*vie 15/12/23*	*vie 15/12/23*	*$ 0*	*2603;2637;2658;2672*
2674	*1.5.6.1.42*	*APROBACIÓN DE PMT TRAMO No. 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)*	*0 días*	*mar 30/05/23*	*mar 30/05/23*	*$ 0*	*2505FC+20 días*
2675	*1.5.6.1.43*	*INICIO DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)*	*0 días*	*mié 31/05/23*	*mié 31/05/23*	*$ 0*	*2674FC+1 día*
2676	**1.5.6.1.44**	**FRENTE DE OBRA No. 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)**	**244.8 días**	**mié 31/05/23**	**sáb 16/03/24**	**$ 1,734,387,901**	
2677	**1.5.6.1.44.1**	**CIV 11007370 - PKID 516242 - CALLE 138 ENTRE AVENIDA BOYACÁ Y CARRERA 59A**	**4.1 días**	**mié 31/05/23**	**lun 5/06/23**	**$ 75,569,597**	
2678	1.5.6.1.44.1.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 31/05/23	mié 31/05/23	$ 533,542	2675
2679	1.5.6.1.44.1.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23	$ 6,329,964	2678
2680	1.5.6.1.44.1.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 1/06/23	vie 2/06/23	$ 2,603,936	2679
2681	1.5.6.1.44.1.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 2,176,491	2680
2682	1.5.6.1.44.1.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 2/06/23	sáb 3/06/23	$ 20,602,706	2681
2683	1.5.6.1.44.1.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	sáb 3/06/23	lun 5/06/23	$ 41,781,779	2682
2684	1.5.6.1.44.1.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 1,541,179	2683
2685	**1.5.6.1.44.2**	**CIV 11012201 - PKID 516204 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 59A Y CARRERA 58D**	**4.1 días**	**lun 5/06/23**	**vie 9/06/23**	**$ 139,461,166**	
2686	1.5.6.1.44.2.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	$ 909,131	2684
2687	1.5.6.1.44.2.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 5/06/23	mar 6/06/23	$ 10,815,430	2686
2688	1.5.6.1.44.2.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23	$ 4,449,105	2687
2689	1.5.6.1.44.2.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 7/06/23	mié 7/06/23	$ 4,698,416	2688
2690	1.5.6.1.44.2.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mié 7/06/23	jue 8/06/23	$ 62,999,789	2689
2691	1.5.6.1.44.2.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 8/06/23	vie 9/06/23	$ 52,567,406	2690
2692	1.5.6.1.44.2.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 3,021,889	2691
2693	**1.5.6.1.44.3**	**CIV 11007601 - PKID 516207 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58A Y CARRERA 58**	**4.1 días**	**vie 9/06/23**	**jue 15/06/23**	**$ 86,041,839**	
2694	1.5.6.1.44.3.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 9/06/23	vie 9/06/23	$ 531,437	2692
2695	1.5.6.1.44.3.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	vie 9/06/23	sáb 10/06/23	$ 6,272,498	2694
2696	1.5.6.1.44.3.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 2,580,296	2695
2697	1.5.6.1.44.3.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	$ 2,874,488	2696
2698	1.5.6.1.44.3.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	mar 13/06/23	mié 14/06/23	$ 43,069,585	2697
2699	1.5.6.1.44.3.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 14/06/23	jue 15/06/23	$ 28,387,047	2698
2700	1.5.6.1.44.3.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 15/06/23	jue 15/06/23	$ 2,326,488	2699
2701	**1.5.6.1.44.4**	**CIV 11008531 - PKID 516217 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 45 (AUTOPISTA NORTE) Y CARRERA 46**	**3.9 días**	**mié 31/05/23**	**lun 5/06/23**	**$ 106,063,488**	
2702	1.5.6.1.44.4.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 31/05/23	mié 31/05/23	$ 691,005	2675
2703	1.5.6.1.44.4.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23	$ 8,249,251	2702
2704	1.5.6.1.44.4.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 1/06/23	vie 2/06/23	$ 3,393,466	2703
2705	1.5.6.1.44.4.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 2/06/23	vie 2/06/23	$ 3,780,374	2704
2706	1.5.6.1.44.4.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 2/06/23	sáb 3/06/23	$ 53,634,647	2705
2707	1.5.6.1.44.4.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	sáb 3/06/23	lun 5/06/23	$ 36,314,745	2706
2708	**1.5.6.1.44.5**	**CIV 11008427 - PKID 516193 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 46A Y CARRERA 47**	**3.9 días**	**jue 29/06/23**	**mié 5/07/23**	**$ 70,397,886**	
2709	1.5.6.1.44.5.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 29/06/23	jue 29/06/23	$ 459,539	2707FC+20 días
2710	1.5.6.1.44.5.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23	$ 5,475,233	2709
2711	1.5.6.1.44.5.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 30/06/23	sáb 1/07/23	$ 2,252,328	2710
2712	1.5.6.1.44.5.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 2,509,128	2711
2713	1.5.6.1.44.5.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	$ 35,598,655	2712
2714	1.5.6.1.44.5.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23	$ 24,103,003	2713
2715	**1.5.6.1.44.6**	**CIV 11008378 - PKID 516183 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 47 Y CARRERA 49**	**4.7 días**	**mié 5/07/23**	**mar 11/07/23**	**$ 95,746,089**	
2716	1.5.6.1.44.6.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	$ 657,439	2714
2717	1.5.6.1.44.6.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	mié 5/07/23	jue 6/07/23	$ 7,854,375	2716
2718	1.5.6.1.44.6.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	jue 6/07/23	vie 7/07/23	$ 3,231,024	2717
2719	1.5.6.1.44.6.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	$ 3,599,411	2718
2720	1.5.6.1.44.6.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.8 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23	$ 37,055,589	2719
2721	1.5.6.1.44.6.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.8 días	sáb 8/07/23	lun 10/07/23	$ 8,771,836	2720
2722	1.5.6.1.44.6.7	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23	$ 34,576,415	2721
2723	**1.5.6.1.44.7**	**CIV 11014180 - PKID 24123200 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58D Y CARRERA 58A**	**2.6 días**	**mar 11/07/23**	**jue 13/07/23**	**$ 240,809,188**	
2724	1.5.6.1.44.7.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 1,263,699	2722
2725	1.5.6.1.44.7.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 19,508,005	2724

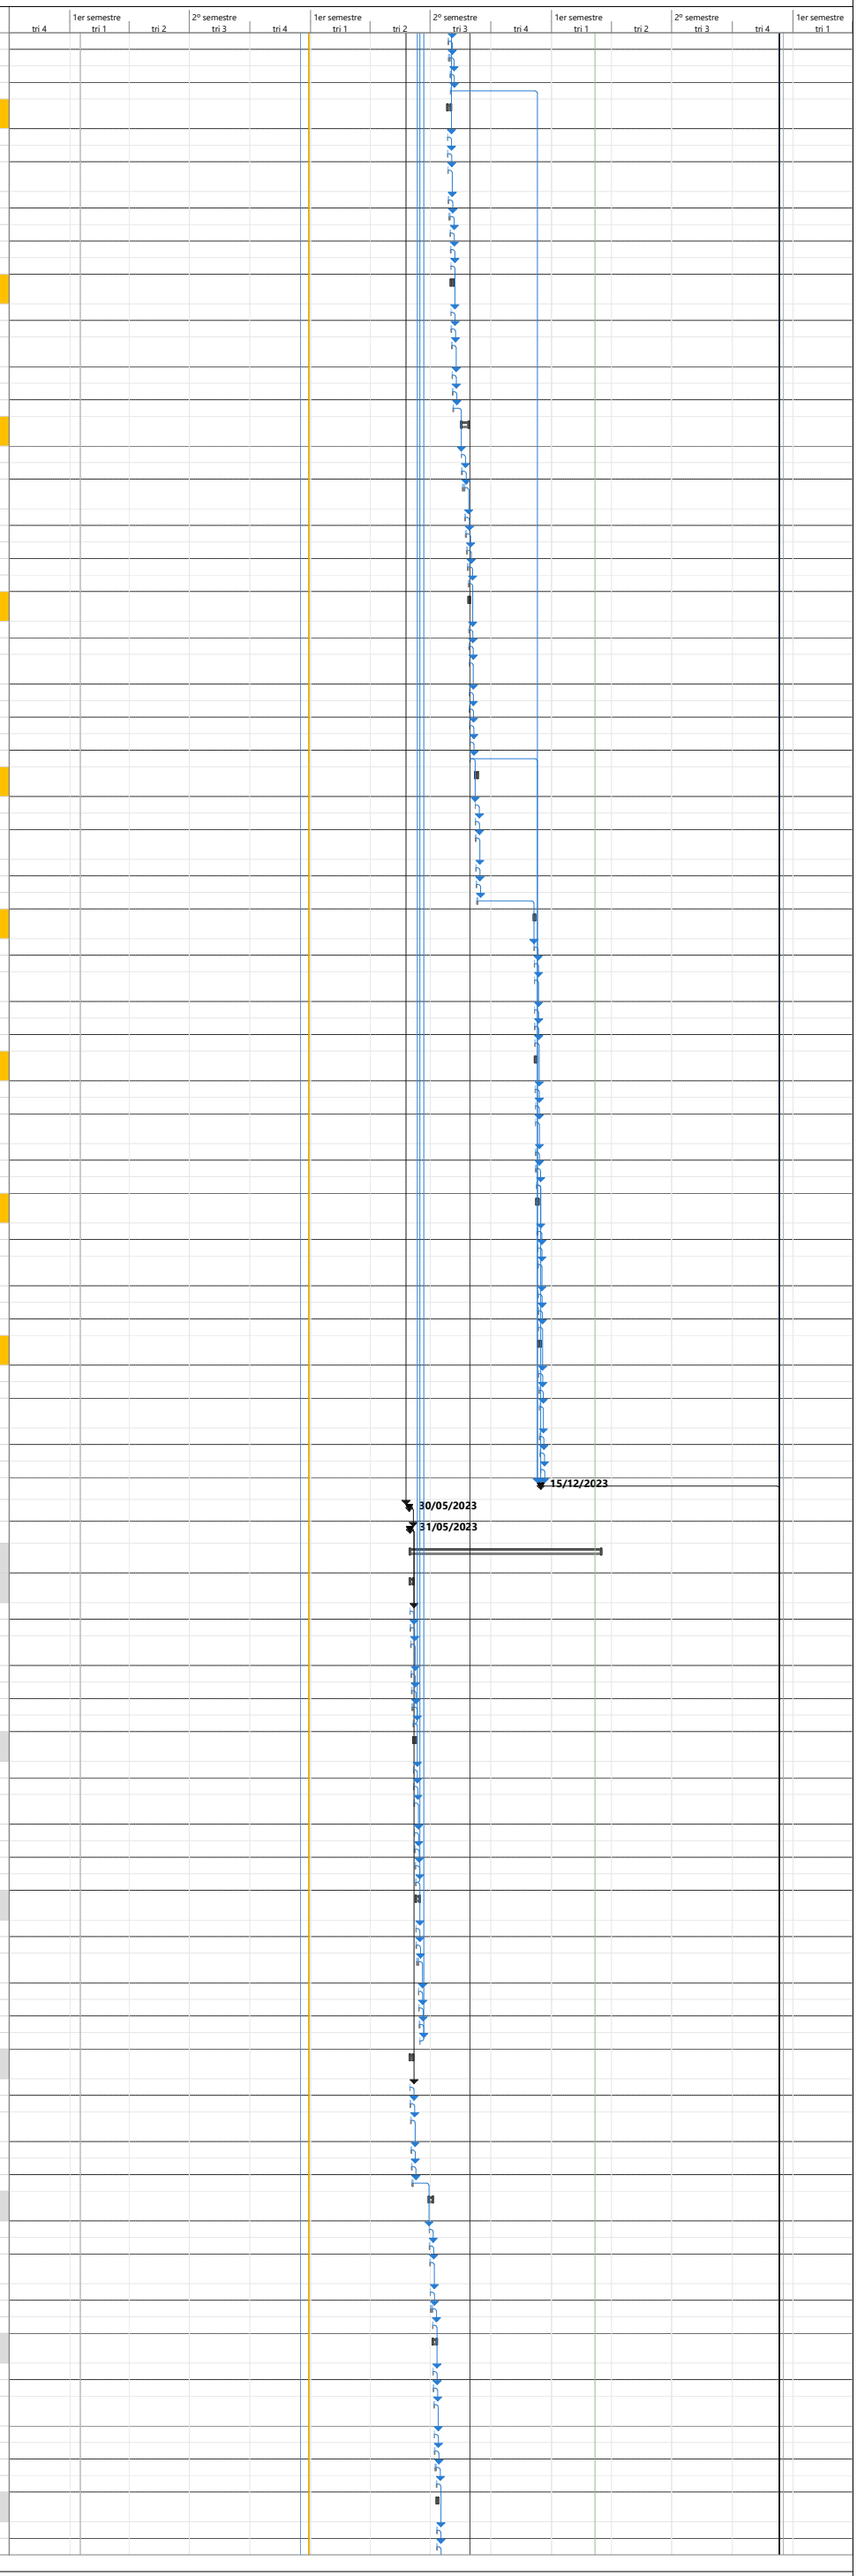


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2726	1.5.6.1.44.7.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	$ 8,024,938	2725
2727	1.5.6.1.44.7.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.4 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	$ 6,876,852	2726
2728	1.5.6.1.44.7.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 107,902,397	2727
2729	1.5.6.1.44.7.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mié 12/07/23	mié 12/07/23	$ 79,271,880	2728
2730	1.5.6.1.44.7.7	3.028 MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	$ 17,961,417	2729
2731	**1.5.6.1.44.8**	**CIV 11013326 - PKID 91019785 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 54C**	**2.2 días**	**jue 13/07/23**	**sáb 15/07/23**	**$ 110,315,637**	
2732	1.5.6.1.44.8.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 679,895	2730
2733	1.5.6.1.44.8.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	$ 7,699,847	2732
2734	1.5.6.1.44.8.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	jue 13/07/23	vie 14/07/23	$ 3,167,459	2733
2735	1.5.6.1.44.8.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.4 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 3,715,111	2734
2736	1.5.6.1.44.8.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	$ 56,677,999	2735
2737	1.5.6.1.44.8.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	vie 14/07/23	sáb 15/07/23	$ 38,375,326	2736
2738	**1.5.6.1.44.9**	**ITEM 6 - CIV 11008253 - PKID 516173 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 52 (BICICARRIL NORTE)**	**2.8 días**	**lun 25/09/23**	**jue 28/09/23**	**$ 110,819,600**	
2739	1.5.6.1.44.9.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23	$ 660,543	2737FC+60 días
2740	1.5.6.1.44.9.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	lun 25/09/23	mar 26/09/23	$ 10,781,456	2739
2741	1.5.6.1.44.9.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23	$ 4,435,128	2740
2742	1.5.6.1.44.9.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.4 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23	$ 3,596,170	2741
2743	1.5.6.1.44.9.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 26/09/23	mié 27/09/23	$ 47,461,973	2742
2744	1.5.6.1.44.9.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	mié 27/09/23	jue 28/09/23	$ 43,884,330	2743
2745	**1.5.6.1.44.10**	**ITEM 18 - CIV 11011895 - PKID 518368 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 57**	**3.2 días**	**vie 15/12/23**	**mar 19/12/23**	**$ 221,726,549**	
2746	1.5.6.1.44.10.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 1,466,849	2744FC+66 días
2747	1.5.6.1.44.10.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	vie 15/12/23	sáb 16/12/23	$ 17,430,212	2746
2748	1.5.6.1.44.10.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	sáb 16/12/23	lun 18/12/23	$ 7,170,193	2747
2749	1.5.6.1.44.10.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.4 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 7,987,572	2748
2750	1.5.6.1.44.10.5	3.030 - MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO	0.4 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 91,702,389	2749
2751	1.5.6.1.44.10.6	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	$ 76,730,102	2750
2752	1.5.6.1.44.10.7	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	0.4 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 16,244,395	2751
2753	1.5.6.1.44.10.8	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 2,994,837	2752
2754	**1.5.6.1.44.11**	**ITEM XX - CIV 11008304 - PKID 516178 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 49**	**5 días**	**mié 21/02/24**	**mar 27/02/24**	**$ 174,323,653**	
2755	1.5.6.1.44.11.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	mié 21/02/24	jue 22/02/24	$ 594,657	2753FC+54 días
2756	1.5.6.1.44.11.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 22/02/24	jue 22/02/24	$ 17,064,607	2755
2757	1.5.6.1.44.11.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 9,125,837	2756
2758	1.5.6.1.44.11.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.8 días	vie 23/02/24	sáb 24/02/24	$ 4,886,380	2757
2759	1.5.6.1.44.11.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1 día	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 37,560,793	2758
2760	1.5.6.1.44.11.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	1 día	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 104,188,473	2759
2761	1.5.6.1.44.11.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	mar 27/02/24	mar 27/02/24	$ 902,906	2760
2762	**1.5.6.1.44.12**	**ITEM XX - CIV 11008157 - PKID 516230 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 53**	**4.9 días**	**mar 27/02/24**	**lun 4/03/24**	**$ 43,401,542**	
2763	1.5.6.1.44.12.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 132,107	2761
2764	1.5.6.1.44.12.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24	$ 4,265,080	2763
2765	1.5.6.1.44.12.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 2,280,688	2764
2766	1.5.6.1.44.12.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.8 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 1,085,862	2765
2767	1.5.6.1.44.12.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1.5 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 9,732,389	2765
2768	1.5.6.1.44.12.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 25,713,265	2767
2769	1.5.6.1.44.12.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	lun 4/03/24	lun 4/03/24	$ 192,151	2768
2770	**1.5.6.1.44.13**	**ITEM XX - CIV 11008198 - PKID 516212 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 52**	**5.9 días**	**lun 4/03/24**	**lun 11/03/24**	**$ 192,103,399**	
2771	1.5.6.1.44.13.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	lun 4/03/24	lun 4/03/24	$ 607,178	2769
2772	1.5.6.1.44.13.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 18,875,497	2771
2773	1.5.6.1.44.13.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 10,094,391	2772
2774	1.5.6.1.44.13.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 4,989,562	2773
2775	1.5.6.1.44.13.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1.5 días	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 38,353,731	2774
2776	1.5.6.1.44.13.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 118,197,226	2775
2777	1.5.6.1.44.13.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	$ 985,814	2776
2778	**1.5.6.1.44.14**	**ITEM XX - CIV 11008450 - PKID 516198 - CALLE 138 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 57**	**5.7 días**	**lun 11/03/24**	**sáb 16/03/24**	**$ 67,608,268**	
2779	1.5.6.1.44.14.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.4 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 274,779	2777
2780	1.5.6.1.44.14.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 6,571,311	2779
2781	1.5.6.1.44.14.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.6 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 3,514,314	2780
2782	1.5.6.1.44.14.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 2,257,709	2781
2783	1.5.6.1.44.14.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	1.5 días	mié 13/03/24	vie 15/03/24	$ 14,461,707	2782
2784	1.5.6.1.44.14.6	3.028 - MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MD25	1 día	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$ 40,114,787	2783
2785	1.5.6.1.44.14.7	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.4 días	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 413,661	2784
2786	*1.5.6.1.45*	*FIN DE INTERVENCIÓN TRAMO No. 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)*	*0 días*	*sáb 16/03/24*	*sáb 16/03/24*	*$ 0*	*2753;2777;2769;2785;2761*
2787	*1.5.6.1.46*	*Priorización de parte del IDU, para ejecución de Actividades por Conservación Programada en el sector de las Delicias*	*0 días*	*mié 30/08/23*	*mié 30/08/23*	*$ 0*	*145FC+5 días*
2788	*1.5.6.1.47*	*Aval de interventoria e IDU para dar Inicio a la Gestión Social*	*0 días*	*jue 14/09/23*	*jue 14/09/23*	*$ 0*	*2787FC+11 días*
2789	*1.5.6.1.48*	*Inicio de Actividades de Gestión Social (Etapa I) Tv 72D entre Calle 45 Sur y Calle 43A Sur (Socialización comienzo actas de vecindad)*	*0 días*	*jue 14/09/23*	*jue 14/09/23*	*$ 0*	*2788*
2790	*1.5.6.1.49*	*Inicio de Actas de Vecindad (Etapa I) Tv 72D entre Calle 45 Sur y Calle 43A Sur*	*0 días*	*lun 18/09/23*	*lun 18/09/23*	*$ 0*	*2789FC+2 días*
2791	*1.5.6.1.50*	*Ejecución de Actas de Vecindad*	*15 días*	*mar 19/09/23*	*jue 5/10/23*	*$ 0*	*2790*
2792	*1.5.6.1.51*	*Fin de Actas de Vecindad (Etapa I) Tv 72D entre Calle 45 Sur y Calle 43A Sur*	*0 días*	*jue 5/10/23*	*jue 5/10/23*	*$ 0*	*2791*
2793	*1.5.6.1.52*	*Aprobación del PMT Etapa I de parte de la SDM*	*0 días*	*mié 30/08/23*	*mié 30/08/23*	*$ 0*	*2787*
2794	*1.5.6.1.53*	*Aprobación del Diseño de la Estructura de Pavimento de parte de interventoria*	*0 días*	*mié 27/09/23*	*mié 27/09/23*	*$ 0*	*2787FC+20 días*
2795	*1.5.6.1.54*	*Reunión de Inicio de las Obras (Comunidad, IDU, Contratista; Interventoria)*	*0 días*	*jue 5/10/23*	*jue 5/10/23*	*$ 0*	*2792FC+1 día*
2796	*1.5.6.1.55*	*Inicio de Actividades de Obra - ETAPA 1*	*0 días*	*lun 9/10/23*	*lun 9/10/23*	*$ 0*	*2792;2793;2794;2795FC+2 d*
2797	**1.5.6.1.56**	**FRENTE DE OBA No. 19 - CONSERVACIÓN PROGRAMADA (ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN) DEL CORREDOR DE LA AV. FERROCARRIL DEL SUR ENTRE CALLE 45 SUR Y AVENIDA BOYACÁ**	**114 días**	**mar 10/10/23**	**sáb 16/03/24**	**$ 3,340,203,492**	
2798	**1.5.6.1.56.1**	**CIV 8011326 - PKID 149099 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 43A SUR**	**36 días**	**mar 10/10/23**	**mié 22/11/23**	**$ 574,808,909**	
2799	1.5.6.1.56.1.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	$ 981,640	2796
2800	1.5.6.1.56.1.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	mar 10/10/23	jue 12/10/23	$ 3,625,913	2799
2801	1.5.6.1.56.1.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	2 días	jue 12/10/23	sáb 14/10/23	$ 62,899,457	2800
2802	1.5.6.1.56.1.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	2 días	sáb 14/10/23	mié 18/10/23	$ 5,980,683	2801
2803	1.5.6.1.56.1.5	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	$ 2,295,455	2805
2804	1.5.6.1.56.1.6	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	2 días	lun 20/11/23	mié 22/11/23	$ 169,771,003	2803
2805	1.5.6.1.56.1.7	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	$ 31,543,975	2806
2806	1.5.6.1.56.1.8	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	$ 41,726,074	2822
2807	1.5.6.1.56.1.9	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	$ 2,061,835	2802
2808	1.5.6.1.56.1.10	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 19/10/23	vie 20/10/23	$ 689,082	2807
2809	1.5.6.1.56.1.11	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	vie 20/10/23	sáb 21/10/23	$ 1,496,424	2808
2810	1.5.6.1.56.1.12	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	2 días	sáb 21/10/23	mar 24/10/23	$ 675,695	2809
2811	1.5.6.1.56.1.13	5.007 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	$ 426,115	2810
2812	1.5.6.1.56.1.14	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	jue 26/10/23	vie 27/10/23	$ 1,435,724	2811
2813	1.5.6.1.56.1.15	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	vie 27/10/23	sáb 28/10/23	$ 1,040,703	2812
2814	1.5.6.1.56.1.16	5.014 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	sáb 28/10/23	lun 30/10/23	$ 3,196,011	2813
2815	1.5.6.1.56.1.17	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	$ 4,026,218	2814
2816	1.5.6.1.56.1.18	AD-006 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 31/10/23	mié 1/11/23	$ 1,816,503	2815
2817	1.5.6.1.56.1.19	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mié 1/11/23	jue 2/11/23	$ 13,878,212	2816
2818	1.5.6.1.56.1.20	AD-009 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 806,372	2817
2819	1.5.6.1.56.1.21	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 3,712,446	2818
2820	1.5.6.1.56.1.22	AD-011 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	$ 2,281,536	2819
2821	1.5.6.1.56.1.23	AD-013 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	3 días	jue 9/11/23	mar 14/11/23	$ 85,967,290	2820
2822	1.5.6.1.56.1.24	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	$ 54,637,776	2821

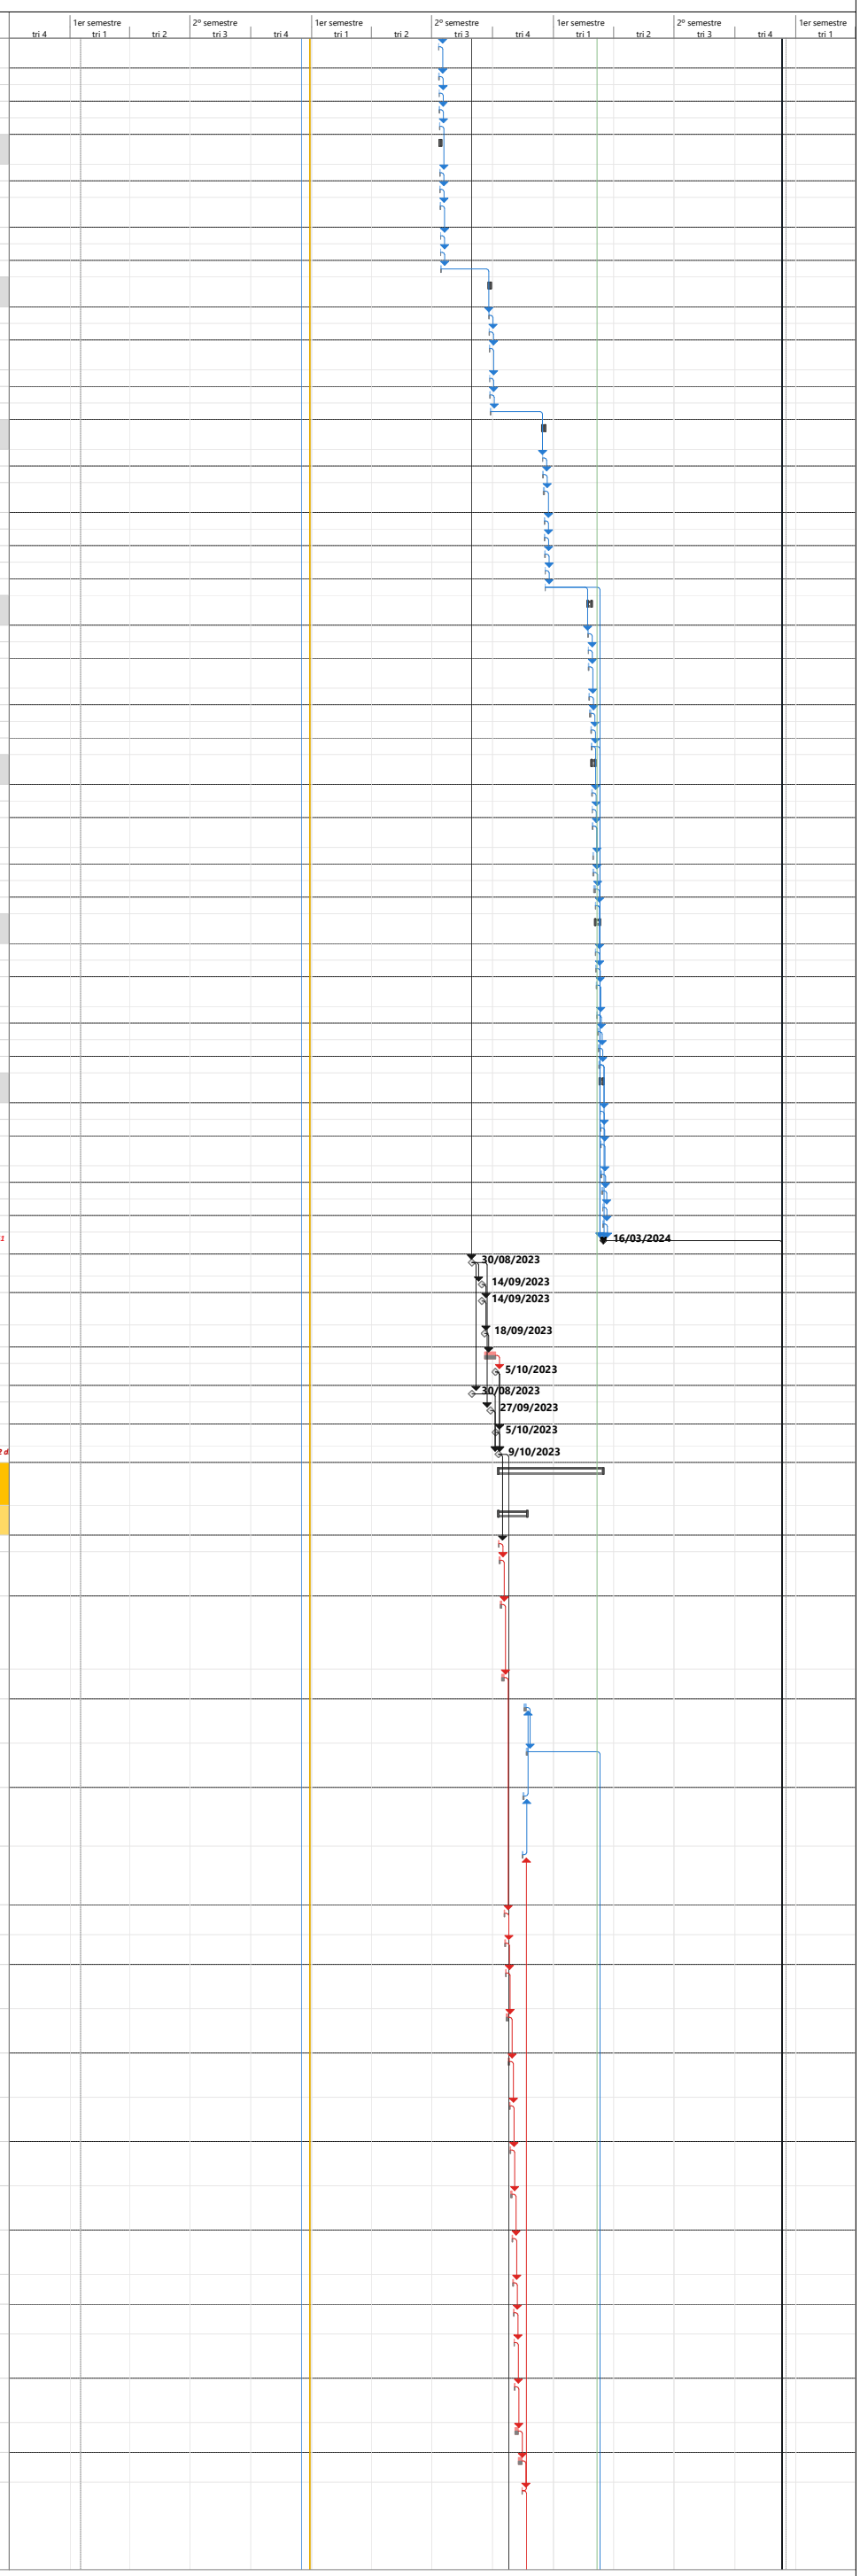


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2823	1.5.6.1.56.1.25	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	mié 15/11/23	mié 15/11/23	$ 77,836,766	2822
2824	**1.5.6.1.56.2**	**CIV 8011274 - PKID 149097 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 43A SUR Y CALLE 43 SUR**	**69 días**	**mié 15/11/23**	**mar 6/02/24**	**$ 271,079,655**	
2825	1.5.6.1.56.2.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	$ 472,841	2823
2826	1.5.6.1.56.2.2	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	jue 16/11/23	vie 17/11/23	$ 38,229,479	2825
2827	1.5.6.1.56.2.3	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	vie 17/11/23	sáb 18/11/23	$ 4,348,914	2826
2828	1.5.6.1.56.2.4	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 1,263,001	2830
2829	1.5.6.1.56.2.5	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	2 días	sáb 3/02/24	mar 6/02/24	$ 106,742,005	2828FC+45 días
2830	1.5.6.1.56.2.6	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	$ 14,089,667	2831
2831	1.5.6.1.56.2.7	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	mar 5/12/23	jue 7/12/23	$ 20,903,143	2844
2832	1.5.6.1.56.2.8	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	2 días	lun 20/11/23	mar 21/11/23	$ 1,651,171	2827
2833	1.5.6.1.56.2.9	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 21/11/23	mié 22/11/23	$ 130,508	2832
2834	1.5.6.1.56.2.10	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	$ 292,456	2833
2835	1.5.6.1.56.2.11	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	$ 226,597	2834
2836	1.5.6.1.56.2.12	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	vie 24/11/23	sáb 25/11/23	$ 1,435,724	2835
2837	1.5.6.1.56.2.13	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	sáb 25/11/23	lun 27/11/23	$ 589,732	2836
2838	1.5.6.1.56.2.14	5.014 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23	$ 1,070,224	2837
2839	1.5.6.1.56.2.15	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	$ 1,551,063	2838
2840	1.5.6.1.56.2.16	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mié 29/11/23	jue 30/11/23	$ 10,321,207	2839
2841	1.5.6.1.56.2.17	AD-009 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 30/11/23	vie 1/12/23	$ 115,196	2840
2842	1.5.6.1.56.2.18	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 1/12/23	sáb 2/12/23	$ 463,984	2841
2843	1.5.6.1.56.2.19	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	sáb 2/12/23	lun 4/12/23	$ 28,192,094	2842
2844	1.5.6.1.56.2.20	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	lun 4/12/23	mar 5/12/23	$ 38,990,649	2843
2845	**1.5.6.1.56.3**	**CIV 8011242 - PKID 149096 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 43 SUR Y CALLE 42C SUR**	**58 días**	**mié 15/11/23**	**mié 24/01/24**	**$ 186,135,420**	
2846	1.5.6.1.56.3.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 15/11/23	jue 16/11/23	$ 276,465	2823
2847	1.5.6.1.56.3.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 16/11/23	vie 17/11/23	$ 849,529	2846
2848	1.5.6.1.56.3.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	vie 17/11/23	sáb 18/11/23	$ 21,577,445	2847
2849	1.5.6.1.56.3.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	lun 20/11/23	lun 20/11/23	$ 2,124,935	2848
2850	1.5.6.1.56.3.5	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 872,717	2852
2851	1.5.6.1.56.3.6	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	1 día	mié 24/01/24	mié 24/01/24	$ 64,551,182	2850FC+35 días
2852	1.5.6.1.56.3.7	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	$ 19,731,944	2853
2853	1.5.6.1.56.3.8	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 13,648,004	2866
2854	1.5.6.1.56.3.9	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	lun 20/11/23	mar 21/11/23	$ 641,544	2849
2855	1.5.6.1.56.3.10	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 21/11/23	mié 22/11/23	$ 642,859	2854
2856	1.5.6.1.56.3.11	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mié 22/11/23	jue 23/11/23	$ 1,279,709	2855
2857	1.5.6.1.56.3.12	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	jue 23/11/23	vie 24/11/23	$ 1,157,554	2856
2858	1.5.6.1.56.3.13	5.011 TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	vie 24/11/23	sáb 25/11/23	$ 5,130,020	2857
2859	1.5.6.1.56.3.14	5.014 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	sáb 25/11/23	lun 27/11/23	$ 1,422,078	2858
2860	1.5.6.1.56.3.15	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 27/11/23	mar 28/11/23	$ 1,717,249	2859
2861	1.5.6.1.56.3.16	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mar 28/11/23	mié 29/11/23	$ 4,836,202	2860
2862	1.5.6.1.56.3.17	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	3 días	mié 29/11/23	sáb 2/12/23	$ 4,850,245	2861
2863	1.5.6.1.56.3.18	AD-009 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	sáb 2/12/23	lun 4/12/23	$ 115,196	2862
2864	1.5.6.1.56.3.19	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	lun 4/12/23	mar 5/12/23	$ 366,605	2863
2865	1.5.6.1.56.3.20	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mar 5/12/23	mié 6/12/23	$ 14,887,454	2864
2866	1.5.6.1.56.3.21	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	mié 6/12/23	jue 7/12/23	$ 25,456,484	2865
2867	**1.5.6.1.56.4**	**CIV 8011213 - PKID 149095 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 42C SUR Y CALLE 41 SUR**	**52 días**	**jue 7/12/23**	**jue 8/02/24**	**$ 363,991,536**	
2868	1.5.6.1.56.4.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 620,822	2866
2869	1.5.6.1.56.4.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	$ 1,908,015	2868
2870	1.5.6.1.56.4.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 42,493,800	2869
2871	1.5.6.1.56.4.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	$ 4,115,550	2870
2872	1.5.6.1.56.4.5	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mar 2/01/24	mié 3/01/24	$ 1,959,774	2874
2873	1.5.6.1.56.4.6	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	1 día	mié 7/02/24	jue 8/02/24	$ 144,954,350	2872FC+30 días
2874	1.5.6.1.56.4.7	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	$ 21,851,265	2875
2875	1.5.6.1.56.4.8	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	$ 21,889,746	2889
2876	1.5.6.1.56.4.9	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 1,462,872	2871
2877	1.5.6.1.56.4.10	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23	$ 1,200,354	2876
2878	1.5.6.1.56.4.11	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 2,746,519	2877

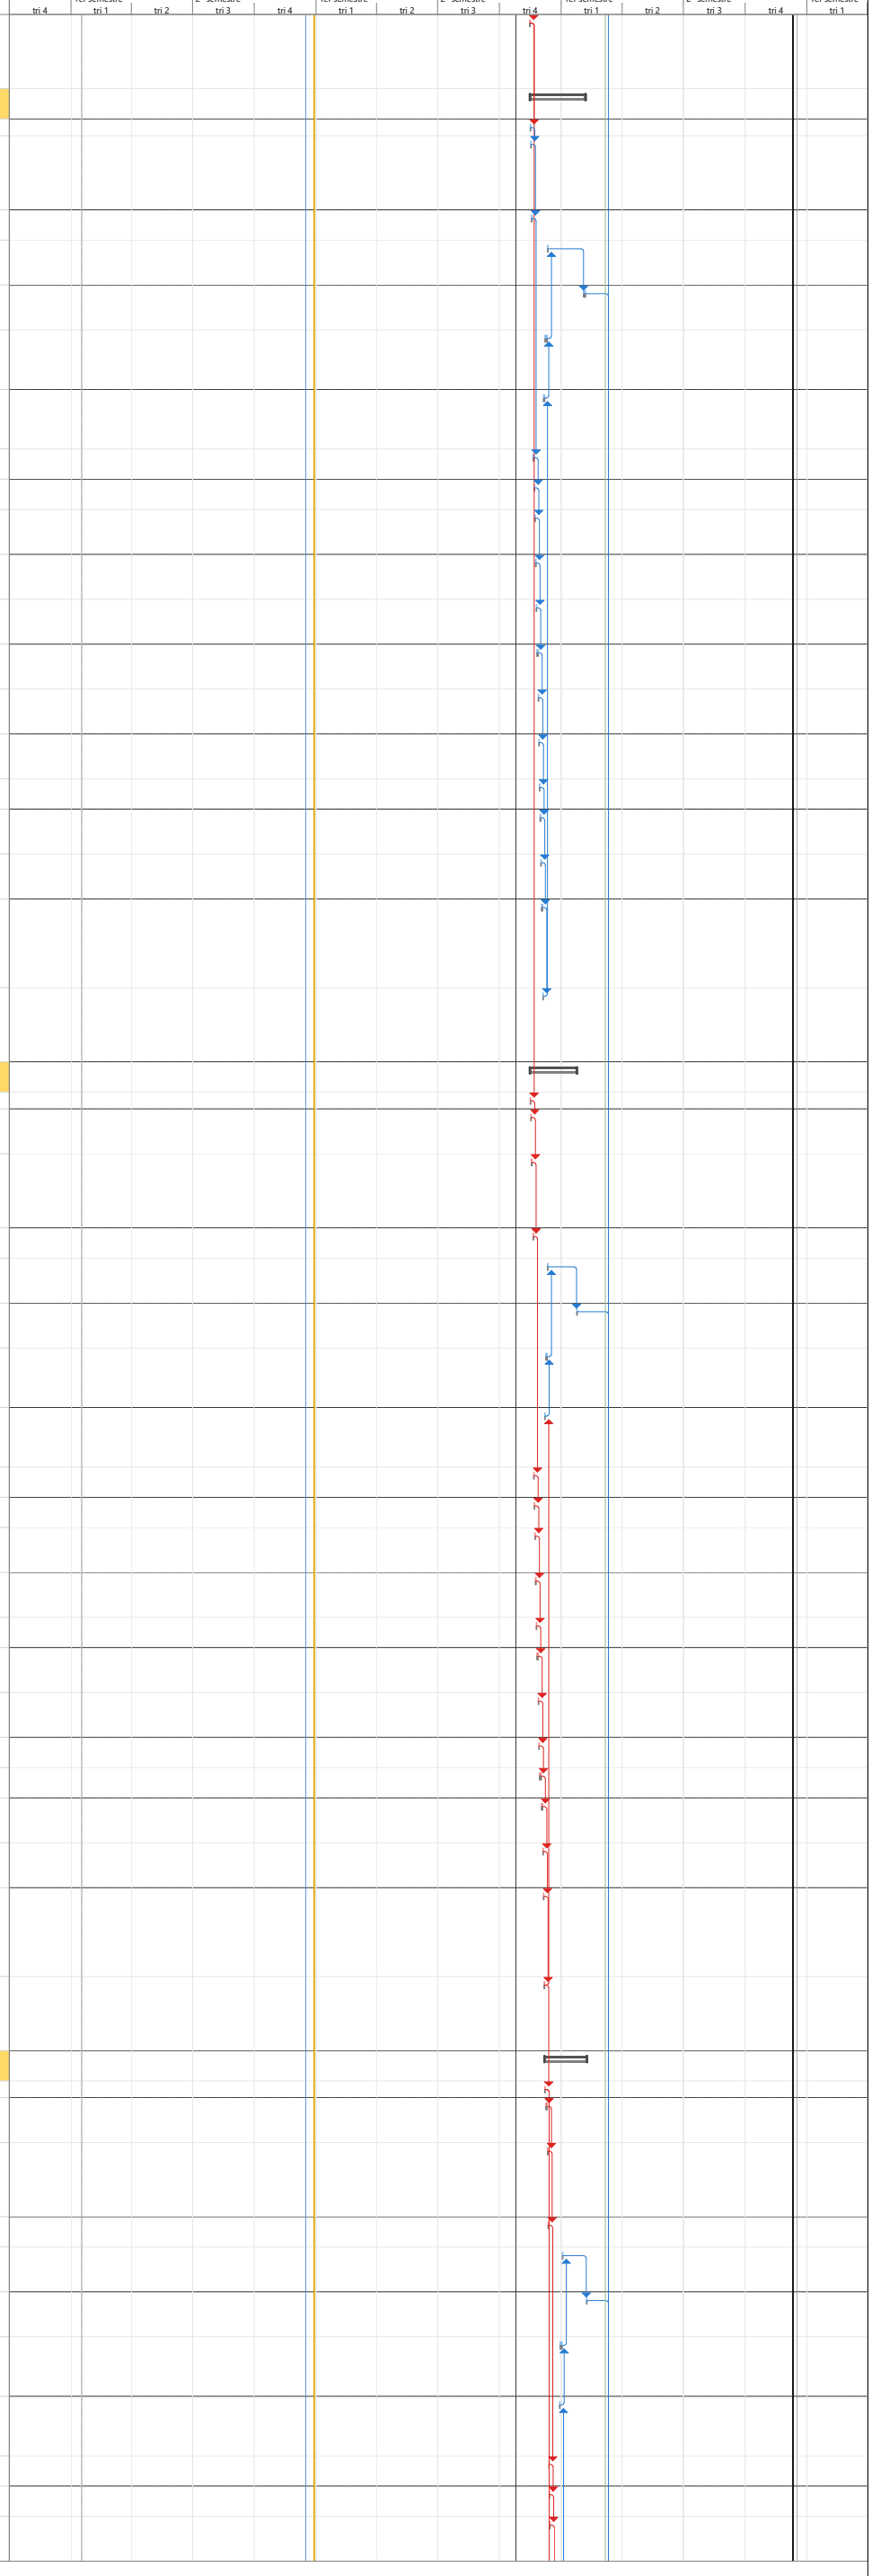


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2879	1.5.6.1.56.4.12	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 2,820,173	2878
2880	1.5.6.1.56.4.13	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 1,435,724	2879
2881	1.5.6.1.56.4.14	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 450,971	2880
2882	1.5.6.1.56.4.15	5.011 TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mar 19/12/23	mié 20/12/23	$ 4,914,940	2881
2883	1.5.6.1.56.4.16	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mié 20/12/23	jue 21/12/23	$ 4,187,368	2882
2884	1.5.6.1.56.4.17	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 21/12/23	vie 22/12/23	$ 13,085,066	2883
2885	1.5.6.1.56.4.18	AD-009 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 22/12/23	sáb 23/12/23	$ 115,196	2884
2886	1.5.6.1.56.4.19	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	$ 412,430	2885
2887	1.5.6.1.56.4.20	AD-016 TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	$ 17,005,723	2886
2888	1.5.6.1.56.4.21	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mié 27/12/23	jue 28/12/23	$ 33,527,447	2887
2889	1.5.6.1.56.4.22	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAIÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	jue 28/12/23	vie 29/12/23	$ 40,833,432	2888
2890	**1.5.6.1.56.5**	**CIV 8011169 - PKID 149094 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 41 SUR Y CARRERA 72B**	**41 días**	**sáb 23/12/23**	**lun 12/02/24**	**$ 117,840,465**	
2891	1.5.6.1.56.5.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	$ 170,945	2885
2892	1.5.6.1.56.5.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	$ 525,389	2891
2893	1.5.6.1.56.5.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 27/12/23	jue 28/12/23	$ 12,027,478	2892
2894	1.5.6.1.56.5.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 28/12/23	vie 29/12/23	$ 1,153,897	2893
2895	1.5.6.1.56.5.5	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24	$ 539,623	2897
2896	1.5.6.1.56.5.6	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	1 día	sáb 10/02/24	lun 12/02/24	$ 39,915,774	2895FC+20 días
2897	1.5.6.1.56.5.7	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 17/01/24	jue 18/01/24	$ 10,508,015	2908
2898	1.5.6.1.56.5.8	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 15/01/24	mar 16/01/24	$ 6,027,902	2909
2899	1.5.6.1.56.5.9	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	$ 269,676	2894
2900	1.5.6.1.56.5.10	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	$ 354,313	2899
2901	1.5.6.1.56.5.11	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	mar 2/01/24	mié 3/01/24	$ 866,388	2900
2902	1.5.6.1.56.5.12	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	mié 3/01/24	jue 4/01/24	$ 969,178	2901
2903	1.5.6.1.56.5.13	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 4/01/24	vie 5/01/24	$ 1,155,744	2902
2904	1.5.6.1.56.5.14	AD-006 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 5/01/24	sáb 6/01/24	$ 316,331	2903
2905	1.5.6.1.56.5.15	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	sáb 6/01/24	mar 9/01/24	$ 2,011,954	2904
2906	1.5.6.1.56.5.16	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	3 días	mar 9/01/24	vie 12/01/24	$ 10,550,263	2905
2907	1.5.6.1.56.5.17	AD-016 TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	vie 12/01/24	sáb 13/01/24	$ 8,250,362	2906
2908	1.5.6.1.56.5.18	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mar 16/01/24	mié 17/01/24	$ 10,983,588	2898
2909	1.5.6.1.56.5.19	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	sáb 13/01/24	lun 15/01/24	$ 11,243,647	2907
2910	**1.5.6.1.56.6**	**CIV 8011154 - PKID 91024899 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CARRERA 72B Y CALLE 40 SUR**	**21 días**	**sáb 9/12/23**	**jue 4/01/24**	**$ 220,381,776**	
2911	1.5.6.1.56.6.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	$ 371,467	2868
2912	1.5.6.1.56.6.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 1,162,108	2911
2913	1.5.6.1.56.6.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mar 12/12/23	mié 13/12/23	$ 29,901,312	2912
2914	1.5.6.1.56.6.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 2,898,204	2913
2915	1.5.6.1.56.6.5	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	$ 575,525	2917
2916	1.5.6.1.56.6.6	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	1 día	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	$ 54,776,736	2915
2917	1.5.6.1.56.6.7	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	jue 28/12/23	vie 29/12/23	$ 5,314,104	2918
2918	1.5.6.1.56.6.8	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 27/12/23	jue 28/12/23	$ 11,041,127	2935
2919	1.5.6.1.56.6.9	2.015 ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	1 día	jue 28/12/23	vie 29/12/23	$ 3,302,250	2918
2920	1.5.6.1.56.6.10	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23	$ 342,535	2914
2921	1.5.6.1.56.6.11	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 1,021,257	2920
2922	1.5.6.1.56.6.12	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	vie 15/12/23	lun 18/12/23	$ 2,745,557	2921
2923	1.5.6.1.56.6.13	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 3,299,302	2922
2924	1.5.6.1.56.6.14	5.007 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 143,814	2923
2925	1.5.6.1.56.6.15	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	mar 19/12/23	mié 20/12/23	$ 2,871,448	2924
2926	1.5.6.1.56.6.16	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	mié 20/12/23	jue 21/12/23	$ 1,533,302	2925
2927	1.5.6.1.56.6.17	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 21/12/23	vie 22/12/23	$ 4,690,985	2926
2928	1.5.6.1.56.6.18	AD-006 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 22/12/23	sáb 23/12/23	$ 839,603	2927
2929	1.5.6.1.56.6.19	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	$ 3,736,697	2928
2930	1.5.6.1.56.6.20	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	$ 8,165,613	2929
2931	1.5.6.1.56.6.21	AD-009 SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 29/12/23	sáb 30/12/23	$ 345,588	2930
2932	1.5.6.1.56.6.22	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	sáb 30/12/23	mar 2/01/24	$ 1,491,623	2931
2933	1.5.6.1.56.6.23	AD-015 TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mar 2/01/24	mié 3/01/24	$ 34,225,349	2932
2934	1.5.6.1.56.6.24	AD-016 TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mié 3/01/24	jue 4/01/24	$ 602,349	2933
2935	1.5.6.1.56.6.25	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	$ 22,198,258	2936
2936	1.5.6.1.56.6.26	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	$ 20,597,381	2928

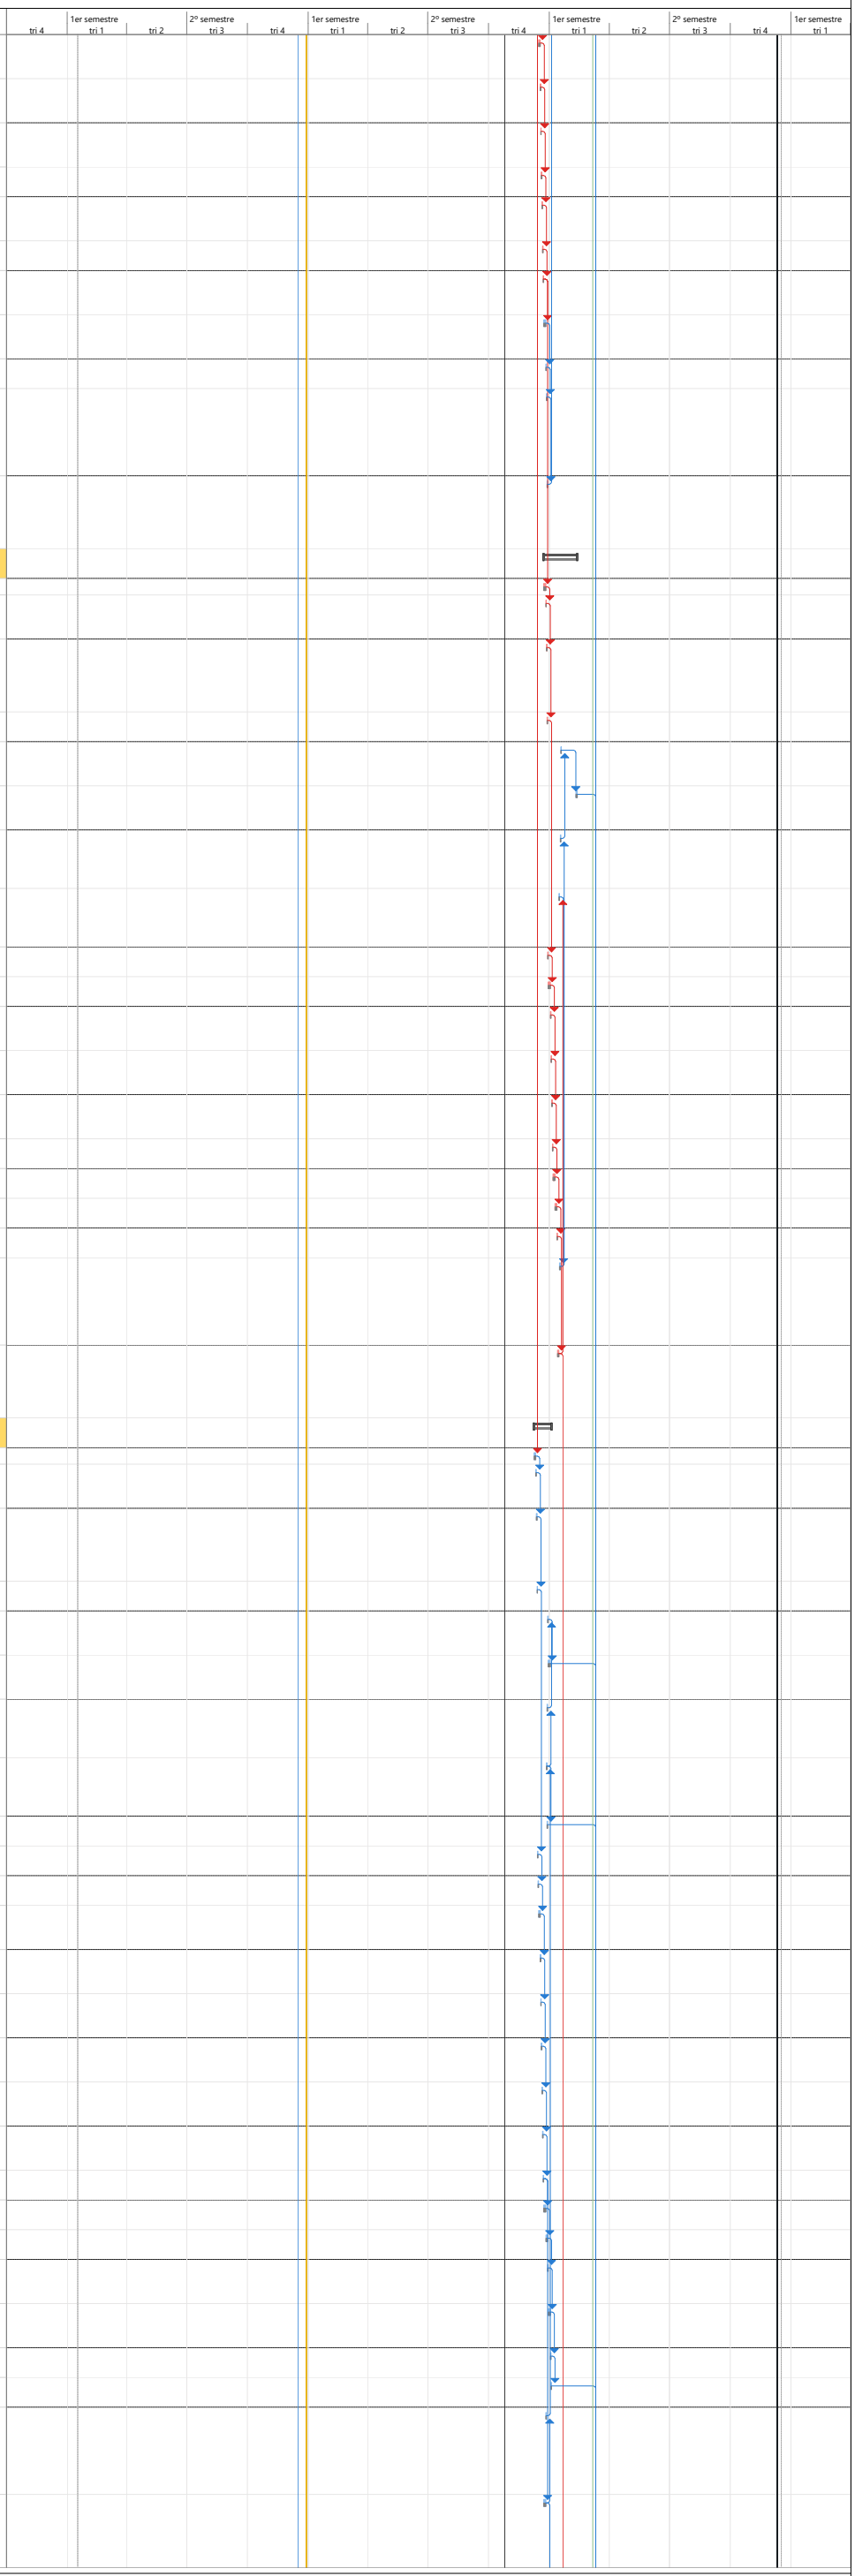

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2937	1.5.6.1.56.6.27	3.002 LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	mar 26/12/23	vie 29/12/23	$ 1,094,141	2936
2938	1.5.6.1.56.6.28	3.003 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	3 días	vie 29/12/23	mié 3/01/24	$ 1,094,141	2937
2939	**1.5.6.1.56.7**	**CIV 8011284 - PKID 149016 - CALLE 43 SUR (BOCACALLE)**	**62.6 días**	**mié 3/01/24**	**jue 14/03/24**	**$ 45,240,093**	
2940	1.5.6.1.56.7.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 114,665	3137FC-11 días
2941	1.5.6.1.56.7.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 3,068,605	2940
2942	1.5.6.1.56.7.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 233,881	2941
2943	1.5.6.1.56.7.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 362,161	2942
2944	1.5.6.1.56.7.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 6,461,805	2943
2945	1.5.6.1.56.7.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 340,088	2944
2946	1.5.6.1.56.7.7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 141,935	2945
2947	1.5.6.1.56.7.8	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 784,730	2946
2948	1.5.6.1.56.7.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 8,216,160	2947
2949	1.5.6.1.56.7.10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 344,960	2948
2950	1.5.6.1.56.7.11	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 212,335	2949
2951	1.5.6.1.56.7.12	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 3/01/24	jue 4/01/24	$ 82,565	2938
2952	1.5.6.1.56.7.13	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 4/01/24	vie 5/01/24	$ 362,586	2951
2953	1.5.6.1.56.7.14	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	3 días	vie 5/01/24	mié 10/01/24	$ 17,228,695	2952
2954	1.5.6.1.56.7.15	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	mié 10/01/24	sáb 13/01/24	$ 7,284,922	2953
2955	**1.5.6.1.56.8**	**CIV 8011170 - PKID 149037 - CALLE 41 SUR (BOCACALLE)**	**39.1 días**	**lun 15/01/24**	**mar 27/02/24**	**$ 125,695,855**	
2956	1.5.6.1.56.8.1	2.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 15/01/24	mar 16/01/24	$ 200,774	2909
2957	1.5.6.1.56.8.2	2.002 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 16/01/24	mié 17/01/24	$ 597,753	2956
2958	1.5.6.1.56.8.3	2.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 17/01/24	jue 18/01/24	$ 13,822,683	2957
2959	1.5.6.1.56.8.4	2.004 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24	$ 1,339,785	2958
2960	1.5.6.1.56.8.5	2.013 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	vie 23/02/24	lun 26/02/24	$ 7,066,007	2972;3005
2961	1.5.6.1.56.8.6	2.014 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 29/01/24	mar 30/01/24	$ 8,370,081	2973
2962	1.5.6.1.56.8.7	2.005 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	$ 835,323	2960
2963	1.5.6.1.56.8.8	2.012 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	1 día	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 63,456,654	2962
2964	1.5.6.1.56.8.9	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24	$ 165,186	2959
2965	1.5.6.1.56.8.10	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	vie 19/01/24	lun 22/01/24	$ 362,786	2964
2966	1.5.6.1.56.8.11	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1 día	lun 22/01/24	mar 23/01/24	$ 105,108	2965
2967	1.5.6.1.56.8.12	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	mar 23/01/24	mar 23/01/24	$ 1,435,724	2966
2968	1.5.6.1.56.8.13	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	mié 24/01/24	mié 24/01/24	$ 416,281	2967
2969	1.5.6.1.56.8.14	5.014 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mié 24/01/24	jue 25/01/24	$ 850,315	2968
2970	1.5.6.1.56.8.15	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 25/01/24	vie 26/01/24	$ 115,197	2969
2971	1.5.6.1.56.8.16	AD-006 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 26/01/24	sáb 27/01/24	$ 371,528	2970
2972	1.5.6.1.56.8.17	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	mar 30/01/24	mié 31/01/24	$ 10,570,502	2961
2973	1.5.6.1.56.8.18	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24	$ 15,614,169	2971
2974	**1.5.6.1.56.9**	**CIV 8011283 - PKID 149017 - TRANSVERSAL 72B (BOCACALLE)**	**40.6 días**	**lun 29/01/24**	**jue 14/03/24**	**$ 19,915,306**	
2975	1.5.6.1.56.9.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 82,255	3137FC-11 días
2976	1.5.6.1.56.9.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 2,201,394	2975
2977	1.5.6.1.56.9.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 167,787	2976
2978	1.5.6.1.56.9.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 259,798	2977
2979	1.5.6.1.56.9.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 4,635,472	2978
2980	1.5.6.1.56.9.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 243,964	2979
2981	1.5.6.1.56.9.7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 141,935	2980
2982	1.5.6.1.56.9.8	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 562,931	2981
2983	1.5.6.1.56.9.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 5,890,671	2982
2984	1.5.6.1.56.9.10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 344,960	2983
2985	1.5.6.1.56.9.11	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 152,320	2984
2986	1.5.6.1.56.9.12	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1 día	lun 29/01/24	mar 30/01/24	$ 35,544	2973
2987	1.5.6.1.56.9.13	5.008 PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	1 día	mar 30/01/24	mié 31/01/24	$ 1,435,724	2986
2988	1.5.6.1.56.9.14	5.009 CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	1 día	mié 31/01/24	jue 1/02/24	$ 478,723	2987
2989	1.5.6.1.56.9.15	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 1/02/24	vie 2/02/24	$ 120,573	2988
2990	1.5.6.1.56.9.16	AD-067 NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y	2 días	jue 7/03/24	sáb 9/03/24	$ 3,161,255	2989FC+30 días
2991	**1.5.6.1.56.10**	**CIV 8011346 - PKID 149101 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 45 SUR Y CALLE 44 SUR**	**11.6 días**	**lun 19/02/24**	**vie 1/03/24**	**$ 557,320,352**	
2992	1.5.6.1.56.10.1	1.001 REPLANTEO GENERAL	0.5 días	lun 19/02/24	lun 19/02/24	$ 779,761	2990FC-18 días
2993	1.5.6.1.56.10.2	1.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	0.8 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	$ 26,666,475	2992
2994	1.5.6.1.56.10.3	1.005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	0.8 días	mar 20/02/24	mié 21/02/24	$ 2,228,901	2993
2995	1.5.6.1.56.10.4	1.006 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	0.5 días	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 2,462,824	2996
2996	1.5.6.1.56.10.5	1.014 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 43,939,882	2997

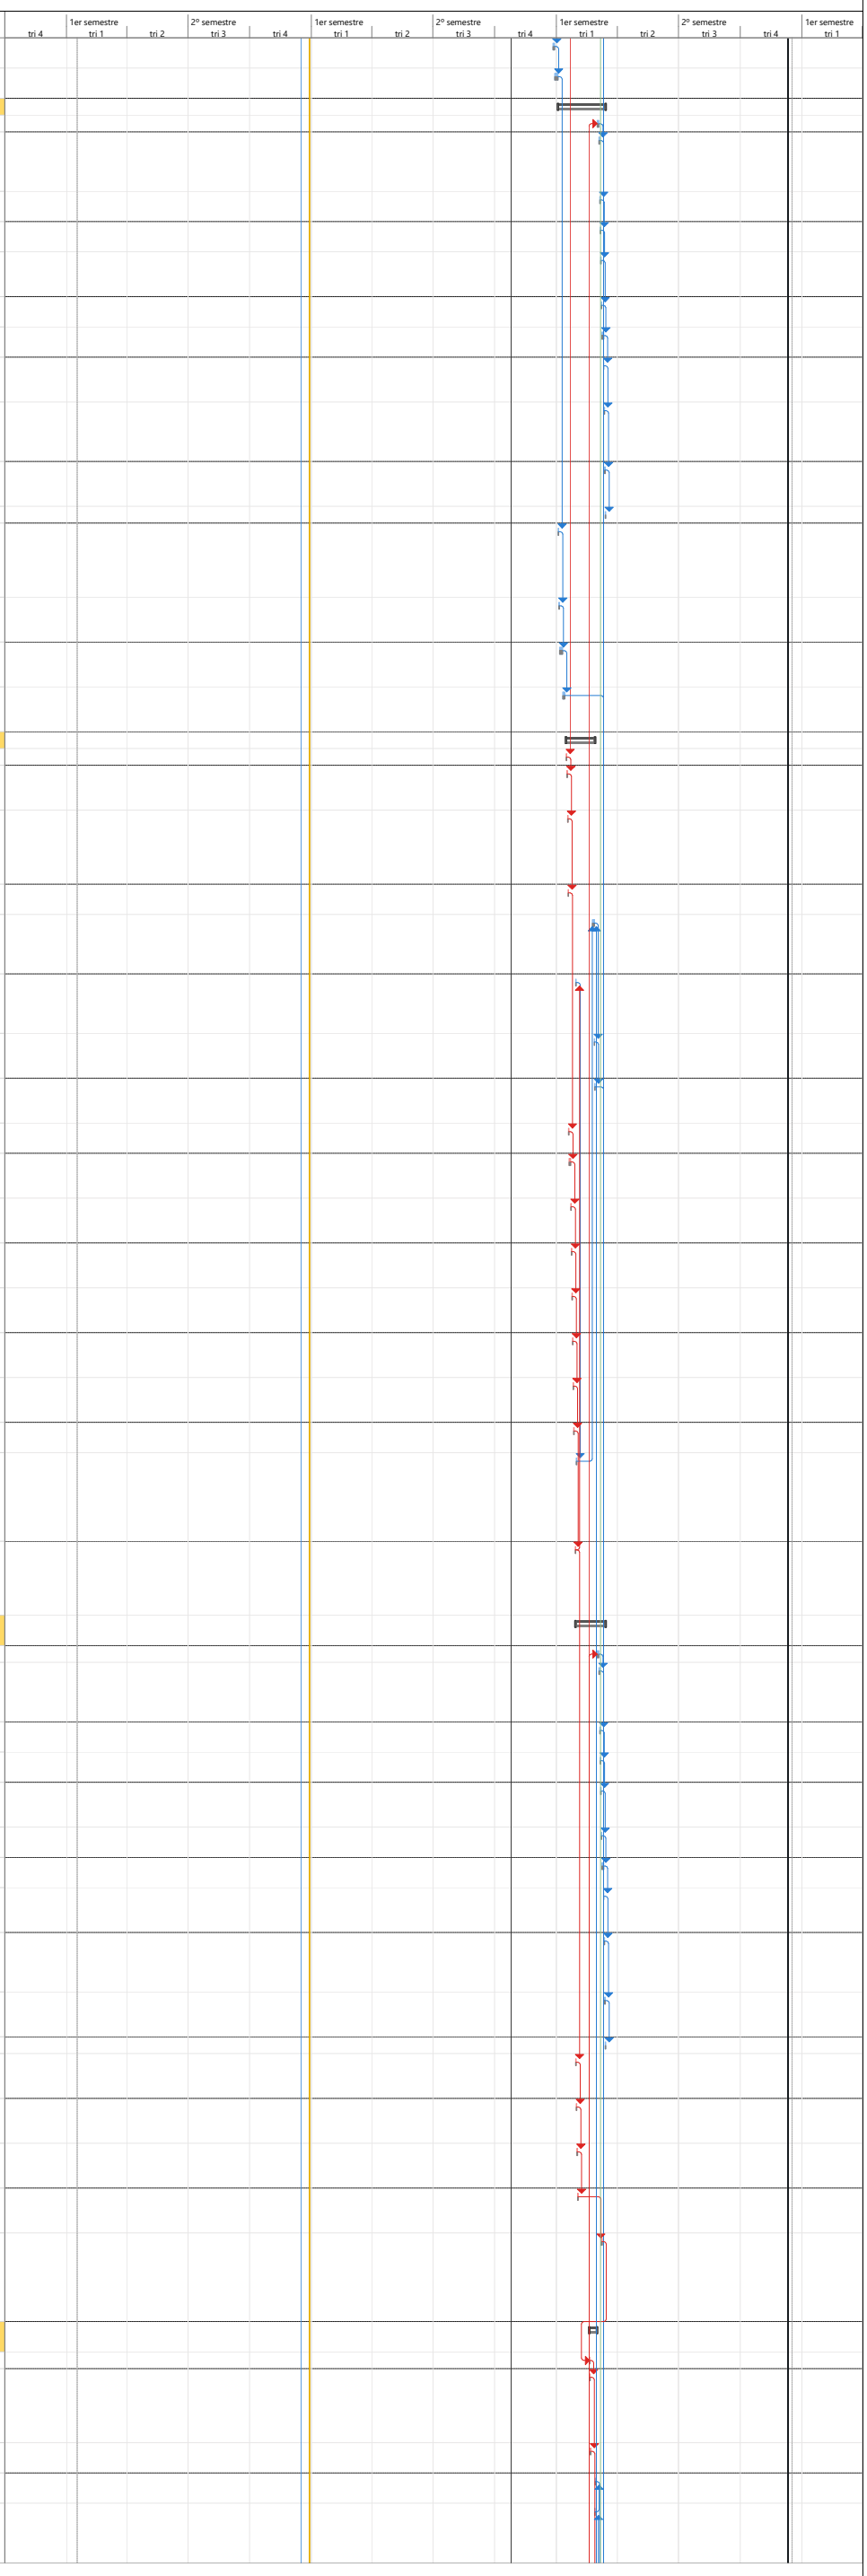


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
2997	1.5.6.1.56.10.6	1.015 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	$ 8,514,447	3000
2998	1.5.6.1.56.10.7	1.017 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	2 días	mié 28/02/24	vie 1/03/24	$ 83,136,204	2995
2999	1.5.6.1.56.10.8	3.026 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin de 1 tonelada incluye operario y combustible)	1 día	vie 1/03/24	vie 1/03/24	$ 96,934,471	2998
3000	1.5.6.1.56.10.9	NP-001 BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MGEA-A ENTREGADA EN PLANTA (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN).	1 día	vie 23/02/24	lun 26/02/24	$ 190,316,360	3005
3001	1.5.6.1.56.10.10	AD-006 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 21/02/24	jue 22/02/24	$ 1,282,196	3006
3002	1.5.6.1.56.10.11	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 13,624,164	3001
3003	1.5.6.1.56.10.12	AD-010 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 23/02/24	lun 26/02/24	$ 1,432,068	3002
3004	1.5.6.1.56.10.13	AD-013 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	$ 19,838,605	3003
3005	1.5.6.1.56.10.14	AD-027 CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. TRANSPORTE PETREOS 28KM.	1 día	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 10,570,502	3001
3006	1.5.6.1.56.10.15	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO , NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	1 día	mié 21/02/24	mié 21/02/24	$ 55,593,492	2994
3007	**1.5.6.1.56.11**	**CIV 8011373 - PKID 149109 - CALLE 45 SUR (BOCACALLE)**	**15 días**	**mar 27/02/24**	**vie 15/03/24**	**$ 211,953,016**	
3008	1.5.6.1.56.11.1	1.001 REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 273,912	3006FC+5 días
3009	1.5.6.1.56.11.2	1.003 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 10,480,093	3008
3010	1.5.6.1.56.11.3	1.005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 905,473	3009
3011	1.5.6.1.56.11.4	1.006 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	vie 1/03/24	sáb 2/03/24	$ 865,133	3010
3012	1.5.6.1.56.11.5	1.014 BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	$ 15,434,573	3011
3013	1.5.6.1.56.11.6	1.015 AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 4,626,196	3012
3014	1.5.6.1.56.11.7	1.017 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 142,148,973	3013
3015	1.5.6.1.56.11.8	3.01 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 812,404	3014
3016	1.5.6.1.56.11.9	3.016 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 165,590	3015
3017	1.5.6.1.56.11.10	3.021 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 1,874,569	3016
3018	1.5.6.1.56.11.11	3.027 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	$ 19,621,318	3017
3019	1.5.6.1.56.11.12	AD-005 DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 332,371	3018
3020	1.5.6.1.56.11.13	AD-006 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 507,228	3019
3021	1.5.6.1.56.11.14	AD-008 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 1,622,380	3020
3022	1.5.6.1.56.11.15	AD-028 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO , NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 12,282,803	3021
3023	**1.5.6.1.56.12**	**CIV 8011373 - PKID 149110 - CALLE 45 SUR (BOCACALLE)**	**14 días**	**jue 29/02/24**	**vie 15/03/24**	**$ 194,803,105**	
3024	1.5.6.1.56.12.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 264,221	3022FC-13 días
3025	1.5.6.1.56.12.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	vie 1/03/24	sáb 2/03/24	$ 7,071,297	3024
3026	1.5.6.1.56.12.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	$ 538,966	3025
3027	1.5.6.1.56.12.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 834,523	3026
3028	1.5.6.1.56.12.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 14,889,223	3027
3029	1.5.6.1.56.12.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 146,501,190	3028
3030	1.5.6.1.56.12.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 783,660	3029
3031	1.5.6.1.56.12.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 151,396	3030
3032	1.5.6.1.56.12.9	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	$ 1,808,241	3031
3033	1.5.6.1.56.12.10	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 18,928,800	3032
3034	1.5.6.1.56.12.11	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 304,674	3033
3035	1.5.6.1.56.12.12	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 489,281	3034
3036	1.5.6.1.56.12.13	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 1,480,247	3035
3037	1.5.6.1.56.12.14	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	1 día	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$ 757,386	3036
3038	**1.5.6.1.56.13**	**CIV 8011420 - PKID 148998 - CALLE 45 SUR (BOCACALLE)**	**15 días**	**mar 27/02/24**	**vie 15/03/24**	**$ 81,426,205**	
3039	1.5.6.1.56.13.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 144,551	3037FC-16 días
3040	1.5.6.1.56.13.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 5,242,960	3039
3041	1.5.6.1.56.13.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 446,172	3040
3042	1.5.6.1.56.13.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	vie 1/03/24	sáb 2/03/24	$ 456,555	3041
3043	1.5.6.1.56.13.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	$ 8,144,934	3042
3044	1.5.6.1.56.13.6	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 2,017,318	3043
3045	1.5.6.1.56.13.7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 11,686,687	3044
3046	1.5.6.1.56.13.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 428,727	3045
3047	1.5.6.1.56.13.9	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 78,538	3046
3048	1.5.6.1.56.13.10	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 989,261	3047
3049	1.5.6.1.56.13.11	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	$ 10,353,557	3048
3050	1.5.6.1.56.13.12	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 156,113	3049
3051	1.5.6.1.56.13.13	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 267,678	3050
3052	1.5.6.1.56.13.14	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 765,899	3051
3053	1.5.6.1.56.13.15	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO A MANO , NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Y BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 40,247,255	3052
3054	**1.5.6.1.56.14**	**CIV 8011420 - PKID 148997 - CALLE 45 SUR (BOCACALLE)**	**14 días**	**mar 27/02/24**	**jue 14/03/24**	**$ 33,792,068**	
3055	1.5.6.1.56.14.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 124,799	3053FC-15 días
3056	1.5.6.1.56.14.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 3,340,130	3055
3057	1.5.6.1.56.14.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 254,586	3056
3058	1.5.6.1.56.14.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	vie 1/03/24	sáb 2/03/24	$ 394,171	3057

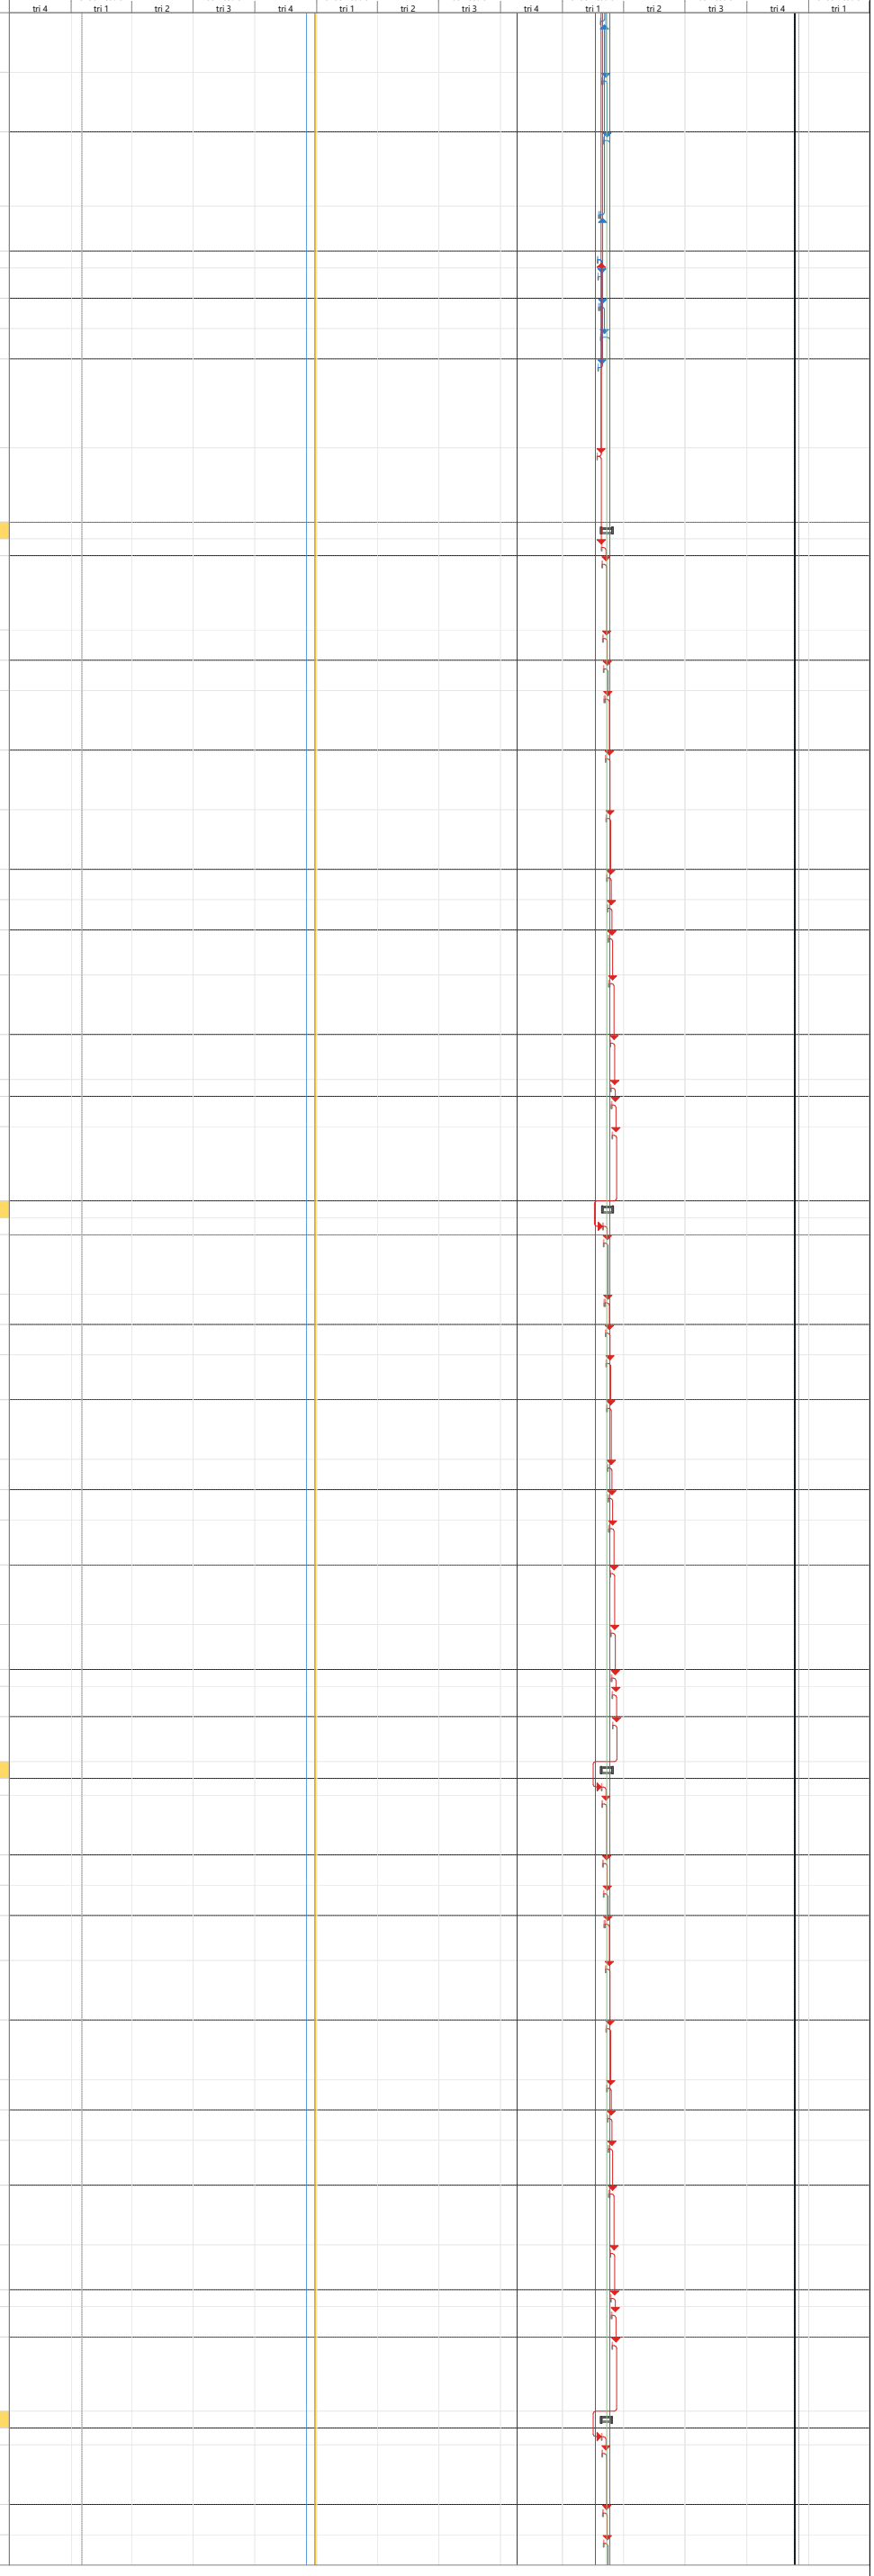


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
3059	1.5.6.1.56.14.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	$ 7,032,657	3058
3060	1.5.6.1.56.14.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 10,090,744	3059
3061	1.5.6.1.56.14.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 370,146	3060
3062	1.5.6.1.56.14.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 105,032	3061
3063	1.5.6.1.56.14.9	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 854,088	3062
3064	1.5.6.1.56.14.10	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 8,942,875	3063
3065	1.5.6.1.56.14.11	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	sáb 9/03/24	lun 11/03/24	$ 208,990	3064
3066	1.5.6.1.56.14.12	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 231,102	3065
3067	1.5.6.1.56.14.13	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 1,024,389	3066
3068	1.5.6.1.56.14.14	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 818,359	3067
3069	**1.5.6.1.56.15**	**CIV 8011873 - PKID 149098 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 43A SUR Y CALLE 43A SUR**	**23.3 días**	**vie 16/02/24**	**jue 14/03/24**	**$ 205,915,356**	
3070	1.5.6.1.56.15.1	REPLANTEO GENERAL	0.5 días	vie 16/02/24	sáb 17/02/24	$ 85,113	3068FC-23 días
3071	1.5.6.1.56.15.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	sáb 17/02/24	lun 19/02/24	$ 2,277,676	3070
3072	1.5.6.1.56.15.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	0.8 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	$ 173,596	3071
3073	1.5.6.1.56.15.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	0.8 días	mar 20/02/24	mié 21/02/24	$ 268,824	3072
3074	1.5.6.1.56.15.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	0.8 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	$ 4,796,331	3073
3075	1.5.6.1.56.15.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	0.8 días	mié 21/02/24	jue 22/02/24	$ 6,881,973	3074
3076	1.5.6.1.56.15.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	0.8 días	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 252,440	3075
3077	1.5.6.1.56.15.8	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	0.8 días	vie 23/02/24	sáb 24/02/24	$ 189,224	3076
3078	1.5.6.1.56.15.9	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	0.5 días	sáb 24/02/24	sáb 24/02/24	$ 3,498,489	3077
3079	1.5.6.1.56.15.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 77,591	3078
3080	1.5.6.1.56.15.11	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 582,486	3079
3081	1.5.6.1.56.15.12	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 6,095,861	3080
3082	1.5.6.1.56.15.13	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 156,113	3081
3083	1.5.6.1.56.15.14	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 157,612	3082
3084	1.5.6.1.56.15.15	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 1/03/24	sáb 2/03/24	$ 761,481	3083
3085	1.5.6.1.56.15.16	5.001 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	1.5 días	sáb 2/03/24	mar 5/03/24	$ 24,193,867	3084
3086	1.5.6.1.56.15.17	5.002 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	1.5 días	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 48,161,930	3085
3087	1.5.6.1.56.15.18	5.005 RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	1.5 días	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 23,470,518	3086
3088	1.5.6.1.56.15.19	AD-029 PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 1,467,794	3087
3089	1.5.6.1.56.15.20	AD-031 PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø14" A Ø24".	1 día	vie 8/03/24	sáb 9/03/24	$ 914,645	3088
3090	1.5.6.1.56.15.21	AD-032 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	sáb 9/03/24	sáb 9/03/24	$ 243,409	3089
3091	1.5.6.1.56.15.22	AD-033 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 486,817	3090
3092	1.5.6.1.56.15.23	AD-034 CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 825,492	3091
3093	1.5.6.1.56.15.24	AD-035 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 1,992,337	3092
3094	1.5.6.1.56.15.25	AD-036 CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 1,338,234	3093
3095	1.5.6.1.56.15.26	AD-037 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 4,033,569	3094
3096	1.5.6.1.56.15.27	AD-038 CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 268,714	3095
3097	1.5.6.1.56.15.28	AD-039 CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 168,321	3096
3098	1.5.6.1.56.15.29	AD-040 EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 418,602	3097
3099	1.5.6.1.56.15.30	AD-041 EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 1,799,655	3098
3100	1.5.6.1.56.15.31	AD-042 EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=8" U.M RDE 21=1 ML, TEE HD EL 8"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=8"=1 UN, UZ U.M PVC D=4"=1 UN, UR U.M PVC D=8"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro e in	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 10,182,156	3099
3101	1.5.6.1.56.15.32	AD-043 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	0.1 días	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 1,283,914	3100
3102	1.5.6.1.56.15.33	AD-044 TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 776,268	3101
3103	1.5.6.1.56.15.34	AD-045 TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 1,224,010	3102
3104	1.5.6.1.56.15.35	AD-046 TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INSTALACION.	0.1 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 3,568,650	3103
3105	1.5.6.1.56.15.36	AD-047 TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 6,515,618	3104
3106	1.5.6.1.56.15.37	AD-048 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 2,580,400	3105
3107	1.5.6.1.56.15.38	AD-049 TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 15,697,182	3106
3108	1.5.6.1.56.15.39	AD-050 UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 700,900	3107
3109	1.5.6.1.56.15.40	AD-051 ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 1,492,320	3108
3110	1.5.6.1.56.15.41	AD-052 ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 872,018	3109
3111	1.5.6.1.56.15.42	AD-053 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 401,755	3110
3112	1.5.6.1.56.15.43	AD-054 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 911,069	3111
3113	1.5.6.1.56.15.44	AD-055 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.2 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 2,491,130	3112
3114	1.5.6.1.56.15.45	AD-056 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 479,885	3113
3115	1.5.6.1.56.15.46	AD-057 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 1,869,212	3114
3116	1.5.6.1.56.15.47	AD-058 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 2,533,523	3115
3117	1.5.6.1.56.15.48	AD-059 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 2,103,484	3116
3118	1.5.6.1.56.15.49	AD-060 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 3,710,964	3117
3119	1.5.6.1.56.15.50	AD-061 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.1 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 2,791,226	3118
3120	1.5.6.1.56.15.51	AD-063 TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).	0.1 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	$ 7,690,958	3119
3121	**1.5.6.1.56.16**	**CIV 8014327 - PKID 24180592 - CALLE 43A SUR (BOCACALLE)**	**20.2 días**	**mié 21/02/24**	**jue 14/03/24**	**$ 62,996,933**	
3122	1.5.6.1.56.16.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 21/02/24	jue 22/02/24	$ 188,222	3120FC-20 días
3123	1.5.6.1.56.16.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	jue 22/02/24	vie 23/02/24	$ 5,037,257	3122
3124	1.5.6.1.56.16.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	vie 23/02/24	sáb 24/02/24	$ 383,930	3123
3125	1.5.6.1.56.16.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	sáb 24/02/24	lun 26/02/24	$ 594,489	3124


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
3126	1.5.6.1.56.16.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	lun 26/02/24	mar 27/02/24	$ 10,606,855	3125
3127	1.5.6.1.56.16.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mar 27/02/24	mié 28/02/24	$ 15,216,336	3126
3128	1.5.6.1.56.16.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 28/02/24	jue 29/02/24	$ 558,255	3127
3129	1.5.6.1.56.16.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24	$ 236,558	3128
3130	1.5.6.1.56.16.9	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	jue 29/02/24	vie 1/03/24	$ 1,288,137	3129
3131	1.5.6.1.56.16.10	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 13,482,710	3130
3132	1.5.6.1.56.16.11	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 475,896	3131
3133	1.5.6.1.56.16.12	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 5/03/24	mar 5/03/24	$ 348,549	3132
3134	1.5.6.1.56.16.13	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 2,315,372	3133
3135	1.5.6.1.56.16.14	AD-064 SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	0.1 días	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 1,912,043	3134
3136	1.5.6.1.56.16.15	AD-065 ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	0.1 días	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 7,064,542	3135
3137	1.5.6.1.56.16.16	AD-066 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	7 días	mié 6/03/24	jue 14/03/24	$ 3,287,782	3136
3138	**1.5.6.1.56.17**	**CIV 8011390 - PKID 148967 - CALLE 44 SUR (BOCACALLE)**	**12 días**	**vie 1/03/24**	**vie 15/03/24**	**$ 19,936,352**	
3139	1.5.6.1.56.17.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 99,309	3137FC-11 días
3140	1.5.6.1.56.17.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 2,657,752	3139
3141	1.5.6.1.56.17.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 202,570	3140
3142	1.5.6.1.56.17.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 313,658	3141
3143	1.5.6.1.56.17.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 5,596,700	3142
3144	1.5.6.1.56.17.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 294,541	3143
3145	1.5.6.1.56.17.7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 164,643	3144
3146	1.5.6.1.56.17.8	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 679,634	3145
3147	1.5.6.1.56.17.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 7,113,261	3146
3148	1.5.6.1.56.17.10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 521,218	3147
3149	1.5.6.1.56.17.11	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 183,898	3148
3150	1.5.6.1.56.17.12	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 2,109,168	3149
3151	**1.5.6.1.56.18**	**CIV 8011306 - PKID 149013 - CALLE 43A SUR (BOCACALLE)**	**13 días**	**vie 1/03/24**	**sáb 16/03/24**	**$ 46,971,092**	
3152	1.5.6.1.56.18.1	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 1/03/24	lun 4/03/24	$ 169,942	3137FC-11 días
3153	1.5.6.1.56.18.2	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	1 día	lun 4/03/24	mar 5/03/24	$ 4,548,426	3152
3154	1.5.6.1.56.18.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	1 día	mar 5/03/24	mié 6/03/24	$ 346,685	3153
3155	1.5.6.1.56.18.4	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$ 536,751	3154
3156	1.5.6.1.56.18.5	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	1 día	mié 6/03/24	jue 7/03/24	$ 9,576,968	3155
3157	1.5.6.1.56.18.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	jue 7/03/24	vie 8/03/24	$ 13,738,613	3156
3158	1.5.6.1.56.18.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	vie 8/03/24	lun 11/03/24	$ 504,035	3157
3159	1.5.6.1.56.18.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	1 día	lun 11/03/24	lun 11/03/24	$ 259,266	3158
3160	1.5.6.1.56.18.9	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 1,163,029	3159
3161	1.5.6.1.56.18.10	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	1 día	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 12,174,621	3160
3162	1.5.6.1.56.18.11	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 1,100,349	3161
3163	1.5.6.1.56.18.12	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 314,697	3162
3164	1.5.6.1.56.18.13	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	1 día	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 2,537,710	3163
3165	*1.5.6.1.57*	*FIN DE INTERVENCIÓN ACTIVIDADES DE OBRA CORREDOR DE LA AVENIDA FERROCARRIL DEL SUR ENTRE AVENIDA BOYACÁ Y CALLE 45 SUR (ETAPAS 1, 2, 3 Y 4)*	*0 días*	*sáb 16/03/24*	*sáb 16/03/24*	*$ 3,012*	*3150;2804;2829;2851;3004;*
3166	*1.5.6.1.58*	*APROBACIÓN DE PMT FRENTE DE OBRA No. 20 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*lun 30/10/23*	*lun 30/10/23*	*$ 0*	2796FC+17 días
3167	*1.5.6.1.59*	*INICIO DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 20 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*mié 1/11/23*	*mié 1/11/23*	*$ 0*	*3166FC+2 días*
3168	**1.5.6.1.60**	**FRENTE DE OBRA No. 20 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)**	**41.65 días**	**mié 1/11/23**	**jue 21/12/23**	**$ 1,566,160,509**	
3169	**1.5.6.1.60.1**	**CIV 11014819 - PKID 91034517 - CALLE 134 ENTRE CANAL CÓRDOBA Y CARRERA 53C**	**0.95 días**	**mié 1/11/23**	**jue 2/11/23**	**$ 33,148,254**	
3170	1.5.6.1.60.1.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 322,413	3167
3171	1.5.6.1.60.1.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 3,072,595	3170
3172	1.5.6.1.60.1.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.1 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 1,263,961	3171
3173	1.5.6.1.60.1.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 880,048	3172
3174	1.5.6.1.60.1.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	mié 1/11/23	mié 1/11/23	$ 27,052,280	3173
3175	1.5.6.1.60.1.6	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	mié 1/11/23	jue 2/11/23	$ 556,957	3174
3176	**1.5.6.1.60.2**	**CIV 11013332 - PKID 91019915 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 53C Y CARRERA 53C**	**0.95 días**	**jue 2/11/23**	**jue 2/11/23**	**$ 19,214,174**	
3177	1.5.6.1.60.2.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 188,651	3175
3178	1.5.6.1.60.2.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 1,789,612	3177
3179	1.5.6.1.60.2.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.1 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 736,185	3178
3180	1.5.6.1.60.2.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 512,577	3179
3181	1.5.6.1.60.2.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 15,756,410	3180
3182	1.5.6.1.60.2.6	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 230,739	3181
3183	**1.5.6.1.60.3**	**CIV 11014192 - PKID 24122941 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 53C Y CARRERA 53**	**0.95 días**	**jue 2/11/23**	**vie 3/11/23**	**$ 112,102,415**	
3184	1.5.6.1.60.3.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	jue 2/11/23	jue 2/11/23	$ 1,099,368	3182
3185	1.5.6.1.60.3.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 2/11/23	vie 3/11/23	$ 10,381,660	3184
3186	1.5.6.1.60.3.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.1 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 4,270,667	3185
3187	1.5.6.1.60.3.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 2,973,494	3186
3188	1.5.6.1.60.3.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 91,404,007	3187
3189	1.5.6.1.60.3.6	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 1,973,219	3188
3190	**1.5.6.1.60.4**	**CIV 11012376 - PKID 527218 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 52A**	**0.95 días**	**vie 3/11/23**	**mar 7/11/23**	**$ 56,823,992**	
3191	1.5.6.1.60.4.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 552,428	3189
3192	1.5.6.1.60.4.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	$ 5,284,154	3191
3193	1.5.6.1.60.4.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.1 días	vie 3/11/23	sáb 4/11/23	$ 2,173,723	3192
3194	1.5.6.1.60.4.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	sáb 4/11/23	sáb 4/11/23	$ 1,513,476	3193
3195	1.5.6.1.60.4.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	sáb 4/11/23	sáb 4/11/23	$ 46,523,654	3194
3196	1.5.6.1.60.4.6	3.013 - SELLADO DE JUNTAS	0.2 días	sáb 4/11/23	mar 7/11/23	$ 776,557	3195
3197	**1.5.6.1.60.5**	**CIV 11012375 - PKID 527156 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 52A Y CARRERA 51**	**0.95 días**	**mar 7/11/23**	**mar 7/11/23**	**$ 47,475,068**	
3198	1.5.6.1.60.5.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.05 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 480,511	3196
3199	1.5.6.1.60.5.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 4,399,144	3198
3200	1.5.6.1.60.5.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.1 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 1,809,661	3199
3201	1.5.6.1.60.5.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 1,259,991	3200
3202	1.5.6.1.60.5.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 38,731,700	3201
3203	1.5.6.1.60.5.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23	$ 794,061	3202
3204	**1.5.6.1.60.6**	**CIV 11009333 - PKID 530377 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 51 Y CARRERA 50**	**1.7 días**	**mar 7/11/23**	**jue 9/11/23**	**$ 61,433,492**	
3205	1.5.6.1.60.6.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	$ 597,584	3203
3206	1.5.6.1.60.6.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mié 8/11/23	mié 8/11/23	$ 5,709,899	3205
3207	1.5.6.1.60.6.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 8/11/23	mié 8/11/23	$ 2,348,862	3206
3208	1.5.6.1.60.6.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 8/11/23	mié 8/11/23	$ 1,635,419	3207
3209	1.5.6.1.60.6.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mié 8/11/23	jue 9/11/23	$ 50,272,080	3208
3210	1.5.6.1.60.6.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23	$ 869,648	3209
3211	**1.5.6.1.60.7**	**CIV 11009345 - PKID 167500 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 50 Y CARRERA 49A**	**1.9 días**	**jue 9/11/23**	**sáb 11/11/23**	**$ 14,369,164**	
3212	1.5.6.1.60.7.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23	$ 137,018	3210
3213	1.5.6.1.60.7.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	jue 9/11/23	jue 9/11/23	$ 1,310,617	3212
3214	1.5.6.1.60.7.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 9/11/23	vie 10/11/23	$ 539,144	3213
3215	1.5.6.1.60.7.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 10/11/23	vie 10/11/23	$ 375,384	3214
3216	1.5.6.1.60.7.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	vie 10/11/23	vie 10/11/23	$ 11,539,157	3215
3217	1.5.6.1.60.7.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 10/11/23	sáb 11/11/23	$ 467,844	3216

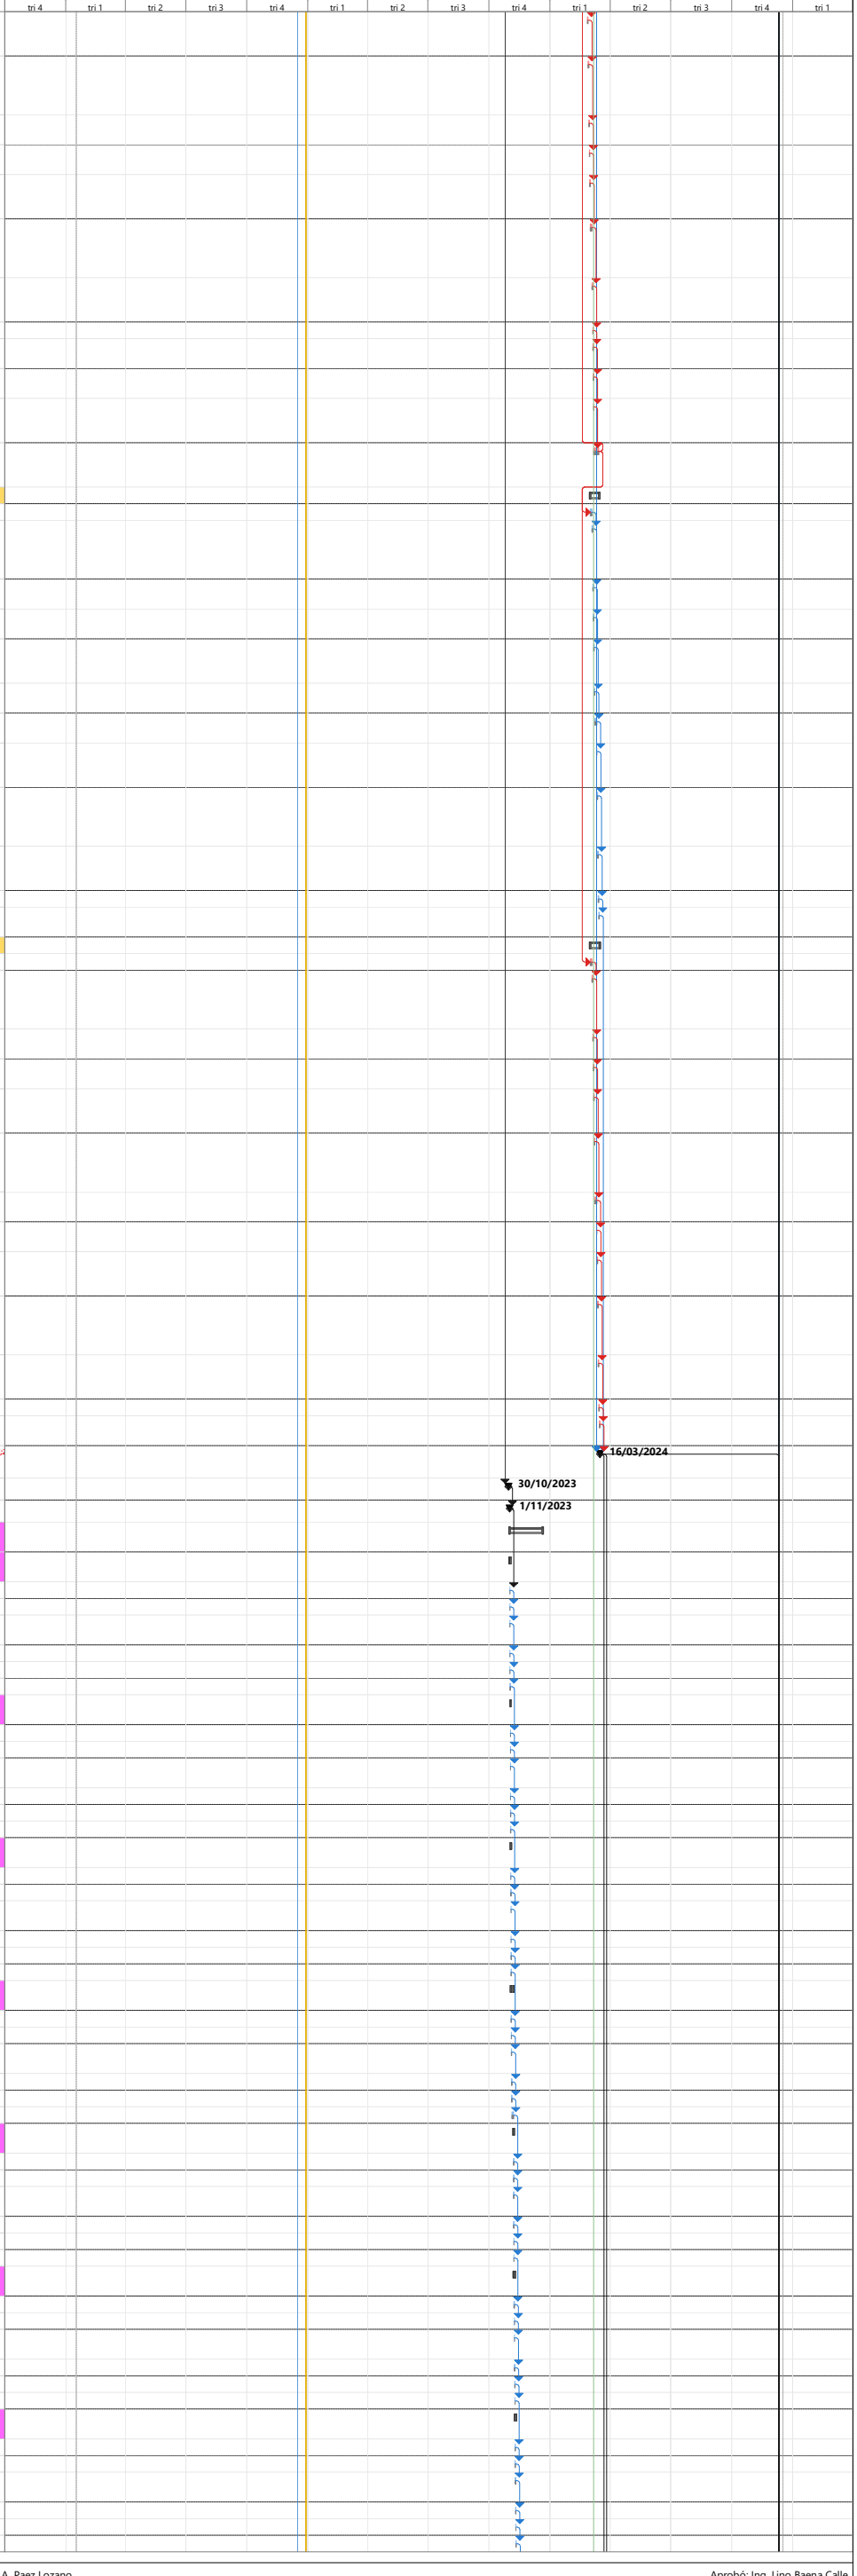

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
3218	**1.5.6.1.60.8**	**CIV 11009356 - PKID 167499 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 49A Y CARRERA 49**	**1.4 días**	**sáb 11/11/23**	**mar 14/11/23**	**$ 52,209,344**	
3219	1.5.6.1.60.8.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23	$ 510,365	3217
3220	1.5.6.1.60.8.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23	$ 4,881,790	3219
3221	1.5.6.1.60.8.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	sáb 11/11/23	mar 14/11/23	$ 2,008,206	3220
3222	1.5.6.1.60.8.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	$ 1,398,231	3221
3223	1.5.6.1.60.8.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	$ 42,981,100	3222
3224	1.5.6.1.60.8.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	$ 429,652	3223
3225	**1.5.6.1.60.9**	**CIV11014710 - PKID 91032333 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 49 Y CARRERA 47**	**1.5 días**	**mar 14/11/23**	**jue 16/11/23**	**$ 37,335,266**	
3226	1.5.6.1.60.9.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	$ 359,679	3224
3227	1.5.6.1.60.9.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23	$ 3,440,455	3226
3228	1.5.6.1.60.9.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	$ 1,415,288	3227
3229	1.5.6.1.60.9.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	$ 985,407	3228
3230	1.5.6.1.60.9.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.2 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	$ 30,291,045	3229
3231	1.5.6.1.60.9.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 15/11/23	jue 16/11/23	$ 843,392	3230
3232	**1.5.6.1.60.10**	**CIV 11009393 - PKID 530370 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 45**	**1.4 días**	**jue 16/11/23**	**vie 17/11/23**	**$ 41,189,582**	
3233	1.5.6.1.60.10.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 16/11/23	jue 16/11/23	$ 394,455	3231
3234	1.5.6.1.60.10.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	jue 16/11/23	jue 16/11/23	$ 3,773,085	3233
3235	1.5.6.1.60.10.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	jue 16/11/23	jue 16/11/23	$ 1,552,119	3234
3236	1.5.6.1.60.10.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.2 días	jue 16/11/23	jue 16/11/23	$ 1,080,678	3235
3237	1.5.6.1.60.10.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	jue 16/11/23	vie 17/11/23	$ 33,219,637	3236
3238	1.5.6.1.60.10.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	$ 1,169,608	3237
3239	**1.5.6.1.60.11**	**CIV 11008720 - PKID 526326 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 55A Y CARRERA 54**	**1.7 días**	**vie 17/11/23**	**lun 20/11/23**	**$ 169,628,779**	
3240	1.5.6.1.60.11.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	$ 1,654,440	3238
3241	1.5.6.1.60.11.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	$ 15,701,074	3240
3242	1.5.6.1.60.11.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	$ 6,458,895	3241
3243	1.5.6.1.60.11.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 17/11/23	sáb 18/11/23	$ 4,497,071	3242
3244	1.5.6.1.60.11.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	sáb 18/11/23	lun 20/11/23	$ 138,238,123	3243
3245	1.5.6.1.60.11.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 20/11/23	lun 20/11/23	$ 3,079,176	3244
3246	**1.5.6.1.60.12**	**CIV 11008693 - PKID 526337 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 57 Y CARRERA 55A**	**3.3 días**	**lun 20/11/23**	**jue 23/11/23**	**$ 106,878,533**	
3247	1.5.6.1.60.12.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 20/11/23	lun 20/11/23	$ 1,037,871	3245
3248	1.5.6.1.60.12.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 20/11/23	mar 21/11/23	$ 9,842,376	3247
3249	1.5.6.1.60.12.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 21/11/23	mar 21/11/23	$ 4,048,825	3248
3250	1.5.6.1.60.12.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 21/11/23	mié 22/11/23	$ 2,819,032	3249
3251	1.5.6.1.60.12.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 22/11/23	jue 23/11/23	$ 86,655,949	3250
3252	1.5.6.1.60.12.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 2,474,480	3251
3253	**1.5.6.1.60.13**	**CIV 11008523 - PKID 526344 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 57**	**3.3 días**	**jue 23/11/23**	**lun 27/11/23**	**$ 88,702,333**	
3254	1.5.6.1.60.13.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 859,786	3252
3255	1.5.6.1.60.13.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 23/11/23	vie 24/11/23	$ 8,189,992	3254
3256	1.5.6.1.60.13.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 3,369,089	3255
3257	1.5.6.1.60.13.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 24/11/23	sáb 25/11/23	$ 2,345,712	3256
3258	1.5.6.1.60.13.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	sáb 25/11/23	lun 27/11/23	$ 72,107,752	3257
3259	1.5.6.1.60.13.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	$ 1,830,002	3258
3260	**1.5.6.1.60.14**	**CIV 11008348 - PKID 526357 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58C Y CARRERA 58**	**3.3 días**	**lun 27/11/23**	**jue 30/11/23**	**$ 71,804,064**	
3261	1.5.6.1.60.14.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	$ 691,687	3259
3262	1.5.6.1.60.14.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	lun 27/11/23	mar 28/11/23	$ 6,608,331	3261
3263	1.5.6.1.60.14.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23	$ 2,718,445	3262
3264	1.5.6.1.60.14.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 29/11/23	mié 29/11/23	$ 1,892,744	3263
3265	1.5.6.1.60.14.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 29/11/23	jue 30/11/23	$ 58,182,206	3264
3266	1.5.6.1.60.14.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	$ 1,710,651	3265
3267	**1.5.6.1.60.15**	**CIV 11008466 - PKID 526347 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58**	**3.1 días**	**jue 30/11/23**	**lun 4/12/23**	**$ 127,170,862**	
3268	1.5.6.1.60.15.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	$ 1,254,816	3266
3269	1.5.6.1.60.15.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.8 días	jue 30/11/23	vie 1/12/23	$ 11,989,542	3268
3270	1.5.6.1.60.15.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.8 días	vie 1/12/23	sáb 2/12/23	$ 4,932,092	3269
3271	1.5.6.1.60.15.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	sáb 2/12/23	lun 4/12/23	$ 3,434,021	3270
3272	1.5.6.1.60.15.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 105,560,391	3271
3273	**1.5.6.1.60.16**	**CIV 11014241 - PKID 24123569 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 59A Y CARRERA 59**	**1.7 días**	**lun 4/12/23**	**mié 6/12/23**	**$ 28,508,446**	
3274	1.5.6.1.60.16.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 278,184	3272
3275	1.5.6.1.60.16.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.2 días	lun 4/12/23	mar 5/12/23	$ 2,639,557	3274
3276	1.5.6.1.60.16.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.2 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 1,085,825	3275
3277	1.5.6.1.60.16.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 756,015	3276
3278	1.5.6.1.60.16.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	mar 5/12/23	mié 6/12/23	$ 23,239,647	3277
3279	1.5.6.1.60.16.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 509,218	3278
3280	**1.5.6.1.60.17**	**CIV 11008215 - PKID 526365 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 59 Y CARRERA 58C**	**2.1 días**	**mié 6/12/23**	**sáb 9/12/23**	**$ 67,394,046**	
3281	1.5.6.1.60.17.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 656,655	3279
3282	1.5.6.1.60.17.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 6,251,449	3281
3283	1.5.6.1.60.17.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mié 6/12/23	jue 7/12/23	$ 2,571,638	3282
3284	1.5.6.1.60.17.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 1,790,529	3283
3285	1.5.6.1.60.17.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.4 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	$ 55,040,096	3284
3286	1.5.6.1.60.17.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 7/12/23	sáb 9/12/23	$ 1,083,679	3285
3287	**1.5.6.1.60.18**	**CIV 11014240 - PKID 526316 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y CARRERA 59B BIS**	**2.5 días**	**sáb 9/12/23**	**mar 12/12/23**	**$ 76,277,182**	
3288	1.5.6.1.60.18.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	sáb 9/12/23	sáb 9/12/23	$ 749,605	3286
3289	1.5.6.1.60.18.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	sáb 9/12/23	lun 11/12/23	$ 7,157,003	3288
3290	1.5.6.1.60.18.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 2,944,151	3289
3291	1.5.6.1.60.18.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 2,049,893	3290
3292	1.5.6.1.60.18.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23	$ 63,012,917	3291
3293	1.5.6.1.60.18.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	$ 363,613	3292
3294	**1.5.6.1.60.19**	**CIV 11013339 - PKID 91020772 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 59B BIS Y CARRERA 59A**	**2.5 días**	**mar 12/12/23**	**vie 15/12/23**	**$ 53,722,627**	
3295	1.5.6.1.60.19.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	$ 521,001	3293
3296	1.5.6.1.60.19.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	$ 4,970,323	3295
3297	1.5.6.1.60.19.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 2,044,624	3296
3298	1.5.6.1.60.19.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 13/12/23	jue 14/12/23	$ 1,423,589	3297
3299	1.5.6.1.60.19.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	$ 43,760,568	3298
3300	1.5.6.1.60.19.6	3.013 - SELLO DE JUNTAS	0.2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 1,002,522	3299
3301	**1.5.6.1.60.20**	**CIV 11008453 - PKID 526350 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58**	**2.3 días**	**vie 15/12/23**	**lun 18/12/23**	**$ 60,747,860**	
3302	1.5.6.1.60.20.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 601,101	3300
3303	1.5.6.1.60.20.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 5,640,233	3302
3304	1.5.6.1.60.20.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 2,320,204	3303
3305	1.5.6.1.60.20.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	vie 15/12/23	sáb 16/12/23	$ 1,644,048	3304
3306	1.5.6.1.60.20.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	sáb 16/12/23	lun 18/12/23	$ 50,542,274	3305
3307	**1.5.6.1.60.21**	**CIV 11012380 - PKID 526324 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58**	**2.3 días**	**lun 18/12/23**	**mié 20/12/23**	**$ 47,286,634**	
3308	1.5.6.1.60.21.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 472,708	3306
3309	1.5.6.1.60.21.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	$ 4,457,554	3308
3310	1.5.6.1.60.21.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 1,833,688	3309
3311	1.5.6.1.60.21.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 1,276,722	3310
3312	1.5.6.1.60.21.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	$ 39,245,962	3311
3313	**1.5.6.1.60.22**	**CIV 11008347- PKID 526309 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58 (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**mié 13/12/23**	**vie 15/12/23**	**$ 72,310,306**	
3314	1.5.6.1.60.22.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 714,087	3312FC-6 días
3315	1.5.6.1.60.22.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mié 13/12/23	jue 14/12/23	$ 6,817,286	3314
3316	1.5.6.1.60.22.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	jue 14/12/23	jue 14/12/23	$ 2,804,404	3315
3317	1.5.6.1.60.22.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 1,952,591	3316
3318	1.5.6.1.60.22.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 60,021,938	3317
3319	**1.5.6.1.60.23**	**CIV 11008387- PKID 526367 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58 (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**vie 15/12/23**	**mar 19/12/23**	**$ 71,954,805**	
3320	1.5.6.1.60.23.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 709,217	3318
3321	1.5.6.1.60.23.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	sáb 16/12/23	sáb 16/12/23	$ 6,783,901	3320
3322	1.5.6.1.60.23.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	sáb 16/12/23	lun 18/12/23	$ 2,790,669	3321
3323	1.5.6.1.60.23.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	$ 1,943,031	3322
3324	1.5.6.1.60.23.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	lun 18/12/23	mar 19/12/23	$ 59,727,987	3323
3325	**1.5.6.1.60.24**	**CIV 11012380- PKID 526322 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 58 Y CARRERA 58 (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**mar 19/12/23**	**jue 21/12/23**	**$ 48,473,281**	
3326	1.5.6.1.60.24.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 484,662	3324
3327	1.5.6.1.60.24.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	$ 4,569,406	3326
3328	1.5.6.1.60.24.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	$ 1,879,701	3327
3329	1.5.6.1.60.24.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	$ 1,308,760	3328
3330	1.5.6.1.60.24.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	$ 40,230,752	3329
3331	*1.5.6.1.61*	*FIN DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 20 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*jue 21/12/23*	*jue 21/12/23*	*$ 0*	*3330*
3332	*1.5.6.1.62*	*APROBACIÓN DE PMT FRENTE DE OBRA No. 21 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*mié 13/12/23*	*mié 13/12/23*	*$ 0*	3314
3333	*1.5.6.1.63*	*INICIO DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 21 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*mié 20/12/23*	*mié 20/12/23*	*$ 0*	*3332FC+6 días*
3334	**1.5.6.1.64**	**FRENTE DE OBRA No. 21 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)**	**121.1 días**	**mié 20/12/23**	**mar 14/05/24**	**$ 439,023,015**	
3335	**1.5.6.1.64.1**	**CIV 11008693 - PKID 526335 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 55A Y CARRERA 57 (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**mié 20/12/23**	**vie 22/12/23**	**$ 140,917,921**	
3336	1.5.6.1.64.1.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	$ 1,390,402	3333
3337	1.5.6.1.64.1.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	$ 13,285,607	3336
3338	1.5.6.1.64.1.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	jue 21/12/23	jue 21/12/23	$ 5,465,252	3337
3339	1.5.6.1.64.1.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 21/12/23	vie 22/12/23	$ 3,805,236	3338
3340	1.5.6.1.64.1.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	vie 22/12/23	vie 22/12/23	$ 116,971,424	3339

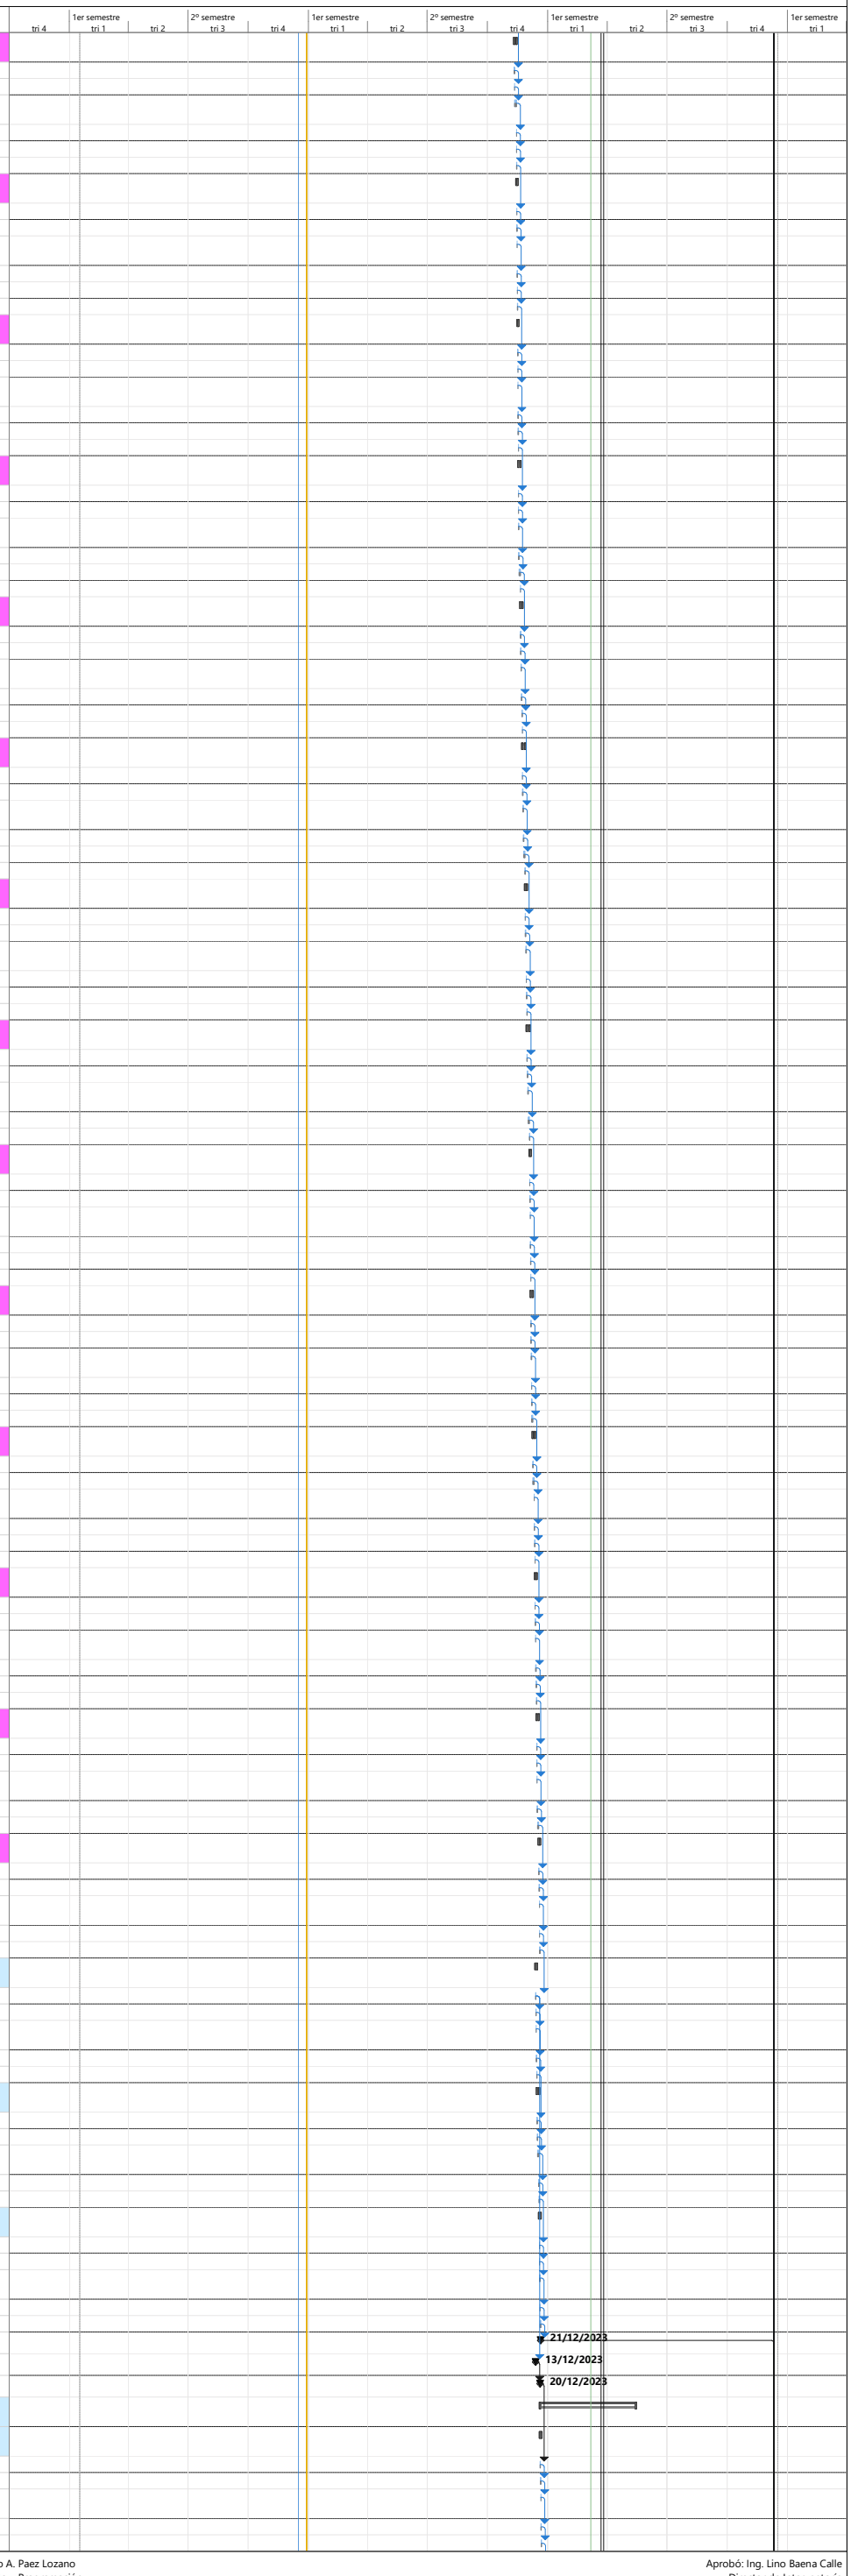

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
3341	**1.5.6.1.64.2**	**CIV 11008720 - PKID 526329 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 55A (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**vie 22/12/23**	**mié 27/12/23**	**$ 15,678,920**	
3342	1.5.6.1.64.2.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	vie 22/12/23	vie 22/12/23	$ 156,324	3340
3343	1.5.6.1.64.2.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	vie 22/12/23	sáb 23/12/23	$ 1,478,041	3342
3344	1.5.6.1.64.2.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	$ 608,017	3343
3345	1.5.6.1.64.2.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	mar 26/12/23	mar 26/12/23	$ 423,314	3344
3346	1.5.6.1.64.2.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	mar 26/12/23	mié 27/12/23	$ 13,013,224	3345
3347	**1.5.6.1.64.3**	**CIV 11008523 - PKID 526342 - CALLE 134 ENTRE CARRERA 57 Y CARRERA 58 (CALZADA NORTE)**	**2.3 días**	**mié 27/12/23**	**vie 29/12/23**	**$ 29,230,984**	
3348	1.5.6.1.64.3.1	3.022 - REPLANTEO GENERAL	0.2 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23	$ 288,113	3346
3349	1.5.6.1.64.3.2	3.017 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0.4 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23	$ 2,755,899	3348
3350	1.5.6.1.64.3.3	3.001 - TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	0.4 días	mié 27/12/23	jue 28/12/23	$ 1,133,684	3349
3351	1.5.6.1.64.3.4	3.009 - RIEGO DE LIGA CRR1	0.5 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	$ 789,338	3350
3352	1.5.6.1.64.3.5	3.026 - MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MD19	0.8 días	jue 28/12/23	vie 29/12/23	$ 24,263,950	3351
3353	**1.5.6.1.64.4**	**PENDIENTE POR EJECUTAR CALLE 134 ENTRE AV. VILLAS Y AV. BOYACA**	**15 días**	**jue 25/04/24**	**mar 14/05/24**	**$ 253,195,190**	**3351FC+100 días**
3354	*1.5.6.2*	*FIN DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 21 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*mar 14/05/24*	*mar 14/05/24*	*$ 0*	*3353*
3355	**1.5.6.3**	**Elaborar Diagnósticos - AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S LENTA**	**45 días**	**mar 26/03/24**	**mar 21/05/24**	**$ 300,000,000**	**3165FC+7 días**
3356	*1.5.6.4*	*APROBACIÓN DIAGNOSTICOS DE AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE - CALZADA N-S LENTA*	*7 días*	*mar 21/05/24*	*mar 28/05/24*	*$ 0*	3355
3357	*1.5.6.5*	*APROBACIÓN DE PMT FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)*	*0 días*	*mié 29/05/24*	*mié 29/05/24*	*$ 0*	3356FC+1 día
3358	*1.5.6.6*	*INICIO DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)*	*0 días*	*mié 29/05/24*	*mié 29/05/24*	*$ 0*	*3357*
3359	**1.5.6.7**	**FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)**	**143 días**	**mié 29/05/24**	**vie 15/11/24**	**$ 10,858,009,925**	**3358**
3360	*1.5.6.8*	*FIN DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 22 - FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALL 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)*	*0 días*	*vie 15/11/24*	*vie 15/11/24*	*$ 0*	*3359*
3361	*1.5.6.9*	*APROBACIÓN DE PMT FRENTE DE OBRA No. 21 - CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)*	*0 días*	*vie 15/11/24*	*vie 15/11/24*	*$ 0*	3360
3362	*1.5.6.10*	*INICIO DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 22 - FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALL 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)*	*0 días*	*vie 15/11/24*	*vie 15/11/24*	*$ 0*	*3361*
3363	**1.5.6.11**	**FRENTE DE OBRA No. 23 - AV. VILLAS ENTRE CALLE 127 Y CALLE 147**	**45 días**	**lun 18/03/24**	**mar 14/05/24**	**$ 7,437,257,384**	**3165FC+1 día**
3364	*1.5.6.12*	*FIN DE INTERVENCIÓN FRENTE DE OBRA No. 22 - FRENTE DE OBRA No. 22 - AV. BOYACÁ ENTRE CALL 13 Y CANAL SALITRE (CALZADA LENTA - NS)*	*0 días*	*mar 14/05/24*	*mar 14/05/24*	*$ 0*	*3363*
3365	**1.5.6.13**	**Implementación de Actividades de Señalización y Demarcación Vial en los segmentos viales atendidos (No se conocerá el costo hasta tener aprobación final de los diseños de parte de la SDM)**	**92.5 días**	**lun 11/03/24**	**mar 2/07/24**	**$ 1,107,631,564**	
3366	*1.5.6.13.1*	*INICIO DE ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL*	*0 días*	*lun 11/03/24*	*lun 11/03/24*	*$ 0*	*3352FC+62 días*
3367	**1.5.6.13.2**	**CALLE 170 ENTRE CARRERA 54 Y AUTOPISTA NORTE**	**5.5 días**	**lun 11/03/24**	**sáb 16/03/24**	**$ 107,929,055**	
3368	1.5.6.13.2.1	3.007 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 10,665,543	3366
3369	1.5.6.13.2.2	3.008 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	lun 11/03/24	mar 12/03/24	$ 7,323,060	3368CC
3370	1.5.6.13.2.3	8.012 - TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	0.5 días	mar 12/03/24	mar 12/03/24	$ 5,090,568	3369
3371	1.5.6.13.2.4	AD-0021 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	0.5 días	mar 12/03/24	mié 13/03/24	$ 36,924,655	3370
3372	1.5.6.13.2.5	AD-022 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	mié 13/03/24	mié 13/03/24	$ 41,390,373	3371
3373	1.5.6.13.2.6	AD-023 HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	0.5 días	mié 13/03/24	jue 14/03/24	$ 1,434,044	3372
3374	1.5.6.13.2.7	AD-024 SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	1 día	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 387,448	3373
3375	1.5.6.13.2.8	AD-062 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	0.5 días	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$ 4,478,290	3374
3376	1.5.6.13.2.9	8.013 - ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0.5 días	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 235,074	3375
3377	**1.5.6.13.3**	**FRENTE DE OBA No. 19 - CONSERVACIÓN PROGRAMADA (ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCIÓN) DEL CORREDOR DE LA AV. FERROCARRIL DEL SUR ENTRE CALLE 45 SUR Y AVENIDA BOYACÁ**	**23 días**	**lun 18/03/24**	**mar 16/04/24**	**$ 95,211,217**	
3378	1.5.6.13.3.1	3.007 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	lun 18/03/24	jue 21/03/24	$ 10,445,170	3376FC+1 día
3379	1.5.6.13.3.2	3.008 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	jue 21/03/24	mar 26/03/24	$ 6,986,191	3378
3380	1.5.6.13.3.3	8.012 - TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	3 días	mar 26/03/24	lun 1/04/24	$ 3,663,912	3379
3381	1.5.6.13.3.4	AD-0021 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	lun 1/04/24	jue 4/04/24	$ 29,842,963	3380
3382	1.5.6.13.3.5	AD-022 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	5 días	jue 4/04/24	mar 9/04/24	$ 35,962,090	3381
3383	1.5.6.13.3.6	AD-023 HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	2 días	mar 9/04/24	jue 11/04/24	$ 981,188	3382
3384	1.5.6.13.3.7	AD-024 SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	2 días	jue 11/04/24	sáb 13/04/24	$ 7,216,219	3383
3385	1.5.6.13.3.8	8.013 - ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	2 días	sáb 13/04/24	mar 16/04/24	$ 113,484	3384
3386	**1.5.6.13.4**	**FRENTE DE OBRA No. 17 Y 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE**	**15 días**	**jue 9/05/24**	**mar 28/05/24**	**$ 445,448,595**	
3387	1.5.6.13.4.1	3.007 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24	$ 35,494,992	3385FC+20 días
3388	1.5.6.13.4.2	3.008 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 14/05/24	mié 15/05/24	$ 34,284,621	3387
3389	1.5.6.13.4.3	8.012 - TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	1 día	mié 15/05/24	jue 16/05/24	$ 11,688,852	3388
3390	1.5.6.13.4.4	AD-0021 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$ 122,885,472	3389
3391	1.5.6.13.4.5	AD-022 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	4 días	lun 20/05/24	vie 24/05/24	$ 193,778,751	3390
3392	1.5.6.13.4.6	AD-024 SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	1 día	vie 24/05/24	sáb 25/05/24	$ 11,575,009	3391
3393	1.5.6.13.4.7	AD-062 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	1 día	sáb 25/05/24	lun 27/05/24	$ 32,597,473	3392
3394	1.5.6.13.4.8	8.013 - ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	lun 27/05/24	mar 28/05/24	$ 3,143,425	3393
3395	**1.5.6.13.5**	**FRENTE DE OBRA No. 20 Y 21- CALLE 134 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE**	**15 días**	**mar 28/05/24**	**lun 17/06/24**	**$ 391,019,134**	
3396	1.5.6.13.5.1	3.007 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	mar 28/05/24	vie 31/05/24	$ 39,101,253	3394
3397	1.5.6.13.5.2	3.008 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	vie 31/05/24	mié 5/06/24	$ 30,230,829	3396
3398	1.5.6.13.5.3	8.012 - TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	1 día	mié 5/06/24	jue 6/06/24	$ 14,833,980	3397
3399	1.5.6.13.5.4	AD-0021 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	jue 6/06/24	mar 11/06/24	$ 135,370,544	3398
3400	1.5.6.13.5.5	AD-022 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	4 días	mar 11/06/24	vie 14/06/24	$ 170,866,472	3399
3401	1.5.6.13.5.6	8.013 - ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	vie 14/06/24	lun 17/06/24	$ 616,056	3400
3402	**1.5.6.13.6**	**RESTAURACIÓN DEMARCACIÓN HORIZONTAL AFECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA - CTO IDU 1712-553-OF-2023**	**13 días**	**lun 17/06/24**	**mar 2/07/24**	**$ 68,023,563**	
3403	1.5.6.13.6.1	3.007 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	lun 17/06/24	mar 18/06/24	$ 2,506,424	3401
3404	1.5.6.13.6.2	3.008 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	2 días	mar 18/06/24	jue 20/06/24	$ 6,755,280	3403
3405	1.5.6.13.6.3	8.012 - TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	1 día	jue 20/06/24	vie 21/06/24	$ 1,791,426	3404
3406	1.5.6.13.6.4	AD-0021 PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24	$ 8,677,367	3405
3407	1.5.6.13.6.5	AD-022 PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	3 días	mar 25/06/24	vie 28/06/24	$ 38,181,252	3406
3408	1.5.6.13.6.6	AD-023 HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	vie 28/06/24	sáb 29/06/24	$ 3,169,992	3407
3409	1.5.6.13.6.7	AD-024 SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	1 día	sáb 29/06/24	mar 2/07/24	$ 6,941,822	3408
3410	*1.5.6.13.7*	*FIN DE ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL*	*0 días*	*mar 2/07/24*	*mar 2/07/24*	*$ 0*	*3409*

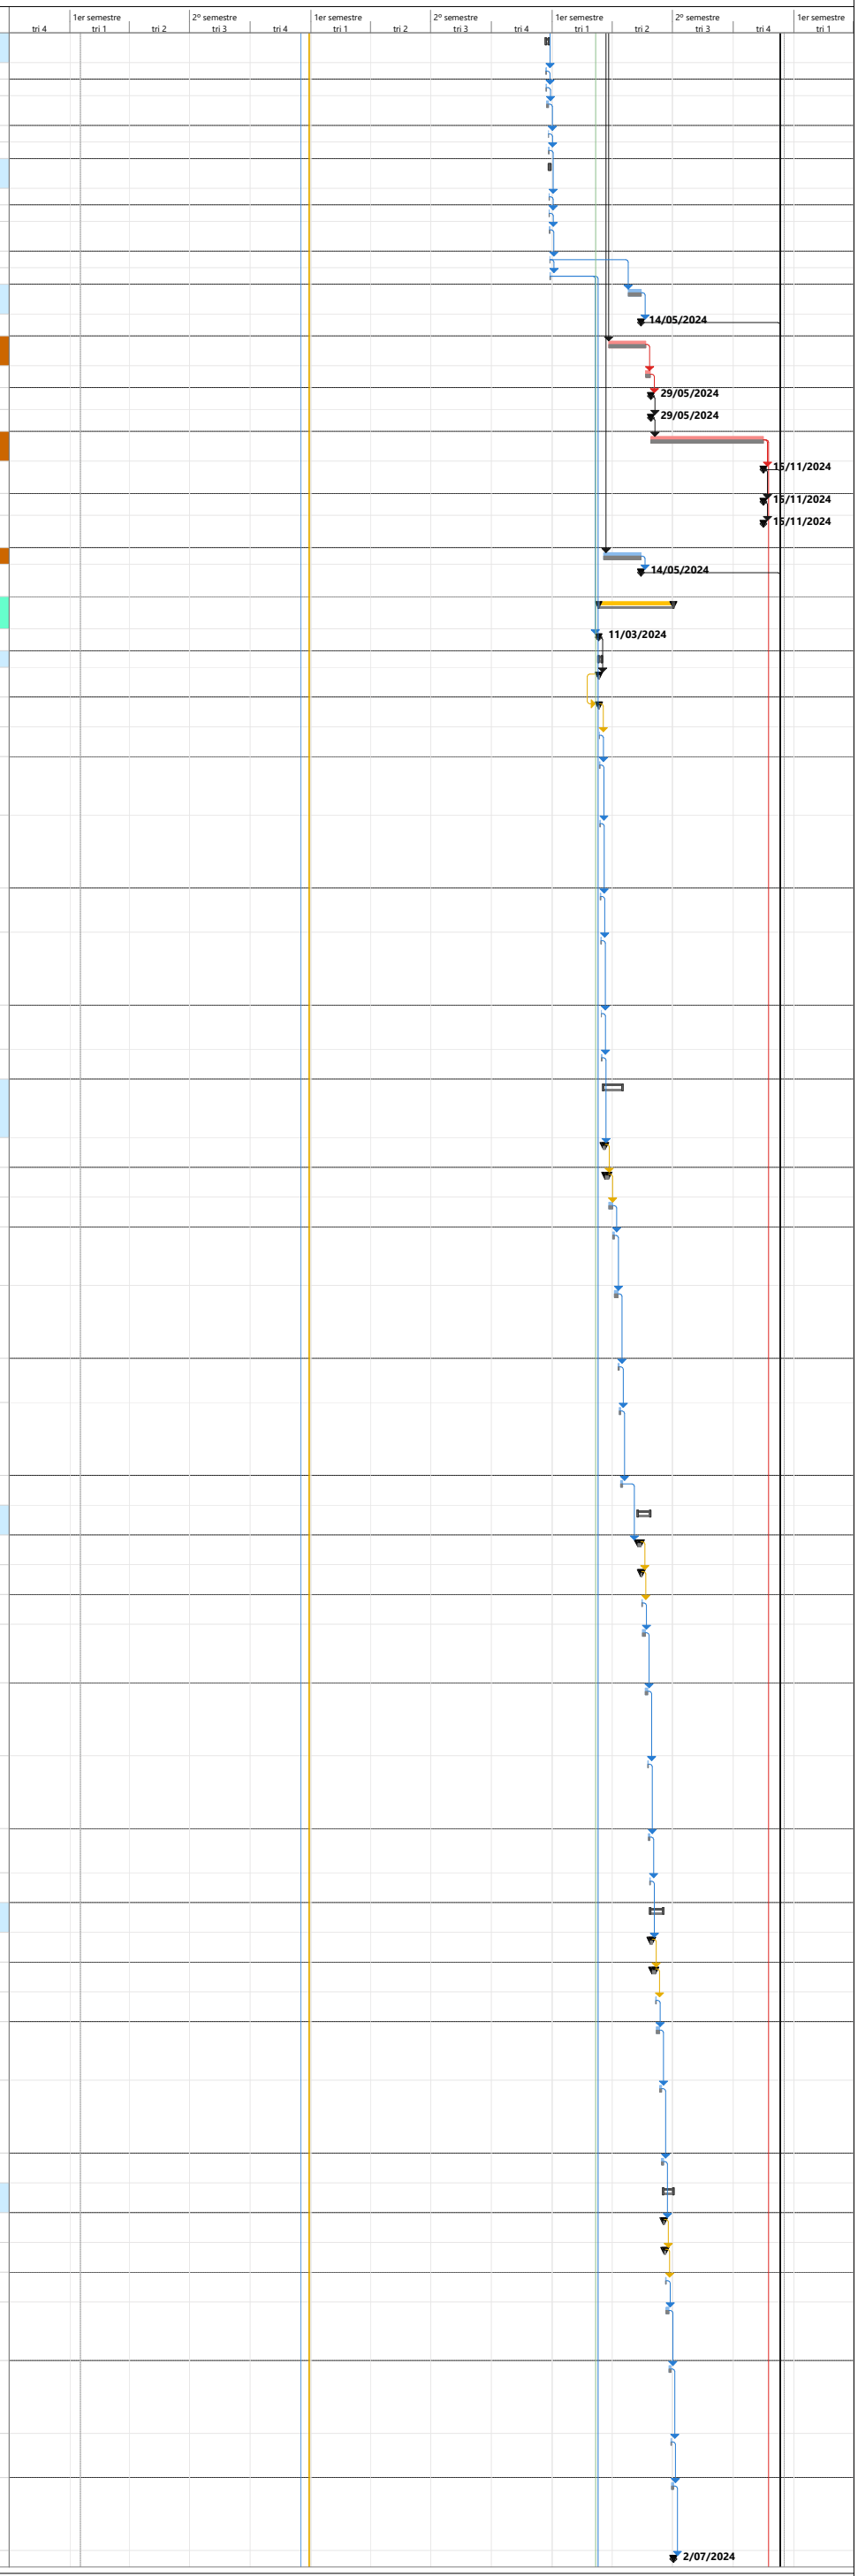

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
3411	1.5.7	*Inicio actividades para la Suscripción del Acta de Recibo Final para la anualidad 2021-2022 (CIVs CALZADAS Sur Norte Lenta y Rápida)(Ver parágrafo 4 del contrato pg 9 de 88 - 45 días hábiles tras culminar el plazo de la anualidad)*	0 días	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 0	186;187;188;189;190;773CC días
3412	1.5.8	*Recorrido de Terminación de la Anualidad*	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23	$ 0	3411
3413	1.5.9	*Suscripción del Acta de Terminación de la Anualidad*	1 día	mar 3/01/23	mar 3/01/23	$ 0	3412
3414	1.5.10	*Atención de Observaciones generadas en el Acta de Terminación de la Anualidad*	40 días	mar 3/01/23	sáb 18/02/23	$ 0	3413
3415	1.5.11	*Actualización de la Base de Datos del inventario de malla Vial en cuanto a PLANOS RECORD para la Vigencia 2021 - 2022 (Av. Boyacá desde Calle 13 a Canal Salitre Calzada S-N Rápida y Lenta) de acuerdo al Anexo Técnico del contrato Numeral 3.17.6*	40 días	mar 3/01/23	sáb 18/02/23	$ 0	3413
3416	1.5.12	*Recorrido de Verificación de atención de observaciones consignados en la Terminación de la Anualidad*	14 días	sáb 18/02/23	lun 6/03/23	$ 0	3414;3415
3417	1.5.13	*Suscripción del Acta de Recibo Final por Anualidad 2021-2022*	0 días	lun 6/03/23	lun 6/03/23	$ 0	3416
3418	1.5.14	*Inicio actividades para la Suscripción del Acta de Recibo Final para la anualidad 2023 (CIVs calzada Norte Sur Rápida y conectantes) (Ver parágrafo 4 del contrato pg 9 de 88 - 45 días hábiles tras culminar el plazo de la anualidad)*	0 días	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$ 0	3352FC+67 días
3419	1.5.15	*Recorrido de Terminación de la Anualidad*	1 día	vie 15/03/24	lun 18/03/24	$ 0	3418
3420	1.5.16	*Suscripción del Acta de Terminación de la Anualidad*	1 día	lun 18/03/24	lun 18/03/24	$ 0	3419
3421	1.5.17	*Atención de Observaciones generadas en el Acta de Terminación de la Anualidad*	16 días	lun 18/03/24	mar 9/04/24	$ 0	3420
3422	1.5.18	*Actualización de la Base de Datos del inventario de malla Vial en cuanto a PLANOS RECORD para la Vigencia 2022 (Av. Boyacá desde Calle 13 a Canal Salitre Calzada N-S Rápida y Lenta) de acuerdo al Anexo Técnico del contrato Numeral 3.17.6*	16 días	lun 18/03/24	mar 9/04/24	$ 0	3420
3423	1.5.19	*Recorrido de Verificación de atención de observaciones consignados en la Terminación de la Anualidad*	6 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24	$ 0	3421;3422
3424	1.5.20	*Suscripción del Acta de Recibo Final por Anualidad 2023*	0 días	mar 16/04/24	mar 16/04/24	$ 0	3423
3425	1.5.21	Ajustes Estimados para Obras Civiles, Redes, Manejo Ambiental-SST-DC y CE-Manejo de Trafico (Vigencias 2022 y 2023)	394 días	mar 3/01/23	mar 16/04/24	$ 4,544,321,375	190FC+3.7 mss
3426	1.5.22	Costos Estimados para Manejo Ambiental-SST-DC y CE-Manejo de Trafico (Vigencias 2022 y 2023)	394 días	mar 3/01/23	mar 16/04/24	$ 409,587,391	190FC+3.7 mss
3427	1.5.23	*Inicio actividades para la Suscripción del Acta de Recibo Final de obra (Ver parágrafo 6 del contrato pg 10 de 88 - 45 días hábiles tras la culminación del plazo de ejecución del Contrato)*	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24	$ 0	3359FC+11 días
3428	1.5.24	*Recorrido de Terminación de obra*	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 0	3427
3429	1.5.25	*Suscripción del Acta de Terminación de obra*	1 día	vie 29/11/24	sáb 30/11/24	$ 0	3428
3430	1.5.26	*Atención de Observaciones generadas en el Acta de Terminación de obra*	11 días	sáb 30/11/24	vie 13/12/24	$ 0	3429
3431	1.5.27	*Actualización de la Base de Datos del inventario de malla Vial en cuanto a PLANOS RECORD de acuerdo al Anexo Técnico del contrato Numeral 3.17.6*	11 días	sáb 30/11/24	vie 13/12/24	$ 0	3429
3432	1.5.28	*Recorrido de Verificación de atención de observaciones consignados en la Terminación de obra*	2 días	vie 13/12/24	lun 16/12/24	$ 0	3430;3431
3433	1.5.29	*Suscripción del Acta de Recibo Final de Obra*	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	$ 0	3432;2786
3434	1.6	*Fin actividades de obra*	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	$ 0	3426;3425;1768;1885;2102;
3435	2	*FIN CONTRATO*	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	$ 0	3434;54;184;257;270;287;28

