SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 MARZO al 21 ABRIL 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	**ABRIL / 2024**	Numero de contrato:	**CD-12-2024-0671**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	REYNALDO OLIVA BABILONIA C.C. 8.731.664		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 22 de marzo al 21 de abril de 2024.	Informe número:	2
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 57.000.000,oo)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante este periodo comprendido desde el 22 de marzo al 21 de abril del 2024 se realizó asesoría a la supervisión administrativa, técnica, a los proyectos que se relaciona en el siguiente informe.

1-Realizar y gestionar oficios para empresas de servicio público, solicitando los diseños, planos y memorias de las vías de los programas: barrios a la obra 8 etapa, ampliaciones viales carreras: 49C, 50, calle 79 y 98. Canalización del arroyo en carrera 18 entre 39 a la calle 47(la cordialidad).

2-Visita de campos a la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), para verificación topográfica con la Triple A SA ESP, contratista Unión Temporal Gran Vía R90 e interventoría EDUBAR SA, para revisar los diseños de la tubería de alcantarillado existente con el canal pluvial no se enfrente entresi en la calle 40 y 45D donde las tuberías cruzan el canal en diámetros de 24 y 20 pulgadas respectivamente. Ver foto No.01



Foto No. 01. Cr 18 calle 45D, verificación topografía.

3- Socialización del proyecto de canalización de la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), con la ADI, EDUBAR, CONTRATISTA, SDOP, Triple A, VER FOTO No.02 Y FOTO No.03

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 MARZO al 21 ABRIL 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.



FOTO No.02: Socialización del proyecto de canalización de la carrera 18 call39 a la 47.



FOTO No.03: Volante de invitación a la reunión de socialización del proyecto de canalización.

4- visita de campo para revisar en los tres pares viales de la carrera 49C – 50 entre calle 76 a la 88 y la calle 79 entre carreras 43 a la 53, Con la empresa Triple A SA ESP, representada con la interventoría de esta empresa para revisar las redes existentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado y el área comercial para reubicación de medidores de agua de las acometidas de los usuarios. Ver foto No.04





FOTO No. 04 recorrido para inspección de redes de los pares viales Carrera 49C-50 Y calle 79.

5-Analizar, evaluar, conceptualizar y cantidades de material de la información enviada la Triple A S.A. E.S.P., en ambos sistemas de acueducto y alcantarillado de los programas barrios a la obra 8 etapa, pares viales (ampliaciones). Ver FOTO No. 05.

| | | |

6-Asesoria y coordinación técnica para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con: el Contratista **Unión Temporal Gran Vía R90**, La Triple A SA ESP, la interventoría **EDUBAR SA** y la SDOB. Se coordinó las conexiones de las tuberías existentes con las nuevas. Ver foto No.06





FOTO No. 06: registro fotográfico de las conexiones de la carrea 22 calle 47 (cordialidad) tubería 315 mm.

7-Asesoría y coordinación técnica para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con la calle 110 (circunvalar) con carreras 34 a 38. La situación que se presentaba en punto fuga de agua en la vía circunvalar de norte a sur carril exterior justo donde termina el puente, fuga permanente en tubería de agua potable de las redes existentes del barrio la pradera quedo en servicio al ampliar la vía circunvalar y construcción del puente sobre la carrera 38 Conexión realizada el día 19 de abril 2024.Ver foto no 07.



FOTO No 07: Empalme carrea 38 con calle 110 (circunvalar) conexiones a tuberías existentes del barrio la pradera y las redes en la vía circunvalar existentes.

8. Visita Técnica y recorrido al proyecto del intercambiador vial de la carrera 43 calle 110 (circunvalar). En donde la empresa de prestación de servicio público La Triple A SA ESP, instalará tubería de conducción en polietileno de 315 mm (12”), en la zona de anden lado impar de la carrera 43.



FOTO No 08: visita y recorrido al proyecto de instalación de tubería de conducción de 325 mm (12 pulgadas) por la empresa Triple A S.A ESP en la carrera 43 entre calle 110.

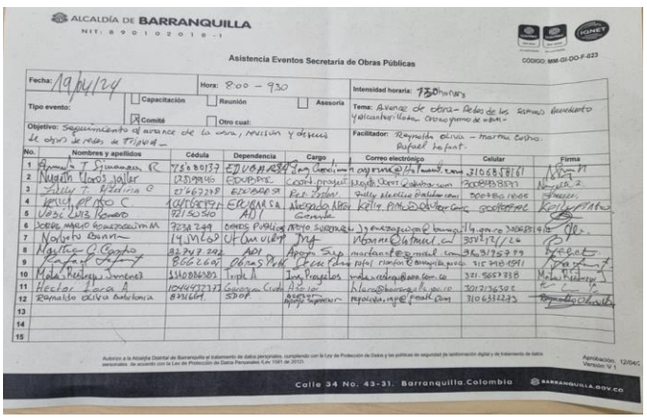
9. Elaboración de listado y proveedores locales de materiales de polietileno en electrofusión para el sistema de acueducto para el programa barrios a la obra 8 etapa. Ver foto 09.

Suministro para instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad PN10.	
	diametro (mm)
tuberia pead PN 10	20 -90-110-160-
iniones electrofusión PN19	20 -90-110-160-
Tee electrofusión PN10	90-110-160-
uniones reducciones electrofusión PN10	90-110-160-
Tope brida - portabridas - portaflanches electrofusión PN10	90-110-160-
brida loca metalicas para tope bridas -brida loca metalica - portaflanche	90-110-160-

FOTO No. 09: listado de elementos sistema de acueducto en polietileno de alta densidad para electrofusión.

10. Asesoría y coordinación a los comités de obra de la calle 47 (cordialidad) y arroyo de la carrera 18, asesor de apoyo al secretario Distrital de Obras Pública

.


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

Asistencia Eventos Secretaria de Obras Públicas

CODIGO: smt-GI-OO-F-023

Fecha: 19/04/24 Hora: 8:00 – 9:30 Intensidad horaria: 7:30 horas

Tipo evento: Capacitación Reunión Asesoría Comité Otro cual:

Tema: Avance de obra - Retiro de los sitios levantado y alcantarillado. Otros puntos de obras.

Objetivo: Seguimiento al avance de la obra, Novedades de obra de retiro de Tierra

Facilitador: Reynaldo Oliva – Marina Cortes. Rafael Infante.

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Celular	Firma
1	Reynaldo J Oliva B	7588017	EDUBARRIOS	Ing Residente	reynaldoliva@hotmail.com	3106883881	
2	Nelson Ubaldo Vallar	12509946	EDUBARRIOS	Cont. proyect	Ubaldo Ubaldo@yahoo.com	3008893897	
3	Jaime J. Herrera C	72462398	EDUBARRIOS	Res. Soc.	Jaime Herrera@yahoo.com	3008861605	
4	Kelly Alfaro C	1047558797	ERMASA	Abogado	Kelly.alfaro@ermasa.com	3008861605	
5	Jose Luis Romero	9715010	ADI	Gerente			
6	Jorge Mario Hernandez M	7038749	OBRAS PUBLICAS	Apoyo Supervisor		3106831875	
7	Nelson Baena	14.976.63	Ut Cordialidad	Ing	Nbaena@hotmail.com	3017172/26	
8	Martha C. Gaona	52.747.202	ADI	Apoyo Sup	marthaa@gmail.com	3163175879	
9	Oscar Cuadrado	8666668	Obras Publicas	Electricista		315 749 4941	
10	Maria Fidelina Jimenez	1140886680	Topografia	Ing Residente		321 5607818	
11	Hector Loza A	1064972177	Guarda Civil	Alcalde		3012136502	
12	Reynaldo Oliva Babilonia	8731664	SDOP	Apoyo Supervisor		3106332225	
13							
14							
15							

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales 1581 de 2012).

Aprobación: 12/04/2 Versión: V. 1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

FOTO No. 10: Formato de asistencia a comité de obra de la vía cordialidad y carrera18 canal pluvial.

11. Asesoría técnica para la elaboración de presupuestos para los sistemas de acueducto y saneamiento al jefe de oficina Arquitecto Armando en el programa barrios a la obra 8 etapa.

Suministro para instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad PN10 con diametro de 90 mm (3")		
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
Tuberia de polietileno de ALto densidad (PEAD) PN10, 90 mm (4")	und	100
Tee de polietileno electrosoldada de lata densidad PN10 90 mm	und	2
Maxiadaptor 110 mm (4") rango 88 - 110	und	2
union tope brida de polietileno electrosolda 90 mm PN10	und	4

12. Asesoría técnica para la elaboración de presupuestos para los sistemas de acueducto y saneamiento al jefe de oficina Arquitecto Armando Movilla.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 MARZO al 21 ABRIL 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

			SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚB											
			PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA					TUBERIA					8	10%
			CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX EN LAS RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTR					POLIETILENO (PEAD) METRO					TORNILLO TUERCA Y AR UNIDAD PN 10	
	OBRA No		DIRECCION	LONGITUD EN METROS	20 mm (1/2")	90 mm (3")	110 mm (4")	160 mm (6")	25 mm (1")	250 mm(10")	90 mm (3")	110 mm (4")		
			MODULO 1								5/8 x 2 1/2" 8	5/8 x 2 1/2" 8		
	1	2	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 Y 27	250	267	288	288	288	267					
	2	3	CARRERA 26 ENTRE CALLES 9 Y 17	500	624	575	575	575	624	134	0	0		
	3	4	CALLE 22 ENTRE CARRERAS 26 Y 29	220	228	253	253	253	228		0			
	4	5	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	160	158	184	184	184	158		0			
	5	1	CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	410	0	472	472	472	0		0			
	6	7	CALLE 7 ENTRE CARRERAS 21 Y 23	230	262	265			262		40			
	7	8	CALLE 10 ENTRE CARRERAS 22 Y 26	288	371	331	331	331	371		0			

	A	B	C	D	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1						15%								
2			SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚB		SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO									
3			PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA		TUBERIA									
4			CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX EN LAS RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTR		PVC METRO				TEE UNIDAD			SELLO (EMPAQUE) UNIDAD		
5	OBRA No		DIRECCION	LONGITUD EN METROS	D160	200(8")	D200	D16	8x6	D8		(160(6")	D6	200
6			MODULO 1											
7	1	2	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 Y 27	250	270	288			58	54		58	54	
8	2	3	CARRERA 26 ENTRE CALLES 9 Y 17	500	630	575	630	134	126	126		126	126	
9	3	4	CALLE 22 ENTRE CARRERAS 26 Y 29	220	230	253	200,6		51	46		51	46	
10	4	5	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	160	160	184	213		37	32		37	32	
11	5	1	CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	410	-	472			94	0		94	0	
12	6	7	CALLE 7 ENTRE CARRERAS 21 Y 23	230	265	265	234,5		53	53		53	53	
13	7	8	CALLE 10 ENTRE CARRERAS 22 Y 26	288	375	331	307,25		75	75		75	75	

Atentamente,



REYNALDO OLIVA BABILONIA
C.C. 8.731.664 de Barranquilla
