INFORME FINAL DE ENTREGA DE OBRA

CONTRATO N.: 145 DE 2019 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATANTE: NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA.

CONTRATISTA: JAMBARK INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS INTERNAS, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CAJAS DE INSPECCION EN LAS SEDES JUDICIALES DE TUNJA, DUITAMA, Y SANTA ROSA DE VITERBO.

FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ROA

SEDES A INTERVENIR: TUNJA


El día 13 de diciembre del presente año se inició a desarrollar el objeto del contrato en la ciudad de Tunja en la sede del Consejo Seccional de la Judicatura, se realizó el sondeo de un baño que está tapado, la segunda sede que se intervino fue la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Tunja se realizó el sondeo de las cajas del cual se lavaron, se retiró residuos; la tercera sede que se intervino fue los Juzgados se sondeó y lavo las cajas con agua a presión, al igual que la tubería colgada en los sótanos, según registro fotográfico; se inspecciono en los tapones del sótano y se nivelo los tubos que estaban descolgados en los cuales se estaban acumulando los desechos según registro fotográfico:







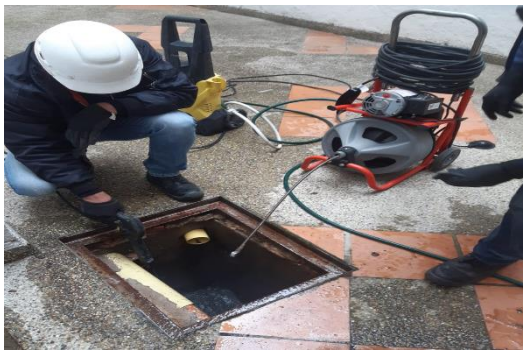

CRA 1B ESTE 48 P 08 SUR, Celular: 311 2707982
E-mail jambarkingenieria@gmail.com

JAMBARK
ingenieria s.a.s















CRA 1B ESTE 48 P 08 SUR, Celular: 311 2707982
E-mail jambarkingenieria@gmail.com


JAMBARK
ingenieria s.a.s

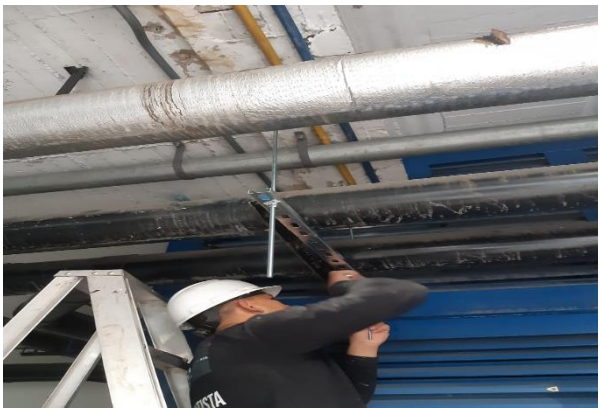



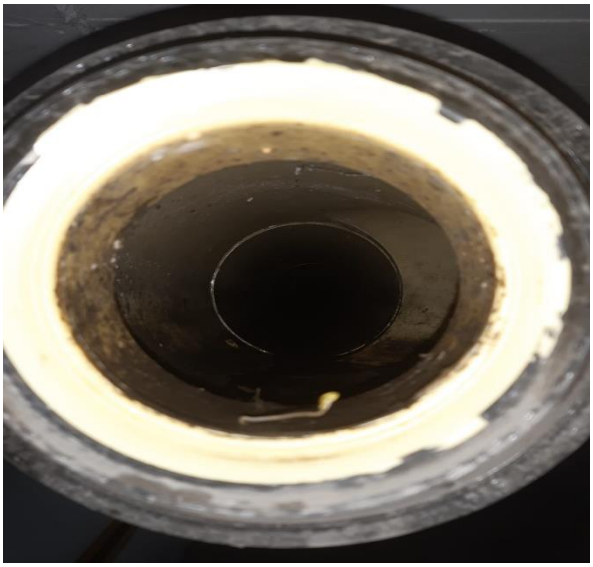



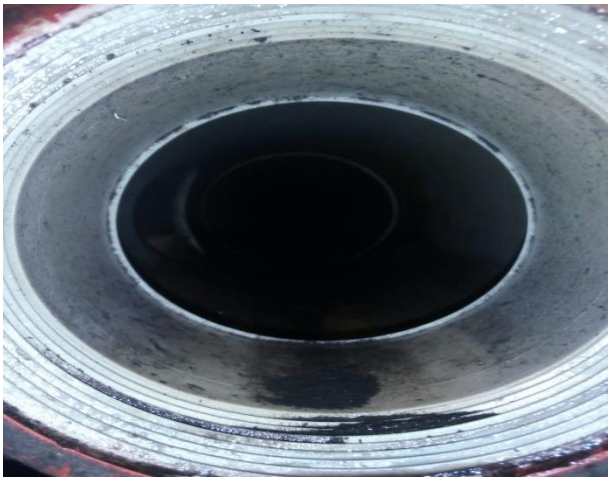



CRA 1B ESTE 48 P 08 SUR, Celular: 311 2707982
E-mail jambarkingenieria@gmail.com

SEDES A INTERVENIR: DUITAMA

La cuarta sede que se intervino fue el Palacio de Justicia en la ciudad de Duitama se sondeó y lavo las cajas; en el sótano hay un pozo eyector donde se recogen los residuos de los baños y en cual no hay bomba, por tanto no se realizó limpieza, solo se hizo el sondeo de la tubería; y se realiza una recomendación, la cual es el cambio de la bomba sumergible actual por una Bomba sumergible de 2" con un Motor Trifásico de 1,5 HP con un voltaje de 220V .









CRA 1B ESTE 48 P 08 SUR, Celular: 311 2707982
E-mail jambarkingenieria@gmail.com






SEDES A INTERVENIR: SANTA ROSA DE VITERBO

La quinta sede que se intervino fue en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo el Palacio de Justicia, y por último se realizó el mantenimiento a las cajas del Tribunal Supremo de Justicia.







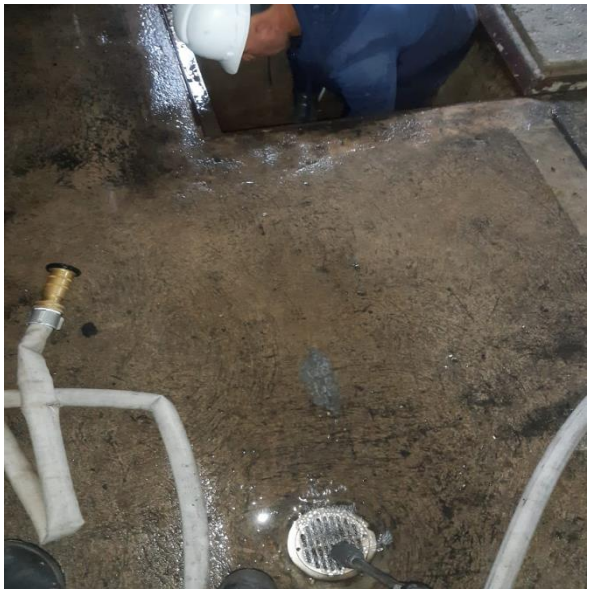





CRA 1B ESTE 48 P 08 SUR, Celular: 311 2707982
E-mail jambarkingenieria@gmail.com





Se hace entrega el día diez y seis (16) días del mes de Diciembre de 2019.

Jose Alfredo Martinez.

JOSE ALFREDO MARTINEZ BARRETO
C.C. 4.192.666 DE PAIPA
REPRESENTANTE LEGAL
JAMBARK INGENIERIA SAS
