	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	23/10/2023

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)
VALOR DEL CONTRATO	$ 449.999.919
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	PAC	CORTE DE ENTREGA	FRENTE DE OBRA	VALOR PAC	
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	El 15 de diciembre del 2023	FRENTE DE TRABAJO No.1 – CUBIERTAS, TECHOS Y CIELO RASO DE ODONTOLOGÍA FRENTE DE TRABAJO No.2 – FACHADAS Y INTERIORES FRENTE DE TRABAJO No.3 – MANTENIMIENTO DE VENTANAS, PUERTAS, BAÑOS, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, CHAPAS DAÑADAS	Los 3 frentes se trabajan al tiempo con diferente personal para el cumplimiento del tiempo de ejecución del contrato el 15 de diciembre del 2023	$ 449.999.919

CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR O SUPERVISOR	TE CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2023
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 DE DICIEMBRE DE 2023
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	Modificatorio No. 01 al Contrato de Obra No. 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023, en cuanto a adicionar Ítems No Previstos que se presentaron durante la ejecución del contrato
VALOR DEL CONTRATO	$ 449.999.919,00
3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENCION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

En Madrid - Cundinamarca, el día 17 del mes de Abril del 2024, a las 10:00 HRS, se reunieron: la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA, el señor Teniente CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES, por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882, en sus calidades de Ordenadora del Gasto - CAMAN y Supervisor Principal, respectivamente; la señora MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del CONSORCIO VENTURA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la supervisión, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 15 de Diciembre de 2023, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**		-		$ -		
1.1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, SANITARIOS INCLUYE RETIRO (INCLUYE CAMBIO DE LAVAMANOS)	Un	16,00	$ 18.012,78	$ 288.204,53	18,00	$ 324.230,10
1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M²	1,00	$ 44.646,96	$ 44.646,96	0,30	$ 13.260,15
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	80,00	$ 11.693,55	$ 935.484,32	63,77	$ 745.697,94
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE FLANCHES, CABALLETES Y SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO	M²	1.200,00	$ 13.694,76	$ 16.433.708,70	878,62	$ 12.032.487,61
1.5	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	65,00	$ 5.168,15	$ 335.929,51	46,31	$ 239.336,86
1.6	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE	M²	67,01	$ 6.040,74	$ 404.790,07	6,00	$ 36.244,45
1.7	DESMONTE DE CANAL METÁLICA EXISTENTE	Ml	140,00	$ 10.417,40	$ 1.458.435,46	138,81	$ 1.446.038,76
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -		
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M³	5,00	$ 21.830,51	$ 109.152,54	0,96	$ 20.957,29
3	**CIMENTACION**				$ -		
3.1	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M³	1,25	$ 411.881,43	$ 514.851,78	0,87	$ 358.336,84

4	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ -		
4.1	LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO	Ml	100,00	$ 37.949,57	$ 3.794.957,46	220,00	$ 8.348.906,40
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -		
5.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15,00	$ 150.065,81	$ 2.250.987,17	38,00	$ 5.702.500,83
6	**PAÑETES**				$ -		
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	67,01	$ 25.616,96	$ 1.716.592,78	6,00	$ 153.701,79
6.2	PAÑETE GOTERAS 1:3 IMPERMEABILIZADO	Ml	15,00	$ 13.145,60	$ 197.183,98		$ -
7	**CIELO RASO**				$ -		
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, COMPUERTAS PARA INSPECCION Y ANGULO PARA LUCES DE PANELES) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	80,00	$ 77.772,35	$ 6.221.787,65	63,77	$ 4.959.542,48
8	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				$ -		
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	Ml	20,00	$ 33.048,19	$ 660.963,80	12,80	$ 423.016,83
9	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**				$ -		
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	67,01	$ 22.829,16	$ 1.529.781,71	1488,21	$ 33.974.577,43
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	652,6	$ 21.827,58	$ 14.245.331,38	669,68	$ 14.617.491,56
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	400,00	$ 31.727,08	$ 12.690.833,34		$ -
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	65,00	$ 26.677,17	$ 1.734.016,19	667,10	$ 17.796.341,54
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Ml	20,00	$ 17.004,36	$ 340.087,29	58,55	$ 995.605,53
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	Ml	15,00	$ 19.890,87	$ 298.362,98		$ -
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS PARA MUROS DE ETERBOARD EN MASILLA TIPO SIKAFLEX PARA DILATACIÓN.	Ml	120,00	$ 12.759,62	$ 1.531.154,96	124,73	$ 1.591.507,99
10	**CARPINTERIA METALICA**				$ -		
10.1	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 4,00 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	Un	10,00	$ 217.940,60	$ 2.179.406,05	12,00	$ 2.615.287,25
10.2	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PARA MALLA PREONDULADA EXISTENTE PARA CERRAMIENTO Y PERFILES (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURAS, ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M²	609,00	$ 13.393,80	$ 8.156.821,19	760,65	$ 10.187.990,20
11	**CUBIERTAS**				$ -		
11.1	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	140,00	$ 55.405,38	$ 7.756.753,50	157,15	$ 8.706.955,80
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 16, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y SOPORTES	Ml	140,00	$ 105.730,56	$ 14.802.278,60	138,81	$ 14.676.459,23

11.3	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR), TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	1.200,00	$ 195.462,25	$ 234.554.695,14	878,62	$ 171.737.038,54
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA PARA CANALES INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Ml	120,00	$ 26.422,14	$ 3.170.656,32	138,81	$ 3.667.656,70
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				$ -		
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	5,00	$ 215.443,01	$ 1.077.215,05	5,00	$ 1.077.215,05
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	11,00	$ 445.732,84	$ 4.903.061,19	13,00	$ 5.794.526,86
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Un	5,00	$ 199.962,02	$ 999.810,11	5,00	$ 999.810,11
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ -		
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO	M²	10,05	$ 144.080,77	$ 1.448.487,60	18,28	$ 2.633.796,43
14	**CERRADURAS**				$ -		
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10,00	$ 100.865,33	$ 1.008.653,32	10,00	$ 1.008.653,32
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10,00	$ 59.934,47	$ 599.344,72	10,00	$ 599.344,72
15	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**				$ -		
15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	100,00	$ 4.156,80	$ 415.679,61	1100,00	$ 4.572.475,71
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		-	$ -	$ -		
NP.001	DESMONTE DE LAMINA SUPERBOARD DE 8MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA EN MURO	M2	-	$ 13.694,00	$ -	40,02	$ 548.033,88
NP.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SUPERBOARD DE 4MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA MURO	M2	-	$ 52.990,64	$ -	38,37	$ 2.033.250,86
NP.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ONDULADA PARA CERRAMIENTO	M2	-	$ 139.592,50	$ -	39,15	$ 5.465.046,38
NP.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN (Incluye marco de sobreponer)	UN	-	$ 184.824,50	$ -	4,00	$ 739.298,00
NP.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON MEZCLADOR MARCA CORONA	UN	-	$ 130.489,22	$ -	27,00	$ 3.523.208,94
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 348.810.106,97**		**$ 344.365.830,36**
ADMINISTRACIÓN		**23,25%**			**$ 81.098.349,87**		**$ 80.065.055,56**
IMPREVISTOS		**1%**			**$ 3.488.101,07**		**$ 3.443.658,30**
UTILIDADES		**4%**			**$ 13.952.404,28**		**$ 13.774.633,21**
IVA		**19%**			**$ 2.650.956,81**		**$ 2.617.180,31**
				SUBTOTAL 1	**$ 449.999.919,00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 444.266.357,75**

EQUIPOS							
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CONTRACTUAL**			**EJECUTADO**	
			CANTIDAD	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**		**$ -**
IVA		**19%**			N/A	N/A	N/A
				SUBTOTAL 3	**$ -**	**SUBTOTAL 4**	**$ -**
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)				**$449.999.919,00**		**$444.266.357,75**	

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	449.999.919,00
VALOR ADICIONADO	$	-
VALOR REDUCIDO	$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	449.999.919,00

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 0%	$	-
Acta de recibo TOTAL	$	449.999.919,00
VALOR TOTAL	**$**	**449.999.919,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	-
SALDO A FAVOR DE LA FAC	$	5.733.561

6. GARANTIAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Equidad Seguros	Cumplimiento del contrato	AB001272	03/10/2023	15/04/2024	N/A	$ 134.999.976,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		03/10/2023	15/12/2026		$ 22.499.996,00
	Estabilidad y calidad de la obra		15/12/2023	15/12/2028		$ 224.999.960,00
	Póliza de responsabilidad extracontractual	AB001273	03/10/2023	15/12/2023	ANEXO 2	$ 232.000.000,00

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$	444.266.357,75
Plazo de ejecución final del contrato:		15/12/2023

NOTA: En el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL del 15 de diciembre del 2023 se dejó la observación que la suma de $ 5.733.561,25 no fueron ejecutados, y mediante ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS de fecha 29 de diciembre del 2023 firmada por las dos partes, numeral tercero se especifica: "*Que el valor final del contrato es de $ 499.999.919 y se tramitó pago por valor de $ 444.266.357,75 Por tanto se debe liberar la suma de $ 5.733.561,25, por no ejecutarse tras cumplir con el objeto del contrato"* .

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Supervisoria en representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882, deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo total a satisfacción suscrita entre las partes; el Contratista CONSORCIO VENTURA, cumplió con todas las obligaciones derivadas del Contrato No. 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023 y de acuerdo al acta de liberación de los recursos se libera la suma de $5,733,561,25 por no ejecutarse, y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo con relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la Ley1150 de 2007 .

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El CONTRATISTA, deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo total a satisfacción suscrita entre las partes; LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882, cumplió con todas las obligaciones derivadas del Contrato No. 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023 y de acuerdo al acta de liberación de los recursos se libera la suma de $5,733,561,25 por no ejecutarse, y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo con relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN Representante Legal Contratista Firma y posfirma	TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor Firma y posfirma	TC. MARIBEL SILVA BARRERA Ordenadora del Gasto Firma y Posfirma

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-4:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27922624	**Fecha Registro:**	2024-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**		04500740100027922624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	444.266.357,75	**Valor Deducciones:**		25.096.521,00	**Valor Neto:**	419.169.836,75	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**444.266.357,75**	Valor Deducciones	25.096.521,00	Valor Neto	**419.169.836,75**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901550907	**Razón Social:**	CONSORCIO VENTURA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096481353	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CVE71	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO / C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA												
	Nación	10	CSF	444.266.357,75	0,00	444.266.357,75				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	275.493,00	275.493,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	392.577,00	392.577,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	137.746,00	137.746,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	22.082.459,00	22.082.459,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.208.246,00	2.208.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-098 - ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-28	444.266.357,75	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ
Fecha: 2024.02.22 15:03:19 -05'00'

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ -TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN

CONSORCIO VENTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 obrando como Representante Legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 8 días del mes de abril de 2024.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
CC. 52.452.955 de Bogotá

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 54824-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75494024	$15.304.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	325.000	0		0		0	7	2.000	0	327.000	2
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	81.300	0		0		0	7	500	0	81.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.122.300	0		0		0	7	6.800	0	1.129.100	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.000	0		0		0	7	2.000	0	327.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	490.000	0		0		0	7	3.000	0	493.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	504.000	0		0		0	7	3.100	0	507.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	7	1.000	0	163.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	65.000	0		0		0	7	400	0	65.400	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	292.500	0		0		0	7	1.800	0	294.300	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	173.400	0		0		0	7	1.100	0	174.500	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	11.000	0		0		0	7	100	0	11.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	726.100	0		0		0	7	4.400	0	730.500	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.355.200	0	0	0	0	7	8.200	0	1.363.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	2.009.200	0	0	0	0	7	12.100	0	2.021.300	18
231001	Colfondos	800227940-6	620.200	0	0	0	0	7	3.800	0	624.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.483.900	0	0	0	0	7	8.900	0	1.492.800	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.383.200				2.383.200	7	14.300	2.397.500			23.832	2.397.500	40

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	146.800	7	900	147.700	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.222.800	7	7.400	1.230.200	37

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75494024	$15.304.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
685.000	7	4.200	689.200	40
ICBF				
1.027.900	7	6.200	1.034.100	40
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	4.278.100	4.304.300
Pensión	4	5.468.500	5.501.500
Riesgos Laborales	1	2.383.200	2.397.500
CCF	2	1.369.600	1.377.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.027.900	1.034.100
MEN	0	0	0
SENA	1	685.000	689.200
TOTALES	21	15.212.300	15.304.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75494024	$15.304.500	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	11/03/2024	75494024	$15.304.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1047480209	ALVAREZ PEREZ JORLAN ALBERTO	1	0			N	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	ESSC24	476.667	59.600	14-23	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	476.667	9.600	14.400	0	0
3	CC	1098663350	LIZCANO CASTELLANOS NANNY ROCIO	1	0			N		X															230301	1.114.000	178.300	0	0	0	0	EPS002	1.114.000	139.300	14-23	1.114.000	5	77.600	CCF04	1.114.000	44.600	1.114.000	22.300	33.500	0	0
4	CC	73086046	MEDINA POLO LUIS FELIPE	1	5			N	X	X																0	0	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
5	CC	73145264	CARVAJAL KALIL ANIBAL ISAAC	1	0			N		X															230201	1.276.000	204.200	0	0	0	0	EPS002	1.276.000	159.500	14-23	1.276.000	5	88.900	CCF04	1.276.000	51.100	1.276.000	25.600	38.300	0	0
6	CC	80774880	GUEVARA SOTO JONATHAN	1	0			N		X															231001	1.276.000	204.200	0	0	0	0	EPS010	1.276.000	159.500	14-23	1.276.000	5	88.900	CCF04	1.276.000	51.100	1.276.000	25.600	38.300	0	0
7	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	1047728001	MACHACON MEZA CARMEN JULIA	1	0			N	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS048	1.040.000	130.000	14-23	1.040.000	5	72.400	CCF24	1.040.000	41.600	1.040.000	20.800	31.200	0	0
9	CC	1128052232	HERNANDEZ ORTEGA FREDY RAFAEL	1	0			N	X																230301	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS041	520.000	65.000	14-23	520.000	5	36.200	CCF24	520.000	20.800	520.000	10.400	15.600	0	0
10	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0			N	X																25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSC34	86.667	10.900	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
11	CC	73212605	RIOS JIMENEZ JOE ENRIQUE	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
12	CC	73317594	TORRES GAMARRA CLEIDER JOSE	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
13	CC	9043110	PEÑA PEREZ PEDRO ANTONIO	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
14	CC	9082324	DE LA ROSA PATERNINA DIOMEDES	1	0			N	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
15	CC	9094808	OROZCO MERCADO JAVIER	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
16	CC	92557333	HERNANDEZ MEDINA WILFRIDO DEL CRISTO	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
17	CC	49752359	RAMOS MOLINA TULIA INES	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	73109175	PAREDES PERTUZ JUAN CARLOS	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
19	CC	73113272	RIOS BELTRAN GERMAN	1	0			N	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
20	CC	73168636	JULIO BONILLA MIGUEL ANDRES	1	0			N	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
21	CC	73197553	POSADA PORTELA JULIO	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
22	CC	73207848	BARRIOS ARROYO RAUL ENRIQUE	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
23	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
24	CC	1143353549	JULIO DE LA ROSA SAMUEL	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
25	CC	17843307	PEREZ DE LA ROSA LEIDEN	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
26	CC	17904444	BELTRAN REYES CARLOS	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
27	CC	33333366	MARRIAGA ARIZA ARELIS DEL CARMEN	1	0			N	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
28	CC	424126	VARGAS MOLINA NORBERTO	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
29	CC	1047367008	CORTECERO CABRERA JORMAN	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
30	CC	1047376745	CARDOZO ROMERO JOSIMAR FERNANDO	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
31	CC	1047450089	RIOS MEZA VICTOR ALFONSO	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
32	CC	1047450558	DE LA ROSA GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
33	CC	1047477459	ORTEGA GAMARRA ALBERT GREGORIO	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
34	CC	1050278553	CASTRO NAVARRO EDGAR JOSE	1	0			N	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
35	CC	80471876	HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO	1	0			N		X															230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS001	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
36	CC	1000033791	GONZALEZ AMAYA HAENZZ LEONARDO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
37	CC	1001898456	EXTREMOR BARRIOS EDGAR MANUEL	1	0			N	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
38	CC	1002086826	SALGADO MORA DEWIS YAIR	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
39	CC	1014200124	RAMIREZ FIGUEROA JOSE ISAIAS	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
40	CC	1043650652	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALBERTO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS048	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74457580	$2.581.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	11.000	0		0		0	3	100	0	11.100	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	369.000	0		0		0	3	1.000	0	370.000	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.500	0		0		0	3	100	0	5.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	22.000	0		0		0	3	100	0	22.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	179.000	0		0		0	3	500	0	179.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	44.000	0		0		0	3	200	0	44.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	11.000	0		0		0	3	100	0	11.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	5.500	0		0		0	3	100	0	5.600	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	16.400	0		0		0	3	100	0	16.500	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.500	0		0		0	3	100	0	5.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	16.500	0		0		0	3	100	0	16.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	38.400	0		0		0	3	200	0	38.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	278.000	0	0	0	0	3	800	0	278.800	11
230301	Porvenir	800224808-8	354.800	0	0	0	0	3	1.000	0	355.800	20
231001	Colfondos	800227940-6	222.000	0	0	0	0	3	600	0	222.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	63.000	0	0	0	0	3	200	0	63.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	404.600				404.600	3	1.100	405.700			4.046	405.700	44

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	156.000	3	500	156.500	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	77.200	3	300	77.500	41

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74457580	$2.581.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
116.700	3	400	117.100	44
ICBF				
177.000	3	500	177.500	44
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	723.800	726.500
Pensión	4	917.800	920.400
Riesgos Laborales	1	404.600	405.700
CCF	2	233.200	234.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	177.000	177.500
MEN	0	0	0
SENA	1	116.700	117.100
TOTALES	21	2.573.100	2.581.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74457580	$2.581.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000033791	GONZALEZ HAENZZ LEONARDO	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
2	CC	1001833045	GOMEZ FLOREZ SAIR MANUEL	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
3	CC	1002191558	CUADRO ESPITIA ALVARO ENRIQUE	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
4	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
5	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
6	CC	1043650652	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALBERTO	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS048	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
7	CC	1047477459	ORTEGA GAMARRA ALBERT GREGORIO	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
8	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
9	CC	73113272	RIOS BELTRAN GERMAN	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
10	CC	73145264	CARVAJAL KALIL ANIBAL ISAAC	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	1047367008	CORTECERO CABRERA JORMAN	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
12	CC	1047450089	RIOS MEZA VICTOR ALFONSO	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
13	CC	1047450558	DE LA ROSA GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	CCFC55	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
14	CC	1047454997	RAMOS GARCIA EDUARDO ENRIQUE	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
15	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
16	CC	80774880	GUEVARA SOTO JONATHAN	1	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
17	CC	1098663350	LIZCANO CASTELLANOS NANNY ROCIO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	1193563504	RAMOS ACEVEDO NICOLAS ELIAS	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
19	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
20	CC	73084648	LARA RUIZ JUAN MANUEL	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
21	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
22	CC	1014200124	RAMIREZ FIGUEROA JOSE ISAIAS	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
23	CC	73168636	JULIO BONILLA MIGUEL ANDRES	1	0			N		X															231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
24	CC	73212605	RIOS JIMENEZ JOE ENRIQUE	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
25	CC	73317594	TORRES GAMARRA CLEIDER JOSE	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
26	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
27	CC	1002086826	SALGADO MORA DEWIS YAIR	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
28	CC	1047409123	PIÑA GAMARRA KEVIN JOSE	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
29	CC	9043110	PEÑA PEREZ PEDRO ANTONIO	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC07	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
30	CC	9082324	DE LA ROSA PATERNINA DIOMEDES	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
31	CC	9094808	OROZCO MERCADO JAVIER	1	3			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS010	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
32	CC	92557333	HERNANDEZ MEDINA WILFRIDO DEL CRISTO	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
33	CC	73581300	BLANQUICETT CASTELLON WILLIAM	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	ESSC24	86.667	10.900	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
34	CC	1047376745	CARDOZO ROMERO JOSIMAR FERNANDO	1	0			N	X																25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	CCFC55	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
35	CC	73109175	PAREDES PERTUZ JUAN CARLOS	1	0			N		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
36	CC	1143353549	JULIO DE LA ROSA SAMUEL	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
37	CC	73207848	BARRIOS ARROYO RAUL ENRIQUE	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
38	CC	1001898456	EXTREMAR BARRIOS EDGAR MANUEL	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
39	CC	17843307	PEREZ DE LA ROSA LEIDEN	1	0			N	X																25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					44	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74457580	$2.581.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	424126	VARGAS MOLINA NORBERTO	1	0			N	X																230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
41	CC	33333366	MARRIAGA ARIZA ARELIS DEL CARMEN	1	0			N		X															231001	43.334	7.000	0	0	0	0	ESSC24	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
42	CC	49752359	RAMOS MOLINA TULIA INES	1	0			N		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
43	CC	7918843	MUÑOZ SANDOVAL ENIO LIBARDO	1	0			N		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	5.500	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
44	CC	1143383484	GAVIRIA OROZCO DAGOBERTO	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS048	86.667	10.900	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0BC1397995FA08D8D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3195231 de TABIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 54824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****


Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



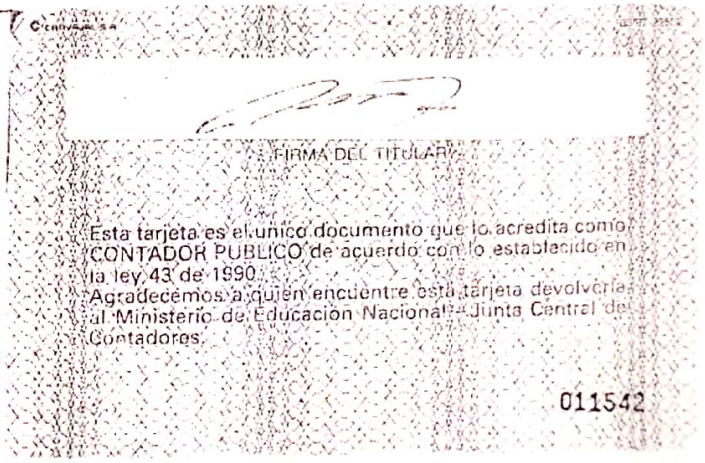

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo Argenis Lopez identificado con CC. No. 52832228 Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREA DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA , de la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de Madrid Cundinamarca a los 15 días del mes de diciembre de 2023



Firma:_____

CC. No. 52832228

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, ANDRÉS MAURICIO ROSERO G. identificado con CC. No. 74360018
Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de MADRID. a los 20 días el mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma:

CC. No. 74360018

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, ENRIQUE Avila. identificado con CC. No. 1077320582.
Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de MADRID. a los 20 días el mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma: ENRIQUE AVILA
CC. No. 1077320582

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, JULIAN MAURICIO GARCIA X. identificado con CC. No. 1013580537.
Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de MADRID a los 20 días el mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma:

CC. No. 1013580537.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, NORBERTO VARGAS MOLINA identificado con CC. No. 424126
Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de MADRID a los 20 días el mes de DICIEMBRE de 2023.

Firma: Norberto Vargas Molina
CC. No. 2124 126

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, Alcides Martin identificado con CC. No. 1073599257.
Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos con respecto a las obras realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de Madrid a los 20 días el mes de Diciembre de 2023.

Firma: Jose Alcides Martin
CC. No. 1073599257

Powered by CamScanner

CONSORCIO
VENTURA

PAZ Y SALVO

Yo, WILLIAM EDILSON GONZALEZ PIRAQUIVE identificado con C.C. 79.954.942 de Bogotá Declaro haber quedado a paz y salvo por todo concepto en lo referente a los pagos recibidos por las siguientes productos y mano de obra:

Suministro Teja Standing Seam Pintada Cal 24, Malla de Cerramiento, flanches de la cubierta, canal de la cubierta, postes para el cerramiento.

Todas las anteriores realizadas en la sede del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AEREA en la ciudad de Madrid Cundinamarca.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., diciembre 15 de 2023.

WILLIAM EDILSON GONZALEZ PIRAQUIVE
CC. No. 79.954.942 de Bogotá

Powered by CamScanner

INFORME No:	INFORME FINAL
FECHA:	20 de Diciembre de 2023
CONTRATO No:	**CONTRATO No.010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023**
OBJETO:	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA).

Partes a intervenir en entrega y recibimiento

Contratista	Consorcio Ventura		
Supervisor	Teniente Carlos Andrés Cuadros Romero.		
Fecha programada cumplimiento	15 de Diciembre	2023	Programado 100%, VS Ejecutado 100 %
Este informe se constata ante la información plasmada ante Bitácora de obra, la cual fue cerrada y firmada el dia 15 de Diciembre del 2023			

TEMAS PRESENTE ACTA

En este cuerpo del in forme se deberán ***describir de forma clara y como puntos obligatorios*** los siguientes aspectos tratados en el comité y los aspectos técnicos de la obra.

Aspectos Técnicos

Bogotá, 17 de noviembre del 2023

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Teniente Carlos Cuadros Supervisor del proyecto Madrid, Colombia

Fuerza Aérea

CONTRATO No.010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA).

Referencia: Informe de Obra Quincenal No 3

Respetados señores: Por medio de la presente remitimos para su revisión y seguimiento el informe del asunto, correspondiente al periodo del 17 de noviembre, al 1 de diciembre del 2023, del contrato de la referencia, se realiza envío de informe Técnico de Obra e Informe SST.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios

Arq. Andrés Mauricio Rosero González
RESIDENTE DE OBRA.
Consorcio Ventura

INFORME FINAL DE OBRA

El día 18 Octubre de 2023 se da inicio, a las actividades de mantenimiento del Aérea de Sanidad de la Fuerza Aérea de Colombia Base en Madrid Cundinamarca, se registra en este informe actividades realizadas y ejecutadas hasta el 15 de diciembre del presente año, se expone cuadro con cantidad ejecutada.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código**
	FORMATO BALANCE DE OBRA	**Versión**
		Vigencia
FECHA	**NOVIEMBRE 23 DE 2023**	
CONTRATO No.	**CONTRATO DE OBRA No. 010-MDN-CGFM-DIGSA- JEFSA-FAC-CAMAN-2023-**	
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO VENTURA**	
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**TE. CARLOS ARDRES CUADROS ROMERO**	

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CORTE No.1 (11/12/2023)		BALANCE A LA FECHA		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
1	**PRELIMINARES**						$ -	$ -	-	MENOR
1.1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, SANITARIOS INCLUYE RETIRO (INCLUYE CAMBIO DE LAVAMANOS)	Un	16.00	$ 18,012.78	$ 288,204.53	18.00	$ 324,230.10	$ 324,230.10	2.00	MAYOR
1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M²	1.00	$ 44,646.96	$ 44,646.96	0.30	$ 13,394.09	$ 13,394.09	(0.70)	MENOR
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	80.00	$ 11,693.55	$ 935,484.32	63.77	$ 745,697.94	$ 745,697.94	(16.23)	MENOR
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE FLANCHES, CABALLETES Y SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO	M²	1,200.00	$ 13,694.76	$ 16,433,708.70	866.43	$ 11,865,548.52	$ 11,865,548.52	(333.57)	MENOR
1.5	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	M²	65.00	$ 5,168.15	$ 335,929.51	46.31	$ 239,336.86	$ 239,336.86	(18.69)	MENOR
1.6	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE	M²	67.01	$ 6,040.74	$ 404,790.07	6.00	$ 36,244.45	$ 36,244.45	(61.01)	MENOR
1.7	DESMONTE DE CANAL METÁLICA EXISTENTE	Ml	140.00	$ 10,417.40	$ 1,458,435.46	138.81	$ 1,446,038.76	$ 1,446,038.76	(1.19)	MENOR
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						$ -	$ -	-	MENOR
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M³	5.00	$ 21,830.51	$ 109,152.54	0.96	$ 20,957.29	$ 20,957.29	(4.04)	MENOR
3	**CIMENTACION**						$ -	$ -	-	MENOR
3.1	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M³	1.25	$ 411,881.43	$ 514,851.78	0.96	$ 395,406.17	$ 395,406.17	(0.29)	MENOR
4	**INSTALACIONES SANITARIAS**						$ -	$ -	-	MENOR
4.1	LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO	Ml	100.00	$ 37,949.57	$ 3,794,957.46	220.00	$ 8,348,906.40	$ 8,348,906.40	120.00	MAYOR
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ -	$ -	-	MENOR
5.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15.00	$ 150,065.81	$ 2,250,987.17	38.00	$ 5,702,500.83	$ 5,702,500.83	23.00	MAYOR
6	**PAÑETES**						$ -	$ -	-	MENOR
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	67.01	$ 25,616.96	$ 1,716,592.78	6.00	$ 153,701.79	$ 153,701.79	(61.01)	MENOR
6.2	PAÑETE GOTERAS 1:3 IMPERMEABILIZADO	Ml	15.00	$ 13,145.60			$ -	$ -	(15.00)	MENOR
7	**CIELO RASO**						$ -	$ -	-	MENOR
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, COMPUERTAS PARA INSPECCION Y ANGULO PARA LUCES DE PANELES) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	80.00	$ 77,772.35	$ 6,221,787.65	63.77	$ 4,959,542.48	$ 4,959,542.48	(16.23)	MENOR
8	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					-	$ -	$ -	-	MENOR
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	Ml	20.00	$ 33,048.19	$ 660,963.80	12.80	$ 423,016.83	$ 423,016.83	(7.20)	MENOR
9	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES**						$ -	$ -	-	MENOR
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	67.01	$ 22,829.16	$ 1,529,781.71	1,512.87	$ 34,537,544.41	$ 34,537,544.41	1,445.86	MAYOR
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	652.6	$ 21,827.58	$ 14,245,331.38	726.80	$ 15,864,282.75	$ 15,864,282.75	74.17	MAYOR
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	400.00	$ 31,727.08	$ 12,690,833.34		$ -	$ -	(400.00)	MENOR
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACIONES).	M²	65.00	$ 26,677.17	$ 1,734,016.19	549.17	$ 14,650,302.63	$ 14,650,302.63	484.17	MAYOR
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Ml	20.00	$ 17,004.36	$ 340,087.29	11.68	$ 198,610.98	$ 198,610.98	(8.32)	MENOR
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	Ml	15.00	$ 19,890.87			$ -	$ -	(15.00)	MENOR
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS PARA MUROS DE ETERBOARD EN MASILLA TIPO SIKAFLEX PARA DILATACIÓN.	Ml	120.00	$ 12,759.62	$ 1,531,154.96	124.73	$ 1,591,507.99	$ 1,591,507.99	4.73	MAYOR
10	**CARPINTERIA METALICA**						$ -	$ -	-	MENOR
10.1	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 4,00 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	Un	10.00	$ 217,940.60	$ 2,179,406.05	12.00	$ 2,615,287.25	$ 2,615,287.25	2.00	MAYOR
10.2	10.2. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTUR ESMALTE COLOR BLANCO PARA MALLA PREONDULADA EXISTENTE PARA CERRAMIENTO Y PERFILES (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURAS, ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M²	609.00	$ 13,393.80	$ 8,156,821.19	760.65	$ 10,187,990.20	$ 10,187,990.20	151.65	MAYOR
11	**CUBIERTAS**						$ -	$ -	-	MENOR
11.1	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	140.00	$ 55,405.38	$ 7,756,753.50	147.85	$ 8,191,685.75	$ 8,191,685.75	7.85	MAYOR
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 16, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y SOPORTES	Ml	140.00	$ 105,730.56	$ 14,802,278.60	138.81	$ 14,676,459.23	$ 14,676,459.23	(1.19)	MENOR
11.3	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR), TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	1,200.00	$ 195,462.25	$ 234,554,695.14	866.43	$ 169,354,353.76	$ 169,354,353.76	(333.57)	MENOR
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA PARA CANALES INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Ml	120.00	$ 26,422.14	$ 3,170,656.32	138.81	$ 3,667,656.70	$ 3,667,656.70	18.81	MAYOR
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						$ -	$ -	-	MENOR
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	5.00	$ 215,443.01	$ 1,077,215.05	5.00	$ 1,077,215.05	$ 1,077,215.05	-	MENOR
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	11.00	$ 445,732.84	$ 4,903,061.19	13.00	$ 5,794,526.86	$ 5,794,526.86	2.00	MAYOR
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Un	5.00	$ 199,962.02	$ 999,810.11	5.00	$ 999,810.11	$ 999,810.11	-	MENOR
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**						$ -	$ -	-	MENOR
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO	M²	D	$ 144,080.77	#¡VALOR!	9.34	$ 1,345,714.37	$ 1,345,714.37	#¡VALOR!	#¡VALOR!

14	**CERRADURAS**						$ -	$ -	-	MENOR
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10.00	$ 100,865.33	$ 1,008,653.32	10.00	$ 1,008,653.32	$ 1,008,653.32	-	MENOR
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE	Un	10.00	$ 59,934.47	$ 599,344.72	10.00	$ 599,344.72	$ 599,344.72	-	MENOR
15	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**					-	$ -	$ -	-	MENOR
15.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Mf	100.00	$ 4,156.80	$ 415,679.61	1,100.00	$ 4,572,475.71	$ 4,572,475.71	1,000.00	MAYOR
							$ -	$ -	-	MENOR
							$ -	$ -	-	MENOR
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**#¡VALOR!**		**$ 325,607,944.28**	**$ 325,607,944.28**		
ADMINISTRACIÓN		**23.25%**			**#¡VALOR!**		**$ 75,703,847.05**	**$ 75,703,847.05**		
IMPREVISTOS		**1%**			**#¡VALOR!**		**$ 3,256,079.44**	**$ 3,256,079.44**		
UTILIDADES		**4%**			**#¡VALOR!**		**$ 13,024,317.77**	**$ 13,024,317.77**		
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**#¡VALOR!**		**$ 2,474,620.38**	**$ 2,474,620.38**		
			TOTAL CONTRACTUAL		**#¡VALOR!**	**SUBTOTAL 1**	**$ 420,066,808.92**	**$ 420,066,808.92**		

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDADES REQUERIDAS			Justificación Mayores o Menores Cantidades
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
NP.001	DESMONTE DE LAMINA SUPERBOARD DE 8MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA EN MURO	M2	38.37	$ 13,694.00	$ 525,438.78	Se requiere desmontar la lamina de superbiard de 8mm porqu el flance de la cubierta está dentro del s
NP.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SUPERBOARD DE 4MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA MURO	M2	38.37	$ 52,990.64	$ 2,033,250.86	Se requiere instalar la lamina de superboard de 4mm para cubrir el muro perimetral de la canal
NP.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ONDULADA PARA CERRAMIENTO	M2	39.15	$ 139,592.50	5,465,046.38	Se requiere la reparación de algunos modulos de la malñla de cerramiento debido a su alto deterioro q
NP.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN (Incluye marco de sobreponer)	UN	4.00	$ 184,824.50	739,298.00	Reemplezo por este tipo de lamparas de las existentes con tubos
NP.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON MEZCLADOR MARCA CORONA	UN	27.00	$ 130,489.22	3,523,208.94	Reemplazo de la totalidad de las griferias de las areas por su alto deterioro
					$ -	
					$ -	
					$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS				**$ 12,286,242.95**	
ADMINISTRACIÓN		**23.25%**			**$ 2,856,551.49**	
IMPREVISTOS		**1%**			**$ 122,862.43**	
UTILIDADES		**4%**			**$ 491,449.72**	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**$ 93,375.45**	
				SUBTOTAL 1	**$ 15,850,482.03**	
	TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+NO PREVISTOS)				**$ 435,917,290.95**	


1.1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, SANITARIOS INCLUYE RETIRO

Se desarrolla el desmonte de Aparatos Sanitarios con un Total ejecutado de 13 Sanitarios y 5 Lavamanos, para un total de 18 aparatos.



1.2 DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO

Se realiza la demolicion de las Placas localizadas en los parquederos, esta actividad se efectúa para poder Anclar los Parales de Soprte de la Malla de Cerramiento.

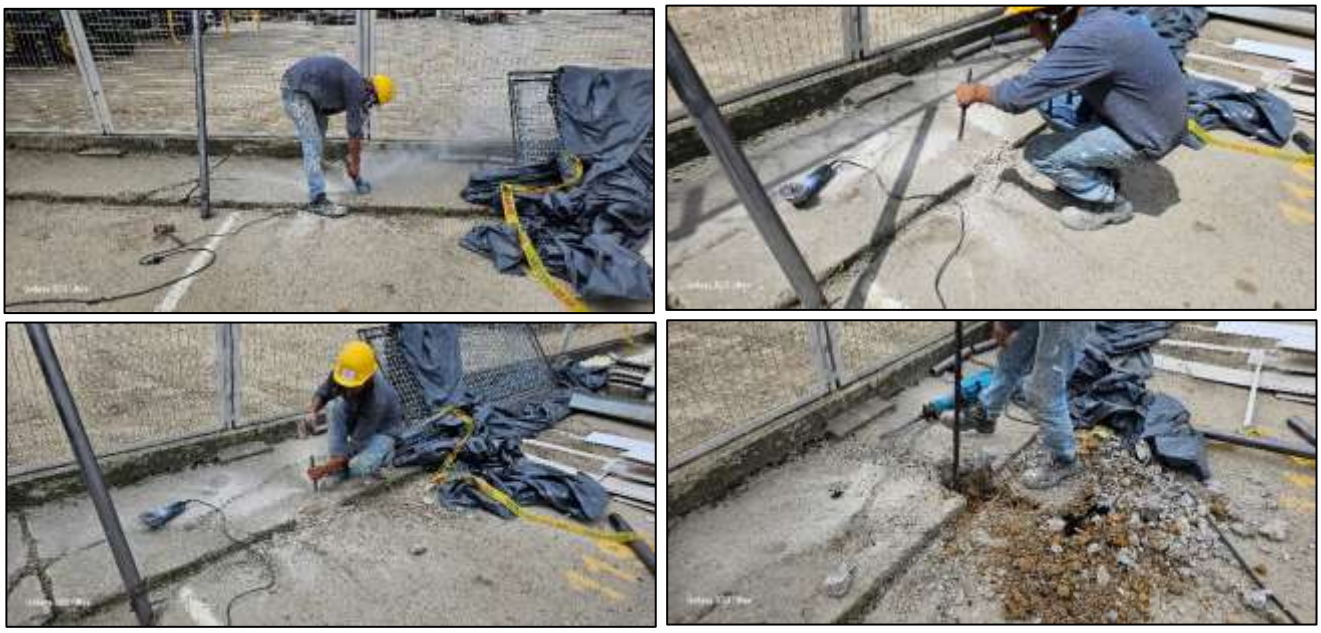

1.3 DESMONTE DE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA Y RETIRO.

Esta actividad se da inicio con el desmonte del cielo raso del área de odontología, 63.77 m² Total Desmontado.









1.4 DESMONTE DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE FLANCHES Y CABALLETES, RETIRO EN SITIO AUTORIZADO.

Esta actividad se realiza con un total ejecutado de 866.43 m² de Cubierta desmontada







1.5 ESCARIFICADO DE PINTURA EN MUROS

Se realizo Escarificado en Muros con un Total Ejecutado de 46.31 m²




1.6 ESCARIFICADO Y RETIRO DE PAÑETE

Se ejecutaron un total de 6 .0 m² de Escarificado y retiros de Pañete en las Zonas identificadas dentro y fuera de Sanidad.









1.7 DESMONTE DE CANAL METÁLICA EXISTENTE.

Se realiza el desmonte de la Canal Metálica Existente en la Cubierta y se ejecutan 138.81 ml de canal desmontada.





2.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION

Se realiza excavación del Terreno en las zonas perimetrales de la Malla de Cerramiento para instalación y Anclaje de Parales, con un Total ejecutado de 0.96 m^3.







3.1 CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.

Se realiza Concreto Ciclópeo para fundir las patas de la Tubería que se utilizara para Soportes de La Malla de Cerramiento Total ejecutado 0.96 m³.




4.1 LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO.

Se realiza la Limpieza de la Red Sanitaria en cada Aparato sanitario desmontado, y así mismo se realiza la Limpieza en las Cajas Principales tanto dentro y fuera de las Instalaciones de Sanidad con Vactor, con un Total ejecutado de 220 ml






5.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Se realiza suministro e Instalacion de pnatallas Led en toads las zonas como lo son, Consultorios, Oficinas, Hospitalizacion, Baños y Halls. Total instalas 38 Unidades.




6.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES

Esta actividad se da inicio con la aplicación de pañete impermeabilizado en muros externos e internos de las instalaciones de sanidad, ejecutados 6.0 m²









7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, COMPUERTAS PARA INSPECCION Y ANGULO PARA LUCES DE PANELES) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se realiza la Instalacion de cielo raso en PVC , junto con susu accesorios entre ellos la Media caña para remates entre muro y techo con un total ejecutado de 63.77 m²






8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS

Se realiza la Demarcacion en areas de Extintores en todas las areas de Sanidad, total ejecutado 12.80 ml






9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

Esta actividad se realiza con la aplicación de Pintura en Vinilo en el interior de las instalaciones de sanidad, con un Total Ejecutado de 1512.87 m²









Ficha tecnica de la pintura

1-2

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
PROTECMAX

PROTECMAX

VINILO MÁXIMA PROTECCIÓN/PINTUMAXTER

DESCRIPCIÓN:
Pintura 100% acrílica diluíble con agua, de acabado semi mate, de alta resistencia, secado rápido, fácil aplicación y excelente retención del color. Diseñada para uso en ambientes de alta exigencia e interiores. Disponible en una amplia gama de colores.

USOS:
Producto para uso recomendado principalmente en ambientes de alta exigencia, para decorar y proteger fachadas, patios, terrazas, revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento.



VENTAJAS:
- Alta resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción.
- Alta blancura.
- Gran variedad de colores.

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto y pintura deteriorada), evitando condiciones poco recomendables, que impiden la adherencia. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Acrílico Pintumaxter®. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas alcalinas de manera directa.
Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos durante la aplicación.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Es un producto listo para usar, se recomienda diluir con agua en una relación máxima del 10%.
APLICACIÓN:
Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación. Brocha, pistola, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.
No lavar antes de 30 días de haberse pintado. En la limpieza no debe utilizar elementos abrasivos.

CON LA GARANTÍA, TRADICIÓN Y EL RESPALDO DE: PINTURAS PINTUMAXTER

9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

Se realiza la aplicación de Pintura Tipo Koraza en los Exteriores del area de Sanidad y las Areas de Triage y Zona de Deposito de Basuras. Total Ejecutado 726.80 m²









9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m²

Se aplica Pintura Epoxica en zonas Interiores del area de Sanidad (Consultorios, Farmacia, Fonoaudiologia, Fisioterapia) Programado 100% ejecutado 50 %.








9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ml

Se aplica Pintura Epoxica en zonas Interiores del area de Sanidad como lo son Bordes de Ventanas, Dinteles en Puertas.(Consultorios, Farmacia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Laboratorio, Procedimientos, Esterilización) Total ejecutado 11.68 ml




9.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS PARA MUROS DE ETERBOARD EN MASILLA TIPO SIKAFLEX PARA DILATACIÓN.

Esta actividad se da inicio con la instalación de malla en juntas en muro de Eterboard, de las instalaciones de sanidad, en su totalidad se ejecutó 124.73 ml









10.1 POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 4,00 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.

Instalación de Postes en Galvanizado para soporte de la Malla de Cerramiento del Area de Sanidad, Total Instalados 12 Unidades.





10.2. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PARA MALLA PREONDULADA EXISTENTE PARA CERRAMIENTO Y PERFILES (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURAS, ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

Se realiza mantenimiento de Malla para Cerramiento del area de Sanidad, inclutendo Zona de Parqueo. Total Ejecutado 760.65 m²









11.1 FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE

Se realiza la Instalacion de Flanche Metalico por el perímetro de la Cubierta y zonas de Vacios. Total Instalado 147.85 ml




11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 16, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y SOPORTES

Se realiza el cambio e Instalación de Canal Metálica sobre el Perímetro de la cubierta y zonas centrales de caídas de aguas. Total Instalada 138.81









11.3 TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH Se anexa con este informe ficha técnica.

Se realiza el cambio e instalación de Teja Tipo Sándwich para Cubierta general de Sanidad, se ejecutó 866.43 m² en total.









11.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA PARA CANALES INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Se realiza la instalación de Malla Plastica sobre todas las Canales Instaladas, para evitar la caída de Hojas en la Tuberia. Ejecutado total de 138.81 ml




12.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Se realiza el cambio de Lavamanos normales por Lavamanos Tipo Pedestal. Esta Actividad se realizo en Consultorios y Zona de Laboratorio. Total 5 Unidades.





12.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA AVANTI PLUS REDONDO COLOR BLANCO, CON ACCESORIOS, SOLDADURA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Se instalan aparatos sanitarios en Area de Consultorios, Baños de Pasillo y Fisioterapia. Total ejecutado 13 unidades.







12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR

Se realiza cambio de Griferia Monocontrol completa en lavamos de Consultorios. Se instalan 5 Unidades en Total.




13.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5 MM DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO

Se realiza cambio de Vidrios Quebrados en Zona de Control, Fisioterapia, Hospitalizacion y Alcobas de Enfermero de Turno y Medico de Turno y Sala de Espera. Total instaldo 9.34 m².




14.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE

Se realiza cambio de Cerraduras en Consultorios y otras oficinas del Area de Sanidad. Total Cambiadas 10 Unidades.




14.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE

Se realiza cambio de Cerraduras en Baños de Hall de Consultorios y Baños de zona de urgencias y Hospitalizacion. del Area de Sanidad. Total Cambiadas 10 Unidades.




15.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

Se realiza aseo general en las Instalaciones de Sanidad. Total ejecutado 1100 m²





NO PREVISTOS

NP 001. DESMONTE DE LAMINA SUPERBOARD DE 8MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA EN MURO

Se realiza desmonte de Lamina SuperBoard, ya que este interfiere en la Actividad de Cambio de Cubierta y cambio de Canales Metalicas. Total ejecutado 38.37 m²





NP 002. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA SUPERBOARD DE 4MM UNA CARA SIN ESTRUCTURA PARA MURO

Se realiza la instalación de Lamina SuperBoard retirado anteriormente. Total ejecutado 38.37 m²





NP 003. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ONDULADA PARA CERRAMIENTO

Se realiza cambio en algunas Zonas de la Malla de Cerramiento del area de Saniamiento, ya que se encuentran deterioradas. Total Ejecutado 39.15 m²






NP 004. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN (Incluye marco de sobreponer)

Se realiza cambio de Pantallas de Bombillo Fluorescente, por Pantallas LED. Localizadas en Farmacia y Archivo de Historias. Taotal Instaladas 4 Unidades.




NP 005. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON MEZCLADOR MARCA CORONA

Se Suministra y Cambia Griferias completas de lavamanos de Consultorios y Baños de Pasillos. Se Instalan 27 unidades Completas (Llaves Dobles y Griferia).









Firma:
Arq. Andrés Mauricio Rosero González
Residente de obra
M.P. A126142010-74360018

CONTRATO No.010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023

OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA).

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

VALOR DEL CONTRATO: $449.999.919.00

SUPERVISOR: T. CARLOS ANDRÉS CUADROS ROMERO.

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN.


RESIDENTE DE OBRA: ARQ. FREDDY REAL RODRÍGUEZ.

RESIDENTE SISO: ARGELIS LÓPEZ.

FRENTE DE OBRA: FRENTE DE TRABAJO #1 CUBIERTAS, TECHOS Y CIELO RASO DE ODONTOLOGÍA. FRENTE DE TRABAJO #2 FACHADAS E INTERIORES. FRENTE DE TRABAJO #3 MANTENIMIENTO DE VENTANAS, PUERTAS, BAÑOS, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, CHAPAS DAÑADAS.

2023

BITACORA

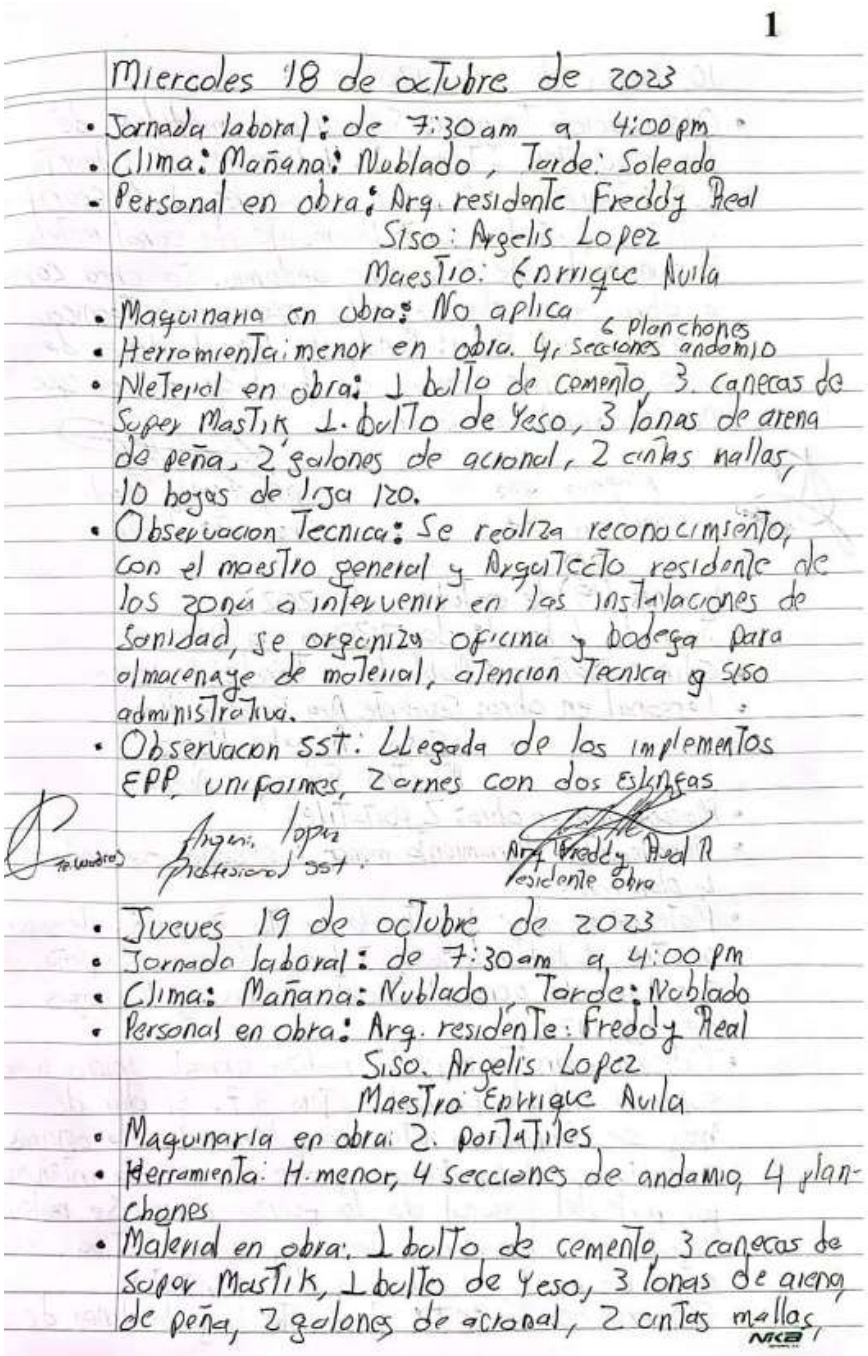

1


Miercoles 18 de octubre de 2023

- Jornada laboral: de 7:30 am a 4:00 pm
- Clima: Mañana: Nublado, Tarde: Soleado
- Personal en obra: Arq. residente Freddy Real
  Siso: Argelis Lopez
  Maestro: Enrrique Avila
- Maquinaria en obra: No aplica
- Herramienta menor en obra. 4, secciones andamio 6 planchones
- Material en obra: 1 bulto de cemento, 3 canecas de Super Mastik 1 bulto de Yeso, 3 lonas de arena de peña, 2 galones de acrional, 2 cintas mallas, 10 bajas de 1/2a 120.
- Observacion Tecnica: Se realiza reconocimiento, con el maestro general y Arquitecto residente de los zonas a intervenir en las instalaciones de Sanidad, se organiza oficina y bodega para almacenaje de material, atencion Tecnica y siso administrativa.
- Observacion SST: LLegada de los implementos EPP, uniformes, 2 arnes con dos eslingas

Angie. Lopez
Profesional SST.

Arq. Freddy Real R
residente obra

- Jueves 19 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30 am a 4:00 pm
- Clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
- Personal en obra: Arq. residente: Freddy Real
  Siso. Argelis Lopez
  Maestro Enrrique Avila
- Maquinaria en obra: 2. portatiles
- Herramienta: H. menor, 4 secciones de andamio, 4 planchones
- Material en obra: 1 bulto de cemento 3 canecas de Super Mastik, 1 bulto de Yeso, 3 lonas de arena de peña, 2 galones de acrional, 2 cintas mallas,

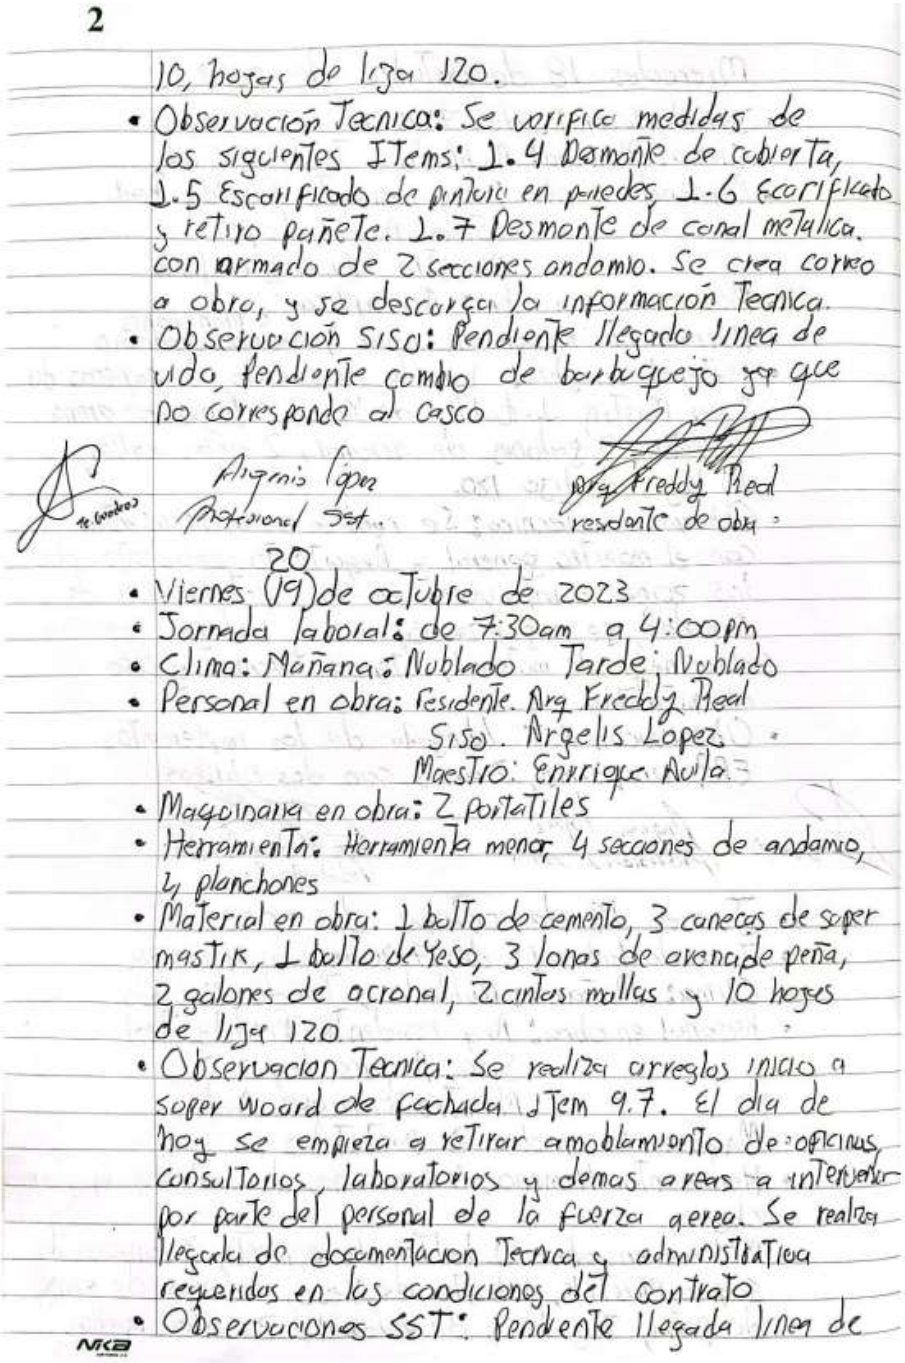

2

10, hojas de lija 120.


- Observación Tecnica: Se verifica medidas de los siguientes ITems: 1.4 Desmonte de cubierta, 1.5 Escarificado de pintura en paredes, 1.6 Escarificado y retiro pañete. 1.7 Desmonte de canal metalica. con armado de 2 secciones andamio. Se crea correo a obra, y se descarga la información Tecnica.
- Observación SISO: Pendiente llegado linea de vida, pendiente cambio de barbaquejo ya que no corresponde al casco

Argenis Lopez
Profesional SST.

Arq. Freddy Read
residente de obra

20

- Viernes (19) de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4:00pm
- Clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
- Personal en obra: Residente. Arq Freddy Read
  Siso. Argelis Lopez.
  Maestro: Enrrique Avila.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles
- Herramienta: Herramienta menor, 4 secciones de andamio, 4 planchones
- Material en obra: 1 bolto de cemento, 3 canecas de super mastik, 1 bolto de yeso, 3 lonas de arena de peña, 2 galones de acronal, 2 cintas mallas y 10 hojas de lija 120.
- Observacion Tecnica: Se realiza arreglos inicio a super woard de fachada ITem 9.7. El dia de hoy se empieza a retirar amoblamiento de oficinas consultorios, laboratorios y demas areas a intervenir por parte del personal de la fuerza aerea. Se realiza llegada de documentacion Tecnica y administrativa requeridos en las condiciones del contrato
- Observaciones SST: Pendiente llegada linea de

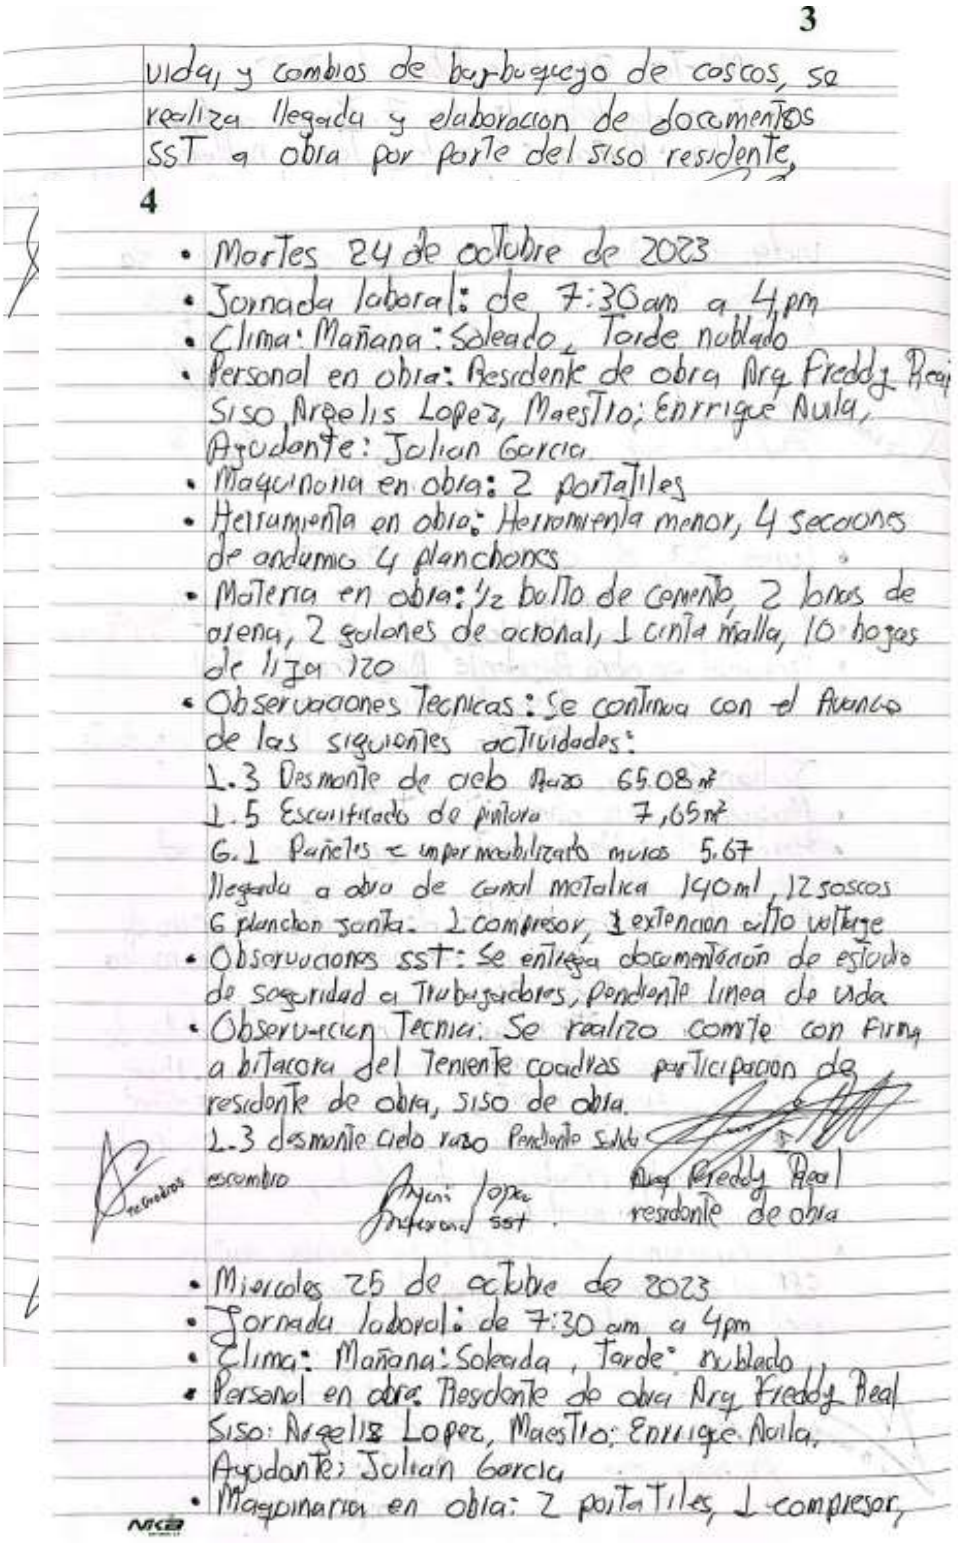

3

vida, y cambios de barbuquejo de cascos, se realiza llegada y elaboracion de documentos SST a obra por parte del siso residente,


4

- Martes 24 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleado, Tarde nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso Angelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante: Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio 4 planchones
- Materia en obra: ½ bulto de cemento, 2 bolos de arena, 2 galones de acpnal, 1 cinta malla, 10 hojas de lija 120
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el Avance de las siguientes actividades:
  1.3 Desmonte de cielo raso 65.08 m²
  1.5 Escarificado de pintura 7,65m²
  6.1 Paneles = impermeabilizado muros 5.67
  llegada a obra de canal metalica 140ml, 12 sacos 6 planchon yanka. 1 compresor, 1 extencion alto voltaje
- Observaciones sst: Se entrega documentación de estudio de seguridad a Trabajadores, pendiente linea de vida.
- Observacion Tecnica: Se realizo comite con Firma a bitacora del Teniente cuadras participacion de residente de obra, siso de obra.
  1.3 desmonte cielo raso Pendiente Salida escombro

Angelis Lopez Profesional sst.

Arq Freddy Real residente de obra

- Miercoles 25 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30 am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleada, Tarde: nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso: Angelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante: Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor,

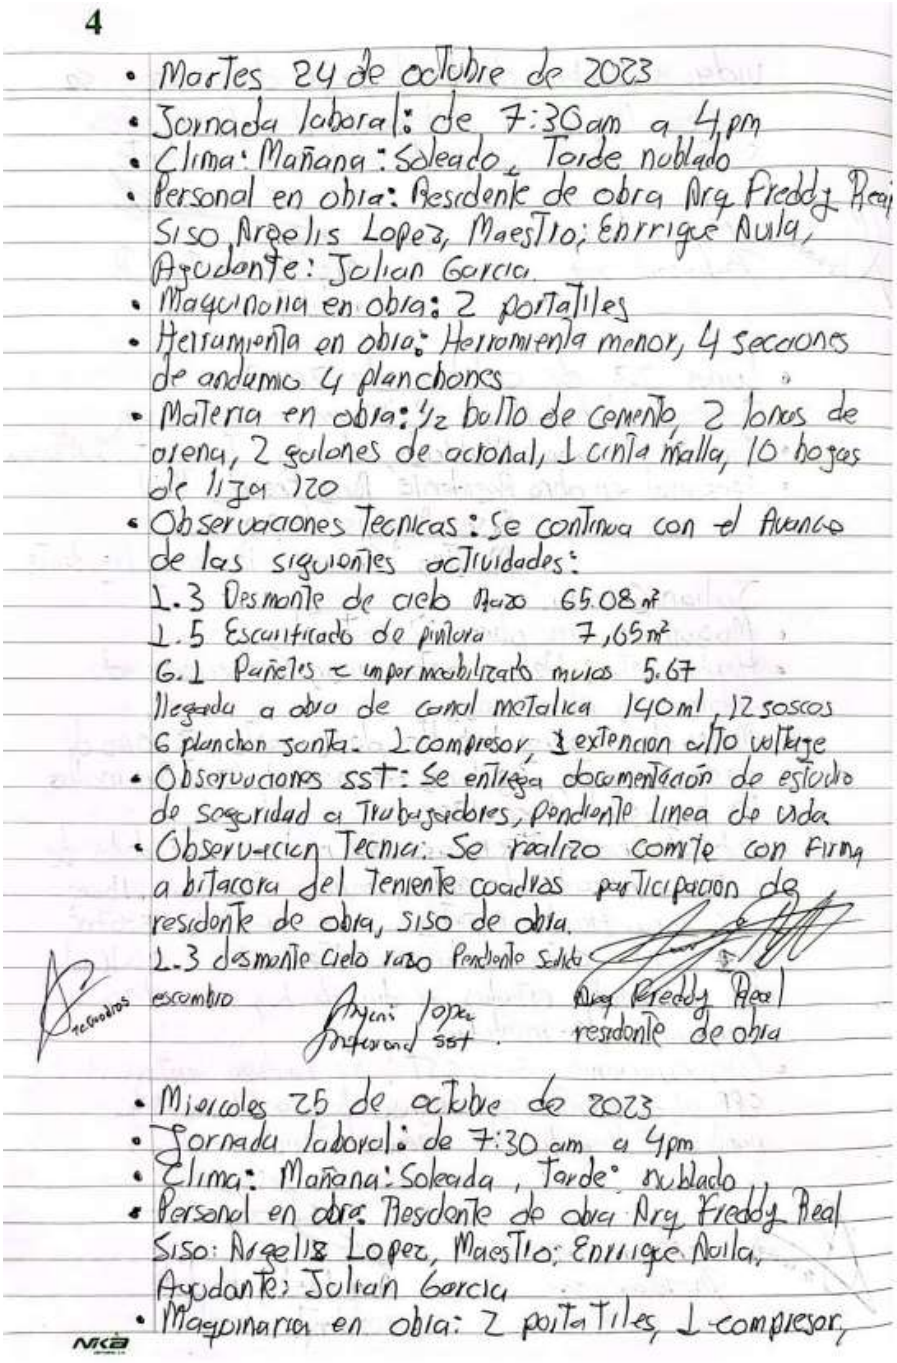


4

- Martes 24 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleado, Tarde nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso Angelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante: Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio 4 planchones
- Materia en obra: ½ bulto de cemento, 2 botes de arena, 2 galones de acronal, 1 cinta malla, 10 hojas de lija 120
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el Avance de las siguientes actividades:
  1.3 Desmonte de cielo Raso 65.08 m²
  1.5 Escarificado de pintura 7,65m²
  6.1 Paneles + impermeabilizado muros 5.67
  llegada a obra de canal metalica 140ml, 12 sacos 6 planchon junta. 2 compresor, 1 extencion alto voltage
- Observaciones SST: Se entrega documentación de estudio de seguridad a Trabajadores, Pendiente linea de vida
- Observacion Tecnica: Se realizo comite con Firma a bitacora del Teniente cuadros participacion de residente de obra, siso de obra.
  2.3 desmonte cielo raso Pendiente Salida escombro

Arq Freddy Real
residente de obra

- Miercoles 25 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30 am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleada, Tarde: nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso: Angelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante: Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor,

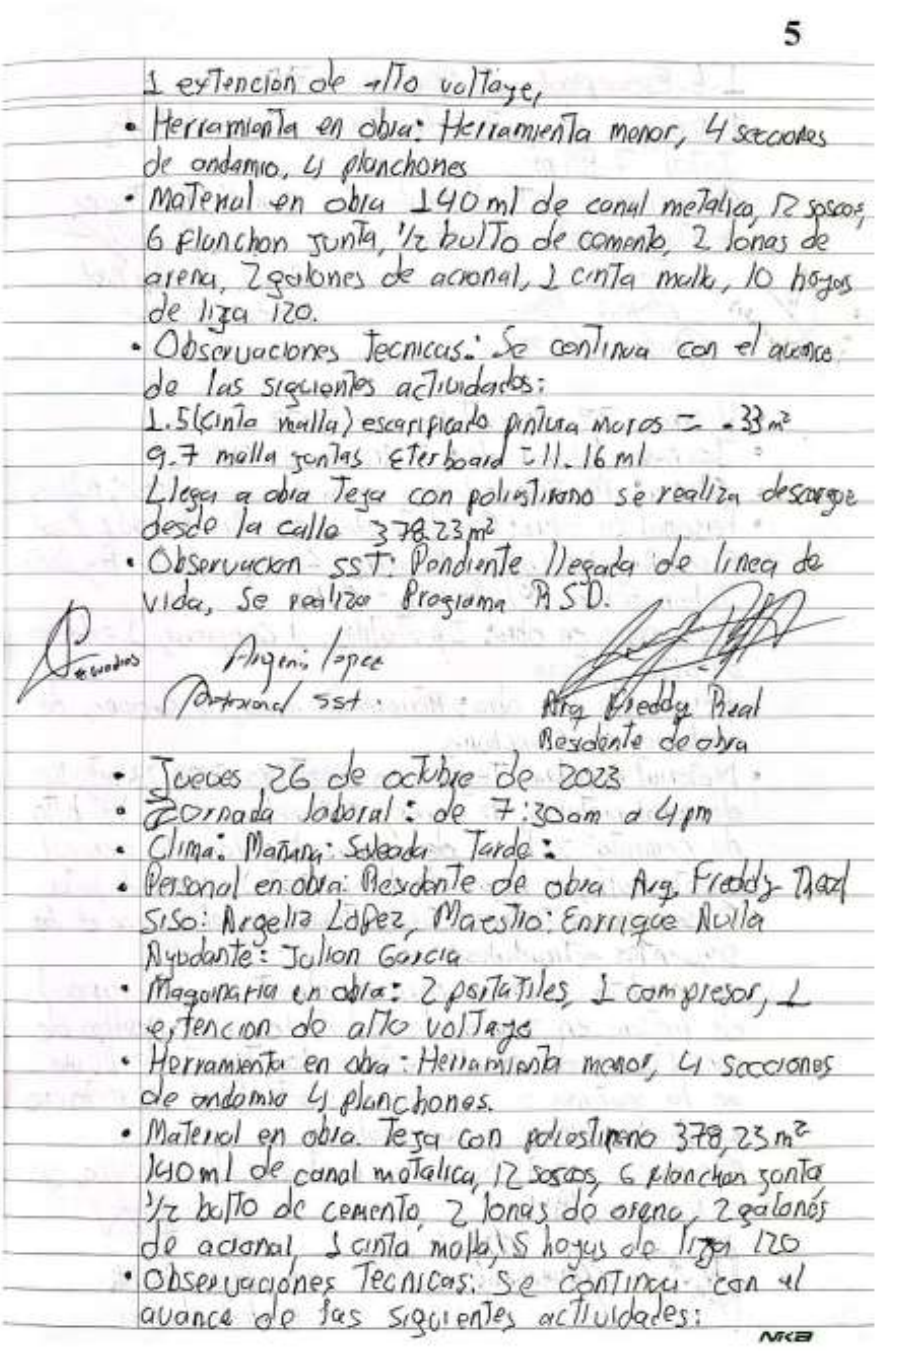

5

1 extencion de alto voltaje,


- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio, 4 planchones
- Material en obra 140 ml de canal metalica, 12 sacos, 6 planchon junta, 1/2 bulto de cemento, 2 lonas de arena, 2 galones de acronal, 1 cinta malla, 10 hojas de liza 120.
- Observaciones tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:
1.5(cinta malla) escarificado pintura muros = .33 m²
9.7 malla juntas Eterboard = 11.16 ml
Llega a obra Teja con poliestireno se realiza descargue desde la calle 378.23 m²
- Observacion SST: Pendiente llegada de linea de vida, se realizo Programa PESO.

Angelica Lopez
Personal sst.

Arq. Freddy Real
Residente de obra

- Jueves, 26 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleado Tarde:
- Personal en obra: Residente de obra Arq. Freddy Real
SISO: Angelica Lopez, Maestro: Enrrique Avila
Ayudante: Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 pistolas, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio 4 planchones.
- Material en obra. Teja con poliestireno 378.23 m²
140 ml de canal metalica, 12 sacos, 6 planchon junta 1/2 bulto de cemento, 2 lonas de arena, 2 galones de acronal, 1 cinta malla, 5 hojas de liza 120
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:

MKB

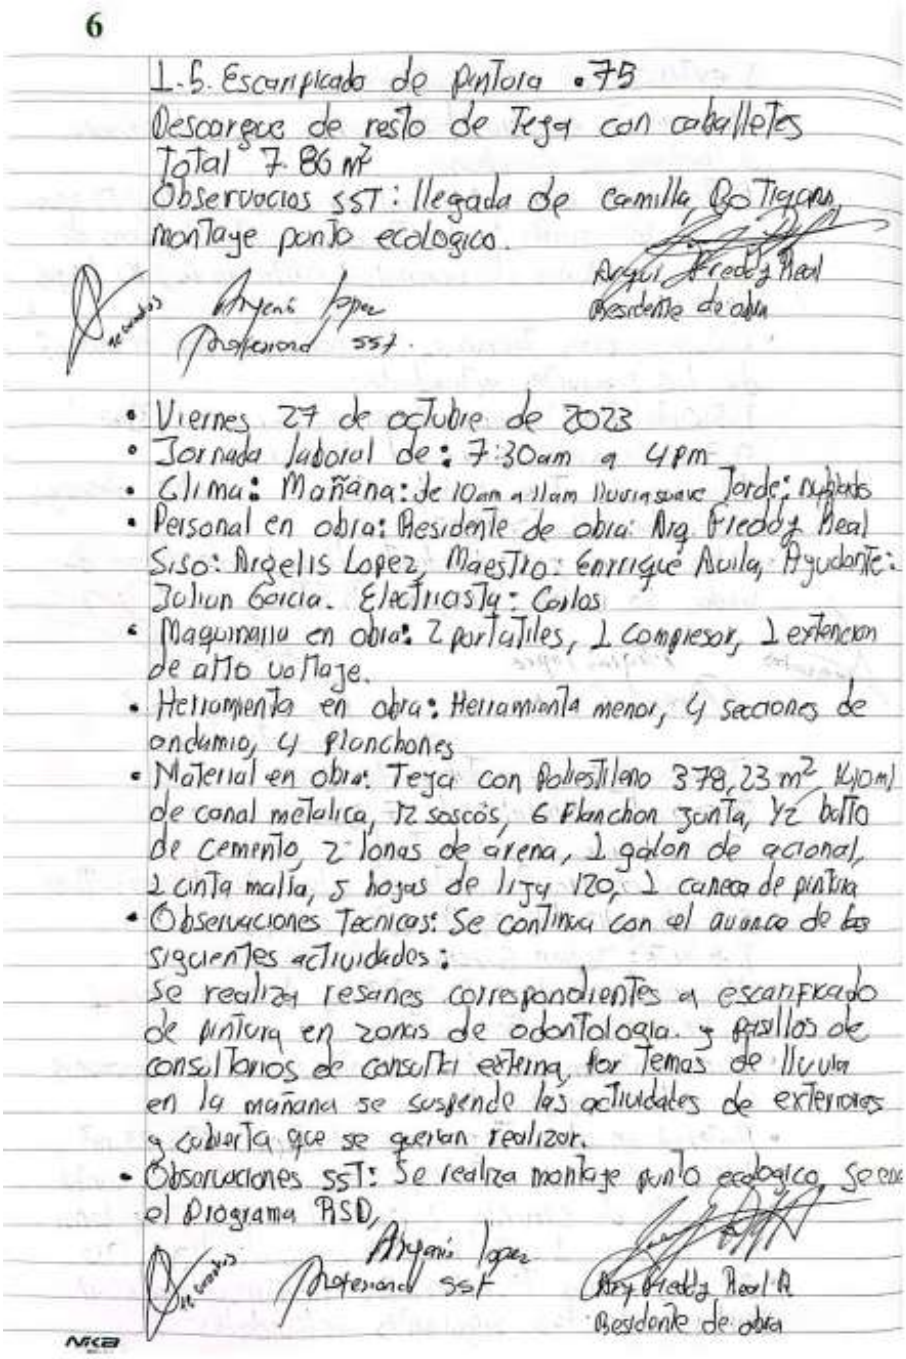

6

1.5. Escarpicado de pintura .75
Descargue de resto de Teja con caballetes
Total 7.86 M²
Observacios SST: llegada de camilla, Rotigas, montaje punto ecologico.


Argel Freddy Real
Residente de obra

Argenis Lopez
Profesional SST.

- Viernes 27 de octubre de 2023
- Jornada laboral de: 7:30am a 4pm
- Clima: Mañana: de 10am a 11am lluvia suave Tarde: nublado
- Personal en obra: Residente de obra: Ing Freddy Real Siso: Argelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante: Julian Garcia. Electricista: Carlos
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio, 4 planchones
- Material en obra: Teja con Poliestileno 378,23 m² Kilom de canal metalica, 12 sacos, 6 Planchon junta, 1/2 bulto de cemento, 2 bolas de arena, 1 galon de acional, 2 cinta malla, 5 hojas de lija 120, 1 caneca de pintura
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:
  Se realizan resanes correspondientes al escarpicado de pintura en zonas de odontologia. y pasillos de consultorios de consulta externa, por Temas de lluvia en la mañana se suspende las actividades de exteriores y cubierta que se querian realizar.
- Observaciones SST: Se realiza montaje punto ecologico, se exp el Programa PSD,

Argenis Lopez
Profesional SST

Ing Freddy Real R
Residente de obra

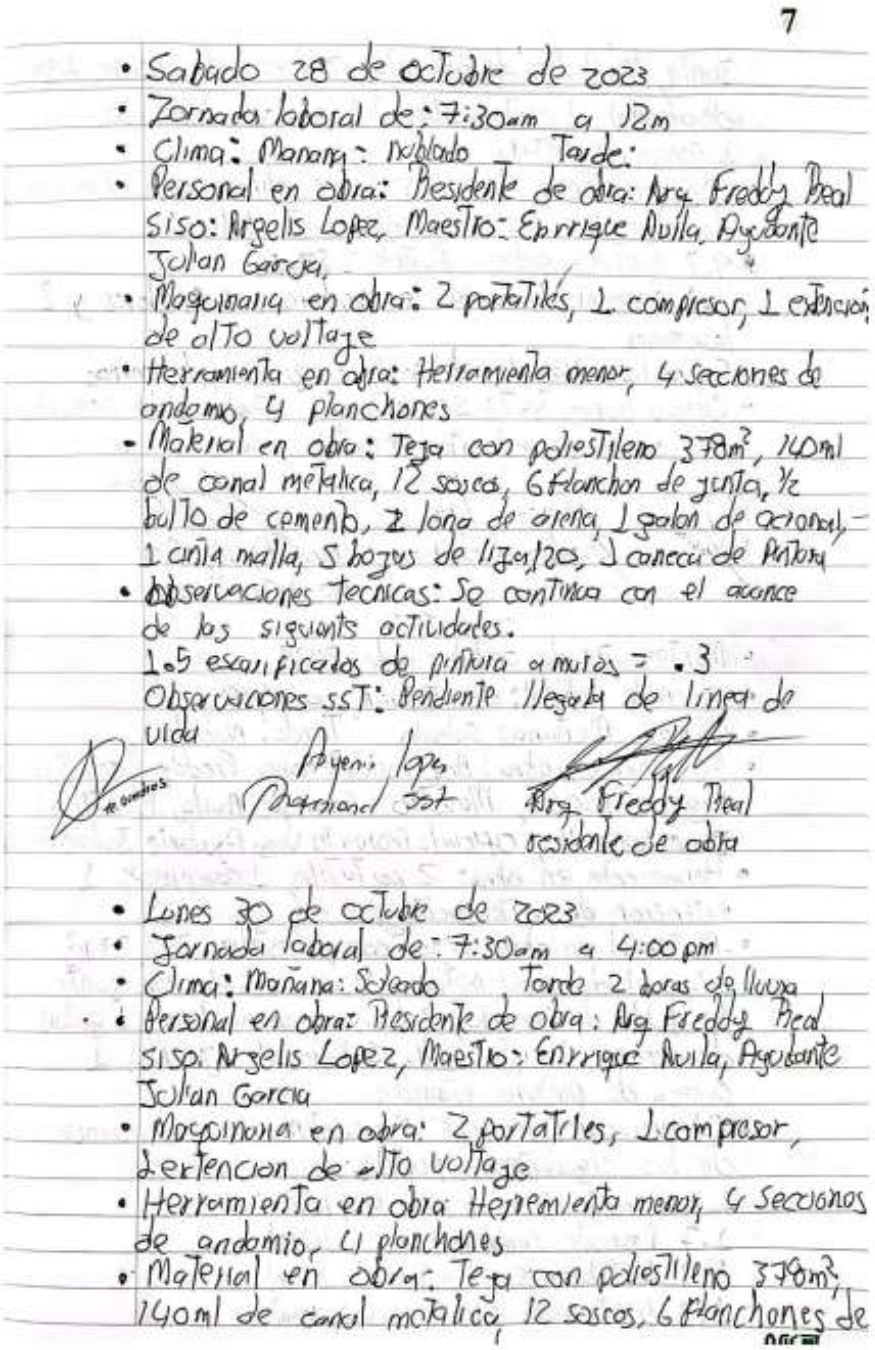


7

- Sabado 28 de octubre de 2023
- Zornada laboral de: 7:30am a 12m
- Clima: Manana: nublado Tarde:
- Personal en obra: Residente de obra: Arq Freddy Real Siso: Argelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante Julian Garcia,
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 secciones de andamio, 4 planchones
- Material en obra: Teja con poliestileno 378m², 140ml de canal metalica, 12 sacos, 6 planchon de junta, ½ bulto de cemento, 2 lona de arena, 1 galon de acrinal, 1 cinta malla, 5 hojas de lija 120, 1 caneca de Pintura
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de los siguints actividades.
  1.5 escarificados de pintura a muros = .3
  Observaciones SST: Pendiente llegada de linea de vida

Arq. Freddy Real
residente de obra

- Lunes 30 de octubre de 2023
- Jornada laboral de: 7:30am a 4:00 pm
- Clima: Mañana: Soleado Tarde 2 horas de lluvia
- Personal en obra: Residente de obra: Arq Freddy Real Siso: Argelis Lopez, Maestro: Enrrique Avila, Ayudante Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 4 Secciones de andamio, 11 planchones
- Material en obra: Teja con poliestileno 378m², 140ml de canal metalica, 12 sacos, 6 planchones de

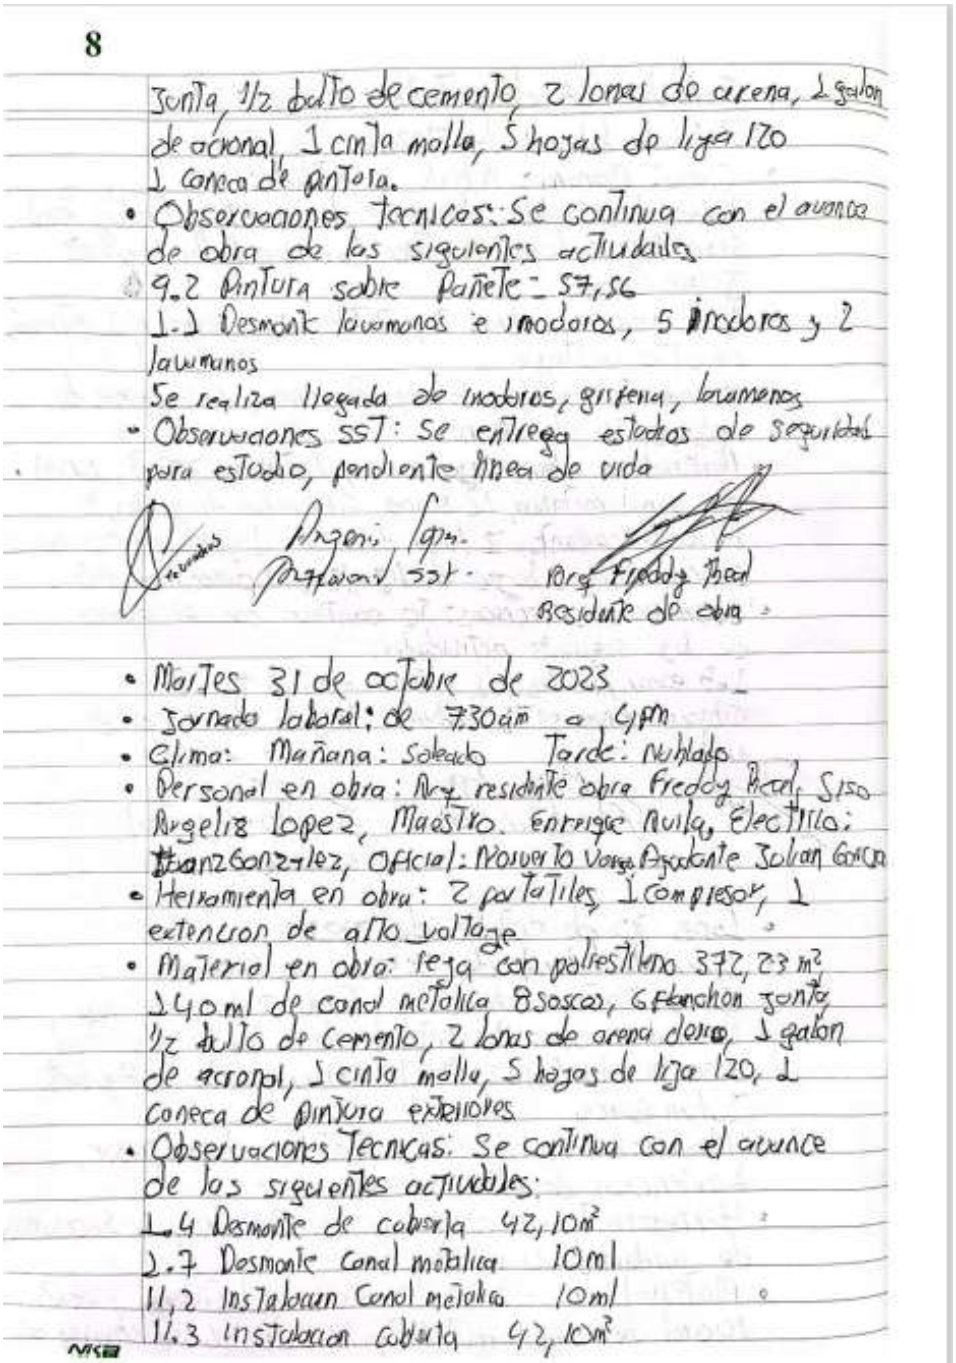

8

Junta, 1/2 balto de cemento, 2 bolsas de arena, 1 galon de acrionl, 1 cinta malla, 5 hojas de lija 120 1 caneca de pintola.

- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de obra de los siguientes actividades
9.2 Pintura sobre Pañete = 57,56
1.1 Desmonte lavamanos e inodoros, 5 inodoros y 2 lavamanos
Se realiza llegada de inodoros, griferia, lavamanos
- Observaciones SST: se entrega estados de seguridad para estudio, pendiente linea de vida

Ingeni. Ingen.
Profesional SST.

Ing. Freddy Real
Residente de obra.

- Martes 31 de octubre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4pm
- Clima: Mañana: Soleado Tarde: Nublado
- Personal en obra: Ing residente obra Freddy Real, Siso Angelis Lopez, Maestro. Enrique Avila, Electrico: Juan Gonzalez, Oficial: Roberto Vega Ayudante Jolian Garcia
- Herramienta en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extencion de alto voltage
- Material en obra: reja con polvestileno 372,23 m² 140 ml de canal metalica 8 soscas, 6 flanchon junta 1/2 balto de cemento, 2 bolsas de arena dorra, 1 galon de acrupl, 1 cinta malla, 5 hojas de lija 120, 1 caneca de pintura exteriores
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de los siguientes actividades:

1.4 Desmonte de cobertia 42,10m²
2.7 Desmonte Canal metalica 10ml
11,2 Instalacion Canal metalica 10ml
11.3 Instalacion cobertia 42,10m²

9/2 Pintura Sobre Pañete 29,98m2


30/10/23 NOTA SUPERVISIÓN: Se requiere por la supervisión que se debe cubrir por el residente de obra todos los días el domante de Cubierta, el cual No DEBE DEJARSE DESTAPADO, ya que si por la noche llueve y se filtra las aguas lluvias o los constructores dañan los ciclorama, luminarios y pintura retirar o cualquier otro. De suceder dicho evento el contratista deberá arreglarlo y cambiarse cualquier material o elemento que se dañe.

Se realiza comite con un Avance de 4% VS Programado de 8% se presenta un atraso de 4%. Se solicita mas personal de obra para atacar Tres frentes, Cubierta, pintura resanes, malla cerramiento

- Observacion SST: Se solicito andamios certificados, pendiente llegada linea de vida, Pendiente llegada de arbogantes.

Arq Freddy Real
Residente de obra

- Miercoles 01 de Noviembre de 2023
- Jornada laboral: de 7:30am a 4pm
- Clima Mañana: Nublado Tarde: 2 hrs de lluvia
- Personal en obra: Arq residente de obra: Freddy Real, SISO: Argeliz Lopez, Oficial: Norverto Vargas, Ayudante: Julian Garcia.
- Herramienta en obra: 2 pantallas, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Material en obra: Teja con poliestileno 330 m², 130 ml de canal metalica, pintura caneca para exteriores, 11 sanitarios, 5 lavamanos, 5 Griferias.
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:

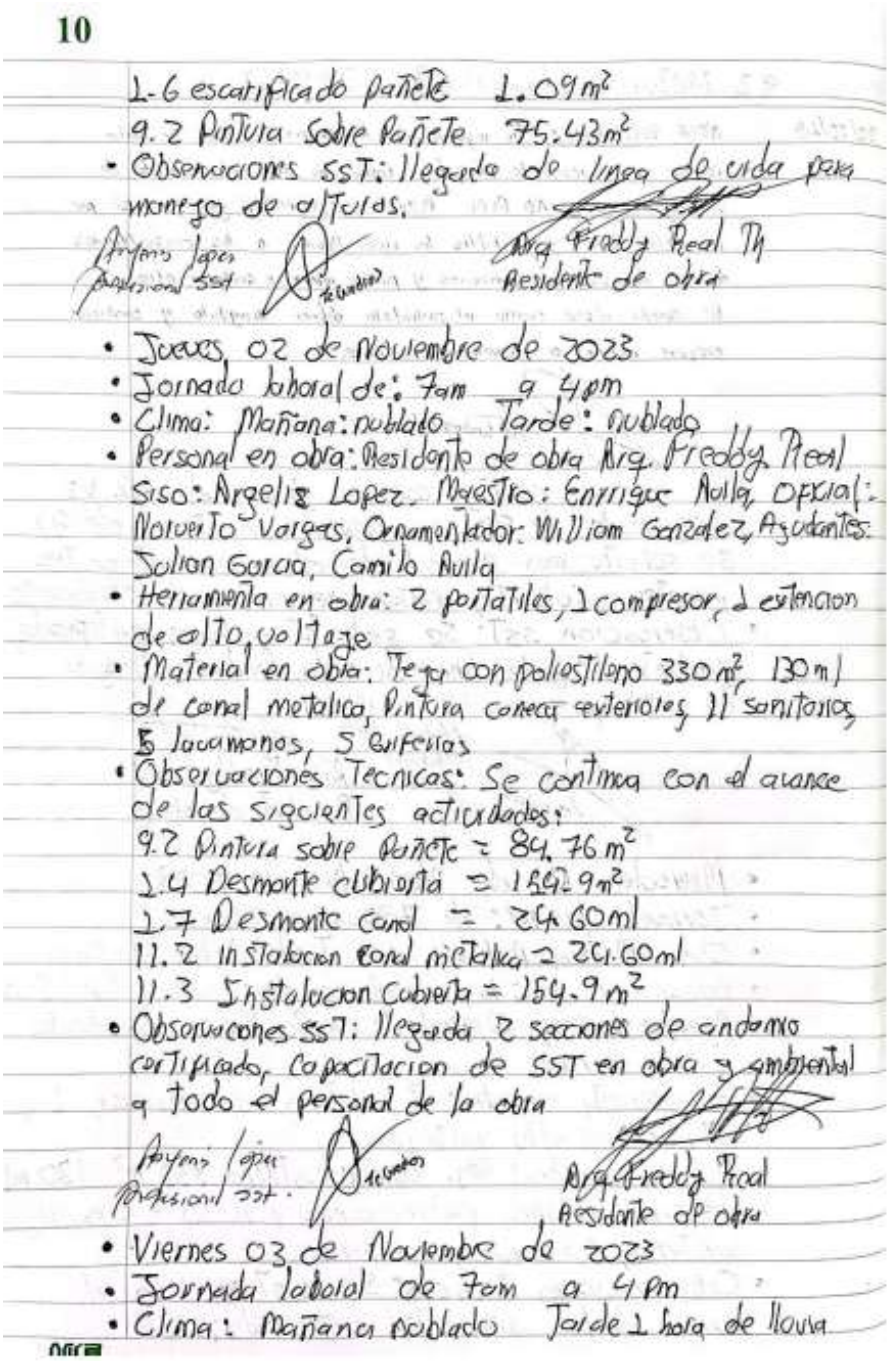

10


1.6 escarificado pañete 1.09 m²
9.2 Pintura Sobre Pañete 75.43 m²
- Observaciones SST: Llegada de linea de vida para manejo de alturas.

Argenis Lopez Profesional SST — Arq Freddy Real TH Residente de obra

- Jueves 02 de Noviembre de 2023
- Jornada laboral de: 7am a 4pm
- Clima: Mañana: nublado Tarde: nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq. Freddy Real Siso: Argelis Lopez. Maestro: Enrrique Avila, Oficial: Roberto Vargas, Ornamentador: William Gonzalez, Ayudantes: Julian Garcia, Camilo Avila
- Herramienta en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Material en obra: Teja con poliestileno 330 m², 130 ml de canal metalica, Pintura conecta exteriores y sanitarios, 5 lavamanos, 5 griferias
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:
9.2 Pintura sobre Pañete = 84.76 m²
1.4 Desmonte cubierta = 154.9 m²
1.7 Desmonte canal = 24.60 ml
11.2 Instalacion canal metalica = 24.60 ml
11.3 Instalacion Cubierta = 154.9 m²
- Observaciones SST: Llegada 2 secciones de andamio certificado, Capacitacion de SST en obra y ambiental a todo el personal de la obra

Argenis Lopez Profesional SST. — Arq Freddy Real Residente de obra

- Viernes 03 de Noviembre de 2023
- Jornada laboral de 7am a 4pm
- Clima: Mañana: nublado Tarde 1 hora de lluvia

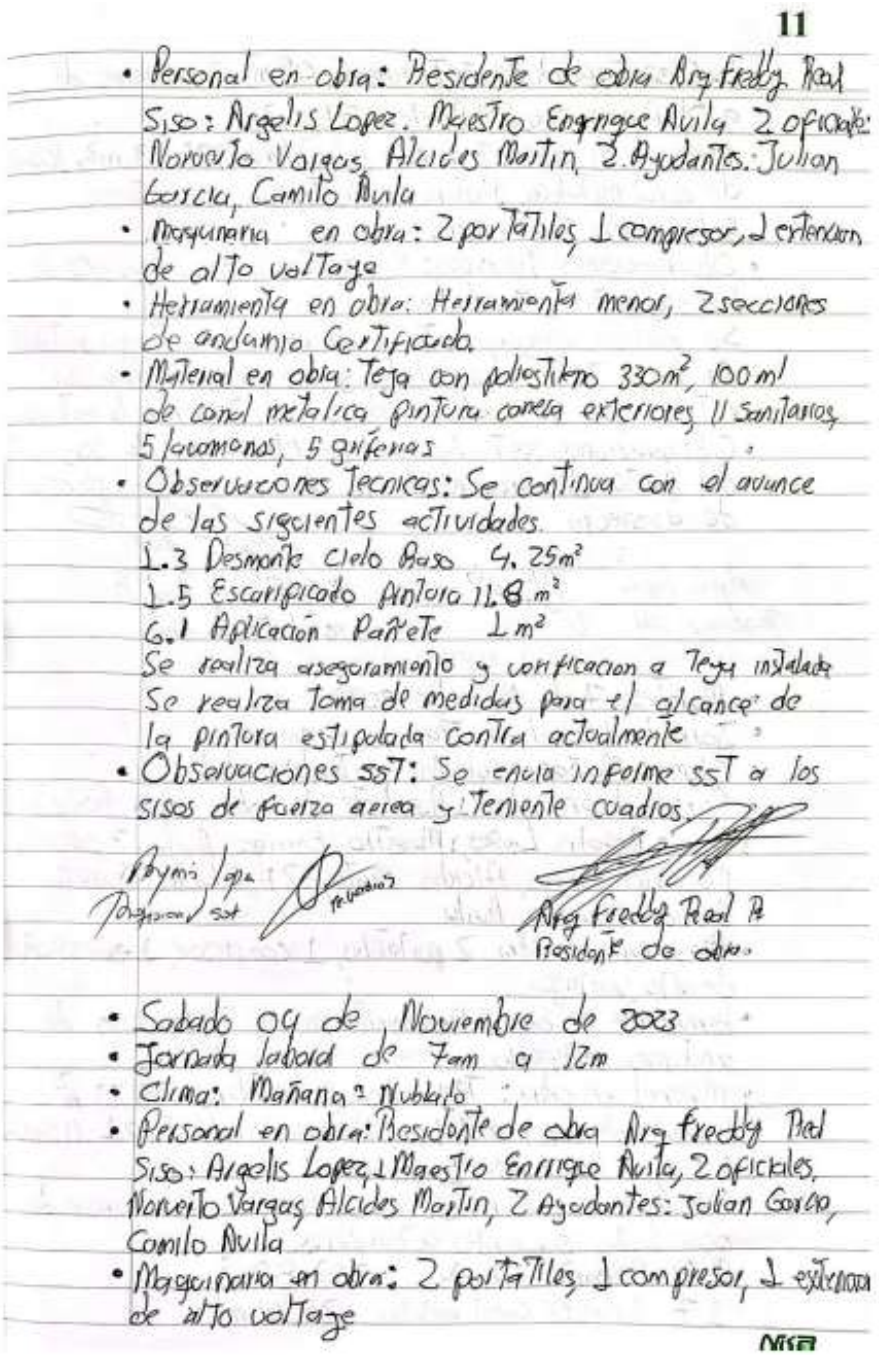


11

- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso: Argelis Lopez. Maestro Enrrique Avila 2 oficiales: Norverto Vargas, Alcides Martin, 2 Ayudantes: Julian Garcia, Camilo Avila
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 esterilizador de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio Certificado.
- Material en obra: Teja con poliestireno 330m², 100 ml de canal metalica pintura correa exteriores, 11 Sanitarios, 5 lavamanos, 5 griferias
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades.
  1.3 Desmonte cielo Raso 4.25m²
  1.5 Escarificado Pintura 11.8 m²
  6.1 Aplicación Pañete 1 m²
  Se realiza asegoramiento y confiacion a Teja instalada
  Se realiza Toma de medidas para el alcance de la pintura estipulada contra actualmente
- Observaciones SST: Se envia informe SST a los sisos de fuerza aerea y Teniente cuadros.

Arq Freddy Real R
Residente de obra.

- Sabado 04 de Noviembre de 2023
- Jornada laboral de 7am a 12m
- Clima: Mañana = Nublado
- Personal en obra: Residente de obra Arq Freddy Real Siso: Argelis Lopez, 1 Maestro Enrrique Avila, 2 oficiales, Norverto Vargas, Alcides Martin, 2 Ayudantes: Julian Garcia, Camilo Avila
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 esterilizador de alto voltaje

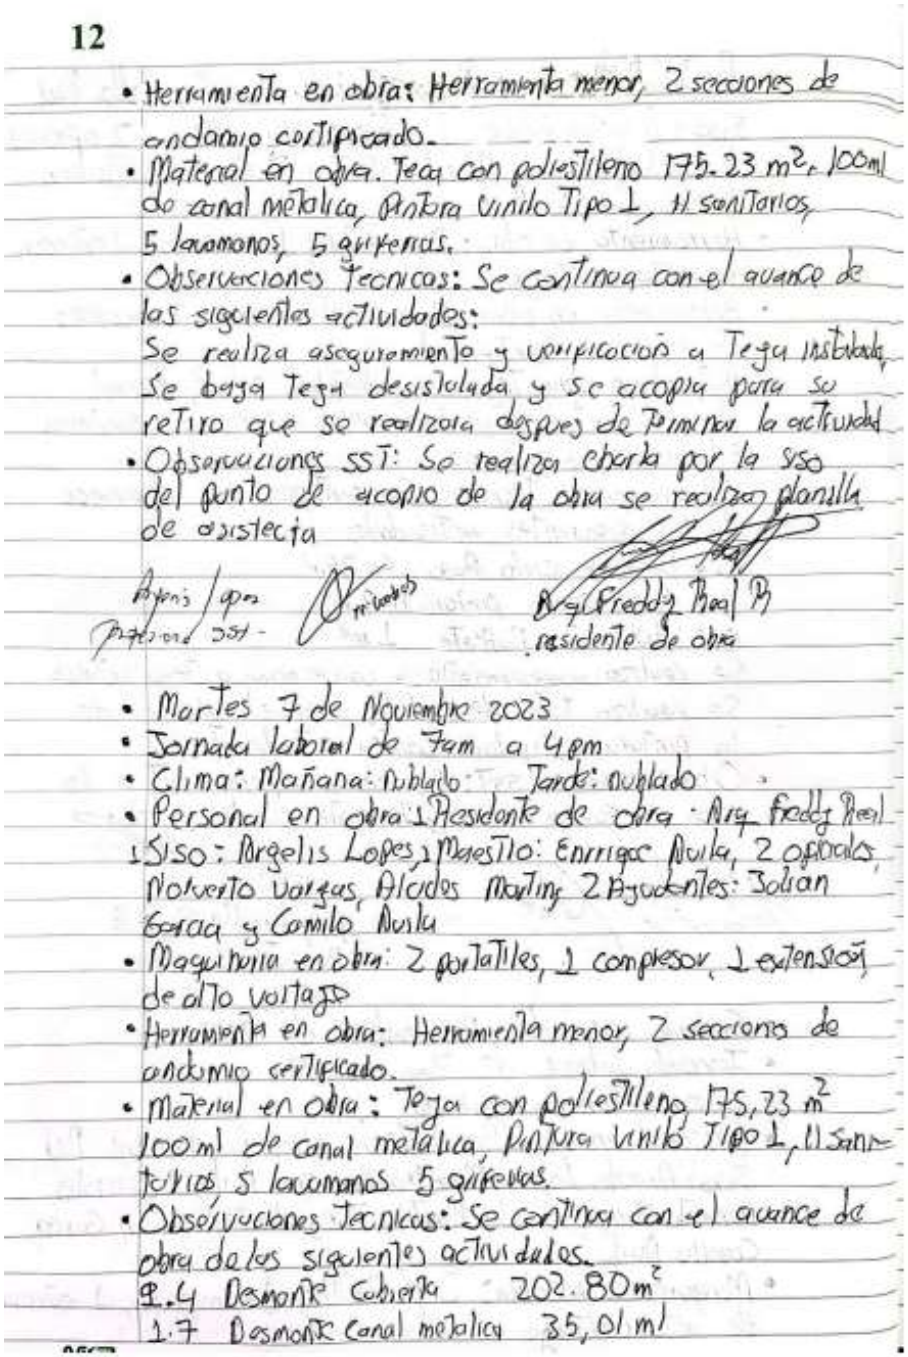


12

- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado.
- Material en obra. Teja con poliestileno 175.23 m^2, 100ml de canal metálica, Pintura Vinilo Tipo 1, 11 sanitarios, 5 lavamanos, 5 griferías.
- Observaciones Técnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:
  Se realiza aseguramiento y compicación a Teja instalada, Se baja Teja desistalada y se acopia para su retiro que se realizara despues de terminar la actividad
- Observaciones SST: Se realiza charla por la SSO del punto de acopio de la obra se realiza planilla de asistecia

Argelis Lopes
SISO

Arq. Freddy Real B
residente de obra

- Martes 7 de Noviembre 2023
- Jornada laboral de 7am a 4pm
- Clima: Mañana: Nublado Tarde: nublado
- Personal en obra: 1 Residente de obra · Arq. Freddy Real 1 SISO: Argelis Lopes, 1 Maestro: Enrrique Avila, 2 oficiales, Roberto Vargas, Alcides Martin, 2 Ayudantes: Jolian Garcia y Camilo Avila
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extensión de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado.
- Material en obra: Teja con poliestileno 175,23 m^2 100 ml de canal metálica, Pintura Vinilo Tipo 1, 11 Sanitarios, 5 lavamanos 5 griferias.
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de obra de las siguientes actividades.
  9.4 Desmonte Cubierta 202.80 m^2
  1.7 Desmonte Canal metalica 35,01 ml

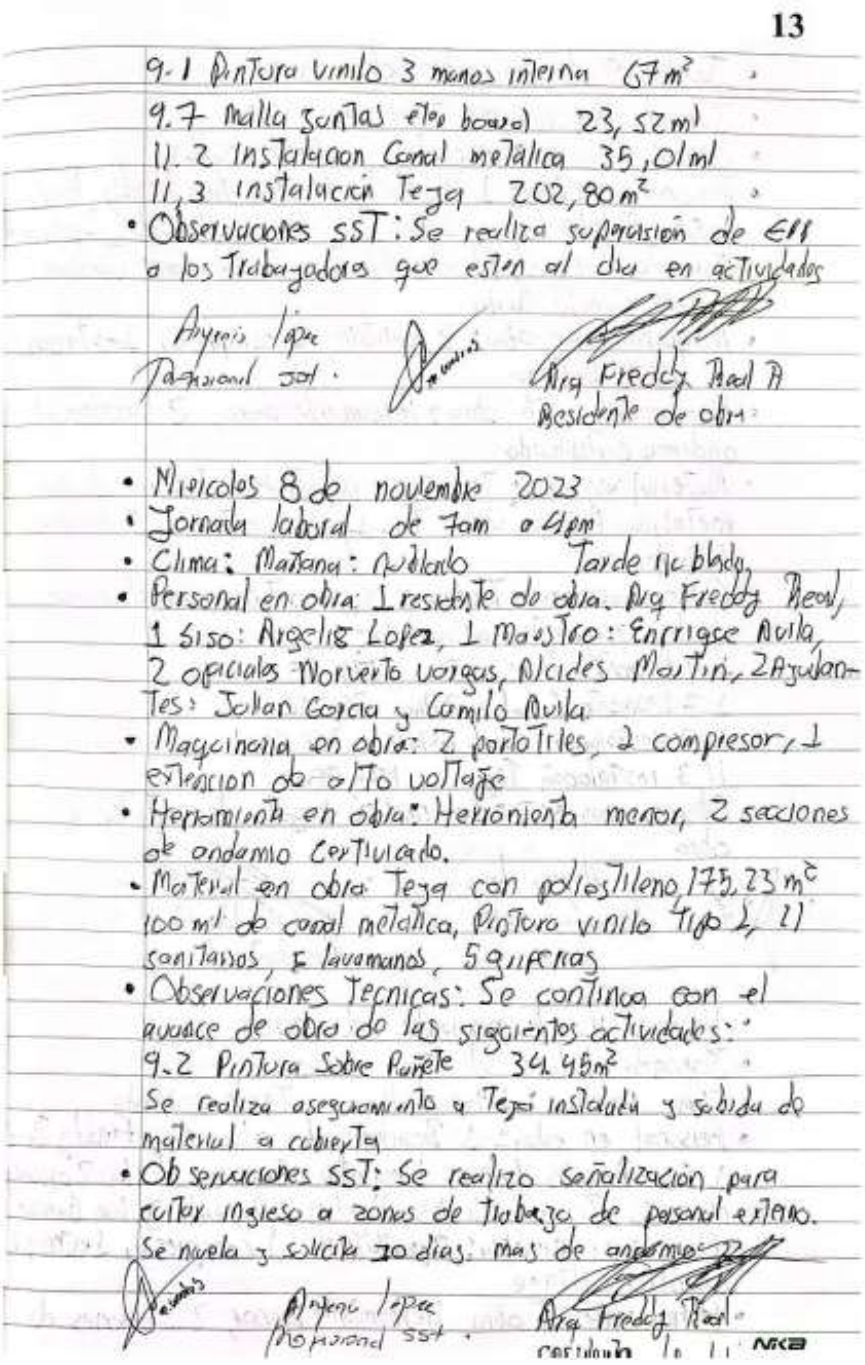

13

9.1 Pintura vinilo 3 manos interna 67 m²
9.7 Malla sanitas (los bordes) 23,52 ml
11.2 Instalacion Canal metálica 35,01 ml
11,3 instalación Teja 202,80 m²

- Observaciones SST: Se realiza suspensión de EPP a los Trabajadores que esten al dia en actividades

Angeis Lopez
Profesional SST.

Arq Freddy Real A
Residente de obra

- Miercoles 8 de noviembre 2023
- Jornada laboral de 7am a 4pm
- Clima: Mañana: Nublado Tarde nublado
- Personal en obra: 1 residente de obra. Arq Freddy Real, 1 Siso: Angelie Lopez, 1 Maestro: Enrrique Avila, 2 oficiales Norberto Vargas, Alcides Martin, 2 Ayudantes: Jolan Garcia y Camilo Avila
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 2 compresor, 1 extencion de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio Certificado.
- Material en obra Teja con polisstileno 175,23 m² 100 ml de canal metalica, Pintura vinilo Tipo 1, 11 sanitarios, 5 lavamanos, 5 duchas
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de obra de las siguientes actividades:
9.2 Pintura Sobre Muñete 34,45 m²
Se realiza aseguramiento a Teja instalada y subida de material a cubierta
- Observaciones SST: Se realizo señalización para evitar ingreso a zonas de Trabajo de personal externo. Se nivela y solicita 30 dias mas de andamio

Angeis Lopez
Profesional SST.

Arq Freddy Real
residente de obra


14

- Jueves 9 de noviembre de 2023
- Jornada laboral de 7am a 4pm
- Clima: Mañana: nublado Tarde nublado
- Personal en obra: 1 Residente de obra Arq Freddy Real, 1 Sso Argelis Lopez, 1 maestro: Enrrique Avila, 2 oficiales Norverto Vargas, Alcides Martin, 2 Ayudante Julian Garcia, Camilo Avila.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extension de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado
- Material en obra: Teja con poliestireno, 100 mt de canal metalica, Pintura vinilo Tipo 1, 8 sanitarios, 5 lavamanos, 1 grifos
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades:
  1.4 Desmonte de cobertura 175,88 m²
  1.7 Desmonte Canal metalica 34,60 ml
  11.2 Instalacion Canal metalica 34,60 ml
  11.3 Instalación Teja 175,88 m²
- Observaciones SST: Se realiza llegada de extintor a obra

Argelis Lopez
Profesional SST

Arq Freddy Real
Residente de obra

- Viernes 10 de noviembre de 2023
- Jornada laboral de 7am a 4pm
- Clima mañana: 1 hora de lluvia Tarde nublado
- Personal en obra: 1 Residente de obra Arq Freddy Real 1 Sso Argelis Lopez, 1 maestro: Enrrique Avila, 2 oficiales Norverto Vargas, Alcides Martin 1 Ayudante Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extension de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de

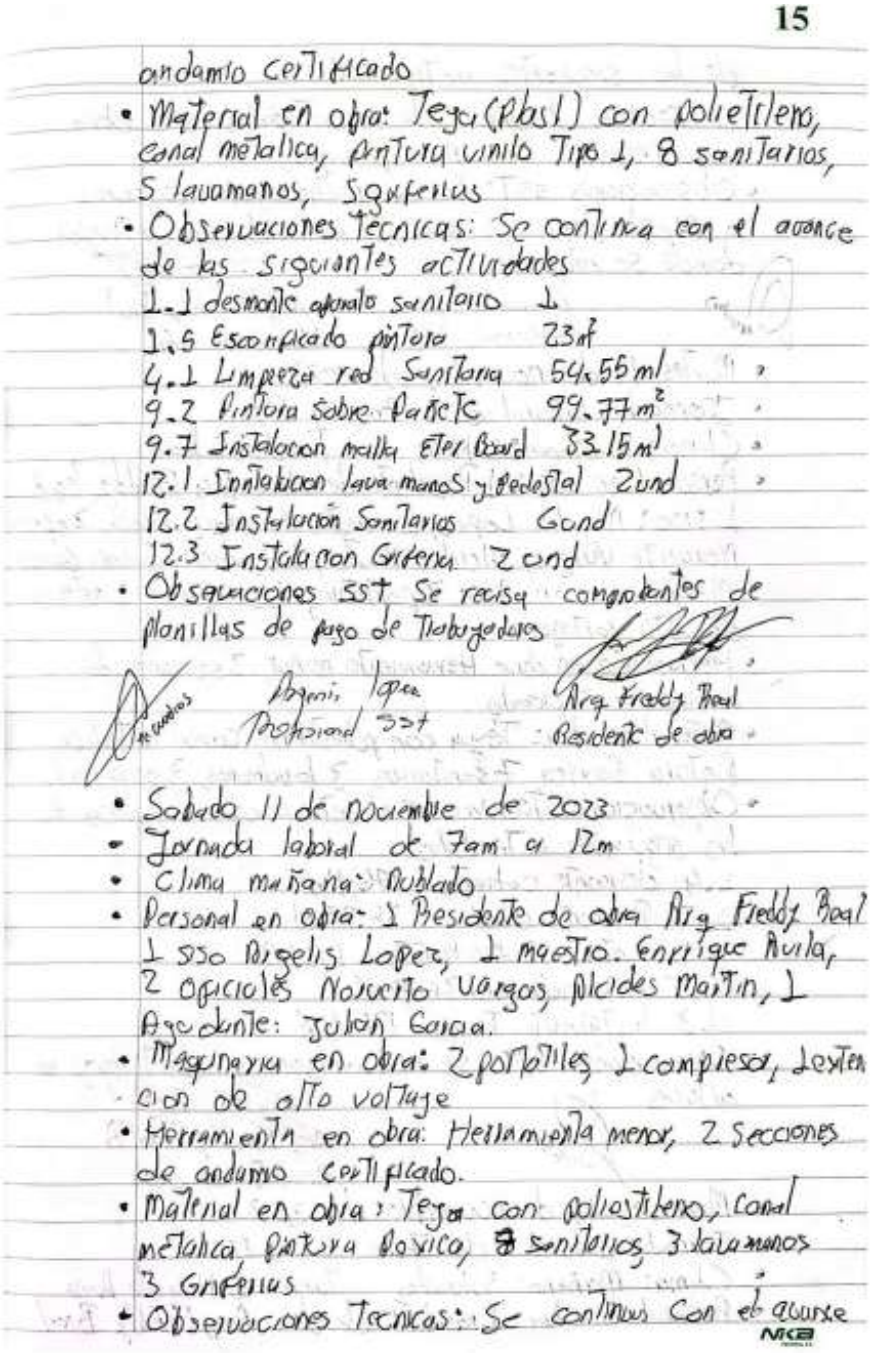


15

andamio certificado
- Material en obra: Teja (Pbsl) con poliestileno, canal metalica, pintura vinilo Tipo 1, 8 sanitarios, 5 lavamanos, 5 griferias
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades
1.1 desmonte aparato sanitario 1
1.5 Escarificado pintura 23m²
4.1 Limpieza red Sanitaria 54.55 ml
9.2 Pintura sobre Pañete 99.77 m²
9.7 Instalacion malla Eter Board 33.15 m²
12.1 Instalacion lava manos y pedestal 2und
12.2 Instalación Sanitarios 6und
12.3 Instalacion Griferia 2und
- Observaciones SST Se revisa comprobantes de planillas de pago de Trabajadores

Angeni Lopez
Profesional SST

Arq. Freddy Real
Residente de obra

- Sabado 11 de noviembre de 2023
- Jornada laboral de 7am a 12m
- Clima mañana: Nublado
- Personal en obra: 1 Residente de obra Arq Freddy Real 1 sso Angelis Lopez, 1 maestro. Enrrique Avila, 2 Oficiales Norberto Vargas, Alcides Martin, 1 Ayudante: Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extension de alto voltaje
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 Secciones de andamio certificado.
- Material en obra: Teja con poliestileno, Canal metalica, pintura acrilica, 8 sanitarios, 3 lavamanos 3 Griferias
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance

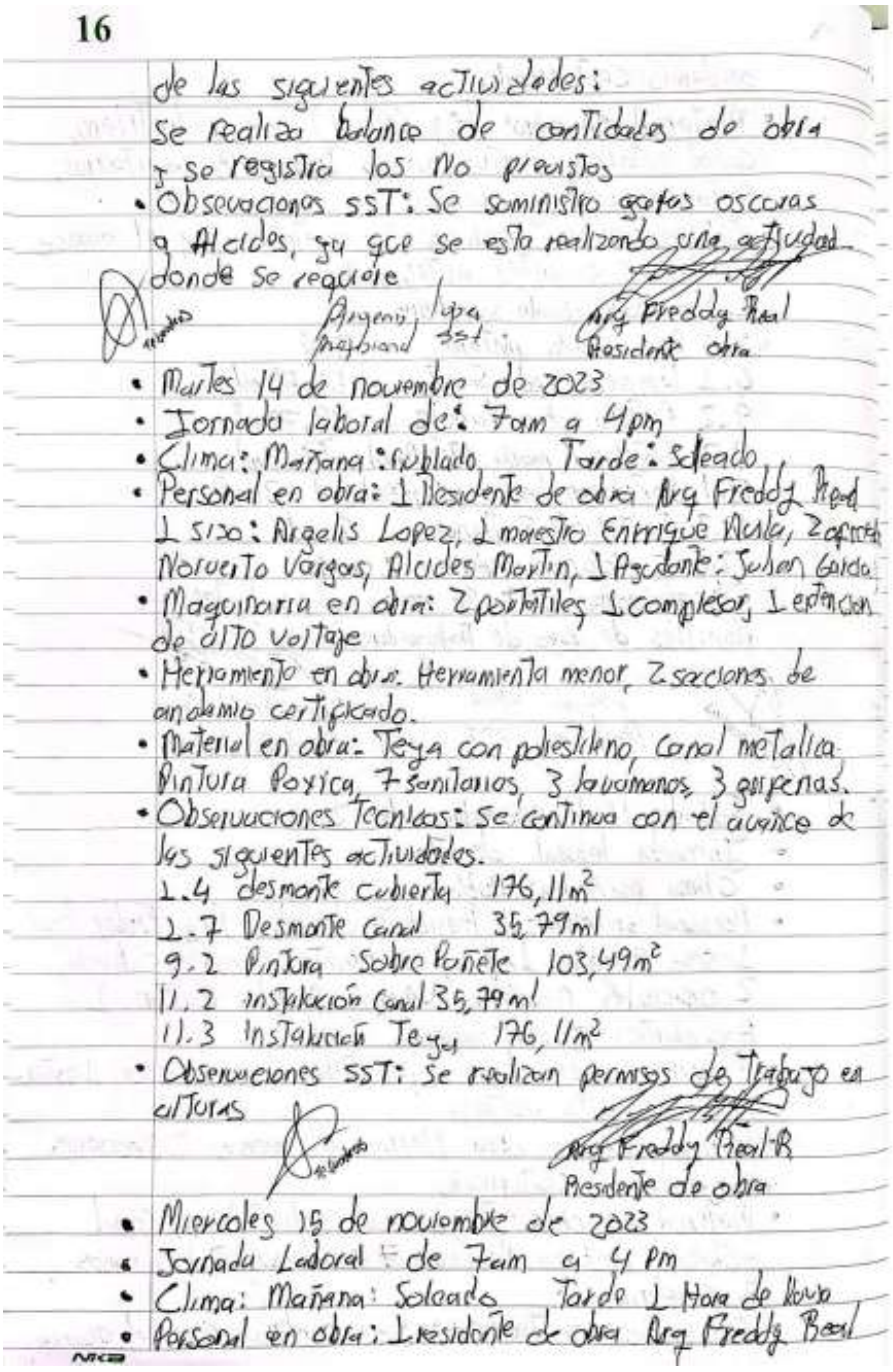

16


de las siguientes actividades:
Se realiza balance de cantidades de obra y se registra los no previstos
- Observaciones SST: Se suministro gafas oscuras a Alcides, ya que se esta realizando una actividad donde se requiere

Argenis Lopez Inspector SST
Arq Freddy Real Presidente obra

- Martes 14 de noviembre de 2023
- Jornada laboral de: 7am a 4pm
- Clima: Mañana: Nublado Tarde: Soleado
- Personal en obra: 1 Residente de obra Arq Freddy Real 1 sizo: Argelis Lopez, 1 maestro Enrrique Ruiz, 2 ayudantes Norverto Vargas, Alcides Martin, 1 Ayudante: Julian Garcia
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor, 1 extension de alto voltaje
- Herramienta en obra. Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado.
- Material en obra: Teja con poliestileno, Canal metalica Pintura Poxica, 7 sanitarios, 3 lavamanos, 3 duchas.
- Observaciones Tecnicas: Se continua con el avance de las siguientes actividades.
  1.4 desmonte cubierta 176,11m²
  2.7 Desmonte Canal 35,79ml
  9.2 Pintura Sobre Cañete 103,49m²
  11.2 instalacion Canal 35,79ml
  11.3 Instalacion Teja 176,11m²
- Observaciones SST: se realizan permisos de Trabajo en alturas

Arq Freddy Real R
Presidente de obra

- Miercoles 15 de noviembre de 2023
- Jornada Laboral de 7am a 4 Pm
- Clima: Mañana: Soleado Tarde 1 Hora de lluvia
- Personal en obra: Presidente de obra Arq Freddy Real

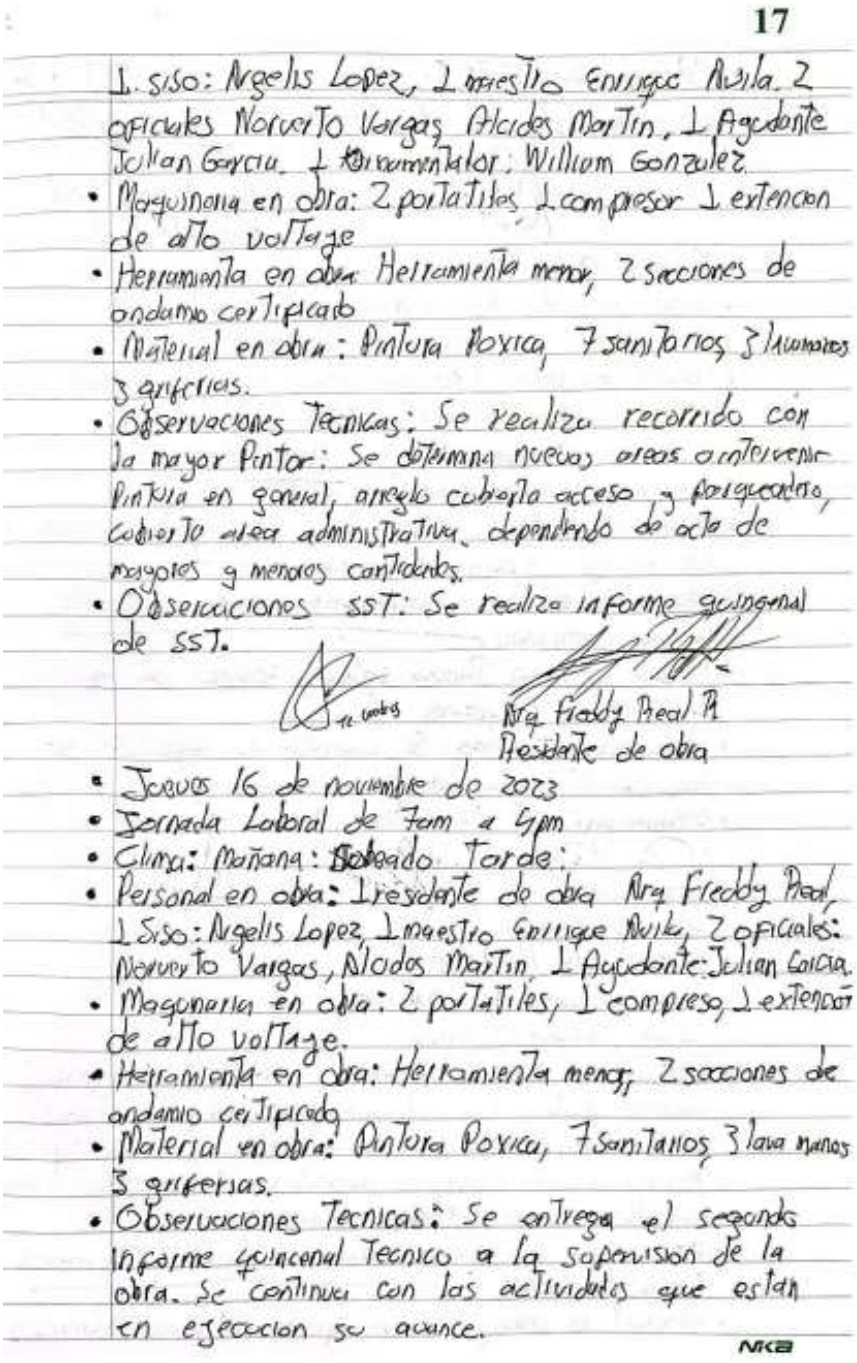


17

1. SISO: Angelis Lopez, 1 maestro Enrique Avila. 2 oficiales Norberto Vargas, Alcides Martin, 1 Ayudante Julian Garcia. 1 Herramentalor: William Gonzalez.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compresor 1 extencion de alto voltaje
- Herramienta en obra Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado
- Material en obra: Pintura Poxica, 7 sanitarios, 3 lavamanos 3 griferias.
- Observaciones Tecnicas: Se realiza recorrido con la mayor Pintor: Se determina nuevas areas a intervenir Pintura en general, arreglo cubierta acceso y parqueadero, cubierta area administrativa, dependiendo de acta de mayores y menores cantidades.
- Observaciones SST: Se realiza informe quincenal de SST.

Ing. Freddy Real R
Residente de obra

- Jueves 16 de noviembre de 2023
- Jornada Laboral de 7am a 5pm
- Clima: Mañana: Soleado Tarde:
- Personal en obra: 1 residente de obra Ing Freddy Real, 1 Siso: Angelis Lopez, 1 maestro Enrique Avila, 2 oficiales: Norberto Vargas, Alcides Martin, 1 Ayudante: Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portatiles, 1 compreso, 1 extencion de alto voltaje.
- Herramienta en obra: Herramienta menor, 2 secciones de andamio certificado
- Material en obra: Pintura Poxica, 7 sanitarios, 3 lava manos 3 griferias.
- Observaciones Tecnicas: Se entrega el segundo informe quincenal Tecnico a la supervision de la obra. Se continua con las actividades que estan en ejecucion su avance.

NKB

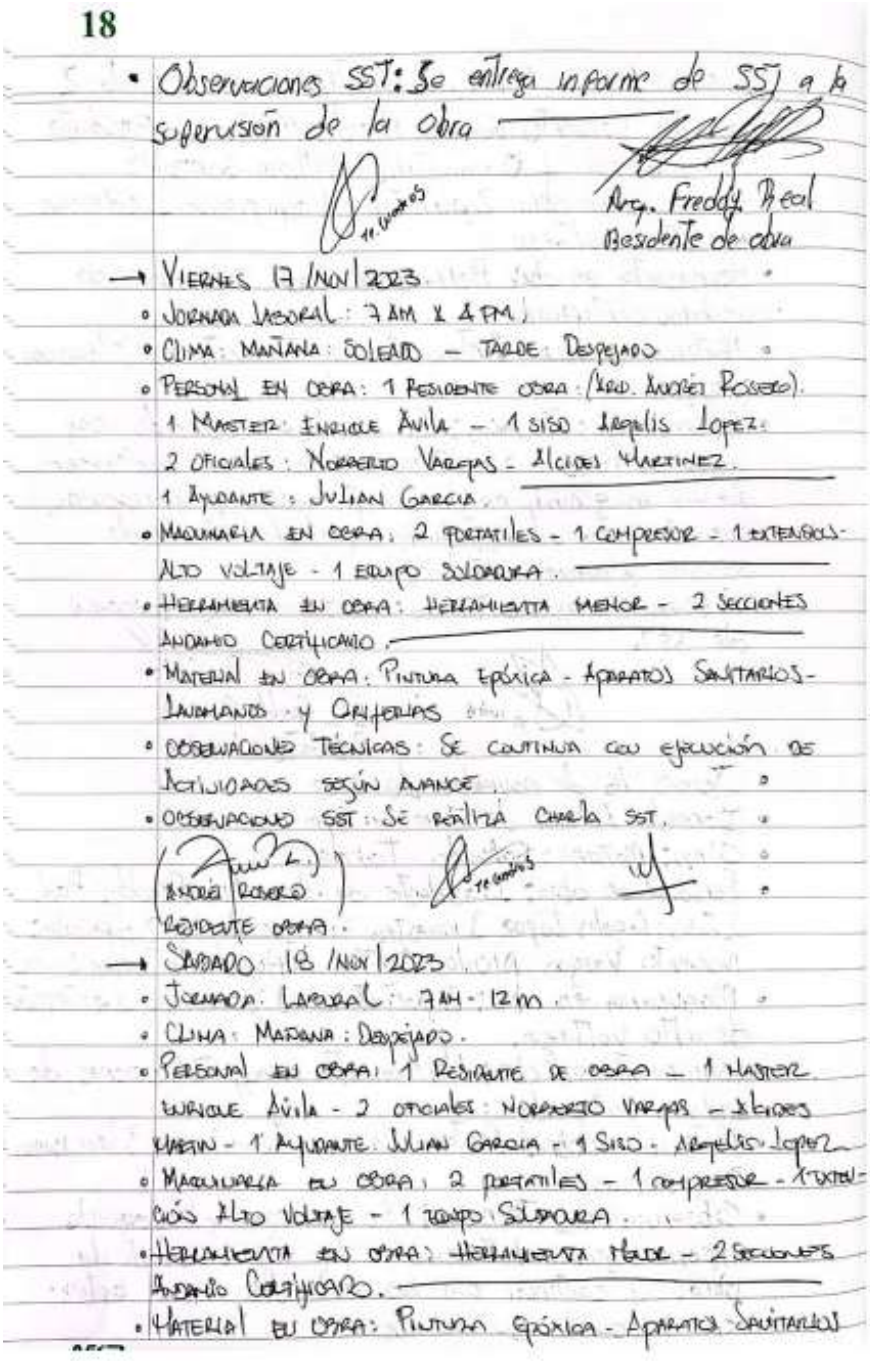

18

- Observaciones SST: Se entrega informe de SST a la supervisión de la obra

Arq. Freddy Real
Residente de obra


→ VIERNES 17/NOV/2023

- JORNADA LABORAL: 7 AM Y 4 PM.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO – TARDE: DESPEJADO
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA (ARQ. ANDRÉS ROSERO). 1 MAESTRO: ENRIQUE ÁVILA – 1 SISO: ARGELIS LOPEZ. 2 OFICIALES: NORBERTO VARGAS – ALCIDES MARTINEZ. 1 AYUDANTE: JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES – 1 COMPRESOR – 1 EXTENSIÓN ALTO VOLTAJE – 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTA EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR – 2 SECCIONES ANDAMIO CERTIFICADO.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPÓXICA – APARATOS SANITARIOS – LAVAMANOS Y ORINERAS
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: SE CONTINUA CON EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN AVANCE.
- OBSERVACIONES SST: SE REALIZA CHARLA SST.

ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE OBRA.

→ SÁBADO 18/NOV/2023

- JORNADA LABORAL: 7AM - 12M.
- CLIMA: MAÑANA: DESPEJADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA – 1 MAESTRO ENRIQUE ÁVILA – 2 OFICIALES: NORBERTO VARGAS – ALCIDES MARTIN – 1 AYUDANTE: JULIAN GARCIA – 1 SISO: ARGELIS LOPEZ
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES – 1 COMPRESOR – 1 EXTENSIÓN ALTO VOLTAJE – 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTA EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR – 2 SECCIONES ANDAMIO CERTIFICADO.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPÓXICA – APARATOS SANITARIOS

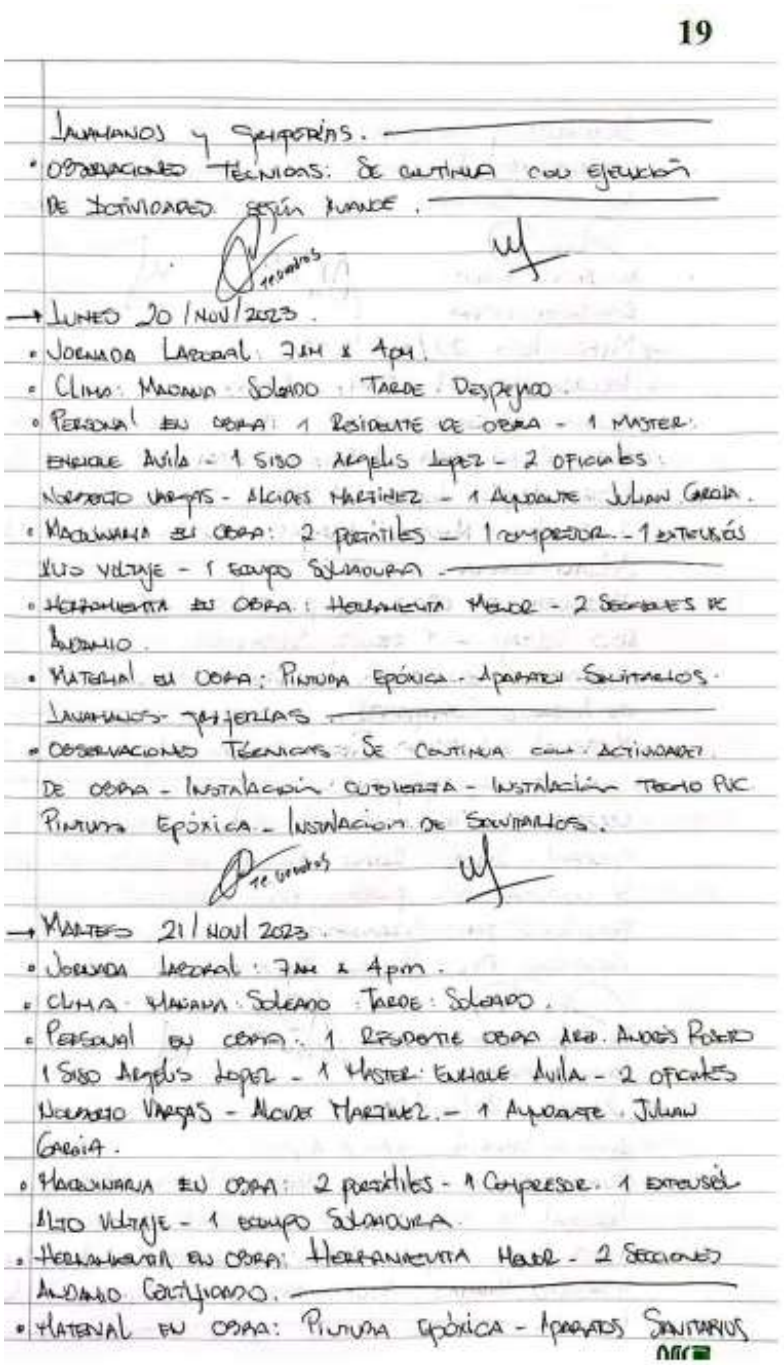

19

Lavamanos y Sanitarios.
- Observaciones Técnicas: Se continua con ejecución de actividades según avance.

→ Lunes 20/Nov/2023.
- Jornada Laboral: 7AM a 4pm.
- Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Despejado.
- Personal en obra: 1 Residente de obra - 1 Maestro: Enrique Avila - 1 Sisa: Angelis Lopez - 2 Oficiales: Norberto Vargas - Alcides Martinez - 1 Ayudante: Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portátiles - 1 compresor - 1 extensión alto voltaje - 1 equipo soldadura.
- Herramienta en obra: Herramienta Menor - 2 Secciones de Andamio.
- Material en obra: Pintura Epóxica - Aparatos Sanitarios - Lavamanos - Tejellas.
- Observaciones Técnicas: Se continua con actividades de obra - Instalación cubierta - Instalación Techo PVC Pintura Epóxica - Instalación de Sanitarios.

→ Martes 21/Nov/2023.
- Jornada Laboral: 7AM a 4pm.
- Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
- Personal en obra: 1 Residente obra Arq. Andres Pulido 1 Sisa Angelis Lopez - 1 Maestro: Enrique Avila - 2 Oficiales Norberto Vargas - Alcides Martinez - 1 Ayudante: Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portátiles - 1 Compresor. 1 extensión alto voltaje - 1 equipo soldadura.
- Herramienta en obra: Herramienta Menor - 2 Secciones Andamio Cerificado.
- Material en obra: Pintura Epóxica - Aparatos Sanitarios



20


LAMINADOS Y CERRERIAS.
- OBSERVACIONES TECNICAS. CONTINUAN CON INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS - LIJADO Y PINTADO EN MUROS.

ARQ. ANDRES ROJERO
RESIDENTE OBRA.

→ MIERCOLES 22/NOV/2023.
- JORNADA LABORAL: 7AM A 4pm.
- CLIMA - MAÑANA: SOLEADO - TARDE: LLUVIOSAS - NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA: ARQ. ANDRES ROJERO. 1 SSO: ARGELIS LOPEZ - 1 MASTER ENRIQUE AVILA - 2 OFICIALES: NORBERTO VARGAS - ALCIDES MARTIN - 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES - 1 COMPRESOR - 1 EXTENSION 220 VOLTAJE - 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTA EN OBRA - HERRAMIENTA MENOR - 2 SOGUETAS DE ANDAMIO CERTIFICADO.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPOXICA - 5 APARATOS SANITARIOS 3 LAMINADOS Y CERRERIAS.
- OBSERVACIONES TECNICAS: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ASEO GENERAL - LIJADO - RESANE - PINTADA EN VINILO EN PARTES, SE CONTINUA CON PINTURA MALLA PERIMETRAL - CAMBIO DE PERFILERIA PARA CERRAMIENTO - SUMINISTRO DE 54ml DE MEDIA CAÑA PVC. - PINTURA EPOXICA EN CONSULTORIOS.

ARQ. ANDRES ROJERO
RESIDENTE OBRA.

→ JUEVES 23/NOV/2023.
- JORNADA LABORAL: 7AM A 4 pm.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO - TARDE: LLUVIOSA - SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA ARQ. ANDRES ROJERO: 1 SST ARGELIS LOPEZ - 1 MASTER: ENRIQUE AVILA - 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS - ALCIDES MARTIN - 1 AYUDANTE: JULIAN GARCIA.

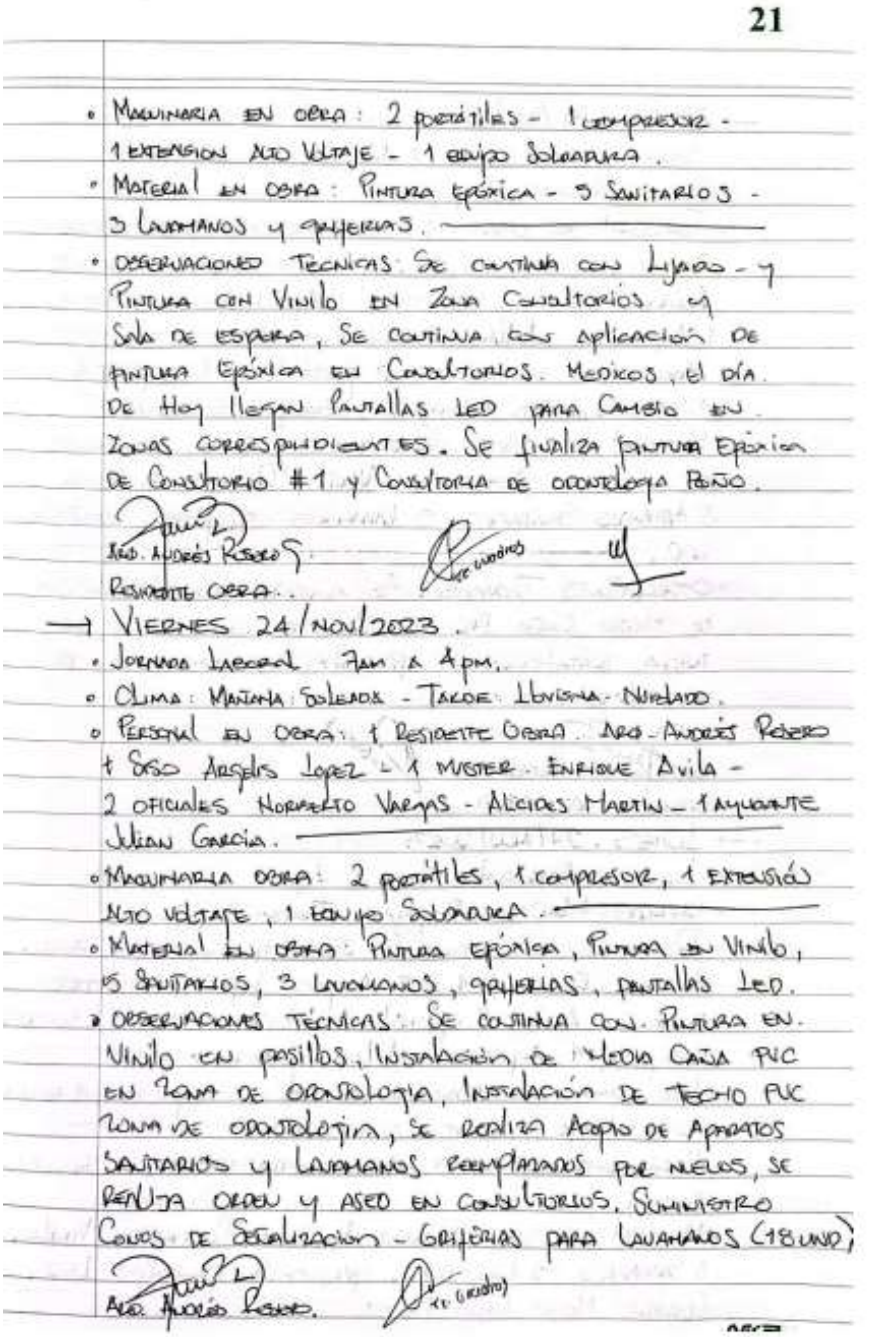

21


- MAQUINARIA EN OBRA: 2 portátiles - 1 compresor - 1 extensión alto voltaje - 1 equipo soldadura.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPÓXICA - 5 SANITARIOS - 5 LAVAMANOS y griferías.
- OBSERVACIONES TECNICAS: SE CONTINUA CON LIJADO - Y PINTURA CON VINILO EN ZONA CONSULTORIOS y SALA DE ESPERA, SE CONTINUA CON APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN CONSULTORIOS MEDICOS, EL DÍA DE HOY LLEGAN PANTALLAS LED PARA CAMBIO EN ZONAS CORRESPONDIENTES. SE FINALIZA PINTURA EPÓXICA DE CONSULTORIO #1 y CONSULTORIA DE ODONTOLOGIA PEÑO.

ING. ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE OBRA.

→ VIERNES 24/NOV/2023.

- JORNADA LABORAL 7am A 4pm.
- CLIMA: MAÑANA SOLEADO - TARDE LLUVIOSA - NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA. ING. ANDRÉS ROSERO 1 SSO ARGELIS LOPEZ - 1 MAESTR. ENRIQUE AVILA - 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS - ALCIDES MARTIN - 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA OBRA: 2 portátiles, 1 compresor, 1 extensión alto voltaje, 1 equipo soldadura.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPÓXICA, PINTURA EN VINILO, 5 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, griferías, PANTALLAS LED.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: SE CONTINUA CON PINTURA EN VINILO EN PASILLOS, INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC EN ZONA DE ODONTOLOGIA, INSTALACIÓN DE TECHO PVC ZONA DE ODONTOLOGIA, SE REALIZA ACOPIO DE APARATOS SANITARIOS y LAVAMANOS REEMPLAZADOS POR NUEVOS, SE REALIZA ORDEN y ASEO EN CONSULTORIOS. SUMINISTRO CONOS DE SEÑALIZACION - GRIFERIAS PARA LAVAMANOS (18 UND)

ING. ANDRÉS ROSERO.

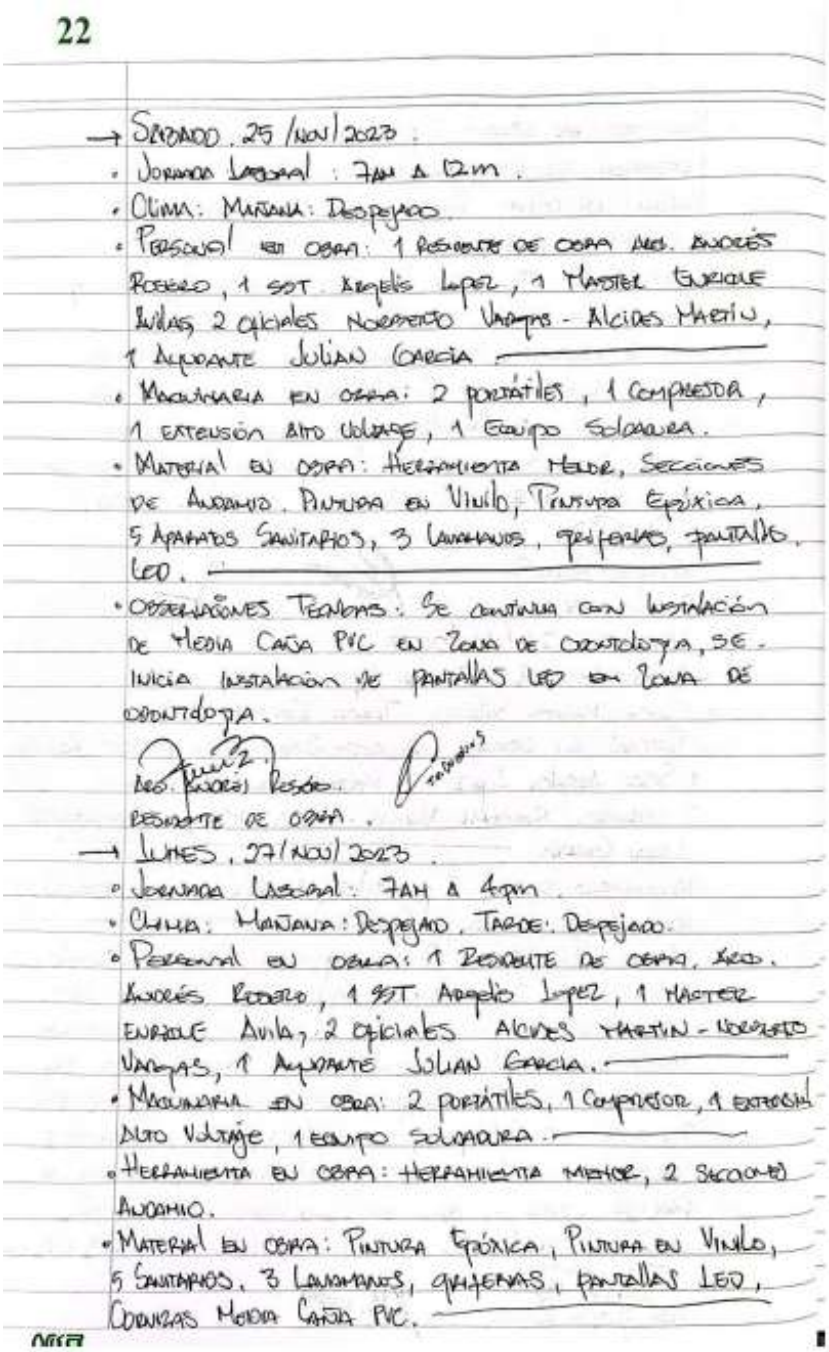


22

→ SÁBADO, 25/NOV/2023.
- JORNADA LABORAL: 7AM A 12M.
- CLIMA: MAÑANA: DESPEJADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ANGELIS LOPEZ, 1 MAESTRO ENRIQUE ÁVILA, 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS - ALCIDES MARTÍN, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 EXTENSIÓN ALTO VOLTAJE, 1 EQUIPO SOLDADURA.
- MATERIAL EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, SECCIONES DE ANDAMIO, PINTURA EN VINILO, PINTURA EPÓXICA, 5 APARATOS SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, GRIFERÍAS, PANTALLAS LED.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC EN ZONA DE ODONTOLOGÍA, SE INICIA INSTALACIÓN DE PANTALLAS LED EN ZONA DE ODONTOLOGÍA.

ARQ. ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE DE OBRA.

→ LUNES, 27/NOV/2023.
- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: DESPEJADO, TARDE: DESPEJADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ANGELIS LOPEZ, 1 MAESTRO ENRIQUE ÁVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN - NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 EXTENSIÓN ALTO VOLTAJE, 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTA EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, 2 SECCIONES ANDAMIO.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPÓXICA, PINTURA EN VINILO, 5 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, GRIFERÍAS, PANTALLAS LED, CODIGAS MEDIA CAÑA PVC.

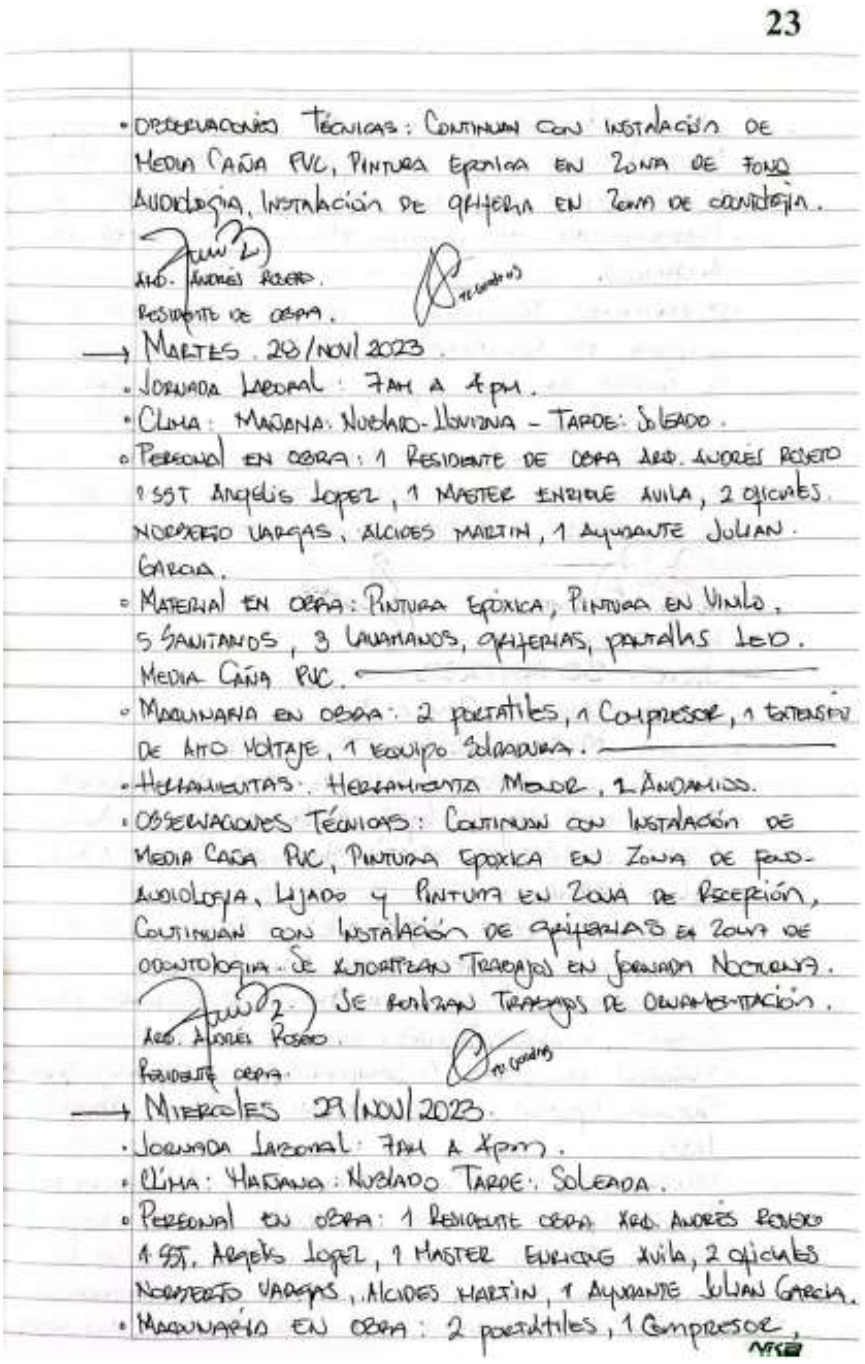

23

- OBSERVACIONES TÉCNICAS: CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC, PINTURA EPOXICA EN ZONA DE FONO AUDIOLOGIA, INSTALACIÓN DE OFICINAS EN ZONA DE CONTABILIDAD.

ARQ. ANDRES ROJERO.
RESIDENTE DE OBRA.


→ MARTES 28/NOV/2023.

- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: NUBLADO - LLUVIOSA - TARDE: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA ARQ. ANDRES ROJERO 1 SST ANGELIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MATERIAL EN OBRA: PINTURA EPOXICA, PINTURA EN VINILO, 5 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, OFICINAS, PANTALLAS LED. MEDIA CAÑA PVC.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES, 1 COMPRESOR, 1 EXTENSION DE ALTO VOLTAJE, 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR, 2 ANDAMIOS.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC, PINTURA EPOXICA EN ZONA DE FONO-AUDIOLOGIA, LIJADO Y PINTURA EN ZONA DE RECEPCIÓN, CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE OFICINAS EN ZONA DE ODONTOLOGIA. SE AUTORIZAN TRABAJOS EN JORNADA NOCTURNA. SE REALIZAN TRABAJOS DE ORNAMENTACIÓN.

ARQ. ANDRES ROJERO.
RESIDENTE OBRA.

→ MIERCOLES 29/NOV/2023.

- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA ARQ. ANDRES ROJERO 1 SST, ANGELIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES, 1 COMPRESOR,

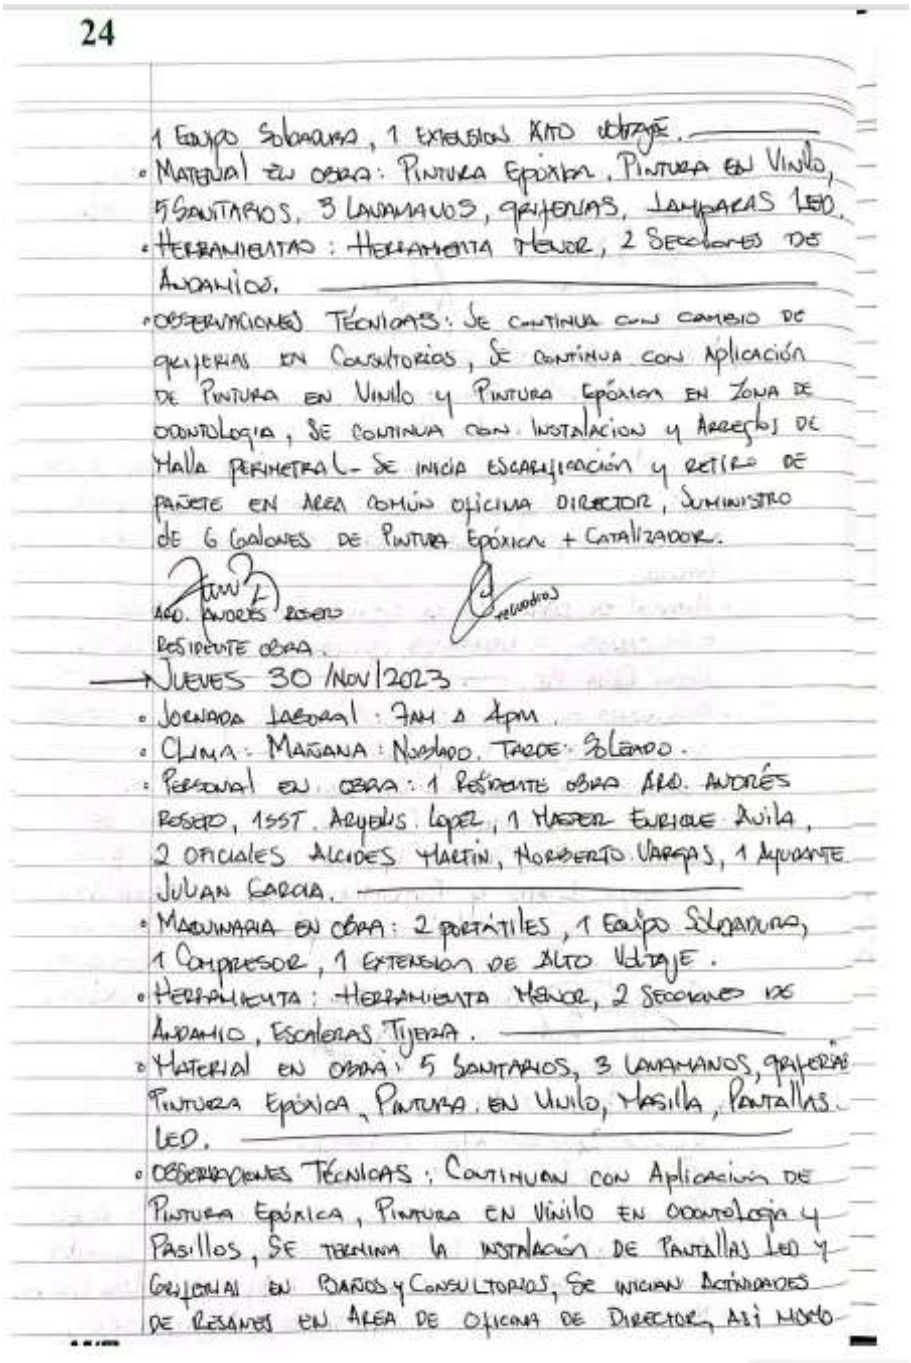

24


1 Equipo Soldadura, 1 Extensión Alto voltaje.

- Material en obra: Pintura Epóxica, Pintura en Vinilo, 5 Sanitarios, 3 Lavamanos, griferías, Lámparas LED.
- Herramientas: Herramienta Menor, 2 Secciones de Andamios.
- Observaciones Técnicas: Se continua con cambio de griferías en Consultorios, se continua con aplicación de Pintura en Vinilo y Pintura Epóxica en Zona de odontología, se continua con instalación y Arreglos de Malla perimetral. Se inicia escarificación y retiro de pañete en área común oficina Director, Suministro de 6 Galones de Pintura Epóxica + Catalizador.

Arq. Andrés Rosero
Residente Obra.

→ Jueves 30/Nov/2023

- Jornada Laboral: 7AM a 4pm.
- Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Soleado.
- Personal en obra: 1 Residente Obra Arq. Andrés Rosero, 1 SST. Argelis Lopez, 1 Maestro Enrique Avila, 2 Oficiales Alcides Martin, Norberto Vargas, 1 Ayudante Julian Garcia.
- Maquinaria en obra: 2 portátiles, 1 Equipo Soldadura, 1 Compresor, 1 Extensión de Alto Voltaje.
- Herramienta: Herramienta Menor, 2 Secciones de Andamio, Escaleras Tijera.
- Material en obra: 5 Sanitarios, 3 Lavamanos, griferías Pintura Epóxica, Pintura en Vinilo, Masilla, Pantallas LED.
- Observaciones Técnicas: Continuan con Aplicación de Pintura Epóxica, Pintura en Vinilo en Odontología y Pasillos, se termina la instalación de Pantallas LED y Griferías en Baños y Consultorios, se inician Actividades de Resanes en Area de Oficina de Director, Asi mismo

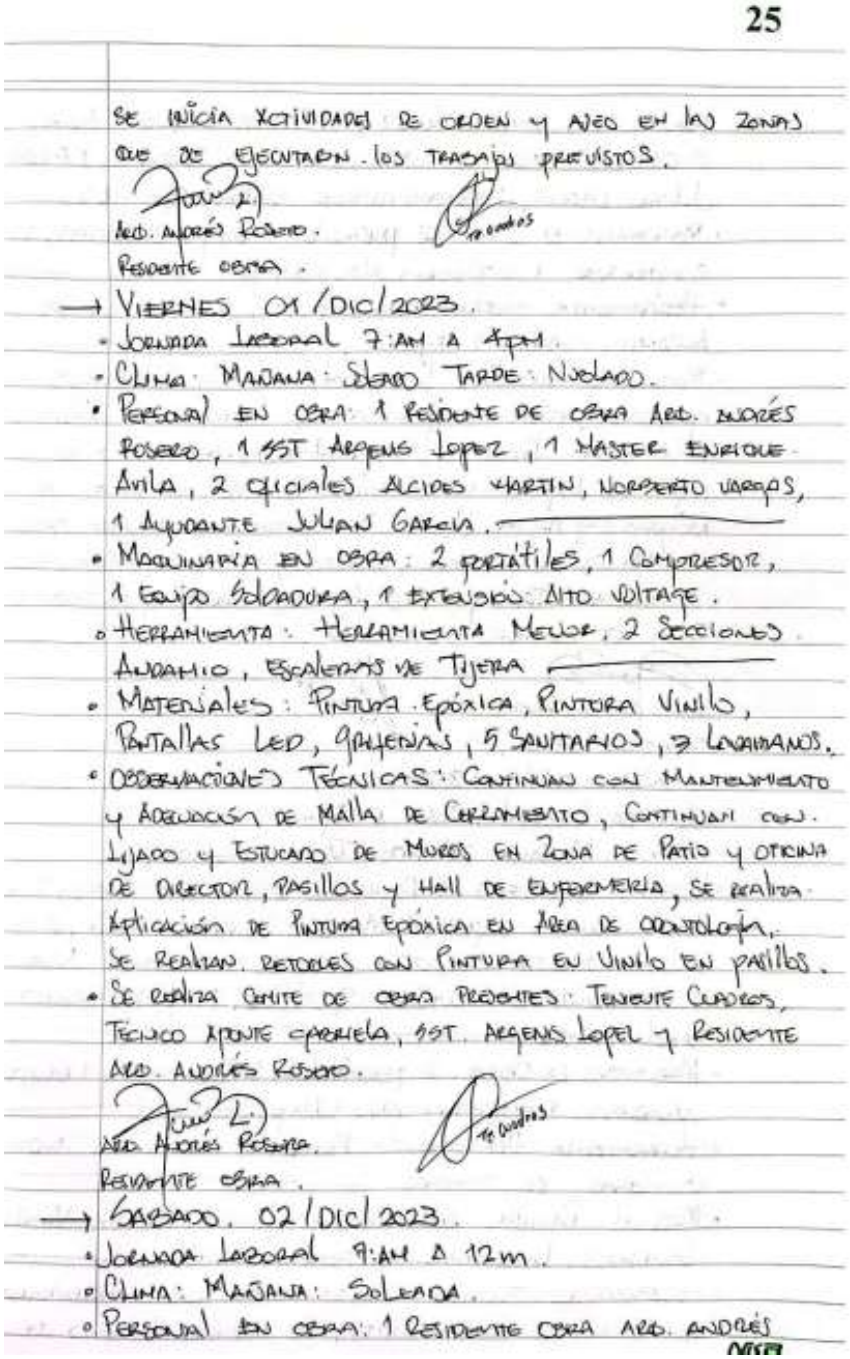

25

SE INICIA ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN LAS ZONAS QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS PREVISTOS.

ARQ. ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE OBRA.


→ VIERNES 01/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL 7:AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 EQUIPO SOLDADURA, 1 EXTENSIÓN ALTO VOLTAJE.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 2 SECCIONES ANDAMIO, ESCALERAS DE TIJERA
- MATERIALES: PINTURA EPÓXICA, PINTURA VINILO, PANTALLAS LED, 9 LUMINARIAS, 5 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: CONTINUAN CON MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO, CONTINUAN CON. LIJADO Y ESTUCADO DE MUROS EN ZONA DE PATIO Y OFICINA DE DIRECTOR, PASILLOS Y HALL DE ENFERMERIA, SE REALIZA APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN AREA DE ODONTOLOGÍA. SE REALIZAN RETOQUES CON PINTURA EN VINILO EN PASILLOS.
- SE REALIZA COMITE DE OBRA PRESENTES: TENIENTE CLAVIJO, TÉCNICO APOYE GABRIELA, SST. ARGENIS LOPEZ Y RESIDENTE ARQ. ANDRÉS ROSERO.

ARQ ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE OBRA.

→ SABADO. 02/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL 9:AM A 12m.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE OBRA ARQ. ANDRÉS

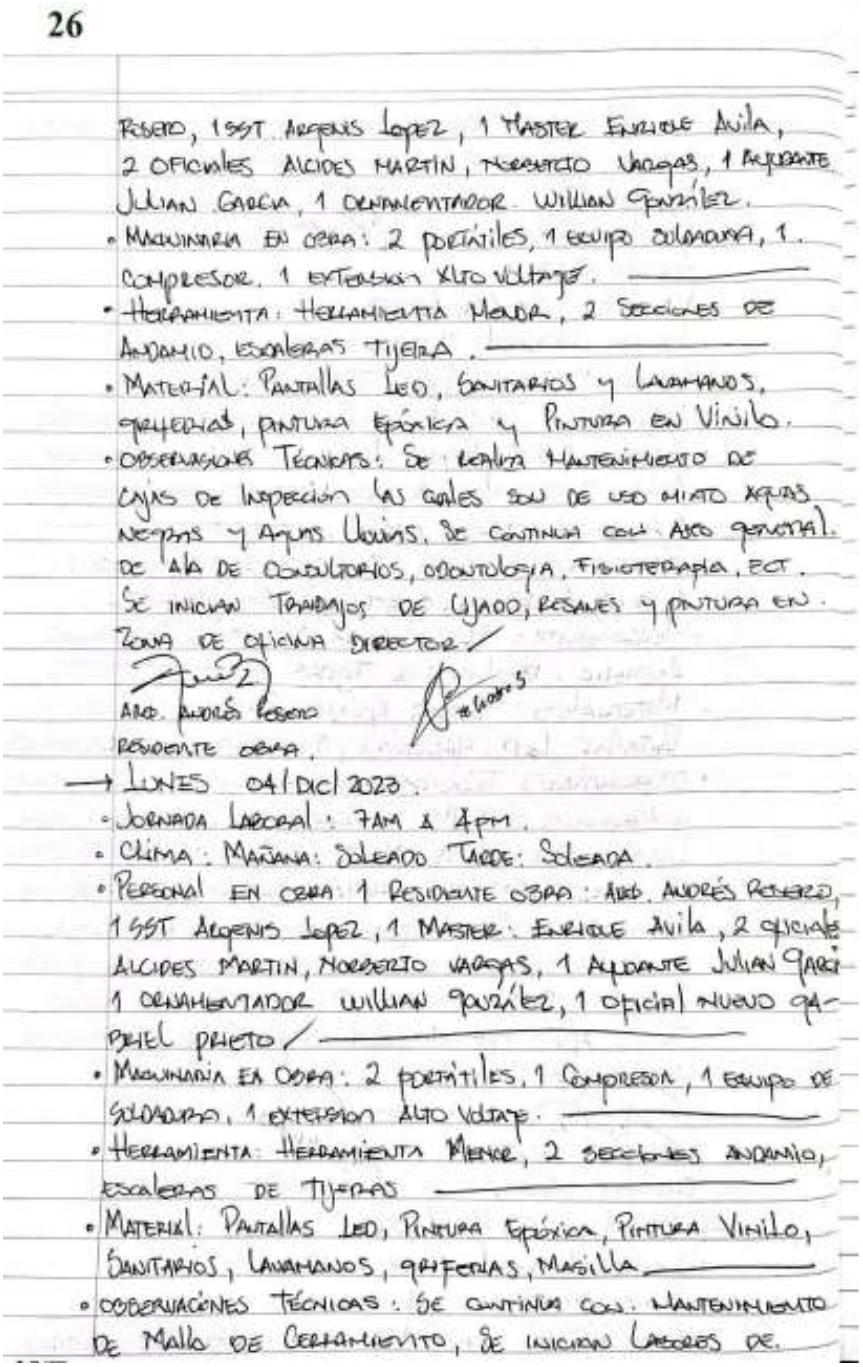


26

ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA, 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZÁLEZ.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 EQUIPO SOLDADURA, 1 COMPRESOR. 1 EXTENSION ALTO VOLTAJE.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 2 SECCIONES DE ANDAMIO, ESCALERAS TIJERA.
- MATERIAL: PANTALLAS LED, SANITARIOS Y LAVAMANOS, GRIFERIAS, PINTURA EPÓXICA Y PINTURA EN VINILO.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN LAS CUALES SON DE USO MIXTO AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS. SE CONTINUA CON ASEO GENERAL DE ÁREA DE CONSULTORIOS, ODONTOLOGÍA, FISIOTERAPIA, ECT. SE INICIAN TRABAJOS DE LIJADO, RESANES Y PINTURA EN ZONA DE OFICINA DIRECTOR.

ARQ. ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE OBRA.

→ LUNES 04/DIC/2023.
- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA 1 RESIDENTE OBRA: ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER: ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCI 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZÁLEZ, 1 OFICIAL NUEVO GA- BRIEL PRIETO.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 EXTENSION ALTO VOLTAJE.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 2 SECCIONES ANDAMIO, ESCALERAS DE TIJERAS
- MATERIAL: PANTALLAS LED, PINTURA EPÓXICA, PINTURA VINILO, SANITARIOS, LAVAMANOS, GRIFERIAS, MASILLA
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: SE CONTINUA CON: MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO, SE INICIAN LABORES DE.

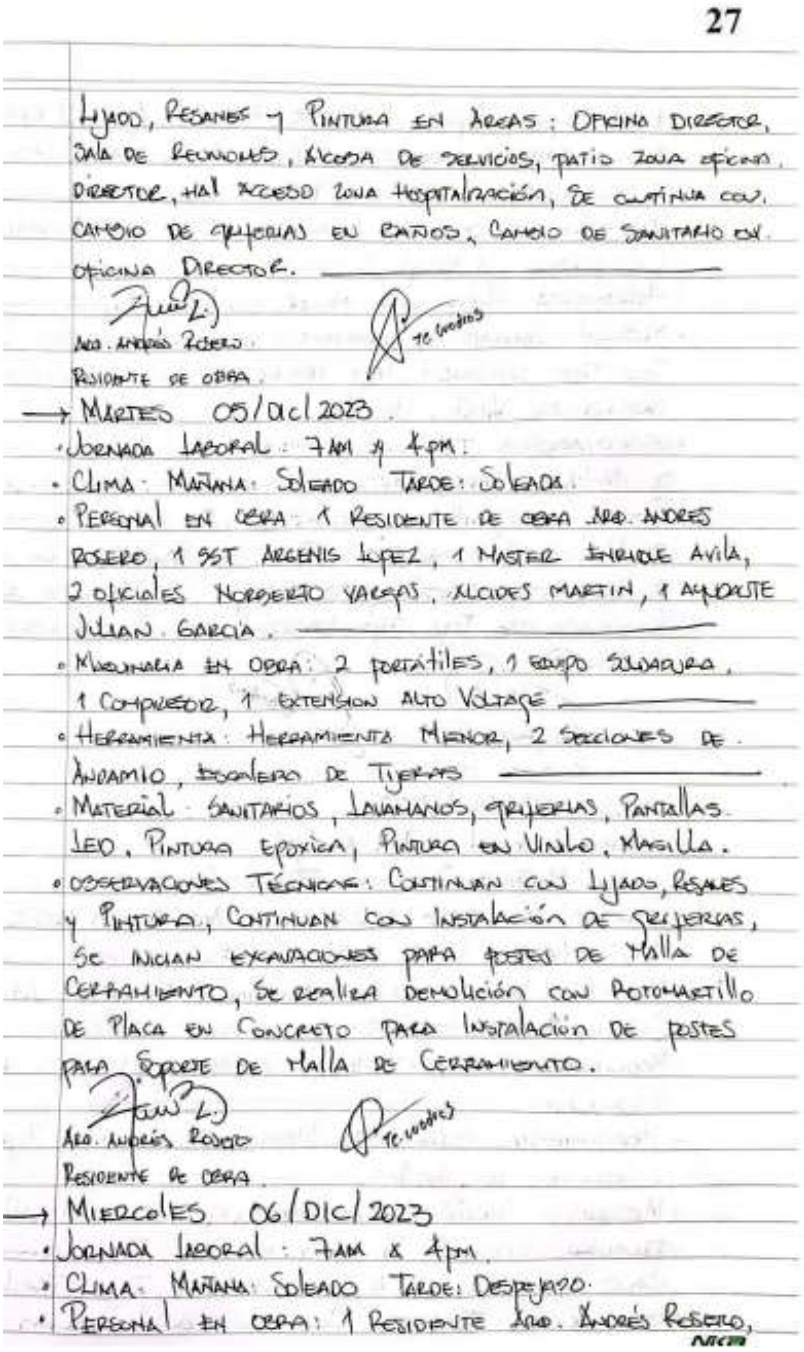

27

LIJADO, RESANES Y PINTURA EN AREAS: OFICINA DIRECTOR, SALA DE REUNIONES, ALCOBA DE SERVICIOS, PATIO ZONA OFICINAS, DIRECTOR, HALL ACCESO ZONA HOSPITALIZACIÓN, SE CONTINUA CON CAMBIO DE CERRADURAS EN BAÑOS, CAMBIO DE SANITARIO EN OFICINA DIRECTOR.

ARQ. ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE DE OBRA


→ MARTES 05/DIC/2023

- JORNADA LABORAL: 7AM Y 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA ARQ. ANDRES ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTÁTILES, 1 EQUIPO SOLDADURA, 1 COMPRESOR, 1 EXTENSION ALTO VOLTAJE
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 2 SECCIONES DE ANDAMIO, ESCALERA DE TIJERAS
- MATERIAL: SANITARIOS, LAVAMANOS, CERRADURAS, PANTALLAS LED, PINTURA EPOXICA, PINTURA EN VINILO, MASILLA.
- OBSERVACIONES TÉCNICAS: CONTINUAN CON LIJADO, RESANES Y PINTURA, CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE CERRADURAS, SE INICIAN EXCAVACIONES PARA POSTES DE MALLA DE CERRAMIENTO, SE REALIZA DEMOLICIÓN CON ROTOMARTILLO DE PLACA EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE POSTES PARA SOPORTE DE MALLA DE CERRAMIENTO.

ARQ. ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE DE OBRA

→ MIERCOLES 06/DIC/2023

- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: DESPEJADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ARQ. ANDRÉS ROSERO,

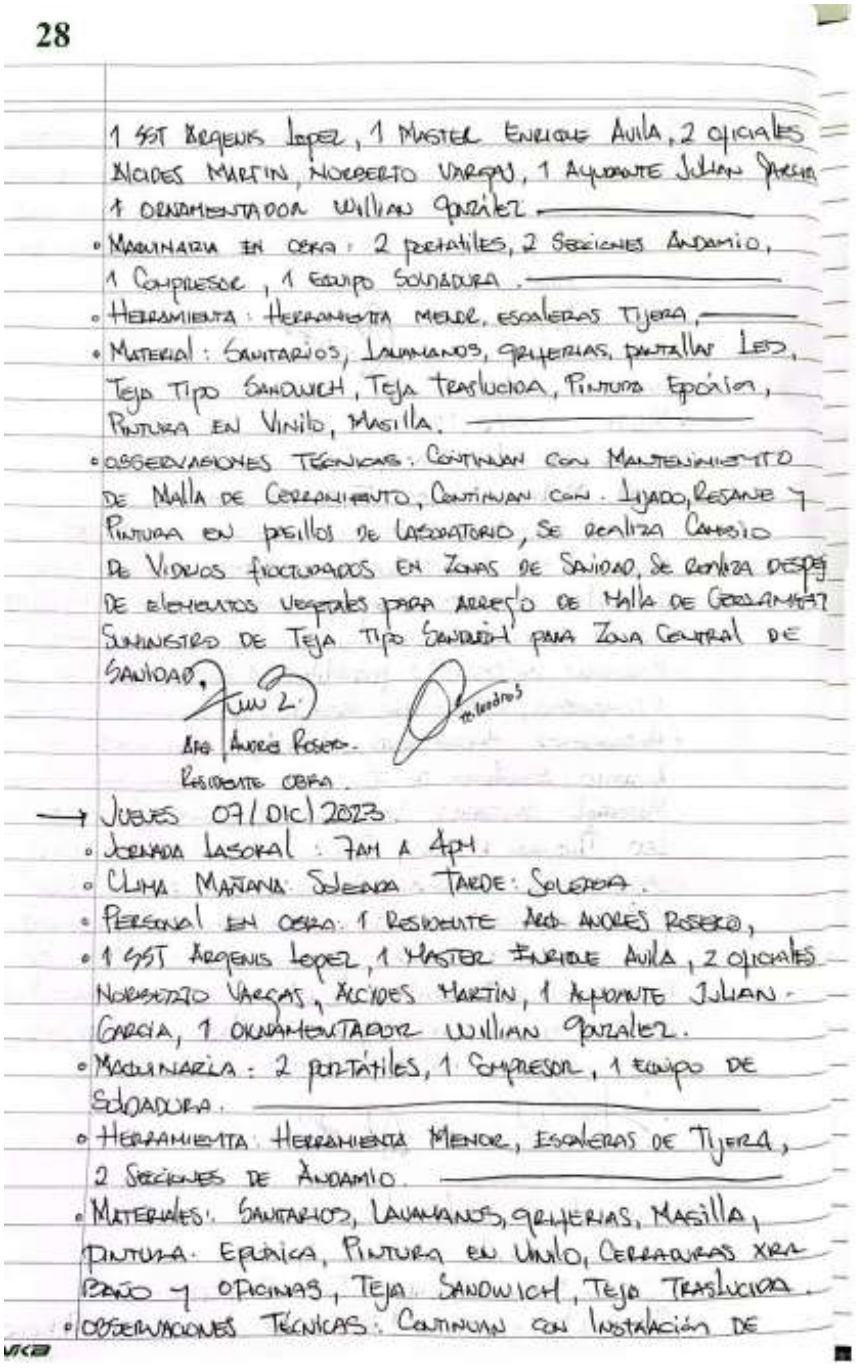

28


1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZALEZ.

- MAQUINARIA EN OBRA: 2 PORTATILES, 2 SECCIONES ANDAMIO, 1 COMPRESOR, 1 EQUIPO SOLDADURA.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS TIJERA.
- MATERIAL: SANITARIOS, LAVAMANOS, GRIFERIAS, PANTALLAS LED, TEJA TIPO SANDWICH, TEJA TRASLUCIDA, PINTURA EPOXICA, PINTURA EN VINILO, MASILLA.
- OBSERVACIONES TECNICAS: CONTINUAN CON MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO, CONTINUAN CON LIJADO, RESANE Y PINTURA EN PRELLOS DE LABORATORIO, SE REALIZA CAMBIO DE VIDRIOS FRACTURADOS EN ZONAS DE SANIDAD, SE REALIZA DESPEJ DE ELEMENTOS VEGETALES PARA ARREGLO DE MALLA DE CERRAMIENTO SUMINISTRO DE TEJA TIPO SANDWICH PARA ZONA CENTRAL DE SANIDAD.

ARQ. ANDRES ROSERO.
RESIDENTE OBRA.

→ JUEVES 07/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL: 7AM A 4PM.
- CLIMA MAÑANA: SOLEADA. TARDE: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ARQ. ANDRES ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES NORBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA, 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZALEZ.
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 EQUIPO DE SOLDADURA.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS DE TIJERA, 2 SECCIONES DE ANDAMIO.
- MATERIALES: SANITARIOS, LAVAMANOS, GRIFERIAS, MASILLA, PINTURA EPOXICA, PINTURA EN VINILO, CERRADURAS XRA BAÑO Y OFICINAS, TEJA SANDWICH, TEJA TRASLUCIDA.
- OBSERVACIONES TECNICAS: CONTINUAN CON INSTALACIÓN DE

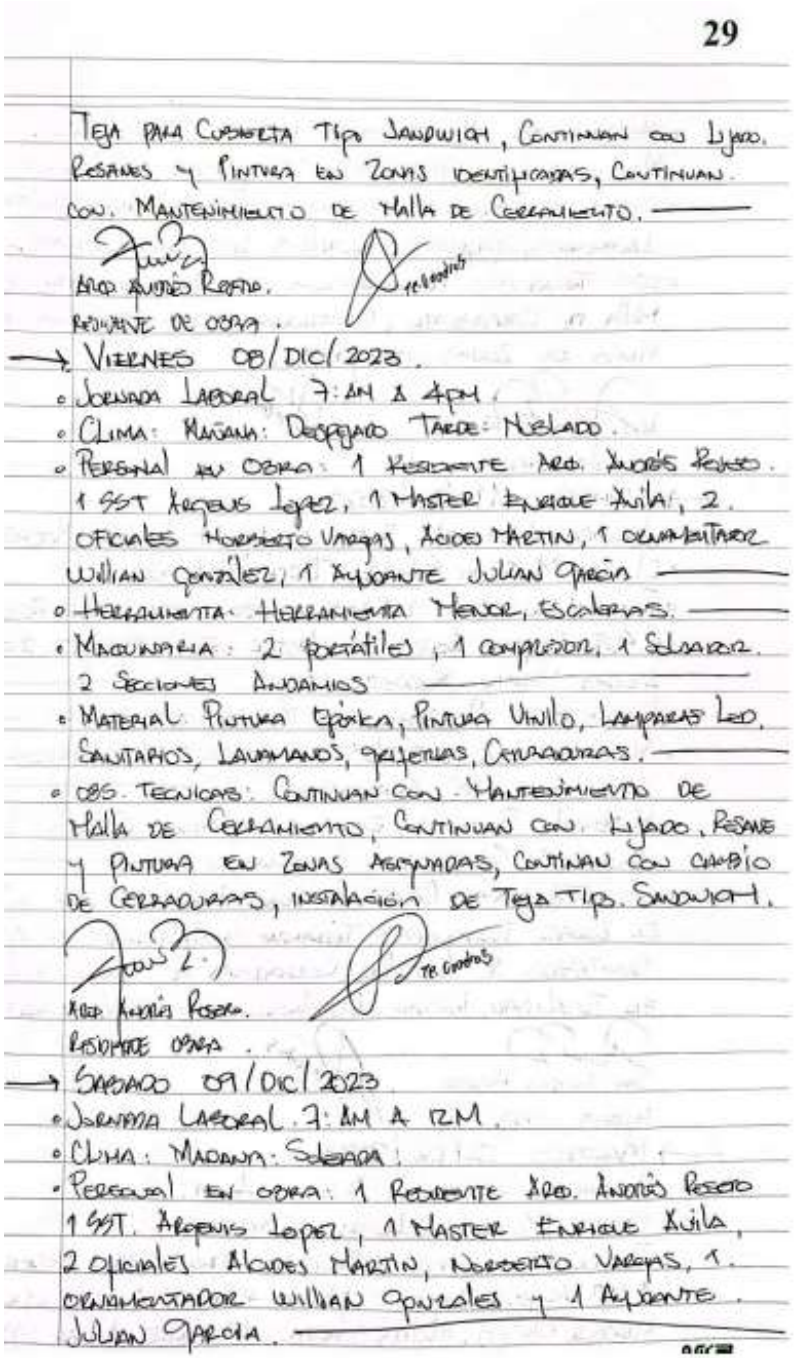

29

TEJA PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH, CONTINUAN CON LIJADO, RESANES Y PINTURA EN ZONAS IDENTIFICADAS, CONTINUAN CON MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO.

ARQ. ANDRÉS REYES.
RESIDENTE DE OBRA.

→ VIERNES 08/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL 7:AM A 4PM.
- CLIMA: MAÑANA: DESPEJADO TARDE: NUBLADO.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ARQ. ANDRÉS REYES. 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES HUMBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZÁLEZ, 1 AYUDANTE JULIAN GARCÍA
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS.
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 SOLDADOR, 2 SECCIONES ANDAMIOS
- MATERIAL: PINTURA EPÓXICA, PINTURA VINILO, LAMPARAS LED, SANITARIOS, LAVAMANOS, GRIFERIAS, CERRADURAS.
- OBS. TECNICAS: CONTINUAN CON MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO, CONTINUAN CON LIJADO, RESANE Y PINTURA EN ZONAS AGRUPADAS, CONTINAN CON CAMBIO DE CERRADURAS, INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH.

ARQ. ANDRÉS REYES.
RESIDENTE OBRA.

→ SABADO 09/DIC/2023

- JORNADA LABORAL 7:AM A 12M.
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ARQ. ANDRÉS REYES 1 SST. ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 ORNAMENTADOR WILLIAN GONZALES Y 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.



30

- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS.
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 SOLDADOR.
- MATERIAL: PINTURA EPÓXICAS, PINTURA VINILO, SANITARIOS, LAVAMANOS, GRIFERIAS, PANTALLAS LED, CERRADURAS
- OBS. TECNICAS: TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO, CONTINUAN CON PINTURA EN VINILO EN ZONAS DESIGNADAS.

ARQ. ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE OBRA.

→ LUNES. 11/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL: 7 AM A 4PM + JORNADA NOCHE. 2A H
- CLIMA: MAÑANA SOLEADO TARDE: SOLEADO.
- PERSONAL EN OBRA. 1 RESIDENTE OBRA ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ARQUIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE LOPEZ, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES, 1 COMPRESOR, 1 SOLDADOR, 2 SECCIONES DE ANDAMIOS
- MATERIAL: PINTURA EPÓXICA Y VINILO, PANTALLAS LED, GRIFERIAS, SANITARIOS, LAVAMANOS
- OBS. TÉCNICAS: CONTINUAN CON LIJADO, RESANE Y PINTURA EN ZONAS DESIGNADAS, TERMINAN INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, SE INSTALAN CERRADURAS DE PUERTAS Y OFICINAS EN TOTALIDAD, INICIAN INSTALACIÓN DE SUPERBOARD.

ARQ. ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE OBRA.

→ MARTES 12/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL: 7 AM A 4PM.
- CLIMA MAÑANA: SOLEADA – TARDE:
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ARQ. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ARQUIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES. NORBERTO VARGAS, ALCIDES MARTIN, 1 AYUDANTE JUAN GARCIA?

- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES
- MATERIAL: PINTURA EPÓXICA, PINTURA EN VINILO, MASILLA, GELFENAS, LAVAMANOS, SANITARIOS, PANTALLAS LED
- OBS. TÉCNICAS: CONTINUAN CON LIJADO, RESANE Y PINTURA EN ZONA DE URGENCIAS.

ING. ANDRÉS ROSERO
RESIDENTE OBRA.


→ MIERCOLES 13/DIC/2023

- JORNADA LABORAL 7AM x 4PM + JORNADA NOCHE 24H
- CLIMA: MAÑANA: DESPEJADO TARDE: DESPEJADO
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ING. ANDRÉS ROSERO, 1 SST. ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA.
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR. ESCALERAS
- MAQUINARIA: 2 PORTÁTILES – 1 IMPRESORA.
- MATERIAL: PINTURA EPÓXICA – PINTURA VINILO, LAMPARAS LED, GELFENAS.
- OBS TÉCNICAS: CONTINUAN CON: INSTALACIÓN DE PLANCHES, ESTERBOARD Y MALLA PLÁSTICA PARA CANALES, CONTINUAN CON: PINTURA EN ZONA HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS.

ING. ANDRÉS ROSERO.
RESIDENTE OBRA.

→ JUEVES 14/DIC/2023.

- JORNADA LABORAL: 7AM x 4PM
- CLIMA: MAÑANA: SOLEADA – TARDE: SOLEADA.
- PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE ING. ANDRÉS ROSERO, 1 SST ARGENIS LOPEZ, 1 MASTER ENRIQUE AVILA, 2 OFICIALES ALCIDES MARTIN, NORBERTO VARGAS, 1 AYUDANTE JULIAN GARCIA
- HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR - ESCALERAS

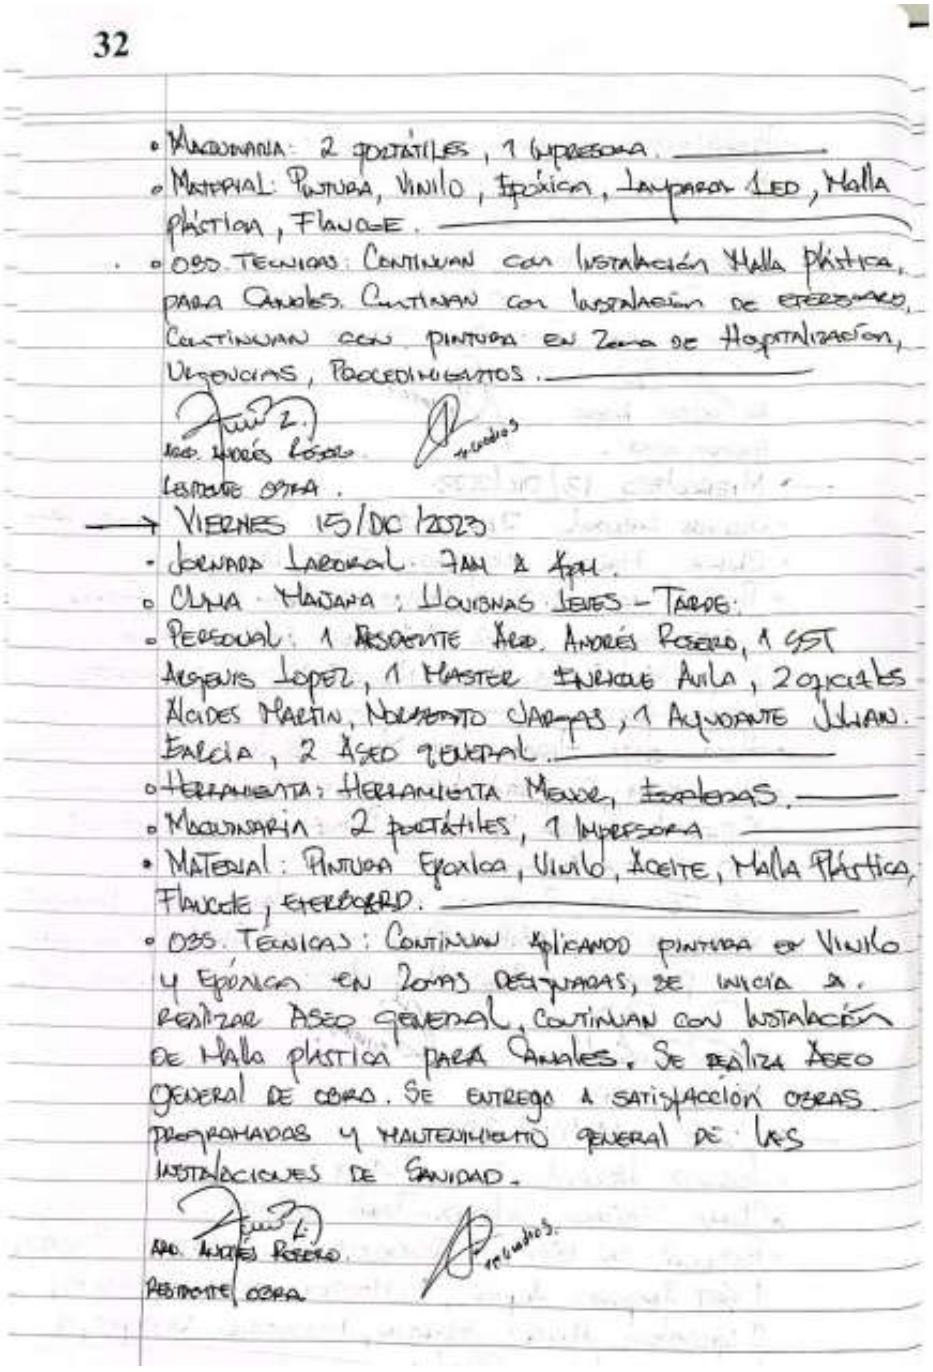

32

- Maquinaria: 2 portátiles, 1 impresora.
- Material: Pintura, Vinilo, Epóxica, Lampara Led, Malla plástica, Flange.
- Obs. Tecnicas: Continuan con instalación Malla plástica, para Andes. Continuan con instalación de Eterboard, Continuan con pintura en Zona de Hospitalización, Urgencias, Procedimientos.

Ing. Andrés Rosero
Residente obra.

→ Viernes 15/Dic/2023

- Jornada Laboral: 7am a 4pm.
- Clima Mañana: Nubosas Lluvias - Tarde:
- Personal: 1 Residente Ing. Andrés Rosero, 1 SST Alexis Lopez, 1 Master Enrique Avila, 2 oficiales Alcides Martin, Norberto Campos, 1 Ayudante Julian. Falcia, 2 Aseo General.
- Herramienta: Herramienta Menor, Escaleras.
- Maquinaria: 2 portátiles, 1 impresora
- Material: Pintura Epoxica, Vinilo, Aceite, Malla Plástica, Flange, Eterboard.
- Obs. Tecnicas: Continuan aplicando pintura en Vinilo y Epóxica en Zonas Designadas, se inicia a realizar Aseo General, Continuan con instalación de Malla plástica para Andes. Se realiza Aseo General de obra. Se entrega a satisfacción obras programadas y mantenimiento general de las instalaciones de Sanidad.

Ing. Andrés Rosero.
Residente obra

INFORME FINAL

FUERZA AEREA SANIDAD

COMPONENTE SST

CONTRATO DE OBRA No 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023

OBJETO OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -ESM 1882(CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA (ESUFA)

CONSORCIO VENTURA

1. INFORMACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS

En el transcurso de la ejecución del proyecto se manejaron el siguiente personal

SECCION	TOTAL, PERSONAL	CARGO
ADMINISTRATIVO	2	RESIDENTE, SST
OPERATIVO	5	OFICIALES., AUXILIARES
ORNAMENTADOR	1	ORNAMENTADOR
RETIRADO	2	RESIDENTE, AUXILIAR
RECHAZADOS	3	OFICIALES

2. BASE DE DATOS CONSORCIO VENTURA

Se anexa base de datos del consorcio ventura con las dos novedades de retiro.



BASE DE DATOS 2023 -SANIDAD -FUERZA AEREA

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	TELEFON	FECHA DE NACIMIENT	RH	EPS	ARL	FONDO DE PENSION	FECHA INGRES	CARGO	PROYECTO	FECHA EXAMEN
Nestor Enrique	Avila Rincon	1077320582	3229260699	25/03/1991	O+	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	18/10/2023	MAESTRO	SANIDAD	
Julian Mauricio	Garcia Arias	1013580537	3219276642	5/07/2004	O+	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	23/10/2023	AYUDANTE	SANIDAD	
Freddy	Real Rodriguez	80060866	3196893706	11/11/1978	O+	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	18/10/2023	RESIDENTE DE OBRA	SANIDAD	
Argenis	Lopez	52832228	3107190724	25/03/1981	O+	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	18/10/2023	PROFESIONA SST	SANIDAD	
Haenz z	Gonzalez Ortiz	79920871	3205997560	12/06/1980	O+	COMPENSAR	POSITIVA	PROTECCION	18/10/2023	ELECTRICISTA	SANIDAD	
María José	Herrera Guzmán	52452955	3105587676	14/06/1978	O+	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	18/10/2023	REPRESENTANTE L	SANIDAD	
Norberto	Vargas Molina	424126	3118893477	24/01/1962	O+	FAMISANAR	POSITIVA	PROTECCION	31/10/2023	OFICIAL	SANIDAD	
William	Gonzalez Piraquive	79954942	3163581135	17/05/1980	O+	CAPITAL SALUD	POSITIVA	COLPENSIONES	28/10/2023	HORNAMENTADOR	SANIDAD	
Johan	Avila Contreras	1000787322	3213602393	RETIRADO 15 noviembre	O+	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	2/11/2023	AYUDANTE	SANIDAD	
Jose Alcides	Martin Guerrero	1073599257	3224556789	4/08/1985	O+	NUEVA EPS	POSITVA	PROTECCION	3/11/2023	OFICIAL	SANIDAD	
Andrés Mauricio	Rosero González	74360018	3158917916	28/01/1978	A+	SANITAS	POSITVA	COLPENSIONES	22/11/2023			

3. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

La Administradora de Riesgos Laborales del Consorcio Ventura es positiva y su objetivo es conseguir una máxima eficacia en materia de prevención de riesgos a nivel laboral en la ocurrencia de actividades empresariales en cualquiera de los sitios de trabajo.

También se realizó el pago de aportes al sistema de seguridad social por parte del consorcio ventura clase V -mes diciembre.

- Anexo_ N 1 seguridad social

4. AUSENTISMO POR ACCIDENTALIDAD

En el trascurso de la ejecución del proyecto no se generó ningún tipo de accidente o incidente en obra.

5. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En toda la ejecución del proyecto se entregó y se realizó reposición de Elementos de Protección Personal y dotación, para las diferentes actividades que se realizaron.
Entre ellos se encuentran los siguientes epp :

- Guantes de nitrilo
- Tapabocas N95
- Gafas transparentes
- Gafas negras
- Camibuso
- Tapabocas R 95 para químicos
- Guantes de nitrilo
- Arnés
- Eslinga
- Línea de vida

Anexo_ N 2 entrega de epp

Registro fotográfico



6. ACTIIVDADES QUE SE REALIZO EN OBRA

Se realiza plan de contingencia para avanzar en obra

- ✓ Trabajar 12 horas por tres días
- ✓ Trabajar 24 horas por dos días

Estos días se trabajaron según lo acordado

En el transcurso que duro el proyecto se realizaron las siguientes actividades

- ✓ Señalización con conos para el área, donde se encuentra las tejas viejas

- ✓ Señalización en toda el área de sanidad indicando que se encuentra en mantenimiento
- ✓ Inspección de equipos
- ✓ Jornada de orden y aseo
- ✓ Se marca todos los cascos del personal con sus datos principales
- ✓ Realización de punto de acopio

7. CHARLAS DIARIAS Y CAPACITACIONES

En la ejecución del proyecto se realizaron inducción y al personal nuevo y charlas al personal operativo y administrativo.
Anexo_ 3 charlas de SST

TEMA	FECHA
Inducción personal nuevo	18,23,31 octubre 2023
Orden y aseo	24/10/2023
Guía SST-fuerza aérea	01/11/2023
Charla ambiental	02/11/2023

TEMA	FECHA
Trabajo en alturas	03/11/ 2023
Manipulación de herramientas	10/11/2023
Riesgo químico	13/11/2023

TEMA	FECHA
Autocuidado	16/11/2023
Información general SST	22/11/2023
Riesgo publico	29/11/2023

TEMA	FECHA
Manipulación de herramientas eléctricas	04/12/2023
Riesgo eléctrico	11/12/2023
Orden y aseo	13/12/2023

8. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

- ✓ Instalación de cubierta

Anexo _N 4 ATS

9. TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

El contratista, realiza permiso de trabajo seguro en alturas, permisos para trabajo en caliente y preoperacional de equipos

Nota: estos permisos se ejecutaron en

- Desinstalación e instalación de cubierta
- Ornamentación
- Instalación de lámina pvc

PREOPERACIONAL

- ✓ Taladro.
- ✓ Pulidora

10. INDUCCIÓN SG-SST

Se realiza la respectiva inducción del personal que ingresa a obra

11. ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

11.1 INVENTARIO DE RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIA

ELEMENTOS	CANTIDAD	OBSERVACION
Camilla	1	Oficina consorcio
botiquín	1	Oficina consorcio
Extintor	1	Oficina consorcio

12. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN.

Se realiza señalización en área que se esta interviniendo

13. MEDIO AMBIENTE

En el transcurso de la ejecución del proyecto se realizaron actividades de medio ambiente entre ellas.
Charlas de clasificación de residuos
Punto de acopio
Limpieza de baños
Orden y aseo
Punto de acopio de químicos

Diariamente se le refuerza al personal los puntos de acopio y su clasificación.

14. REGISTRO FOOTGRAFICO

Se relaciona todo el registro fotográfico del transcurso de la ejecución del proyecto.


<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Recursos para la atencion de emergencias</td><td>Punto de acopio</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Aviso de advertencia</td><td>Identificacion de casco</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Señalizacion de area (conos)</td><td>Señalizacion de area (cinta de señalizacion)</td></tr>
</table>

	
Charla punto de acopio	Charla punto de acopio
	
Se realiza charla de seguridad orden y aseo	Se realiza charla de seguridad orden y aseo
	
Charla medio ambiente	Charla de seguridad

Anexo_1 seguridad social

RELACION DE PLANLLAS DE SEGURIDAD MESES EJECUTADOS (OCTUBRE-DICIEMBRE)

PLANILLA OCTUBRE -CONSORCIO VENTURA

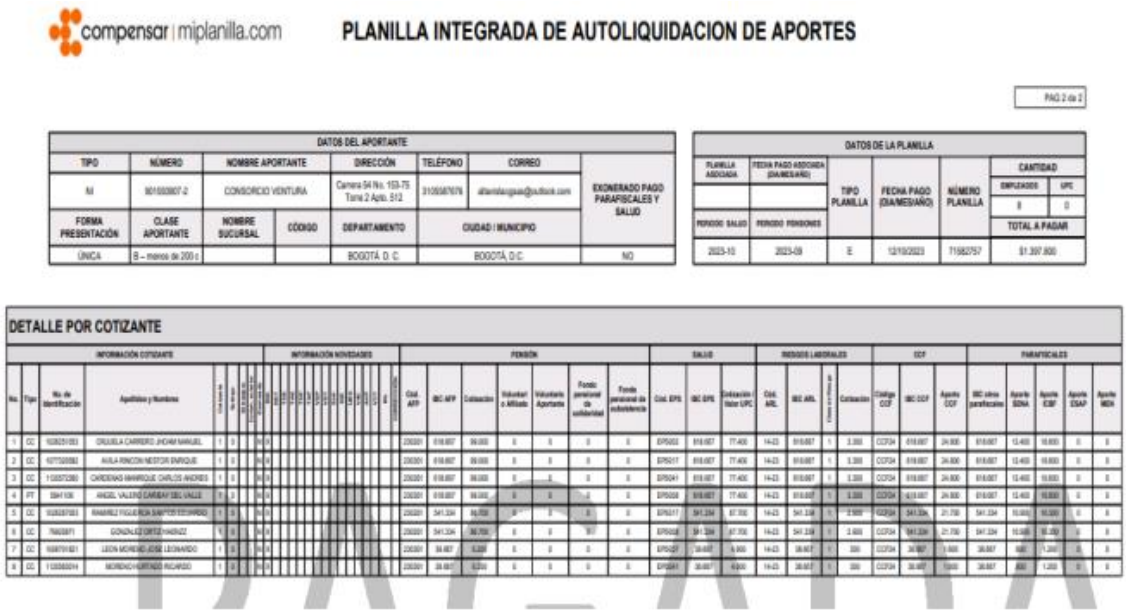

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901553907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	12/10/2023	71982757	$1.397.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código de Ubicación	Inválido	Sit. Especial	Cód. Actividad Alto Riesgo	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	LNR	RET	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020251053	CRUZOLA CARRERO JHOAN MANUEL	1	0																			23020	616.667	99.000	0	0	0	0	EPS002	616.667	77.400	14-23	616.667	1	3.300	CCF24	616.667	24.800	616.667	13.400	16.600	0	0
2	CC	1077200582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0																			23020	616.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	616.667	77.400	14-23	616.667	1	3.300	CCF24	616.667	24.800	616.667	13.400	16.600	0	0
3	CC	1 03572380	CARDENAS MARROQUIN CARLOS ANDRES	1	0																			23020	616.667	99.000	0	0	0	0	EPS041	616.667	77.400	14-23	616.667	1	3.300	CCF24	616.667	24.800	616.667	13.400	16.600	0	0
4	PT	594106	ANGEL VALLEJO CARBAYSEL VALLE	1	0																			23020	616.667	99.000	0	0	0	0	EPS008	616.667	77.400	14-23	616.667	1	3.300	CCF24	616.667	24.800	616.667	13.400	16.600	0	0
5	CC	1026307083	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0																			23020	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	67.700	14-23	541.334	1	2.600	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.500	13.000	0	0
6	CC	79830971	GONZALEZ ORTIZ HAIVER	1	0																			23020	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	67.700	14-23	541.334	1	2.600	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.500	13.000	0	0
7	CC	1030731821	LEON MORENO JOSE LEONARDO	1	0																			23020	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
8	CC	1 03580037	MORENO HURTADO RICARDO	1	0																			23020	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0

EMPRESA -RAZON SOCIAL MARIA JOSE -NOVIEMBRE

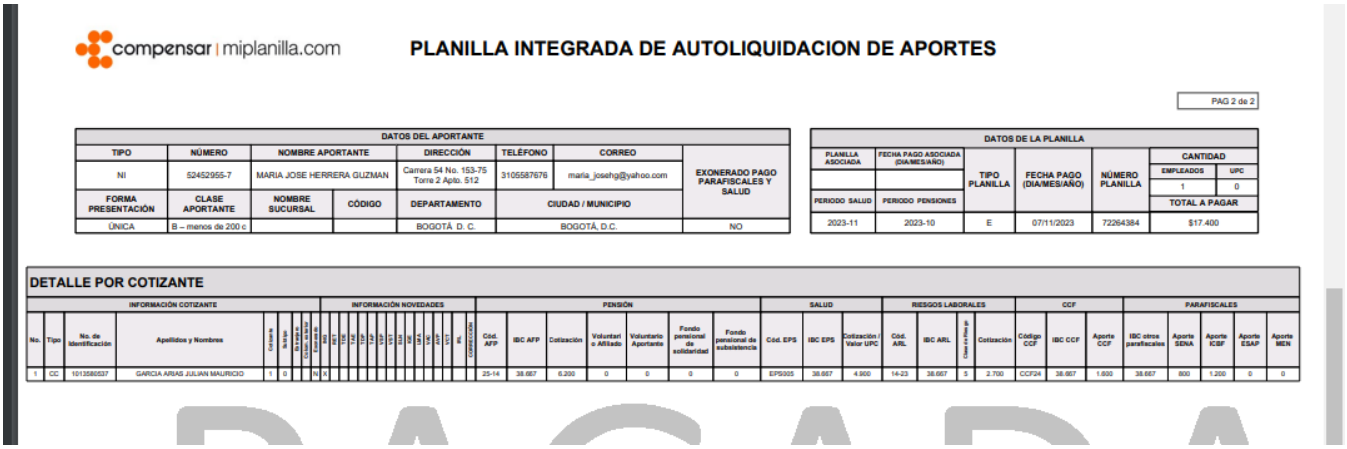

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	52452955-7	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	maria_joseh@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72264384	$17.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código de Ubicación	Inválido	Sit. Especial	Cód. Actividad Alto Riesgo	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	LNR	RET	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013580037	GARCIA ARIAS JULIAN MAURICIO	1	0			X																25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0

RAZON SOCIAL: CONSORCIO VENTURA -NOVIEMBRE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72207595	$2.917.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario Integral	Extranjero Cotiza en Mi País	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
2	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
3	CC	1126572360	CARDENAS MANRIQUE CARLOS ANDRES	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
4	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
5	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
6	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
7	CC	1006701821	LEON MORENO JOSE LEONARDO	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
8	CC	1126583014	MORENO HURTADO RICARDO	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
9	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0			N	X															23030	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	62.900	14-23	502.667	1	2.700	CCF24	502.667	20.200	502.667	10.100	15.100	0	0
10	CC	80002686	REAL RODRIGUEZ FREDDY	1	0			N	X															23030	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS008	502.667	62.900	14-23	502.667	1	2.700	CCF24	502.667	20.200	502.667	10.100	15.100	0	0
11	CC	424126	VARGAS MOLINA NORBERTO	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
12	CC	79954942	GONZALEZ PIRAQUIVE WILLIAM EDILSON	1	0			N	X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	4.900	14-23	38.667	1	300	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0

PLANILLA

PLANILLLA DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES


PAG 3 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				45	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992119	$9.837.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Salario Integral	Extranjero Cotiza en Mi País	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000033791	GONZALEZ HAENZZ LEONARDO	1	0			N	X															23030	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS008	386.667	48.400	14-23	386.667	5	27.000	CCF24	386.667	15.500	386.667	7.800	11.700	0	0
2	CC	1001833045	GOMEZ FLOREZ SAIR MANUEL	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
3	CC	1001978897	PAJARO BETANCOURT JUAN JOSE	1	0			N	X	X														23030	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
4	CC	1002191558	GONZALEZ MARIMON KEVIN	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC07	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
5	CC	1007975926	OSORIO MIELES DANIEL ESTEBAN	1	0			N	X	X														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
6	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
7	CC	1043650652	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALBERTO	1	0			N	X															23030	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS048	193.334	24.200	14-23	193.334	5	13.500	CCF24	193.334	7.800	193.334	3.900	5.900	0	0
8	CC	1047367008	CORTECERO CABRERA JORMAN	1	0			N	X															23030	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	48.400	14-23	386.667	5	27.000	CCF24	386.667	15.500	386.667	7.800	11.700	0	0
9	CC	1047450089	RIOS MEZA VICTOR ALFONSO	1	0			N	X															23030	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS010	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
10	CC	1047477459	ORTEGA GAMARRA ALBERT GREGORIO	1	0			N	X															23030	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS048	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
11	CC	1049447758	PEREZ AGAMEZ FELIPE	1	0			N	X															25-14	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	29.000	14-23	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	232.000	4.700	7.000	0	0
12	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
13	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N																23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
14	CC	1042578084	LOPEZ PAYARES YUVIANA PATRICIA	1	0			N	X															25-14	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS041	193.334	24.200	14-23	193.334	5	13.500	CCF24	193.334	7.800	193.334	3.900	5.900	0	0
15	CC	1043643864	ZALLA CAMARGO CARLOS ALBERTO	1	0			N	X	X														25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
16	CC	43492087	ARBOLEDA FERNANDEZ ANNI YULIET	1	0			N	X	X														23030	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS010	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
17	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0			N	X															23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
18	CC	73084648	LARA RUIZ JUAN MANUEL	1	0			N	X															25-14	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS005	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
19	CC	1047450558	DE LA ROSA GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	1	0			N	X															23030	38.667	6.200	0	0	0	0	CCFC55	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
20	CC	1047454997	RAMOS GARCIA EDUARDO ENRIQUE	1	0			N	X															23030	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	72.500	14-23	580.000	5	40.400	CCF24	580.000	23.200	580.000	11.600	17.400	0	0
21	CC	1047469198	GONZALEZ CEBALLOS ELKIN RAFAEL	1	0			N	X															23030	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS005	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
22	CC	73197553	POSADA PORTELA JULIO	1	0			N	X															23030	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	29.000	14-23	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	232.000	4.700	7.000	0	0
23	CC	73212605	RIOS JIMENEZ JOE ENRIQUE	1	0			N	X															23030	618.667	99.000	0	0	0	0	ESSC07	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
24	CC	73317594	TORRES GAMARRA CLEIDER JOSE	1	0			N	X															23030	618.667	99.000	0	0	0	0	ESSC24	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
25	CC	1193563504	RAMOS ACEVEDO NICOLAS ELIAS	1	0			N	X															25-14	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS041	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
26	CC	1193591177	OROZCO BURGOS RAFAEL	1	0			N	X															23030	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	29.000	14-23	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	232.000	4.700	7.000	0	0
27	CC	424126	VARGAS MOLINA NORBERTO	1	0			N	X															23030	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0
28	CC	88143350	TORO CASTRO ANOLFO	1	0			N	X															23030	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS017	232.000	29.000	14-23	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	232.000	4.700	7.000	0	0

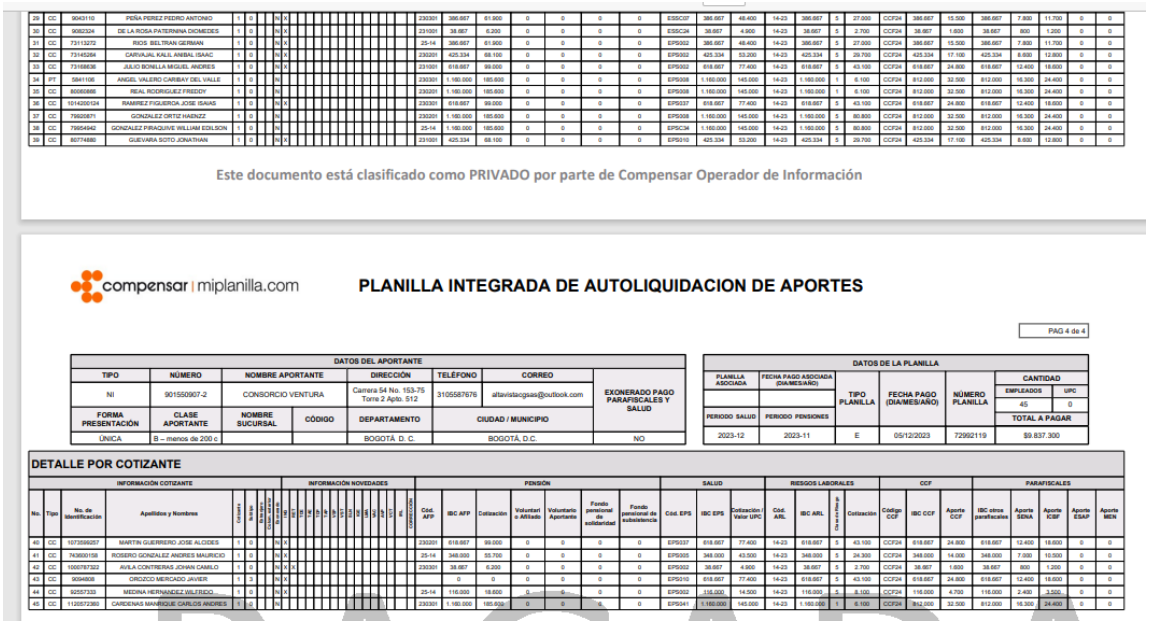

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 4 de 4

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72992119	$9.837.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código Sucursal	Nombre Sucursal	Días de Mora	Días de Mora Licencias	IGE	IRL	SLN	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	ABS	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	CODIGO NOVEDAD	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0			N	X																		230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS037	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
41	CC	7439009158	ROSERO GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1	0			N	X																		25-14	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	43.500	14-23	348.000	5	24.300	CCF24	348.000	14.000	348.000	7.000	10.500	0	0
42	CC	1000787322	AVILA CONTRERAS JOHAN CAMILO	1	0			N	X	X																	230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	4.900	14-23	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	38.667	800	1.200	0	0
43	CC	9094808	OROZCO MERCADO JAVIER	1	3			N	X																			0	0	0	0	0	0	EPS010	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
44	CC	92537333	MEDINA HERNANDEZ WILFREDO	1	0			N	X																		25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	14.500	14-23	116.000	5	8.100	CCF24	116.000	4.700	116.000	2.400	3.500	0	0
45	CC	1120572380	CARDENAS MANRIQUE CARLOS ANDRES	1	0			N																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	8.100	CCF24	812.000	32.500	812.000	16.300	24.400	0	0


CONCLUSIONES

Se termina obra el 15 de diciembre del presente año, sin ninguna novedad de accidentes o incidentes o patologías, se entrega informe final junto con planillas de seguridad.

Adicional se retira elementos suministrados por el CONSORCIO VENTURA, como lo es:

- Camilla
- Botiquín
- Extintor
- Puntos de acopio
- Conos de seguridad
- Arnés, eslinga
- Cafetera
- Horno
- Impresora

Anexo_2 entrega epp

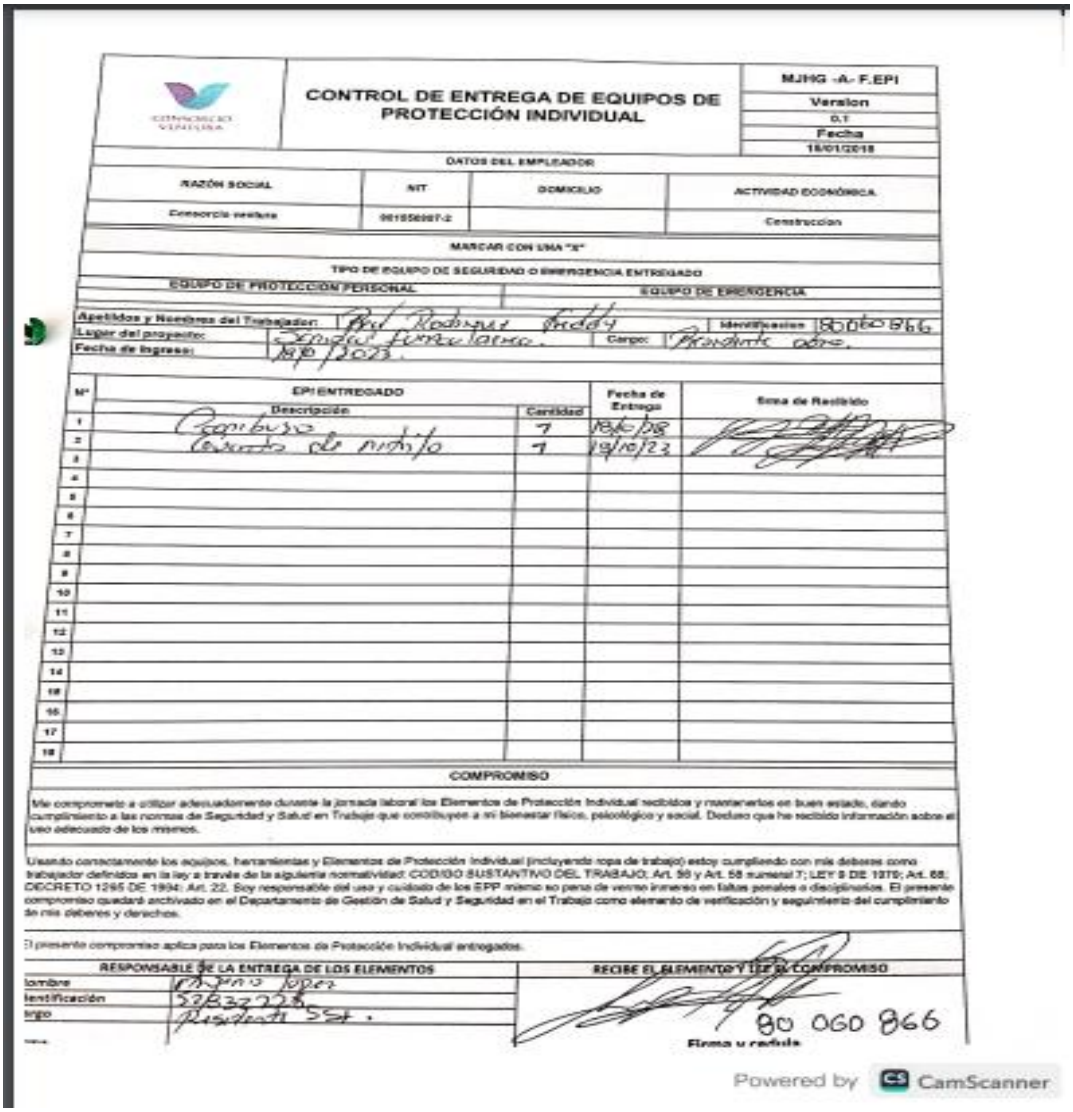

CONSORCIO VENTURA

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MJHG -A- F.EPI
Version
0.1
Fecha
15/01/2018

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONÓMICA
Consorcio ventura	901556997-2		Construccion

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: Raf Rodrigue Freddy | Identificacion: 80060866
Lugar del proyecto: Zanja Formaleteria. | Cargo: Residente obra.
Fecha de Ingreso: 18/9/2023.

Nº	EPI ENTREGADO Descripción	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de Recibido
1	Casco	1	18/9/23	
2	Chaleco de malla	1	18/9/23	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO


Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que constituyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarios. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO
Nombre: Mario Lopez	
Identificación: 32832228	
Cargo: Residente SST.	80 060 866
	Firma y cedula

Powered by CamScanner

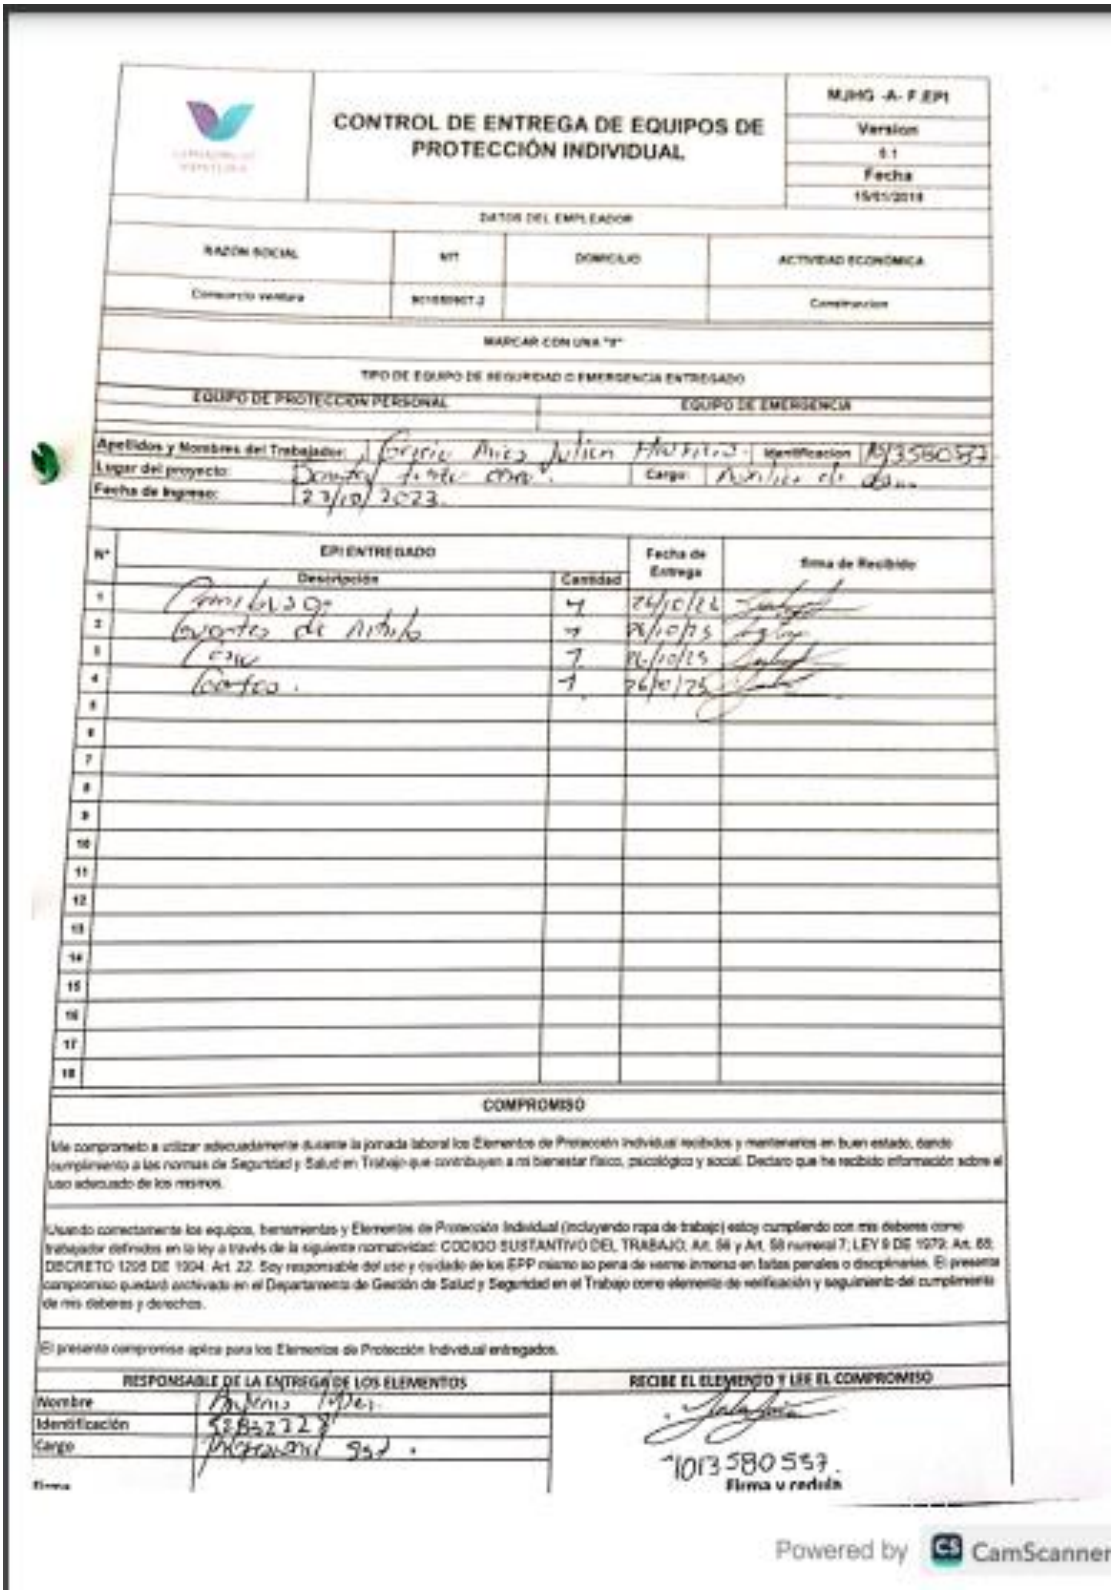

CONSORCIO VENTURA

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MJHG -A- F.EPI
Version
0.1
Fecha
15/01/2018

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL	NIT	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONOMICA
Consorcio Ventura	901580907-2		Construccion

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: [illegible] Identificacion 1013580557
Lugar del proyecto: [illegible] Cargo: [illegible]
Fecha de ingreso: 23/10/2023

N°	EPI ENTREGADO Descripción	Cantidad	Fecha de Entrega	firma de Recibido
1	[illegible]	1	24/10/23	
2	[illegible]	1	24/10/23	
3	[illegible]	1	24/10/23	
4	[illegible]	1	24/10/23	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO


Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos.

El presente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO
Nombre [illegible]	
Identificación [illegible]	1013580557
Cargo [illegible]	
Firma	Firma y cedula

Powered by CamScanner

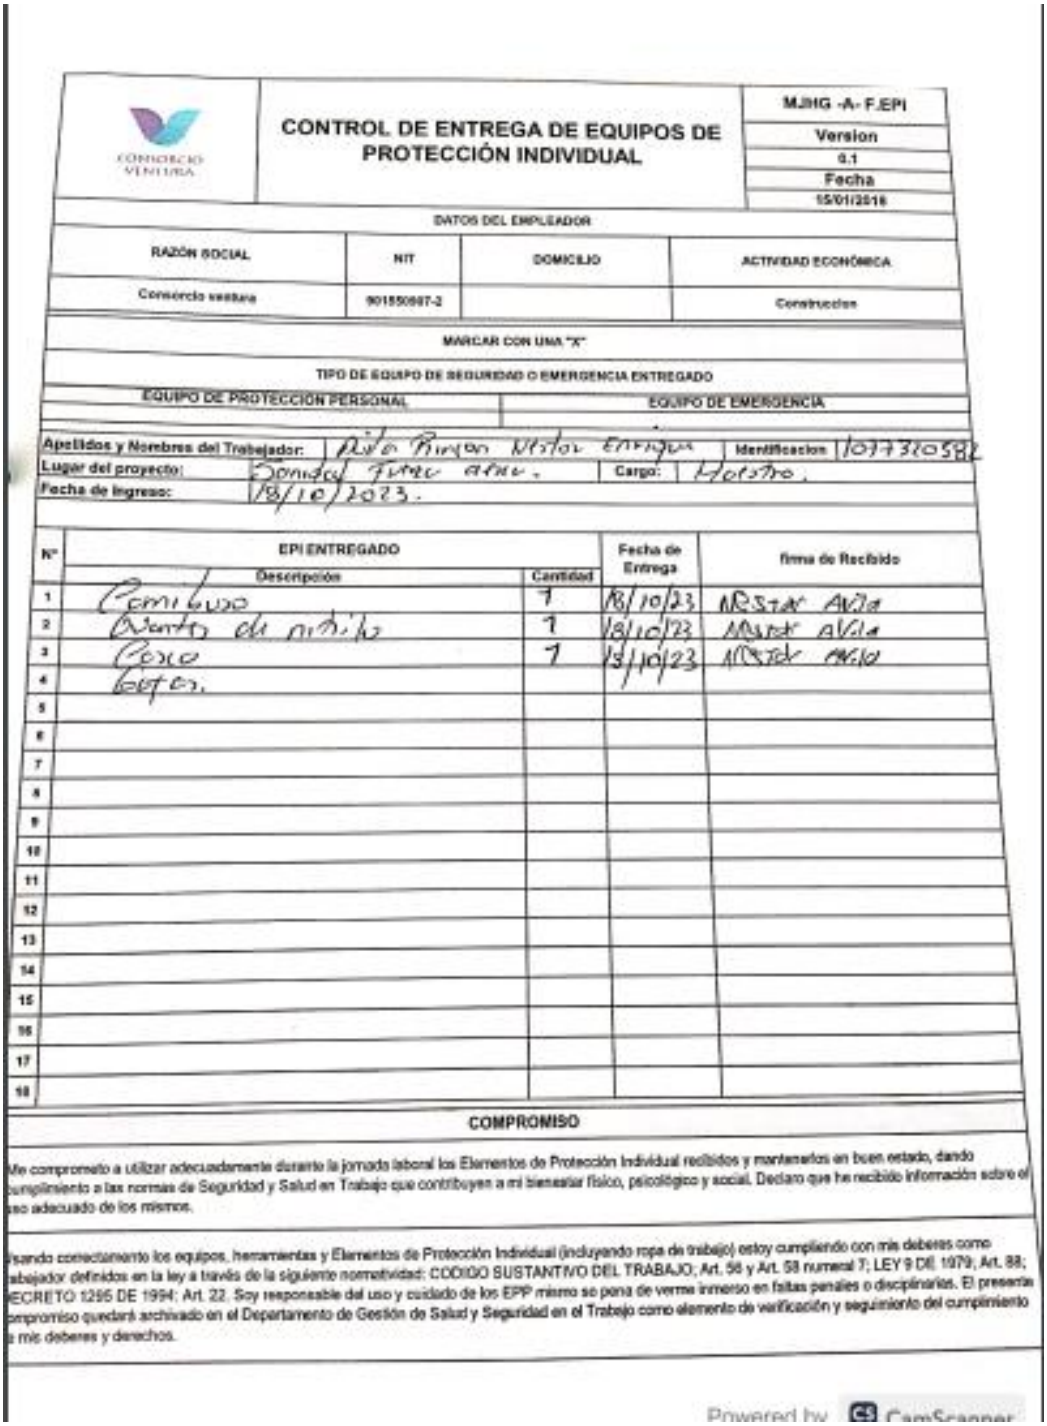

CONSORCIO VENTURA

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MJHG -A- F.EPI
Version
0.1
Fecha
15/01/2018

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONÓMICA
Consorcio ventura	901550697-2		Construccion

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: Ruiz Rincon Victor Enrique | Identificacion: 1077320582
Lugar del proyecto: Sonidos Fuerz aerea. | Cargo: Motorista.
Fecha de Ingreso: 18/10/2023.


N°	EPI ENTREGADO		Fecha de Entrega	firma de Recibido
	Descripción	Cantidad		
1	Camisa	1	18/10/23	MRSTAR AVILA
2	Pantalon dril	1	18/10/23	MRSTAR AVILA
3	Casco	1	18/10/23	MRSTAR AVILA
4	Botas.			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento a mis deberes y derechos.

Powered by CamScanner

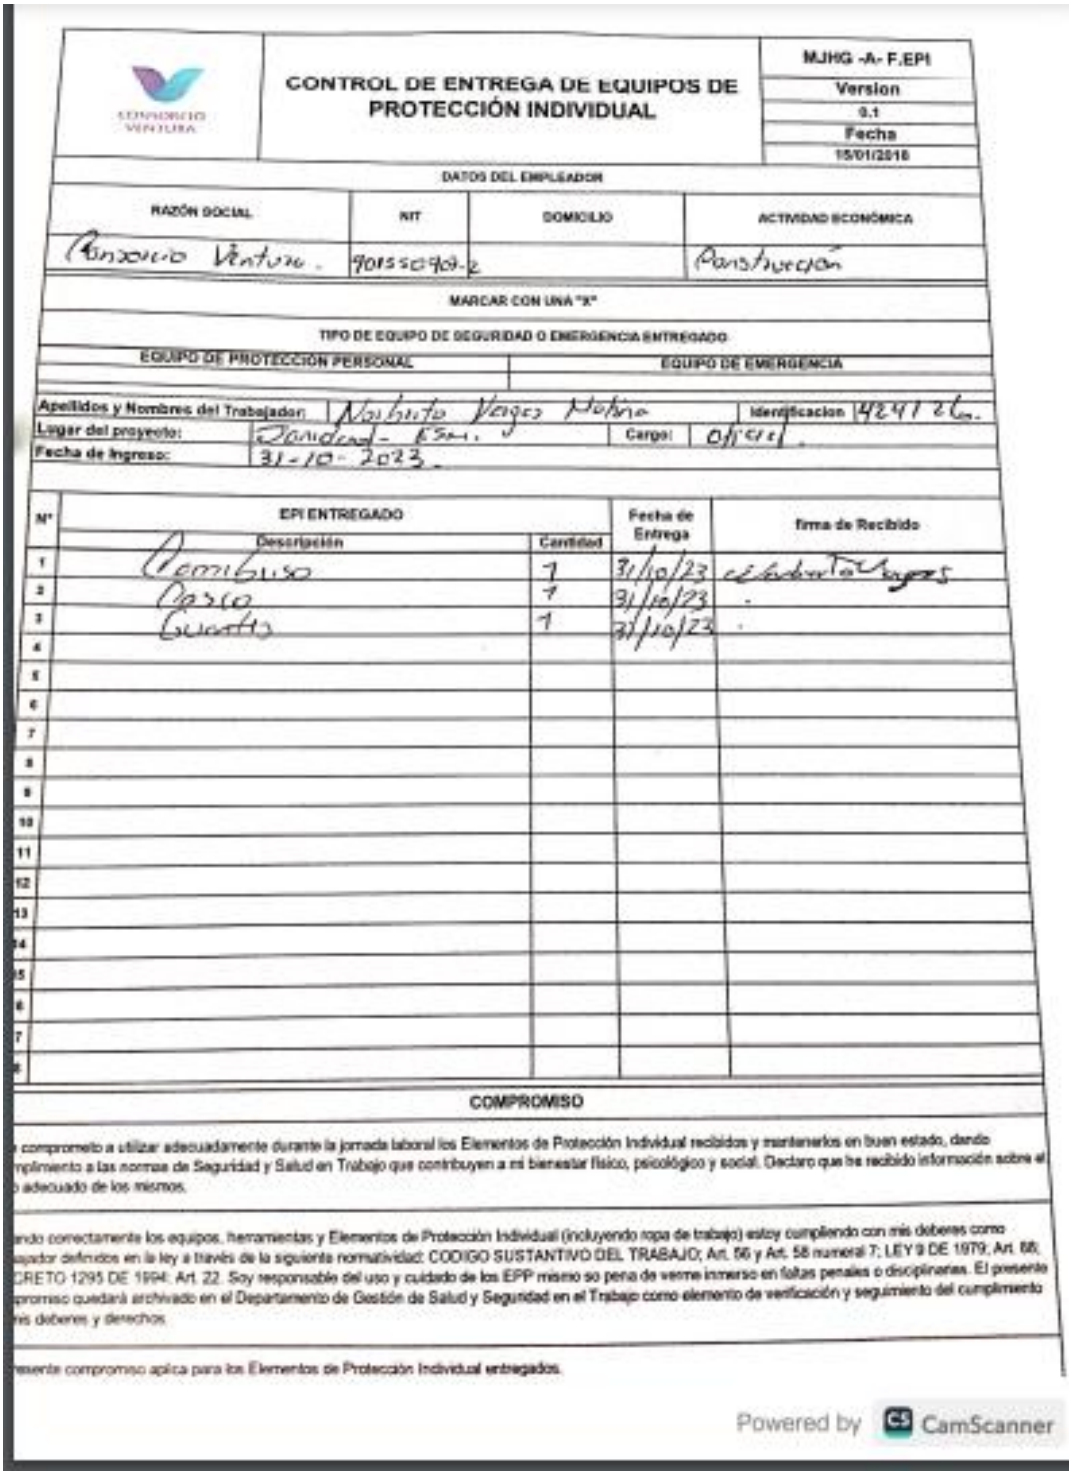

CONSORCIO VENTURA

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MJHG -A- F.EPI | Version 0.1 | Fecha 15/01/2018

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL	NIT	DOMICILIO	ACTIVIDAD ECONÓMICA
Consorcio Ventura	901550909-2		Construcción

MARCAR CON UNA "X"

TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	EQUIPO DE EMERGENCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador: Nolbito Vargas Molina — Identificacion: 4241 26..
Lugar del proyecto: Sanidad - ESM. — Cargo: Oficial
Fecha de Ingreso: 31-10-2023

N°	EPI ENTREGADO Descripción	Cantidad	Fecha de Entrega	firma de Recibido
1	Pantalon	1	31/10/23	
2	Casco	1	31/10/23	
3	Guantes	1	31/10/23	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

COMPROMISO

compromeso a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los Elementos de Protección Individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando mplimiento a las normas de Seguridad y Salud en Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el adecuado de los mismos.

ando correctamente los equipos, herramientas y Elementos de Protección Individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como ajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; CRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente promiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como elemento de verificación y seguimiento del cumplimiento is deberes y derechos.

esente compromiso aplica para los Elementos de Protección Individual entregados.

Powered by CamScanner

Anexo_3 charla de SST e inducion

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD					MJHG -A- F.IND
Proyecto	Fuerza aerea	Tema	autocuidado.		Fecha 15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM	Aplicado a	Trabajadores		Version 0.1
Fecha	16/11/2023	Expositor	Argenis Lopez		

Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
Nestor Oswaldo Avila	1077320582	oficial	3[illegible]2[illegible]79	consorcio	
Julian Garcia Arias	1013580533	Auxiliar	3219276692	consorcio	
Norberto Burgos	424726	oficial	3105892604	consorcio	
Freddy Pinzon	80060866	B. Obra	3[illegible]766	consorcio	
Jose Mateo [illegible]	1033579054	oficial	3143788013	consorcio	

OBSERVACIONES: Tema Tratados. el autocuidado Para Tu nombre lo indica. Cada uno de nosotros debemos de realizar cada actividad laboral siempre con los cuidados necesarios Para evitar algun tipo de accidente.

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD — MJHG -A- F.IND

Proyecto	Fuerza aerea			Tema	Información panel 534	Fecha	15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM			Aplicado a	Trabajadores	Version	0.1
Fecha	27/11/2023			Expositor	Argenis Lopez		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	[illegible]	1073599234	oficial	3145338[illegible]	Ventura	
2	Nestor avila	1077320552	oficial	3[illegible]	Ventura	
3	Roberto Vergara	4024726	Oficial	3115592[illegible]	Ventura	
4	Julian Garcia Arias	1013590937	Auxiliar	3210276668	Ventura	
5	Andres Rentes T	7435115	Asistente	3145117716	Ventura	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES: Tema Tratados: orden y aseo en todo lo que, Utilización correcta de EPP, importancia de los pausas activas en trabajos.

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD — MJHG -A- F.IND

Proyecto	Fuerza aerea			Tema	Riesgo publico.	Fecha	15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM			Aplicado a	Trabajadores	Version	0.1
Fecha	29/11/2023			Expositor	Argenis Lopez		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	[illegible]	1073599234	oficial	3145338[illegible]	Ventura	
2	Nestor avila	1077320552	oficial	3[illegible]	Ventura	
3	Roberto Vergara	4024726	Oficial	3115592[illegible]	Ventura	
4	Julian Garcia Arias	1013590937	Auxiliar	3210276668	Ventura	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES: Tema Tratados: Tener precaución en la calle con el Celular, hacer, ya que en estos Fechas, la delincuentes, entran al acecho de Ruquien Victima, para robarlos o causarles daño.

CONSORCIO VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Proyecto	fuerza aerea	Tema	Manipulacion Armamentos E.	Fecha	15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM	Aplicado a	Trabajadores	Version	0.1
Fecha	04/12/2023	Expositor	Argenis Lopez		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Jose M Ortiz	1013599737	Oficial	3145738885	Ventura	
2	Nestor Avila	1077332392	Oficial	3229246677	Ventura	
3	Humberto Vergara	412 4726	Oficial	3118592674	Ventura	
4	Julian Garcia Arro	1013590537	Auxiliar	3219276648	Ventura	
5	Andres Rogero T.	74360015	Residente	3156117116	Ventura	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Tema Recordo que se debe de tener Plan Corrido Si realiza trabajos con desenergizantes electricos, Ver que los peritutos Si encuentre en buen estado Que la atencion Si encuentre Igual, tener cuidado que sean los voltios indicados.

CONSORCIO VENTURA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD


MJHG -A- F.IND

Proyecto	fuerza aerea	Tema	Riesgo ergonomico.	Fecha	15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM	Aplicado a	Trabajadores	Version	0.1
Fecha	11/12/2023.	Expositor	Argenis Lopez		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Jose il Rolon	1013597237	oficial	3145138885	Ventura	
2	Nestor Avilo	1077320350	Oficial	3209266677	Ventura	
3	Humberto Venegas	424726	O Ficial	3115942078	Ventura	
4	Julian Garcia Arevalo	1013590537	Auxiliar	3219127664	Ventura	
5	Andres Rivero	7A360015	RESIDENTE	3145117116	VENTURA	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Tema: Verificación de cero Combustible en este individuo Peligro tipo de actividad, Para poder saber si algun Combustible cerca, ya que se puede generar algun tipo de accidente o incidente.

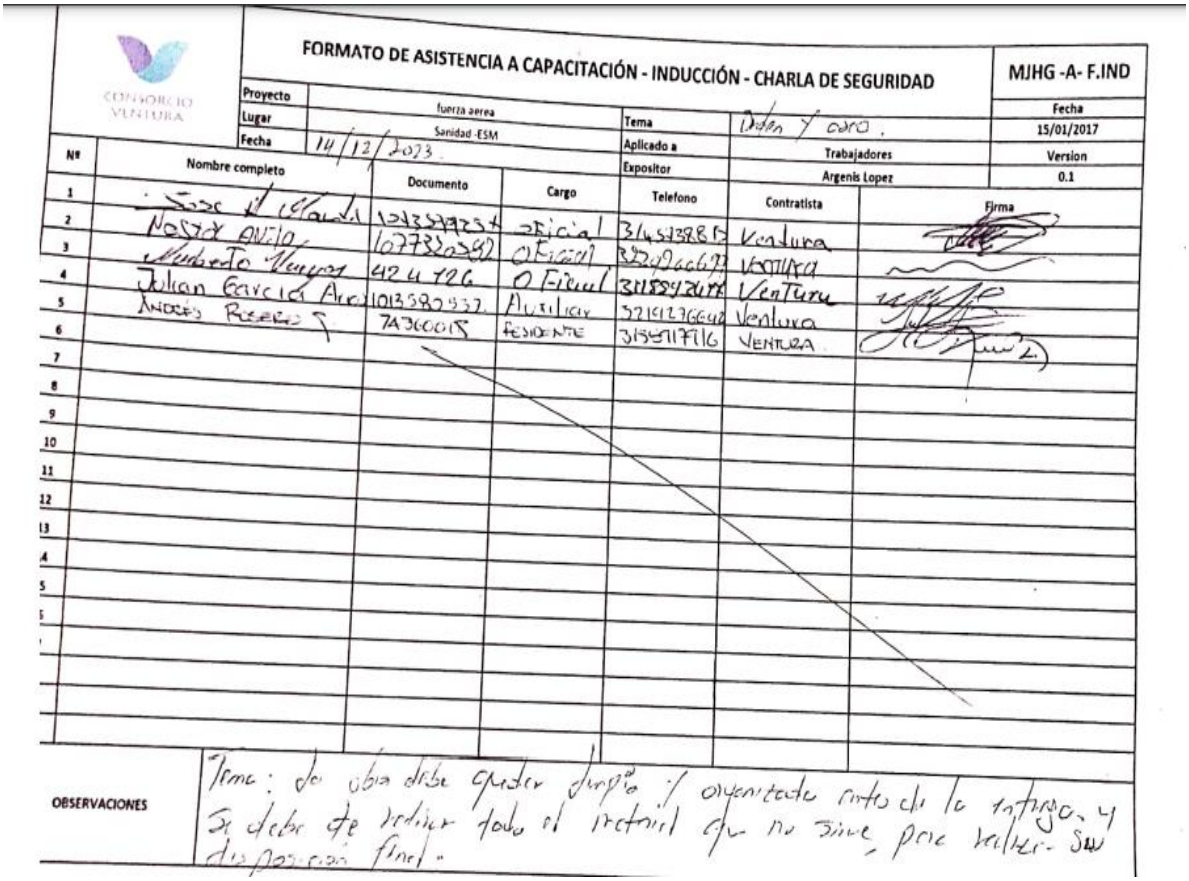

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Proyecto	fuerza aerea			Tema	Orden y aseo.	Fecha	15/01/2017
Lugar	Sanidad -ESM			Aplicado a	Trabajadores	Version	0.1
Fecha	14/12/2023			Expositor	Argenis Lopez		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Jose D Ceballos	1243579234	oficial	3145138857	Ventura	
2	Nestor Avila	1077320342	Oficial	3209466977	Ventura	
3	Humberto Vergara	424726	Oficial	3115942078	Ventura	
4	Julian Garcia Arc	1013582332	Auxiliar	3216276642	Ventura	
5	Andres Rivera T	74360015	Residente	3155717116	Ventura	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Firma: la obra debe quedar limpia y organizada antes de la entrega. y se debe de retirar todo el material que no sirve para realizar su disposición final.

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **MARIA JOSE HERRERA GUZMAN** identificada con tipo y número de documento **NI 52452955** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **02/10/2013**, con actividad económica principal código **5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISENO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISENO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en las bases de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es desde el **15/12/2023 12:30** y sus últimos **1** años o fracción para los eventos de **Accidente de Trabajo.**

A continuación, se relaciona únicamente los ítems por cada vigenica donde la empresa reportó eventos a la Administradora de Riesgos Laborales.

INFORMACIÓN DETALLADA CONSTANCIA	AÑO
	2023
Número promedio de trabajadores afiliados a riesgos laborales	1
Accidentes de Trabajo	
Número de Accidentes de Trabajo reportados por la empresa a la ARL por los años de consulta	0
Número total de AT calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de AT MORTAL calificado de origen profesional (fecha reporte vs origen) por la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IT de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IPP de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IT por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Accidente de Trabajo de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número total de IT reportadas (fecha de radicación IT) por Accidente de Trabajo y FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de IPP por FALLO JUDICIAL de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de PI de la empresa por cada uno de los años consultados	0
Número de Accidente Trabajo (fecha de reporte) con prestación económica de PS-SP de la empresa por cada uno de los años consultados	0

Powered by CamScanner

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
Fecha Reporte: Corresponde al DD/MM/AAAA en la cual se realizó el aviso oficial del evento a POSITIVA
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador
IT: Incapacidad Temporal
Fecha de Radicación IT: Corresponde a DD/MM/AAAA en la cual se realizó presentación de la documentación de la IT a POSITIVA
IPP: Incapacidad Permanente Parcial
PI: Pensión de Invalidez
PS: Pensión de Sobrevivientes
SP: Sustitución Pensional

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de Expedición: **15/12/2023 12: 30**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=AJOdLoxaOvMztrtCaShlUKCl6mmeMCj5LrFuAf9FoZs=)

Para verificación de Positiva

Powered by CamScanner

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 440492 - 2023 - 1**

Nombre de la Empresa :	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	901340813
Nombre Representante Legal :	Maria Jose Herrera Guzman		
Responsable SG-SST :	Argenis lopez	Correo SG-SST :	argelopez1904@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2023	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	lopezargenis755@gmail.com	Cantidad Trabajadores :	10

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
5439004	**Riesgo V**	**OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CONOPERADORES)**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	Cumple totalmente	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 2/9/2024 5:25 PM
Fecha de Diligenciamiento : 2/9/2024

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 413409 - 2023 - 1**

Nombre de la Empresa :	Maria Jose Herrera Guzman		
Tipo Persona	Natural	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Cédula de ciudadanía	Número de Documento	52452955
Nombre Representante Legal :	Maria Jose Herrera Guzman		
Responsable SG-SST :	Argenis lopez	Correo SG-SST :	argelopez1904@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2023	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	maria_josehg@yahoo.com	Cantidad Trabajadores :	10

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
5439004	**Riesgo V**	**OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (CONOPERADORES)**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	Cumple totalmente	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 2/9/2024 5:34 PM
Fecha de Diligenciamiento : 2/9/2024

PRODUCTO **CORONA** | **SANITARIOS**

ALUVIA

Sanitario de dos piezas - Taza Alongada



La linea Aluvia se inspira en el movimiento y caída del agua en la naturaleza, dando como resultado un producto con formas orgánicas y líneas fluidas, generando superficies más suaves, amigables y limpias.

- Limpieza óptima de la taza gracias a sus agujeros expuestos que evitan la acumulación de gérmenes y bacterias.
- Capacidad de evacuación de sólidos **500 gr**
- Consumo de agua de **3. litros - 1.0 gpf**
- Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Pestaña en el asiento, diseñada para una experiencia más higiénica.

Tecnología
EcoFlush
La más ahorradora de Corona

REFERENCIA:

203501001
SANITARIO ALUVIA AL

203501031
SANITARIO ALUVIA BONE AL

COLOR:

100 Blanco
103 Bone

INFORMACIÓN TÉCNICA

Uso	Residencial
Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Dimensiones generales **(Largo x Ancho x Alto)**	715 x 367 x 730 mm aprox. 28-1/8 x 15-3/16 x 28-3/4 plg aprox.
Consumo de agua	3.7 Lpf / 1.0 gpf
Presión de agua	20 - 80 PSI / 1.38 - 5.52 Bar
Capacidad de descarga	500 gr
Sistema de descarga	Por gravedad
Espejo de agua	130 x 210 mm / 5-1/8 x 8-1/4 plg
Altura de sello	60 mm / 2-3/8 plg
Diámetro del sifón	45 mm / 1-3/4 plg
Tipo de sifón	Expuesto
Medida de instalación	305 mm / 12 plg
Peso Neto	30.1 kg / 66.3 lb aprox.
Tipo de accionamiento	Botón PUSH
Tipo de asiento	Cierre lento
Válvula de llenado	Hidrostática ajustable
Válvula de descarga	Nuki ajustable

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empacado **(Largo x Ancho x Alto)**	**TZ:** 737 x 437 x425 mm aprox. 29 x 17-3/16 x 16-3/4 plg aprox. **TQ:** 380 x 240 x 400 mm aprox. 14-15/16 x 9-7/16 x 15-3/4 plg aprox.
Peso bruto	24.6 kg / 54.2 lb aprox.
Volumen	0.14 m³ / 4.8 ft³

REPUESTOS

Válvula Llenado:	O22850001	Hidrostática Universal Plus
Válvula Descarga:	806200001	Válvula descarga nuki advance
Accionamiento:	933709991	Tapa tanque Aluvia blanco
Asiento:	959080001	Asiento Versatile RD blanco

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana,** y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

GARANTÍA COMPLETA
PARA SIEMPRE
En porcelana

GARANTÍA DE 5 AÑOS
En grifería tanque

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y **EDGE.**

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

corona

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sos**

corona.co

ALUVIA


Sanitario de dos piezas - Taza Alongada Compacta

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

PLANOS TÉCNICOS*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

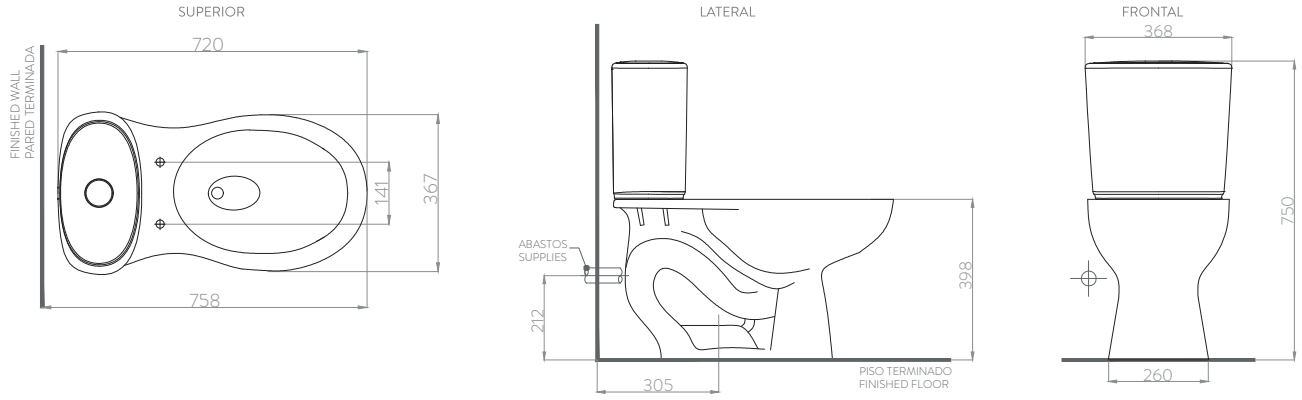

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota

17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE

MIXTO
Embalaje procedente de fuentes responsables
FSC® C011320

Fibra virgen: **70%**

Reciclado: **30%**

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua		Línea Base **EDGE**		Línea Base **LEED V.4**		Reducción vs. Línea Base **EDGE***	Reducción vs. Línea Base **LEED V.4****
Aluvia	3.7 Lpf	1.0 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	6.0 Lpf	1.6 gpf	20%	20%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%.**

"Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La **china vitrificada (Cerámica Vítrea)** se componen en su totalidad de materiales inertes que son **compuestos inorgánicos.** Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad"

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá **(601) 404 88 84** / Resto del país **01 8000 5120 30**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109** / Nicaragua **(505) 2249-5521**
El Salvador **(503) 2274-4620** / Honduras San Pedro Sula **(504) 9470-9391**
Honduras Tegucigalpa **(504) 9441-1968** / Costa Rica **(506) 4001-4966** / Panamá **(507) 8000-202**
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

Versión: 03/2022

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

icontec
Sello de Calidad
NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

Asiento

OTRAS RESINAS NYLON, PVC, PLÁSTICO	7 OTRO	07 O	POLIPROPILENO	5 PP	05 PP

Válvula de entrada

OTRAS RESINAS HDP, POM, EPDM, ABS, PVC	7 OTRO	07 O	POLIPROPILENO	5 PP	05 PP

Válvula de salida

OTRAS RESINAS PVC, CAUCHO	7 OTRO	07 O	POLIPROPILENO	5 PP	05 PP
			POLIESTIRENO	6 PP	06 PP

Sistema de accionamiento

OTRAS RESINAS ABS, POM, ACERO INOXIDABLE	7 OTRO	07 O

Los accesorios de instalación, fontanería y asientos de artefactos sanitarios se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

corona

GRIFERÍAS **CORONA** | **LAVAMANOS**

ALUVIA

Grifería lavamanos 4 pulgadas triceta

Aluvia integra líneas y formas como las de una erosión aluvial, su forma robusta está inspirada en el agua esculpiendo las rocas a través de los años dando paso a superficies más suaves, amigables y limpias evitando que haya acumulación de impurezas. El conjunto de manijas es el resultado de su diseño ergonómico, brindando un agarre cómodo sin importar el agua y el jabón.

- Grifería **ultra ahorro,** consumo de 5,7 litros por minuto.
- **Cierre fácil** giro práctico de tan sólo 90°.
- **Acabado superior,** mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- **Mayor ángulo de salida** permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- **Fácil limpieza:** Diseño que evita la acumulación de impurezas.



REFERENCIA (S): Cj. AV1020001 / Subcj. AV1040001

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
· Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Material: Cuerpo; plástico.
Manija; plástico.
· Peso Neto: 330 gr. - 0,72 lb.
· Dimensión grifería (H x L x W): 151 x 165 x 156 mm.
5 15/16 x 6 1/2 x 6 1/8 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
· Capacidad de flujo máximo a **60 psi**: 8,3 L/min.
· Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.

SERVICIO TÉCNICO · CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES · NO CONTAMINA EL AGUA CON PLOMO · ULTRA AHORRO DE AGUA · 30 AÑOS DE GARANTÍA · 5 AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)

PLANOS TÉCNICOS

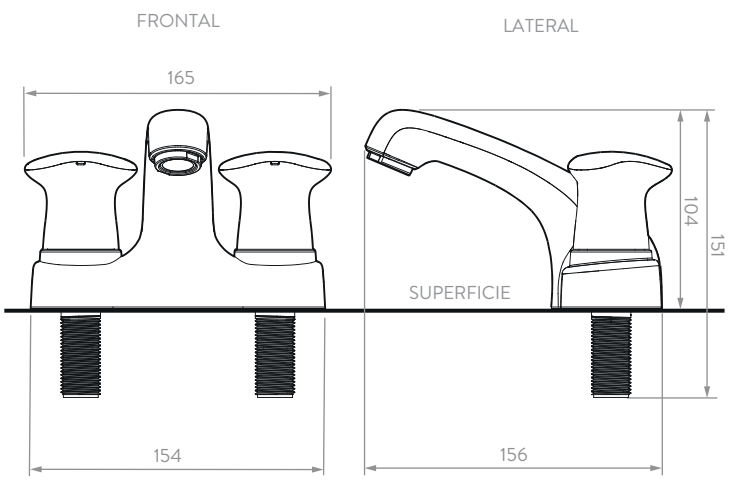

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Compatibilidad conexión estándar de fácil instalación.
Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS


LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

ALUVIA
Grifería lavamanos 4 pulgadas triceta

DIAGRAMA DE CAUDAL

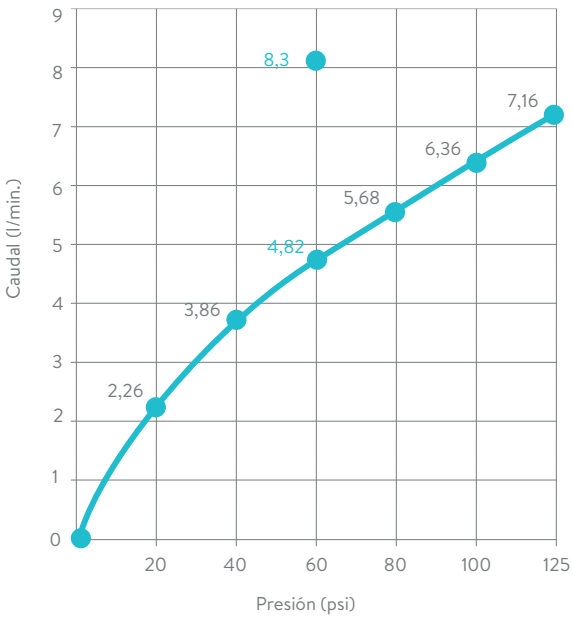

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	60	8,3	Máximo

PRESIÓN (psi)	CAUDAL PROM. (L/min.)
20	2,26
40	3,86
60	4,82
80	5,68
100	6,36
125	7,16

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA LAVAMANOS 4 PULGADAS ALUVIA.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. **http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.**
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar recomendaciones.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

AV1020001 CJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA (Incluye sifón, desague y varilla accionadora).
AV1040001 SUBCJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA (No incluye varilla accionadora).
AV1043331 PQTE SUBCJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA X3

REPUESTOS

O19090001 UNIDAD CIERRE 90°
O10370001 EMPAQUE Y RESORTE
O20720001 TUERCA ASEGURADORA
O24750001 MANIJA ALUVIA TRICETA
O24460001 AIREADOR HEMBRA

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Etiquetas ambientales tipo I.
NTC 5871:2011

A'DESIGN AWARD WINNER 2017 GOLD

La linea Aluvia obtuvo el premio A' Design Award de Oro, uno de los reconocimientos internacionales de diseño más importantes y prestigiosos en la categoría "Bathroom Furniture and Sanitary Ware Design" 2016 - 2017.

icontec Sello de Calidad
NTC 1644
Accesorios de suministro en fontanería


icontec Sello con Reglamento Técnico
Resolución 501 de 2017
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

corona

FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

Lavamanos Aluvia 4p

Ref.: AV1010001

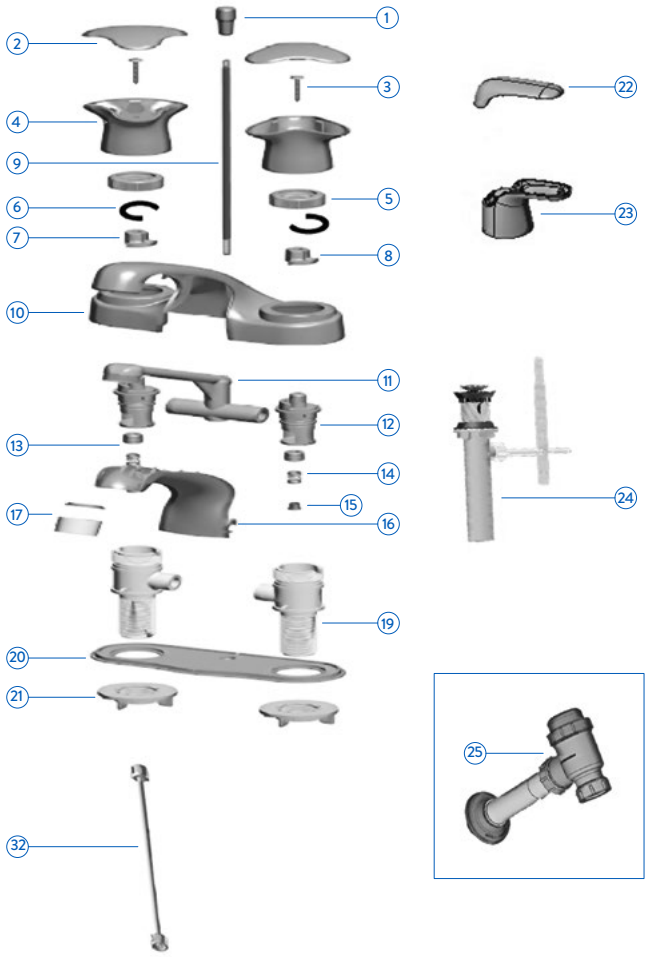

OTRAS RESINAS ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO,PMMA, POM SANTOPRENE	7 O	07 OTRO	POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD Bolsas plásticas, Bolsas de superlón	4 LDPE	04 PEBD

Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

MATERIAL RECICLADO

57% METAL

(Viruta, canales, rotura, limadura y recuperación de obsoletos) / Total MP metal

10% PLÁSTICO

(Recirculante de canales, rotura y recuperado de PT) / Total MP plásticas

USO AGUA EN EL PROCESO

66% AGUA RECIRCULADA

Agua utilizada en procesos de fabricación y tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, reintegrándose a los procesos industriales.

corona

Lavamanos Aluvia 4p

Ref.: AV1010001

NO.	CJ GF LVM 4P PLNCA ALUVIA AV1010001	CJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA AV1020001	SUBCJ GF LVM 4P PLNCA ALUVIA AV1030001	SUBCJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA AV1040001	PQTE SUBCJ GF LVM 4P PLNCA ALUVIA X3 AV1033331	PQTE SUBCJ GF LVM 4P TCTA ALUVIA X3 AV1043331	NOMBRE	MATERIAL	ACABADO
1	1	1					Botón desagüe lavamanos aluvia	ABS	Cromado
2		2		2		6	Tapa manija cruceta aluvia	ABS	Cromado
3	2	2	2	2	6	6	Tornillo autorroscante inoxidable	Acero inoxidable	Natural
4		2		2		6	Manija triceta aluvia	ABS	Cromado
5	2	2	2	2	6	6	Tuerca bonete cuerpo cierre rápido	POM	Natural
6	2	2	2	2	6	6	Retenedor escudo aluvia	POM	Natural
7	1	2	1	2	3	6	Acople caliente manija decorada cierre rápido 90 grados	POM	Natural
8	1		1		3		Acople frío manija decorada cierre rápido 90 grados	POM	Natural
9	1	1					Varilla accionadora cromada	Latón	Cromado
10	1	1	1	1	3	3	Carcaza superior lavamanos 4 pulgadas aluvia	ABS	Cromado
11	1	1	1	1	3	3	Cuerpo central 4 pulgadas aluvia	POM	Natural
12	2	2	2	2	6	6	Unidad cierre rápido 90 grados	Varios	Natural
13	2	2	2	2	6	6	Empaque de selle	Caucho	Natural
14	2	2	2	2	6	6	Resorte monocontrol	Acero inox	Natural
15	2	2	2	2	6	6	Buje empaque de selle	POM	Natural
16									
17	1	1	1	1	3	3	Aireador plástico 1.5 gpm rosca interna	Varios	Cromado
18	1	1	1	1	3	3	Carcaza inferior lavamanos 4 pulgadas aluvia	ABS	Cromado
19	2	2	2	2	6	6	Cuerpo lateral lavamanos 4 pulgadas cierre rápido	POM	Natural
20	1	1	1	1	3	3	Empaque base gris lavamanos 4 pulgadas aluvia	Caucho	Natural
21	2	2	2	2	6	6	Tuerca aseguradora lavamanos / lavaplatos	POM	Natural
22	2		2		6		Tapa manija palanca aluvia	ABS	Cromado
23	2		2		6		Manija palanca aluvia	ABS	Cromado
24	1	1					Subensamble desagüe automático cromado	Varios	Natural
25	1	1					Subensamble sifón botella	Varios	Natural
26	1		1		3		Caja lavamanos 4 pulgadas palanca aluvia	Cartón	Impreso
27		1		1		3	Caja lavamanos 4 pulgadas triceta aluvia	Cartón	Impreso
28	1	1	3	3	7	7	Etiqueta código de barras	Papel	Impreso
29	1	1	1	1	3	3	Hoja de instrucción lavamanos 4 pulgadas aluvia	Papel	Impreso
30	2	2	1	1	3	3	Bolsa plástica 39936	PEBD	Natural
31					1	1	Bolsa plástica transparente	PEBD	Natural
32	2	2					Acople griflex lavamanos	Varios	Natural
33	1	1	1	1	3	3	Etiqueta código de barras	Papel	Impreso
34			1	1	3	3	Sticker lavamanos aluvia	Papel	Natural

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 888 / Resto del país: 01 8000 5120304

CENTRO AMÉRICA: Panamá (507) 800 0202 / Guatemala (502) 18006240109 / Costa Rica (506) 4001 4966 / Nicaragua (505) 2249 5521 / Salvador (503) 2274 4620 / Honduras (504) 9441 1968 (Tegucigalpa) / Honduras (504) 9470 9391 (San Perdro Sula) / Ecuador 1800001065 / Perú 8005 4124 / México 01 800 705 1020

Correo de atención en Centro América: **postventa@incesastd.com**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona**.co

corona



Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	**Alcoba**
Cilindro	**Tubular**
Manillas	**Pomo**
Material	**Acero inoxidable**
Uso	**Alcoba**
Color	**Satinado**

Fabricante

Modelo	**6871-ET**
Origen	**Importado**

Más detalles

Garantía	**12 meses**



Ficha técnica

Especificaciones



Tipo	**Cerraduras**
Reversible	**Si**
Observaciones	**La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.**
Material	**Acero 304**
Tipo Pestillo	**Cerradura**
País de Origen	**China**
Color	**Acero inoxidable**

Más detalles


Garantía	**12 meses**
Características	**Cerradura De Pomo Tubular Para Baño: Apertura Exterior Con Un Objeto Plano, Interior Asegura Girando, En Acero Inoxidable.**

UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

EL SISTEMA CIELO RASO EN PVC, REPRESENTA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION UN AVANCE TECNOLOGICO Y FUTURISTA. ES UNA SOLUCION INTELIGENTE Y ECOLÓGICA QUE SATISFACE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO EN CUANTO A: CALIDAD, DISEÑO, INNOVACION Y DURABILIDAD.

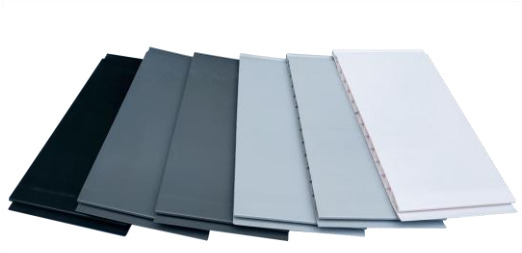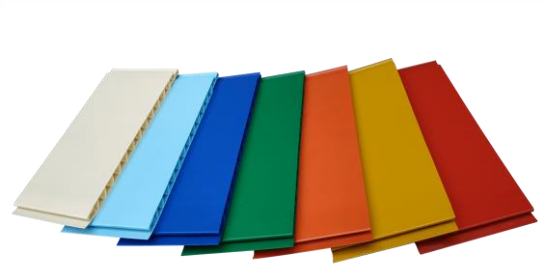

UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

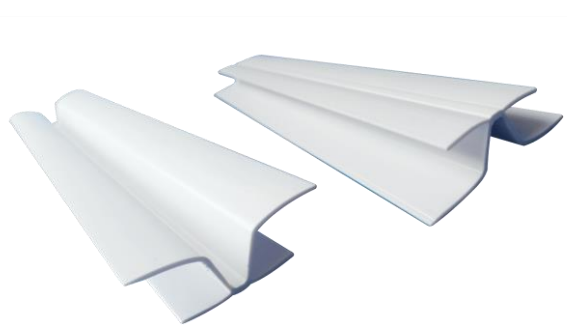CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SISTEMA

- PERFIL LAMA LISA (PL)
- PERFIL CORNISA LISA
- PERFIL REMATE EN "U"
- PERFIL ANGULAR ESCUALIZABLE

COLORES

BLANCO

AMADERADOS
- MADERA CLARO
- CEREZO
- MADERA OSCURO

ESCALA GRISES
- GRIS CLARO
- GRIS OSCURO
- NEGRO

FIESTA
- BEIGE
- AZUL PASTEL
- AZUL MAR
- VERDE ESMERALDA
- NARANJA
- AMARILLO TOSTAO
- ROJO

PASTELES
- COSECHA DE TRIGO,
- VERDE SEDA,
- VERDE CENIZO,
- SOL DE PRIMAVERA,
- BRISA DE LILAS,
- PERA EXOTICA,
- NARANJA FLOR DE LA PASION,
- NARANJA BATIDO DE MANGO,
- VALLE DORADO

UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**


USOS DEL SISTEMA	• **LAMINAS PVC:** ENSAMBLADAS POR EL SISTEMA MACHIHEMBRADO • **PERFIL CORNISA:** GENERA ACABADO EN LOS BORDES • **PERFIL ANGULAR ESCUALIZABLE:** MANEJO DE JUNTA ENTRE LAMA Y LAMA SI SE REQUIERE, EN AREAS SUPERIORES A LA MEDIDA LINEAL DE LAS LAMAS • **PERFIL REMATE EN "U":** GENERA ACABADO EN EL PERIMETRO DE LAS LAMPARAS DE ILUMINACION

DESCRIPCION PRODUCTO	LONGITUD ML	ANCHO CM	PESO BRUTO KG
PERFIL LAMA (PL)	**3,4,5,6 ML**	**25 CM ÚTIL**	**2400 KG (M'2)**
PERFIL CORNISA	**3,4,5,6 ML**	**3,50 CM**	**0.107 KG (ML)**
PERFIL REMATE U	**3,4,5,6 ML**	**1,50 CM**	**0.76 KG (ML)**
PERFIL ANGULAR ESCUALIBLE	**3,4,5,6 ML**	**4.00 CM**	**0,138 KG (ML)**


UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

PRESENTACION PLANOMETRICA DEL SISTEMA


LAMAS PL - PLANO



PERFIL ANGULAR ESCUALIZABLE



REMATE EN "U"



UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

PROPIEDADES FISICAS	**DESCRIPCION** PRODUCTO 100% IMPERMEABLE, IDEAL PARA CIELOS, MUROS Y REVESTIMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS CON AMBIENTES ASEPTICOS COMO PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, FRUTAS, LABORATORIOS, COLEGIOS, HOSPITALES ETC. FORMULACION PROTECCION UV GARANTIZADA SOLO PARA **USO** EN INTERIORES. TEMPERATURA DE TRABAJO -25^0 A 50^0 CENTIGRADOS, RESISTENTE AL IMPACTO GENERADOS POR PERFORACIONES O MECANISMOS PROPIOS DE LA INSTALACION. AISLANTE TERMICO, SU COMPORTMIENTO A TEMPERATURAS EXTERNAS LO HACE APTO PARA EL USO EN REVESTIMIENTOS DE CAMARAS FRIGORIFICAS ASEGURANDO HERMETISMO DE LA FUENTE DE RUIDO • MATERIAL PVC RIGIDO 100% ORIGINAL • AUTO EXTINGUIBLE (TESTEADO POR EL CERTIFICADO 657 004 IPT) INMUNE A HONGOS, BACTERIAS, MUSGOS, Y MOHOS • OPACIDAD ALTA • AISLANTE ACUSTICO (ATENUACION HASTA DEL 80%)
PROPIEDADES QUIMICAS - BIOLOGICAS Y ELECTRICAS	**DESCRIPCION** • RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS Y • NO TIENE OLOR NI SABOR • RESISTENTE A SOLVENTES: THINNER, VARSOL, ALCOHOLES • NO ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD **LA CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMO “AUTO EXTINGUIBLE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA: MATERIAL DE MUY BAJA PROPAGACIÓN DE LLAMA” HACEN ADEMÁS DE ESTE PRODUCTO LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CIELOS RASOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GNC.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	• EN GENERAL PARA AMBIENTES NORMALES QUE PUEDAN TENER EXPOSICION AL POLVO Y GRASA LA LIMPIEZA DEBE SER FRECUENTE • PARA SITIOS QUE REQUIEREN LIMPIEZA EXAUSTIVA Y MANTENIMIENTO FRECUENTE: PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS SE PUEDE USAR AGUA Y JABON.

UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

PRESENTACION Y EMPAQUE DE LAS LAMINAS EN PVC

DENOMINACION	ML PRODUCTO	M'2 PRODUCTO POR PAQUETE	DIMENSIONES EMPAQUE			PESO BRUTO POR UNIDAD DE EMPAQUE APROX (KG)
			LARGO	ANCHO	UNIDAD DE EMPAQUE	
PERFIL LAMA LISA (PL)	3 ML	12,00 M2	3,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	28,80 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	4 ML	16,00 M2	4,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	38,40 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	5 ML	20,00 M2	5,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	48,00 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	6 ML	24,00 M2	6,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	57,60 KG

PRESENTACION Y EMPAQUE ACCESORIOS PARA LAMINAS EN PVC

DENOMINACION	ML PRODUCTO	DIMENSIONES EMPAQUE			PESO BRUTO UNIDAD DE EMPAQUE (KG)			
		LARGO	ANCHO	UNIDAD DE EMPAQUE	3.00 ML	4.00 ML	5.00 ML	6.00 ML
PERFIL CORNISA LISA	3,4,5,6 ML	3,00 ML	25 CMTS	25 UNIDADES	8,025 KG	10.7 KG	13,37 KG	16,05 KG
PERFIL REMATE EN "U"	3,4,5,6 ML	4,00 ML	25 CMTS	50 UNIDADES	11.4 KG	15,2 KG	19,00 KG	22,8 KG
PERFIL ANGULAR ESCUALIZABLE	3,4,5,6 ML	5,00 ML	25 CMTS	25 UNIDADES	10.35 KG	13,8 KG	17,25 KG	20,7 KG

UNIPERFILES PERFILES EN PVC	**FICHA TECNICA** **SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS**	**FECHA** **2019 – 25 - 07**

MANEJO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	EL PRODUCTO EMBALADO DEBE ALMACENARSE SOBRE ESTIBAS, PALLETS O ESTANTERÍA, ACOSTADO A LO LARGO, EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA DARLE MAYOR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y EVITAR DEFORMACIONES. DURANTE EL TRANSPORTE SE DEBE TENER SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA QUE EVITE DEFORMACIONES, PREFERIBLEMENTE SE DEBE APILAR HORIZONTALMENTE PARA DARLE MAYOR SOPORTE ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA TENER UN DISPOSITIVO PLANO INCLINADO CON UN ÁNGULO DE APROXIMADAMENTE 80^0 Y UN SOPORTE EN LA PARTE INFERIOR QUE EVITE DESLIZAMIENTOS Y DEFORMACIONES. MAXIMO SE DEBERÍA ALMACENAR EN ESTA POSICIÓN DE 8 A 10 PAQUETES DE 4 LAMAS C/U.

LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA SE HA ELABORADO CON BASE EN EXPERIENCIAS PRACTICAS, NO EXIME AL USUARIO DE HACER ENSAYOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUTO.

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
ANTICORROSIVO

ANTICORROSIVO

MÁXIMA PROTECCIÓN



DESCRIPCIÓN:

Anticorrosivo base solvente formulado a partir de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad. El producto cuenta con alto rendimiento, adherencia y secado rápido.

USOS:

Producto diseñado para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre superficies metálicas ferrosas en ambientes interiores o exteriores tales como: puertas, ventanas, rejas, etc.

VENTAJAS:

- Evita la corrosión
- Mejora la durabilidad de superficies metálicas expuestas a la intemperie.
- Resistente a grasas, aceites, ambientes húmedos.
- Secado rápido
- Excelente adherencia, rendimiento y cubrimiento.
- Producto libre de plomo y cromo

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme, limpia (libre de grasa, oxido, polvo, pintura deteriorada, humedad), asegurando condiciones que garanticen la adherencia.

Resanar imperfecciones de la superficie y/ o defectos menores. Lijar las superficies brillantes y lisas para mejorar la adherencia.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, sin embargo, por su alta viscosidad se recomienda diluir con thinner o Varsol en una relación máxima del 10%.

El uso de solventes no recomendados para la dilución afecta el desempeño final del producto, ocasionando defectos en el acabado y durabilidad.

APLICACIÓN:

Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 2 horas para la segunda mano. Permita un secado de 6 a 8 horas para dar el acabado final a la superficie.

ANTICORROSIVO

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad (KU)	110 - 115
Densidad (Kg /Gal.)	4.0-4.2 (Varía entre colores)
Secado al tacto (Horas) (HR 60% y T 25°C)	2-3
Secado para acabado final (horas) (HR 60% y T 25°C)	6-8
Rendimiento teórico (m2/ gal)	20
Manos recomendadas	2

Nota: el rendimiento real del producto puede variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca depositada.

PRESENTACIONES:

Envase de 1/8 de galón, 1/4 de galón, de 1 Galón, caneca 5 galones y Tambor de 55 galones*.

*Bajo pedido especial

SEGURIDAD:

Contiene productos inflamables. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de ignición. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados. Produce vapores nocivos.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos peligrosos.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.

ESMALTE PREMIUM

ESMALTE SINTETICO

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético formulado a partir de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad. Ofrece un acabado brillante. El producto cuenta con propiedades de máxima resistencia, alto rendimiento, cubrimiento, adherencia y secado rápido.

USOS:

Producto diseñado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal como puertas, ventanas, rejas, muebles, madera, etc.



VENTAJAS:

- Alto cubrimiento
- Secado rápido
- Acabado brillante
- Excelente adherencia
- Alta resistencia a la luz y a la intemperie

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, oxido, polvo, pintura deteriorada), asegurando condiciones que garanticen la adherencia.

Se recomienda utilizar Anticorrosivo Pintumaxter® como pintura de fondo para proteger el sustrato.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, sin embargo, por su alta viscosidad se recomienda diluir con thinner, Varsol o xilol en una relación máxima del 10%.

El uso de solventes no recomendados para la dilución afecta el desempeño final del esmalte, ocasionando defectos en el acabado (color, brillo, durabilidad, etc.).

APLICACIÓN:

Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo un secado de 4 a 5 horas entre capas.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/8 de galon, 1/4 de galón, 1 Galón, Caneca 5 galones y Tambor.

ESMALTE PREMIUM

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad (KU)	105 - 110
Densidad (Kg /Gal.)	3,3 – 4 (Varía entre colores)
Secado al tacto (Horas)	2-3
Secado para repintado (Horas)	6-8
Rendimiento teórico (m2/ gal)	25
Manos recomendadas	2

Nota: el rendimiento real del producto puede variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de película seca depositada.

SEGURIDAD:

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando

ALMACENAMIENTO:

Contiene productos inflamables. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados. Produce vapores nocivos.

No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en los teléfonos: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.

PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
PROTECMAX

PROTECMAX

VINILO MÁXIMA PROTECCIÓN/PINTUMAXTER



DESCRIPCIÓN:

Pintura 100% acrílica diluíble con agua, de acabado semi mate, de alta resistencia, secado rápido, fácil aplicación y excelente retención del color. Diseñada para uso en ambientes de alta exigencia e interiores. Disponible en una amplia gama de colores.

USOS:

Producto para uso recomendado principalmente en ambientes de alta exigencia, para decorar y proteger fachadas, patios, terrazas, revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción.
- Alta blancura.
- Gran variedad de colores.

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto y pintura deteriorada), evitando condiciones poco recomendables, que impiden la adherencia. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Acrílico Pintumaxter®. No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas alcalinas de manera directa.

Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, se recomienda diluir con agua en una relación máxima del 10%.

APLICACIÓN:

Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación. Brocha, pistola, permitiendo un secado de 2 horas entre capas.

No lavar antes de 30 días de haberse pintado. En la limpieza no debe utilizar elementos abrasivos.

PROTECMAX

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) / Acabado	> 10 – 35 - Semimate
Viscosidad a 25°C (KU)	100-110
Densidad (Kg/Gal)	5.1 – 5.3
pH	8,0- 9.2 Tiempo de secado entre capas
Tiempo de secado entre capas (horas) (a HR 60% y T 25°C)	1 1⁄2-2
Poder cubriente (%)	≥96%
Rendimiento Teórico	De 25m2/gal a 35 m2/gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

PRESENTACIONES:
Tarro de 1⁄4 de galón, de 1⁄2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD :
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes y gafas de seguridad. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando. No vierta el producto en desagües ni en cuerpos de agua.

ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico en el teléfono: 3103222881

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.

Grifería monocontrol


Single lever faucet

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Installation Instructive

NOTA: En construcciones nuevas, antes de instalar la grifería, es importante drenar la tubería para eliminar los residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto.
NOTE: *In new construction is important to drain the pipe system before installing the faucet in order to remove solid waste which may affect normal operation of the cartridges that come with the product.*

Este instructivo también aplica a otras referencias de griferías tanto para LAVAMANOS como LAVAPLATOS.
This instructive also applies to other lavatory or kitchen faucets references.




SIGA LA SECUENCIA NUMÉRICA PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN:
FOLLOW THE NUMERIC SEQUENCE FOR A CORRECT INSTALLATION:

1. Ajuste las mangueras **(6)** al cuerpo de la grifería **(1)** por las entradas de abajo, luego ajuste el tornillo (s) de fijación **(2)** al cuerpo de la grifería **(1).**
*Tighten the hoses **(6)** to the faucet body **(1)** on the inputs bottom it, then tighten the fixture screw (s) **(2)** in the faucet body **(1).***

2. Introduzca las mangueras **(6)** por el agujero del lavamanos* **(4),** asegúrese que el(los) anillo(s)de selle **(3)** estén ubicados en el orden correcto como se ilustra en la imagen.
*Insert the hoses **(6)** into the lavatory* hole **(4),** make sure that the sealing gasket(s) **(3)** is (are) in the proper order indicated on the figure.*

3. Asegure la grifería **(1)** al lavamanos* con la(s) tuerca(s) **(7)**, asegúrese que la(s) arandela(s) o platina(s) **(5)** y/o anillo de selle **(8)** estén en el orden indicado como se ilustra en el imagen.
*Fix the faucet **(1)** to the lavatory* with the fastening nut(s) **(7)**, make sure that the washer(s) or retainer(s) **(5)** and or sealing gasket(s) **(8)** is (are) in the order indicated on the figure.*

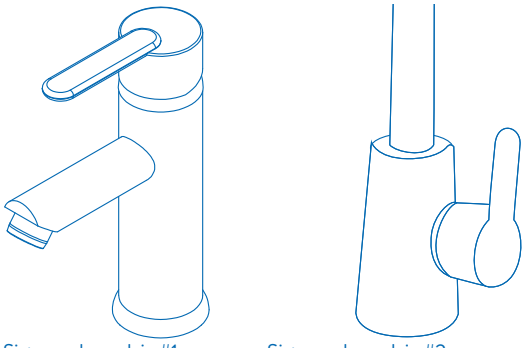


* Referencias no incluidas en el producto.
** References not included in the product.*

A.



Aplique silicona líquida anti hongos para prevenir filtraciones
Apply antifungal liquid caulk to prevent leaks.


B.



En algunas referencias la tuerca aseguradora posee tornillos de fijación; rósquelos cuando ubique el producto de la forma deseada.
In some references fastening nut has fixture screws; screw them whe the product have been located as wished.


MANTENIMIENTO DEL AIREADOR:
AIRATOR MAINTENANCE:

Realice el mantenimiento cuando note que el chorro de agua **no es espumoso** o cuando el **flujo de agua es bajo.**
Perform maintenance when you notice the water stream is ***not foamy*** *or the* ***flow of water is low.***

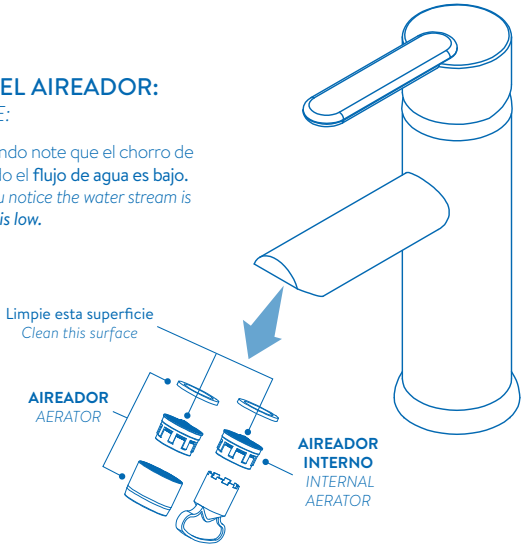

MANTENIMIENTO DE LA MANIJA:
HANDLE MAINTENANCE:

* Referencias no incluidas en el producto.
** References not included in the product.*
** En algunos productos la tuerca y el escudo son una sola pieza.
*** Some products have the nut and the escutcheon in the same piece.*
*** Para GRIFERÍA BRASSIA use ref. 022810001
*** To BRASSIA FAUCET use ref. 022810001*

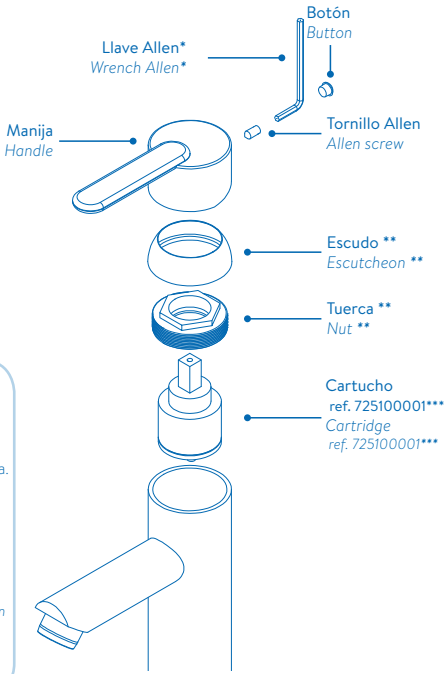


INSTALACIÓN DE LA REGULACIÓN[IV]
ANGLE VALVE INSTALLATION[IV]

- Corte el suministro principal del agua.
- Utilice cinta de teflón en las roscas para evitar fugas de agua.

[IV] válvula de regulación; ref. 96720/ 96700 / 96715

- *Cut the principal water supply.*
- *Use teflon tape in the threads, in order to avoid water leakages.*

[IV] angle valve; ref. 96720/ 96700 / 96715



CERTIFICADO DE GARANTÍA
Limitada **30 años**

Usted acaba de adquirir un Producto CORONA, diseñado y fabricado bajo las más estrictas normas y especificaciones de calidad, las que garantizarán un adecuado funcionamiento del mismo. A través de esta garantía, nuestra compañía le agradece haber elegido uno de nuestros productos y reconoce su confianza ofreciendo un servicio técnico especializado y una completa red de puntos de servicio autorizados GRIVAL® (PSAs y SAGs GRIVAL®) y la más completa información.
El certificado de Garantía Integral CORONA le representa que además de la tecnología aplicada en la fabricación para lograr la mejor calidad en cada producto CORONA, asegura que usted recibirá la respuesta de toda nuestra organización si su producto llega a presentar algún defecto en la fabricación, es decir las partes estructurales del producto que no sufren desgaste por el uso diario y la manipulación (cuerpo – chasis), contemplando también las piezas que gozan de algún acabado estético.

AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA GARANTÍA TENGA PRESENTE:

1. GARANTÍA DE COMPONENTES Y DE ELEMENTOS FUNCIONALES: No se extiende a aquellas piezas que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto, unidades de selle, empaques y manijas que por la manipulación y ambiente pueden desgastarse. Es importante que tenga en cuenta que esta garantía podrá hacerse efectiva siempre y cuando las condiciones de uso, instalación y mantenimiento del producto sean las especificadas en la respectiva hoja de instrucciones. La instalación del producto exige que ésta se haya realizado bajo los parámetros técnicos de plomería. La presente garantía no se extiende a aquellos daños o defectos derivados de errores de instalación, residuos sólidos en el sistema hidráulico o del no acatamiento a las indicaciones que CORONA incluye en la respectiva hoja de instrucciones que acompaña el producto. Al presentarse el reclamo por garantía, CORONA podrá enviar un técnico especializado para verificar el cumplimiento de los anteriores requerimientos.
De conformidad con las condiciones anteriores, CORONA reemplazará por uno de características y funcionalidades iguales o similares teniendo en cuenta la tecnología de producto existente al momento de hacerse efectiva la garantía, previo diagnóstico de falla.
2. GARANTÍA DE ACABADOS: Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.
En caso de no seguirse estas instrucciones la garantía de acabados no será aplicable, y en tal caso CORONA le podrá suministrar las partes para su reposición al precio vigente.
3. INADECUADO USO DEL PRODUCTO: Esta garantía no cubre daños derivados de ejercer una fuerza que exceda los límites de torque permisibles. CORONA no se hará bajo ninguna circunstancia responsable de daños causados a otros bienes, por efectos de reparación o instalación de los productos o porque el uso que se le está dando al producto no es el especificado.

RESPALDO DE MARCA

1. REPUESTOS ORIGINALES CORONA: Cuando se requieran repuestos de las partes funcionales, el compromiso de CORONA sera garantizar el suministro de repuestos por el término de **(5) años** a partir de la fecha de des continuación del producto y para repuestos relacionados con las partes estéticas, el compromiso se extiende por **(2) años** contados a partir de la fecha de des continuación del producto. Tenga en cuenta que de acuerdo a los términos especificados en la garantía y según aplique los repuestos tendrán un costo y los podrá adquirir dirigiéndose al Punto de Servicio Autorizado más cercano o contáctenos a la LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE de su país, para recibir orientación. Nuestros productos han sido diseñados para facilitar su mantenimiento.
Le recomendamos conservar el instructivo de instalación para dicho propósito.
2. SERVICIO DE INSTALACIÓN CORONA: Para mayor tranquilidad y garantizar la correcta manipulación del producto, CORONA le recomienda solicitar el servicio de instalación en los Puntos de Servicio Autorizado o a través de la LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA CORONA.
3. REPOSICIÓN POR FALTANTES: Para los casos donde usted evidencie que le falto algún componente de su producto de acuerdo al instructivo de instalación del mismo, le solicitamos dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto para su reposición.

CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

1. Haber seguido las indicaciones contenidas en esta garantía y en el instructivo de instalación del producto.
2. Haber registrado la garantía a través de los medios anteriormente descritos (preferiblemente).
3. No haber realizado ajustes o modificaciones al producto que alteren su adecuado funcionamiento.
4. Para cualquier reparación anterior, haber utilizado repuestos originales CORONA.

5.Haberse comunicado con nuestra linea de atención nacional o internacional o tener una orden de servicio oficial.
6.Presentar este certificado y/o su factura de compra original y el producto CORONA, este último en el evento en que los productos no se hayan instalado, en el punto donde se adquirió el producto.

No obstante, a pesar de haber vencido la garantía o de no ser esta aplicable, usted lo solicita, CORONA ofrecerá un servicio técnico especializado, el cual se facturara a la tarifa vigente en nuestra red nacional de Punto de Servicio Autorizado GRIVAL® (P.S.A GRIVAL®) o al SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® (S.A.G GRIVAL®).

CORONA se reserva el derecho de descontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso a la red de distribución.

SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

· S.A.G Montería
Cra. 3 No. 35-43
tel: 7826065 - 3135279974

· S.A.G Tunja
Cra. 14 No. 18-50
tel: 7440385 - 3124487058

· S.A.G Cartago
Cra. 7 No. 12-26
tel: 2131390 - 3113705392

· S.A.G Cúcuta
Av. 11E No. 9N-28
tel: 5746097 - 3153806593

· S.A.G San Andrés Isla
Av. 20 de Julio; Edificio del FED
tel: 5123915

·S.A.G Manizales
Cra. 20 No. 20 - 13
tel: 8847549 - 3207102806

· S.A.G Ibagué
Jordán 4a. Etapa; Mza 2; casa 11
tel: 2680267 - 3106280808

·S.A.G Rionegro
Kilómetro 3 vía Llano Grande
tel: 5372811

· S.A.G Arauca
Cra. 23 - Calle 25; Esquina Barrio Miramar
tel: 8857671

· S.A.G Villavicencio
Av. 40 No. 27 - 77; Barrio 7 de Agosto
tel: 6680555 - 3103895622

· S.A.G Barrancabermeja
Calle 52 No. 14-50; Barrio Colombia
tel: 6110530 - 3176708225

· S.A.G Pasto
Cra. 11 No. 16-07; Barrio Fátima
tel: 7202259 - 313 7911604

· S.A.G Tuluá
Calle 28 No. 23-52
tel: 2447989

PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

· P.S.A Bogotá
Av. Caracas No. 63-63 Chapinero
tel: 3481746 - 3124440022

· P.S.A Bogotá Norte
Av. Carrera 45 No, 149-09 Mazuren
tel: 6140241 - 3138697904

· P.S.A Bucaramanga
Cra. 16 No. 42-89 Barrio Centro
tel: 6334754 - 3124440024

· P.S.A Barranquilla
Calle 84 No. 43-49; Local 2
tel: 3735347 - 3124440023

· P.S.A Cartagena
Av. Pedro de Hererida 21-83; local 3
tel: 6455806 - 3124602395

· P.S.A Pereira
Calle 20 No. 9-41
tel: 3257269 - 3124440023

· P.S.A Medellín
Cra. 49 No. 45-18; Junín con Amador
tel: 5114086 - 3124440021

· P.S.A Envigado – El Dorado
Cra. 41 No. 39 Sur 63
tel: 3027993 - 3124604322

· P.S.A Cali
Calle 10 No. 42-54
tel: 5525150 - 312440025

LÍNEAS DE ATENCIÓN GRATUITA AL CLIENTE

Colombia:
018000512030

Perú:
0800 54 124

Ecuador:
1800001065

Argentina:
0800 444 2935

Venezuela:
0800 100 2573

Costa Rica:
08000 121 672

Panamá:
18005072382

República Dominicana:
1 888 751 2626

Bolivia:
800 10 0695

México:
001 8669705030

Avanti

Ref: 42290

Lavamanos de Pedestal en Porcelana Sanitaria



Características

- Diseño que combina la funcionalidad y el ahorro de espacio
- Lavamanos de Pedestal de 19 7/8" x 16 7/8" (50.5 cm x 43 cm)
- Amplio pozo proporciona mayor comodidad
- Superficie de repisa para ubicar artículos de aseo
- Agujeros insinuados que permiten escoger diferentes opciones de grifería
- Agujero integral de drenaje que evita el rebose
- La suite completa de la línea Avanti comprende además sanitario redondo y alongado
- Cumple con las normas Icontec NTC 920 y ASME/ANSI A112.19.2
- Garantía CORONA limitada de por vida

Colores Disponibles

100 blanco	103 bone	107 beige
111 azul cielo	125 rosa bahama	155 gris
117 azul cobalto	118 azul oscuro	129 vinotinto
	149 verde oscuro	160 negro

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
42290	Compacto lavamanos de Pedestal de 19 7/8" x 16 7/8" (50.5 cm x 43 cm), disponible con agujeros insinuados	24.6 lbs (11.2 kg)
04120	Pedestal Avanti	16.5 lbs (7.5 kg)

CALIDAD CERTIFICADA
ICONTEC
NTC No.920-1
Artefactos Sanitarios de China Vitrificada

Avanti

Ref: 42290


Lavamanos de Pedestal en Porcelana Sanitaria





Información técnica

Especificaciones

Material	Porcelana Sanitaria
Tamaño	19 7/8" x 16 7/8" (50.5 cm x 43 cm)
Pozo	19 7/8" x 12" (50.5 cm x 30.5 cm)
Agujeros para grifería	1 3/8" (3.5 cm)
Dimensiones del producto empacado	Modelo 04229: 20 5/8" x 17 1/2" x 8 7/8" (52.5 cm x 44.5 cm x 22.5 cm) Modelo 04120: 26" x 5 7/8"x 7 1/2" (66 cm x 15 cm x 19 cm)
Peso del producto empacado	Modelo 04229: 26.4 lbs (12 kg) Modelo 04120: 17.4 lbs (7.9 kg)
Garantía	Garantía Integral de por vida

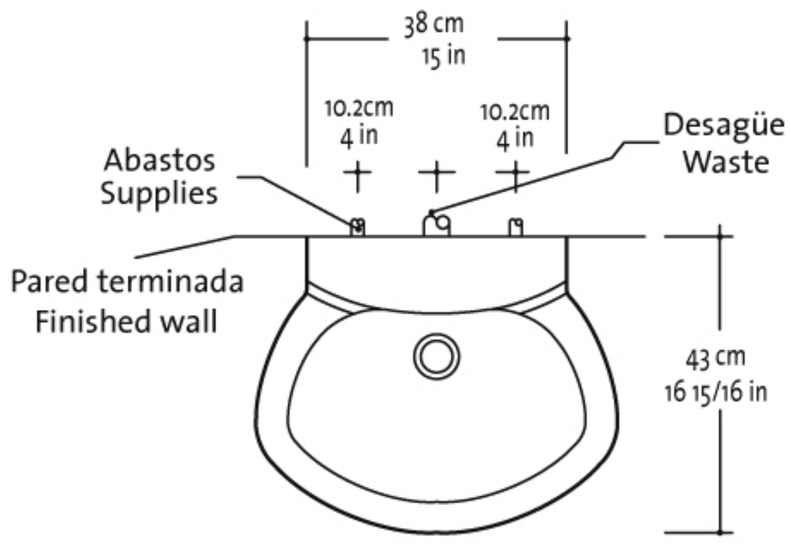

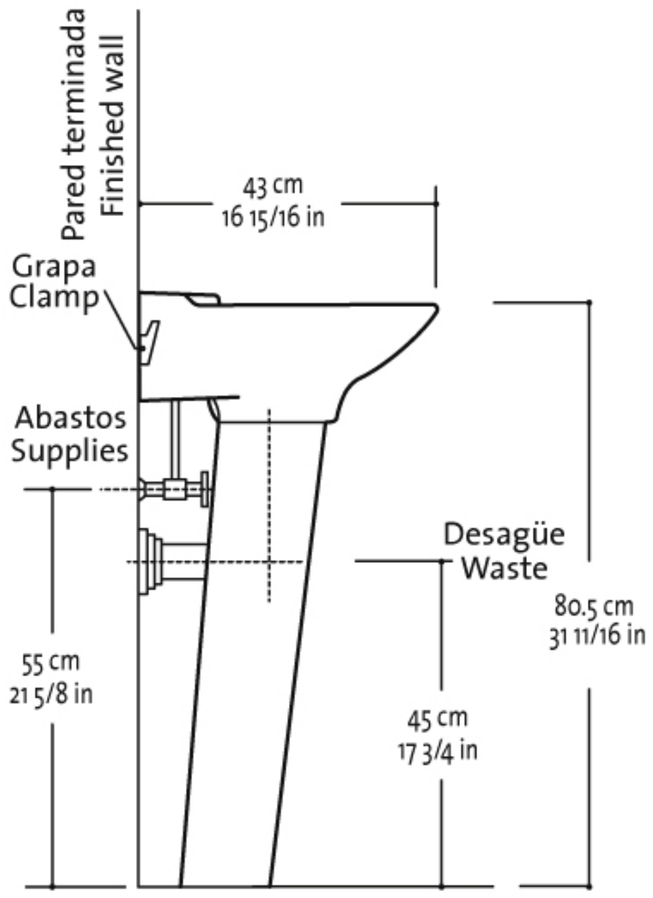

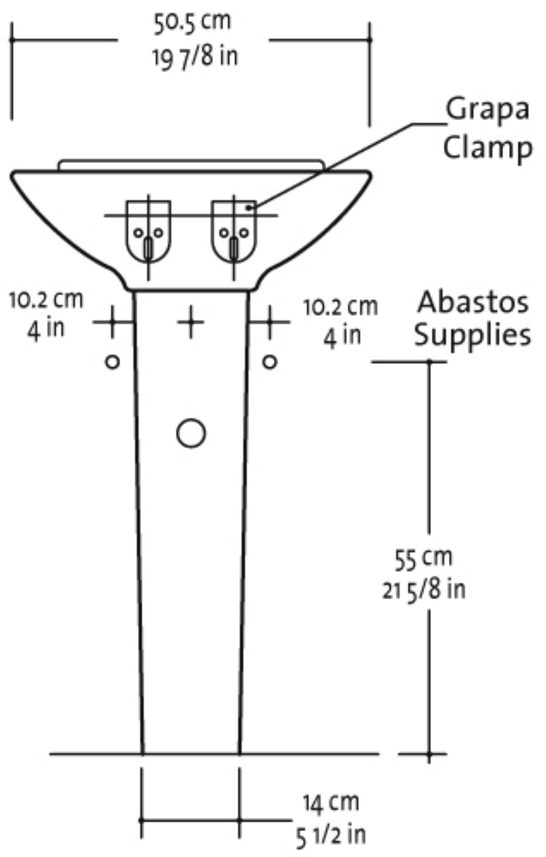

NOTA: Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

Si Usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co

LAVAMANOS 4 PULGADAS
ROBLE
REF(S). SUBCJ: 0R1020001 / CJ: 0R1030001

El LAVAMANOS 4 PULGADAS ROBLE ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Permite regular la temperatura del agua por medio de dos manijas independientes. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor angulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
136 x 172 x 154 mm., 5,4 x 6,8 x 6,1 pulg.
· Peso neto 480 gr. / 1,06 lb.
· Peso bruto 540 gr. / 1,19 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

PLANOS TÉCNICOS

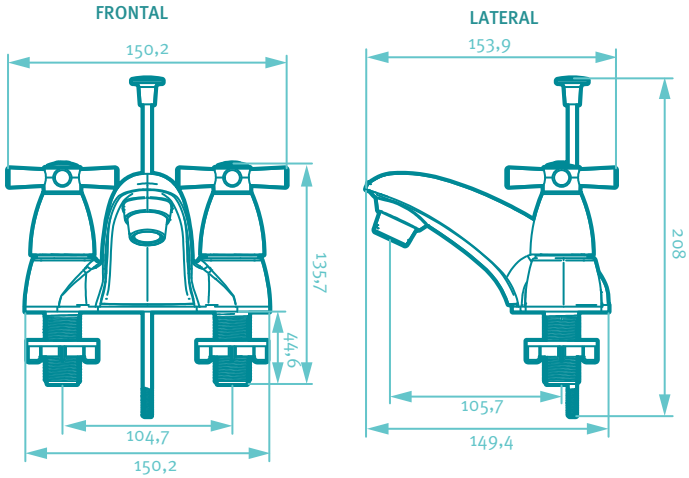

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES

AHORRO
DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA
GRIVAL

5 AÑOS
GARANTÍA
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.


Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

ROBLE

REF(S). SUBCJ: OR1020001 / CJ: OR1030001

DIAGRAMA DE CAUDAL

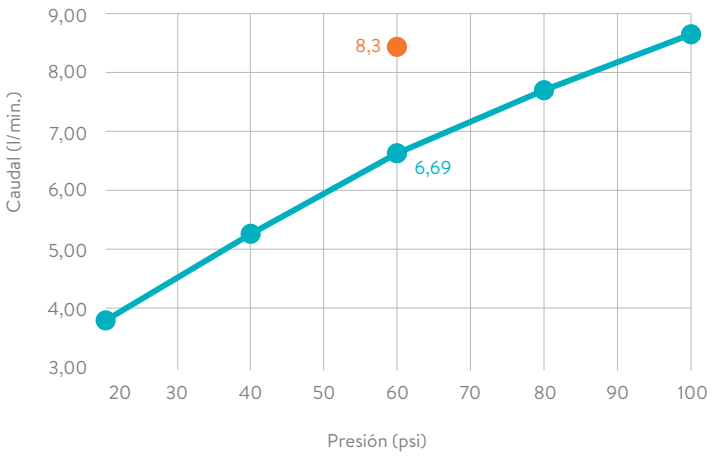

REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,87
40	5,13
60	6,69
80	7,8
100	8,7

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

· Repuesto unidad de cierre rápido 90 cor
Ref. 024480001

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

· OR1020001 Subcj Grifería lavamanos 4 pulgadas Roble (Incluye varilla)

· OR1030001 Cj Grifería lavamanos 4 pulgadas Roble (Incluye sifon, desague y varilla)

GRIVAL

PINTURA EPÓXICA ENAR



Descripción

Recubrimiento de dos componentes. El componente A es una pintura formulada a base de resina epoxi y el componente B es un catalizador de poliamida. La apropiada mezcla de estos componentes genera una película que ofrece una notable adherencia sobre diferentes substratos, formando una película dura, resistente a la abrasión y de alto desempeño al contacto ambientes químicamente agresivos, durabilidad al contacto con combustibles, disolventes aromáticos y ambientes húmedos.

Unidades de Empaque	
Epóxico	
Presentacion	**unidades x bandeja**
1/4	9
Galón	4

WILLIAM GONZALEZ PIRAQUIVE Estructuras Metálicas, Carpintería Metálica, Cubiertas y Ornamentación Nit: 79.954.942-4	Calle 70A No. 68B-56 Bogotá D.C. Tel: 3163581135	CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO	Código: SGWG-F-10 Versión:01 Fecha: 02/06/2016 Revisión: 02/06/2016

Se certifica que la TEJA STANDING SEAM en acero prepintado aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada de manera independiente del area de producción con resultados satisfactorios

INFORMACION BASICA

FECHA	12/12/2023	CERTIFICADO No.	CER-12-223
CLIENTE	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2
PRODUCTO	STANDING SEAM 500MM BLANCO CAL 24	NORMA	ASTM A755
	ESPESOR PROMEDIO MP	0,55 - 00,58	


OP	5025	TOTAL ml	1780,07	REMISION	4474
ID MP	SS BL 24 013	EPT	3465	SA	5504

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA

GRADO	C max	Mn max	P max	S max	SI max	Esfuerzo de Fluencia (Mpa (ksi)	Esfuerzo máximo Mpal (ksi)	% Elongación en 50mm, mínimo
33	0,40	0,20	0,05	0,1	0,11	227(33)	380(55)	28

PRUEBAS Y ENSAYOS

Ubicación resaltes STANDING SEAM



Ancho Útil:	CONFORME
Longitud Nominal:	CONFORME
Profundidad de Grafado:	CONFORME
Paso entre Crestas:	CONFORME
Acero Prepintado:	CONFORME
Pestañas:	CONFORME

Aprobado:

WILLIAM GONZALEZ PIRAQUIVE
CC. 79,954,942 de Bogotá

Powered by CamScanner

WILLIAM GONZALEZ PIRAQUIVE Estructuras Metálicas, Carpintería Metálica, Cubiertas y Ornamentación Nit: 79.954.942-4	Calle 70A No. 68B- 56 Bogotá D.C. Tel: 3163581135	CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO	Código: SGWG-F-10 Versión:01 Fecha: 02/06/2016 Revisión: 02/06/2016

Se certifica que la TEJA STANDING SEAM en acero prepintado aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada de manera independiente del area de producción con resultados satisfactorios

INFORMACION BASICA

FECHA	12/12/2023	CERTIFICADO No.	CER-12-222
CLIENTE	CONSORCIO VENTURA	NIT	901550907-2
PRODUCTO	STANDING SEAM 500MM VERDE CAL 24	NORMA	ASTM A755


	ESPESOR PROMEDIO MP		0,55 - 00,58				
OP	5026	TOTAL ml	1783,15		REMISION	4474	
ID MP	SS VR 24 022		EPT	3465	SA	5504	

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA

GRADO	C max	Mn max	P max	S max	Sl max	Esfuerzo de Fluencia (Mpa (ksi)	Esfuerzo máximo Mpal (ksi)	% Elongación en 50mm, mínimo
33	0,40	0,20	0,05	0,1	0,11	227(33)	380(55)	28

PRUEBAS Y ENSAYOS

Ubicación resaltes STANDING SEAM



Ancho Útil:	CONFORME
Longitud Nominal:	CONFORME
Profundidad de Grafado:	CONFORME
Paso entre Crestas:	CONFORME
Acero Prepintado:	CONFORME
Pestañas:	CONFORME


Aprobado:

WILLIAM GONZALEZ PIRAQUIVE
CC. 79,954,942 de Bogotá

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

CUBIERTA STANDING SEAM SENCILLA Y SANDWICH

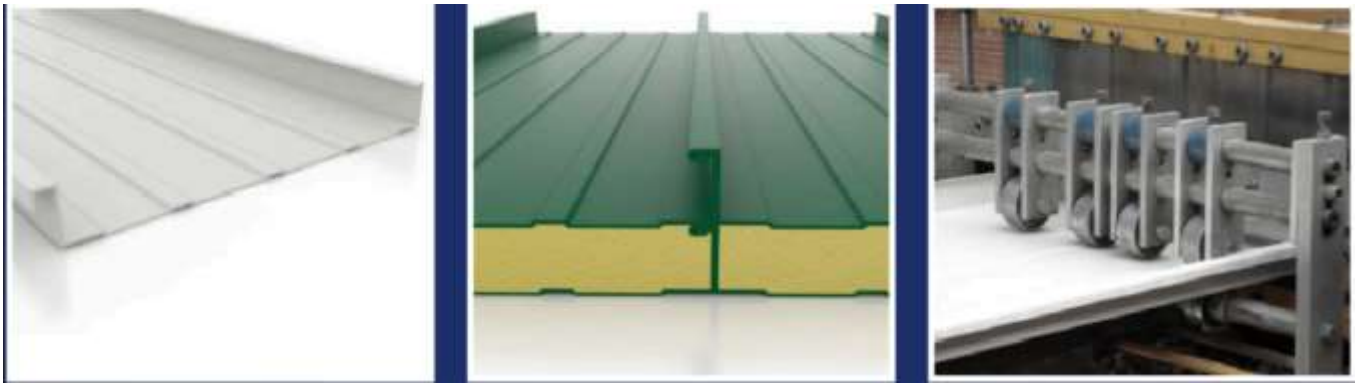

INFORMACION TECNICA

Teja metálica formada en frio, especialmente diseñada para fabricarse en obra y cubrir grandes superficies, en las que se requieren bajas pendientes y grandes luces sin traslapos longitudinales; gracias a su versatilidad se puede diseñar cubiertas con teja sencilla en alturas de 1.5” y 2” con paneles tipo sándwich.

Av. Centenario N° 100-72 Fontibón
Tels. 7029067 – 3208536300
www. metal-xpress.com - david@metal-xpress.com

VENTAJAS

- No posee traslapos en la dirección del flujo del agua, garantizando un sistema completamente hermético
- Fabricado y grafado en obra
- No hay límite de longitud ya que es fabricada en una pieza de la canal a la cumbrera
- Sistema de fijación oculta a base de clips
- La tornillería no queda expuesta a la intemperie lo que disminuye el riesgo de posibles filtraciones
- Las tejas pueden ser fabricadas de la longitud requerida en secciones rectas o curvas dependiendo del diseño arquitectónico

USOS

- Plantas industriales
- Bodegas
- Edificios – viviendas
- Centros educativos
- Instalaciones deportivas
- Hangares
- Supermercados
- Fachadas y cerramientos

Av. Centenario N° 100-72 Fontibón
Tels. 7029067 – 3208536300
www. metal-xpress.com - david@metal-xpress.com


TEJA CURVA




Radio mínimo de curvatura (m)	Altura del Panel	Calibres
10	1.5"(38.1mm)	26 - 24

La teja puede presentar rizados por el formado en frío.

COLORES

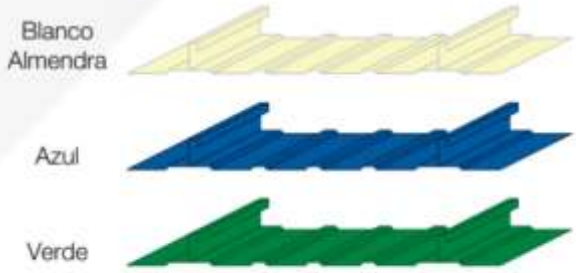

AISLAMIENTOS



Fibra de vidrio | Poliestireno | Poliuretano

Av. Centenario N° 100-72 Fontibón
Tels. 7029067 – 3208536300
www. metal-xpress.com - david@metal-xpress.com

Panel 2”



Altura Panel	Ancho útil (mm)	Calibre	Espesor (mm)	Peso (mm)
2" (50.8 mm)	450	24	0.60	6.38
		26	0.46	4.78

Tabla de carga	Luz Simple		Luz Continua	
	Carga (kg/m²)		Carga (kg/m²)	
Luces (mm)	C26	C24	C26	C24
1,800	78	123	110	181
1,900	67	104	99	163
2,000	57	89	89	147
2,100	49	77	81	133
2,200	43	67	74	121

Panel 1.5”



Altura Panel	Ancho útil (mm)	Calibre	Espesor (mm)	Peso (mm)
1.5" (38.1 mm)	500	24	0.60	5.74
		26	0.46	4.3

Tabla de carga	Luz Simple		Luz Continua	
	Carga (kg/m²)		Carga (kg/m²)	
Luces (mm)	C26	C24	C26	C24
1,400	49	101	115	174
1,500	40	82	97	152
1,600	33	68	80	134
1,700	28	56	66	118
1,800	23	48	56	106


Recomendaciones

- Distancia recomendada entre correas para panel 2": 1.80 m para Cal 26
- Pendiente mínima panel 2": 4%
- Distancia recomendada entre correas para panel 1.5": 1.50 m para Cal 26
- Pendiente mínima panel 1.5": 4%

Av. Centenario N° 100-72 Fontibón
Tels. 7029067 – 3208536300
www. metal-xpress.com - david@metal-xpress.com

Accesorios

Clip de fijación

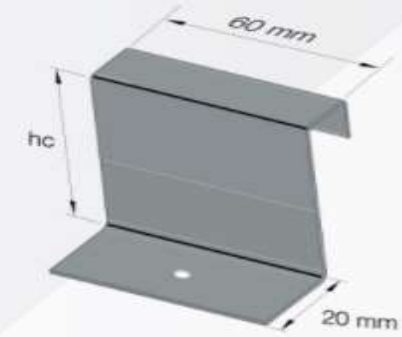


hc= 1½" (38,1 mm) ó 2" (50,8 mm)

Tornillo

Tornillo 10 - 16 3/4



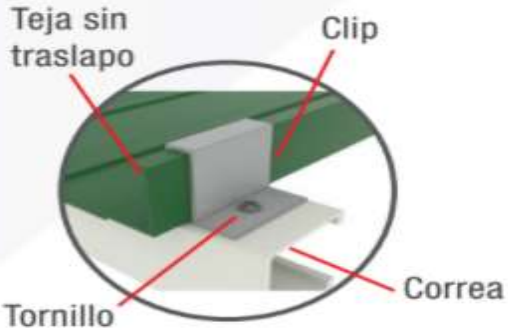


Teja Sencilla:

Una sola bandeja



Teja tipo sándwich:

Bandeja superior e inferior con aislamiento sobrepuesto



Av. Centenario N° 100-72 Fontibón
Tels. 7029067 – 3208536300
www. metal-xpress.com - david@metal-xpress.com


CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A, hace constar que la empresa **Altavista Construction Group Sas**, identificada con **NI 901340813** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **12/02/2024** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2023** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


Resultados Evaluación por Ciclo



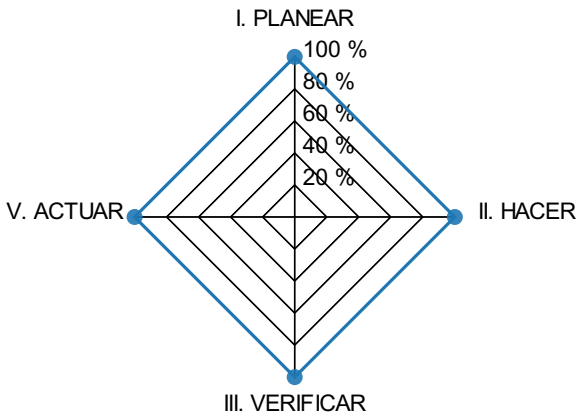

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar

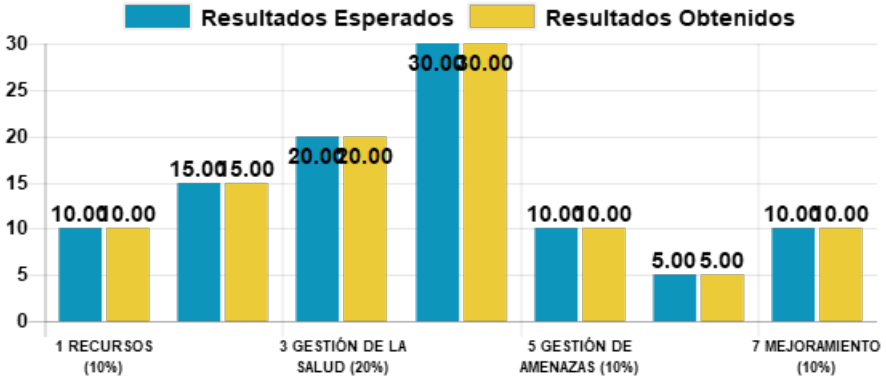

ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **12 febrero 2024**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=xqXJG1HCZzrtnTcWCa1X0A==)

Para verificación de Positiva


CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Maria Jose Herrera Guzman** , identificada con **NI 52452955** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **12/02/2024** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2023** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Resultados Evaluación por Ciclo



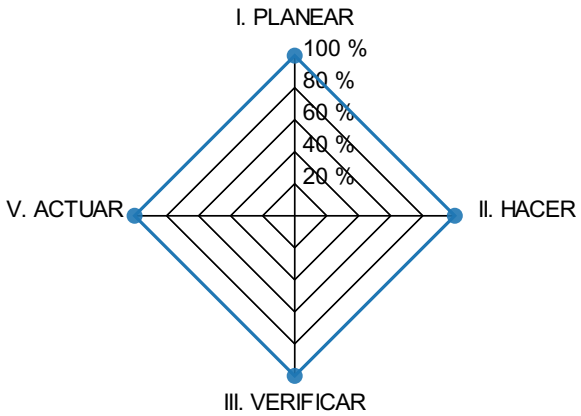

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar

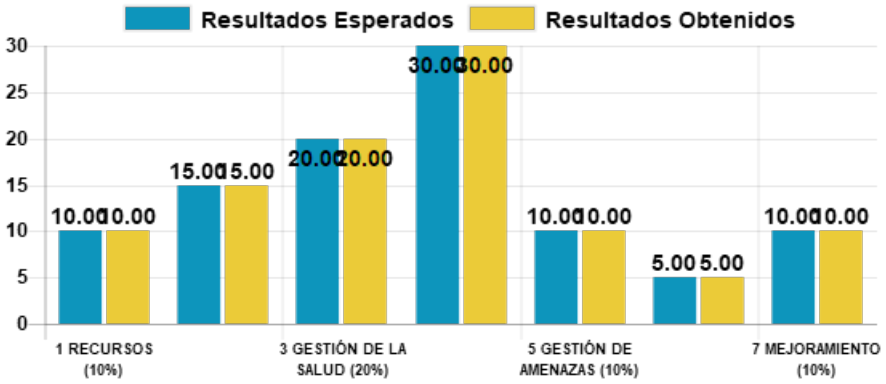

ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **12 febrero 2024**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=kPsk60yWyKzt0/WZvTP1lQ==)

Para verificación de Positiva

PINTURA EPÓXICA ENAR



Descripción

Recubrimiento de dos componentes. El componente A es una pintura formulada a base de resina epoxi y el componente B es un catalizador de poliamida. La apropiada mezcla de estos componentes genera una película que ofrece una notable adherencia sobre diferentes substratos, formando una película dura, resistente a la abrasión y de alto desempeño al contacto ambientes químicamente agresivos, durabilidad al contacto con combustibles, disolventes aromáticos y ambientes húmedos.

Unidades de Empaque	
Epóxico	
Presentacion	**unidades x bandeja**
1/4	9
Galón	4

Elige una opción

1 Cotizar

SKU: N/D

CATEGORÍA: PINTURA EPÓXICA ENAR

DESCRIPCIÓN VALORACIONES (0)

Usos

Se recomienda para la protección y decoración de maquinaria Industrial, pisos, paredes, metales expuestos, acero estructural, áreas donde se demande requerimientos específicos de sanidad.

Ventajas

- Alta resistencia química.
- Alta dureza.
- Resistencia al esfuerzo mecánico.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido.
- Alto desempeño.
- Uso interior o exterior

Ficha Técnica
Pintura Epóxica Enar

Descripción

Recubrimiento de dos componentes. El componente A es una pintura formulada a base de resina epoxi y el componente B es un catalizador de poliamida. La apropiada mezcla de estos componentes genera una película que ofrece una notable adherencia sobre diferentes substratos, formando una película dura, resistente a la abrasión y de alto desempeño al contacto ambientes químicamente agresivos, durabilidad al contacto con combustibles, disolventes aromáticos y ambientes húmedos.

Usos

Se recomienda para la protección y decoración de maquinaria Industrial, pisos, paredes, metales expuestos, acero estructural y áreas donde se demande requerimientos específicos de sanidad.

Ventajas

- Alta resistencia química.
- Alta dureza.
- Resistencia al esfuerzo mecánico.
- Excelente adherencia.
- Secado rápido.
- Alto desempeño.
- Uso interior o exterior

Modo de empleo

Preparación de la superficie

- Es de vital importancia el pretratamiento de la superficie, ya que de este dependerá el desempeño del producto.
- Elimine impurezas o suciedad tales como: grasa, tierra, mugre, barro, óxido, pintura vieja o deteriorada entre otros. Preferiblemente lijando, esto no solo ayuda eliminar impurezas en la superficie sino también maximiza el área de contacto mejorando así el anclaje del producto en el sustrato.
- Repare la superficie eliminando grietas, desniveles, imperfecciones con Estuco Plástico o Acrílico *Enar*, Max Drywall *Enar* o Enargrietas *Enar* según sea la superficie, deje secar por 24 horas mínimo.
- Es muy importante que la superficie se encuentre los más seca posible a la hora de realizar aplicación, por lo que es necesario eliminar cualquier tipo de humedad presente en la superficie, además no es recomendable el uso agua o líquidos de baja volatilidad para la limpieza de la superficie a pintar.

- Debe medirse la humedad del sustrato, ya que en cementosos sólo pueden ser recubiertos cuando su humedad es menor o igual al 4% en peso. Esta medición es extremadamente importante. El mejor método para identificar la presencia de humedad ascendente es aún el "ensayo del plástico" (Se basa en la utilización de una hoja de polietileno de por lo menos 0.5 m x 0.5 m adherida a la superficie de concreto). El plástico debe ser colocado en contacto directo con la superficie por lo menos durante 24 horas. La condensación de agua bajo el plástico indicará si existe alguna transmisión de vapor. Sustratos con humedad > 4% o humedad ascendente (vapor condensado) indican la necesidad de tiempo adicional de secado.
- En estructuras metálicas se recomienda el uso previo de Anticorrosivo *Enar* ya que esto potencializara las propiedades de este producto, además aumentar la vida útil de la superficie.
- En madera nueva, asegúrese que ésta se encuentre limpia y seca. En este caso aplique una mano diluida (Utilice Disolvente Epóxico *Enar*) del producto para sellar los poros de la superficie y luego realice la aplicación habitual.

Aplicación

- Es muy importe agitar cada componente por separado. Se mezcla 1 galón de pintura Epóxica *Enar* por un 1 galón de catalizador *Enar*, se homogeniza la mezcla y se deja en reposo 10 minutos. Asegúrese que la relación de mezcla sea 1:1 y de gastar la cantidad preparada antes de 4 horas.
- Según sea su método de aplicación (brocha, rodillo o pistola) realice las disoluciones con Disolvente Epóxico *Enar*. (Para rodillo o brocha utilice una relación de 1 parte de producto por 1/16 de disolvente - Para pistola utilice una relación de 1 parte de producto por 1/8 de disolvente)
- De la correcta homogenización de la mezcla dependerán propiedades finales y de acabado de la pintura.
- Se aplica de 2 a 3 manos de pintura, dejando un tiempo de secado entre manos mínimo 6 a 8 horas, dependiendo el color y el estado de la superficie. (Los tiempos de secado son aproximados, ya que se pueden presentar variaciones dependiendo de la temperatura y humedad de la zona donde se realice la aplicación)

Datos técnicos

Parámetro	Valor	Unidad
Acabado	Brillante	-
Densidad (Com. A)	5.0 - 5.1	Kg/gal
Densidad (Com. B)	3.3 - 3.4	Kg/gal
Porcentaje de Solidos	45-50	%
Tiempo de secado entre aplicaciones	6 - 8	Horas
Tiempo de secado total	7	Días
Rendimiento Teórico	35 - 45	m^2/ gal

*El rendimiento podrá variar dependiendo la superficie donde se realice la aplicación metálica, madera o muro. También influirá el método de aplicación.

Presentación

$$\text{Galon y } \frac{1}{4}\text{Galón}$$

Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original, bien cerrado en lugar fresco, bajo techo y fuera del alcance de los niños. No se recomienda almacenar en torres de más de seis unidades, es de vital importancia no mezclar el producto con otras sustancias.

CONCRETIZA S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 2 12 23 No. de Orden Cliente: Interna: VISITA No

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
	Fuerza Aereo madrid C.	

OPERARIO Julio cesar Pinzon
AYUDANTE cesar Romero
EQUIPO W C V 272

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSION	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería	6" 4" 12"			100 mts	
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección	8 un.				
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otro	Sanitarios			120 mts	

TIEMPO EJECUCIÓN 4 Horas

HORA DE INICIO 8 A m HORA DE TERMINACIÓN 12.00

OPERARIO CONCRETIZA SAS

NOMBRE Julio cesar Pinzon

FIRMA Y CEDULA 79643283

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE)

NOMBRE Andres Mauricio Rosero Q.

FIRMA Y CEDULA 74360018.

CARGO Residente de obra.

OBSERVACIONES N/A.

Powered by CamScanner
