SGC-CP-16222-24
Neiva, abril 23 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No.434 de 2023.
Asunto: Informe de interventoría No.5

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual interventoría No.5
2. Informes semanales el periodo
3. Correspondencia
4. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

5

Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	5	Periodo comprendido entre el :	1 de marzo de 2024	y el:	31 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	434 DE 2023	**Contrato Nº:**	416 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 85.481.726,00	**Valor Inicial:**	$ 842.938.161,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 85.481.726,00	**Valor total:**	$ 842.938.161,00
Valor pagado:	$ -	**Valor pagado:**	
Valor por pagar:	$ 85.481.726,00	**Valor por pagar:**	$ 842.938.161,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	8/11/2023	9/09/2029	$ 8.548.180,00
Cumplimiento	8/11/2023	12/03/2025	$ 25.644.540,00
Prestaciones sociales	8/11/2023	9/09/2027	$ 8.548.180,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	10/09/2027	$ 84.293.816,10
Estabilidad y calidad de la obra	Un año mas		$ 168.587.632,20
Calidad del servicio	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	7/09/2024	$ 232.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ -
		$ -

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
		$ -
		$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

5

Ingenieria & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	17,85%	7,85%	25,70%
% Ejecutado	12,05%	8,52%	20,58%
Diferencia	-5,80%	0,68%	-5,12%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 150.465,07	$ 66.131,79	$ 216.596,86	25,70%
% Ejecutado	$ 101.605,25	$ 71.845,95	$ 173.451,20	20,58%
Diferencia	$ -	$ 5.714,15	$ 5.714,15	-5,12%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se ejecutaron acividades en los siguientes municipios:


Aipe: Vereda La Esperanza, predio Reserva Forestal Piedra del Aguila
Palermo: Vereda Brisas del Carmen, predio Villalobos y vereda Bombonal predio Providencia
Altamira: Vereda La Singa, predio Marañon 2 y vereda Alto Resinas, predio El Vergel
Guadalupe: Vereda Filo de Salazar, predio Guardanelos y predio Los Pinos
Timana: Vereda Montañita, predio Las Juntas
Acevedo: Vereda El Rubí, predio La Fortuna y vereda La Marimba predio El Silencio
Elias: Vereda Viso, predio El Chorro
El Pital: Vereda El Vegón, predio Los Cafeteros, La Carolina, El Retiro.
Saladoblanco: Vereda Vista Hermosa, predio El Socorro
Iquira: Vereda Río Negro, predio Buenos Aires

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	1		33,33%	0,00%	1
TÉCNICO	2		66,67%	0,00%	2
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3
TOTALES	3		100,00%		

TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO




CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		1	0,00%	7,14%	1
TÉCNICO	2		14,29%	0,00%	2
M.O.N.C.	11		78,57%	0,00%	11
TOTAL	13	1	92,86%	7,14%	14
TOTALES	14		100,00%		

TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**5**	CQ Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

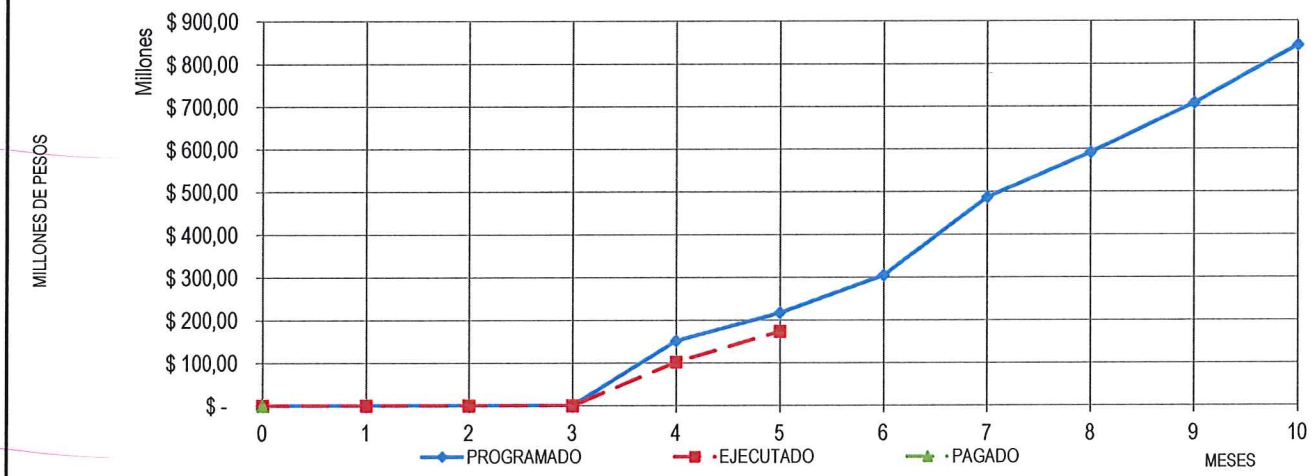

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se han presentando dificultad con la mano de obra para la ejecución de los mantenimientos en los predios del municipio de Neiva, debido a que el contratista no ha logrado concretar precios con la comunidad, superando el costo establecido en el contrato. Teniendo en cuenta las condiciones reales encontradas en las visitas diagnósticas y durante la ejecución de las actividades, se presentó la documentación y soportes requeridos con el fin de iniciar el trámite ante la Entidad para la modificación No.2 al contrato de obra.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Humberto Quiza Camacho **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia zambrano serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 1**	5

CQ Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES				$ 670.910.102,00				$ 80.869.504,00	$ 57.183.520,00	$ 138.053.024,00		$ 532.857.078,00
1	Manteniento aislamiento	ML	33037	$ 10.241	$ 338.331.917,00	0,00	0,00	0,00				33.037,00	$ 338.331.917,00
2	Manteniento aislamiento cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	ML	31405	$ 6.064	$ 190.439.920,00	13.336,00	9.430,00	22.766,00	$ 80.869.504,00	$ 57.183.520,00	$ 138.053.024,00	8.639,00	$ 52.386.896,00
3	Mantenimiento restauracion activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	HA	65	$ 1.730.481	$ 112.481.265,00	0,00	0,00	0,00				65,00	$ 112.481.265,00
4	Manteniento de barreras vivas de fique (Ha)	ML	9400	$ 3.155	$ 29.657.000,00	0,00	0,00	0,00				9.400,00	$ 29.657.000,00
												0,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 670.910.102,00				$ 80.869.504,00	$ 57.183.520,00	$ 138.053.024,00		$ 532.857.078,00
	ADMINISTRACION		20,00%		$ 134.182.020,00				$ 16.173.900,80	$ 11.436.704,00	$ 27.610.605,00		$ 106.571.415,00
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 6.709.101,00				$ 808.695,04	$ 571.835,00	$ 1.380.530,00		$ 5.328.571,00
	UTILIDAD		3,90%		$ 26.165.494,00				$ 3.153.910,66	$ 2.230.157,00	$ 5.384.068,00		$ 20.781.426,00
	UTILIDAD		19,00%		$ 4.971.444,00				$ 599.243,02	$ 423.730,00	$ 1.022.973,00		$ 3.948.471,00
	COSTO AIU (24.90%)				$ 172.028.059,00				$ 20.735.749,52	$ 14.662.426,00	$ 35.398.176,00		$ 136.629.883,00
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 842.938.161,00				$ 101.605.253,52	$ 71.845.946	$ 173.451.200		$ 669.486.961,00

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 842.938.161,00	V/R ANTICIPO:	$ 0,00
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 842.938.161,00	% RETEGARANTIA:	0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		0,00%
2					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		0,00%
	TOTAL				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 85.481.726,00	V/R ANTICIPO:	NA
V/R ADICIONES:	$ 0,00	% ANTICIPO:	NA
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 85.481.726,00	% RETEGARANTIA:	10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
						N/A	N/A	$ 0,00	$ 85.481.726,00	0,00%
						N/A	N/A	$ 0,00	$ 85.481.726,00	0,00%
	TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.481.726,00	

cam ¡Cuida la naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	5	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador de Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de marzo de 2024	al	31 de marzo de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



BUENOS AIRES - RIO NEGRO - IQUIRA

FOTOGRAFÍA No.2



PROVIDENCIA - BOMBONAL - PALERMO

FOTOGRAFÍA No.3



EL VERGEL - ALTO RESINAS - ALTAMIRA

FOTOGRAFÍA No.4



EL SOCORRO - VISTA HERMOSA - SALADOBLANCO

FOTOGRAFÍA No.5



LOS PINOS - FILO DE SALAZAR - GUADALUPE

FOTOGRAFÍA No.6



EL SILENCIO - LA MARIMBA - ACEVEDO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	11-mar-24	PERIODO No.	15	DEL	4/03/2024	AL	10/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	181			DÍAS POR EJECUTAR	181		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	123	EQUIVALE AL	40,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	123	EQUIVALE AL	40,5%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos	4/05/2024		no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	3/09/2024		no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	4/09/2024		no iniciado
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)			


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 174.464.509,00	20,70%	-5,93%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 124.461.864,55	14,77%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo
DAVID RUIZ RODRIGUEZ	10.618.022.167	Ayudante
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Ayudante
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Ayudante
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Ayudante
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Ayudante
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	7,1%	1
	TECNICO	2	0	14,3%	0,0%	2
	M.O/N.C	11	0	78,6%	0,0%	11
	TOTALES	**13**	**1**	**92,9%**	**7,1%**	**14**
	TOTAL	14		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Aipe** vereda La Esmeralda predio Reserva Forestal Piedra del Águila; en el municipio de **Palermo** vereda Las Brisas del Carmen predio Villalobos; en el municipio de **Altamira** vereda La Singa predio Marañón 2 y vereda Alto Resinas predio El Vergel; en el municipio de **Guadalupe** vereda Filo de Salazar predio Guardanelos y predio Los pinos; en el municipio de **Timaná** vereda Montañita predio Las Juntas; en el municipio de **Acevedo** vereda El Rubi predio La Fortuna y en la vereda La Marimba predio El Silencio; en el municipio de **El Pita**l vereda El Vegón predio Los Cafeteros, La Carolina, El Retiro; en el municipio de **Elías** vereda Viso predio El Chorro; en el municipio de **Saladoblanco** vereda Vista Hermosa predio El Socorro y en le municipio de **Iquira** vereda Río Negro predio Buenos Aires.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Las actividades realizadas se encuentran en proceso de verificación de la interventoría para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LOS CAFETEROS, LA CAROLINA, EL RETIRO - VDA EL VEGON - MUNICIPIO DE EL PITAL



PREDIO EL CHORRO - VDA VISO - MUNICIPIO DE ELIAS



EL SOCORRO - VDA VISTA HERMOSA - MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



PREDIO BUENOS AIRES - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE IQUIRA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	18-mar-24	PERIODO No.	16	DEL	11/03/2024	AL	17/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	174			DÍAS POR EJECUTAR	174		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	130	EQUIVALE AL	42,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	130	EQUIVALE AL	42,8%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	**Mantenimiento aislamientos**	7/09/2024		no iniciado
2	**Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales**	26/05/2024		en proceso
3	**Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)**	7/09/2024		no iniciado
4	**Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)**	16/06/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 192.818.368,00	22,87%	-5,94%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 142.747.152,95	16,93%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo
DAVID RUIZ RODRIGUEZ	10.618.022.167	Ayudante
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Ayudante
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Ayudante
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Ayudante
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Ayudante
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	7,1%	1
	TECNICO	2	0	14,3%	0,0%	2
	M.O/N.C	11	0	78,6%	0,0%	11
	TOTALES	**13**	**1**	**92,9%**	**7,1%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron labores en los aislamientos de los municipios de; **Aipe** vereda La Esmeralda predio Reserva Forestal Piedra del Águila; en el municipio de **Palermo** vereda Las Brisas del Carmen predio Villalobos y vereda Bombonal predio Providencia; en el municipio de **Altamira** vereda La Singa predio Marañón 2 y vereda Alto Resinas predio El Vergel; en el municipio de **Guadalupe** vereda Filo de Salazar predio Guardanelos y predio Los pinos; en el municipio de **Timaná** vereda Montañita predio Las Juntas; en el municipio de **Acevedo** vereda El Rubí predio La Fortuna y vereda La Marimba predio El Silencio; en el municipio de **El Pital** predio Los Cafeteros, La Carolina, El Retiro vereda El Vegon; en el municipio de **Elías** predio El Chorro vereda Viso; en el municipio de **Saladoblanco** predio El Socorro vereda Vista Hermosa y en el municipio de **Iquira** predio Buenos Aires vereda Río Negro.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Las actividades realizadas se encuentran en proceso de verificación de la interventoría para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



LIMPIA PREDIO RF PIEDRA DEL AGUILA - VDA LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE AIPE



PROVIDENCIA - VDA BOMBONAL - MUNICIPIO DE PALERMO



PREDIO EL VERGEL - VDA ALTO RESINAS - MUNICIPIO DE ALTAMIRA



PREDIO LOS PINOS - VDA FILO DE SALAZAR - MUNICIPIO DE GUADALUPE

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	25-mar-24	PERIODO No.	17	DEL	18/03/2024	AL	24/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	167			DÍAS POR EJECUTAR	167		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	137	EQUIVALE AL	45,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	137	EQUIVALE AL	45,1%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	**Mantenimiento aislamientos**	7/09/2024		no iniciado
2	**Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales**	26/05/2024		en proceso
3	**Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)**	7/09/2024		no iniciado
4	**Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)**	16/06/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 207.438.980,00	24,61%	-5,60%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 160.270.554,75	19,01%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo
DAVID RUIZ RODRIGUEZ	10.618.022.167	Ayudante
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Ayudante
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Ayudante
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Ayudante
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Ayudante
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	7,1%	1
	TECNICO	2	0	14,3%	0,0%	2
	M.O/N.C	11	0	78,6%	0,0%	11
	TOTALES	**13**	**1**	**92,9%**	**7,1%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Aipe** vereda La Esmeralda predio Reserva Forestal Piedra del Águila; en el municipio de **Palermo** vereda Las Brisas del Carmen predio Villalobos y vereda Bombonal predio Providencia; en el municipio de **Altamira** vereda La Singa predio Marañón 2 y vereda Alto Resinas predio El Vergel; en el municipio de **Guadalupe** vereda Filo de Salazar predio Guardanelos y predio Los pinos; en el municipio de **Timaná** vereda Montañita predio Las Juntas; en el municipio de **Acevedo** vereda El Rubí predio La Fortuna y vereda La Marimba predio El Silencio; en el municipio de **El Pital** vereda El Vegon predio Los Cafeteros; en el municipio de **Elias** vereda Viso predio El Chorro; en el municipio de **Saladoblanco** predio El Socorro vereda Vista Hermosa y en le municipio de **Iquira** predio Buenos Aires en la vereda Río Negro.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se recomienda alcontratista mayor celeridad en la ejecución de las actividades para no generar atrasos en la programacion de obra.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO EL SILENCIO - VDA LA MARIMBA - MUNICIPIO DE ACEVEDO



PREDIO EL VERGEL - VDA ALTO RESINAS - MUNICIPIO DE ALTAMIRA



PREDIO PROVIDENCIA - VDA BOMBONAL - MUNICIPIO DE PALERMO



PREDIO LOS CAFETEROS - VDA EL VEGON - MUNICIPIO DE EL PITAL

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	1-abr-24	PERIODO No.	18	DEL	25/03/2024	AL	31/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	160			DIAS POR EJECUTAR	160		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	144	EQUIVALE AL	47,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	144	EQUIVALE AL	47,4%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	**Mantenimiento aislamientos**	7/09/2024		no iniciado
2	**Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales**	26/05/2024		en proceso
3	**Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)**	7/09/2024		no iniciado
4	**Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)**	16/06/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 216.596.862,00	25,70%	-5,12%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 173.451.200,03	20,58%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
OMAIRA CARVAJAL ARANDA	1.083.898.645	Técnico de campo
DAVID RUIZ RODRIGUEZ	10.618.022.167	Ayudante
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Ayudante
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Ayudante
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Ayudante
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Ayudante
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	7,1%	1
	TECNICO	2	0	14,3%	0,0%	2
	M.O/N.C	11	0	78,6%	0,0%	11
	TOTALES	**13**	**1**	**92,9%**	**7,1%**	**14**
	TOTAL	**14**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Aipe** vereda La Esmeralda predio Reserva Forestal Piedra del Águila; en el municipio de **Palermo** vereda Las Brisas del Carmen predio Villalobos y vereda Bombonal predio Providencia; en el municipio de **Altamira** vereda La Singa predio Marañón 2 y vereda Alto Resinas predio El Vergel; en el municipio de **Guadalupe** vereda Filo de Salazar predio Guardanelos y predio Los pinos; en el municipio de **Timaná** vereda Montañita predio Las Juntas; en el municipio de **Acevedo** vereda El Rubí predio La Fortuna y vereda La Marimba predio El Silencio; en el municipio de **El Pital** vereda El Vegon predio Los Cafeteros; en el municipio de **Elías** vereda Viso predio El Chorro; en el municipio de **Saladoblanco** predio El Socorro vereda Vista Hermosa y en le municipio de **Iquira** predio Buenos Aires en la vereda Río Negro.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se han presentando problemas con la mano de obra para los predios del municipio de Neiva, debido a que el contratista no ha logrado concretar precios con la comunidad, superando el costo establecido en el contrato.
Teniendo en cuenta las condiciones reales encontradas en las visitas diagnósticas y durante la ejecución de las actividades, se presentó la documentación y soportes requeridos con el fin de iniciar el trámite ante la Entidad para la modificación No.2 al contrato de obra.
Se recomienda al contratista mayor celeridad en la ejecución de las actividades para no generar atrasos en la programación de obra.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO BUENOS AIRES - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE IQUIRA



PREDIO LOS CAFETEROS - VDA EL VEGON - MUNICIPIO DE EL PITAL



PREDIO R.F. PIEDRA DEL AGUILA - VDA LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE AIPE



PREDIO PROVIDENCIA - VDA BOMBONAL - MUNICIPIO DE PALERMO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** Vobo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

SGC-CP-16220-24
Neiva, marzo 22 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Citación comité técnico.

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día miércoles 03 de abril de 2024 a las 9:00 am, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia, fundamental la asistencia del representante legal.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29372779	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.800	7.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	29372779	2024-04-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29372779	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.800	7.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	29372779	2024-04-23	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	4.000	0	228.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	4.000	0	228.000
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	3.200	0	178.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	3.200	0	178.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	200	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	200	0	7.600
Gran Total					406.400	0	7.400	0	413.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29513458	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.333.600	93.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	29513458	2024-04-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
2	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
3	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	54.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.350.000	54.000	1.350.000	94.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	5711001
5	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																3			3	3	3	3	PROTECCION-230201	150.000	24.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	150.000	6.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	150.000	0	150.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	30.000	S	5711001
6	CC 1075279737	VARGAS OSORIO JUAN FELIPE	1.800.000	F	X	X														0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.080.000	172.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.080.000	43.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.125.000	45.000	1.080.000	75.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	336.200	S	5711001
7	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
8	CC 1077873357	PAREJO PEREZ VICTOR ALFONSO	2.500.000	F		X														0			13	13	13	13	COLPENSION ES-25-14	1.083.334	173.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.083.334	43.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.333.334	53.400	1.083.334	75.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	345.700	S	5711001
9	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
10	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
11	CC 1081516568	SUAREZ ORTIZ LIDA VANESSA	2.000.000	F		X														0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	227.778	9.200	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	45.300	S	5711001
12	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29513458	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.333.600	93.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	29513458	2024-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.296.668	17.596.668	17.596.668	17.986.112	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.607.600	0	46.700	0	2.654.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	194.800	0	3.500	0	198.300
PROTECCION	230201	800229739	0	4	932.800	0	16.700	0	949.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.480.000	0	26.500	0	1.506.500
EPS(Administradoras: 3)				11	704.000	0	12.700	0	716.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	373.400	0	6.700	0	380.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	2.900	0	162.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	170.600	0	3.100	0	173.700
ARP(Administradoras: 1)				11	1.214.500	0	21.700	0	1.236.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	11	1.214.500	0	21.700	0	1.236.200
CCF(Administradoras: 1)				11	713.600	0	12.800	0	726.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	11	713.600	0	12.800	0	726.400
Gran Total					5.239.700	0	93.900	0	5.333.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29665390	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.607.600	28.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29665390	2024-04-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29665390	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.607.600	28.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29665390	2024-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	14.700	0	830.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	10.900	0	618.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	3.800	0	211.800
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	3.800	0	207.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	2.800	0	154.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	1.000	0	53.000
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	6.400	0	361.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	6.400	0	361.400
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	3.700	0	207.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	3.700	0	207.700
Gran Total					1.579.000	0	28.600	0	1.607.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
