| | | | |
|---|---|---|---|
| ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S. | FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO | **VERSIÓN:** 1 | |
| | | Fecha: 23/08/2021 | |
| | | Fecha de ingreso y egreso a la obra | DD/MM/AA |
| | | | DD/MM/AA |

| **IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Equipo: | Motoniveladora Champion | | | | Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA. |
| Placa (identificación) : | MC077278 | | | |  |
| Ubicación del equipo: | TUNJA | | | | |
| Marca: | CHAMPION | | | | |
| Modelo: | 1997 | | | | |
| Serie: | X026191X | | | | |
| Rodaje | Neumáticos | | | | |
| **DATOS DE LA MAQUINARIA** | | | | | |
| Propietario: | Benitez Camargo Ana María y otros C.C.33.376.474 | | | | |
| Color: | Amarillo | | | | |
| Dimensiones: | Peso: 13894 Kg | Alto: 3378mm | Ancho: 2489mm | Largo: 8458mm | |
| Datos de contacto E-mail: | ingenierosbenitez@gmail.com | | | | |
| Fecha de Registro: | 16/05/2018 | | | | OPERADOR |
| Condiciones de operación: | Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S. | | | | |
| OBSERVACIONES | Tarjeta registro de maquinaría No. 48178<br>Re potencialización: Noviembre de 2023, Hugo Ávila Ávila Tecnólogo Electromecánica | | | | |

*SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES*

| **CONTROL DE ACTIVIDADES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento. | | | | | |
| **FECHA** | **C** | **V** | **M** | **Descripción** | **Responsable** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.**

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

No. 48178

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

| NÚMERO DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC077278 | CHAMPION | 710A | 1997 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | MOTONIVELADORA | X026191X |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| AMARILLO | | NEUMATICOS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 13894 Kg | 3378 mm | 2489 mm | 8458 mm |

| PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BENITEZ CAMARGO ANA MARIA Y OTRO(S). | C.C. 33.376.474 |

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 16-05-2018 | 08-08-2018 | ****** |
| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000028538

*Hugo Ávila Ávila*
*Tecnólogo en Electromecánica*

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**
**MOTONIVELADORA CHAMPION**

**PROPIETARIO:**
ANA MARÍA BENÍTEZ CAMARGO
C.C. No. 33.376.474

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MAQUINA:**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MÁQUINA:** | MOTONIVELADORA |
| **MARCA:** | CHAMPION |
| **RODAJE:** | NEUMÁTICOS |
| **LÍNEA:** | 710A |
| **No. DE SERIE:** | X026191X |
| **AÑO DE FABRICACIÓN:** | 1997 |
| **COLOR:** | AMARILLO |
| **PESO:** | 13,89 Ton |
| | |
| **MOTOR:** | 6BT |
| **MARCA:** | CHAMPION |
| **POTENCIA BRUTA:** | 204HP |
| **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |

Mediante la presente me permito certificar que la maquina descrita, fue sometida a ajuste de motor, servotransmisión y sistema hidráulico para quedar repotenciada con las características correspondientes a una maquina modelo 2008.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2.023.

**HUGO ÁVILA ÁVILA**
**TECNÓLOGO EN ELECTROMECÁNICA**

**Mz J Casa 25 Brr. Ciudadela Sol de Oriente – Tunja - Boyacá**
Hugo_maqunaria@hotmail.com
**Cel: 3106799893**

# ANEXO 14
# RESUMEN DE AVANCE Y EJECUCIÓN

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

El día 13 de marzo de 2024 mediante el comunicado T-002-2023-152-OFC se solicito el inicio de proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento al cronograma el cual ha aumentado de manera exponencial hasta la fecha.

A corte del día 7 de abril de 2024 el consorcio SIVA VIAS presenta un porcentaje de atraso en tiempo de 20% y en costos del 16,65% tal como se puede observar a continuación:


Indicadores en tiempo


| Fecha de corte | % avance programado | % avance ejecutado | % atraso |
|---|---|---|---|
| 7/4/2024 | 62 | 42 | -20 |

Indicadores en costos

| Fecha de corte 7/4/2024 | avance programado | avance ejecutado | atraso |
|---|---|---|---|
| % | 31,97 | 15,32 | -16.65 |
| $ | 2.243.510.223,16 | 1.074.889.327,05 | -1.168.620.896,10 |

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

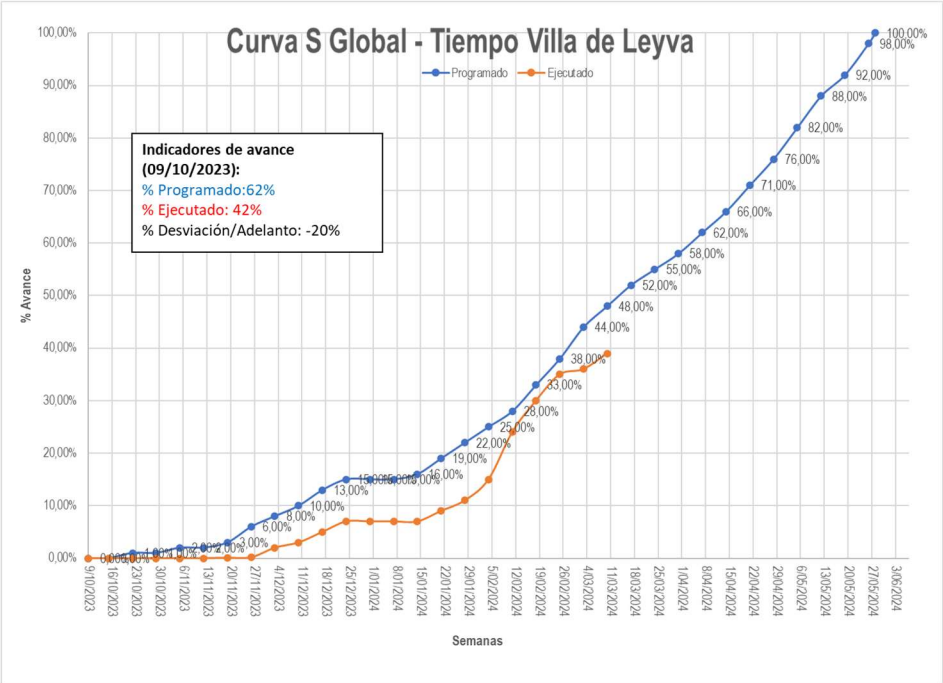

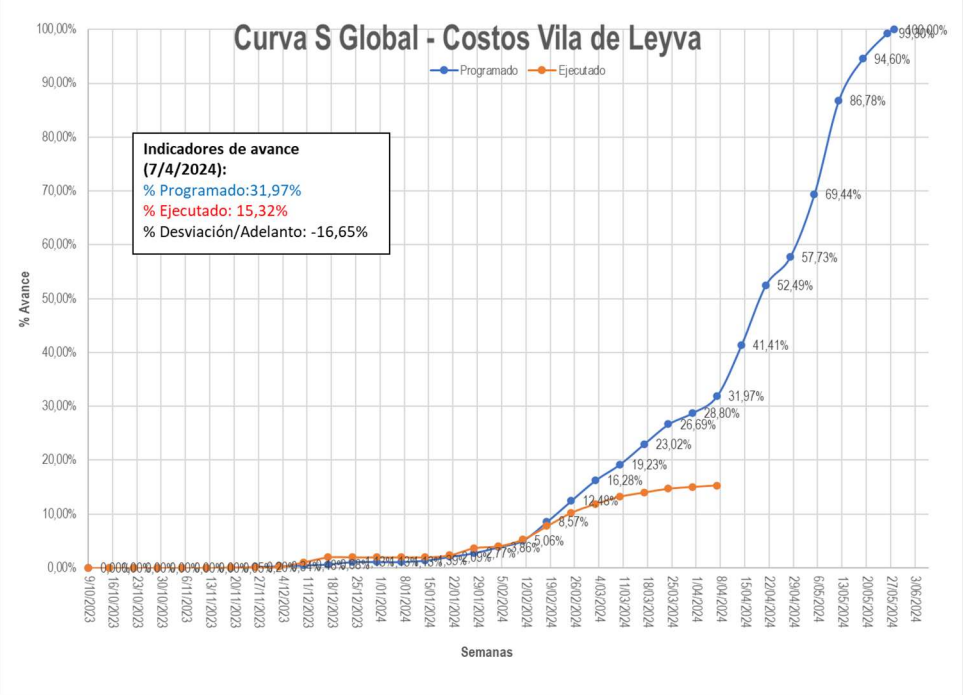
NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (C

| | Fecha de corte: 7/4/2024 | | | | | Indicadores en tiempo - Datos de | | | | | | Indicadores en costo - Datos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDT | Descripción | Valor Total | Duración | Comienzo | Fin | % Programado | % Ejecutado | % Desviación / Adelanto | Costo Programado | Costo Ejecutado | $ Desviación / Adelanto | % Programado | % Ejecutado | % Desviación / Adelanto |
| **0** | **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ** | **$ 7.017.631.198,80** | **213 días** | **lun 9/10/23** | **mar 28/05/24** | **62,00%** | **42,00%** | **-20,00%** | **$ 2.243.510.223,17** | **$ 1.074.889.327,06** | **-$ 1.168.620.896,11** | **31,97%** | **15,32%** | **-16,65%** |
| 1 | INICIO | $ 0,00 | 0 días | lun 9/10/23 | lun 9/10/23 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | AJUSTES Y REVISION DE DISEÑOS | $ 0,00 | 31 días | lun 9/10/23 | mié 8/11/23 | **100,00%** | **70,00%** | -30,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+2950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97 | $ 0,00 | 7 días | jue 9/11/23 | mié 15/11/23 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | FIN ACTIVIDADES PRELIMINARES | $ 0,00 | 0 días | mié 15/11/23 | mié 15/11/23 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5** | **OBRA VIAL** | **$ 6.895.037.548,90** | **175 días** | **jue 16/11/23** | **mar 28/05/24** | **58,00%** | **36,00%** | **-22,00%** | **$ 2.165.575.975,24** | **$ 1.013.207.286,70** | **-$ 1.152.368.688,53** | **31,41%** | **14,69%** | **-16,71%** |
| **5.1** | **Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K7+135.97, sentido Villa de Leyva a Arcabuco:** | **$ 2.606.430.444,24** | **175 días** | **jue 16/11/23** | **mar 28/05/24** | **73,00%** | **61,00%** | **-12,00%** | **$ 1.160.070.557,60** | **$ 784.817.234,78** | **-$ 375.253.322,82** | **44,51%** | **30,11%** | **-14,40%** |
| 5.1.1 | Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado derecho | $ 24.704.471,38 | 55 días | jue 16/11/23 | lun 29/01/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 24.704.471,38** | **$ 24.704.471,38** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.2 | Excavación para filtro francés de la cuneta lado derecho de la vía | $ 7.800.580,42 | 55 días | jue 16/11/23 | lun 29/01/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 7.800.580,42** | **$ 7.800.580,42** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.3 | Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado derecho | $ 10.583.613,87 | 15 días | lun 15/01/24 | lun 29/01/24 | **100,00%** | **83,00%** | -17,00% | **$ 10.583.613,87** | **$ 8.784.399,51** | **-$ 1.799.214,36** | 100,00% | 83,00% | -17,00% |
| 5.1.4 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 10.399.229,92 | 55 días | dom 19/11/23 | jue 1/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 10.399.229,92** | **$ 10.399.229,92** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.5 | Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado derecho | $ 1.124.710,97 | 12 días | mar 30/01/24 | sáb 10/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 1.124.710,97** | **$ 1.124.710,97** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| **5.1.6** | **Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado derecho** | **$ 167.404.576,25** | **10 días** | **dom 11/02/24** | **mar 20/02/24** | **100,00%** | **83,00%** | **-17,00%** | **$ 167.404.576,25** | **$ 120.720.096,64** | **-$ 46.684.479,61** | **100,00%** | **72,11%** | **-27,89%** |
| 5.1.6.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 133.384.227,45 | 10 días | dom 11/02/24 | mar 20/02/24 | **100,00%** | **65,00%** | -35,00% | **$ 133.384.227,45** | **$ 86.699.747,84** | **-$ 46.684.479,61** | 100,00% | 65,00% | -35,00% |
| 5.1.6.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 34.020.348,80 | 10 días | dom 11/02/24 | mar 20/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 34.020.348,80** | **$ 34.020.348,80** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.7 | Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado izquierdo | $ 64.704.471,38 | 12 días | mar 30/01/24 | sáb 10/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 64.704.471,38** | **$ 64.704.471,38** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.8 | Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado izquierdo | $ 15.583.613,87 | 12 días | mar 30/01/24 | sáb 10/02/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 15.583.613,87** | **$ -** | **-$ 15.583.613,87** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.1.9 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 15.839.153,72 | 7 días | dom 11/02/24 | sáb 17/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 15.839.153,72** | **$ 15.839.153,72** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.10 | Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado izquierdo | $ 1.124.710,97 | 10 días | mié 21/02/24 | vie 1/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 1.124.710,97** | **$ -** | **-$ 1.124.710,97** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.11** | **Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado izquierdo** | **$ 167.404.576,25** | **10 días** | **sáb 2/03/24** | **lun 11/03/24** | **100,00%** | **91,00%** | **-9,00%** | **$ 167.404.576,25** | **$ 143.395.415,31** | **-$ 24.009.160,94** | **100,00%** | **85,66%** | **-14,34%** |
| 5.1.11.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 133.384.227,45 | 10 días | sáb 2/03/24 | lun 11/03/24 | **100,00%** | **82,00%** | -18,00% | **$ 133.384.227,45** | **$ 109.375.066,51** | **-$ 24.009.160,94** | 100,00% | 82,00% | -18,00% |
| 5.1.11.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 34.020.348,80 | 10 días | sáb 2/03/24 | lun 11/03/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 34.020.348,80** | **$ 34.020.348,80** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| **5.1.12** | **Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado derecho** | **$ 136.601.602,28** | **10 días** | **mar 12/03/24** | **jue 21/03/24** | **100,00%** | **75,00%** | **-25,00%** | **$ 136.601.602,28** | **$ 81.058.446,51** | **-$ 55.543.155,77** | **100,00%** | **59,34%** | **-40,66%** |
| 5.1.12.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 111.086.311,54 | 10 días | mar 12/03/24 | jue 21/03/24 | **100,00%** | **50,00%** | -50,00% | **$ 111.086.311,54** | **$ 55.543.155,77** | **-$ 55.543.155,77** | 100,00% | 50,00% | -50,00% |
| 5.1.12.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 25.515.290,74 | 10 días | mar 12/03/24 | jue 21/03/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 25.515.290,74** | **$ 25.515.290,74** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| **5.1.13** | **Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado izquierdo** | **$ 136.601.602,28** | **10 días** | **vie 22/03/24** | **dom 31/03/24** | **100,00%** | **60,00%** | **-40,00%** | **$ 136.601.602,28** | **$ 47.732.553,05** | **-$ 88.869.049,23** | **100,00%** | **34,94%** | **-65,06%** |
| 5.1.13.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 111.086.311,54 | 10 días | vie 22/03/24 | dom 31/03/24 | **100,00%** | **20,00%** | -80,00% | **$ 111.086.311,54** | **$ 22.217.262,31** | **-$ 88.869.049,23** | 100,00% | 20,00% | -80,00% |
| 5.1.13.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 25.515.290,74 | 10 días | vie 22/03/24 | dom 31/03/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 25.515.290,74** | **$ 25.515.290,74** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| **5.1.14** | **FILTRO FRANCES** | **$ 220.346.179,17** | **45 días** | **sáb 16/12/23** | **dom 18/02/24** | **100,00%** | **87,00%** | **-13,00%** | **$ 220.346.179,17** | **$ 217.274.579,17** | **-$ 3.071.600,00** | **100,00%** | **98,61%** | **-1,39%** |
| 5.1.14.1 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | $ 217.274.579,17 | 45 días | sáb 16/12/23 | dom 18/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 217.274.579,17** | **$ 217.274.579,17** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.14.2 | DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA | $ 3.071.600,00 | 7 días | lun 12/02/24 | dom 18/02/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 3.071.600,00** | **$ -** | **-$ 3.071.600,00** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| **5.1.15** | **Instalación de Tubería de concreto D = 36" y relleno con material proveniente de la excavación** | **$ 56.570.617,70** | **22 días** | **dom 11/02/24** | **dom 3/03/24** | **100,00%** | **53,00%** | **-47,00%** | **$ 56.570.617,70** | **$ 16.887.373,53** | **-$ 39.683.244,18** | **100,00%** | **29,85%** | **-70,15%** |
| 5.1.15.1 | Demolición de estructuras hidráulicas existente | $ 11.066.445,10 | 7 días | dom 11/02/24 | sáb 17/02/24 | **100,00%** | **20,00%** | -80,00% | **$ 11.066.445,10** | **$ 2.213.289,02** | **-$ 8.853.156,08** | 100,00% | 20,00% | -80,00% |
| 5.1.15.2 | Excavación para obras hidráulicas de drenaje (alcantarillas) | $ 5.561.856,00 | 5 días | dom 18/02/24 | jue 22/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 5.561.856,00** | **$ 5.561.856,00** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.1.15.3 | Instalación de Tubería de concreto D = 36" | $ 34.431.810,00 | 7 días | vie 23/02/24 | jue 29/02/24 | **100,00%** | **22,00%** | -78,00% | **$ 34.431.810,00** | **$ 7.574.998,20** | **-$ 26.856.811,80** | 100,00% | 22,00% | -78,00% |
| 5.1.15.4 | Relleno con material proveniente de la excavación | $ 4.674.442,70 | 3 días | vie 1/03/24 | dom 3/03/24 | **100,00%** | **15,00%** | -85,00% | **$ 4.674.442,70** | **$ 701.166,41** | **-$ 3.973.276,30** | 100,00% | 15,00% | -85,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.15.5 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 836.063,90 | 7 días | vie 23/02/24 | jue 29/02/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 836.063,90** | **$ 836.063,90** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| **5.1.16** | **Fundida de pocetas-aleta de alcantarillas con concreto hecho en sitio** | **$ 84.789.877,20** | **15 días** | **lun 4/03/24** | **lun 18/03/24** | **100,00%** | **18,00%** | **-82,00%** | **$ 84.789.877,20** | **$ 14.359.410,39** | **-$ 70.430.466,81** | **100,00%** | **16,94%** | **-83,06%** |
| 5.1.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | $ 16.277.881,80 | 3 días | lun 4/03/24 | mié 6/03/24 | **100,00%** | **35,00%** | -65,00% | **$ 16.277.881,80** | **$ 5.697.258,63** | **-$ 10.580.623,17** | 100,00% | 35,00% | -65,00% |
| 5.1.16.2 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | $ 23.643.865,20 | 12 días | jue 7/03/24 | lun 18/03/24 | **100,00%** | **16,00%** | -84,00% | **$ 23.643.865,20** | **$ 3.783.018,43** | **-$ 19.860.846,77** | 100,00% | 16,00% | -84,00% |
| 5.1.16.3 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | $ 8.060.518,20 | 5 días | jue 7/03/24 | lun 11/03/24 | **100,00%** | **24,00%** | -76,00% | **$ 8.060.518,20** | **$ 1.934.524,37** | **-$ 6.125.993,83** | 100,00% | 24,00% | -76,00% |
| 5.1.16.4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | $ 36.807.612,00 | 7 días | mar 12/03/24 | lun 18/03/24 | **100,00%** | **8,00%** | -92,00% | **$ 36.807.612,00** | **$ 2.944.608,96** | **-$ 33.863.003,04** | 100,00% | 8,00% | -92,00% |
| **5.1.17** | **Carpeta de rodadura asfáltica en anchos de 3.3m** | **$ 1.048.720.838,46** | **21 días** | **lun 1/04/24** | **dom 21/04/24** | **17,00%** | **0,00%** | **-17,00%** | **$ 38.486.969,97** | **$ -** | **-$ 38.486.969,97** | **3,67%** | **0,00%** | **-3,67%** |
| 5.1.17.1 | Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H ancho 7.00 m | $ 44.752.290,66 | 7 días | lun 1/04/24 | dom 7/04/24 | **86,00%** | **0,00%** | -86,00% | **$ 38.486.969,97** | **$ -** | **-$ 38.486.969,97** | 86,00% | 0,00% | -86,00% |
| 5.1.17.2 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | $ 934.613.866,22 | 14 días | lun 8/04/24 | dom 21/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.17.3 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO) | $ 69.354.681,58 | 14 días | lun 8/04/24 | dom 21/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.18 | FIN CONSTRUCCION TRAMO Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K7+135.97 | $ 0,00 | 0 días | dom 21/04/24 | dom 21/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.1.19** | **Relleno de material de afirmado para cunetas** | **$ 39.290.514,37** | **21 días** | **mar 16/04/24** | **lun 6/05/24** | **0,00%** | **50,00%** | **50,00%** | **$ -** | **$ 10.032.342,88** | **$ 10.032.342,88** | **0,00%** | **25,53%** | **25,53%** |
| 5.1.19.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | $ 29.258.171,49 | 21 días | mar 16/04/24 | lun 6/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.19.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 10.032.342,88 | 21 días | mar 16/04/24 | lun 6/05/24 | **0,00%** | **100,00%** | 100,00% | **$ -** | **$ 10.032.342,88** | **$ 10.032.342,88** | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| **5.1.20** | **Fundida de cunetas en concreto hecho en sitio** | **$ 345.782.094,58** | **21 días** | **vie 19/04/24** | **jue 9/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.1.20.1 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | $ 46.643.199,09 | 21 días | vie 19/04/24 | jue 9/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.20.2 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | $ 299.138.895,49 | 21 días | vie 19/04/24 | jue 9/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.1.21** | **Placa en concreto de paso box culvert en pontón No.2 Y RIP RAP** | **$ 51.053.409,20** | **28 días** | **mié 1/05/24** | **mar 28/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.21.1 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA | $ 8.283.623,20 | 7 días | mié 1/05/24 | mar 7/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.21.2 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | $ 12.883.694,60 | 7 días | mié 8/05/24 | mar 14/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.21.3 | IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR | $ 289.800,00 | 7 días | mié 8/05/24 | mar 14/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.21.4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | $ 22.282.585,40 | 7 días | mié 8/05/24 | mar 14/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.21.5 | Enrocado Rip Rap pontón No.2 | $ 7.313.706,00 | 14 días | mié 15/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.1.22 | FIN CONSTRUCCION ENROCADO RIP RAP EN EL PONTON NO.2 | $ 0,00 | 0 días | mar 28/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.2** | **Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K2+950, sentido Arcabuco a Villa de Leyva:** | **$ 4.052.463.055,66** | **103 días** | **dom 11/02/24** | **jue 23/05/24** | **49,00%** | **11,00%** | **-38,00%** | **$ 1.005.505.417,64** | **$ 228.390.051,93** | **-$ 777.115.365,71** | **24,81%** | **5,64%** | **-19,18%** |
| 5.2.1 | Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado izquierdo | $ 74.793.746,37 | 15 días | dom 11/02/24 | dom 25/02/24 | **100,00%** | **49,00%** | -51,00% | **$ 74.793.746,37** | **$ 36.648.935,72** | **-$ 38.144.810,65** | 100,00% | 49,00% | -51,00% |
| 5.2.2 | Excavación para filtro francés de la cuneta lado izquierdo de la vía | $ 25.309.109,18 | 15 días | dom 11/02/24 | dom 25/02/24 | **100,00%** | **67,00%** | -33,00% | **$ 25.309.109,18** | **$ 16.957.103,15** | **-$ 8.352.006,03** | 100,00% | 67,00% | -33,00% |
| 5.2.3 | Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado izquierdo | $ 26.072.701,48 | 15 días | dom 11/02/24 | dom 25/02/24 | **100,00%** | **3,00%** | -97,00% | **$ 26.072.701,48** | **$ 782.181,04** | **-$ 25.290.520,44** | 100,00% | 3,00% | -97,00% |
| 5.2.4 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 18.941.946,68 | 7 días | lun 26/02/24 | dom 3/03/24 | **100,00%** | **62,00%** | -38,00% | **$ 18.941.946,68** | **$ 11.744.006,94** | **-$ 7.197.939,74** | 100,00% | 62,00% | -38,00% |
| 5.2.5 | Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado izquierdo | $ 1.884.630,83 | 15 días | mié 14/02/24 | mié 28/02/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 1.884.630,83** | **$ -** | **-$ 1.884.630,83** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| **5.2.6** | **Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado izquierdo** | **$ 280.081.987,40** | **14 días** | **dom 18/02/24** | **sáb 2/03/24** | **100,00%** | **50,00%** | **-50,00%** | **$ 280.081.987,40** | **$ 56.918.915,35** | **-$ 223.163.072,05** | **100,00%** | **20,32%** | **-79,68%** |
| 5.2.6.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 223.163.072,05 | 14 días | dom 18/02/24 | sáb 2/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 223.163.072,05** | **$ -** | **-$ 223.163.072,05** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.6.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 56.918.915,35 | 14 días | dom 18/02/24 | sáb 2/03/24 | **100,00%** | **100,00%** | 0,00% | **$ 56.918.915,35** | **$ 56.918.915,35** | **$ -** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5.2.7 | Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado derecho | $ 74.793.746,37 | 12 días | lun 26/02/24 | vie 8/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 74.793.746,37** | **$ -** | **-$ 74.793.746,37** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.8 | Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado derecho | $ 26.072.701,48 | 12 días | lun 26/02/24 | vie 8/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 26.072.701,48** | **$ -** | **-$ 26.072.701,48** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.9 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 14.788.502,98 | 7 días | sáb 9/03/24 | vie 15/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 14.788.502,98** | **$ -** | **-$ 14.788.502,98** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.10 | Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado derecho | $ 1.884.630,83 | 15 días | lun 26/02/24 | lun 11/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 1.884.630,83** | **$ -** | **-$ 1.884.630,83** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| **5.2.11** | **Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado derecho** | **$ 280.081.987,40** | **14 días** | **mar 12/03/24** | **lun 25/03/24** | **100,00%** | **3,00%** | **-97,00%** | **$ 280.081.987,40** | **$ 3.415.134,92** | **-$ 276.666.852,48** | **100,00%** | **1,22%** | **-98,78%** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.11.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 223.163.072,05 | 14 días | mar 12/03/24 | lun 25/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 223.163.072,05** | **$ -** | **-$ 223.163.072,05** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.11.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 56.918.915,35 | 14 días | mar 12/03/24 | lun 25/03/24 | **100,00%** | **6,00%** | -94,00% | **$ 56.918.915,35** | **$ 3.415.134,92** | **-$ 53.503.780,43** | 100,00% | 6,00% | -94,00% |
| **5.2.12** | **Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado izquierdo** | **$ 228.546.011,72** | **14 días** | **lun 1/04/24** | **dom 14/04/24** | **43,00%** | **0,00%** | **-43,00%** | **$ 98.274.785,04** | **$ -** | **-$ 98.274.785,04** | **43,00%** | **0,00%** | **-43,00%** |
| 5.2.12.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 185.856.776,46 | 14 días | lun 1/04/24 | dom 14/04/24 | **43,00%** | **0,00%** | -43,00% | **$ 79.918.413,88** | **$ -** | **-$ 79.918.413,88** | 43,00% | 0,00% | -43,00% |
| 5.2.12.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 42.689.235,26 | 14 días | lun 1/04/24 | dom 14/04/24 | **43,00%** | **0,00%** | -43,00% | **$ 18.356.371,16** | **$ -** | **-$ 18.356.371,16** | 43,00% | 0,00% | -43,00% |
| **5.2.13** | **Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado derecho** | **$ 228.546.011,72** | **14 días** | **lun 15/04/24** | **dom 28/04/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.2.13.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | $ 185.856.776,46 | 14 días | lun 15/04/24 | dom 28/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.13.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 42.689.235,26 | 14 días | lun 15/04/24 | dom 28/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.2.14** | **FILTRO FRANCES** | **$ 311.020.954,03** | **21 días** | **mié 3/04/24** | **mar 23/04/24** | **19,00%** | **17,00%** | **-2,00%** | **$ 59.093.981,27** | **$ 100.320.050,83** | **$ 41.226.069,56** | **19,00%** | **32,26%** | **13,26%** |
| 5.2.14.1 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | $ 304.000.154,03 | 21 días | mié 3/04/24 | mar 23/04/24 | **19,00%** | **33,00%** | 14,00% | **$ 57.760.029,27** | **$ 100.320.050,83** | **$ 42.560.021,56** | 19,00% | 33,00% | 14,00% |
| 5.2.14.2 | DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA | $ 7.020.800,00 | 21 días | mié 3/04/24 | mar 23/04/24 | **19,00%** | **0,00%** | -19,00% | **$ 1.333.952,00** | **$ -** | **-$ 1.333.952,00** | 19,00% | 0,00% | -19,00% |
| **5.2.15** | **Instalación de Tubería de concreto D = 36" y relleno con material proveniente de la excavación** | **$ 24.701.698,10** | **34 días** | **sáb 9/03/24** | **jue 11/04/24** | **88,00%** | **11,00%** | **-77,00%** | **$ 23.430.960,34** | **$ 1.603.723,97** | **-$ 21.827.236,37** | **94,86%** | **6,49%** | **-88,36%** |
| 5.2.15.1 | Demolición de estructuras hidráulicas existente | $ 4.327.519,40 | 10 días | sáb 9/03/24 | lun 18/03/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 4.327.519,40** | **$ -** | **-$ 4.327.519,40** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.15.2 | Excavación para obras hidráulicas de drenaje (alcantarillas) | $ 2.429.884,80 | 7 días | mar 19/03/24 | lun 25/03/24 | **100,00%** | **66,00%** | -34,00% | **$ 2.429.884,80** | **$ 1.603.723,97** | **-$ 826.160,83** | 100,00% | 66,00% | -34,00% |
| 5.2.15.3 | Instalación de Tubería de concreto D = 36" | $ 15.756.930,00 | 10 días | mar 26/03/24 | jue 4/04/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 15.756.930,00** | **$ -** | **-$ 15.756.930,00** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| 5.2.15.4 | Relleno con material proveniente de la excavación | $ 1.789.771,50 | 7 días | vie 5/04/24 | jue 11/04/24 | **29,00%** | **0,00%** | -29,00% | **$ 519.033,74** | **$ -** | **-$ 519.033,74** | 29,00% | 0,00% | -29,00% |
| 5.2.15.5 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | $ 397.592,40 | 7 días | mar 26/03/24 | lun 1/04/24 | **100,00%** | **0,00%** | -100,00% | **$ 397.592,40** | **$ -** | **-$ 397.592,40** | 100,00% | 0,00% | -100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.16** | **Fundida de pocetas-aleta de alcantarillas con concreto hecho en sitio** | **$ 36.069.445,60** | **28 días** | **vie 12/04/24** | **jue 9/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.2.16.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | $ 7.418.979,30 | 7 días | vie 12/04/24 | jue 18/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.16.2 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | $ 9.973.153,20 | 21 días | vie 19/04/24 | jue 9/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.16.3 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | $ 2.949.462,80 | 7 días | vie 19/04/24 | jue 25/04/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.16.4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | $ 15.727.850,30 | 14 días | vie 26/04/24 | jue 9/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.17 | Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H ancho 7.00 m | $ 74.875.217,34 | 10 días | lun 29/04/24 | mié 8/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.2.18** | **Carpeta de rodadura asfáltica en anchos de 3.3m** | **$ 1.679.739.045,80** | **14 días** | **mar 30/04/24** | **lun 13/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.2.18.1 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | $ 1.563.701.778,58 | 14 días | mar 30/04/24 | lun 13/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.18.2 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO) | $ 116.037.267,22 | 14 días | mar 30/04/24 | lun 13/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.19 | FIN CONSTRUCCION TRAMO Desde la abscisa inicial K2+950 hasta la abscisa K5+570 | $ 0,00 | 0 días | lun 13/05/24 | lun 13/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.2.20** | **Relleno de material de afirmado para cunetas** | **$ 65.736.347,23** | **14 días** | **vie 3/05/24** | **jue 16/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.2.20.1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | $ 48.951.390,71 | 14 días | vie 3/05/24 | jue 16/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.20.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | $ 16.784.956,52 | 14 días | vie 3/05/24 | jue 16/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.2.21** | **Fundida de cunetas en concreto hecho en sitio** | **$ 578.522.633,12** | **18 días** | **lun 6/05/24** | **jue 23/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.2.21.1 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | $ 78.038.009,41 | 18 días | lun 6/05/24 | jue 23/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2.21.2 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | $ 500.484.623,71 | 18 días | lun 6/05/24 | jue 23/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.3 | FIN CONSTRUCCION CUNETAS DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97 | $ 0,00 | 0 días | jue 23/05/24 | jue 23/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.4** | **Defensas viales y señalizaciones** | **$ 88.201.760,00** | **7 días** | **lun 20/05/24** | **dom 26/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM | $ 2.457.600,00 | 7 días | lun 20/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM | $ 7.372.800,00 | 7 días | lun 20/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 MTS. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS | $ 24.048.000,00 | 7 días | lun 20/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 CM. SEGUN NORMA INVIAS | $ 54.323.360,00 | 7 días | lun 20/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.5** | **Pintura para tráfico, marcas viales y tachas reflectivas** | **$ 68.997.810,00** | **11 días** | **jue 16/05/24** | **dom 26/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.5.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS | $ 36.967.440,00 | 11 días | jue 16/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES | $ 10.731.750,00 | 11 días | jue 16/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.5.3 | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | $ 21.298.620,00 | 11 días | jue 16/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.6 | FIN INSTALACION DE SEÑALES Y PINTURA PARA TRAFICO DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97 | $ 0,00 | 0 días | dom 26/05/24 | dom 26/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **5.7** | **Fundida de canales concreto hecho en sitio** | **$ 78.944.479,00** | **13 días** | **jue 16/05/24** | **mar 28/05/24** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| 5.7.1 | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | $ 23.745.590,00 | 3 días | jue 16/05/24 | sáb 18/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | $ 3.650.430,30 | 3 días | dom 19/05/24 | mar 21/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.7.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | $ 3.561.063,40 | 7 días | mié 22/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.7.4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | $ 47.987.395,30 | 7 días | mié 22/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | CARACTERIZACIÓN VIA VILLA DE LEYVA (11,48 KM) | $ 11.259.010,00 | 7 días | mié 22/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | PMT | $ 48.994.812,56 | 175 días | jue 16/11/23 | mar 28/05/24 | **70,00%** | **75,00%** | 5,00% | **$ 34.296.368,79** | **$ 36.746.109,42** | **$ 2.449.740,63** | 70,00% | 75,00% | 5,00% |
| 8 | PMA | $ 62.339.827,34 | 175 días | jue 16/11/23 | mar 28/05/24 | **70,00%** | **40,00%** | -30,00% | **$ 43.637.879,14** | **$ 24.935.930,94** | **-$ 18.701.948,20** | 70,00% | 40,00% | -30,00% |
| 9 | FIN OBRA | $ 0,00 | 0 días | mar 28/05/24 | mar 28/05/24 | **0,00%** | **0,00%** | 0,00% | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

# ANEXO 15
# BITÁCORA

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

Asi mismo se recordó al consorcio contratista que el concreto para estas muros es impermeabilizado por lo que se debe tener en cuenta ya que el mismo se esta preparando en obra. La maquinaria no realiza actividades.

Raymar Gelves G.

10-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaría: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topografo, ambiental, 2 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 1 conductor.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero
la retroexcavadora realiza excavación para construcción de filtro sobre la K2+400, asi mismo se realiza la instalación de 7 tubos de Ø=36" para la alcantarilla sobre el canal izquierda en la K4+110. El consorcio SIVA VIAS realiza la aclaración de que va a requerir un tubo adicional teniendo en cuenta que la localización que marcan los diseños para esta alcantarilla es en diagonal, luego cada extremo va a requerir cortar 1/2 tubo. Tambien se instaló concreto de 2000 psi para atraque de esta alcantarilla, finalmente se realiza construcción de filtro sobre la K1+490.
se evidencia presencia en obra de profesional SST y Profesional de Topografia por parte de interventoria.

Raymar Gelves G

12-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaría: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volqueta.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se culmina la excavación sobre el canal izquierdo de la alcantarilla K3+670, en este punto se instala concreto de 2000 psi para salado aunque se observa un grado alto de humedad. En la alcantarilla K4+110 se inicia

El relleno con material proveniente de la excavación. Desde la interventoría se realiza un llamado de atención a la correcta utilización de los EPP, específicamente el uso de protectores auditivos a la cuadrilla de alcantarillas.

se evidencia presencia del profesional SST y profesional de topografía por parte de la interventoria. la interventoría actúa que cuenta con el personal requerido.

Raymer Gelves G.

13-3-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaría: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carro tanque y volqueta.
Personal contratista: residente, SST, ambiental, social, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares y 4 operadores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se realiza construcción de filtro Francés sobre la abscisa K2+430, desde la interventoría se expresa la preocupación por la poca actividad realizada y el hecho de que las motoniveladoras se encuentren completamente paradas, así mismo se manifiesta que se realizo una solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento dado el atraso presentado. Contestaremos en su momento este requerimiento por parte del consorcio. Que tiene origen en la falta de aprobación de los diseños geométricos, en la carpeta asfáltica y la intervención por terceros de mas del 50% del objeto del contrato, entre otros.

Raymer Gelves G.

14-3-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaría: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carro tanque y volqueta.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
la retroexcavadora realiza corte y excavación para la sub-rasante, se culmina el relleno con material proveniente de la excavación en la alcantarilla K4+120. se realiza en conjunto replanteo topográfico para la excavación de

la alcantarilla K4+120, la demas maquinaria permanece parqueada, esta actividad se realiza por el consorcio con presencia del cadenero de interventoria, nuevamente se evidencia presencia en obra de profesional sst y profesional de topografia de interventoria. la interventoria aclara que cuenta con el personal requerido.

Reymar Celves C.

15-3-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaria: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volqueta
Personal contratista: residente, sst, topógrafo, social, 2 caderneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 1 conductor.
Personal interventoría: residente, sst, topógrafo y cadenero.
se continua con el replanteo topográfico, teniendo en cuenta que en los trabajos de reubicación de tuberías realizados por el acueducto ARCASA, se movieron las estacas y referencias de la zona. sobre el margen derecho en la alcantarilla K3+030 se realizó nuevamente la instalación de concreto para solado esto debido a que el que se habia instalado se encontraba muy blando posiblemente debido al agua presente, se realiza la instalación de concreto impermeabilizado para muros y dacoles sobre la K3+990, desde la interventoría se solicita la realización de ensayos de control y calidad a los concretos a lo que el consorcio manifiesta que se esta coordinando lo pertinente.
se evidencia presencia de profesional SST. la interventoría aclara que cuenta con el personal requerido.

Reymar Celves C.

16-3-24 Estado del clima: am/ soleado
maquinaria: motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, vibrocompactador, carro tanque.
Personal contratista: residente, sst, ambiental, social, topógrafo, 2 caderneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores, 1 conductor.
Personal interventoría: residente, sst, topógrafo y cadenero.
sobre la abscisa K3+365 se evidenció un poste de electricidad inclinado sobre la vía, esto al inicio de la

Jornada laboral, ante el inminente riesgo para los usuarios de la vía, el consorcio SIVA VIAS inició el protocolo cerrando la vía y redirigiendo el tráfico por una ruta alterna, inmediatamente se realizo el acercamiento con la empresa de energía quienes sobre las 12:00 p.m solucionaron el percance. El incidente se presentó posiblemente debido a la excavación de filtro que quedo junto al poste desde el dia anterior y debido a las fuertes lluvias presentadas el terreno se erosionó. Por parte del consorcio vemos con preocupación la situación con los postes electricos como de telefonias ya que es el segundo incidente y dichos postes presentan un riesgo al estar tan pegados a la estructura de la via y con las actividades de filtro podrian seguir desprendiéndose. se evidencia Presencia de Profesionales SST y de Topografia por parte de interventoria.

Reymar Celvez G.

18-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaria: motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, vibrocompactador, carro tanque
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 7 conductor.
Personal de interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero
se realizó el retiro de la formaleta en el descole de la alcantarilla de la K3+990, posteriormente la cuadrilla de estructuras hidraulicas se retiro de la obra. La retroexcavadora se retiro de la obra y la demas maquinaría se encuentra parqueada. El equipo de topografia realiza replanteo, el consorcio informa que mediante el comunicado CSV-2023-059 se realizó la solicitud de suspensión del contrato a partir del 25 de marzo hasta el 31 de marzo. La interventoría manifiesta que estudiará la iniciativa.
se evidencia presencia en obra de profesional SST y profesional de topografia por parte de interventoria. la interventoria aclara que cuenta con el personal requerido.

Reymar Celvez G.

19-3-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaria: motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, vibrocompactador, carro tanque y volqueta.

Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se realiza lleno con material proveniente de la excavación en la alcantarilla K3+870, así mismo se realiza lleno de un vacío que había quedado en el eje de la vía en la alcantarilla K3+990 con el objeto de habilitar ambos carriles y disminuir los riesgos. la retroexcavadora realiza corte y explanación, la demas maquinaría continua parqueada.
- se evidencia presencia de profesional SST y profesional de topografía en obra por parte de la interventoría. la interventoría aclara que cuenta con el personal requerido.
Reymar Celves G.

20-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
Personal contratista: residente, SST, ambiental, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
maquinaría: motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora, carro tanque y volqueta.
la retroexcavadora realiza actividades de corte y excavación. La demas maquinaria permanece parqueada. el equipo de topografía interventoría/contratista realiza chequeo de cotas en puntos de referencia y toma de secciones desde la K2+100 hasta la K0+00. Esto se realiza con el residente y cadenero de interventoría.
- se evidencia presencia de profesional SST y profesional de topografía en obra por parte de interventoría. la interventoría aclara que cuenta con el personal requerido. Reymar Celves C.

21-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
maquinaria: motoniveladoras, vibrocompactador, retroexcavadora, excavadora, carro tanque y volqueta.
La unica maquina laborando es la retroexcavadora, las

demas permanecen parqueadas, los puntos de cierre de la via se desplazaran al punto de trabajo. La topografia continua con labores de replanteo. se realiza construcción de filtro en la K2+220.
se evidencia presencia de profesional sst y profesional de topografia en obra por parte de la interventoria. la interventoría aclara que cuenta con el personal requerido
Reymar Gelves G.

22-3-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora, carro tanque y volquetas
Personal contratista: residente, SST, ambiental, social, topógrafo 2 cadeneros, 6 auxiliares, 5 operadores, 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
La excavadora realiza actividad de corte y excavación de la explanación, la retroexcavadora realiza excavación para filtro, la demas maquinaria permanece parqueada
El consorcio contratista manifiesta su inconformidad por la no suspensión del contrato como lo habian solicitado y esperan que el dia sabado 23 y domingo 24 habra restricción de vehículos de carga en el municipio.
se evidencia Presencia de profesional SST y profesional de topografia en obra por parte de interventoria. la interventoría manifiesta que cuenta con el personal requerido.
Reymar Gelves G.

23-3-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaria: 2 motoniveladoras, vibrocompactador, retroexcavadora excavadora, carro tanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 5 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
La excavadora continua con actividades de corte y excavación de la explanación hasta la K2+160. Debido a que no se acopió suficiente material para filtro y a la restricción de vehículos de carga pesada el consorcio determinó llenar con material proveniente de la excavación aproximadamente 70 ml de excavación

para Filtro, esto con el Fin de evitar accidentes durante el Festivo, se trabajo doble jornada am/pm. Debido a que el consorcio no cuenta con un acopio de material y por el alto flujo vehicular que se mantiene en la via, no es pertinente acopiar material sobre esta y por la restricción de vehiculos no se pudo transportar material., se evidencia Profesional SST y Profesional de topografia en obra por parte de interventoria. la interventoría cuenta con el personal requerido.

Raymar Galves G.

26-3-24 Estado del clima: am/pm nublado sin lluvias.
maquinaria: 1 motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, retroexcavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se retiró una de las motoniveladoras, vibrocompactador presenta Fallas mecánicas, la excavadora realiza actividades de corte y explanación y la retroexcavadora excavación y construcción de Filtro. Al Final de la jornada se señaliza adecuadamente las zonas de excavación. En el tramo de la K2+100 hasta la K2+050 no se realizan excavación debido a un tema de cercas y poda de arboles, se continua de la K2+050 hacia menores.
se observa presencia de profesional SST y profesional de topografia en obra por parte de la interventoria. La interventoría aclara que cuenta con el personal requerido.

Raymar Galves G.

27-3-24 Estado del clima: nublado sin lluvias.
maquinaria: 1 motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, excavadora carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 6 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Se continua con actividades de corte y explanación, excavación y construcción de Filtro. se refuerza la señalización en el tramo de intervensión. se Finaliza jornada sin mayor novedad. La interventoría manifiesta contar con el personal requerido.
se evidencia presencia de profesional SST y profesional de topografia en obra por parte de interventoria.

Raymar Galves G.

1-4-24 Estado del clima: nublado sin lluvias.
Personal contratista: residente, SST, social, ambiental, topógrafo, 2 cadeneros, 1 apical, 7 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Maquinaria: motoniveladora, excavadora, retro excavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
se realiza corte y excavación para subrasante sobre la K1+940. La motoniveladora y vibrocompactador perfilan terreno natural en la K2+100 e inician conformación de la subrasante en la K3+120 hacia menores. se observa que los factores climáticos han deteriorado las capas granulares instaladas.
Se evidencia presencia de profesional SST y profesional de topografía en obra por parte de interventoría desde interventoría indica que se cuenta con el personal requerido para el desarrollo contrato 3031 de 2023.
Reymar Celves G.

2-4-24 Estado del clima: am nublado sin lluvias
pm se presentan lluvias sobre 1pm y después de las 4:30 pm.
maquinaria: 2 motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, ambiental, topógrafo, 2 cadeneros, 1 apical, 7 auxiliares, 5 operadores y 3 conduc
Personal interventoría: residente, SST y cadenero.
se realiza excavación sobre margen derecha en alcantarilla K3+990 margen derecho y se realiza la instalación de solado. se continua con la conformación de la subrasante hasta la K2+870 y construcción de alt
se requirió desplazar la excavadora hasta la K3+990 continuar con la excavación. Se hace la precisión que l alcantarilla en cuestión es la K3+990. sobre la abscisa K2+035 se observan la disposición de aguas residuales sobre la vía, se realiza acercamiento con propietarios para conocer la situación y se dará traslado a la entidad de la situación.
- se evidencia profesional SST en obra por parte de interventoría

3-4-24 Estado del clima: am soleado
pm con fuertes lluvias.
maquinaria: 2 motoniveladoras, retroexcavadora, excavadora, carro tanque, vibrocompactador y volquetas
Personal contratista: residente, sst, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 6 auxiliares, 5 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, sst, topógrafo y cadenero.
La interventoría realiza chequeo y verificación de niveles para subrasante desde la K3+120 hasta la K2+960, encontrandose 4 puntos que llenan sobre el eje aproximadamente 4 cm, se recomienda mejorar la compactación de los hombros los cuales se ven afectados por las lluvias de la noche anterior y se recuerda que de la abscisa K3+060 hacia menores se debe realizar ensayos de densidades. las lluvias dificultan las actividades en la jornada de la tarde.
Comienza lluvia fuerte a las 2:10 Pm y de corrido en la tarde, por tal motivo se pararon las actividades y maquinaria. Entre las abs 2+080 y 2+100 se encuentra canal de concreto, el cual ha sido descubierta la estructura por la excavación del filtro frances y las fuertes lluvias, pudiendo causar daños estructurales a este, cabe mencionar que este canal no sera intervenido. No se evidencia presencia profesional sst y de topografia de interventoria.
Desde la interventoria se aclara que se cuenta con el personal requerido para el desarrollo del contrato 3031 de 2023
Roymar Celues G

4-4-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaria: motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, carro tanque, vibrocompactador y volquetas.
Personal contratista: residente, sst, topografo, 2 cadeneros, 1 oficial, 6 auxiliares, 5 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Se realizan actividades de perfilado y conformación de la subrasante, excavación para filtro y caile y explanación del terreno natural. El equipo de topografía realiza chequeo de la subrasante (interventoría) desde la K3+120 hacia menores, encontrando que se tienen puntos que no coinciden con el diseño los

cuales fueron socializados con la topografía del consorcio contratista.

El consorcio SIVA VIAS manifiesta: la comunidad del sector conocido como chapanillo hacen un llamado al contratista y a la interventoría, donde comentan con preocupación que serán afectados grandemente con las alcantarillas de las abscisas K2+350 y K2+350 y el manejo de aguas que se tiene en el diseño. Desde el consorcio SIVA VIAS solicitamos a la interventoría por medio de esta el paso a seguir. Desde la interventoría se solicita trasladar el requerimiento vía correo electrónico acompañado del oficio que la comunidad se comprometió a enviar, con el objeto de dar traslado a la entidad.

Raymal Galvez G.

5-4-24 Estado del clima: am/pm soleado am

lluvias despues de las 3:30 pm.

maquinaria: motoniveladora, retroexcavadora, excavadora, carro-tanque, vibrocompactador y volquetas.

Personal contratista: residente, SST, topografo, 2 cadeneros, 1 oficial & auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.

Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.

Sobre las 12pm se recibe visita del dr. william archila, secretario de contratación de la entidad departamental quien viene a realizar visita de verificación debido a las solicitudes de incumplimiento presentadas por la interventoría, se realiza recorrido explicandole las cantidades y actividades realizadas a la fecha, desde la interventoría se manifiesta que se reiniciaron las actividades sin embargo el atraso continua, el cual a fecha de 31-3-24 es de -13,76 en términos de costos y -17% en términos de tiempo. El consorcio contratista manifiesta las dificultades que se han presentado haciendo enfasis en que no se tiene el diseño geométrico aprobado ni el ítem de asfalto aprobado por lo que a su consideración no le han dado las garantías para el desarrollo del proyecto. Se realiza instalación de concreto de 3000 psi para placa de piso en descole de la alcantarilla K3+870, desde la interventoría se solicita una corrección en la acomodación del acero, la cual fue

subsanada inmediatamente. El consorcio SIVA VIAS realiza cilindros para control y calidad. Desde el consorcio contratista se solicita verificar niveles de subrasante desde la K2+960 hacia menores, sin embargo una vez realizado recorrido por el equipo de topografía y residente de topografía se observa que los hombros tanto derechos como izquierdos no se encuentran en condiciones optimas, presentan desniveles, un alto grado de humedad y falta de compactación por lo que la interventoría solicita corregir esto antes de chequear niveles.

El consorcio manifiesta: se ha podido evidenciar que a lo largo de la vía intervenida por el acueducto ARCASA, en su actividad de reubicación de la tubería han estado haciendo excavaciones en la subrasante dentro de lo que será la calzada, para hacer extracción y recuperación de la tubería, paralelo a esto estan realizando un llenado para tapar dicha excavación y en esta actividad no se observa ningun tipo de compactación a este material, causando afectación directa a la subrasante, como tambien han estado haciendo la misma actividad en varios tramos largos donde estan dejando la tubería ya reubicada debajo de lo que será la cuneta, haciendo el mismo proceso mencionado anteriormente. hasta el momento estas actividades van por la abscisa K1+230 aproximadamente. por otra parte luego del chequeo de los niveles de subrasante por parte del Ing. residente y cadenero de topografía, el consorcio tomará las medidas necesarias para dejar el terreno en óptimas condiciones.

Raymar Celves C.

6-4-24 Estado del clima: am soleado

maquinaria: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, carrotanque, vibrocompactador y volquetas.

Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial & auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.

Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.

Se realiza instalación de concreto de 3000 psi impermeabilizado en placa de piso del descole de la alcantarilla K4+120. se continua con actividades de corte y explanación sobre la K1+560, se realizan cilindros para verificación de control y calidad

del concreto. Así mismo se realiza excavación para filtro, desde la interventoría se solicita iniciar el lleno de la excavación realizada ya que se tiene cerca de 100 ml de excavación que podría presentar fallas si no se rellena y construye filtro pronto. El consorcio manifiesta que la problemática con los predios ya fue advertida y que coordinará lo pertinente.

Raymer Galvis G.

8-4-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaria: 2 motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora excavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 6 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se realiza perfilado de subbase sobre la K3+250 - K3+345.
se realiza relleno de la excavación de la alcantarilla K3+990,
Desde la interventoría se verifican niveles de subrasante desde la K2+960 hasta la K2+740, sin embargo se solicita perfilar para ajustar a niveles de diseño. y se deja la observación por posible falla sobre el hombro derecho en dicho tramo.

Raymer Galvis G.

# ANEXO 16
# ACTAS DE COMITÉ

(No se realizaron comités en el periodo correspondiente al presente informe)

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# ANEXO 17

# ACTAS DE VECINDAD

NO SE REALIZARON ACTAS DE VECINDAD EN ESTE PERIODO. SIN EMBARGO SE REALIZARON SEGUIMIENTO A LAS ACTAS LEVANTADAS LOS CUALES SE PUEDEN OBSERVAR EN LA PAGINA 582

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# ANEXO 18


# CERTIFICACIONES

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# CERTIFICACIÓN DE LA CORRECTA INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100-6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá" celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, y de acuerdo a las evidencias presentadas por el consorcio SIVA VIAS y anexas en el presente informe, certifico que durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2024 el contratista de obra ha realizado la correcta inversión de los giros autorizados en condición de anticipo.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de abril de 2024.



CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

# CERTIFICACIÓN DE DEDICACIÓN Y PERMANENCIA DEL RECURSO HUMANO

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100-6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá" celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, y conforme a lo evidenciado en obra y a los documentos presentados por el consorcio SIVA VIAS, certifico que durante el periodo correspondiente al presente informe el personal técnico presente en obra corresponde al aprobado y cumple con los requisitos mínimos estipulados por la entidad.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de abril de 2024.




CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LAS MAQUINAS

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100-6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá" celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, basado en la información presentada por el consorcio SIVA VIAS y adjunta en el presente informe, certifico que durante el periodo correspondiente al mes de marzo el consorcio contratista dispuso de la maquinaria mínima requerida para la ejecución de actividades y la misma cuenta con las condiciones de funcionabilidad adecuadas.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de abril de 2024.



CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# CERTIFICACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100-6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá" celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, de acuerdo con lo evidenciado en obra y la documentación presentada por el consorcio contratista, certifico que durante el periodo correspondiente al presente informe se ha realizado la correcta implementación del plan de manejo de tránsito suministrado.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de abril de 2024.




CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# CERTIFICACIÓN PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100-6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá" celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, certifico que durante el periodo correspondiente al presente informe, las actividades ejecutadas se han desarrollado realizando los procesos constructivos adecuados a cada paso y acordes a las especificaciones técnicas de las mismas.

Dada en Bogotá a los 14 días del mes de abril de 2024.



CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-044** |
| **CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE VALLA** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28/10/2023 | | | |
| **CONTRATO / CONVENIO** | No. | 3268 | FECHA | 28/08/2023 |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SIVA VÍAS | | | |
| **PLAZO** | 7 MESES | | | |
| **VALOR** | $ | | | 7.017.631.198,80 |
| **INTERVENTORÍA** | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S | | | |

**El suscrito interventor certifica que la valla referente al contrato o convenio anteriormente descrito, fue instalada en el sitio K4+800 en la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco y cumple con los parámetros establecidos por la Gobernación de Boyacá.**

**OBSERVACIONES (Si las hay): La valla fue instalada en el sitio acordado y cumple con los requisitos y características estipuladas por la gobernación de Boyacá.**

INTERVENTOR

Anexar registro fotográfico.



CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100 -6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá " celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, basado en la evidencia presentada por el contratista, certifico que el personal presente en obra cuenta con la debida afiliación al sistema de seguridad social y ARL acorde a lo estipulado en la ley.

Dada a los 14 días del mes de abril de 2024



CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

CERTIFICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100 -6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá " celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, y teniendo en cuenta la información allegada me permito informar que el consorcio contratista no realizó la entrega de la totalidad de información referente al cumplimiento del plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, razón por la cual se incluyó como causal en la actualización de solicitud de incumplimiento radicada.

Dada a los 14 días del mes de abril de 2024

CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S


NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

CERTIFICACIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PMA.

Yo, Camilo Adolfo Naged, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.149.315 en condición de representante legal de Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S identificada con NIT 800.155.100 -6 en calidad de interventor del contrato de obra 3268 de 2023 cuyo objeto es "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, Boyacá " celebrado entre la gobernación de Boyacá y el consorcio SIVA VIAS, y teniendo en cuenta la información presentada por el consorcio SIVA VIAS y adjunta al presente informe, certifico que se ha realizado la correcta implementación del plan de manejo ambiental y plan de gestión social.

Dada a los 14 días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,



CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

A la fecha el consorcio SIVA VIAS presenta un atraso en términos de costos de -16,65% y en indicadores de tiempo de -20%, razon por la cual el dia 13 de marzo de 2024 mediante el comunicado T-002-2023-152-OFC se solicito el inicio de proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento al cronograma y plan de trabajo por parte del consorcio SIVA VIAS el cual fue actualizado a la fecha mediante el comunicado T-002-2023-189-OFC.

Cordialmente,

CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# ANEXO 19
# INFORMES DEL CONSORCIO SIVA VIAS

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

**INFORME MENSUAL NO. 05**

**09 DE MARZO DE 2024 – 08 DE ABRIL DE 2024**

**CONTRATO 3268 DE 2023**

**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

CONSORCIO SIVA VIAS

**11 DE ABRIL DE 2024**

# Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. OBJETIVOS ..... 3
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 4
4. ASPECTOS JURÍDICOS ..... 5
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..... 6
5.1. RELACIÓN DEL PERSONAL SUSCRITO AL CONTRATO DURANTE EL MES DE ENERO: ..... 6
5.2. RELACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE CARGA DURANTE EL MES DE ENERO ..... 6
5.3. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE EL MES DE ENERO ..... 7
5.4. RELACIÓN VIGENTE DE PÓLIZAS ..... 7
6. ASPECTOS FINANCIEROS ..... 8
6.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ..... 8
6.2. RESUMEN DE FACTURACIÓN ..... 9
7. AVANCE DE OBRA ..... 10
7.1. INICIACIÓN ..... 10
7.2. VALLA INFORMATIVA ..... 10
7.3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ..... 11
7.4. EJECUCIÓN DE OBRAS ..... 12
8. GESTIÓN DEL PROYECTO ..... 15
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 17
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 29
11. ANEXOS ..... 30

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene la finalidad de exponer de manera cualitativa y cuantitativa los avances realizados por el CONSORCIO SIVA VÍAS en cada una de las actividades enmarcadas en el contrato de obra 3268 de 2023 durante el periodo comprendido del 9 de marzo de 2024 y el 8 de abril de 2024.

Además, contiene toda la información necesaria para que la interventoría pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones en lo relativo a la ejecución física, siendo esto una parte de las obligaciones contractuales del Consorcio adquiridas bajo contrato de Obra No. 3268 DE 2023 con la Gobernación de Boyacá.

## 2. OBJETIVOS

Visualizar el estado actual del proyecto, establecer alcances y definir hitos que permitan que el proyecto se desarrolle con los tiempos y recursos establecidos.

## 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

| CONTRATO NO. | 3268 DE 2023 |
|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO** | OBRA |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA |
| **NUMERO DEL PROCESO** | LP-GB-001-2023 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ |
| **NIT.** | 891.800.498-1 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SIVA VÍAS |
| **NIT.** | 901.738.696-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MARÍA FERNANDA CUESTA MORA |
| **CEDULA** | 1.065.640.759 |
| **INTERVENTORÍA** | INGEOCIM S.A.S. |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | SIETE (7) MESES |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SIETE MIL DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 ($7.017.631.198,80) |
| **ANTICIPO (30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO)** | DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 64/100 ($2.105.289.359,64) |
| **FECHA DE INICIO** | 09 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 08 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N.01** | 22 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO N.01** | 11 DE ENERO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | 28 DE MAYO DE 2024 |

El proyecto sigue contemplando las metas físicas iniciales contratadas dentro del alcance, hasta el momento no se han suscritos modificaciones contractuales.

El acta de suspensión No.01 se suscribe el día 22 de diciembre de 2022 por motivos de que las canteras que suministran los materiales pétreos cierran operaciones desde el día 22 de diciembre de 2023 hasta el 9 de enero de 2024.

## 4. ASPECTOS JURÍDICOS

Mediante la siguiente tabla se describe la trazabilidad jurídica del presente contrato:

| DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|
| **Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1103** | 09 de febrero de 2023 |
| **Proceso de licitación de obra pública LP-GB-001-2023** | 14 de febrero de 2023 |
| **Resolución de adjudicación No. 975** | 10 de julio de 2023 |
| **Contrato de obra No. 3268 de 2023** | 28 de agosto de 2023 |
| **Registro presupuestal No. 7754** | 21 de septiembre de 2023 |
| **Aprobación de pólizas del contratista, según firma de contrato (SEGUROS DEL ESTADO S.A. - 11-40-101055346)** | 03 de octubre de 2023 |
| **Acta de inicio del contrato No. 3268 de 2023** | 09 de octubre de 2023 |
| **Acta de suspensión No.01 del contrato No. 3268 de 2023** | 22 de diciembre de 2023 |
| **Acta de reinicio No.01 del contrato No. 3268 de 2023** | 11 de enero de 2024 |

# 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

## 5.1. RELACIÓN DEL PERSONAL SUSCRITO AL CONTRATO DURANTE EL MES DE MARZO:

| OCUPACIÓN | NOMBRE |
|---|---|
| **Director de obra** | Eduardo José Cayón Márquez |
| **Residente de obra** | Jaime Andres Mejía |
| **Residente Social** | Juana Valentina López Camargo |
| **Residente Ambiental** | Maira Alejandra Parra Sánchez |
| **Especialista en Geotecnia y Pavimentos** | Obdulio Mejía |
| **Especialista en Estructuras** | Julio Ramos |
| **Ingeniero SISO** | Cesar González Armenta |
| **Profesional SISO** | Edilsa Eliana Medina Munévar |
| **Topógrafo** | Elviyei Peña Ariza |
| **Cadenero 1** | Andres Mauricio Herreño Marín |
| **Cadenero 2** | Edgar Daniel Sáenz Munévar |
| **Secretaria** | Yeimy Nataly Sanabria |
| **Controladora de trafico** | Zaidí Shisley Perayo Moreno |
| **Controladora de trafico** | Diana Cirley Moreno de Dios |
| **Oficios varios** | Elio Pastor Meléndez Yépez |
| **Oficios varios** | Ender Alfredo Araque |
| **Oficios varios** | Duván Felipe Suarez |
| **Oficios varios** | Michael Stiven Rico Hernández |
| **Oficios varios** | Diego Eduardo Chávez González |
| **Maestro de Obra** | Pedro José Leandro |
| **Ayudante de Construcción** | Federico Antonio Pirona Naranjo |
| **Ayudante de Construcción** | Albonio Segundo Torres Gaona |
| **Ayudante de Construcción** | Cristian Felipe Garzón Cubides |
| **Ayudante de Construcción** | Camilo Andres Cuellar Saavedra |
| **Celador** | Castañeda Efidio |
| **Celador** | Martin Juan |
| **Celador** | Gil Miguel |

## 5.2. RELACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE CARGA DURANTE EL MES DE MARZO

| OCUPACIÓN | NOMBRE |
|---|---|
| **Operador de retroexcavadora sobre orugas** | Luis Pardo |
| **Operador de retroexcavadora sobre orugas** | Suarez Espitia Jheysson Andres |
| **Operador de vibro compactador** | Wilder Kolanne Gallardo Báez |
| **Operador de motoniveladora** | Cesar David Hernández |
| **Operador de motoniveladora** | Wilmer Antonio Ortiz De Ávila |
| **Operador de motoniveladora** | John Fredy Acosta Saavedra |
| **Operador de retroexcavadora (pajarita)** | Jheysson Andres Suarez Espitia |
| **Operador de volqueta** | José Antonio Reyes Herrera |

| OCUPACIÓN | NOMBRE |
|---|---|
| **Operador de volqueta** | Mauricio Enrique Guarín Moreno |
| **Operador de volqueta** | Pedro Julio Pardo |
| **Operador de volqueta** | Brayan Andres Salas |
| **Operador de carrotanque** | Víctor Alfonso Merchán Sáenz |

## 5.3. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE EL MES DE ENERO

| TIPO DE MAQUINA O EQUIPO | REFERENCIA, MARCA O PLACA |
|---|---|
| **Retroexcavadora sobre orugas** | VOLVO ECZ210CL |
| **Vibro compactador** | CAT CS54B |
| **Motoniveladora** | CHAMPION serie IV 720 A |
| **Motoniveladora** | CHAMPION serie IV 710 A |
| **Retroexcavadora (pajarita)** | CATERPILLAR 420D |
| **Carrotanque** | FUSO NHR613 |
| **Volqueta sencilla** | CHEVROLET PXH147 |
| **Volqueta sencilla** | CHEVROLET OAI196 |
| **Volqueta sencilla** | INTER SNK177 |
| **Volqueta sencilla** | DODGE INC752 |

## 5.4. RELACIÓN VIGENTE DE PÓLIZAS

| **CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO** | | | **COMPAÑÍA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **PÓLIZA No.:** | **VIGENCIA** | |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** |
| **1** | Cumplimiento del contrato | $1.403.526.239,76 | 11-44-101207938 | 28/08/2023 | 28/07/2024 |
| **2** | Buen Manejo e inversión del Anticipo | $2.105.289.359,64 | | 28/08/2023 | 28/07/2024 |
| **3** | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $1.403.526.239,76 | | 28/08/2023 | 28/03/2027 |
| **4** | Estabilidad y calidad de la obra | $2.105.289.359,64 | | 28/03/2024 | 28/03/2029 |
| **5** | Responsabilidad civil extracontractual | $580.000.000,00 | 11-40-101055346 | 28/08/2023 | 28/03/2024 |

| **CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO** | | | **COMPAÑÍA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **PÓLIZA No.:** | **VIGENCIA** | |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** |
| **1** | Cumplimiento del contrato | $1.403.526.239,76 | 11-44-101207938 | 28/08/2023 | 28/07/2024 |
| **2** | Buen Manejo e inversión del Anticipo | $2.105.289.359,64 | | 28/08/2023 | 28/07/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $1.403.526.239,76 | | 28/08/2023 | 28/03/2027 |
| **4** | Estabilidad y calidad de la obra | $2.105.289.359,64 | | 28/03/2024 | 28/03/2029 |
| **5** | Responsabilidad civil extracontractual | $580.000.000,00 | 11-40-101055346 | 28/08/2023 | 28/03/2024 |

Las pólizas según acta de inicio fueron actualizadas con la cobertura de fechas del acápite de GARANTÍAS del Contrato de obra 3268 de 2023 de acuerdo con el comunicado S-2023-012713-SECCON del 14 de noviembre de 2023.

Las pólizas de acuerdo con el acta de reinicio no.01 del 11 de enero de 2024 fueron enviadas el 01 de febrero de 2024.

Hasta la fecha de este informe, no hemos recibido acta de aprobación por la entidad de las pólizas según acta de reinicio no.01 del 11 de enero de 2024.

## 6. ASPECTOS FINANCIEROS

### 6.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El plan de anticipo modificado 01:

| PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO MODF 01 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | RUBRO | VALOR TOTAL | % | MES 1 | MES 2 |
| 1,1 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 188.800.000,00 | 8,97% | $ 188.800.000,00 | |
| 2,2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 204.120.000,00 | 9,70% | $ 204.120.000,00 | |
| | | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 476.773.647,81 | 22,65% | $ 476.773.647,81 | |
| 2,3 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 134.032.500,00 | 6,37% | $ 33.508.125,00 | $ 100.524.375,00 |
| | | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 207.078.595,00 | 9,84% | $ 207.078.595,00 | $ 0,00 |
| 2,6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | TRANSPORTE | $ 380.995.317,00 | 18,10% | $ 380.995.317,00 | |
| 4,2 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 25.380.132,00 | 1,21% | $ 12.690.066,00 | $ 12.690.066,00 |
| 4,14 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 123.877.135,20 | 5,88% | $ 123.877.135,20 | $ 0,00 |
| SUMINISTROS ADICIONALES | | | | | | |
| 4,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 27.067.898,00 | 1,29% | $ 0,00 | $ 27.067.898,00 |
| 4,8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 31.656.898,13 | 1,50% | $ 0,00 | $ 31.656.898,13 |
| 4,10 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 222.170.963,69 | 10,55% | $ 0,00 | $ 222.170.963,69 |
| 4,11 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 83.336.267,98 | 3,96% | $ 0,00 | $ 83.336.267,98 |
| | | VALOR TOTAL | $ 2.105.289.354,81 | 100,00% | $ 1.627.842.886,01 | $ 477.446.468,80 |
| | | VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | $ 1.171.961.405,81 | | $ 807.729.378,01 | $ 364.232.027,80 |
| | | VALOR TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA | $ 552.332.632,00 | | $ 439.118.191,00 | $ 113.214.441,00 |
| | | VALOR TOTAL TRANSPORTE | $ 380.995.317,00 | | $ 380.995.317,00 | $ 0,00 |

Vo.Bo.

**MARÍA FERNANDA CUESTA MORA**
Representante Legal
CONSORCIO SIVA VÍAS
Contratista

**CAMILO A. NAGED R.**
Representante Legal
INGEOCIM S.A.S.
Interventor

Resumen financiero del anticipo hasta el 08 de abril de 2024

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Anticipo del 30% del valor total del contrato** | $ 2.105.289.359,64 |
| **Primer desembolso** | $ 1.602.127.959,00 |
| **Segundo desembolso** | $ 25.702.135,30 |
| **Tercer desembolso** | $ 476.355.892,00 |
| **Valor total desembolsado** | $ 2.104.185.986,30 |
| **Valor restante por desembolsar** | $ 1.090.577,00 |

El día 07 de marzo se envió la documentación requerida, para realizar el desembolso del monto certificado por la fiduciaria Alianza, para poder hacer el acto de cierre y que se consignen los rendimientos financieros a la Gobernación de Boyacá.

Se anexan a este informe en la sección de documentos financieros los informes-extractos que envía la fiducia hasta el mes de febrero. El mes de marzo hasta la fecha de este informe no ha sido emitido los extractos por la fiducia.

### 6.2. RESUMEN DE FACTURACIÓN

Hasta la fecha no se ha facturado pero se encuentra en tramite el acta parcial de cobro No.01 con valor total de $607,434,561.77 (este valor es sin amortizar)


## 7. AVANCE DE OBRA

### 7.1. INICIACIÓN

El Consorcio Siva Vías, realizo actas de vecindades antes de la iniciación de la obra, en la cual se hizo una inspección visual del tramo de la vía a intervenir y socializando con la comunidad que se verá afectada durante el transcurso de la ejecución de la obra.

### 7.2. VALLA INFORMATIVA

El Consorcio Siva Vías fabricó, suministró e instaló una valla provisional bajo el decreto 804 de 2016 de medidas de seis (6) metros de ancho por tres (3) metros de alto, respetando el diseño suministrado por la Gobernación de Boyacá y el sitio previamente determinado por interventoría.

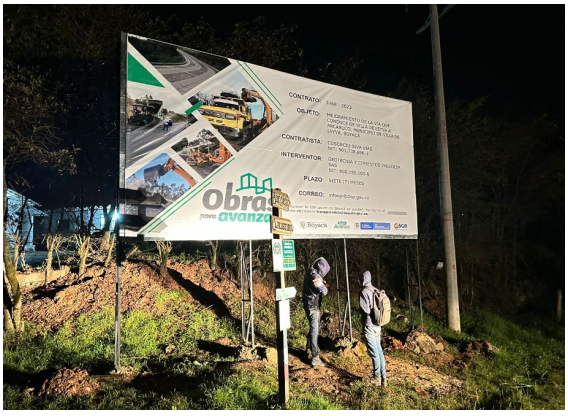


- **Tipo de Material.**

Para el cuerpo de la valla se utilizaron láminas galvanizadas calibre 22 con bordes doblados y soldados o remachados en sus aristas de tal forma que se garantice la estabilidad y durabilidad de la valla en el transcurso de la obra.

- **Sistema de Apoyo.**

El apoyo de la valla es mediante anclaje en concreto en el suelo y perfil metálico a una altura de 1.8 mts del nivel inferior de la valla con respecto al suelo.

- **Acabado.**

Toda la superficie metálica se cubrió se imprimo con pintura anticorrosiva para evitar oxidación y daños a la valla durante el transcurso de la obra

- **Normatividad.**

La fabricación e instalación de la valla se cumplió bajo el decreto 804 de 2016 del departamento de la Gobernación de Boyacá.

### 7.3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Previo al inicio de actividades se implementaron las señalizaciones viales provisionales incluidas en el plan de manejo de tránsito, para intervenir un frente de trabajo de 200 mt aproximadamente.



*Foto 1. Señalizaciones provisionales.*



*Foto 2. Paletero realizando labor de pare y siga a los vehículos que transitan por la vía.*



*Foto 3. Separadores de vía con colombianas y cintas de peligro.*

## 7.4. EJECUCIÓN DE OBRAS

A continuación, se presenta el cuadro de avance de lo ejecutado vs lo programado con las condiciones contractuales hasta el 08 de abril de 2024.

| CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANTIDAD PROGRAMADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** |
| **I** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN** | | | | | |
| 1.1 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | M3 | 13,759.15 | 6,943.91 | 100.00% | 50.47% |
| 1.2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 2,534.61 | 314.24 | 100.00% | 12.40% |
| 1.3 | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | M3 | 13,349.76 | 8,900.47 | 100.00% | 66.67% |
| | | | | | | |
| | | | | | **100.00%** | **44.49%** |
| **II** | **ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | |
| 2.1 | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 4.19 | 2.55 | 100.00% | 60.86% |
| 2.2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 5,837.86 | 1,339.92 | 100.00% | 22.95% |
| 2.3 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 3,008.18 | 658.80 | 68.70% | 15.05% |
| 2.4 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | - | 658.80 | 0.00% | 26.50% |
| 2.5 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | M2 | 10,335.40 | 658.80 | 37.41% | 2.38% |
| 2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 137,113.60 | 658.80 | 79.86% | 0.38% |

| CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANTIDAD PROGRAMADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** |
| 2.7 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO) | M3-KM | - | 658.80 | 0.00% | 0.83% |
| | | | | | | |
| | | | | | **32.44%** | **20.72%** |
| **III** | **SEÑALIZACIÓN** | | | | | |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM | UND | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM | UND | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS | ML | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 MTS. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS | ML | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 CM. SEGUN NORMA INVIAS | UND | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES | UND | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 3.7 | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | |
| | | | | | **0.00%** | **0.00%** |
| **IV** | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | |
| 4.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 73.35 | - | 100.00% | 0.00% |
| 4.2 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 2,518.47 | 1,787.96 | 100.00% | 70.99% |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 28.94 | 11.37 | 59.52% | 23.39% |
| 4.4 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 7.98 | 3.33 | 73.21% | 30.58% |
| 4.5 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 34.80 | 2.56 | 70.06% | 5.15% |
| 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 86.00 | 30.00 | 100.00% | 34.88% |
| 4.7 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 173.32 | - | 88.13% | 0.00% |
| 4.8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 2,808.06 | - | 70.33% | 0.00% |
| 4.9 | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | - | 10.19 | 0.00% | 19.22% |
| 4.1 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 4.11 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | KG | - | - | 0.00% | 0.00% |

| CONDICIONES DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTRATADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANTIDAD PROGRAMADA** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **% PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** |
| 4.12 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | M3 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 4.13 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 4.14 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | M3 | 1,183.67 | 999.00 | 58.34% | 49.24% |
| 4.15 | DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA | ML | 115.71 | - | 50.31% | 0.00% |
| 4.16 | ENROCADO O RIP-RAP | M3 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | |
| | | | | | **27.31%** | **17.28%** |
| **V** | **INTERVENCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | |
| 5.1 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | - | | 0.00% | 0.00% |
| 5.2 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | - | | 0.00% | 0.00% |
| 5.3 | IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR | M2 | - | | 0.00% | 0.00% |
| 5.4 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA | M3 | - | | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | |
| | | | | | **0.00%** | **0.00%** |

Durante el periodo relacionado en este informe, se continúan con las actividades como el suministro, extendida, nivelación y compactación de la capa de subbase granular y base granular, en la continuación de la construcción del filtro debajo de cuneta que se realiza mediante las actividades de excavación, instalación de geotextil NT2000 y relleno con material filtrante, en la instalación de las tuberías de concreto reforzado de 36” que se realiza mediante las actividades; de excavación, en la adecuación y nivelación del terreno de fondo, en el solado de limpieza para apoyo de las tuberías, en la instalación de tuberías de concreto reforzado de 36”, en el concreto de atraque, y el relleno con material proveniente de las excavaciones. Además, se inician las actividades para la construcción de los descoles de las alcantarillas que constan del figurado y armado del acero de refuerzo, de la fundida en concreto de 3000 psi impermeabilizado para placa de fondo con viga tacón y muros aletas y de empalme con la tubería.

A comienzos de marzo, la empresa de acueducto ARCASA inicio la reubicación de las tuberías que parten desde la abscisa K2+400, hasta la fecha de este informe siguen con la reubicación y no hay fecha exacta de terminación de sus actividades, siendo esto el mayor problema de la obra puesto que ha impedido que iniciemos con ese tramo con un nuevo frente de trabajo propuesto desde inicios de febrero.

Además de los atrasados por las tuberías del acueducto encontramos ciertos problemas que se han manifestado en el transcurso de las actividades como los problemas de los postes eléctricos que se encuentran en el eje de los filtros, esto ha ocasionado que durante la excavación se desestabilicen y

se desplomen ocasionando pare de actividades y cierre de la vía. Para evitar que ocurran nuevamente se decidió para las actividades cercanas a los postes y remitimos oficios solicitando la reubicación a la empresa eléctrica EBSA S.A ESP, hasta la fecha de este informe no hemos recibido respuesta por parte de ellos.

Las cantidades ejecutadas hasta la fecha se han realizado de acuerdo en base al cronograma según reinicio no.01, el avance se ha visto en la excavación, relleno, extendida de subbase, extendida de base, construcción de filtros y construcción de alcantarillas.

Como bien sabemos hemos tenido un atraso considerable que se ha manifestado por parte de la interventoría en su oficio de control y seguimiento, y como contratista a su solicitud hemos programado un plan de contingencia de incluir un frente de trabajo adicional con subcontrato de maquinaria y profesionales que han estado a la espera de iniciar actividades por los la reubicación de la tubería antes mencionada. Este frente de trabajo tiene programado iniciar actividades a partir del lunes 15 de abril de 2024. Una vez este activo esperamos aumentar el rendimiento y así recuperarnos del atraso.

También se ha venido trabajando en el acta modificatoria del proyecto para la inclusión de ítems no previsto de la mezcla asfáltica aprobada en el comité de técnico de obra el día 26 de febrero de 2024 y realizar el balance de cantidades. a la fecha el contratista espera la aprobación final por parte de la Entidad contrate

## 8. GESTIÓN DEL PROYECTO

Durante el seguimiento y control del proyecto se realizaron actividades previas al inicio de la obra que fueron necesarias para poder cumplir correctamente con la ejecución. Se realizó la gestión social y se conformaron actas de veedurías para la información de los habitantes que se ven afectados directamente, además se implementaron planes de gestión que llevan al correcto orden de ejecución de las actividades.

En los programas de gestión social se han realizado socializaciones a la comunidad en los salones comunales y en el punto de oficina ‘Mercado Gomar’, de la misma manera se han realizado comunicaciones entre administraciones locales privadas y públicas.

Se han establecido la información y divulgación en búsqueda de personal de trabajo la cual se reciben las hojas de vida y dentro del programa de recursos humanos estas se estudian y se validan.

Se realizaron reuniones con las comunidades evidenciando reporte de obra y socializando los trabajos realizados hasta la fecha, se le explicaron los trabajos próximos a realizar.

En la fecha del 18 de enero se presentaron hechos de vandalismo a gran parte nuestra señalización se adjuntan evidencias fotográficas de lo sucedido. A este proceso se le dio seguimiento y se compartió a los presidentes de J.A.C en apoyo para darlo a conocer a las comunidades y evitarán futuros hechos nuevos de vandalismo.

Se han venido realizando los seguimientos a las actas de vecindad en donde se deja establecido afectaciones que han podido tener los propietarios de los predios que se vean directamente afectados

por la ejecución de la vía al momento de la operación de la maquinaria, dejando en evidencia el estado mediante registro fotográfico actualizado.

El plan de gestión ambiental se llevó a cabo mediante los programas que en dicho plan permanecen, el desarrollo de las actividades incurre en la gestión ambiental por lo que previo al inicio de la obra se dieron charlas y capacitaciones al personal de trabajo, técnico y operativo para la prevención de riesgos ambientales. Estas capacitaciones se realizan durante el transcurso de la obra semanalmente.

A la fecha de este informe, se están adelantando y presentando los permisos ambientales tanto de aprovechamiento forestal como de intervención de causes, playas y lechos ante la autoridad competente Corpoboyacá y se adelantan gestiones para que la visita técnica sea lo más pronto posible.

Se han venido realizando el control del manejo y disposición de los escombros en sitio autorizados, control de materiales pétreos; material para filtro, piedra-rajón, subbase y base, estos materiales han sido comprados en cantera autorizada y que cuentan con licencia ambiental y minera.

Dentro de la gestión de tráfico, se comunicó a la administración municipal de Villa de Leyva, que se estarán realizando operaciones continuas de 1 hora en el momento del cierre, y que se traten de coger rutas alternas mientras la vía se encuentre en intervención.

El manejo y disposición final de materiales se ha venido ejecutando y llevando a cabo la documentación requerida previamente aprobada por interventoría con autorización final del sitio.

Durante la ejecución de la obra se realizan actividades con equipos los cuales se requieren que estén certificados y calibrados tales como los equipos de topografía.

La gestión SST ha venido desarrollándose de acuerdo con el plan inicial, se llevan el control de personal afiliado al consorcio y a las empresas contratadas, dentro de las actividades realizadas en el tramo de obra se puede evidenciar; charlas de 5 minutos, análisis de trabajo seguro y preoperacionales a la maquinaria diario; al igual se inspecciona la señalización dando cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de la gestión SST se realizan el control, instalación y mantenimiento de la señalización de acuerdo con el plan de manejo de tráfico, se realiza la entrega y reposición de EPP, se ejecutan actividades lúdicas, se realizan las capacitaciones de acuerdo con el programa establecido con el fin de ayudar al trabajador a evitar accidentes en su empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva en todos los integrantes del consorcio SIVA VÍAS.

Hasta la fecha no se han presentado accidentes laborales.

Las actividades que han requerido control de calidad han sido las excavaciones mediante el replanteo topográfico para así establecer la correcta implantación de la sección vial. El material filtrante, el material de subbase, y el material de base, los cuales se anexan a este documento.

De igual manera se encuentran verificados las máquinas pesadas y volquetas que se encuentran operando, su documentación estará anexa a este documento.

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

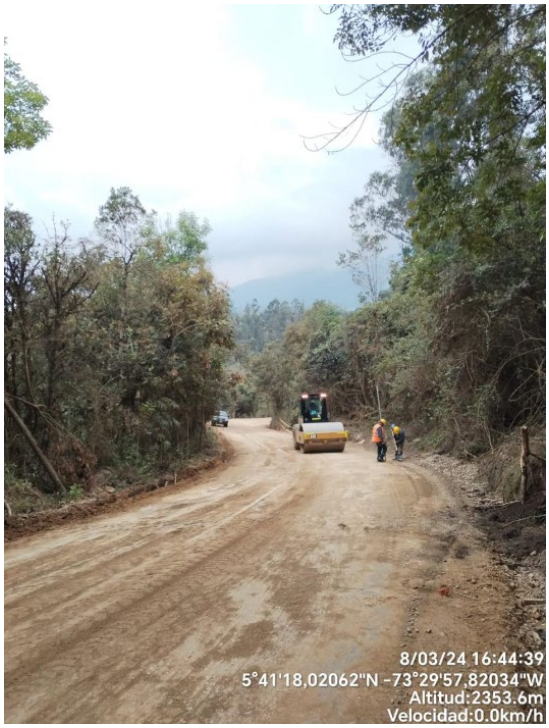



*Foto 4. Compactación de la subrasante*




*Foto 5. Compactación de la subbase granula.*

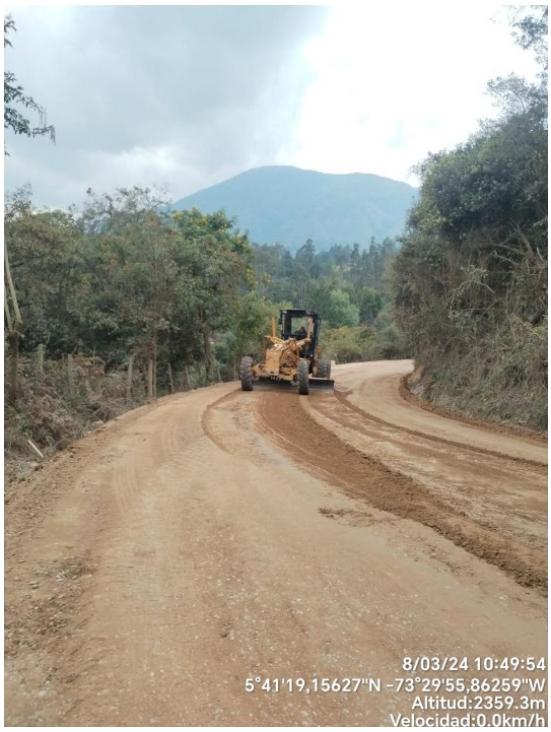



*Foto 6. Nivelación de la subbase granular.*




*Foto 7. Tubería de concreto reforzado clase I instalada*




*Foto 8. Relleno con material seleccionado de la excavación para el tape de la tubería de concreto reforzado clase I*




*Foto 9. Fundida de muros en descole de alcantarilla en concreto de 3000 psi impermeabilizado.*




*Foto 10. Instalación de tubería de concreto reforzado clase I con ayuda de una pajarita*




*Foto 11. Instalación de formaleta para solado de atraque para tubería de concreto reforzado clase I*




*Foto 12. Relleno compactado con material seleccionado proveniente de la excavación.*




*Foto 13. Sección de tubería de concreto de reforzado clase I totalmente rellenada y compactada*




*Foto 14. Descole de alcantarilla fundido en concreto de 3000 psi impermeabilizado.*




*Foto 15. Excavaciones de caja y transporte de material sobrante*




*Foto 16. Nivelación de la subrasante*




*Foto 17. Excavación para filtro y transporte de material sobrante.*




*Foto 18. Excavación de sección para instalación de alcantarilla*




*Foto 19. Instalación de tubería de alcantarilla con ayuda de una pajarita*




*Foto 20. Compatación de subrasante*




*Foto 21. Excavación de filtro y transporte de material sobrante.*




*Foto 22. Excavación de caja*




*Foto 23. Compactación de subrasante*




*Foto 24. Prueba de concreto Slump y toma de muestras de cilindros para concreto de 3000 psi impermeabilizado para estructura de descole de alcantarilla*




*Foto 25. Fundida de placa y tacón de descole y armado y figurado de acero para muros*




*Foto 26. Nivelación de subbase granular.*




*Foto 27. Nivelación de subbase granular.*

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se ejecuta de acuerdo con los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas de las actividades teniendo en cuenta el control SST, social y ambiental de la obra para cumplir con los estándares de calidad.

Los trabajos ejecutados hasta la fecha han sido afectados por las diferentes problemáticas encontradas en la vía por terceros, hasta la fecha se encuentran resueltas algunas y otras en espera tales como las obras de drenaje, en donde se encuentra en revisión por parte de la dirección técnica de la Entidad contratante.

Para aumentar el rendimiento y equilibrar el atraso que llevamos, el frente de trabajo empezar a operar a partir del lunes 15 de abril de 2024.

El consorcio se compromete a implementar todas las herramientas necesarias para cumplir con las condiciones actuales del contrato y poder terminar la ejecución de la obra en el tiempo programado.

MariaFernandaCuesta

**MARÍA FERNANDA CUESTA MORA**
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VÍAS**

## 11. ANEXOS

**I.** Documentos legales
**II.** Documentos administrativos
**III.** Documentos financieros
**IV.** Certificación de equipos
**V.** Ensayos de laboratorio

# I. DOCUMENTOS LEGALES

# CONTRATO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 3268 DE 2023**

**TABLA DE CONTENIDO**


**CLÁUSULA 1. DEFINICIONES**
**CLÁUSULA 2. OBJETO**
**CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO**
**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO**
**CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO**
**CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**
**CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**
**CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**
**CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**
**CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**
**CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA**
**CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**
**CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD**
**CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD**
**CLÁUSULA 15. MULTAS**
**CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL**
**CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**
**CLÁUSULA 18. GARANTÍAS**
**CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**
**CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA**
**CLÁUSULA 21. CESIÓN**
**CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN**
**CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN**
**CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**
**CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS**


Entre **LA GOBERNACION DE BOYACA** (en adelante la "Entidad") por medio de su representante **WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.570 expedida en Paz de Rio, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto 0553 de 25 de Abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, por una parte; y por la otra **CONSORCIO SIVA VIAS,** con NIT: 901.738.696-2, representado legalmente por **MARIA FERNANDA CUESTA MORA**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.065.640.759 (en adelante el "Contratista"), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: II. Que mediante Resolución No. 302 de 01 de Marzo de 2023, la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-GB-001-2023. II. El objeto del proceso se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos bajo el Nº. 2022004150232. III. Que mediante Resolución No. 975 de 10 de Julio de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas: **CLAUSULA 1. DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. **CLAUSULA 2. OBJETO.** El objeto del Contrato es **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ. CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.** El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-GB-001-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de SIETE (7) MESES, contados a partir del ACTA DE INICIO,

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** El valor del Contrato es por la suma de **SIETE MIL DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 ($7.017.631.198.80),** equivalentes a 6.049.68 SMLMV para el año de suscripción del contrato [2023] suma que se discrimina de la siguiente manera.

FORMULARIO 1

**PROPUESTA ECONÓMICA**

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **I. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN** | | | | | | | | |
| 1,1 | 3.02.02 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | M3 | 13.759,15 | $ 17.370,00 | $ 238.996.435,50 |
| 1,2 | 2.01.09 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 2.534,61 | $ 32.870,00 | $ 83.312.630,70 |
| 1,3 | 3.02.01 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA | M3 | 13.349,76 | $ 4.210,00 | $ 56.202.489,60 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 378.611.555,80** |
| **II. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | |
| 2,1 | 3.04.03 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | KM | 4,19 | $ 1.436.440,00 | $ 6.018.683,60 |
| 2,2 | 3.04.07 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 5.837,86 | $ 122.150,00 | $ 713.094.599,00 |
| 2,3 | 3.04.06 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 4.378,40 | $ 135.640,00 | $ 593.886.176,00 |
| 2,4 | 3.06.09 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 2.486,48 | $ 1.004.760,00 | $ 2.498.315.644,80 |
| 2,5 | 3.06.09 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | M2 | 27.627,60 | $ 4.330,00 | $ 119.627.508,00 |
| 2,6 | 3.12.09 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-KM | 171.693,97 | $ 2.010,00 | $ 345.104.879,70 |
| 2,7 | 3.12.06 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO) | M3-KM | 79.587,36 | $ 2.330,00 | $ 185.391.948,80 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 4.481.438.439,90** |
| **III. SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | |
| 3,1 | 3.09.10 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM | UND | 5,00 | $ 491.520,00 | $ 2.457.600,00 |
| 3,2 | 3.09.10 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM | UND | 15,00 | $ 491.520,00 | $ 7.372.800,00 |
| 3,3 | 3.09.17 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS | ML | 12.489,00 | $ 2.960,00 | $ 36.967.440,00 |
| 3,4 | 3.09.07 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTAFAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS | ML | 100,00 | $ 240.480,00 | $ 24.048.000,00 |
| 3,5 | 3.09.08 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGUN NORMA INVIAS | UND | 182,00 | $ 298.480,00 | $ 54.323.360,00 |
| 3,6 | 3.09.13 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES | UND | 1.047,00 | $ 10.250,00 | $ 10.731.750,00 |
| 3,7 | 3.09.04 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 323,00 | $ 65.940,00 | $ 21.298.620,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 157.188.670,00** |
| **IV. OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 4,1 | 1.01.10 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) | M3 | 73,35 | $ 209.870,00 | $ 15.393.964,50 |
| 4,2 | 3.02.07 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 2.518,47 | $ 16.320,00 | $ 41.101.430,40 |
| 4,3 | 3.03.22 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 48,62 | $ 562.470,00 | $ 27.347.291,40 |
| 4,4 | 2.07.02 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 10,90 | $ 1.010.090,00 | $ 11.009.981,00 |
| 4,5 | 2.07.01 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 49,67 | $ 1.057.690,00 | $ 52.535.462,30 |
| 4,6 | 3.03.28 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE REFORZADO D=96" INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 86,00 | $ 583.590,00 | $ 50.188.740,00 |
| 4,7 | 2.01.09 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 196,98 | $ 32.870,00 | $ 6.464.214,20 |
| 4,8 | 3.10.12 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 3.992,52 | $ 8.420,00 | $ 33.617.018,40 |
| 4,9 | 3.13.15 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 53,00 | $ 448.030,00 | $ 23.745.590,00 |
| 4,10 | 3.03.05 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | 1.088,56 | $ 734.570,00 | $ 799.629.519,20 |
| 4,11 | 3.13.24 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | KG | 14.139,17 | $ 9.070,00 | $ 128.242.271,90 |
| 4,12 | 3.04.05 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | M3 | 860,77 | $ 90.860,00 | $ 78.209.562,20 |
| 4,13 | 2.07.01 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 45,37 | $ 1.057.690,00 | $ 47.987.395,30 |
| 4,14 | 3.03.02 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | M3 | 2.028,78 | $ 256.940,00 | $ 521.274.733,20 |
| 4,15 | 3.03.08 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA | ML | 230,00 | $ 43.880,00 | $ 10.092.400,00 |
| 4,16 | N.A | NUEVO | | ENROCADO O RIP-RAP | M3 | 47,43 | $ 154.200,00 | $ 7.313.706,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.864.147.280,00** |
| **V. INTERVENCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA** | | | | | | | | |
| 5,1 | 2.07.02 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 22,06 | $ 1.010.090,00 | $ 22.282.585,40 |
| 5,2 | 3.10.12 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | 1.530,13 | $ 8.420,00 | $ 12.883.694,60 |
| 5,3 | 3.13.23 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR | M2 | 4,00 | $ 72.450,00 | $ 289.800,00 |
| 5,4 | 3.02.08 | PRECIOS GOBERNACIÓN | | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA | M3 | 48,59 | $ 170.480,00 | $ 8.283.623,20 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 43.739.703,20** |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 6.896.037.648,90** |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)** | **$ 6.896.037.648,90** |
| PMT | $ 48.994.812,56 |
| PMA | $ 62.339.827,34 |
| CARACTERIZACIÓN VIA VILLA DE LEYVA (11,48 KM) | $ 11.259.010,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 7.017.631.198,80** |

| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | DESCRIPCIÓN | | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | ADMINISTRACIÓN | A= | 22% |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | IMPREVISTO | I= | 3% |
| | UTILIDAD | U= | 5% |
| | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 30% |

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. **CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del contrato. La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: **NOTA DE ANTICIPO:** NOTA DE ANTICIPO: El Departamento de Boyacá concederá al CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% del valor de las obras a contratar, el cual, será amortizado en cada Acta PARCIAL sin superar el 70% de la totalidad del contrato. El anticipo será entregado al CONTRATISTA previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización; y este, será girado por El Departamento a la entidad fiduciaria, sujeto a la programación y disponibilidad del PAC. El CONTRATISTA, para recibir el anticipo, deberá, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, deberá presentar y radicar la cuenta de cobro correctamente elaborada junto con el documento, donde conste la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo. El giro del anticipo no constituye condición previa para la iniciación del contrato. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo que del mismo se establecen para el presente proceso de contratación. **MANEJO DEL ANTICIPO.** El CONTRATISTA deberá constituir una FIDUCIA o PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1. El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los insumos (materiales), equipo de trabajo profesional, mano de obra, transporte y demás actividades contempladas en el presupuesto de ejecución de obra. 2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR. 3. La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros directamente a los proveedores de los insumos (materiales), a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación ante la fiduciaria, por parte del CONTRATISTA, de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar debidamente aprobada por el INTERVENTOR. Copia de los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el siguiente informe que se genere, posterior a su aprobación. 4. Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos del anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito por parte del ordenador del gasto delegado por el departamento. 5. El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será hasta máximo el 50% del plazo inicial del contrato, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá utilizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo. 6. A la terminación del encargo fiduciario o del patrimonio autónomo la fiduciaria deberá devolver a la entidad que realice el desembolso los rendimientos que se hubieren generado de los recursos que integren el encargo, los cuales serán consignados en la cuenta que se le informe. 7. En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, excepto que en el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario. 8. El costo de la comisión de la fiducia o patrimonio autónomo será cubierto directamente por el contratista y no podrá ser descontado de los recursos entregados a título de anticipo. 9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por la Gobernación. 10. Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, FIDUCIARIO la sociedad fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la Superintendencia Financiera y el beneficiario el departamento de Boyacá y los proveedores del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato. 11. En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se tendrá en cuenta lo establecido en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Comercio, como también las demás normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o complemente. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre del consorcio o de la unión temporal. Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.”. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. **CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de disponibilidad Presupuestal: 1103 de 2023 y Certificado de disponibilidad Presupuestal: 35023 de 2023 (SPGR). **CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.** El Departamento,

cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 1. El treinta (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo, la aprobación de la garantía única pactada y la constitución de un patrimonio autónomo irrevocable, de acuerdo a lo establecido al final del presente capitulo. 2. El noventa por ciento (90%) se cancelará de acuerdo con las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el interventor y por el supervisor delegado, que correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la documentación requerida, se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a su radicación en la entidad. Las actas, las deberá presentar EL CONTRATISTA, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución. 3. El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación y entrega del contrato. Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. El valor del contrato incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar; una vez se presenten los servicios a entera satisfacción, previa entrega del informe de actividad desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, acta expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integrado en salud, pensiones y riesgos profesionales según la normatividad vigente; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio de 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el valor del contrato se entiende incluido el IVA, los gravámenes y demás costos directos o indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Así mismo se entienden incluidos los costos y gastos de transporte y entrega. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007 DEL DERECHO DE TURNO. **PARÁGRAFO TERCERO:** Si el Contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. **CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 1.** Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a ejecutar. **2.** Entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. **3.** Diligenciar junto con el Interventor y/o supervisor de obra la Bitácora de obra. **4.** Entregar informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega. **5.** Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto. **6.** Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas. **7.** Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya alaborar en la ejecución del contrato. **8.** En la ejecución de las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA seceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministrados por EL DEPARTAMENTO con Los pliegos de condiciones y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. EL DEPARTAMENTO podrá hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, por conveniencia, por factores relacionados con el diseño o por eventosexcepcionales. Estas condiciones serán presentadas mediante acta de modificación suscrita entre el Interventor de la obra y EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA deseahacer cambios a los planos y especificaciones originales, deberá contar con la aprobaciónprevia y escrita por parte DEL DEPARTAMENTO. **9.** El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y subcontratistas. **10.** El contratista deberá presentar una actualización al inventario vial del tramo de la vía intervenida, la información debe presentarse en layer o capas independientes dando cumplimiento a la resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio de Transporte ola que la modifique o se encuentre vigente a la fecha de realizar la entrega a la Gobernación de Boyacá y a los lineamientos para la formulación de cartografía en la infraestructura de datos espaciales de Boyacá. **11.** Es obligación del contratista presentar planos record de las obras ejecutadas con localización georeferenciada de acuerdo a los lineamientos para la formulación de cartografía en la infraestructura de datos espaciales de Boyacá. **12.** Es obligación del contratista para el recibo de las obras presentar diligenciada el ACTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO del sistema de gestión documental de la Gobernación de Boyacá, la cual debe estar aprobada por la interventoría con la revisión del profesional delegado por la Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial. **13.** Dentro del concepto de materiales, calidad de las obras y equipo, el contratista debe obligarse a: a. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios parala obra, deberá informarse de la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras según el desarrollo de ejecución de la misma, con previsión de posible escasez. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA, debido a la falla o escasez de materiales que sean previsibles. B. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes de abastecimiento, deberá suministrar libre de costo para EL DEPARTAMENTO todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el Interventor o por EL DEPARTAMENTO Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobación, podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago extra. Las aprobaciones de EL DEPARTAMENTO a los materiales y elementos estipulados en esta cláusula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenúa; EL DEPARTAMENTO podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficienciasen los equipos, deberá ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta de EL CONTRATISTA, siasí lo ordena EL DEPARTAMENTO y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará a EL CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias encontrados, además EL CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija EL DEPARTAMENTO,en las mismas

condiciones pactadas anteriormente. C. Si EL CONTRATISTA no cumple las órdenes de EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo establecido, éste podrá retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con los costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra serán entregadosa EL CONTRATISTA, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. D. En ninguno de los casos contemplados en esta cláusula habrá lugar a plazos adicionales, ni a reajuste de pagos. E. EL CONTRATISTA llevará a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situará oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo mínimo para el desarrollo de los mismos. EL DEPARTAMENTO podrá exigir y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas. F. De ser necesario el contratista efectuara los ajustes requeridos a los diseños, razón por la cualcontará con director y residente de obra como personal idóneo y capacitado para efectuar estas acciones, para aprobación interventoría. G. EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente proceso, deberá mantener en obra la permanencia de los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras, que deberá contar con la maquinaria y equipo necesarios y descritos en el presente estudio. H. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la ejecución de la obra, con los frentes de trabajo mínimos y adicionales ofertados; su no permanencia en obra será causal de sanción por incumplimiento por parte de la entidad contratante. i. EL CONTRATISTA se obliga a disponer de los frentes de trabajo necesarios para cumplir el objeto y la totalidad de las actividades del contrato, dentro del plazo establecido. J. El contratista se obliga a instalar valla informativa referente al presente contrato, en el cual también se debe incluir de forma visible, clara y legible, la siguiente información**: "¡Denunciar la Corrupción en Boyacá es posible!, escríbenos al correo electrónico transparencia@boyaca.gov.co." CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA.** El Contratista tiene derecho a: 1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. **CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.** La Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. **CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD.** El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. **CLAUSULA 14. INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto contratado. **CLAUSULA 15. MULTAS.** Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial de las obligaciones del CONTRATISTA causará multas diarias y sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1 x 1000) del valor del presente Contrato por cada día hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, caso en el cual el DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO I. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. PARÁGRAFO II. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el DEPARTAMENTO podrá acudir a la jurisdicción coactiva. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLAUSULA 16. CLÁUSULA PENAL.** En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente hasta por el veinte (20%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere. La cual se hará efectiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demás normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la

Entidad para dar trámite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al procedimiento correspondiente. **CLAUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. **CLAUSULA 18. GARANTÍAS. CLAUSULA 18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Departamento de Boyacá identificado con NIT 891.800.498-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>20% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>100% del valor del anticipo</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>20% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra</td><td>30% del valor del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>
<ul>
<li>Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.</li>
<li>No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</li>
<li>Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td>
<ul>
<li>Número y año del contrato</li>
<li>Objeto del contrato</li>
<li>Firma del representante legal del contratista</li>
<li>En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</li>
</ul>
</td></tr>
</table>

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. **18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA.** El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. **18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.** El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características:

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | Departamento de Boyacá identificado con NIT 891.800.498-1 y el Contratista |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación. |
| Valor | 500 SMMLV |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del Contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y Departamento de Boyacá identificado con NIT 891.800.498-1 |
| Amparos | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del Contrato<br>• Objeto del Contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. **CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA.** El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). **CLAUSULA 21. CESIÓN.** El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. **CLAUSULA 22. LIQUIDACIÓN.** Una vez terminado el objeto del presente acto y previo recibido a satisfacción del DEPARTAMENTO, se procederá a efectuar la liquidación final del contrato, la que se hará entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, teniendo como requisito previo la presentación de las pólizas requeridas si a ello hubiere lugar; esta liquidación se hará constar en un acta especial que requerirá para su validez la aprobación por parte del DEPARTAMENTO. Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato. Si el contratista se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la entidad procederá a su

liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. **CLAUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el K2+950 Al K7+136 Del Municipio De Villa De Leyva Al Municipio De Arcabuco Departamento De Boyacá. el domicilio contractual es ciudad de Tunja en la calle 20 No 9 – 90 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, piso Sótano oficina. **CLAUSULA 25. DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las Garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

28/08/2023.

Por la Entidad,

**WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS**
Secretario de Contratación

Por el Contratista,

**CONSORCIO SIVA VIAS**
R/L MARIA FERNANDA CUESTA MORA
Contratista

**Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Elaboró: Lady C.
Profesional Externo

# ACTA DE INICIO

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-025** |
| **ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: 9/10/2023 | | | |
| CONTRATO No: | 3268 de 2023 | | |
| REGISTRO BPyP No.: | 2022004150232 | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | NIT. C.C. | 891.800.498-1 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SIVA VIAS | NIT. C.C. | 901.738.696-2 |
| INTERVENTOR: | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S | | |

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

| | |
|---|---|
| VALOR: | SIETE MIL DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 ($7.017.631.198.80) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 7 meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 8 de mayo de 2024 |

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

| REQUISITOS | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|
| Garantías y su aprobación | X | | |
| Publicación, si es el caso | X | | |
| Expedición de RP | X | | |
| Otros | X | | |

Cuáles: Certificación de cumplimiento de pago de aportes al SGSSS y parafiscales.

**Nota:** Se suscribe acta de iniciación de conformidad con la solicitud y directrices dadas por el Secretario de Contratación/Delegado para la Contratación del Departamento, registradas en acta de comité de fecha 04/10/2023, la cual se adjunta y hace parte integral de la presente.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: CAMILO ADOLFO NAGED. R
R.L. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
INTERVENTOR

Firma: MariaFernandaCuesta
Nombre: MARIA FERNANDA CUESTA
R.L. CONSORCIO SIVA VIAS
CONTRATISTA

# ACTA DE SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 3** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-037** |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | | **FECHA: 19/Abr/2023** |

| | |
|---|---|
| ACTA No: 1 | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 22 de diciembre de 2023 |
| CONTRATO No: | 3268 de 2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SIVA VIAS (NIT. 901.738.696-2) |
| INTERVENTOR: | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S (NIT. 800155100 – 6) |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ |
| VALOR: | $ 7.017.631.198,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 7 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 9 DE OCTUBRE DE 2023 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** De acuerdo con la jurisprudencia, la suspensión del contrato es una medida excepcional, que solamente procede en caso de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público.

**SEGUNDO:** Según lo solicitado por el contratista, al realizar el análisis de las condiciones de interés público derivadas de la de la Licitación Pública, los fines de la contratación, los mecanismos contractuales a cargo de la Entidad y los principios de la Contratación Estatal; es evidente que estos se ven afectados por la existencia de condiciones exógenas a las partes contractuales, que impiden la realización de las actividades programadas en lo que refiere al oficio CSV-2023-027 dado el impacto técnico que tiene el cierre de las trituradoras en la meta física que depende de dicho componente y que corresponde a un monto alrededor del 70% de la misma.

**TERCERO:** Que mediante el comunicado CSV-2023-027 de fecha 14 de diciembre de 2023, el CONSORCIO SIVA VIAS solicita suspender el contrato de obra publica No.3268 teniendo en cuenta que las canteras que suministran los materiales petreos cierran operaciones desde el dia 22 de diciembre de 2023 hasta el 9 de enero de 2024.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 3268 a partir del 22 de diciembre de 2023.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**CUARTO.** Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

**QUINTA.** Durante el tiempo de la suspensión de plazo **e**l contratista se compromete a mantener la señalización preventiva que garantice la seguridad en el sitio de la obra (cuando aplique).

**SEXTA.** Se aclara que durante el tiempo de suspensión el contratista es responsable por la calidad y protección de las obras ejecutadas .

**SEPTIMA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA/ CONSORCIO SIVA VIAS | INTERVENTOR /INGEOCIM S.A.S |
| RL/ Maria Fernanda Cuesta | RL/ Camilo Adolfo Naged |

# ACTA DE REINICIO

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 2** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-038** |
| **ACTA DE REINICIACIÓN** | | **FECHA: 19/Abr/2023** |

ACTA No: 1

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 11 de enero de 2024 |
| CONTRATO No: | 3268 de 2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SIVA VIAS |
| INTERVENTOR: | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ |
| VALOR: | $ 7.017.631.198,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 7 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL: | 28/05/2024 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante acta No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.3268 de 2023

**SEGUNDO:** Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del contrato N°3268 a partir del 11 de enero de 2024.

**SEGUNDO:** El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

**TERCERO:** El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

**CUARTA.** El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

**QUINTA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
MARIA FERNANDA CUESTA
RL/ CONSORCIO SIVA VIAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
CAMILO ADOLFO NAGED R.
RL/ GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

# POLIZAS

# POLIZAS SEGÚN CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-44-101207938** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **10** | **2023** | **04** | **10** | **2023** | **00:00** | **25** | **05** | **2029** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO SIVA VIAS** | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **GOBERNACION DE BOYACA** | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAMOS EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO SIVA VIAS. 901738696-2
- SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 901513076-1 PARTICIPACION 60%

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 12/10/2023 | 11/09/2024 | $2,105,289,359.64 | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 12/10/2023 | 11/09/2024 | $1,403,526,239.76 | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 12/05/2024 | 12/05/2029 | $2,105,289,359.64 | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 12/10/2023 | 12/05/2027 | $1,403,526,239.76 | |

### ACLARACIONES

ANEXO. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 04/10/2023, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **37,564,514.00 | $ ******25,000.00 | $ ***7,142,007.00 | $ ********44,731,522.00 | $ ****7,017,631,198.80 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101207938 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | | TUNJA, BOYACA | | 7420150 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
- SIS ORGANIZATION S.A.S. 901198451-7 PARTICIPACION 40%

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101207938 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SIVA VIAS | NIT: 901.738.696-2 | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| GOBERNACION DE BOYACA | NIT: 891.800.498-1 | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO SIVA VIAS. 901738696-2
- SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 901513076-1 PARTICIPACION 60%
- SIS ORGANIZATION S.A.S. 901198451-7 PARTICIPACION 40%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A GOBERNACION DE BOYACA 891800498-1

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

ANEXO. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 04/10/2023, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****676,931.00 | $ ******20,000.00 | $ *****132,416.00 | $ **********829,348.00 | $ ******580,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 | | | |


**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***



11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**





FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

DLF133527A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | | TUNJA, BOYACA | | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

DLF133527A

# POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-44-101207938** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **10** | **2023** | **04** | **10** | **2023** | **00:00** | **25** | **05** | **2029** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO SIVA VIAS** | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **GOBERNACION DE BOYACA** | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAMOS EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO SIVA VIAS. 901738696-2
- SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 901513076-1 PARTICIPACION 60%

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **12/10/2023** | **11/09/2024** | **$2,105,289,359.64** | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **12/10/2023** | **11/09/2024** | **$1,403,526,239.76** | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **12/05/2024** | **12/05/2029** | **$2,105,289,359.64** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **12/10/2023** | **12/05/2027** | **$1,403,526,239.76** | |

### ACLARACIONES

ANEXO. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 04/10/2023, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **37,564,514.00 | $ ******25,000.00 | $ ***7,142,007.00 | $ ********44,731,522.00 | $ ****7,017,631,198.80 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101207938 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | | TUNJA, BOYACA | | 7420150 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
- SIS ORGANIZATION S.A.S. 901198451-7 PARTICIPACION 40%

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

MariaFernandaCuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF133527A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101207938 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101207938

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF133527A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SIVA VIAS | NIT: 901.738.696-2 | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| GOBERNACION DE BOYACA | NIT: 891.800.498-1 | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO SIVA VIAS. 901738696-2
- SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 901513076-1 PARTICIPACION 60%
- SIS ORGANIZATION S.A.S. 901198451-7 PARTICIPACION 40%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A GOBERNACION DE BOYACA 891800498-1

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

ANEXO. DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA 04/10/2023, SE AJUSTA LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****676,931.00 | $ ******20,000.00 | $ *****132,416.00 | $ **********829,348.00 | $ ******580,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***



11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**





FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | | TUNJA, BOYACA | | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 12/10/2023 | 12/05/2024 | $580,000,000.00 | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

DLF133527A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101055346 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 00:00 | 25 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | | TUNJA, BOYACA | | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101055346

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

DLF133527A

# POLIZAS SEGÚN ACTA DE REINICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101214674 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2024 | 09 | 10 | 2023 | 00:00 | 09 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SIVA VIAS | NIT: 901.738.696-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DE BOYACA | NIT: 891.800.498-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAMOS EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO SIVA VIAS. 901738696-2
- SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 901513076-1 PARTICIPACION 60%
- SIS ORGANIZATION S.A.S. 901198451-7 PARTICIPACION 40%

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/10/2023 | 29/11/2024 | $1,403,526,239.76 | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 09/10/2023 | 29/11/2024 | $2,105,289,359.64 | $2,105,289,359.64 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/10/2023 | 29/05/2027 | $1,403,526,239.76 | $1,403,526,239.76 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 09/05/2024 | 09/05/2029 | $2,105,289,359.64 | $2,105,289,359.64 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS . LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****576,791.00 | $ *******8,000.00 | $ *****111,110.00 | $ **********695,902.00 | $ ****7,017,631,198.80 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101214674

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101214674 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2024 | 09 | 10 | 2023 | 00:00 | 09 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101214674

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADRIANADIAZSUS 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101214674, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de ENERO de 2024

11-44-101214674

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101058535 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2024 | 09 | 10 | 2023 | 00:00 | 29 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SIVA VIAS | NIT: 901.738.696-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GOBERNACION DE BOYACA | NIT: 891.800.498-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | TUNJA, BOYACA | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 3268 DE 2023. CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA.

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A GOBERNACION DE BOYACA 891800498-1

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS .

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******79,452.00 | $ *******3,000.00 | $ ******15,665.00 | $ ***********98,117.00 | $ ******580,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101058535

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Maria Fernanda Cuesta

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101058535 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2024 | 09 | 10 | 2023 | 00:00 | 29 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 09/10/2023 | 29/05/2024 | $580,000,000.00 | $580,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101058535

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADRIANABERNALC 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101058535 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 2024 | 09 | 10 | 2023 | 00:00 | 29 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SIVA VIAS | | **NIT: 901.738.696-2** |
| **DIRECCIÓN:** CL 72 41 B 20 ED DASANTOS OF 506 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3103616963 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7420150 |

BENEFICIARIO: 891800498 - GOBERNACION DE BOYACA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SIS ORGANIZATION SAS | 901198451-7 | 40.00 |
| SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS | 901513076-1 | 60.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101058535

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Maria Fernanda Cuesta

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADRIANABERNALC 3

# II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

# DOCUMENTOS MAQUINARIA

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO SIVA VÍAS**
**NIT. 901.738.696-2**
Ciudad

***Asunto**: Propuesta para arrendamiento vehículo Carrotanque- placas NHR613-*

Respetados señores,

Javier Dario Angarita, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.485.299 de Bogotá, por medio de la presente me permito presentarles la siguiente propuesta de arrendamiento del vehículo carro tanque, para el transporte de agua en Villa de Leyva, Boyacá. El vehículo cuenta con las siguientes especificaciones:

| | |
|---|---|
| **Tipo de Vehículo** | Carro tanque |
| **Placa** | NHR613 |
| **Modelo** | 2023 |
| **Marca** | FUSO |
| **Capacidad Carga Tanque** | 3390 Galones |
| **Herramientas de trabajo** | Moto bomba, manguera de para riego de agua y flauta de riego para vías |
| **Póliza de Seguro Todo Riesgo** | Con la compañía Seguros Bolivar hasta el 20 de diciembre de 2024 |
| **Póliza de Hidrocarburos** | Vigente hasta el 21 de enero de 2025 |

Teniendo en cuenta las especificaciones mencionadas, el valor mensual de la propuesta de arrendamiento del vehículo NHR613 es de COP$ 15.000.000 (quince millones de pesos) a todo costo.

Quedo atento a cualquier solicitud que pueda surgir al respecto.

Cordialmente,

Javier Dario Angarita
C.C. 79.485.299

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030515229

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| NHR613 | FUSO | FIV1PKX2LNQA | 2023 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 3.907 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | TANQUE | DIESEL | 5260 |

NÚMERO DE MOTOR
400924D0045680

REG: N

VIN: MEC0574P6PP056665

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: MEC0574P6PP056665

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ANGARITA CAÑAS JAVIER DARIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79485299

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
170

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352022000474031

I/E
I

FECHA IMPORT.
08/10/2022

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 22/11/2023 | 22/11/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT02007699304

**DATOS ENVÍO**
**NOMBRE:** JAVIER DARIO ANGARITA CAÑAS
**DIRECCION:** CL 154 91 56 TO 1 AP 503
**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA

## DATOS DEL TOMADOR

**NOMBRE:** BANCO DAVIVIENDA S.A.
**IDENTIFICACIÓN:** 860034313

# SEGURO DE AUTOMÓVILES

## CERTIFICADO DE SEGURO

**Póliza N°** 5160626341201
**Certificado:** 0 **N°:** 001
**Fecha de Expedición:** 20/12/2023

| VIGENCIA DEL SEGURO | DESDE (Día Mes Año) | HASTA (Día Mes Año) |
|---|---|---|
| | 20/12/2023 | 20/12/2024 |
| | A las 24 horas | A las 24 horas |

**OBSERVACIONES:** NN DAVIVIENDA JAVIER DARIO ANGARITA CAÑAS CC 79485299carganivel nacional pol 5160.

## ASEGURADO N.1

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| JAVIER DARIO ANGARITA CAÑAS | 79485299 |

## BENEFICIARIOS

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 860034313 | Oneroso |

## DATOS DEL ASESOR

| NOMBRE | TELÉFONO |
|---|---|
| CONFINANCIERA BOGOTA | 3122122 |

## RELACIÓN DE ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR | EQUIPO ORIGINAL |
|---|---|---|
| | $ 0 | |

## DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

| | |
|---|---|
| PLACA | NHR613 |
| MARCA | FUSO FI 3.9L [4800mm] MT 3900CC TD 4X2 [6.4] ABS [STD] |
| MODELO | 2023 |
| TIPO | CARRO TANQUES |
| COLOR | BLANCO |
| NÚMERO DE MOTOR | 400924D0045680 |
| VIN O CHASIS | MEC0574P6PP056665 |
| VALOR COMERCIAL * | $ 213,800,000 |
| TOTAL ACCESORIOS | $ 0 |
| VALOR ASEGURADO DEL BIEN | $ 213,800,000 |

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 328 Código: 39810005

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# AMPAROS

## AL ASEGURADO

| COBERTURA | VALOR ASEGURADO<br>% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones | DEDUCIBLE<br>% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones |
|---|---|---|
| Daños a Terceros | 1500 | 0%, min. 0 |
| Muerte o lesiones a 1 persona | 1500 | |
| Muerte o lesiones a 2 o más personas | 3000 | |
| COBERTURAS ADICIONALES | | |
| Atención jurídica proceso penal y civil | | |
| Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños | | |

## AL VEHÍCULO

| COBERTURA | DEDUCIBLE<br>% ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente |
|---|---|
| Hurto parcial y total* | 0%, min. 0 |
| Daños parciales | 10%, min. 1 |
| Terremoto | Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales |
| Daño total | 0%, min. 0 |
| RENTA DIARIA | 10 Días |
| Renta diaria por inmovilización | 10 Días |
| Asistencia Bolívar | Según condiciones y ciudades con convenio |
| COBERTURAS ADICIONALES | |
| Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días) | |
| Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación | |
| Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente | |

*Este deducible aplica solo

## OTROS BENEFICIOS

| |
|---|
| Programa de reposición especial en caso de pérdida total |
| Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo |

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

## $ VALORES A PAGAR

| | |
|---|---|
| VALOR DE LA PRIMA | $ 352,770 |
| VALOR ASISTENCIA BOLÍVAR | $ 21,380 |
| IVA PRIMA | $ 67,026 |
| IVA ASISTENCIA | $ 4,062 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 445,238** |
| PERIODICIDAD DE PAGO | MENSUAL |
| PRIMA PARA UNA VIGENCIA COMPLETA | $ 5,342,863 |

**NOTA IMPORTANTE**

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Póliza a la cual accede
N°:5160626341201

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

## DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

| | |
|---|---|
| PLACA | NHR613 |
| MARCA | FUSO FI 3.9L [4800mm] MT 3900CC TD 4X2 [6.4] ABS [STD] |
| MODELO | 2023 |
| TIPO | CARRO TANQUES |
| COLOR | BLANCO |
| NÚMERO DE MOTOR | 400924D0045680 |
| VIN O CHASIS | MEC0574P6PP056665 |
| VALOR COMERCIAL * | $ 213,800,000 |
| VALOR ACCESORIOS | $ 0 |
| VALOR ASEGURADO DEL BIEN | $ 213,800,000 |

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 328 Código: 39810005

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

## ASEGURADOS

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| JAVIER DARIO ANGARITA CAÑAS | 79485299 |

## BENEFICIARIOS

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 860034313 |

**VIGENCIA DEL SEGURO**

| DESDE | HASTA |
|---|---|
| 20/12/2023 | 20/12/2024 |
| Día Mes Año | Día Mes Año |
| A las 24 horas | A las 24 horas |

## AL ASEGURADO

| COBERTURA | VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente | DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente |
|---|---|---|
| Daños a Terceros | 1500 | 0%, min. 0 |
| Muerte o lesiones a 1 persona | 1500 | |
| Muerte o lesiones a 2 o más personas | 3000 | |
| COBERTURAS ADICIONALES | | |
| Atención jurídica proceso penal y civil | | |
| Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños | | |

## AL VEHÍCULO

| COBERTURA | DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente |
|---|---|
| Hurto parcial y total* | 0%, min. 0 |
| Daños parciales | 10%, min. 1 |
| Terremoto | Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales |
| Daño total | 0%, min. 0 |
| RENTA DIARIA | 10 Días |
| Renta diaria por inmovilización | 10 Días |
| Asistencia Bolívar | Según condiciones y ciudades con convenio |
| COBERTURAS ADICIONALES | |
| Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días) | |

## CLÁUSULA ESPECIAL PARA BENEFICIARIO ONEROSO

Extractado de las Condiciones Generales de la Póliza de Automóviles de Seguros Comerciales Bolívar. Aplica para las pólizas de automóviles con beneficiario oneroso.

**PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN**

En el evento de una pérdida total o parcial que se pretenda indemnizar en dinero, salvo que el beneficiario oneroso autorice el pago de la indemnización al ASEGURADO, ésta se destinará en primer lugar, a cubrir los créditos con garantía prendaria sobre el vehículo asegurado y el excedente, si lo hubiere, se pagará al ASEGURADO.

**RENOVACIÓN AUTOMÁTICA (COBERTURA ININTERRUMPIDA)**

Como un beneficio para el ASEGURADO y con el fin de garantizar la cobertura ininterrumpida de la póliza para la protección del vehículo, las partes acuerdan que ésta continuará vigente y se renovará por un período igual al señalado en la vigencia de la póliza. El tomador del seguro está obligado a pagar la prima dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o si fuere el caso, de los anexos que se expidan con fundamento a ella. El no pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos producirá la terminación automática de la póliza y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la celebración del contrato.

**REVOCACION DEL SEGURO**

En el evento que la póliza tenga designado beneficiario oneroso, la aseguradora podrá revocar unilateralmente la póliza, notificando su decisión al beneficiario oneroso y al ASEGURADO con no menos de 30 días comunes de antelación a la fecha efectiva de revocación de la póliza.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

21 de Diciembre del 2023

# ANEXO: NO APLICACIÓN DE DEDUCIBLE EN REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS

## Póliza No: 5160626341201 - Riesgo No: 1

Se hace constar que en caso de siniestro en el cual la compañía determine la pérdida total por Daños o Hurto, el deducible estipulado en la carátula de la póliza se reducirá al 10%, siempre y cuando el asegurado opte como indemnización por la figura de la reposición total del vehículo a través de la compañía.

Dicha reposición se deberá hacer bajo las siguientes condiciones:

1-. El valor a reponer será el que corresponda al valor comercial tomado como base de la guía Automóviles de Fasecolda vigente al momento del siniestro, menos el deducible pactado disminuido en un 10%.

2-. La reposición se realizará única y exclusivamente por un vehículo cero kilómetros y se hará por el 100% del valor indicado en el punto 1 anterior, no obstante el Asegurado podrá optar por un vehículo de mayor valor, caso en el cual él asumirá la diferencia.

3-. El proceso de reposición deberá hacerlo el Asegurado mediante los servicios exclusivos de Subocol, (empresa dedicada a la prestación de servicios de Intermediación y logística en compra de vehículos y repuestos), quien se encargará de asesorarlo en el proceso de compra y obtención de beneficios.

En caso de no optar por la reposición, la indemnización se hará siguiendo las condiciones pactadas en el contrato de Seguro.



Firma Representante Legal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Página en blanco

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 11 | 20 |

| VIGENCIA | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2023 | 11 | 21 |
| HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2024 | 11 | 20 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015100999301 | NHR613 | CAMION | PÚBLICO | 3907 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | FUSO | FIV1PKX2LNQA | null - null |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 400924D0045680 | MEC0574P6PP056665 | MEC0574P6PP056665 | 5.26 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER DARIO ANGARITA CAÑAS | 3102877577 | CC | 79485299 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 77556 | 1015 | 77556 | 1015100999301 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $776,000.00 | $403,500.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR


**$1,181,600.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

**Empresas**

Documento resumen de las condiciones contratadas

**Allianz**

# Seguro

de RC HIDROCARBUROS

www.allianz.co

Allianz

PROGRAMADORES PROFESIONALES DE

NIT: 8600676932
CALLE 191A N 11A-92 TORRE- 1 0
BOGOTA
Tel. 7594142
Móvil 3208838620
E-mail: programadores.profesionales@allia2.com.co

## Datos Generales

| | | |
|---|---|---|
| **Tomador del Seguro:** | FEDISPETROL COLOMBIA ES MINOR ES MINOR<br>CL 98 22 - 64 . .<br>BOGOTA<br>Teléfono: 3214511874<br>Email: fedispetrol@hotmail.com | NIT: 8600089041 |
| **Póliza y duración:** | Póliza nº: 023377739 / 0<br><br>Duración: Desde las 00:00 horas del 22/01/2024 hasta las 24:00 horas del 21/01/2025.<br>Importes expresados en PESO COLOMBIANO. | |

## Datos del Asegurado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asegurado Principal:** | ANGARITA CAÑAS, JAVIER DARIO<br>CL 93 3 58 69 .<br>BOGOTA | **CC:** | 79485299 |
| **Profesión:** | Profesiones Técnicas | **Email:** | jadace69@hotmail.com |
| **Estado Civil:** | Casado/a | | |

## Datos del Riesgo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Placa:** | NHR613 | **Código del vehículo:** | 0000039804012 |
| **Marca:** | FUSO | **Tipo:** | FI 3.9L [4800MM] |
| **Clase:** | CAMION | **Versión:** | MT 3900CC TD 4X2 [6.4] ABS |
| **Modelo:** | 2023 | **Capacidad en gls:** | 03400 |
| **Número VIN:** | MEC0574P6PP056665 | **Servicio:** | Público |
| **Chasis:** | MEC0574P6PP056665 | **Serie:** | MEC0574P6PP056665 |
| **Motor:** | 400924D0045680 | | |

## Coberturas

| Amparos | Valor Asegurado Único | Deducible |
|---|---|---|
| 1.BÃisico RCE Hidrocarburos - Decreto 1073 de 2015 | 520.000.000,00 | 15% con mínimo 3.000.000,00 |
| 2.Contaminación accidental subita e imprevista | 520.000.000,00 | 15% con mínimo 3.000.000,00 |
| 3.Costos de Limpieza y remediacion | 520.000.000,00 | 15% con mínimo 3.000.000,00 |
| 4.Gastos Medicos | 130.000.000,00 | Sin Deducible |

22-01-2024 15:00:20 0310101025600100C052 CA461430 1703477

## Clausulado General

Para conocer todos los detalles de coberturas, asistencias, servicios y más, consulta las Condiciones Generales de tu seguro **Aquí.**

Si quieres saber más acerca de condicionados de todas nuestras pólizas visita **www.allianz.co**

## Especificaciones Adicionales

Intermediarios:

| Código | Nombre Intermediario | % de Participación Allianz |
|---|---|---|
| 1703477 | PROGRAMADORES PROFESIONALES DE | 100,00 |

## Liquidación de Primas

**Nº de recibo: 103357251**

Periodicidad del pago: ANUAL

| | |
|---|---|
| PRIMA | 1.010.560,00 |
| IVA | 192.006,00 |
| **IMPORTE TOTAL** | **1.202.566,00** |

De conformidad con el artículo 1068 del Código de Comercio, la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

## Servicios para el Asegurado

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros, solicitudes de intervención, correción de errores o subsanación de retrasos, el asegurado podrá dirigirse a:

**En cualquier caso**

**El Asesor** PROGRAMADORES PROFESIONALES DE
**Telefono/s:**7594142 3208838620
Tambien a través de su e-mail:
programadores.profesionales@allia2.com.co
**Sucursal:** BOGOTÁ FARMER 2

**Urgencias y Asistencia**

**Desde su celular al #265**
**En Bogotá .....(57) 601 5941133**
**Linea de atención al cliente a nivel nacional.....018000513500**
**www.allianz.co**

Si tiene inquietudes, sugerencias o desea presentar una queja, visite www.allianz.co, enlace Atención al cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

* Grandes contribuyentes, régimen común. No sujeto a retención.

Se hace constar expresamente que sin el pago del recibo de prima carecerá de validez la cobertura del seguro



**Esteban Delgado**
**Representante Legal**
**Allianz Seguros S.A.**

16/01/2023-1301-P-06-RCEHIDROCARBURV3-D00I
16/01/2023-1301-NT-P-06-RCEHIDROCARBURV2

# Allianz Responsabilidad Civil Extracontractual Hidrocarburos

## Decreto 1073-2015

## Objeto y Alcance del Seguro

## CONDICIONES GENERALES

ALLIANZ SEGUROS S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, en consideración a las declaraciones que el TOMADOR ha hecho en la solicitud y a lo consignado en los demás documentos suministrados por el mismo para el otorgamiento de la cobertura respectiva, los cuales se incorporan a este contrato para todos los efectos y al pago de la prima convenida dentro de los términos establecidos para el mismo, concede al ASEGURADO los amparos que se estipulan en la Sección Segunda y Tercera, con sujeción a lo dispuesto en las definiciones, límites de cobertura, términos y condiciones generales contenidos en la presente póliza y en la legislación colombiana aplicable a ésta.

## SECCIÓN - PRIMERA EXCLUSIONES

SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE CONTRATADA LA COBERTURA, ESTA PÓLIZA EXCLUYE LA PÉRDIDA Y CUALQUIER TIPO DE SINIESTRO, DAÑO, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ÉSTE FUESE, RELACIONADO, DERIVADO, CAUSADO O COMO CONSECUENCIA DE:

1. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O SUS REPRESENTANTES.
2. RIESGOS DE ENERGÍA NUCLEAR, REACCIÓN NUCLEAR, RADIACIÓN NUCLEAR, CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA. RIESGOS ATÓMICOS Y NUCLEARES, ISÓTOPOS RADIOACTIVOS.
3. GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS PERPETRADOS POR AGENTES EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), REBELIÓN Y SEDICIÓN.
4. ASONADA SEGÚN SU DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL; MOTÍN O CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR; HUELGAS, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES; ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS QUE INCLUYEN ACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA COMETIDOS POR MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS.
5. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA TALES COMO: TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, MAREMOTO, TSUNAMI, HURACÁN, CICLÓN, TIFÓN, TORNADO, TEMPESTAD, VIENTO, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL DE AGUAS, INUNDACIÓN, LLUVIA, GRANIZO, ESTANCACIÓN, HUNDIMIENTO DEL TERRENO, DESLIZAMIENTO DE TIERRA, CAÍDA DE ROCAS, ALUDES, Y DEMÁS FUERZAS DE LA NATURALEZA.
6. INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES U ÓRDENES DE LA AUTORIDAD, DE

NORMAS TÉCNICAS O DE –PRESCRIPCIONES MÉDICAS O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

7. INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O POR MORA DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.
8. ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
9. POSESIÓN O USO DE EMBARCACIONES, NAVES FLOTANTES, AERONAVES O NAVES AÉREAS, ASÍ COMO CUALQUIER TRANSPORTE POR AGUA.
10. RIESGOS DE EXTRACCIÓN, REFINAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS; MINERÍA SUBTERRÁNEA.
11. COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHÍCULOS A MOTOR.
12. CONTAMINACIÓN PAULATINA.
13. DAÑOS ORIGINADOS POR LA ACCIÓN PAULATINA DE AGUAS.
14. PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO CUANDO NO ESTÉN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
15. ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO.
16. RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO.
17. PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, OPERACIONES TERMINADAS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS SE PRODUCEN DESPUÉS DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCIÓN, DE LA TERMINACIÓN, DEL ABANDONO O DE LA PRESTACIÓN. RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS.
18. OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO EN VIRTUD DE LEYES O DISPOSICIONES OFICIALES DE CARÁCTER LABORAL, ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
19. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO.
20. RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES.
21. DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARIZANTES, MULTAS Y /O SANCIONES
22. DAÑOS, PÉRDIDA O EXTRAVIÓ DE BIENES DE TERCEROS.
23. RECLAMACIONES QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES. DAÑOS PATRIMONIALES PUROS.
24. RECLAMACIONES EN LAS QUE SE IMPIDA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, LA DEBIDA TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO, CUANDO EL IMPEDIMENTO PROCEDA DE LA VÍCTIMA, DE PERSONAS U ÓRGANOS CON PODER PÚBLICO, U OTRAS PERSONAS, GRUPOS U ÓRGANOS CON PODER LEGAL, O COACCIÓN DE HECHO.
25. RECLAMACIONES POR SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
26. RECLAMACIONES ENTRE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE APARECEN CONJUNTAMENTE MENCIONADAS COMO EL «ASEGURADO» EN LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PÓLIZA O POR ANEXO.
27. CUALQUIER LESION CORPORAL O ENFERDAD RELACIONADA CON ASBESTOS.

28. DAÑOS DERIVADOS DE LA ACCIÓN PAULATINA DE TEMPERATURAS, DE GASES, VAPORES Y HUMEDAD, DAÑOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON RAYOS IONIZANTES DE ENERGÍA.
29. DAÑOS GENÉTICOS A PERSONAS O ANIMALES.
30. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS AL ASEGURADO, ASÍ COMO A SUS PARIENTES (SE ENTIENDE POR PARIENTES DEL ASEGURADO LAS PERSONAS LIGADAS A ESTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD).
31. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS A QUIENES SE EXTIENDE LA COBERTURA DEL PRESENTE SEGURO, ASÍ COMO A LOS EMPLEADOS Y A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, A LOS DIRECTIVOS O A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA JURÍDICA ASEGURADA SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD.
32. DAÑOS A LOS BIENES, PRODUCTOS O MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y/O AL VEHÍCULO TRANSPORTADOR
33. DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE ECOPETROL O DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA DE COMBUSTIBLE.
34. DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO A POZOS PETROLEROS, TANQUES PETROLEROS Y SUS PÉRDIDAS CONSECUENCIALES, BLOW OUT, CRATERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE CONTROL, DAÑOS AL PETRÓLEO CRUDO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DEL PETRÓLEO, RIESGOS OFF-SHORE.
35. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR
36. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.
37. RESPONSABILIDAD CIVIL SURGIDA POR DAÑOS QUE TENGAN COMO ORIGEN EL USO, APREHENSIÓN, DECOMISO O, EMBARGO EJERCIDO POR CUALQUIER AUTORIDAD, POR SECUESTRE O CUANDO SEA HURTADO, ROBADO, APROPIADO INDEBIDAMENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES ILÍCITAS.
38. LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL ASEGURADO.
39. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR ASEGURADO.
40. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS CUANDO EL VEHÍCULO TRANSITE POR VÍAS NO HABILITADAS O AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SALVO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE OBLIGUE A TOMAR DICHAS VÍAS.
41. DAÑO ECOLÓGICO PURO.
42. VEHÍCULOS CON MÁS DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD A MENOS QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE REPOTENCIADO Y DICHA REPOTENCIACIÓN NO SUPERE 12 AÑOS.
43. EN NINGÚN CASO ESTE SEGURO CUBRIRÁ PÉRDIDA, DAÑO, RESPONSABILIDAD O GASTO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR O AL CUAL SE CONTRIBUYA POR O QUE SURJA DE UN EVENTO CIBERNÉTICO, Y EN GENERAL NO ESTÁ CUBIERTO CUALQUIER TIPO DE PERJUICIO, PERDIDA, Y/ O DAÑO QUE SE CAUSE AL ASEGURADO, SUS DEPENDIENTES, SUS SOCIOS, SUS ACCIONISTAS, SUS DIRECTIVOS, SUS EMPLEADOS, SUS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, COMO TAMPOCO LOS DAÑOS QUE CAUSE EL ASEGURADO.
44. NO OTORGARÁ COBERTURA NI SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR NINGÚN SINIESTRO

U OTORGAR NINGÚN BENEFICIO EN LA MEDIDA EN QUE (I) EL OTORGAMIENTO DE LA COBERTURA, (II) EL PAGO DE LA RECLAMACIÓN O (III) EL OTORGAMIENTO DE TAL BENEFICIO EXPONGAN A ALLIANZ A CUALQUIER SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONTEMPLADA EN LAS RESOLUCIONES, LEYES, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, DECISIONES O CUALQUIER NORMA DE LAS NACIONES UNIDAS, LA UNIÓN EUROPEA, EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CUALQUIER OTRA LEY NACIONAL O REGULACIÓN APLICABLE. (ESTÁ CLÁUSULA APLICA PARA TODOS LOS AMPAROS DE ESTA PÓLIZA).

45. PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD, DAÑO, COMPENSACIÓN, LESIÓN, ENFERMEDAD, MUERTE, PAGO MÉDICO, COSTO DE DEFENSA, COSTO, GASTO O CUALQUIER OTRA CANTIDAD, REAL O SUPUESTA. INCURRIDO O ACUMULADO PARA EL ASEGURADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE E INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA QUE CONTRIBUYA AL MISMO TIEMPO O EN CUALQUIER SECUENCIA, QUE SE ORIGINE, SEA CAUSADO POR, SURJA DE, CONTRIBUYA A, RESULTE DE O DE OTRA MANERA EN CONEXIÓN CON UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE O EL MIEDO O LA AMENAZA (REAL O PERCIBIDA) DE UNA ENFERMEDAD TRANSMISIBLE.
46. PÉRDIDAS FINANCIERAS PURAS.
47. SECUESTRO Y RESCATE
48. RECICLAJE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS.
49. SE EXCLUYE TODA RECLAMACIÓN POR TRANSPORTE EN VEHÍCULOS QUE NO CUMPLAN CON LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16 Y 17 DEL DECRETO 4299 DE 2005 Y POSTERIOR ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2,3.86 DECRETO 1073 DE 2015.
50. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GLP.
51. SE EXCLUYE TODA RECLAMACIÓN EN LA CUAL EL ASEGURADO NO DE CUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE.
52. SE EXLCUYEN LOS GASTOS Y COSTOS DEL PERSONAL DEL ASEGURADO QUE NO TENGA COMO FUNCIÓN DENTRO DE SUS OBLIGACIONES LABORALES EL MANEJO DE CONTINGENCIAS RELACIONADAS CON LIMPIEZA Y/O BIOREMEDIACIÓN DEL HIDROCARBURO.

**EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL**

LA **ALLIANZ** NO INDEMNIZA LOS DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR Y/O COMO CONSECUENCIA DE:

1. CONTAMINACIÓN PAULATINA O GRADUAL, ASÍ COMO CONTAMINACIÓN QUE NO PROVENGA DE UN EVENTO ACCIDENTAL, SÚBITO E IMPREVISTO. DAÑO ECOLÓGICO PURO.
2. INOBSERVANCIA DE INSTRUCCIONES O RECOMENDACIONES PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL O MANTENIMIENTO DADAS POR LOS FABRICANTES DE ARTÍCULOS O INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN O EL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO POR CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE.

3. OMISIÓN DE LAS REPARACIONES NECESARIAS DE LOS ARTEFACTOS O INSTALACIONES ARRIBA MENCIONADOS.
4. LA INOBSERVANCIA DE LEYES, NORMAS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LAS AUTORIDADES U ORGANISMOS PÚBLICOS, PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
5. AGUAS NEGRAS, BASURAS O SUBSTANCIAS RESIDUALES.
6. DIOXINAS, CLORO FENOLES O CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA. LA **ALLIANZ** NO RESPONDE POR:
   1. DAÑOS ECOLÓGICOS. DAÑO ECOLÓGICO PURO.
   2. GASTOS INCURRIDOS POR EL ASEGURADO CON EL FIN DE PREVENIR, NEUTRALIZAR O AMINORAR DAÑOS A TERCEROS A CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACIÓN CUBIERTA O EXCLUIDA POR ESTA PÓLIZA, SALVO AQUELLOS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA Y BIORREMEDIACIÓN CUBIERTOS EN ESTA PÓLIZA.

## SECCION SEGUNDA – COBERTURA BÁSICA

### RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HIDROCARBUROS

ESTE SEGURO IMPONE A CARGO DE LA **ALLIANZ** LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, QUE CAUSE EL ASEGURADO Y QUE OCURRAN DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA CON RELACIÓN A TERCEROS, DE ACUERDO CON LA LEY QUE SEAN CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO, IMPUTABLE AL ASEGURADO CAUSADO POR ACCIÓN DIRECTA DEL HIDROCARBURO EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL TRANSPORTE, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN SIEMPRE Y CUANDO TALES ACTIVIDADES ESTÉN SIENDO REALIZADAS POR EL ASEGURADO.

- DAÑOS MATERIALES TALES COMO LA DESTRUCCIÓN, AVERÍA O EL DETERIORO DE UNA COSA.
- DAÑOS PERSONALES TALES COMO LESIONES CORPORALES, ENFERMEDADES, MUERTE.
- LUCRO CESANTE DEL TERCERO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS DAÑOS PERSONALES O MATERIALES AMPARADOS POR LA PÓLIZA.
- DAÑO MORAL, PERJUICIOS FISIOLÓGICOS Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN DIRECTAMENTE DERIVADOS DE UNA LESIÓN CORPORAL O DAÑO MATERIAL AMPARADO POR LA PÓLIZA.

### GASTOS CUBIERTOS:

LA **ALLIANZ** RESPONDE, ADEMÁS, AUN EN EXCESO DEL LÍMITE ASEGURADO, POR

LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN CONTRA EL ASEGURADO, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

- SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA EN LA PÓLIZA O SUS ANEXOS.
- SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO DE JUICIO CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA **ALLIANZ**.
- SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE EL LÍMITE ASEGURADO, LA **ALLIANZ** SOLO RESPONDE POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDE EN LA INDEMNIZACIÓN.
- LA **ALLIANZ** SOLO RECONOCERÁ COMO HONORARIOS PROFESIONALES AQUELLOS ESTABLECIDOS EN LAS TARIFAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA RESPECTIVA CIUDAD, PREVIA APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE RESPECTIVO.

### GASTOS DE DEFENSA

LOS GASTOS DE DEFENSA EN EL PROCESO QUE SE ADELANTA COMO CONSECUENCIA DE UN DAÑO AMPARADO EN LA PÓLIZA SE ENTENDERÁN CUBIERTOS DENTRO DEL LÍMITE ASEGURADO. LA **ALLIANZ** SOLO RECONOCERÁ COMO HONORARIOS PROFESIONALES AQUELLOS ESTABLECIDOS EN LAS TARIFAS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA RESPECTIVA CIUDAD, PREVIA APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE PACTADO.

## SECCION TERCERA - COBERTURAS ADICIONALES

### RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL

SE CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA POR LA VARIACIÓN ACCIDENTAL, SÚBITA E IMPREVISTA DE LA COMPOSICIÓN DEL, AGUA, DEL AIRE, DEL SUELO O DEL SUBSUELO, O BIEN POR RUIDO, SIEMPRE Y CUANDO SEA CONSECUENCIA DE UN HECHO EXTERNO DE CARÁCTER ACCIDENTAL, SÚBITO E IMPREVISTO, IMPUTABLE AL ASEGURADO, OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

### GASTOS DE LIMPIEZA Y/O BIORREMEDIACIÓN:

DENTRO DEL LÍMITE ASEGURADO SE ENTIENDEN CUBIERTOS HASTA LA SUMA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y/O BIORREMEDIACIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES ORIGINADOS EN UN ACONTECIMIENTO SÚBITO E IMPREVISTO CAUSADO POR EL ASEGURADO.

### GASTOS MÉDICOS

SE CUBREN LOS GASTOS MÉDICOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO FRENTE A TERCEROS VÍCTIMAS DE UNA LESIÓN PERSONAL SUFRIDA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DECLARADAS Y ASEGURADAS; Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MISMO PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS QUE SE CAUSEN POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITAL, DE ENFERMERÍA Y DE DROGAS PROVENIENTES DE LA LESIÓN PERSONAL.

## SECCIÓN CUARTA – CONDICIONES ESPECIALES

• El cabezote podrá enganchar cualquier tráiler que cumpla, con los requisitos del Registro Único Nacional.

• Revocación de la póliza sesenta (60) días, previo aviso al Ministerio de Minas y Energía.

## SECCIÓN QUINTA – SINIESTROS

### OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.

El Asegurado está obligado a dar noticia a Allianz de la ocurrencia de un siniestro, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de que lo haya conocido o debido conocer. Si contra el Asegurado se inicia algún proceso judicial por la ocurrencia de un siniestro, debe de igual modo dar aviso a Allianz aunque ya lo haya dado respecto a la ocurrencia del mismo siniestro. Igual obligación corresponde al Asegurado cuando recibe reclamación de terceros por algún siniestro. Allianz no puede alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo, intervienen en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro.

Ocurrido un siniestro, el Asegurado está obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer el salvamento de los bienes y/o el auxilio de las personas afectadas. Queda igualmente obligado a tomar las providencias aconsejables tendientes a evitar la agravación de los daños o perjuicios.

El Asegurado está obligado a colaborar en su defensa, a otorgar los documentos y a concurrir a las citaciones que la ley o la autoridad le exija; a hacerse presente en todas las diligencias encaminadas a establecer el monto de los perjuicios y a ajustar la pérdida cuando la ley; la autoridad o Allianz se lo exija.

El Asegurado está obligado a observar la mejor diligencia a fin de evitar otras causas que puedan dar origen a reclamaciones. Igualmente está obligado a atender todas las instrucciones e indicaciones que Allianz le de para los mismos fines.

El Asegurado debe hacer todo lo que esté a su alcance para permitir a Allianz el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

Si el Asegurado incumple cualquiera de las obligaciones que le corresponden en virtud de esta condición, Allianz puede deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. La mala fe del Asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro, causa la pérdida de tal derecho.

## RECLAMACION

Corresponde al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. Sin perjuicio de la libertad probatoria que le asiste en virtud de artículo 1077 del Código de Comercio, el Asegurado debe aportar como sustento a la reclamación los documentos que Allianz razonablemente le exija, tales como pero no limitados a:

Detalles, libros, facturas, documentos justificativos y cualesquiera informes que se le requieran en relación con la reclamación, como también, facilitar la atención de cualquier demanda, asistir a las audiencias y procesos judiciales a que haya lugar, suministrar pruebas, conseguir si es posible la asistencia de testigos y prestar toda colaboración necesaria en el curso de tales procesos judiciales.

## FACULTADES DE ALLIANZ EN CASO DE SINIESTRO

Ocurrido el siniestro, Allianz está facultada para lo siguiente:

- Entrar en los predios o sitios en que ocurrió el siniestro, a fin de verificar o determinar su causa o extensión.
- Inspeccionar, examinar, clasificar, avaluar y trasladar de común acuerdo con el Asegurado, los bienes que hayan resultado afectados en el siniestro.
- Pagar la indemnización en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa afectada, a opción de Allianz.
- Allianz tiene derecho a transigir o desistir así como de realizar todo lo conducente para disminuir el monto de la responsabilidad a su cargo y para evitar que se agrave el siniestro.
- Allianz tiene derecho a tomar las medidas que le parezcan convenientes para liquidar o reducir una reclamación en nombre del Asegurado.
- Allianz se beneficia con todos los derechos, excepciones y acciones que favorecen al Asegurado y se libera de responsabilidad en la misma proporción en que se libera el Asegurado.
- Allianz tiene derecho de verificar las condiciones del riesgo y de sus modificaciones, y de cobrar las primas reajustadas a que hay lugar.

Si por acto u omisión del Asegurado se desmejoran los derechos de Allianz, ésta no tiene más responsabilidad que la que le correspondió al
Asegurado en el momento de ocurrir el siniestro conforme a las estipulaciones de este seguro.

## PROHIBICIONES AL ASEGURADO Y PÉRDIDA DEL DERECHO

El Asegurado no puede sin consentimiento previo y escrito de Allianz aceptar responsabilidades, desistir, transigir, conciliar, ni hacer cesión de derechos derivados de este

seguro, so pena de perder todo derecho bajo esta póliza.

Tampoco puede incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro, y de aquellos encaminados a impedir la agravación de un daño.

Así mismo le está prohibido impedir o dificultar la intervención de Allianz en la investigación de un siniestro o en el ajuste de las pérdidas.

Allianz está relevada de toda responsabilidad y el beneficiario pierde todo derecho a la indemnización en cualquiera de los siguientes casos:

- Si en cualquier tiempo se emplean engañosa o dolosamente medios o documentos por el Tomador, Asegurado o Beneficiario, o por terceras personas que obren por cuenta suya o con su consentimiento, para sustentar una reclamación o para derivar beneficio del seguro que esta póliza ampara.
- Por omisión maliciosa por parte del Asegurado de su obligación de declarar a Allianz conjuntamente con la noticia del siniestro, los seguros coexistentes sobre el mismo interés Asegurado y contra el mismo riesgo.
- Por renuncia del Asegurado a sus derechos contra terceros responsables del siniestro.

## DEDUCIBLE

**Allianz** solo será responsable por el monto de la Pérdida que exceda cualquier Deducible aplicable. Si se aplica más de un Deducible a un Reclamo relacionado, solo se aplicará el Deducible más alto aplicable.

## PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Allianz pagará indemnizaciones correspondientes a siniestros amparados bajo esta póliza o por sus anexos, únicamente en los siguientes casos:

- Cuando se le demuestra plenamente por parte del asegurado o de la víctima, su responsabilidad a través de medios probatorios idóneos; así como la cuantía del perjuicio causado.
- Cuando se realiza, con autorización previa de Allianz, un acuerdo entre el Asegurado y la víctima o sus causahabientes, mediante el cual se establecen las sumas definitivas que el primero debe pagar al segundo o segundos, por concepto de toda indemnización.
- Cuando Allianz realiza un convenio con la víctima o sus causahabientes, mediante el cual éstos liberan de toda responsabilidad al Asegurado.
- Cuando existe una sentencia judicial o laudo arbitral debidamente ejecutoriados.

Si el Asegurado debe pagar una renta al damnificado y el valor capitalizado de ésta excede el valor del límite asegurado o el remanente una vez deducidas otras indemnizaciones, tal renta se paga en la proporción que existe entre el límite asegurado o su remanente y el valor capitalizado de la renta.

Si el Asegurado, como consecuencia de alguna situación distinta, obtiene el derecho de pedir la eliminación o disminución en el monto de la renta, está obligado a que sea Allianz la que ejerza tal derecho.

En el caso que algún arreglo convenido por Allianz no llegue a concretarse por culpa del asegurado, Allianz queda liberada de su obligación de indemnizar.

### REDUCCION DEL LÍMITE ASEGURADO

El límite asegurado por la presente póliza se entiende reducido desde el momento del siniestro en el importe de la indemnización pagada por Allianz. Por lo tanto, la responsabilidad de Allianz por uno o más siniestros ocurridos durante el período de vigencia del seguro, no excederá en total el límite asegurado.

De igual manera se aplica el mismo concepto cuando se trate de sublímites.

## SECCIÓN SEXTA - CUESTIONES FUNDAMENTALES DE CARÁCTER GENERAL

### DEFINICIONES

Para todos los efectos de este seguro, y donde quiera que ellos aparezcan, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente significado:

**1. ASEGURADO:** Es la persona natural o jurídica bajo esa denominación figura en la caratula de esta póliza o por anexo. Además de éste, todos los funcionarios a su servicio, mientras se encuentran en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tal.

**2. BENEFICIARIO:** es el damnificado o víctima. Es la tercera víctima del perjuicio patrimonial causado por el Asegurado.

**3. VIGENCIA:** donde es el período comprendido entre las fechas de iniciación y la terminación del amparo que brinda el seguro, las cuales aparecen señaladas en la carátula de esta póliza o por anexo.

**4. RECLAMACIÓN:**

En Modalidad Ocurrencia
Se entenderá por RECLAMACION:

- Un procedimiento judicial o administrativo
- Un requerimiento formal y por escrito dirigido al asegurado o asegurador en ejercicio de las acciones legales que correspondan
- La comunicación al asegurador de cualquier hecho o circunstancia concreta, conocida por primera vez por el asegurado y notificada fehacientemente, que pueda razonablemente determinar la ulterior formulación de una petición de resarcimiento o hacer entrara en juego

las garantías de la póliza.

## 5. SINIESTRO

En Modalidad Ocurrencia

Es todo hecho externo, acaecido en forma accidental, súbita e imprevista, ocurrido durante la vigencia de esta póliza, que cause un daño o un perjuicio que pueda dar origen a una reclamación de responsabilidad civil extracontractual en contra del Asegurado y afectar este seguro. Se entiende ocurrido el siniestro en el momento en que acaece el hecho externo imputable al Asegurado.

Constituye un solo siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa originaria, con independencia del número de reclamantes, reclamaciones formuladas o personas legalmente responsables.

**EVENTO CIBERNÉTICO** significa:

- Cualquier tratamiento no autorizado de Datos por parte del Asegurado o cualquier persona que tenga cualquier tipo de vínculo, real y/o presunto con éste.
- Cualquier violación a las leyes o incumplimiento de los reglamentos que tienen que ver con la seguridad o protección de Datos,
- -Cualquier Falla en la Seguridad de los Sistemas Tecnológicos del Asegurado.

**ENFERMEDAD TRANSMISIBLE:** cualquier enfermedad que pueda ser transmitida por medio de cualquier sustancia o agente desde cualquier organismo a otro organismo donde:

- La sustancia o agente incluye, entre otros, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
- El método de transmisión, ya sea directa o indirecta, incluye, entre otros, transmisión aérea, transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y
- La enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar lesiones corporales, enfermedades, angustia emocional o daños a la salud humana, el bienestar humano o daños a la propiedad.

**DATOS** hace referencia a los datos que tienen valor para el titular de los mismos, es decir, que son esenciales para el negocio; Incluye, pero sin limitarse a, **Datos Personales**, información técnica, jurídica, comercial, financiera, administrativa, operativa y tecnológica,

**DATOS PERSONALES** cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, que cumplen con las siguientes características: (i) están referidos a aspectos exclusivos y propios de la persona y (ii) permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos. Son ejemplos de datos personales: el nombre, número de identificación, datos de ubicación, origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos

o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

**TRATAMIENTO:** se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos, ya sea o no a través de medios automáticos y/o electrónicos, tales como recolección, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, retiro, consulta, uso, revelación, circulación, eliminación o destrucción.

**DAÑO A DATOS**: la fuga, manipulación, pérdida, sustracción, destrucción o alteración de **Datos**.

**SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL ASEGURADO:** cualquier dispositivo, propio o no, que le permita al Asegurado prestar los servicios y manejar los Datos en condiciones de seguridad y calidad.

**FALLA EN LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS** cualquier situación que afecta la protección o el aseguramiento de los datos, sistemas y aplicaciones, es decir, cualquier situación que afecta la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos que se almacenen, reproduzcan o procesen en los sistemas informáticos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad destinados a salvar la vida de una persona.

**LIMITE ASEGURADO**

La suma indicada en los Datos Identificativos de esta póliza o por anexo como «límite por vigencia» es el límite máximo de responsabilidad de Allianz por todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro. En ningún caso y por ningún motivo la responsabilidad de Allianz puede exceder este límite durante la vigencia, aunque durante el mismo período ocurran uno o más siniestros.

La suma indicada en los Datos Identificativos de esta póliza o por anexo como «límite por evento» es el límite máximo de responsabilidad de Allianz por todos los daños y perjuicios causados por el mismo siniestro.

Cuando en los Datos Identificativos de esta póliza o por anexo se índica un sublimite para un determinado amparo por vigencia, tal sublimite es el límite máximo de la indemnización por todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro que afectan dicho amparo.

**PRIMA**

EL TOMADOR pagará la prima indicada en la carátula de la póliza o por anexo, dentro del término establecido en esta.

El pago de la prima deberá hacerse en el domicilio de Allianz o en el de sus representantes o agentes debidamente autorizados.

Allianz devenga definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo. Sin embargo, en caso de que por uno o más siniestros, se agote el límite Asegurado, la prima se entiende totalmente devengada por Allianz. Si el agotamiento es parcial se entiende por devengada la correspondiente al valor de la indemnización, sin consideración al tiempo corrido del riesgo.

En caso que se establezca una prima mínima y de depósito, esta podrá ser ajustada al final de la vigencia del seguro, aplicando la tasa de ajuste indicada en la carátula de la póliza o por anexo. Si el valor calculado de esta manera fuere mayor que la prima mínima y de depósito, EL TOMADOR se obliga a pagar el correspondiente excedente. Si el valor calculado fuere menor que la prima mínima y de depósito, no habrá Lugar a devolución de prima por parte de Allianz puesto que se trata de una prima mínima.

## DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

1. El Tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según la solicitud de seguro suscrita por él. La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por Allianz, la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.
2. Si la declaración no se hace con sujeción a una solicitud de seguro, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el Tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.
3. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato no es nulo, pero Allianz solo está obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato, represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.
4. Las sanciones consagradas en esta condición no se aplican si Allianz, antes de celebrarse el contrato, conoció o debió conocer hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Rescindido el contrato en los términos de esta condición, Allianz tiene derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena.

## AGRAVACIÓN DEL RIESGO

EL ASEGURADO o EL TOMADOR, según el caso, está n obligados a mantener el estado del riesgo según lo declarado por ellos en la solicitud del seguro. En tal virtud, uno u otro debe notificar por escrito a Allianz los hechos y circunstancias que sobrevienen con posterioridad a la celebración del contrato del seguro y que, conforme al criterio estipulado en la " DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO " que " El Tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según la solicitud de seguro suscrita por él. La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por Allianz, la

hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro, significan agravación del riesgo.

La notificación debe hacerse con antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de la modificación del riesgo, si esta depende del arbitrio del asegurado o tomador. Si la modificación es extraña a la voluntad del Asegurado o Tomador; dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento de ella. Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior; Allianz puede revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. La mala fe del Asegurado o el Tomador da derecho a Allianz de retener la prima no devengada.

Esta sanción no se aplica cuando Allianz ha conocido oportunamente la modificación y consentido en ella.

## DERECHOS DE INSPECCIONES

1. Allianz tiene en todo tiempo el derecho de inspeccionar las propiedades y operaciones del asegurado, pudiendo hacer la inspección a cualquier hora hábil y por personas debidamente autorizadas por Allianz.
2. El Asegurado está obligado a proporcionar a Allianz todos los detalles e informaciones necesarios para la debida apreciación del riesgo. Allianz puede examinar los libros y registros, con el fin de efectuar comprobaciones acerca de los datos que sirvieron de base para el cálculo de la prima.

## TERMINACIÓN Y REVOCACIÓN DEL SEGURO

El presente seguro termina:

1. Por extinción del periodo por el cual se contrató si no se efectúa la renovación.
2. Por desaparición del riesgo. En caso de extinción por la causal aquí anotada, si la desaparición del riesgo consiste en uno o más siniestros, y se agota el límite asegurado, Allianz tiene derecho a la totalidad de la prima correspondiente a la vigencia completa.
3. Por la revocación unilateral del contrato que efectúe cualquiera de las partes.

Este contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por Allianz, mediante noticia escrita al ASEGURADO, enviada a su última dirección conocida y al Ministerio de Minas y Energía con no menos de SESENTA (60) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; Por EL ASEGURADO, en cualquier momento, mediante aviso escrito A Allianz En el primer caso, la revocación da derecho al ASEGURADO a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguro a corto plazo, en cuyo caso se cobrará la prima a prorrata para la vigencia del seguro más un recargo del 10% de la diferencia entre dicha prima y la anual. La prima de una póliza de corto plazo no podrá aplicarse a un período más largo para obtener menor

prima total.

## CESIÓN
Opera de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1106 y 1107 del Código de Comercio.

## COEXISTENCIA DE SEGUROS
EL ASEGURADO debe informar por escrito a Allianz los seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo interés y contra los mismos riesgos asegurados bajo esta póliza, dentro del término de diez (10) hábiles días a partir de su celebración. La inobservancia de esta obligación producirá la terminación del contrato, a menos que el valor conjunto de los seguros no exceda el valor real del interés asegurado.

En el caso de pluralidad o coexistencia de seguros, los Aseguradores deberá n soportar la indemnización debida al Asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el Asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de estos seguros produce nulidad.

## ÁMBITO TERRITORIAL
Están amparados todos los siniestros ocurridos en el territorio de la Republica de Colombia.

## SUBROGACIÓN
Allianz, por razón de cualquier indemnización que pague, se subrogará, por ministerio de la Ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro.

El Asegurado no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. El incumplimiento de esta obligación le acarrea la pérdida del derecho de indemnización.

## COMPROMISORIA O DE ARBITRAMENTO
Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de conformidad con la legislación vigente, ley 1563 de 2012, o de las normas posteriores que la modifiquen o deroguen. en estos casos, la cláusula compromisoria no será aplicable en los eventos en que Allianz sea llamada en garantía dentro del proceso ordinario que instaure la víctima contra el asegurado para reclamar el pago de la indemnización derivada de la responsabilidad civil. Así mismo, en el evento de que el asegurado y los reclamantes acordaren resolver las diferencias relacionadas con la responsabilidad civil amparada por esta póliza, Allianz acepta su vinculación al trámite arbitral.

## NOTIFICACIONES
Toda comunicación a que haya lugar entre las partes con motivo de la ejecución de las condiciones estipuladas en este contrato, se hace por escrito, y es prueba suficiente de la notificación, la constancia y fecha de recibo personal de las partes o la del envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado, a la última dirección conocida de las partes.

EI requisito anterior no se aplica para la notificación del siniestro a Allianz, la cual puede hacerse

por cualquier medio idóneo, incluido el escrito.

## ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

EL TOMADOR se obliga a entregar información veraz y verificable, actualizar por cualquier medio escrito sus datos personales, así como los del ASEGURADO y EL BENEFICIARIO, por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos según la póliza. Esta garantía, consagra la facultad de Allianz de dar por terminado el contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 1061 del código de comercio. Cuando EL ASEGURADO (y/o BENEFICIARIO) sean personas diferentes al TOMADOR, la información relativa a aquellos será recaudada al momento de la presentación de la reclamación.

## DOMICILIO

Se fija en la ciudad que figure en la carátula de la póliza, como domicilio contractual sin perjuicio de las disposiciones procesales.

## AVISO DE SINIESTRO

El asegurado o beneficiario están obligados a dar noticia a Allianz de la ocurrencia del siniestro, dentro de los Treinta (3) días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. El incumplimiento de la obligación descrita dará lugar a que Allianz deduzca de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

# TABLA No: NHR 613 - COMPARTIMIENTO No 1

Certificado de Aforo No. CT 004 - 24

RES. MINIMINAS No 463

**MEDICIÓN Y VOLUMETRIA MCC SAS**

NIT. 901.426.596-5

Calle 151 No. 111 a 87

**COMPARTIMIENTO ID No: 1**

**PLACA ID No: NHR 613**

**ALTURA NOMINAL: 129,80 cm**

**CAPACIDAD NOMINAL: 1.635,00 Galones**

**ALTURA DE REFERENCIA: 140,00 cm**
BORDE SUPERIOR DE CUPULA

**UBICACIÓN REGLA DE MEDIDA:**

Parte trasera manhole

**METODO DE AFORO:** Fisico -volumetrico en

Normal operacion de llenado con calibradores (seraphines

| Equipo | Certificado |
|---|---|
| 50 Galones | MCG-21-241 |
| 100 Galones | MCG-21-242 |
| Regla Tajima | MD-0198-14 |

**METODO DE CALCULO TABLA:** Interpolacion Matematica

**NORMA : NTC 5628 (Homologada API 2554 - ASTM D 1409)**

**NOTA:** A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDIDO ESTE CERTIFICADO SOLO SE ACEPTARA RECLAMACIONES DURANTE LOS PRIMEROS 60 DÍAS CALENDARIO

NIT 901426596-5

Realizado por:

Tecnico ; Iván Calderón Millán

Tel: 3107546776

| ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,41 | 51 | 596,92 | 101 | 1.360,00 | 116 | 1.540,00 |
| 2 | 14,81 | 52 | 612,50 | 102 | 1.373,33 | 117 | 1.550,00 |
| 3 | 22,22 | 53 | 628,13 | 103 | 1.386,67 | 118 | 1.559,09 |
| 4 | 29,63 | 54 | 643,75 | 104 | 1.400,00 | 119 | 1.568,18 |
| 5 | 37,04 | 55 | 659,38 | 105 | 1.412,50 | 120 | 1.577,27 |
| 6 | 44,44 | 56 | 675,00 | 106 | 1.425,00 | 121 | 1.586,36 |
| 7 | 51,85 | 57 | 690,63 | 107 | 1.437,50 | 122 | 1.595,45 |
| 8 | 59,26 | 58 | 706,45 | 108 | 1.450,00 | 123 | 1.602,40 |
| 9 | 66,67 | 59 | 722,58 | 109 | 1.462,50 | 124 | 1.607,19 |
| 10 | 74,07 | 60 | 738,71 | 110 | 1.475,00 | 125 | 1.611,99 |
| 11 | 81,48 | 61 | 754,84 | 111 | 1.487,50 | 126 | 1.616,78 |
| 12 | 88,89 | 62 | 770,97 | 112 | 1.500,00 | 127 | 1.621,58 |
| 13 | 96,30 | 63 | 787,10 | 113 | 1.510,00 | 128 | 1.626,37 |
| 14 | 105,38 | 64 | 803,23 | 114 | 1.520,00 | 129 | 1.631,16 |
| 15 | 116,13 | 65 | 819,36 | 115 | 1.530,00 | 129,8 | 1.635,00 |
| 16 | 126,88 | 66 | 835,48 | | | | |
| 17 | 137,63 | 67 | 851,61 | | | | |
| 18 | 148,39 | 68 | 867,74 | | | | |
| 19 | 159,14 | 69 | 883,87 | | | | |
| 20 | 169,89 | 70 | 900,00 | | | | |
| 21 | 180,65 | 71 | 915,63 | | | | |
| 22 | 191,40 | 72 | 931,25 | | | | |
| 23 | 202,60 | 73 | 946,88 | | | | |
| 24 | 215,58 | 74 | 962,50 | | | | |
| 25 | 228,57 | 75 | 978,13 | | | | |
| 26 | 241,56 | 76 | 993,75 | | | | |
| 27 | 254,55 | 77 | 1.009,23 | | | | |
| 28 | 267,53 | 78 | 1.024,62 | | | | |
| 29 | 280,52 | 79 | 1.040,00 | | | | |
| 30 | 293,51 | 80 | 1.055,38 | | | | |
| 31 | 306,58 | 81 | 1.070,77 | | | | |
| 32 | 319,74 | 82 | 1.086,15 | | | | |
| 33 | 332,90 | 83 | 1.101,49 | | | | |
| 34 | 346,05 | 84 | 1.116,42 | | | | |
| 35 | 359,21 | 85 | 1.131,34 | | | | |
| 36 | 372,37 | 86 | 1.146,27 | | | | |
| 37 | 385,53 | 87 | 1.161,19 | | | | |
| 38 | 398,68 | 88 | 1.176,12 | | | | |
| 39 | 413,64 | 89 | 1.191,04 | | | | |
| 40 | 428,79 | 90 | 1.205,80 | | | | |
| 41 | 443,94 | 91 | 1.220,29 | | | | |
| 42 | 459,09 | 92 | 1.234,78 | | | | |
| 43 | 474,24 | 93 | 1.249,28 | | | | |
| 44 | 489,39 | 94 | 1.263,77 | | | | |
| 45 | 504,62 | 95 | 1.278,26 | | | | |
| 46 | 520,00 | 96 | 1.292,75 | | | | |
| 47 | 535,39 | 97 | 1.306,67 | | | | |
| 48 | 550,77 | 98 | 1.320,00 | | | | |
| 49 | 566,15 | 99 | 1.333,33 | | | | |
| 50 | 581,54 | 100 | 1.346,67 | | | | |

**DARIO ANGARITA**

**CAMION TANQUE**
**PLACA: NHR 613**

**CAPACIDAD NOMINAL TOTAL:**
**3385 Galones**

**No DE COMPARTIMIENTOS: 3**

Enero 20 2024

# TABLA No: NHR 613 - COMPARTIMIENTO No 2

Certificado de Aforo No. CT 004 - 24

RES. MINIMINAS No 463

**MEDICIÓN Y VOLUMETRIA MCC SAS**

NIT. 901.426.596-5

Calle 151 No. 111 a 87

**COMPARTIMIENTO ID No: 2**

**PLACA ID No: NHR 613**

**ALTURA NOMINAL: 130,00 cm**

**CAPACIDAD NOMINAL: 880,00 Galones**

**ALTURA DE REFERENCIA: 140,00 cm**
BORDE SUPERIOR DE CUPULA

**UBICACIÓN REGLA DE MEDIDA:**

Parte trasera manhole

**METODO DE AFORO:** Fisico -volumetrico en

Normal operacion de llenado con calibradores (seraphines

| Equipo | Certificado |
|---|---|
| 50 Galones | MCG-21-241 |
| 100 Galones | MCG-21-242 |
| Regla Tajima | MD-0198-14 |

**METODO DE CALCULO TABLA:** Interpolacion Matematica

**NORMA : NTC 5628 (Homologada API 2554 - ASTM D 1409)**

**NOTA:** A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDIDO ESTE CERTIFICADO SOLO SE ACEPTARA RECLAMACIONES DURANTE LOS PRIMEROS 60 DÍAS CALENDARIO

NIT 901426596-5

Realizado por:

Tecnico ; Iván Calderón Millán

Tel: 3107546776

| ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,59 | 51 | 316,67 | 101 | 720,69 | 116 | 819,44 |
| 2 | 9,17 | 52 | 325,00 | 102 | 727,59 | 117 | 825,00 |
| 3 | 13,76 | 53 | 333,33 | 103 | 734,48 | 118 | 830,56 |
| 4 | 18,35 | 54 | 341,67 | 104 | 741,38 | 119 | 836,11 |
| 5 | 22,94 | 55 | 350,00 | 105 | 748,28 | 120 | 841,67 |
| 6 | 27,52 | 56 | 358,33 | 106 | 755,17 | 121 | 847,22 |
| 7 | 32,11 | 57 | 366,67 | 107 | 762,07 | 122 | 851,77 |
| 8 | 36,70 | 58 | 375,00 | 108 | 768,97 | 123 | 855,29 |
| 9 | 41,28 | 59 | 383,33 | 109 | 775,86 | 124 | 858,82 |
| 10 | 45,87 | 60 | 391,67 | 110 | 782,76 | 125 | 862,35 |
| 11 | 50,46 | 61 | 400,00 | 111 | 789,66 | 126 | 865,88 |
| 12 | 55,05 | 62 | 408,33 | 112 | 796,55 | 127 | 869,41 |
| 13 | 59,63 | 63 | 416,67 | 113 | 802,78 | 128 | 872,94 |
| 14 | 64,22 | 64 | 425,00 | 114 | 808,33 | 129 | 876,47 |
| 15 | 68,81 | 65 | 433,33 | 115 | 813,89 | 130 | 880,00 |
| 16 | 73,39 | 66 | 441,67 | | | | |
| 17 | 77,98 | 67 | 450,00 | | | | |
| 18 | 82,57 | 68 | 458,33 | | | | |
| 19 | 87,16 | 69 | 466,67 | | | | |
| 20 | 91,74 | 70 | 475,00 | | | | |
| 21 | 96,33 | 71 | 483,33 | | | | |
| 22 | 101,41 | 72 | 491,67 | | | | |
| 23 | 108,45 | 73 | 500,00 | | | | |
| 24 | 115,49 | 74 | 508,13 | | | | |
| 25 | 122,54 | 75 | 516,26 | | | | |
| 26 | 129,58 | 76 | 524,39 | | | | |
| 27 | 136,62 | 77 | 532,52 | | | | |
| 28 | 143,66 | 78 | 540,65 | | | | |
| 29 | 150,70 | 79 | 548,78 | | | | |
| 30 | 157,75 | 80 | 556,91 | | | | |
| 31 | 164,79 | 81 | 565,04 | | | | |
| 32 | 171,83 | 82 | 573,17 | | | | |
| 33 | 178,87 | 83 | 581,30 | | | | |
| 34 | 185,92 | 84 | 589,43 | | | | |
| 35 | 192,96 | 85 | 597,56 | | | | |
| 36 | 200,00 | 86 | 605,51 | | | | |
| 37 | 207,69 | 87 | 613,39 | | | | |
| 38 | 215,39 | 88 | 621,26 | | | | |
| 39 | 223,08 | 89 | 629,13 | | | | |
| 40 | 230,77 | 90 | 637,01 | | | | |
| 41 | 238,46 | 91 | 644,88 | | | | |
| 42 | 246,15 | 92 | 652,76 | | | | |
| 43 | 253,85 | 93 | 660,63 | | | | |
| 44 | 261,54 | 94 | 668,50 | | | | |
| 45 | 269,23 | 95 | 676,38 | | | | |
| 46 | 276,92 | 96 | 684,25 | | | | |
| 47 | 284,62 | 97 | 692,13 | | | | |
| 48 | 292,31 | 98 | 700,00 | | | | |
| 49 | 300,00 | 99 | 706,90 | | | | |
| 50 | 308,33 | 100 | 713,79 | | | | |

**DARIO ANGARITA**

**CAMION TANQUE**
**PLACA: NHR 613**

**CAPACIDAD NOMINAL TOTAL:**
**3385 Galones**

**No DE COMPARTIMIENTOS: 3**

Enero 20 2024

ASISTENCIA TECNICA MCG LTDA

# TABLA No: NHR 613 - COMPARTIMIENTO No 3

Certificado de Aforo No. CT 004 - 24
RES. MINIMINAS No 463

**MEDICIÓN Y VOLUMETRIA MCC SAS**
NIT. 901.426.596-5
Calle 151 No. 111 a 87

**COMPARTIMIENTO ID No: 3**

**PLACA ID No: NHR 613**

**ALTURA NOMINAL: 132,00 cm**

**CAPACIDAD NOMINAL: 870,00 Galones**

**ALTURA DE REFERENCIA: 140,00 cm**
BORDE SUPERIOR DE CUPULA

**UBICACIÓN REGLA DE MEDIDA:**
Parte trasera manhole

**METODO DE AFORO:** Fisico -volumetrico en
Normal operacion de llenado con calibradores (seraphines

| Equipo | Certificado |
|---|---|
| 50 Galones | MCG-21-241 |
| 100 Galones | MCG-21-242 |
| Regla Tajima | MD-0198-14 |

**METODO DE CALCULO TABLA:** Interpolacion Matematica

**NORMA : NTC 5628 (Homologada API 2554 - ASTM D 1409)**

**NOTA:** A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDIDO ESTE CERTIFICADO SOLO SE ACEPTARA RECLAMACIONES DURANTE LOS PRIMEROS 60 DÍAS CALENDARIO

NIT 901426596-5

Realizado por:
Tecnico ; Iván Calderón Millán
Tel: 3107546776

| ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones | ALTURA Cm | VOLUMEN Galones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,44 | 51 | 312,20 | 101 | 709,09 | 117 | 815,00 |
| 2 | 8,89 | 52 | 320,33 | 102 | 716,08 | 118 | 820,00 |
| 3 | 13,33 | 53 | 328,46 | 103 | 723,08 | 119 | 825,00 |
| 4 | 17,78 | 54 | 336,59 | 104 | 730,07 | 120 | 830,00 |
| 5 | 22,22 | 55 | 344,72 | 105 | 737,06 | 121 | 835,00 |
| 6 | 26,67 | 56 | 352,85 | 106 | 744,06 | 122 | 840,00 |
| 7 | 31,11 | 57 | 360,98 | 107 | 751,05 | 123 | 845,00 |
| 8 | 35,56 | 58 | 369,11 | 108 | 758,04 | 124 | 850,00 |
| 9 | 40,00 | 59 | 377,24 | 109 | 765,04 | 125 | 852,50 |
| 10 | 44,44 | 60 | 385,37 | 110 | 772,03 | 126 | 855,00 |
| 11 | 48,89 | 61 | 393,50 | 111 | 779,02 | 127 | 857,50 |
| 12 | 53,33 | 62 | 401,67 | 112 | 786,01 | 128 | 860,00 |
| 13 | 57,78 | 63 | 410,00 | 113 | 793,01 | 129 | 862,50 |
| 14 | 62,22 | 64 | 418,33 | 114 | 800,00 | 130 | 865,00 |
| 15 | 66,67 | 65 | 426,67 | 115 | 805,00 | 131 | 867,50 |
| 16 | 71,11 | 66 | 435,00 | 116 | 810,00 | 132 | 870,00 |
| 17 | 75,56 | 67 | 443,33 | | | | |
| 18 | 80,00 | 68 | 451,67 | | | | |
| 19 | 84,44 | 69 | 460,00 | | | | |
| 20 | 88,89 | 70 | 468,33 | | | | |
| 21 | 93,33 | 71 | 476,67 | | | | |
| 22 | 97,78 | 72 | 485,00 | | | | |
| 23 | 103,50 | 73 | 493,33 | | | | |
| 24 | 110,49 | 74 | 501,63 | | | | |
| 25 | 117,48 | 75 | 509,76 | | | | |
| 26 | 124,48 | 76 | 517,89 | | | | |
| 27 | 131,47 | 77 | 526,02 | | | | |
| 28 | 138,46 | 78 | 534,15 | | | | |
| 29 | 145,46 | 79 | 542,28 | | | | |
| 30 | 152,45 | 80 | 550,41 | | | | |
| 31 | 159,44 | 81 | 558,54 | | | | |
| 32 | 166,43 | 82 | 566,67 | | | | |
| 33 | 173,43 | 83 | 574,80 | | | | |
| 34 | 180,42 | 84 | 582,93 | | | | |
| 35 | 187,41 | 85 | 591,06 | | | | |
| 36 | 194,41 | 86 | 599,19 | | | | |
| 37 | 201,58 | 87 | 606,62 | | | | |
| 38 | 209,45 | 88 | 613,97 | | | | |
| 39 | 217,32 | 89 | 621,32 | | | | |
| 40 | 225,20 | 90 | 628,68 | | | | |
| 41 | 233,07 | 91 | 636,03 | | | | |
| 42 | 240,95 | 92 | 643,38 | | | | |
| 43 | 248,82 | 93 | 650,74 | | | | |
| 44 | 256,69 | 94 | 658,09 | | | | |
| 45 | 264,57 | 95 | 665,44 | | | | |
| 46 | 272,44 | 96 | 672,79 | | | | |
| 47 | 280,32 | 97 | 680,15 | | | | |
| 48 | 288,19 | 98 | 687,50 | | | | |
| 49 | 296,06 | 99 | 694,85 | | | | |
| 50 | 304,07 | 100 | 702,10 | | | | |

**DARIO ANGARITA**

**CAMION TANQUE**
**PLACA: NHR 613**

**CAPACIDAD NOMINAL TOTAL:**
**3385 Galones**

**No DE COMPARTIMIENTOS: 3**

Enero 20 2024

ARL | sura

Medellín, 22 de enero de 2024

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..**

## CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS LUIS RORIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 79718963 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/01/2024 **Fecha fin cobertura:** 21/02/2024

**INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE**

**HURTADO CLAVIJO JOHAN LEONARDO C1023004853**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
4492301 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE MERCANCÍAS TALES COMO: TRONCOS, GANADO, PRODUCTOS REFRIGERADOS, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUSO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA DE LÍQUIDOS (EJEMPLO: LA LECHE QUE SE RECOGE EN LAS GRANJAS, AGUA, ETCÉTERA). AUTOMÓVILES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN INCLUIR EL PROCESO DE ACOPIO NI ELIMINACIÓN. INCLUYE EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA (CAMIONES) CON CONDUCTOR.

**CLASE DE RIESGO:** 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000004 - TRANSPORTE

**CLASE:** 4 **PORCENTAJE:** 4.35% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
4492301 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE MERCANCÍAS TALES COMO: TRONCOS, GANADO, PRODUCTOS REFRIGERADOS, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUSO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA DE LÍQUIDOS (EJEMPLO: LA LECHE QUE SE RECOGE EN LAS GRANJAS, AGUA, ETCÉTERA). AUTOMÓVILES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN INCLUIR EL PROCESO DE ACOPIO NI ELIMINACIÓN. INCLUYE EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA (CAMIONES) CON CONDUCTOR.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
4492301 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. SE INCLUYE EL TRANSPORTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE MERCANCÍAS TALES COMO: TRONCOS, GANADO, PRODUCTOS REFRIGERADOS, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUSO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA DE LÍQUIDOS (EJEMPLO: LA LECHE QUE SE RECOGE EN LAS GRANJAS, AGUA, ETCÉTERA). AUTOMÓVILES, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN INCLUIR EL PROCESO DE ACOPIO NI ELIMINACIÓN. INCLUYE EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGA (CAMIONES) CON CONDUCTOR.

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 4492301

**CLASE DE RIESGO:** 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

**Su pago lo debe realizar con riesgo 4 (4.35 %), teniendo en cuenta lo siguiente:**

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C797189632402231197

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/01/2024 8:30 AM

Dirección IP: 181.61.129.181, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Escaneado con CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79718963

NOMBRE

JUAN CARLOS LUIS RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

11-07-1975

SANGRE-RH

AB+

FECHA DE EXPEDICION


13-03-2017

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

ITBOY - DIST TTO No. 10/VILLA DE LEYVA

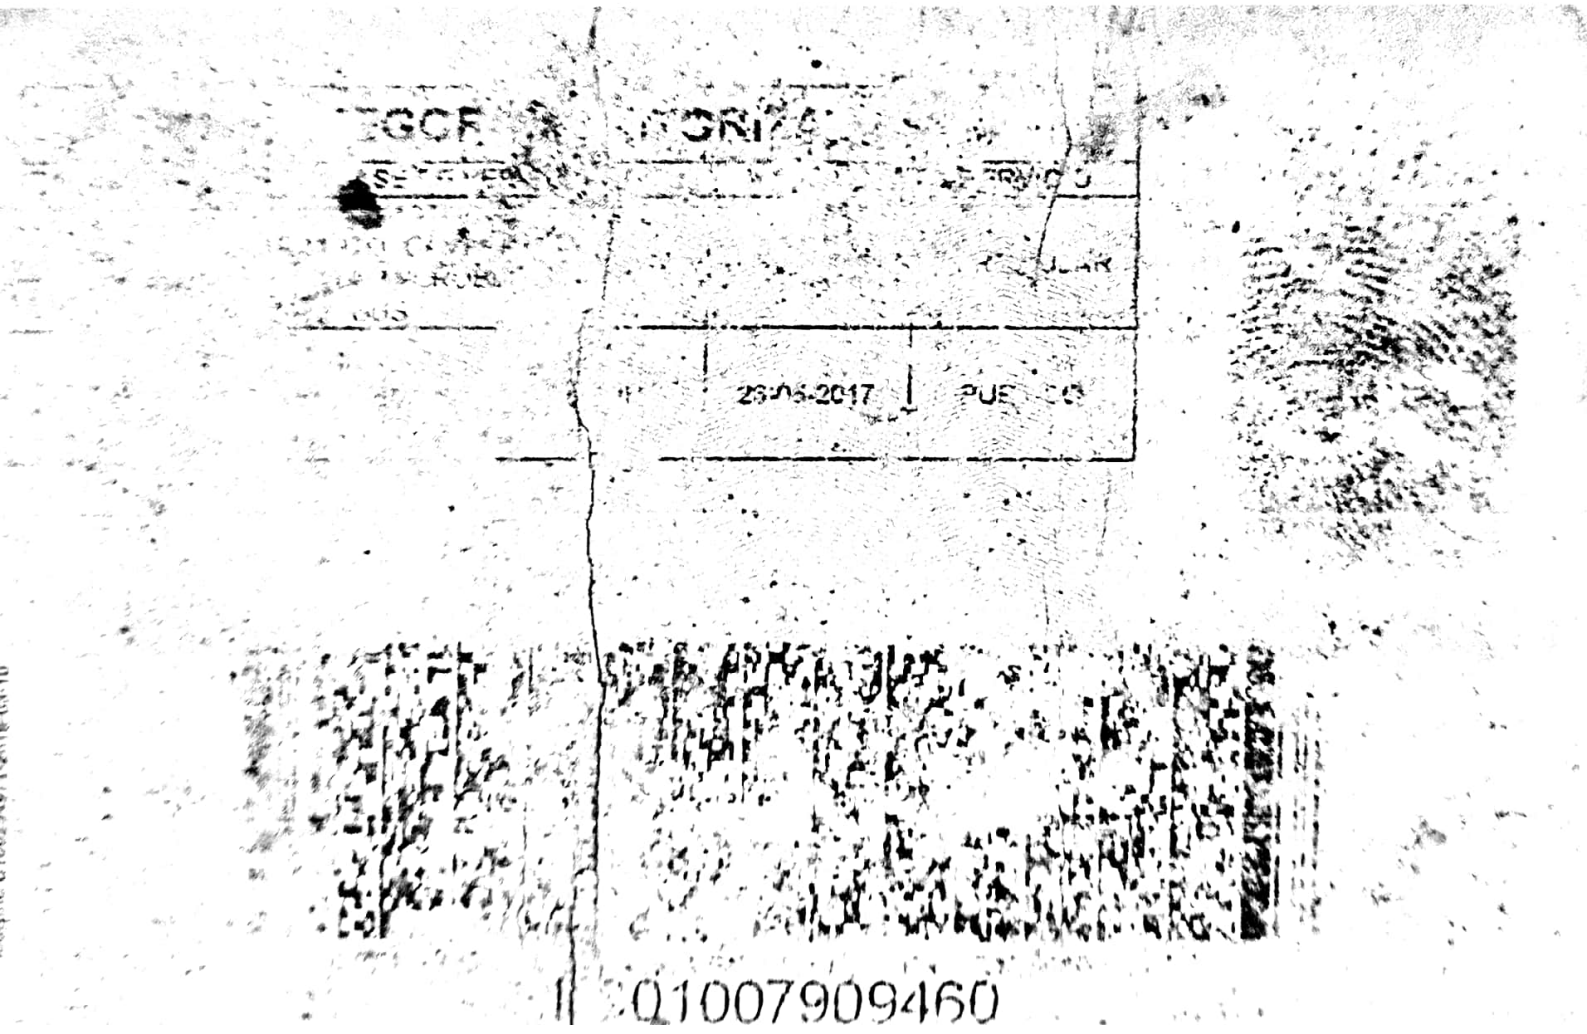



Escaneado con CamScanner

enlace operativo

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha Creación Informe** | 2024-01-22, 8:28:19 AM |
| **Fecha Pagada** | 2024-01-22, 08:37:57 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | enero de 2024 |
| **Empresa** | JUAN CARLOS LUIS RODRIGUEZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 79718963 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 798205852 |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 68404706 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Valor** | $ 427.100 |

| Nit | Código | Administradora | Afiliados | Valor sin Mora | Valor Mora | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 56.600 | $ 0 | $ 56.600 |
| | | **SubTotales:** | | $ 427.100 | $ 0 | |
| | | **Total a Pagar:** | | | | $ 427.100 |



Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340



Escaneado con CamScanner

# SOAT

**PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO**

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO MES DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA) |
|---|---|---|
| 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2024-12-04 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508005529207000 | INC752 | CARGA O MIXTO | PARTICULAR | 5919 | 1978 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | DODGE | VOLCO |

| LÍNEA VEHICULO |
|---|
| D 600 |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 362GM2U0157858 | DT856921 | | 10.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LUIS GONZALEZ, AURA JULIANA | 3208246677 | CC | 1054096095 | SACHICA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 15 | 13550 | 0 | LA VIRGINIA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $ 776000 | $ 403500 | $ 2100 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 1181600

Paola Mercado

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] / 701,68 [2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

**RECUERDE QUE:**

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo deba realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía asoguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:


En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, *modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se* corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la poliza y demas servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de



Escaneado con CamScanner

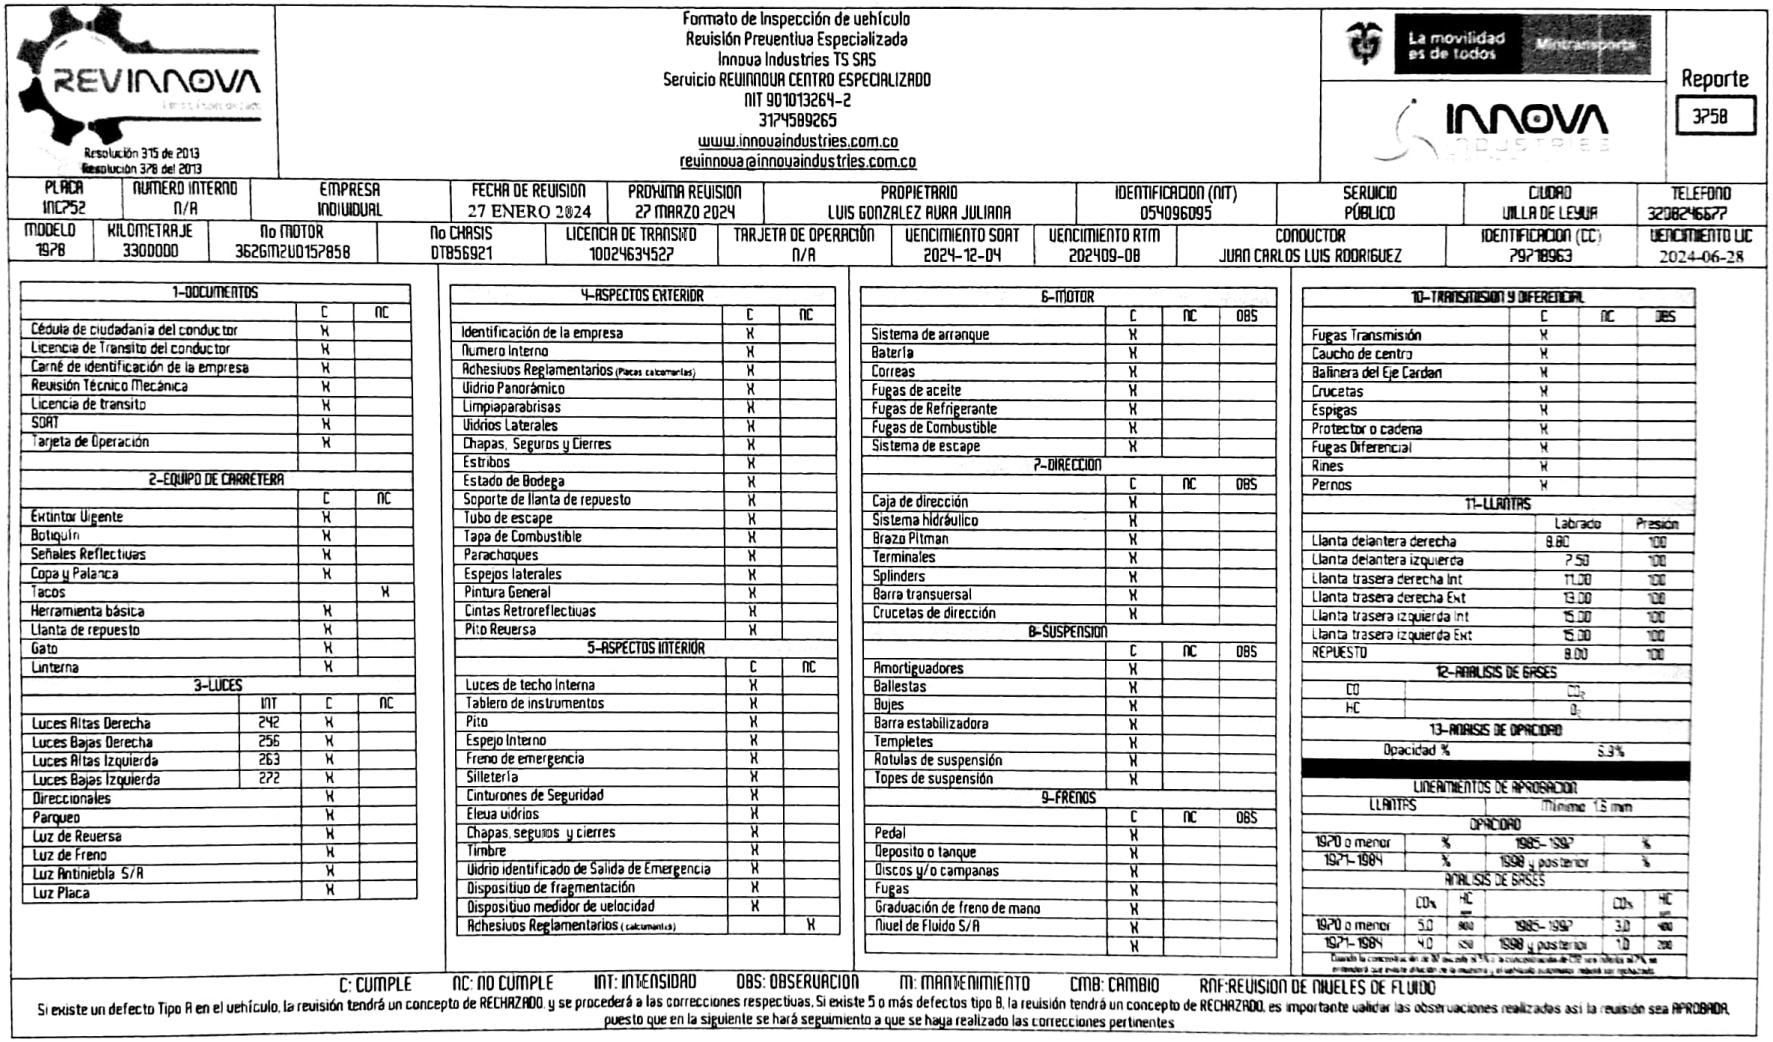

Formato de Inspección de uehículo
Revisión Preuentiua Especializada
Innoua Industries TS SAS
Servicio REUINNOUA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
3174589265
www.innouaindustries.com.co
reuinnoua@innouaindustries.com.co

Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

La movilidad es de todos — Mintransporte

Reporte 3758

| PLACA | NUMERO INTERNO | EMPRESA | FECHA DE REUISION | PROXIMA REUISION | PROPIETARIO | IDENTIFICACION (NIT) | SERUICIO | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC752 | N/A | INDIUIDUAL | 27 ENERO 2024 | 27 MARZO 2024 | LUIS GONZALEZ AURA JULIANA | 0540960095 | PÚBLICO | UILLA DE LEYUA | 3208246877 |

| MODELO | KILOMETRAJE | No MOTOR | No CHASIS | LICENCIA DE TRANSITO | TARJETA DE OPERACIÓN | UENCIMIENTO SOAT | UENCIMIENTO RTM | CONDUCTOR | IDENTIFICACION (CC) | UENCIMIENTO LIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3300000 | 362GM2U0157858 | DT856921 | 10024634527 | N/A | 2024-12-04 | 202409-08 | JUAN CARLOS LUIS RODRIGUEZ | 79718963 | 2024-06-28 |

**1-DOCUMENTOS**

| | C | NC |
|---|---|---|
| Cédula de ciudadanía del conductor | X | |
| Licencia de Transito del conductor | X | |
| Carné de identificación de la empresa | X | |
| Reuisión Técnico Mecánica | X | |
| Licencia de transito | X | |
| SOAT | X | |
| Tarjeta de Operación | X | |

**2-EQUIPO DE CARRETERA**

| | C | NC |
|---|---|---|
| Extintor Uigente | X | |
| Botiquín | X | |
| Señales Reflectiuas | X | |
| Copa y Palanca | X | |
| Tacos | | X |
| Herramienta básica | X | |
| Llanta de repuesto | X | |
| Gato | X | |
| Linterna | X | |

**3-LUCES**

| | INT | C | NC |
|---|---|---|---|
| Luces Altas Derecha | 242 | X | |
| Luces Bajas Derecha | 256 | X | |
| Luces Altas Izquierda | 263 | X | |
| Luces Bajas Izquierda | 272 | X | |
| Direccionales | | X | |
| Parqueo | | X | |
| Luz de Reuersa | | X | |
| Luz de Freno | | X | |
| Luz Antiniebla S/A | | X | |
| Luz Placa | | X | |

**4-ASPECTOS EXTERIOR**

| | C | NC |
|---|---|---|
| Identificación de la empresa | X | |
| Numero Interno | X | |
| Achesiuos Reglamentarios (Placas calcomanias) | X | |
| Uidrio Panorámico | X | |
| Limpiaparabrisas | X | |
| Uidrios Laterales | X | |
| Chapas, Seguros y Cierres | X | |
| Estribos | X | |
| Estado de Bodega | X | |
| Soporte de llanta de repuesto | X | |
| Tubo de escape | X | |
| Tapa de Combustible | X | |
| Parachoques | X | |
| Espejos laterales | X | |
| Pintura General | X | |
| Cintas Retroreflectiuas | X | |
| Pito Reuersa | X | |

**5-ASPECTOS INTERIOR**

| | C | NC |
|---|---|---|
| Luces de techo Interna | X | |
| Tablero de instrumentos | X | |
| Pito | X | |
| Espejo Interno | X | |
| Freno de emergencia | X | |
| Silleteria | X | |
| Cinturones de Seguridad | X | |
| Eleua uidrios | X | |
| Chapas, seguros y cierres | X | |
| Timbre | X | |
| Uidrio identificado de Salida de Emergencia | X | |
| Dispositiuo de fragmentación | X | |
| Dispositiuo medidor de uelocidad | X | |
| Achesiuos Reglamentarios (calcomanias) | | X |

**6-MOTOR**

| | C | NC | OBS |
|---|---|---|---|
| Sistema de arranque | X | | |
| Batería | X | | |
| Correas | X | | |
| Fugas de aceite | X | | |
| Fugas de Refrigerante | X | | |
| Fugas de Combustible | X | | |
| Sistema de escape | X | | |

**7-DIRECCION**

| | C | NC | OBS |
|---|---|---|---|
| Caja de dirección | X | | |
| Sistema hidráulico | X | | |
| Brazo Pitman | X | | |
| Terminales | X | | |
| Splinders | X | | |
| Barra transuersal | X | | |
| Crucetas de dirección | X | | |

**8-SUSPENSION**

| | C | NC | OBS |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | X | | |
| Ballestas | X | | |
| Bujes | X | | |
| Barra estabilizadora | X | | |
| Templetes | X | | |
| Rotulas de suspensión | X | | |
| Topes de suspensión | X | | |

**9-FRENOS**

| | C | NC | OBS |
|---|---|---|---|
| Pedal | X | | |
| Deposito o tanque | X | | |
| Discos y/o campanas | X | | |
| Fugas | X | | |
| Graduación de freno de mano | X | | |
| Nuel de Fluido S/A | X | | |
| | X | | |

**10-TRANSMISION Y DIFERENCIAL**

| | C | NC | OBS |
|---|---|---|---|
| Fugas Transmisión | X | | |
| Caucho de centro | X | | |
| Balinera del Eje Cardan | X | | |
| Crucetas | X | | |
| Espigas | X | | |
| Protector o cadena | X | | |
| Fugas Diferencial | X | | |
| Rines | X | | |
| Pernos | X | | |

**11-LLANTAS**

| | Labrado | Presión |
|---|---|---|
| Llanta delantera derecha | 8.80 | 100 |
| Llanta delantera izquierda | 7.50 | 100 |
| Llanta trasera derecha Int | 11.00 | 100 |
| Llanta trasera derecha Ext | 13.00 | 100 |
| Llanta trasera izquierda Int | 15.00 | 100 |
| Llanta trasera izquierda Ext | 15.00 | 100 |
| REPUESTO | 8.00 | 100 |

**12-ANALISIS DE GASES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CO | | $CO_2$ | |
| HC | | $O_2$ | |

**13-ANALISIS DE OPACIDAD**

| | |
|---|---|
| Opacidad % | 5.3% |

**LINEAMIENTOS DE APROBACION**

LLANTAS: Mínimo 1.6 mm

OPACIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1970 o menor | % | 1985- 1997 | % |
| 1971- 1984 | % | 1998 y posteriores | % |

ANALISIS DE GASES

| | CO% | HC ppm | | CO% | HC ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 o menor | 5.0 | 800 | 1985- 1997 | 3.0 | 400 |
| 1971- 1984 | 4.0 | 550 | 1998 y posteriores | 1.0 | 200 |

Cuando la concentración de CO sea inferior al 3.0%, y la concentración de CO2 sea inferior al 9%, se entenderá que existe dilución de la muestra, y el vehículo automotor deberá ser replaceado.

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERUACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF:REUISION DE NIUELES DE FLUIDO

Si existe un defecto Tipo A en el uehículo, la reuisión tendrá un concepto de RECHAZADO, y se procederá a las correcciones respectiuas. Si existe 5 o más defectos tipo B, la reuisión tendrá un concepto de RECHAZADO, es importante ualidar las obseruaciones realizadas así la reuisión sea APROBADA, puesto que en la siguiente se hará seguimiento a que se haya realizado las correcciones pertinentes



Escaneado con CamScanner

REVINNOVA
Resolución 375 de 2013
Resolución 378 del 2013

Formato de Inspección de vehículo
Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
Servicio REVINNOVA282603 CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
3174589265
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co

La movilidad es de todos · Mintransporte


INNOVA INDUSTRIES

Reporte 3758


| PLACA | NUMERO INTERNO | EMPRESA | FECHA DE REVISION | PROXIMA REVISION | PROPIETARIO | IDENTIFICACION (NIT) | SERVICIO | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC752 | N/A | INDIVIDUAL | 27 ENERO 2024 | 27 MARZO 2024 | LUIS GONZALEZ AURA JULIANA | 1054096095 | PÚBLICO | VILLA DE LEYVA | 3208246677 |

| CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION: | | | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: |
|---|---|---|---|
| | APROBADO | X | COMPLETAR KIT DE CARRETERA |
| | NO APROBADO | | |

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

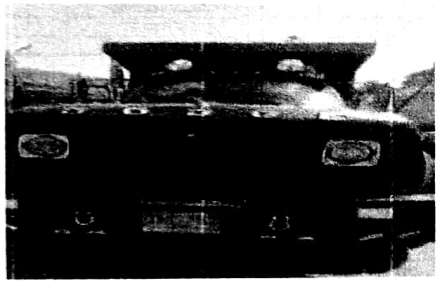





INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS



Escaneado con CamScanner

# SuAporte | Factura

**Fecha creación reporte:** 2024-01-18, 11:20:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 68358773

**Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2024

**Fecha límite de pago:** 2024-02-09

**PAGADA 18/01/2024**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PEDRO JULIO PARDO REYES | | | | |
| **Documento** | CC4232536 | **Dirección** | CL 9 #10 - 58 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3106731471 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | VILLA DE LEIVA | **Departamento** | BOYACA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 4232536 | PARDO REYES PEDRO JULIO | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 208.000 | EPS CAJACOPI | $ 1.300.000 | $ 162.500 | ARL SURA | $ 1.300.000 | $ 56.600 | NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 427.100 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes FSP | Aportes FSS | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE | TOTAL INTERESES | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 56.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 427.100 | $ 0 | $ 427.100 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Escaneado con CamScanner
