	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 3580 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

Contrato de Obra No. 3448 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI

Contrato de Interventoría No. 4315 de 202 **Interventoría:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 19/02/2024-29/02/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	NA
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	NA
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	NA
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		NA
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		NA
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	NA
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	NA
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		NA
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		NA

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JOSE RICARGO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 4315 DE 2023.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NRO. 2

PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 Localización del Proyecto 7

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 8

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 8

2.4 Características técnicas del proyecto. 9

3 INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS 11

3.1 Información general del contrato 11

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 14

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 15

3.3 Seguimiento de ítems no previstos 16

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16

4.1 Informe Semanal 16

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 16

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 16

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 17

4.5 Estado General del Tiempo 17

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 17

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 17

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad de Obra 17

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 17

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 17

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra 17

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 18

4.9.4 Actas de comité de obra 18

4.9.5 Acta de reunión 18

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.1 Información general del contrato 18

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 20
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 21
5.3 Informes especialistas y profesionales 21
5.4 Informe del Programa Anual de Caja 22
5.5 Informe Matriz de Riesgos 22
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 22
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 22
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 22
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 22
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 23
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 23
6.6 Otros documentos seguimiento mensual 23
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 23
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
8 ANEXOS 25

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización Especifica tramo de intervención - Vereda Alto Coembi 7
Ilustración 2. Localización tramo de intervención - Vereda La Esmeralda..... 7
Ilustración 3. Condiciones actuales de la vía, vereda Alto Coembi - Municipio de Puerto Asís 8
Ilustración 4. Condiciones actuales de la vía, vereda La Esmeralda - municipio de Orito .. 9
Ilustración 5. Detalle Placa Huella..... 9
Ilustración 6. Alcantarilla Tipo 10

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información General Convenio Solidario 3448 de 2023 12
Tabla 2. Información General Convenio Solidario 3580 de 2023 13
Tabla 3. Suspensiones y/o Ampliaciones 14
Tabla 4. Reinicio y prórrogas 14
Tabla 5. Información General del contrato de Interventoría 19
Tabla 6. Información de Ejecución del Contrato. 20
Tabla 7. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato de Interventoría 4315 de 2023 21

1 INTRODUCCIÓN

El gobierno Nacional por medio del Instituto Nacional de Vías – INVIAS implementó el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual tiene como objeto el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos vecinales, ancestrales y/o vías regionales, mediante la firma de convenios solidarios con los organismos de acción comunal -OAC; asi entonces el programa se proyecta a realizar la intervención de aproximadamente 33.102 kilómetros a nivel nacional mediante la firma de 1000 convenios celebrados entre el Instituto Nacional de Vías y los Organismos de acción comunal.

De acuerdo con lo anteriormente descrito, la Junta de Acción Comunal Alto Coembi celebra el convenio solidario Nro. 3448 de 2023, el cual tiene como objeto *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*. Así también, la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Esmeralda celebra el convenio solidario Nro. 3580 de 2023, cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",* los cuales se celebran con la finalidad de implementar el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

En aras de dar cumplimiento y control del normal desarrollo de los convenios solidarios, el Instituto Nacional De Vías – INVIAS, celebra con el ingeniero EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA el contrato de interventoría Nro. 4315 de 2023 cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y EL MUNICIPIO DE ORITO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*, con el fin de realizar seguimiento y control a los convenios solidarios Nro. 3448 y 3580 de 2023. El valor del contrato de interventoría es de SETENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($70.064.582,00).

Así entonces el presente documento plasma el avance de las actividades desarrolladas por las partes dentro de las obligaciones contractuales en los componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del contrato Nro. 4315 de 2023 contempla la interventoría a los siguientes convenios:

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3448 de 2023, cuyo objeto es, "*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*. con un valor de doscientos millones doscientos ochenta mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte ($200.280.682).

Descripción técnica: El proyecto se ejecutará en la vereda la Libertad del centro Poblado Alto Coembi, el proyecto comprende la construcción de 103,80 metros lineales de pavimento en placa huella con 5 metros de ancho, cimentada sobre una capa granular de 0.15 metros de espesor. Es importante aclarar que, en la etapa de estudios y diseños, los especialistas a cargo realizarán la implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, la cual definirá las condiciones finales de la placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3580, cuyo objeto es, "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" con un valor de doscientos un millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y un pesos m/cte ($201.869.271).

Descripción técnica: El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial que desde el municipio de Orito conduce a la inspección de Siberia en aproximadamente el kilómetro 7. Así entonces, se proyecta la construcción de 87 metros lineales de pavimento en placa huella de 5 metros de ancho, cimentada sobre una capa granular de 0,15 metros de espesor. Es importante aclarar que en la etapa de estudios y diseños, los especialistas a cargo realizaran la implementación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, la cual definirá las condiciones finales de la placa huella.

2.1 Localización del Proyecto

CONVENIO SOLIDARIO 3448 de 2023:

El proyecto se ejecuta en la zona rural del municipio de Puerto Asís, en la vereda Alto Coembi, la cual se ubica al occidente del municipio en el corredor vial La Libertad – La Carmelita vía 86568-1413 con código 86568-1895.



Ilustración 1. Localización Especifica tramo de intervención - Vereda Alto Coembi

CONVENIO SOLIDARIO 3580 DE 2023:

El proyecto se ejecuta en la zona rural del municipio de Orito, en la vereda la Esmeralda, teniendo como punto inicial el kilómetro 7 de la vía que del municipio de Orito conduce a la vereda Siberia.



Ilustración 2. Localización tramo de intervención - Vereda La Esmeralda

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La ejecución de los convenios solidarios 3480 y 3580 del 2023, en las veredas Alto Coembi y La Esmeralda, respectivamente beneficiaran de manera directa a la población que habita en estas zonas, debido que las vías actualmente se encuentran en afirmado en condiciones precarias. Lo anterior, genera aumento en los tiempos de desplazamiento, accidentes viales por el mal estado de la vía.

Por otro lado, se debe reconocer que los sectores rurales contribuyen de manera directa al sostenimiento de la económica urbana y rural, motivo por el cual es necesario que estas sean objeto de aperturas, ampliaciones y mantenimientos, ya que contribuyen de manera directa a mejorar la movilidad, reducen tiempos de desplazamiento, minimizan el riesgo de accidentes viales por el estado precario de la vía e incrementan y facilitan la comercialización de los productos propios de las zonas a intervenir.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Convenio Solidario 3448 de 2023, el sector a intervenir se encuentra en vía tipo Afirmado con un ancho promedio de 5m en estado regular. A continuación, se muestra el estado actual de la vía.



Ilustración 3. Condiciones actuales de la vía, vereda Alto Coembi - Municipio de Puerto Asís

Convenio Solidario 3580 de 2023, el sector a intervenir se encuentra en afirmado, con material de rodadura suelto que afecta la movilidad de la zona, ya que incrementa el riesgo de accidentes viales debido al mal estado de la vía.



Ilustración 4. Condiciones actuales de la vía, vereda La Esmeralda - municipio de Orito

2.4 Características técnicas del proyecto.

Convenio Solidario 3448 de 2023 – Vereda Alto Coembi

La entidad en el presupuesto inicial del convenio solidario Nro. 3448 de 2023, planteo el mejoramiento de 103,80 metros lineales de vía mediante placa huella, con los diseños establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales y el mejoramiento de una alcantarilla. En cuanto a la placa huella esta comprende la siguiente distribución: 2 huellas de concreto simple de 0.90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0.90 metros con espesor de 0.15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0.45 metros cada una, con espesor de 0.15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0.70 metros cada una, cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.




Ilustración 5. Detalle Placa Huella.
Fuente: Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales

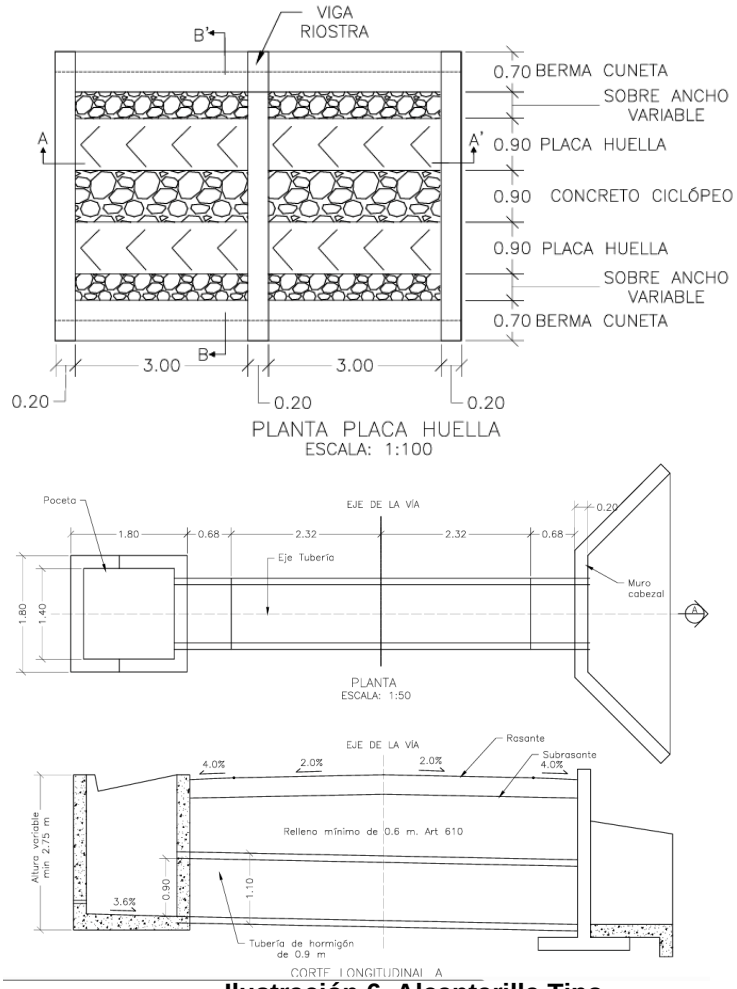


Ilustración 6. Alcantarilla Tipo
Fuente: Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales

Convenio Solidario 3580 DE 2023 – Vereda La Esmeralda

La entidad en el presupuesto inicial del convenio 3580 de 2023, planteo el mejoramiento de 87 metros lineales de vía mediante placa huella, con los diseños establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales y la construcción de tres alcantarillas de 36". En cuanto a la placa huella esta comprende la siguiente distribución: 2 huellas de concreto simple de 0.90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0.90 metros con espesor de 0.15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0.45 metros cada una, con espesor de 0.15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0.70 metros cada una, cimentada sobre

una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor. Tal como se detalla en la ilustración 5.

3 INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales de los convenios solidarios 3448 de 2023 y 3580 de 2023

- **Convenio solidario Nro. 3448 de 2023**

Convenio solidario Nro. 3448 de 2023	
Objeto:	*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*
Nombre del Contratista:	Junta de acción comunal de alto Coembi
Representante Legal:	JULIO MESA RIVERA
Nit:	800.199.583-9
Número del Convenio:	3448 de 2023
Fecha de suscripción del contrato:	19 de septiembre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.280.692)
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Inicio:	21 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023.
Fecha de Suspensión 1	27 de diciembre de 2023
Fecha de Ampliación 1 a la suspensión 1	08 de enero de 2024

Fecha de reinicio 1.	19 de febrero de 2024
Fecha de Prorroga 1.	22 de febrero de 2024
Fecha de terminación 2.	30 de abril de 2024

Tabla 1. Información General Convenio Solidario 3448 de 2023

No obstante, durante el primer mes de ejecución comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 hasta el 28 de diciembre de 2024, de manera conjunta con la OAC se realizaron algunos Gastos Administrativos, los cuales corresponden a póliza y estudios y diseños:

Nro. de cheque	Valor	Observaciones
3853032 del 01/12/2023	12’000.000	Abono para compra de dotación, póliza y madera
3853033 del 06/12/2023	24’030.000	Abono a ferretería
3853034 del 13/12/2023	11’700.000	Abono a material subbase (incluye transporte)
3853035 del 14/12/2023	5’300.000	Diseño geométrico, estudio de suelo, diseños de mezclas, rediseño de placa huella.

Por tanto, durante los días de ejecución del mes de febrero comprendidos entre el 19 de febrero al 29 de febrero de 2024, la interventoría a realizado la revisión documental de personal mínimo y revisión de estudios y diseños. Siendo esta información subsanada de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría y remitida a la supervisión del contrato mediante el comunicado E.M.P-4315-OF-039 del 26 de febrero para los fines pertinentes.

- **Convenio solidario Nro. 3580 de 2023**

Convenio solidario Nro. 3580 de 2023	
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
Nombre del Contratista:	Junta de acción comunal de la vereda la Esmeralda
Representante Legal:	ALBA SARA HOYOS JOAQUI
Nit:	800.232.067-0
Número del Convenio:	3580 de 2023

Fecha de suscripción del contrato:	27 de septiembre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($201.869.271)
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Inicio:	21 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023.
Fecha de Suspensión 1	27 de diciembre de 2023
Fecha de Ampliación 1 a la suspensión 1	08 de enero de 2024
Fecha de reinicio 1.	19 de febrero de 2024
Fecha de Prorroga 1.	22 de febrero de 2024
Fecha de terminación 2.	30 de abril de 2024

Tabla 2. Información General Convenio Solidario 3580 de 2023

Durante el primer mes de ejecución comprendido entre el 21 de noviembre al 28 de diciembre de 2023, con la OAC de La Esmeralda se realizaron netamente Gastos Administrativos, los cuales corresponden a póliza y estudios y diseños: A continuación, se relacionan los pagos realizados

Nro. de cheque	Valor	Observaciones
001 del 21/12/2023	3’106.600	Pago Estudio de suelos, topografía y Póliza

Durante los días de ejecución del mes de febrero comprendidos entre el 19 al 29 de febrero de 2024, la interventoría y la supervisión del contrato aprobaron y aceptaron los estudios y diseños correspondiente a:

- Levantamiento topográfico
- Estudio de Suelos
- Diseño Geométrico

Actualmente la OAC se encuentra adelantando el diseño de mezcla, cotizaciones de materiales y revisión de hojas de vida para el personal a vincularse en el desarrollo de la palca huella.

En cuanto a los salarios del personal mínimo del convenio (Ingeniero residente, contador y maestro de obra) no ha sido posible realizar su vinculación y posterior pago, debido que a

la fecha estos no cumple con los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas del convenio.

Es preciso aclarar que los dos convenios en ejecución dieron inicio el 21 de noviembre de 2023, no obstante a la fecha no ha sido posible dar inicio a las actividades de construcción de placa huella, debido que el proyecto contempla la elaboración de Estudios y diseños para realizar la adaptación de la Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales, los cuales solo hasta el presente mes de ejecución se dio la respectiva aprobación pro parte de la interventoría.

Durante las visitas de campo realizadas por la interventoría, se determina mediante inspección visual que se requiere el mejoramiento de cuatro alcantarillas en las veredas, una (01) en la vereda Alto Coembi y tres (03) en la Vereda La Esmeralda.

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, se presentan las siguientes anotaciones, para los convenios 3848 y 3550 de 2023.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	-	27/12/2023	27/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
	1	08/01/2024	15/01/2024	19/02/2024	19/02/2024

Tabla 3. Suspensiones y/o Ampliaciones

Acta de Reinicio 1	19/02/2024
Acta de Prorroga 1	22/02/2024
Fecha de terminación 2	30/04/2024

Tabla 4. Reinicio y prórrogas

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

CONVENIO SOLIDARIO 3448 de 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Para el periodo comprendido entre 19 de febrero hasta 29 de febrero de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

Semana Nro. 06: del 19 de febrero hasta 25 de febrero

- Se realizó el reinicio de las actividades de fecha 19 de febrero de 2024 y se celebró el acta de prorroga Nro. 01, quedando como nueva fecha de terminación del convenio el 30 de abril de 2024.
- Se realiza las subsanaciones del levantamiento topográfico.
- Revisión del estado general del proyecto, metas y alcance del mismo.

Semana Nro. 07: del 26 de febrero hasta 29 de febrero

- Se realiza las subsanaciones del diseño geométrico.
- Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros.

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3580

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Semana Nro. 06: del 19 de febrero hasta 25 de febrero

- Se realizó el reinicio de las actividades de fecha 19 de febrero de 2024 y se celebró el acta de prorroga Nro. 01, quedando como nueva fecha de terminación del convenio el 30 de abril de 2024.
- Se realiza las subsanaciones del estudio de suelos.
- Revisión del estado general del proyecto, metas y alcance del mismo.

Semana Nro. 07: del 26 de febrero hasta 29 de febrero

- Recepción de hojas de vida de la mano de obra a vincularse en el desarrollo de las actividades constructivas del convenio.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

La interventoría desde el inicio de sus actividades a realizado el acompañamiento, administrativo, técnico y financiero al desarrollo de los convenios, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por la presente interventoría.

- Revisión de hojas de vida del personal mínimo de los convenios 3448 y 3580 de 2023.
- Aprobación de hojas de vida del personal mínimo de los convenios 3448 y 3580 de 2023.
- Aprobación de estudios y diseños desarrollados en el marco de los convenios 3448 y 3580 de 2023.
- Se proyecta para el siguiente mes de ejecución iniciar el mejoramiento de los tramos cuales, mediante placa huella.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Los informes semanales realizados durante el presente mes de ejecución se anexan al presente informe; en cumplimiento al manual de Interventoría del INVIAS se realizan con el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. (ANEXO 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En cumplimiento al manual de Interventoría del INVIAS para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, no obstante para el presente mes de ejecución no aplica el diligenciamiento del presente formato, debido que el proyecto aún se entra en etapa de estudios y diseños.

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Durante los días de ejecución del mes no febrero, no se ha obtenido la aceptación por parte de la supervisión del contrato de las hojas de vida presentadas por las juntas de acción

comunal de las veredas Alto Coembi y La Esmeralda debido. No obstante, una vez se realice la validación de las hojas de vida por parte de la supervisión del contrato, se realizará el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 en cumplimiento al Manual de Interventoría del INVIAS.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se detalla el avance financiero y presupuestal de los convenios solidarios. (ANEXO 2)

4.5 Estado General del Tiempo

Para el presente informe, el cual contiene las actividades ejecutadas durante los días de ejecución del mes de febrero no se realiza el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 contenido en el Manual de Interventoría del INVIAS, toda vez que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y diseños y adaptación de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente informe, el cual contiene las actividades ejecutadas durante los días de ejecución del mes de febrero no se han realizado laboratorios para los convenios Nro. 3448 y 3580 de 2023, toda vez que los convenios aun se encuentran en etapa de estudios y diseños. Así entonces, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 no aplica para el presente periodo de ejecución.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Las garantías que amparan los convenios solidarios Nro. 3448 y 3580 de 2023, se detallan en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto al presente informe.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad de Obra

No Aplica para el desarrollo de los convenios.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica para el desarrollo de los convenios.

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

No Aplica para el desarrollo de los convenios.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

Para el programa de inversión de los convenios se deben diligenciar los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2, no obstante no aplica para el presente informe.

4.9.4 Actas de comité de obra

Durante los días de ejecución del mes de febrero no se celebraron actas de comités técnicos. No obstante, cuando se presenten se realizará el debido diligenciamiento del formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 contenido en el Manual de Interventoría del INVIAS.

4.9.5 Acta de reunión

Durante los días de ejecución del mes de febrero no se han realizado actas de reunión con las OAC de las veredas Alto Coembi y la Esmeralda, sin embargo una vez estas se realicen en la ejecución del contrato, se procederá a realizar el diligenciamiento del formato MEPI-MN-IN-14-FR-2.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos del contrato de interventoría Nro. 4315 de 2023.

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Nombre del Contratista:	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Representante Legal:	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
Nit.	18104108-1
Número del contrato:	4315 DE 2023.
Fecha de suscripción del contrato:	09 noviembre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	Setenta millones sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos ($70.064.582) M/CTE
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES.
Fecha de Inicio:	20 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2023

Fecha de suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Ampliación a la suspensión:	08 de enero de 2024
Fecha de reinicio 1:	19 de febrero de 2024
Fecha de terminación 2:	30 de abril de 2024.

Tabla 5. Información General del contrato de Interventoría

Durante el segundo mes de ejecución se solicito el cambio de los siguientes profesionales

Jaime Médicis	Ingeniero Residente de Interventoría
Dayana Erazo	Profesional Social
Inspector SST	Mariana Arcos

Por los que se relacionan en la siguiente tabla:

ANDREA NATHALY BURBANO	Ingeniero Residente de Interventoría
JINETH ALEXANDRA SOLARTE	Inspector SST
GINNA NATALIA BELALCAZAR	Profesional Social

A continuación, se relacionan los pagos de salario del personal vinculado al desarrollo del contrato de interventoría Nro. 4315 de 2023, el cual se realiza desde el día 19 de febrero de 2024 hasta el día 29 de febrero de 2024:

CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)		PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) ((2)+(3))*(4) = (5)	EJECUCIÓN MES 2 (19 FEBRERO – 29 DE FEBRERO DE 2024)
PERSONAL PROFESIONAL					**Condiciones Finales**	**MES 1**
Director de Interventoría	$ 5.800.000	Sebastián Mora		0,60	$ 3.480.000	**$ 1.740.000,00**
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.800.000	Andrea Burbano		2,00	$ 5.600.000	**$ 1.400.000,00**
Profesional Ambiental	$ 3.000.000	Diego Solarte		0,25	$ 750.000	**$ 375.000,00**
Profesional Social	$ 3.000.000	Ginna Belalcazar		0,25	$ 750.000	**$ 375.000,00**
PERSONAL TÉCNICO						
Inspector	$ 1.350.000	Leonardo Charry		4,00	$ 5.400.000	**$ 675.000,00**
Inspector	$ 1.350.000	Romario Villegas				**$ 675.000,00**
Inspector SST	$ 1.400.000	Jineth Solarte		2,00	$ 2.800.000	**$ 700.000,00**
Especialista en Pavimentos y/o vías	$ 5.000.000	Sebastián Mora		N/A	$ 2.500.000	**$ 2.500.000,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)					**$ 21.280.000,00**	**$ 8.440.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (6)					2,36	**2,36**

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 50.220.800,00**	**$ 19.918.400,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS				**Condiciones Finales**	
Viáticos Director y Especialistas	Día	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00	-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
Motocicletas (150CC o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 600.000,00	6,00	$ 3.600.000,00	$ 900.000,00
Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	-
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00	-
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00	$ 400.000,00
OTROS COSTOS					
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	Según comprobante por mes	$ 200.000,00	0,00	$ -	-
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	Según comprobante por mes	$ 100.000,00	2,00	$ 200.000,00	$ 100.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 150.000,00	2,00	$ 300.000,00	$ 150.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 38.500,00	2,00	$ 77.000,00	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$ 8.657.000,00**	**$ 1.550.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 58.877.800,00**	**$ 21.468.400,00**
IVA = 19% * (C) = (E)				**$ 11.186.782,00**	**$ 4.078.996,00**
COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 70.064.582,00**	**$ 25.547.396,00**

Tabla 6. Información de Ejecución del Contrato.

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan anotaciones:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	-	27/12/2023	27/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
	1	08/01/2024	15/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
REINICIOS					

ACTA DE REINICIO		FECHA			
1		19/02/2024			
PRORROGA					
ACTA DE PRORROGA		**FECHA**	**PLAZO**		**FECHA DE TERMINACIÓN**
1	-	22/02/2024	38 DÍAS		30/04/2024

Tabla 7. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato de Interventoría 4315 de 2023

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se detallan las actividades realizadas por la interventoría durante los días de ejecución del mes de febrero comprendidos entre el 19 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024:

Durante el periodo del 19 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Acompañamiento a las OAC en las diferentes actividades de ejecución de los convenios.
- Requerir, revisar y verificar las hojas de vida del personal mínimo a participar en los convenios.
- Elaboración de informes semanales.
- Requerir información técnica de los convenios a las OAC.
- Presentar el personal mínimo para el desarrollo de la interventoría a la supervisión.
- Aprobar los estudios y diseños presentados por las OAC.
- Requerir a contratistas el presupuesto y el cronograma de trabajo.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante le periodo comprendido entre el 19 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024, la OAC de la Vereda Alto Coembi, presento los siguientes estudios:

- Diseño de Mezcla 2500 PSI
- Diseño de Mezcla 3000 PSI
- Estudio de Suelos
- Diseño Geométrico
- Diseño de Pavimento.
- Levantamiento topográfico

Durante le periodo comprendido entre el 19 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024, la OAC de la Vereda La Esmeralda presento los siguientes estudios:

- Estudio de Suelos
- Diseño Geométrico
- Levantamiento topográfico

Después de subsanar las observaciones realizadas desde la interventoría, los estudios y diseños elaborados en el marco de los convenios solidarios, fueron de aprobación por parte de la interventoría, inclusive a la fecha se tiene la aceptación de los estudios y diseñados presentados por la OAC La esmeralda.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja

No aplica para este contrato de interventoría.

5.5 Informe Matriz de Riesgos

No aplica para este contrato de interventoría.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

No Aplica el uso del aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina **CIFRA**.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

El control de equipos y vehículos se realiza mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 perteneciente al Manual de Interventoría del INVIAS.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

El seguimiento y control del personal vinculado al contrato de interventoría se realiza mediante el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

El detalle financiero y presupuestal del presente contrato de interventoría se realiza mediante el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

El detalle de las garantías contractuales del presente contrato de interventoría puede detallarse en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contrato de Interventoría no contempla anticipo para el desarrollo de sus actividades.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante los días de ejecución del mes de Febrero la OAC de la vereda Alto Coembi realizó las subsanaciones respectivas de los estudios y diseños requeridos para la adaptación de la Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales, logrando la aprobación por parte de la presente interventoría.

Durante los días de ejecución del mes de Febrero la OAC de la vereda Alto Coembi realizó las subsanaciones respectivas de los estudios y diseños requeridos para la adaptación de la Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras viales, logrando la aprobación por parte de la presente interventoría y la respectiva aceptación por parte de la supervisión.

Durante el presente mes de ejecución se celebra la prorroga Nro. 01 a los convenios solidarios y al presente contrato de interventoría, quedando como fecha de terminación nro., 02 el día 30 de abril de 2024.

8 ANEXOS

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INFORMES SEMANALES

VEREDA ALTO COEMBI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL""

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 6 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ▫ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN RAMON FRANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ALTO COEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

En la Vereda Alto Coembi, se proyecta la construcción de 103 Metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EN EL PRESENTE CONTRATO SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA CON UNA LONGITUD DE 103 METROS LINEALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO, TAMBIEN SE VA HA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TRES ALCANTARILLAS CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO COEMBI

CONVENIO No.	3448 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.280.692,00
FECHA DE INICIO:	21/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.280.692,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4315 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 70.064.582,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 70.064.582,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.280.692		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 200.280.692		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 70.064.582		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 70.064.582		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.280.692,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.030.000,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.677.430,33	17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.773.698,00	0,1823132
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.677.430,33	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.677.430,33	17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SEMANA DEL 19 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO 2024

Durante esta semana, se realizo la gestion y organizacion de los documentos que hasta el momento se han establecido, con la colaboracion de la presidenta de la Junta y el contador, para que de esta manera se tenga soportes de cada proceso realizado
Documentos:
-Se realizó el reinicio de las actividades de fecha 19 de febrero de 2024 y se celebró el acta de prorroga Nro. 01, quedando como nueva fecha de terminación del convenio el 30 de abril de 2024.
-Se realiza las subsanaciones del levantamiento topográfico.
-Revisión del estado general del proyecto, metas y alcance del mismo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A DESPLEGAR: Estar presentes en cada fase del contrato, supervisando y verificando la correcta ejecución de las actividades pactadas. Mantener una comunicación fluida y efectiva con los equipos operativos y técnicos para resolver cualquier inconveniente de manera oportuna. Asegurar el seguimiento de las mejores prácticas y recomendaciones específicas para cada área de trabajo involucrada en el contrato. Documentar cuidadosamente cada hallazgo y observación, facilitando así la retroalimentación constructiva y la toma de decisiones informadas.	FIRMA NOMBRE: FABIAN ESTEBAN MORA ARCOS Matrícula Profesional No.: 19202-339296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL""

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 7 del 26/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI ▫ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN RAMON FRANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ALTO COEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

En la Vereda Alto Coembi, se proyecta la construcción de 103 Metros lineales de placa huella

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EN EL PRESENTE CONTRATO SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA CON UNA LONGITUD DE 103 METROS LINEALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO, TAMBIEN SE VA HA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TRES ALCANTARILLAS CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO COEMBI

CONVENIO No.	3448 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.280.692,00
FECHA DE INICIO:	21/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.280.692,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4315 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 70.064.582,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 70.064.582,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.280.692		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 200.280.692		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 70.064.582		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 70.064.582		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.280.692,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.030.000,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.677.430,33	17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.547.396,00	36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.677.430,33	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.773.698,00	18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

UBICACIÓN: ..... PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

..... LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SEMANA DEL 19 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024

Durante esta semana, se realizo la gestion y organizacion de los documentos que hasta el momento se han establecido, con la colaboracion de la presidenta de la Junta y el contador, para que de esta manera se tenga soportes de cada proceso realizado:
-Se realiza las subsanaciones del diseño geométrico.
-Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A DESPLEGAR: Estar presentes en cada fase del contrato, supervisando y verificando la correcta ejecución de las actividades pactadas. Mantener una comunicación fluida y efectiva con los equipos operativos y técnicos para resolver cualquier inconveniente de manera oportuna. Asegurar el seguimiento de las mejores prácticas y recomendaciones específicas para cada área de trabajo involucrada en el contrato. Documentar cuidadosamente cada hallazgo y observación, facilitando así la retroalimentación constructiva y la toma de decisiones informadas.	FIRMA NOMBRE: FABIAN ESTEBAN MORA ARCOS Matrícula Profesional No.: 19202-339296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORMES SEMANALES

VEREDA LA ESMERALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL""

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 6 del 19/02/2024 al 25/02/2024 Último Informe Semanal SI ▫ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN RAMON FRANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMPERALDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EN EL PRESENTE CONTRATO SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA CON UNA LONGITUD DE 87 METROS LINEALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO, TAMBIEN SE VA HA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TRES ALCANTARILLAS CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO No.	3580 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.869.271,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.869.271,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4315 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 70.064.582,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 70.064.582,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.869.271	$ 201.869.271		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.869.271	$ 201.869.271		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 70.064.582	$ 70.064.582		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 70.064.582	$ 70.064.582		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.869.271,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.106.600,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.677.430,33	16,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.773.698,00	18,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.677.430,33	16,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.773.698,00	18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ..... Avance o Atraso Físico %: .....

Meta Física Ejecutada %: .....

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SEMANA DEL 19 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO DE 2024

Durante esta semana, se realizo la gestion y organizacion de los documentos que hasta el momento se han establecido, con la colaboracion de la presidenta de la Junta y el contador, para que de esta manera se tenga soportes de cada proceso realizado
Documentos:
-Se realizó el reinicio de las actividades de fecha 19 de febrero de 2024 y se celebró el acta de prorroga Nro. 01, quedando como nueva fecha de terminación del convenio el 30 de abril de 2024.
-Se realiza las subsanaciones del estudio de suelos.
-Revisión del estado general del proyecto, metas y alcance del mismo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

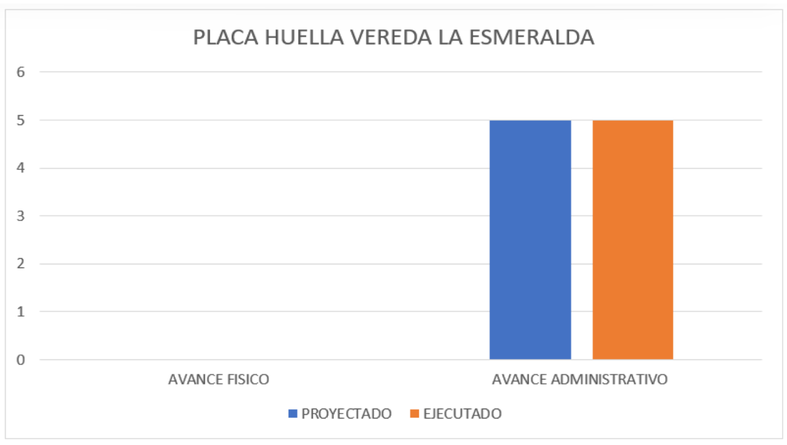

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A DESPLEGAR: Estar presentes en cada fase del contrato, supervisando y verificando la correcta ejecución de las actividades pactadas. Mantener una comunicación fluida y efectiva con los equipos operativos y técnicos para resolver cualquier inconveniente de manera oportuna. Asegurar el seguimiento de las mejores prácticas y recomendaciones específicas para cada área de trabajo involucrada en el contrato. Documentar cuidadosamente cada hallazgo y observación, facilitando así la retroalimentación constructiva y la toma de decisiones informadas.	FIRMA NOMBRE: FABIAN ESTEBAN MORA ARCOS Matrícula Profesional No.: 19202-339296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL""

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 7 del 25/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal SI ▫ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN RAMON FRANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMPERALDA EN EL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

EN EL PRESENTE CONTRATO SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA CON UNA LONGITUD DE 87 METROS LINEALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO, TAMBIEN SE VA HA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TRES ALCANTARILLAS CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO No.	3580 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.869.271,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.869.271,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4315 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 70.064.582,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 70.064.582,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.869.271	$ 201.869.271		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.869.271	$ 201.869.271		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 70.064.582	$ 70.064.582		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 70.064.582	$ 70.064.582		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.869.271,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.106.600,00	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.354.860,67	16,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.547.396,00	36,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.354.860,67	16,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.547.396,00	36,5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 19 FEBRERO - 29 FEBRERO

VALOR FACTURA: $ 25.547.396,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SEMANA DEL 25 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Durante esta semana, se realizo la gestion y organizacion de los documentos que hasta el momento se han establecido, con la colaboracion de la presidenta de la Junta y el contador, para que de esta manera se tenga soportes de cada proceso realizado
Documentos:
-Se realizó el reinicio de las actividades de fecha 19 de febrero de 2024 y se celebró el acta de prorroga Nro. 01, quedando como nueva fecha de terminación del convenio el 30 de abril de 2024.
-Se realiza las subsanaciones del estudio de suelos.
-Revisión del estado general del proyecto, metas y alcance del mismo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

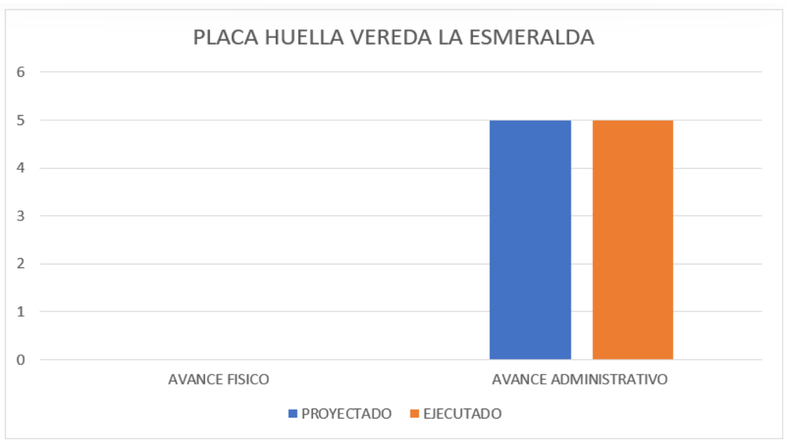

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A DESPLEGAR: Estar presentes en cada fase del contrato, supervisando y verificando la correcta ejecución de las actividades pactadas. Mantener una comunicación fluida y efectiva con los equipos operativos y técnicos para resolver cualquier inconveniente de manera oportuna. Asegurar el seguimiento de las mejores prácticas y recomendaciones específicas para cada área de trabajo involucrada en el contrato. Documentar cuidadosamente cada hallazgo y observación, facilitando así la retroalimentación constructiva y la toma de decisiones informadas.	FIRMA NOMBRE: FABIAN ESTEBAN MORA ARCOS Matrícula Profesional No.: 19202-339296

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

VEREDA ALTO COEMBI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Dirección Territorial Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 3448 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI

MES INFORME MENSUAL: 1

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4315 de 2023

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	150829	Mejoramiento , Mantenimiento y Rehabilitación De	10	Nación		$ 199.280.692	
		N/A	N/A	Propios		$ 1.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.280.692,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OTROS COSTOS + ABONO A MATERIALES	$ 12.000.000		**$ 12.000.000**
ABONO A MATERIALES DE OBRA	$ 24.030.000		**$ 24.030.000**
ABONO A MATERIALES DE OBRA	$ 11.700.000		**$ 11.700.000**
PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.300.000		**$ 5.300.000**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 19202-339296 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

VEREDA LA ESMERALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Dirección Territorial Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 3580 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

MES INFORME MENSUAL: 1

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4315 de 2023

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	150823	Mejoramiento , Mantenimiento y Rehabilitación De	10	Nación		$ 200.869.271	
		N/A	N/A	Propios		$ 1.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201.869.271,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Otros Costos	$ 2.516.346	$ 590.254	$ 3.106.600
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 19202-339296 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

VEREDA ALTO COEMBI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 3448 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTO COEMBI

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 de Noviembre de 2023

PLAZO INICIAL: 2 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.280.692,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.280.692,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5.300.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4315 DE 2023 **INTERVENTOR:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.056.138,40	10	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.014.034,60	19	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.084.207,60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283695

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,0	19	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069135 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A la fecha se han realizado varios requerimientos a la OAC Alto Coembi, para que realice la actualización de las polizas en ocasión a la suscripcion de la suspensión, reinicio y prorroga, no obstante a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la OAC.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-339296 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

VEREDA LA ESMERALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 3580 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21 de Noviembre de 2023

PLAZO INICIAL: 2 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.869.271,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.869.271,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3.106.600,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4315 DE 2023 **INTERVENTOR:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.373.854,20	27	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.093.463,55	27	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.560.781,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100286147

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,0	27	9	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069871 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A la fecha se han realizado varios requerimientos a la OAC Alto Coembi, para que realice la actualización de las polizas en ocasión a la suscripcion de la suspensión, reinicio y prorroga, no obstante a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la OAC.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-339296 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4315 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

CONTRATO DE OBRA No. 3448 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ALTO COEMBI

CONTRATO DE OBRA No. 3580 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA UWQ39G	MOTOCICLETA GRIS 124 CC																			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA PGT66E	MOTOCICLETA NEGRO 114 CC																			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA NNO15D	MOTOCICLETA NEGRO 124 CC																			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 19202-339296 CAU

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONVENIO No: 3448 DE 2023

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Alto Coembi

CONVENIO No: 3580 DE 2023

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal de la Vereda la Esmeralda

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MES 2 (19 DE FEB. - 29 DE FEB.)

PROYECTO: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y EL MUNICIPIO DE ORITO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4315 de 2023

INTERVENTOR: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANDREA NATHALY BURBANO	1124856271	Residente Interventoría	$ 2.800.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EIVI MANUEL PIPICANO	############	$ 5.900	I	NUEPA EPS	9463615376	$ 44.800	COLPENSIONES	9463615376	$ 179.200	$ 44.800			Dependientes
2	LEONARDO CHARRY	69007218	Inspector	$ 1.350.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EIVI MANUEL PIPICANO	$ 540.000,00	$ 2.900	I	NUEVA EPS	9463615376	$ 21.600	PORVENIR	9463615376	$ 86.400	$ 21.600			Dependientes
3	ROMARIO VILLEGAS	7714318	Inspector	$ 1.350.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EIVI MANUEL PIPICANO	$ 540.000,0	$ 2.900	I	SALUD TOTAL	9463615376	$ 21.600	PROTECCIÓN	9463615376	$ 86.400	$ 21.600			Dependientes
4	JINETH ALEXANDRA SOLARTE	69008988	Inspector SST	$ 1.400.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EIVI MANUEL PIPICANO	$ 560.000,0	$ 3.000	I	EMSSANAR	9463615376	$ 22.400	COLPENSIONES	9463615376	$ 89.600	$ 22.400			Dependientes
6	SEBASTIAN MORA ARCOS	1061774344	Director	$ 1.740.000																			X	X	X	X	X	X		X	X	X				EIVI MANUEL PIPICANO	$ 390.000,0	$ 27.200	I	NUEVA EPS	9463616392	$ 48.800	COLPENSIONES	9463616392	$ 62.400				Independientes
7	GINNA NATALIA BELALCAZAR	1061768572	Prof. Social	$ 375.000																			X	X	X	X										EIVI MANUEL PIPICANO	$ 173.334,0	$ 12.100	I	NUEVA EPS	9462359920	$ 19.400	PORVENIR	9463516675	$ 27.800	-			Independientes
8	DIEGO SOLARTE	18127825	Prof. Ambiental	$ 375.000																			X	X	X	X										EIVI MANUEL PIPICANO	$ 173.334,0	$ 12.100	I	NUEVA EPS	9462359920	$ 19.400	COLPENSIONES	9463516675	$ 27.800	-			Independientes
9																																										
10																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 8/02/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-339296 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18104108		PIPICANO PANTOJA EIVI MANUEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA BAJO PUTUMAYO	BARRIO CENTRO	ORITO-PUTUMAYO	3175515637	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9463615376	E	2024/03/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856271	BURBANO BASTIDAS ANDREA NATHALY	230301	12	$1,120,000	$179,200	EPS037	12	$1,120,000	$44,800	CCF63	12	$1,120,000	$44,800	14-23	12	$1,120,000	$5,900	12	$0	$0
2	CC	7714318	CHARRY LOSADA LEONARDO	230301	12	$540,000	$86,400	EPS037	12	$540,000	$21,600	CCF63	12	$540,000	$21,600	14-23	12	$540,000	$2,900	12	$0	$0
3	CC	69008988	SOLARTE PEREZ JINETH ALEXANDRA	230301	12	$560,000	$89,600	ESSC18	12	$560,000	$22,400	CCF63	12	$560,000	$22,400	14-23	12	$560,000	$3,000	12	$0	$0
4	CC	1065611121	VILLEGAS VILLALOBOS ROMARIO ENRIQUE	230201	12	$540,000	$86,400	EPS002	12	$540,000	$21,600	CCF63	12	$540,000	$21,600	14-23	12	$540,000	$2,900	12	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$2,760,000**	**$441,600**			**$2,760,000**	**$110,400**			**$2,760,000**	**$110,400**			**$2,760,000**	**$14,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$441,600	$0	$0	$441,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$355,200	$0	$0	$355,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$86,400	$0	$0	$86,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$14,700	$0	$0	$14,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$110,400	$0	$0	$110,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$110,400	$0	$0	$110,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$110,400	$0	$0	$110,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$22,400	$0	$0	$22,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$66,400	$0	$0	$66,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$21,600	$0	$0	$21,600
TOTAL				4	$677,100	$0	$0	$677,100

2024/02/28 07:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18104108		PIPICANO PANTOJA EIVI MANUEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	INTERVENTORIA BAJO PUTUMAYO	BARRIO CENTRO	ORITO-PUTUMAYO	3175515637	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02		9463615675	Y	2024/03/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061768572	BELALCAZAR CAICEDO GINNA NATALIA	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$21,700		0	$0	$0	14-23	4	$173,334	$12,100	0	$0	$0
2	CC	18127825	SOLARTE BENAVIDES DIEGO FERNANDO	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$21,700		0	$0	$0	14-23	4	$173,334	$12,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$346,668**	**$55,600**			**$346,668**	**$43,400**			**$0**	**$0**			**$346,668**	**$24,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$55,600	$0	$0	$55,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$27,800	$0	$0	$27,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$27,800	$0	$0	$27,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,200	$0	$0	$24,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$24,200	$0	$0	$24,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$43,400	$0	$0	$43,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$43,400	$0	$0	$43,400
TOTAL				**2**	**$123,200**	**$0**	**$0**	**$123,200**

2024/02/28 07:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18104108		PIPICANO PANTOJA EIVI MANUEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EIVI PIPICANO	BARRIO CENTRO	VILLAGARZON-PUTUMAYO	1234567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02		9463616392	Y	2024/03/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EIVI PIPICANO (1 Afiliados)					$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: VILLAGARZON Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$27,200		$0	$0
1	CC 1061774344	MORA ARCOS FABIAN SEBASTIAN	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$48,800		0	$0	$0	14-23	9	$390,000	$27,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$390,000	$62,400			$390,000	$48,800			$0	$0			$390,000	$27,200		$0	$0

2024/02/28 07:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18104108		PIPICANO PANTOJA EIVI MANUEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	EIVI PIPICANO	BARRIO CENTRO	VILLAGARZON-PUTUMAYO	1234567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02		9463616392	Y	2024/03/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,400	$0	$0	$62,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,800	$0	$0	$48,800
TOTAL				1	$138,400	$0	$0	$138,400

2024/02/28 07:56 PM

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4315-2023 **INTERVENTOR:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

MES INFORME MENSUAL: 19 FEB AL 29 FEB DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y EL MUNICIPIO DE ORITO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3448 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO COEMBI

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3580 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	168823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal 4315 DE 2023	$ 70.064.582	
			TOTAL			$ 70.064.582	$ 70.064.582

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 25.547.396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	19 FEB AL 29 FEB DE 2024	$ 21.468.400	$ 4.078.996	$ 25.547.396	N/A	$ 25.547.396	N/A	168823 del 20/09/2023	$ 70.064.582	$ 70.064.582		
TOTALES		$ 21.468.400	$ 4.078.996	$ 25.547.396	N/A	$ 25.547.396	N/A					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N° 1 DEL 19 FEB AL 29 FEB DEL 2024	$ 21,468,400	$ 4,078,996	$ 25,547,396
-			
-			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-339296

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO EURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 12 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4315 DE 2023 **INTERVENTOR:** EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y EL MUNICIPIO DE ORITO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 21/11/2023

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21 DE ENERO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 70.064.582,00

VALOR ACUMULADO: $ 70.064.582,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 7.006.458,20	9 / 11 / 2023	30 / 6 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.012.916,40	9 / 11 / 2023	31 / 12 / 2026
Calidad del servicio		$ 21.019.374,60	9 / 11 / 2023	31 / 12 / 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101277042

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 12 2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre:FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-339296 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

RELACIÓN DE PAGOS

PIPICANO PANTOJA EIVI CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4315 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	NÓMINA EMPLEADOS 2 RELACION NÓMINA DE PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2024

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Devengado					TOTAL A PAGAR	FIRMA
			Salario básico	auxilio transporte	dias trabajados	otros pagos	total devengado		
ANDREA NATHALY BURBANO	1.124.856.271	RESIDENTE	$ 2.800.000,00	0	12	280.000	1.120.000	$ 1.400.000,00	
LEONARDO CHARRY	7.714.318	INSPECTOR	$ 1.350.000,00	0	12	135.000	540.000	$ 675.000,00	
ROMARIO VILLEGAS	1.065.611.121	INSPECTOR	$ 1.350.000,00	0	12	135.000	540.000	$ 675.000,00	
JINETH ALEXANDRA SOLARTE	69.008.988	INSPECTOR SST	$ 1.400.000,00	0	12	140.000	560.000	$ 700.000,00	
Totales			**6.900.000**	**-**	**48**	**690.000**	**2.760.000**	**3.450.000**	

Neto pagado: $3.450.000

Se realizan otros pagos, por concepto de movilización a lugar de trabajo

Periodo de pago	29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de liquidación	29 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de	**19 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024**

Observaciones

CUENTA DE COBRO N°01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108

DEBE A:

FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
C.C. N° 1061774344 de Popayán - Cauca

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.740.000,00) M/CTE

Por concepto de: director del contrato de Interventoría Nro. 4315 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", con un porcentaje de dedicación del 30%.

Para constancia se firma en Mocoa a los 26 días del mes de febrero del 2024



FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
1061774344 de Popayán - Cauca

CUENTA DE COBRO N°01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108

DEBE A:

DIEGO FERNANDO SOLARTE BENAVIDES
C.C. N° 118.127.825 de Mocoa - Putumayo

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($375.000,00) M/CTE

Por concepto de: profesional ambiental del contrato de Interventoría Nro. 4315 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", con un porcentaje de dedicación del 12,5%.

Para constancia se firma en Mocoa a los 26 días del mes de febrero del 2024

Diego Solarte Benavides

DIEGO FERNANDO SOLARTE BENAVIDES
C.C. N° 118.127.825 de Mocoa - Putumayo

CUENTA DE COBRO N°01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108

DEBE A:

GINNA NATALIA BELALCAZAR CAICEDO
C.C. N°. 1061768572 de Popayán - Cauca

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($375.000,00) M/CTE

Por concepto de: profesional Social del contrato de Interventoría Nro. 4315 de 2023 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, con un porcentaje de dedicación del 12,5%.

Para constancia se firma en Mocoa a los 26 días del mes de febrero del 2024



DAYANA VANESSA OBANDO ERAZO
C.C. N°. 18.127.825 de Mocoa - Putumayo

CUENTA DE COBRO N°01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108

DEBE A:

FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
C.C. N° 1061774344 de Popayán - Cauca

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,00) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Profesional especialista en pavimentos encargado de la revisión de los estudios y diseños realizados por las OAC Alto Coembi y La Esmeralda en el marco de los convenios solidarios, los cuales son revisados y aprobados en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de Interventoría Nro. 4315 de 2023 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

Para constancia se firma en Mocoa a los 26 días del mes de febrero del 2024



FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
1061774344 de Popayán - Cauca

San Miguel Agreda de Mocoa, 19 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO NRO. 01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108 de Villagarzón - Putumayo

DEBE A:

MATEO MURILLO RIVERA
C.C. N° 1.053.823.404 de Manizales - Caldas

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE MOTOCICLETA DE PLACAS UWQ39G PARA EL MES DE FEBRERO 19 FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024.

VALOR A CANCELAR:

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,00) M/CTE

Mateo Murillo Rivera

MATEO MURILLO RIVERA
C.C. N° 1.053.823.404 de Manizales - Caldas

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030499288

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UWQ39G	FRATELLI	LIGERA 125	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	GRIS	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JJ152QMI 220301421	N	LZRL2F003PA000282

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*******	N	LZRL2F003PA000282	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MURILLO RIVERA MATEO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1053823404

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	9

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352022000280079	I	28/06/2022	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/11/2023	21/11/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MOCOA



LT0700262791 2

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	11	18

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	11	19
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	11	18

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
37023091	UWQ39G	MOTOCICLETA	PARTICULAR	124	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FRATELLI	

LÍNEA VEHÍCULO
LIGERA125

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JJ152QMI220301421	LZRL2F003PA000282	LZRL2F003PA000282	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MATEO MURILLO RIVERA		CEDULA	1053823404	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2731	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181,700	$ 94,400	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 278,200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.823.404

MURILLO RIVERA

APELLIDOS

MATEO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1992

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-DIC-2010 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0900100-00283729-M-1053823404-20110311 0026105981A 1 35717211

San Miguel Agreda de Mocoa, 19 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO NRO. 01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108 de Villagarzón - Putumayo

DEBE A:


NATHALY ANDREA BURBANO BASTIDAS
C.C. N° 1.124.856.271 de Mocoa - Putumayo

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE MOTOCICLETA DE PLACAS PGT66E PARA EL MES DE FEBRERO 19 FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024.

VALOR A CANCELAR:

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,00) M/CTE



NATHALY ANDREA BURBANO BASTIDAS
C.C. N° 1.124.856.271 de Mocoa - Putumayo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015401693

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PGT66E	YAMAHA	T115FI (T115FL-5)	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
114	NEGRO ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
E3S9E0010678	N	9FKUE1618J2010678

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKUE1618J2010678	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BURBANO BASTIDAS ANDREA NATHALY	C.C. 1124856271

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	9

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902017000241192	I	07/12/2017	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/01/2018	01/02/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MOCOA



LT01007512248

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-03-14	2023-03-15	2024-03-14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1108004064531000	PGT66E	MOTOS	PARTICULAR	114	2018

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	YAMAHA	T115FI (T115FL-5)	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E3S9E0010678	9FKUE1618J2010678	9FKUE1618J2010678	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BURBANO BASTIDAS, ANDREA NATHALY	3202162022	CC	1124856271	MOCOA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	11	999911	0	MOCOA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas.

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data.

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.856.271**

BURBANO BASTIDAS

APELLIDOS

ANDREA NATHALY

NOMBRES

Andrea Burbano

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1991**

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-SEP-2009 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-6400100-00196146-F-1124856271-20091111 0017942121A 2 26634781

San Miguel Agreda de Mocoa, 19 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO NRO. 01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108 de Villagarzón - Putumayo

DEBE A:

MONICA BASTIDAS GUEVARA
C.C. N° 31213485

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE MOTOCICLETA DE PLACAS NNO15D PARA EL MES DE FEBRERO 19 FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024.

VALOR A CANCELAR:

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,00) M/CTE



_____

MONICA BASTIDAS GUEVARA
C.C. N° 31213485

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009864095

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NNO15D	YAMAHA	YBR125ESD	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	TURISMO	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR
E3F4E103684

REG
N

VIN
9FKKE1996G2103684

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FKKE1996G2103684

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BASTIDAS GUEVARA MONICA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 31213485

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
10

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902015000093729

I/E
I

FECHA IMPORT.
14/05/2015

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
02/06/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/07/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MOCOA

LT01005783059

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	12	14

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	12	15
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	12	14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901069463701	NNO15D	MOTOCICLETA	PARTICULAR	124	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	YAMAHA	YBR125ESD	226 - TURISMO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E3F4E103684	9FKKE1996G2103684	9FKKE1996G2103684	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MONICA BASTIDAS GUEVARA	3192278101	CC	31213485	MOCOA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901069463701	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$181,700.00	$94,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR


$278,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

San Miguel Agreda de Mocoa, 19 de Febrero de 2024

CUENTA DE COBRO NRO. 01

EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
CC. 10.104.108 de Villagarzón - Putumayo

DEBE A:

LEANDRO NORBEY ARTEAGA YELA
C.C. N° 18130297

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA BARRIO CENTRO MOCOA CL 6 8 02

VALOR A CANCELAR:

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000,00) M/CTE



LEANDRO NORBEY ARTEAGA YELA
C.C. N° 18130297

TV Internet Voz Móvil

ARTEAGA YELA LEANDRO NORVEY

Servicio Fijo - No. Línea: **6084200520**
KR 6 CL 8 02 CENTRO MOCOA
MOCOA - PUTUMAYO
Nit o CC.: 18130297
Factura electrónica de venta: BEC357535060

QR DIAN

Total a Pagar
$ 35,659
Fecha de vencimiento y pago: **24/Feb/2024**
Fecha de suspensión: **26/Feb/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
24471410311

Periodo facturado: 17/Ene/2024 al 16/Feb/2024

17/02	17/02	24/02	26/02	16/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 54,309
Pagos Realizados	- $ 54,309
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 105**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 105
Servicio mes actual	**$ 35,554**
Servicios Mes Actual IVA Induido	$ 35,554
Total a pagar servicio	**$ 35,659**


IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 2,359.00	$ 448.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio $420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0
Sep	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ARTEAGA YELA LEANDRO NORVEY

(415)7707176960178(8020)000002447141031 1(3900)000000000035659(96)20240224

Numero para Pagos	24471410311	**$**

Total a pagar

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

	FORMATO RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIO:	3448 de 2023
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal de alto Coembi
CONVENIO:	3580 de 2023
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal de la vereda la Esmeralda
CONTRATO INTERVENTORÍA:	4315-2023
INTERVENTOR:	EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA
SUPERVISOR:	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
FECHA:	29/02/2024

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/01/2024	E.M.P-4315-OF-008	solicitud de información convenio nro. 3580 de 2023	Interventoría	JAC Esmeralda
2/01/2024	E.M.P-4315-OF-009	observaciones hojas de vida personal mínimo.	Interventoría	JAC Alto Coembi
1101/2024	E.M.P-4315-OF-010	solicitud copia de acta de suspensión nro. 01	Interventoría	INVIAS
15/01/2024	E.M.P-4315-OF-011	solicitud de información	Interventoría	JAC Esmeralda
16/01/2024	E.M.P-4315-OF-012	solicitud de cambio de profesional	Interventoría	INVIAS
16/01/2024	E.M.P-4315-OF-013	revisión hoja de vida - ingeniero residente convenio n	Interventoría	JAC Esmeralda
19/01/2024	E.M.P-4315-OF-014	revisión estudios y diseños convenio nro. 3448 de 202	Interventoría	JAC Alto Coembi
19/01/2024	E.M.P-4315-OF-015	observaciones hojas de vida personal mínimo.	Interventoría	JAC Alto Coembi
19/01/2024	E.M.P-4315-OF-016	observaciones hojas de vida personal mínimo.	Interventoría	JAC Alto Coembi
19/01/2024	E.M.P-4315-OF-017	aprobación personal mínimo-convenio nro.3448 del 2	Interventoría	INVIAS
22/01/2024	E.M.P-4315-OF-018	solicitud de cambio de residente e inspector de interv	Interventoría	INVIAS
22/01/2024	E.M.P-4315-OF-019	aprobación de hojas de vida personal mínimo conven	Interventoría	INVIAS
26/01/2024	E.M.P-4315-OF-020	revisión de topografía convenio nro. 3580 de 2023	Interventoría	JAC Esmeralda
31/01/2024	E.M.P-4315-OF-021	contratos del personal vinculado al desarrollo del cont	Interventoría	INVIAS
4/02/2024	E.M.P-4315-OF-022	revisión de estudio geométrico convenio nro. 3580 de	Interventoría	JAC Esmeralda
7/02/2024	E.M.P-4315-OF-023	solicitud de reinicio de contrato de interventoría	Interventoría	INVIAS
8/02/2024	E.M.P-4315-OF-024	informe de interventoría nro. 01	Interventoría	INVIAS
9/02/2024	E.M.P-4315-OF-025	acta de costos nro. 01	Interventoría	INVIAS
16/02/2024	E.M.P-4315-OF-026	acta de costos nro. 01 - fisica	Interventoría	INVIAS
20/02/2024	E.M.P-4315-OF-027	solicitud de aprobación de personal de contrato de int	Interventoría	INVIAS

	FORMATO RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONVENIO:		3448 de 2023		
CONTRATISTA:		Junta de acción comunal de alto Coembi		
CONVENIO:		3580 de 2023		
CONTRATISTA:		Junta de acción comunal de la vereda la Esmeralda		
CONTRATO INTERVENTORÍA:		4315-2023		
INTERVENTOR:		EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA		
SUPERVISOR:		JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
20/02/2024	E.M.P-4315-OF-028	aprobación personal mínimo-convenio nro.3448 del 2(	Interventoría	JAC Alto Coembi
20/02/2024	E.M.P-4315-OF-029	aprobación de hojas de vida personal mínimo conven	Interventoría	JAC Esmeralda
23/02/2024	E.M.P-4315-OF-030	remisión de anexos 2 y 3	Interventoría	INVIAS
23/02/2024	E.M.P-4315-OF-031	solicitud de actualización de pólizas.	Interventoría	JAC Alto Coembi
23/02/2024	E.M.P-4315-OF-032	solicitud de actualización de pólizas.	Interventoría	JAC Esmeralda
23/02/2024	E.M.P-4315-OF-033	revisión de estudios y diseños	Interventoría	JAC Alto Coembi
24/02/2024	E.M.P-4315-OF-034	remisión anexo 4	Interventoría	INVIAS
24/02/2024	E.M.P-4315-OF-035	aceptación de estudios y diseños	Interventoría	JAC Esmeralda
24/02/2024	E.M.P-4315-OF-036	remisión de estudios y diseños elaborados en el marc	Interventoría	INVIAS
24/02/2024	E.M.P-4315-OF-037	solicitud de carteras de diseño geométrico	Interventoría	JAC Alto Coembi
26/02/2024	E.M.P-4315-OF-038	aceptación de estudios y diseños	Interventoría	JAC Alto Coembi
26/02/2024	E.M.P-4315-OF-039	remisión de estudios y diseños elaborados en el marc	Interventoría	INVIAS

FABIAN SEBASTIAN MORA ARCOS
19202-339296 CAU
Director de Interventoría
