	Versión: 02
	Código: GIL-F-072

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO	FEBRERO	**Informe Número:**	**6**
Dirección Regional	TOLIMA	**Supervisor Regional**	WILSON HELY SIERRA
Fecha de elaboración del informe	15/02/2024		

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		**INTERVENTOR**	
Contratista	Jhon Fredy Niño Aragon	Interventor	Jhair Rodolfo Gonzalez Velasquez
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5402648	Contrato No.	CO1.PCCNTR.5448117
Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2023	Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2023
Fecha Suspensión No. 1	N/A	Fecha Suspensión No. 1	N/A
Fecha Reinicio No. 1	N/A	Fecha Reinicio No. 1	N/A
Fecha Suspensión No. 2	N/A	Fecha Suspensión No. 2	N/A
Fecha Reinicio No. 2	N/A	Fecha Reinicio No. 2	N/A
Fecha de Terminación	15 de febrero de 2024	Fecha de Terminación	15 de febrero de 2024
Valor Inicial	$948,406,754,69	Valor Inicial	$94,800,000
Valor adición No. 1	N/A	Valor adición No. 1	N/A
Valor adición No. 2	N/A	Valor adición No. 2	N/A
Valor Actualizado	$948,406,754,69	Valor Actualizado	$94,800,000
Plazo Inicial	Tres Meses (Sin exceder el 31 de diciembre)	Plazo Inicial	Setenta y siete (77) dias
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga No.01:	Treinta y un (31) dias	Prórroga No.01:	Treinta y un (31) dias
Prórroga No 02:	Quince (15l dias	Prórroga No 02:	Quince (15l dias
Plazo Actualizado	Ciento Trece (113) dias	Plazo Actualizado	Ciento Trece (113) dias

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :

EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA


CARGO	**NOMBRE**
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	Jhon Fredy Niño Aragon
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	Cristian Rivera
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	N/A
RESIDENTE SISO DE OBRA	Yenny Astrid Rodriguez Basto
INSPECTOR DE OBRA	N/A
COORDINADOR DE OBRA	N/A
ESPECIALISTAS	N/A

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	**NOMBRE**
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	Jhair Rodolfo Gonzalez Velasquez
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	Julian Andres Mosquera Jaramillo
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	N/A
RESIDENTE SISO DE OBRA	Ana Maria Morales
INSPECTOR DE OBRA	N/A
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	N/A
ESPECIALISTAS	N/A
	N/A

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION

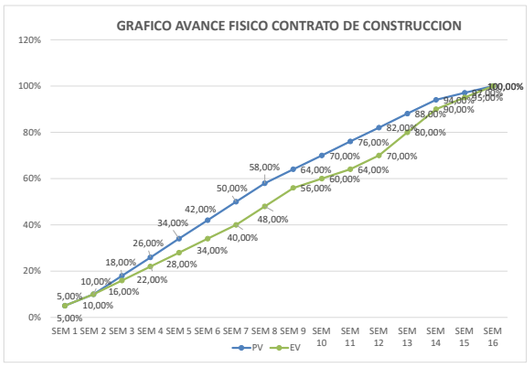


%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 1	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
SEM 2	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%
SEM 3	8,00%	18,00%	6,00%	16,00%	-2,00%
SEM 4	8,00%	26,00%	6,00%	22,00%	-4,00%
SEM 5	8,00%	34,00%	6,00%	28,00%	-6,00%
SEM 6	8,00%	42,00%	6,00%	34,00%	-8,00%
SEM 7	8,00%	50,00%	6,00%	40,00%	-10,00%
SEM 8	8,00%	58,00%	8,00%	48,00%	-10,00%
SEM 9	6,00%	64,00%	8,00%	56,00%	-8,00%
SEM 10	6,00%	70,00%	4,00%	60,00%	-10,00%
SEM 11	6,00%	76,00%	4,00%	64,00%	-12,00%
SEM 12	6,00%	82,00%	6,00%	70,00%	-12,00%
SEM 13	6,00%	88,00%	10,00%	80,00%	-8,00%
SEM 14	6,00%	94,00%	10,00%	90,00%	-4,00%
SEM 15	3,00%	97,00%	5,00%	95,00%	-2,00%
SEM 16	3,00%	100,00%	5,00%	100,00%	0,00%
			ALERTAS		0,00%

0,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

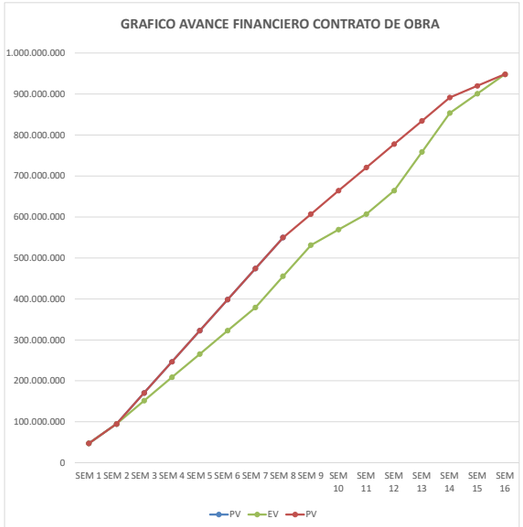

%AVANCE SEMANAL	PROGRAMADO	PV	EJECUTADO	EV	ATRASO
SEM 1	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ 47.420.337,73	$ -
SEM 2	$ 47.420.337,73	$ 94.840.675,47	$ 47.420.337,73	$ 94.840.675,47	$ -
SEM 3	$ 75.872.540,38	$ 170.713.215,84	$ 56.904.405,28	$ 151.745.080,75	-$ 18.968.135,09
SEM 4	$ 75.872.540,38	$ 246.585.756,22	$ 56.904.405,28	$ 208.649.486,03	-$ 37.936.270,19
SEM 5	$ 75.872.540,38	$ 322.458.296,59	$ 56.904.405,28	$ 265.553.891,31	-$ 56.904.405,28
SEM 6	$ 75.872.540,38	$ 398.330.836,97	$ 56.904.405,28	$ 322.458.296,59	-$ 75.872.540,38
SEM 7	$ 75.872.540,38	$ 474.203.377,35	$ 56.904.405,28	$ 379.362.701,88	-$ 94.840.675,47
SEM 8	$ 75.872.540,38	$ 550.075.917,72	$ 75.872.540,38	$ 455.235.242,25	-$ 94.840.675,47
SEM 9	$ 56.904.405,28	$ 606.980.323,00	$ 75.872.540,38	$ 531.107.782,63	-$ 75.872.540,38
SEM 10	$ 56.904.405,28	$ 663.884.728,28	$ 37.936.270,19	$ 569.044.052,81	-$ 94.840.675,47
SEM 11	$ 56.904.405,28	$ 720.789.133,56	$ 37.936.270,19	$ 606.980.323,00	-$ 113.808.810,56
SEM 12	$ 56.904.405,28	$ 777.693.538,85	$ 56.904.405,28	$ 663.884.728,28	-$ 113.808.810,56
SEM 13	$ 56.904.405,28	$ 834.597.944,13	$ 94.840.675,47	$ 758.725.403,75	-$ 75.872.540,38
SEM 14	$ 56.904.405,28	$ 891.502.349,41	$ 94.840.675,47	$ 853.566.079,22	-$ 37.936.270,19
SEM 15	$ 28.452.202,64	$ 919.954.552,05	$ 47.420.337,73	$ 900.986.416,96	-$ 18.968.135,09
SEM 16	$ 28.452.202,64	$ 948.406.754,69	$ 47.420.337,73	$ 948.406.754,69	$ -
			ALERTAS		$ -

Nota:

NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría. A la fecha no se tiene informe mensual de interventoría consolidado.

CONTROL DE HITOS DE CONSTRUCCION

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	No DE DIAS PROGRAMADOS	No DE DIAS TRANSCURRIDOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	RETRASO/ADELANTO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**17/10/2023**	**31/01/2024**					
1	PRELIMINARES	17/10/2023	30/10/2023	13,00	0	**0,00%**		0,00%
2	OBRA CIVIL - ARQUITECTURA	17/10/2023	15/02/2024	121,00	0	**0,00%**		0,00%
3	OBRA ESTRUCTURAL - ESTRUCTURA METALICA	30/10/2023	10/01/2024	72,00	0	**0,00%**		0,00%

	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	15/02/2024
	Plazo FALTANTE el Proyecto en Días	**121**

ALERTA	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	**Cumple**
El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	**SI**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables.	**SI**
Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	**SI**
Presencia de personal de interventoría en las sedes	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra	**SI**
La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra	**SI**
La interventoría realiza comités periódicos de obra	**SI**
El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad	**SI**
Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques.	**SI**
El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición	**SI**
El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos	**SI**
Observaciones	

TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	**Cumple**
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo.	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional.	**SI**

Observaciones (DETALLE LOS TEMAS RELEVANTES PARA EL PARA EL COMPONENTE DURANTE LA SEMANA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

SEMANA No. 1	Inicio de ejecucion de actividades de retiro de drywall existente en los ambientes de hoteleria, cocina. Asi como el retiro de la estructura de soporte del drywall existente
SEMANA No. 2	continua la ejecucion de actividades de retiro de drywall existente en los ambientes de hoteleria, cocina. Asi como el retiro de la estructura de soporte del drywall existente, se culmina esta actividad en la zona de hoteleria y continua en la zona de cocina y logistica
SEMANA No. 3	Se da inicio a la labor de mantenimeinto de la estructura metalica existente y se realiza el refuerzo de la misma con el fin de adaptarla para la sujecion de la nueva estructura de cubierta, adicionalmente continuan las labores de retiro de cielorraso existente.
SEMANA No. 4	Continua la labor de mantenimeinto de estructura metalica y de sujecion de cubierta, en los ambientes de hoteleria y turismo.
SEMANA No. 5	Se da inicio a la ejecuion de las labores de retiro de drywall en las oficinas administrativas en los ambientes de direccion regional y se da inicio a la labor de mantenimeinto de estructura existente en el area de cocina
SEMANA No. 6	Continuan las actividades de mantenimiento de estructura metalica en los ambientes de hoteleria, de Cocina y se da inicio al mantenimento de la estructura metalica en la zona de logistica.
SEMANA No. 7	Se da inicio a la actividad de retiro de cubierta existente, verificando el cumplimiento de cada una de los requerimientos de seguridas y salud para el personal en ejecucion de esta actividad y manejo de este tipo de material, esta actividad da incilo en la zona de hoteleria
SEMANA No. 8	Continua el retiro de cubierta existente en Asbesto en la zona de hoteleria, de igual manera se realiza la instalacion de la cubierta nueva. Adicionalmente se realiza esta actividad en los ambientes administrativos.
SEMANA No. 9	Se avanza con la instalacion de cubierta nueva en ambientes de hoteleria y administrativos, al igual que en la instalacion de drywall en ambioentes administrativos
SEMANA No. 10	Se avanza con la instalacion de cubierta nueva en ambientes de hoteleria y administrativos, al igual que en la instalacion de drywall en ambioentes administrativos, adicionalmente inicia la instalacion de drywall en zona de hoteleria e instalacion de cocina
SEMANA No. 11	Se da inicio a la instalacion de estrctura de drywall en los ambiented del bloque D, adicionalmente se avanza en los acabados de la zona de direccion, resane de paredes y superficies verticales
SEMANA No. 12	Se avanza en las actividades de instalacion de drywalll y pintura de los diferentes ambientes de la zona de cocina europea y subdireccion, adicionalmenmte se inicia esta activida en el ambiente 1070 B
SEMANA No. 13	Se da inicio a las labores de instalacion de frescasa y laminas de drywall en los ambientes del bloque D y la zona de hoteleria, adicionalmente continua la ejecucion de actividades en la zona de direccion, subdireccion y albientes 1010 A, 1020A, 1030A y zona de logistica.
SEMANA No. 14	Se realiza la entrega de los ambientes de formacion 1010A, 1020A, 1030A, 1070B, Piso y oficinas de direccion, y 1080 Logistica estos ambientes se entregas con acabados y pintura en su totalidad para el uso del Sena
SEMANA No. 15	Se avanzo en la terminacion de los ambnientes de formacion del bloque D, la zona de hoteleria y subdireccion, realizando instalaciones electricas para las luminarias y alistamiento de superficies para pintura.
SEMANA No. 16	Se realizo la entrega de las oficinas del piso de Sub direccion, con sus respectivas luminarias y acabados de cielorraso y pintura, tambien se realizo la entrega de los ambientes de formacion 2010 D, 2040 D, 2050 D, 2060 D, con sus luminarias y correspondientes acabados de cielorraso y pintura. Se da terminacion a las actividades contractuales.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

SEMANA No. 1	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 2	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 3	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 4	Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 5	Se solicita al contratista aclarar en que fecha se cuenta con el suministro de la nueva cubierta pues a la fecha no se cuenta con la misma y esto genera retrasos significativos en las actividades principales. e realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 6	Se hacen las recomendaciones pertinentes y el seguimiento a la preparacion de la actividad de desmonte de cubierta existente a fin de cumplir con los requerimeintos, el cuidado y disposicion de materiales con Asbesto. Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 7	Se realiza el continuao segimiento a las actividades del contrato, se hacen los requerimeintos pertinentes al contratista a fin de cumplir con las normas del manjo de materiales de asbesto, a fin priorizar el cuidado del personal expesto al manejo de estos elementos. Se realiza el seguimiento a la actividad y se hacen las peticiones y correciones pertinentes respecto del uso de los implementos de seguridad para el personal y la ejecucion tecnica de cada una de las actividades.
SEMANA No. 8	Se realizan las verificaciones pertinentes a la instalacion de la nueva cubierta, y se solicita al contratista una reprogramacion y la implementacion de un plan de choque a fin de mitigar los retrasos rpresentados en el suministro de la cubierta.
SEMANA No. 9	Se realizan jornadas adicionales a fin de mitigar los retrasos en el suministro de la cubierta, en algunas ocasiones se ven afectadas las actividades por las lluvias. Se hacen los requerimeintos pertinentes al contratista relacionados con el manejo de Asbesto y sugerencias a la ejecucion tecnica de actividades
SEMANA No. 10	Se realiza el seguimeinto a las actividades en ejecucion y se realizan las sugerencias pertinentes al contratista. Se evalua la solicitud de una prorroga puesto que los recursos implementados para mitigar los retrasos se han visto afectados por las lluvias en la zona.
SEMANA No. 11	Se realiza el seguimiento a cada una de las intervenciones, a la fecha se han hecho los requerimientos necesarios al contratista en pro de garantizar la calidad de la Obra
SEMANA No. 12	Se hace el seguimiento permanente a la ejecucion de la actividad de instalacion de drywall verificando sus niveles y realizando las correcciones y sugerencias pertinentes enb cuanto al proceso tecnico al contratista.
SEMANA No. 13	Se hace el seguimiento permanente a la ejecucion de la actividad de instalacion de drywall verificando sus niveles y realizando las correcciones y sugerencias pertinentes enb cuanto al proceso tecnico al contratista. Adicionalmente se insta al contratista a aumentar el numero de cuadrilllas en la ejecucion, en pro de dar prioridad a la enrega de los ambientes de formacion.

SEMANA No. 14	Se realiza los requerimientos pertinentes respecto de la entrega de ambientes de formacion 1010A, 1020A, 1030A, 1070B, Piso y oficinas de direccion, y 1080 Logistica, realizando mencion de pendientes menores por ejecutar por el contratista, el cual se compromete a realizar los mismos a la mayor brevedad. e insta al contratista a dar prioridad a los ambientes del Bloque D Hoteleria
SEMANA No. 15	Se realizo el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra, realizando sugerencias en cuanto al desarrollo tecnico de las obras de acabados en la zona de Hoteleria, y los ambientes 2020 D. 2030d, 2040d, 2050d y 2060d. Asi como se solicitaron detalles y correcciones en la zona de subdireccion.
SEMANA No. 16	Se verifico la entrega de los ambientes de formacion del Bloque D, asi como el funcionamiento de las nuevas luminaras, se realiozaron observaciones para la entrega final de las oficinas del tercer piso de la Sub direccion. Se da terminacion a las actividades contractuales.

PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MES

PERSONAL CONTRATISTA DE OBA	CANT.	PERSONAL MANO DE OBRA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	SUBCONTRATISTA OBRA HIDRAULICOS	CANT.	
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS (AUXILIAR, A		INGENIEROS		INGENIEROS		
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO, INSPECTOR)	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	1	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		
AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA		
OFICIALES DE OBRA								
OPERADOR DE MAQUINARIA								
TOTAL	3	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0	

REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA
(Registre los datos de los últimos informes)

PERIODO			ESTADO Y CONTENIDO		
N° INFORME	DESDE	HASTA	Fecha de Entrega	Radicado SENA	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
2	1/11/2023	15/11/2023	15/11/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
3	16/11/2023	30/11/2023	30/11/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
4	1/12/2023	15/12/2023	15/12/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
5	16/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
6	29/12/2023	15/01/2024	15/01/2024		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
7	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato
8	1/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		Informe de avance de actividades y verificacion de obligaciones del contrato

ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, de conformidad con las funciones desempeñadas, en Ibague a los:

Quince	15	días del mes de	Febrero	de	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año en que se firma el acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	Wilson Hely Sierra Vaca	FIRMA	

EQUIPO DE APOYO DE LA REGIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	Paola Morales	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Georreferenciación	Descripción
	Entrega de ambientes 2020 D y 2030 Dde con cielorraso y pintura terminados, asi como la instalacion de luminarias nuevas



Georreferenciación	Descripción
	Entrega de ambiente 2010 D con cielorraso y pintura terminados, asi como la instalacion de luminarias nuevas



Georreferenciación	Descripción
	Entrega de ambientes 2040 D, 2050D Y 2060 D con cielorraso y pintura terminados, asi como la instalacion de luminarias nuevas



Georreferenciación	Descripción
	Entrega de ambiente DE OFICINAS DE SUB DIRECCION Y TODOS LOS AMBIENTES DEL PISO 3 con cielorraso y pintura terminados, asi como la instalacion de luminarias nuevas
