INFORME DE INTERVENTORIA No.06
Del 28 de Diciembre de 2023 al 15 de Enero de 2024

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

INTRODUCCIÒN 3

2. CONTRATO DE OBRA 4

2.1. Información del contrato de obra: 4
2.2. Control de pólizas: 5
2.3. Relación de equipo de obra 5
2.4. Estado del tiempo 5
2.5. Balance Financiero contrato de obra: 6

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

3.1. Información general del contrato. 3 6
3.2. Control de pólizas: 7
3.3. Balance financiero del contrato de interventoría: 7
3.4. Control y vigilancia de actividades de campo. 7

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 8

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8

6.1 Instalación de nueva cubierta 9
6.2 Instalación de drywall 12
6.3 Preparación de Superficies y aplicación de pintura 14

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

7.1 Desmonte de Cubierta existente e instalación de nueva cubierta tipo canaleta. 16
7.2 Desmonte de cielorraso existente e instalación de nuevo drywall. 16
7.3 Preparación y aplicación de pintura. 17
7.4 Observaciones Generales. 18

INTRODUCCIÒN

El servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima, celebró el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de fecha 27 de septiembre de 2023, con el Ingeniero JHON FREDY NIÑO ARAGON, el cual tiene como objeto: EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL, de conformidad con lo estipulado en los estudios previos y la propuesta presentada por JHON FREDY NIÑO ARAGON identificado con cedula de ciudadanía No.93.206.420, y los documentos que hacen parte integral del contrato.

De otro lado, mediante contrato de mínima cuantía se adjudicó el contrato de Interventoría Nº. MC-RT-931010-595-2023 al ingeniero JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ. El cual recibió el visto bueno por parte del SENA regional Tolima.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance de las actividades realizadas por el Contratista de obra entre las fechas 28 de diciembre de 2023 hasta el 15 de Enero de 2024. Durante la presente ejecución del contrato, la Interventoría realizó funciones de control seguimiento y vigilancia de las actividades y obligaciones del constructor, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, en consecuencia, ha impartido instrucciones y recomendaciones al contratista para la ejecución de actividades programadas para el presente período, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 cuyo objeto es: "EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL", suscrito con el servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Tolima y de todas aquellas normas, especificaciones, documentos de orden técnico y legal contenidos en estos.

Durante este período, la Interventoría ejerció sus funciones a través de comunicaciones, comité de obra y bitácora de obra, realizando a su vez control y seguimiento del personal, equipo, estado del tiempo y actividades de obra.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1. Información del contrato de obra:

La Construcción del proyecto consiste en la ejecución de las obras de acuerdo con la estructuración del contrato, características y diseños que proporcionaron los estudios previos efectuados y por la entidad.

Las características principales del contrato son las siguientes:

Contrato No:	CO1.PCCNTR.5402648
Contratista:	JHON FREDY NIÑO ARAGON
Objeto De Contrato:	EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL.
Valor Del Contrato:	Novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con sesenta y nueve centavos ($ 948.406.754,69) M/te
Plazo:	Tres (03) Meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. Sin exceder el 31 de Diciembre de 2023

2.2. Control de pólizas:

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparada con la garantía única de cumplimiento Nº 4008784 y responsabilidad Civil Extracontractual Nº 4001839 Expedidas por la compañía aseguradora "HDI SEGUROS" el día 12/10/2023 que ampara el contrato de obra Nº CO1.PCCNTR.5402648 suscrito con JHON FREDY NIÑO ARAGON, en los siguientes términos.

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	4008784	27/09/2023	30/04/2024	$189.681.351,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	4008784	27/09/2023	30/12/2026	$47.420.337,75
Estabilidad y calidad de la obra	4008784	27/09/2023	27/09/2028	$379.362.702,00

El contrato de Obra de la referencia, se encuentra amparado con la póliza de Responsabilidad civil extracontractual RCE expedida por la compañía " HDI SEGUROS." Nº 4001839; las cuales fueron revisadas y aprobadas el funcionario competente con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Predios labores y operaciones	4001839	27/09/2023	30/12/2023	$232.000.000,00

2.3. Relación de equipo de obra

- Herramienta Menor
- Andamios certificados

2.4. Estado del tiempo

Durante el desarrollo de la obra hasta la fecha se presentó un 30% de tiempo de lluvia, que durante la ejecución de las actividades realizadas a la fecha no interfiere en el avance de obra

2.5. Balance Financiero contrato de obra:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$948.406.755,00	
ACTA PARCIAL No. 01		$244,642,322.86
ACTA PARCIAL No. 02		$327,345,590.05
SALDO EN EJECUCION		$376,418,841.78
SUMAS IGUALES	**$948.406.755,00**	**$948.406.755,00**

Nota: El contratista a la fecha se encuentra realizando el cobro de acta parcial No. 02

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información general del contrato. 3

Los aspectos generales del contrato son:

Contrato Nº: CO1.PCCNTR.5448117

Contratista: JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
NIT: 93.296.714-9

Contratista: SENA REGIONAL TOLIMA

Objeto/Contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

Valor/Contrato: Noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos ($ 94.800.000,00) M/te

Plazo: Setenta y siete (77) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución. Sin exceder el 31 de diciembre de 2023

3.2. Control de pólizas:

El contrato de Interventoría de la referencia, se encuentra amparado por la póliza Nº 41-44-101275981 (Anexo 0) expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A,** la que ampara el contrato Nº CO1.PCCNTR.5448117, suscrito con JHAIR RODOLFO GONZALES cual fue revisada por el funcionario competente y aprobado con el siguiente detalle:

Amparos	Póliza No.	Vigencia desde	Hasta	Vr. asegurado
Cumplimiento del contrato	41-44-101275981	11-10-2023	30-04-2024	$18.960.000,00
Calidad del servicio	41-44-101275981	31-12-2023	31-12-2026	$4.740.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	41-44-101275981	11-10-2023	31-12-2028	$18.960.000,00

3.3. Balance financiero del contrato de interventoría:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$94.800.000,00	
ACTA PARCIAL No. 01		$56,880,000.00
SALDO EN EJECUCION		$37,920,000.00
SUMAS IGUALES	**$94.800.000,00**	**$94.800.000,00**

Nota: A la fecha se encuentra en proceso de cobro el acta parcial No. 01

3.4. Control y vigilancia de actividades de campo.

- Verificación y control de materiales.
- Evaluación de terminados acordes a lo contratado en cada uno de sus procedimientos técnicos.
- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en la ejecución de la obra.

4. RELACION CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	Tres (03) Meses contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
PRORROGA No.01	Un (01) Mes
FECHA DE TERMINACION	31-ene-24

5. RELACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	77 Días contados a partir del acta de inicio
ACTA DE INICIO	17-oct-23
PRORROGA No.01	Un (01) Mes
FECHA DE TERMINACION	31-ene-24

6. EJECUCION DE OBRA.

6.1 Instalación de nueva cubierta

La transición de la cubierta de asbesto a la nueva cubierta tipo canaleta en este proyecto ha sido llevada a cabo con precisión técnica y una supervisión detallada en todas las etapas del proceso. Desde la planificación hasta la ejecución, cada aspecto técnico ha sido minuciosamente verificado, asegurando la conformidad con los estándares de instalación y proporcionando una solución integral y eficiente. Este enfoque garantiza no solo el cumplimiento de los requisitos técnicos, sino también la creación de entornos intervenidos que cumplen con los más altos estándares de funcionalidad y seguridad. A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta la ejecución precisa de esta actividad. No sin antes mencionar que durante este periodo se culmino con la totalidad de la instalación de cubierta, verificando la no presencia de infiltraciones en las zonas intervenidas. Se realizo el seguimiento con el caballete y los flanches perimetrales en cada uno de los ambientes.



Ilustración 1 Zonas intervenidas con nueva cubierta.

De igual manera, se realizó la instalación de los caballetes y flanches para evitar el ingreso de agua en las juntas de la cubierta. A continuación, se adjunta registro fotográfico de esta actividad.



Ilustración 2 Instalación de caballete y flanches



Ilustración 3 instalación de cubierta

6.2 Instalación de drywall

La transición exitosa de la cubierta de asbesto a la nueva cubierta tipo canaleta en el marco de este proyecto ha sido meticulosamente gestionada, enfocándose especialmente en la instalación de la estructura y el alistamiento del cielorraso de drywall. Desde la fase inicial de planificación hasta la ejecución práctica, esta interventoría ha demostrado un compromiso a fin de cumplir con la precisión técnica y la supervisión detallada en cada etapa del proceso.

Durante este período, se ha llevado a cabo con éxito la instalación de la estructura de drywall, asegurando una base sólida y conforme a los estándares requeridos. La fijación de las láminas de drywall ha sido realizada con destreza, seguida de un meticuloso proceso de masillado que ha preparado las áreas intervenidas para la aplicación de la pintura final.

Además, cabe destacar que la preparación para la pintura no ha sido solo un paso estético; cada área ha sido examinada minuciosamente para garantizar la ausencia de defectos y asegurar un acabado de alta calidad. Este enfoque no solo asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos, sino que también contribuye a la creación de entornos intervenidos que cumplen con estándares de funcionalidad y seguridad.

En conjunto, la culminación de la instalación de la cubierta ha sido respaldada por un seguimiento detallado, incluyendo la verificación exhaustiva de la impermeabilización en las zonas intervenidas. Se han realizado inspecciones adicionales, utilizando el caballete y verificando los flanches perimetrales en cada uno de los ambientes, para garantizar la integridad estructural y funcional de las áreas intervenidas.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta de manera visual y detallada la ejecución precisa de estas actividades, proporcionando una visión clara del progreso alcanzado en la transición de la cubierta.



Ilustración 4 Instalación de estructura de drywall, frescasa y Laminas.

Se realizo la preparación del drywall en cada uno de los ambientes, verificando la nivelación de su superficie y alistando la misma para la aplicación de pintura. A continuación, se presenta registro fotográfico de esta actividad.



Ilustración5 Preparación para pintura de nuevo cielorraso en drywall

6.3 Preparación de Superficies y aplicación de pintura

La transición de la cubierta de asbesto a la nueva cubierta tipo canaleta en este proyecto ha avanzado con éxito, destacando ahora el paso crucial de la preparación de superficies para la aplicación de pintura. La meticulosa instalación de la estructura de drywall y la aplicación de las láminas, seguida de un detallado proceso de masillado, han sentado las bases para una superficie que ahora se encuentra en la fase de alistamiento para la pintura final.

La preparación de las superficies desempeña un papel crucial en la calidad estética y durabilidad del proyecto. Cada área intervenida ha sido sometida a un riguroso proceso de lijado, relleno de imperfecciones y aplicación de selladores para lograr una superficie uniforme y receptiva a la pintura. Este enfoque garantiza no solo la estética visual, sino también la durabilidad a largo plazo de la aplicación de pintura.

Durante este periodo, se ha prestado especial atención a la selección de productos y técnicas de preparación, asegurando la adherencia óptima de la pintura y la resistencia al desgaste. Además, se han implementado medidas para minimizar la acumulación de polvo y garantizar un entorno de trabajo limpio y seguro.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta la preparación de superficies, proporcionando una visión detallada del progreso alcanzado en esta etapa del proyecto.



Ilustración6 Aplicación de Pintura en Drywall

Adicionalmente se realiza la instalación de luminarias en cada uno de los ambientes intervenidos y que se ha culminado la aplicación de pintura. A la fecha se presenta instalación de luminarias en el ambiente de dirección, a continuación, se puede observar registro fotográfico de la ejecución de esta actividad.



Ilustración 7 Aplicación de pintura e instalación de luminarias.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades técnicas realizadas en el marco de este proyecto de cambio de cubiertas, que abarcan desde el desmonte de cubierta en Asbesto, la instalación de la nueva cubierta tipo canaleta, la estructura de drywall y hasta la culminación de ambientes con pintura e instalación de luminarias, han demostrado el compromiso de esta interventoría con el seguimiento y verificación de la correcta ejecución de cada una de las actividades. A continuación, se presentan algunas conclusiones en cuanto a cada una de las actividades principales inmersas en el presente proyecto.

7.1 Desmonte de Cubierta existente e instalación de nueva cubierta tipo canaleta.

- La instalación de la nueva cubierta tipo canaleta se ha llevado a cabo en su totalidad, garantizando una transición exitosa desde la cubierta de asbesto. La precisión técnica durante la instalación asegura no solo la funcionalidad estructural sino también la conformidad con los requisitos normativos y evitando filtraciones en la misma.

- Se ha garantizado el estricto cumplimiento de todas las normativas y regulaciones pertinentes durante el retiro del asbesto cemento y la instalación de la nueva cubierta, priorizando la seguridad del personal involucrado en el manejo del Asbesto Cemento.

- A la fecha ya se realizo el retiro de las instalaciones del SENA la totalidad de la cubierta retirada de Asbesto cemento, realizando la disposición de la misma en los lugares autorizados.

- La instalación de la nueva cubierta se ha llevado a cabo con un enfoque detallado y de calidad, garantizando la durabilidad y eficiencia del nuevo sistema, así como su integración adecuada con la estructura existente.

- Durante el desmonte e instalación de cubierta, se mantuvo un monitoreo continuo de los aspectos relacionados con la seguridad, implementando medidas preventivas y correctivas para salvaguardar la integridad de los trabajadores y del entorno.

7.2 Desmonte de cielorraso existente e instalación de nuevo drywall.

- La actualización de la estructura de drywall ha sido implementada con éxito, proporcionando una base sólida y moderna para el proyecto. Este cambio se ha realizado con precisión técnica, asegurando una adaptación efectiva a las necesidades específicas del proyecto.

- La instalación del drywall, complementada con la aplicación de frescasa, genera que los ambientes presenten menores temperaturas generando un aislamiento de la temperatura de cubierta y de esta manera generando ahorro ene l consumo de energía.

- Se ha llevado a cabo un seguimiento técnico exhaustivo durante todas las etapas de la instalación del Drywall, garantizando la adherencia a los estándares y especificaciones técnicas establecidos.

- A la fecha se presentan importantes retrasos en la zona de hotelería y turismo, en estos ambientes se evidencia el retraso en la instalación de Frescasa y de laminas de drywall , así como la preparación de las superficies para la aplicación de pintura.

- En la zona de dirección se presenta el mayor avance de Instalación y preparación para pintura de dicha estructura de cielorraso.

- La meticulosa verificación de la nivelación ha sido prioritaria, asegurando que cada elemento de Drywall se ajuste con precisión, cumpliendo con los requisitos técnicos para un resultado homogéneo.

7.3 Preparación y aplicación de pintura.

La preparación de superficies para la aplicación de pintura ha sido una fase esencial en el proyecto, destacando la importancia de esta actividad para lograr resultados estéticos de alta calidad y una durabilidad a largo plazo. A continuación, se presentan algunas conclusiones específicas de esta etapa:

- La preparación detallada de superficies para la aplicación de pintura ha sido llevada a cabo de manera rigurosa. Procesos como el lijado, relleno de imperfecciones y la aplicación de selladores aseguran una base uniforme y óptima para la pintura, contribuyendo a la estética y durabilidad a largo plazo.

- La culminación de ambientes con la aplicación de pintura e instalación de luminarias marca una fase importante del proyecto. La coordinación efectiva de estas actividades asegura no solo la finalización estética, sino también la funcionalidad y seguridad de los espacios intervenidos, a la fecha se encuentran en fase de finalización de pintura el ambiente de dirección regional.

- La preparación de superficies ha resultado en una base uniforme y receptiva, esencial para garantizar una aplicación de pintura suave y homogénea. Cada área

intervenida ha sido sometida a procesos de lijado y relleno de imperfecciones, contribuyendo a la creación de ambientes estéticamente agradables.

- La preparación exhaustiva ha dejado los ambientes en condiciones óptimas para la aplicación de pintura. La eliminación de irregularidades y la creación de una superficie uniforme aseguran que la pintura se adhiera de manera efectiva y proporcione resultados visuales de alta calidad.

- Esta interventoría realiza el seguimiento en la aplicación de la pintura en cada uno de los ambientes, realizando las sugerencias pertinentes al contratista a fin de contar con un correcto terminado de las actividades.

7.4 Observaciones Generales.

- Se le han realizado distintos requerimientos al contratista durante el presente periodo a fin de que coordine estrategias a fin de mitigar retrasos presentados, al evaluar que los rendimientos de obra no han sido los proyectados inicialmente.

- A la fecha se presentan considerables retrasos en el ambiente de Hotelería y Turismo, con lo cual se le reitera la Solicitud al contratista de implementar medidas a fin de mitigar retrasos, sugiriéndole el aumento en el numero de cuadrillas a fin de cumplir con los tiempos estipulados en el contrato.

- Se han presentado imprevistos al momento de realizar la instalación de la Frescasa y el drywall en los ambientes del bloque D y/o Hotelería y turismo, puesto que se pudo evidenciar que se presentaban filtraciones en la Viga Canal en la cual convergen las aguas de toda esta cubierta, cuya reparación no corresponde a la ejecución del presente contrato y debimos coordinarnos con quien realizo esta reparación instalando un manto impermeabilizante en la misma. Actividad por la cual las actividades en esta zona no continuaron su avance debido a que la cubierta instalada tuvo que ser retirada en parte para la instalación del manto. Por lo anteriormente expuesto no se pudo avanzar en la instalación de frescasa y Drywall en todos estos ambientes debido a que no se encontraba totalmente impermeabilidad la cubierta y la humedad en el drywall genera un daño inminente en el mismo. Este retraso llevo a una para de aproximadamente doce días en la ejecución.

- En el ambiente de Logística, las ventanas existentes que colindan con el parqueadero se encontraban sueltas y con riesgo de colapso, por lo cual se hizo necesario el reforzamiento de las mismas y generar una nueva estructura de sujeción a fin de garantizar su estabilidad y correcta sujeción.

Esta interventoría reitera su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la calidad en todas las fases del proyecto, asegurando el éxito en el retiro de cubiertas de asbesto

cemento y la instalación de la nueva cubierta. La instalación del nuevo cielorraso en drywall y la aplicación de pintura y terminación de cada uno de los ambientes intervenidos.

Al presente informe se anexan los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo del personal adscrito a la ejecución de obra.

Ing. **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**.
Interventor Externo.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL."

CONTRATISTA:
Ing. JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ V.



SENA REGIONAL TOLIMA.
Ibagué Tolima

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3

1.2. PERSONAL DE LA OBRA..... 3

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES..... 4

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A) 5

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES. 7

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 7

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 7

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO..... 8

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS 8

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS 8

1.6. REGISTROS DE INSPECCION 8

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS.... 10

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION 11

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD DEL PERIODO 28 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO /24 11

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 12

1.8.1. ORDEN Y ASEO 12

1.8.2. MANEJO DE ASBESTO..... 13

1.8.3. DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 14

1.9 ANEXOS 17

1.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del contrato a ejecutar es: contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) del contrato de obra cuyo objeto es diseño y construcción de cubierta para las edificaciones del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional."

1.2. PERSONAL DE LA OBRA

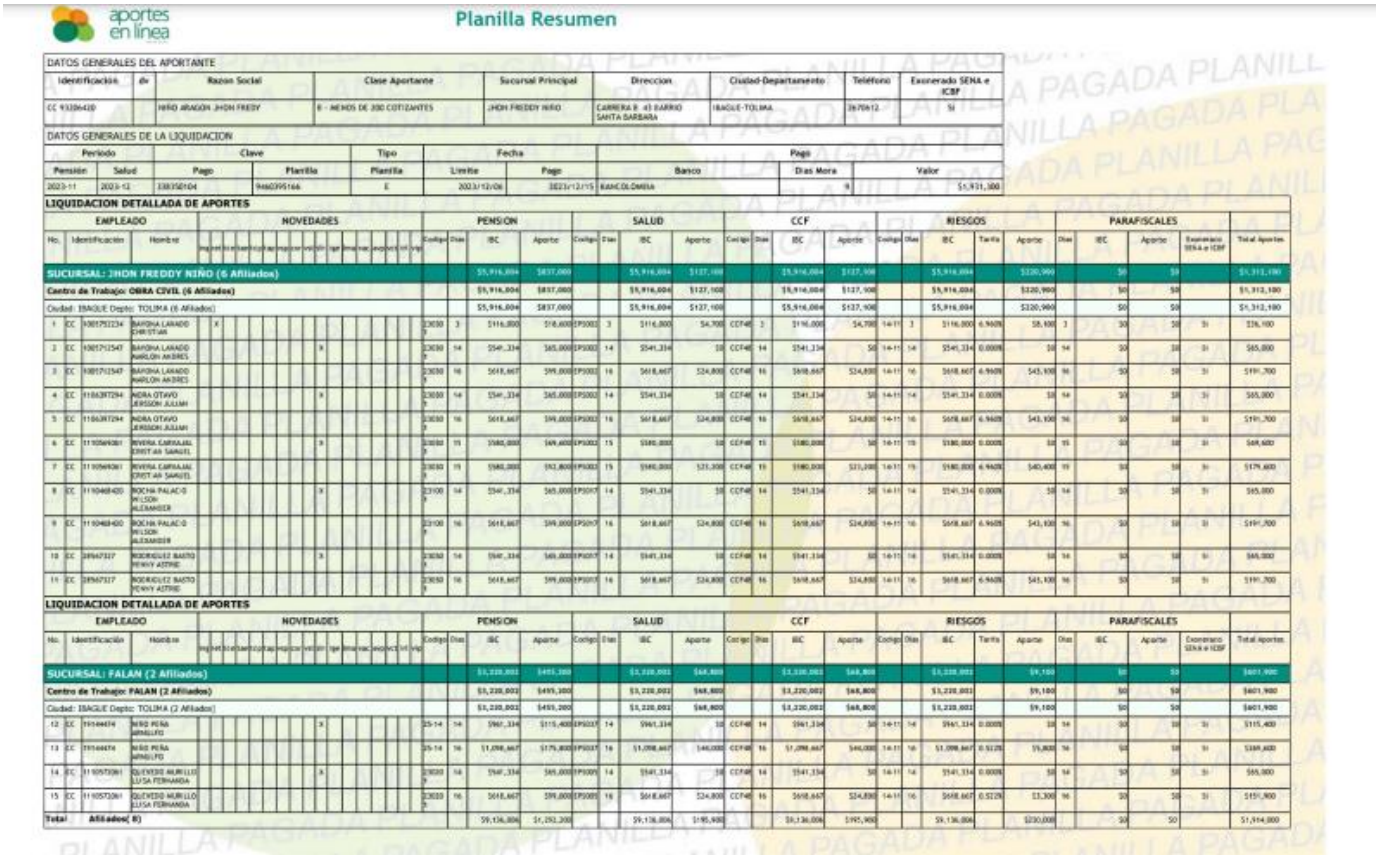
Se relaciona a continuación personal en el periodo comprendido del 28 de diciembre al 15 de enero

CEDULA		CARGO	ACTIVO
1005712547	MARLON BAYONA	AYUDANTE	SI
1110569061	CRISTIAN RIVERA	INGENIERO RESIDENTE	SI
1110468420	WILSON ROCHA	OFICIAL	SI
28567327	YENNY RODRIGUEZ	SGSST	SI
1106397294	JERSON MORA	SOLDADOR	SI
1005719345	OBRAYHAM SMITH AGUIAR OSPINA	AYUDANTE	SI
1104694600	JERSON DAVID VALLEJO SEPÚLVEDA	AYUDANTE	SI
1110579595	JUAN DAVID ROJAS OTAVO	AYUDANTE	SI
1005771910	DANIEL FELIPE VILLANUEVA	AYUDANTE	SI
7687765	WILIAN SILVA CUELLAR	AYUDANTE	SI
1110511762	EUDER CAMILO SILVA	OFICIAL	SI
1110579026	VICTOR MANUEL OLIVAR GARCÍA	SOLDADOR	SI
1110530011	LUIS FELIPE TRIANA SAAVEDRA	AYUDANTE	SI
93399767	CESAR AUGUSTO PARRA TIQUE	AYUDANTE	SI

CEDULA		CARGO	ACTIVO
1110537579	JOHN FERNEY REY TELLEZ	AYUDANTE	SI
1007166780	JOSÉ EBER BASTA CIFUENTES	AYUDANTE	SI

1.3. REGISTO DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES

Desde interventoría se realiza verificación de las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal, pro de cumplir con todos los requisitos legales.
se adjunta imagen de la planilla la cual se adjunta como anexo al presente documento.



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93386420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	338350104	94602995166	E	2023/12/06	2023-12-15	BANCOLOMBIA	9	$1,931,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)						$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$320,900		$0	$0		$1,312,100
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)						$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$320,900		$0	$0		$1,312,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$320,900		$0	$0		$1,312,100
1	CC	1001751234	BARONA LARADO CHRISTIAN	X		23030	3	$116,000	$16,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF40	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$26,100
2	CC	1001751547	BARONA LARADO MARLON ANDRES		X	23030	14	$541,334	$65,000	EPS002	14	$541,334	$0	CCF40	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
3	CC	1001751547	BARONA LARADO MARLON ANDRES			23030	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF40	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
4	CC	1106287294	MORA OTAVO JERSSON JULIAN		X	23030	14	$541,334	$65,000	EPS002	14	$541,334	$0	CCF40	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
5	CC	1106287294	MORA OTAVO JERSSON JULIAN			23030	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF40	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
6	CC	1110569081	RIVERA CARVAJAL CRISTIAN SAMUEL		X	23030	15	$580,000	$69,600	EPS002	15	$580,000	$0	CCF40	15	$580,000	$0	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$69,600
7	CC	1110569081	RIVERA CARVAJAL CRISTIAN SAMUEL			23030	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
8	CC	1110468400	ROCHA PALACIO WILSON ALEXANDER		X	23030	14	$541,334	$65,000	EPS017	14	$541,334	$0	CCF40	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
9	CC	1110468400	ROCHA PALACIO WILSON ALEXANDER			23030	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$24,800	CCF40	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
10	CC	28967317	RODRIGUEZ BASTO YENNY ASTRID		X	23030	14	$541,334	$65,000	EPS017	14	$541,334	$0	CCF40	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
11	CC	28967317	RODRIGUEZ BASTO YENNY ASTRID			23030	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$24,800	CCF40	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FALAN (2 Afiliados)						$3,220,001	$495,300			$3,220,001	$68,800			$3,220,001	$68,800			$3,220,001		$9,100		$0	$0		$601,900
Centro de Trabajo: FALAN (2 Afiliados)						$3,220,001	$495,300			$3,220,001	$68,800			$3,220,001	$68,800			$3,220,001		$9,100		$0	$0		$601,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,220,001	$495,300			$3,220,001	$68,800			$3,220,001	$68,800			$3,220,001		$9,100		$0	$0		$601,900
12	CC	79144474	NIÑO PEÑA ARNULFO		X	25-14	14	$961,334	$115,400	EPS017	14	$961,334	$0	CCF40	14	$961,334	$0	14-11	14	$961,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$115,400
13	CC	79144474	NIÑO PEÑA ARNULFO			25-14	16	$1,098,667	$175,800	EPS017	16	$1,098,667	$40,000	CCF40	16	$1,098,667	$40,000	14-11	16	$1,098,667	0.512%	$5,800	16	$0	$0	SI	$389,600
14	CC	1110573061	QUEVEDO MURILLO LUISA FERNANDA		X	23030	14	$541,334	$65,000	EPS005	14	$541,334	$0	CCF40	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
15	CC	1110573061	QUEVEDO MURILLO LUISA FERNANDA			23030	16	$618,667	$99,000	EPS005	16	$618,667	$24,800	CCF40	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	0.512%	$3,300	16	$0	$0	SI	$191,900
Total	Afiliados(8)					$9,136,006	$1,292,200			$9,136,006	$195,600			$9,136,006	$195,600			$9,136,006		$330,000		$0	$0		$1,914,000

Ilustración 1 Seguridad social

1.3.1. SOPORTES DE APTITUD PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (CERTIFICADOS DE ENTRENAMIENTO TSA Y/O REENTRENAMIENTO T.S.A)

Dando cumplimiento al programa de trabajo seguro en alturas, desde interventoría se hace verificación de los cursos de alturas del personal nuevo.

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JERSSON JULIAN MORA OTAVO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1106397294, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS TRABAJADOR AUTORIZADO
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: ISRAEL ARDILA MUNOZ ARDILA
ENTRENADOR: FABIO GALLO PULIDO
SEDE DONDE SE FORMÓ: ISRAEL MUÑOZ ARDILA (I.M.A)
EMPLEADOR: JHON FREDY NI?O ARAGON
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SECTOR ECONÓMICO: SECTOR DE LA CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 22/10/2023 a 25/10/2023
INTENSIDAD HORARIA: 32 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Ilustración 2 Verificación curso de alturas

1.4. INDICADORES DE GESTION Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAES GENERALES Y LABORALES.

1.4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Buscando la mejora continua en el SGSST, la interventoría realiza seguimiento a los indicadores de accidentalidad en el periodo del 28 de diciembre hasta el 15 de enero, no se presentaron incidentes y accidentes.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD									
MES	N° de AT	HHT	N° Días Perdidos por AT	No. AT Graves	No. Trabajadores Mes	I.F AT	I.S. AT	ILI 2023	Tasa AT
DICIEMBRE	12	1428	0	0	12	0	0	0	0
TOTAL	**12**	1428	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0%**

I.F: INDICE DE FRECUENCIA ACCIDENTES DE TRABAJO

I.S: INDICE DE SEVERIDAD ACCIDENTES DE TRABAJO

I.L.I: INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

1.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En el periodo comprendido entre el 28 de diciembre al 15 de enero no se presentaron Accidentes labores ni incidentes.

1.4.3 INDICADORES DE AUSENTISMO

Durante el periodo del 28 de diciembre al 15 de enero de 2024, no se presentaron ausentismos.

INDICADORES DE AUSENTISMO								
MES	No. De trabajadores	No. de casos existentes de EG	No. Casos existentes de EL	No. Casos Nuevos EL	N° Días Perdidos por EG	Incidencia EL	Prevalencia general de la EL	Prevalencia global de la EG 2023
NOVIEMBRE	12	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTUALES	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.5. HISTORICO DE CASOS REPORTADOS

N/A

1.5. PLAN DE EMERGENCIAS

En aras de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores cuenta con un plan de emergencias y con los equipos requeridos para atender cualquier eventualidad, ajustado para el contrato.

GRUPO (LUGAR)	ELEMENTO DE EMERGENCIA	CANTIDAD
AREA DE HOTELERIA	BOTIQUIN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

1.6. REGISTROS DE INSPECCION

1.6.1. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DEL BUEN USO DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

Durante las diferentes actividades que se desarrollan en el proyecto, interventoría verifica que si se lleve a cabo la entrega de los EPP adecuados para cada actividad, como lo es manejo de tejas de asbesto, instalación de teja, instalación de estructura para drywall, manejo de frescasa.

INSPECCION	COLABORADOR	EPP	ESTADO
1005712547	MARLON BAYONA	SI	BUENO
1110569061	CRISTIAN RIVERA	SI	BUENO
1110468420	WILSON ROCHA	SI	BUENO
28567327	YENNY RODRIGUEZ	SI	BUENO
1106397294	JERSON MORA	SI	BUENO
1005719345	OBRAYHAM SMITH AGUIAR OSPINA	SI	BUENO
1104694600	JERSON DAVID VALLEJO SEPÚLVEDA	SI	BUENO
1110579595	JUAN DAVID ROJAS OTAVO	SI	BUENO
1005771910	DANIEL FELIPE VILLANUEVA	SI	BUENO
7687765	WILIAN SILVA CUELLAR	SI	BUENO
1110511762	EUDER CAMILO SILVA	SI	BUENO
1110579026	VICTOR MANUEL OLIVAR GARCÍA	SI	BUENO
1110530011	LUIS FELIPE TRIANA SAAVEDRA	SI	BUENO
93399767	CESAR AUGUSTO PARRA TIQUE	SI	BUENO
1110537579	JOHN FERNEY REY TELLEZ	SI	BUENO
1007166780	JOSÉ EBER BASTA CIFUENTES	SI	BUENO

NOTA: En estado General de Inspección se debe especificar si es Bueno (B), Regular (R), Malo (M)

1.6.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

INSPECCION	COLABORADOR	ARNES	ESTADO
1005712547	MARLON BAYONA	SI	BUENO
1110569061	CRISTIAN RIVERA	SI	BUENO
1110468420	WILSON ROCHA	SI	BUENO
28567327	YENNY RODRIGUEZ	SI	BUENO
1106397294	JERSON MORA	SI	BUENO
1005719345	OBRAYHAM SMITH AGUIAR OSPINA	SI	BUENO
1104694600	JERSON DAVID VALLEJO SEPÚLVEDA	SI	BUENO
1110579595	JUAN DAVID ROJAS OTAVO	SI	BUENO
1005771910	DANIEL FELIPE VILLANUEVA	SI	BUENO
7687765	WILIAN SILVA CUELLAR	SI	BUENO
1110511762	EUDER CAMILO SILVA	SI	BUENO
1110579026	VICTOR MANUEL OLIVAR GARCÍA	SI	BUENO
1110530011	LUIS FELIPE TRIANA SAAVEDRA	SI	BUENO
93399767	CESAR AUGUSTO PARRA TIQUE	SI	BUENO
1110537579	JOHN FERNEY REY TELLEZ	SI	BUENO
1007166780	JOSÉ EBER BASTA CIFUENTES	SI	BUENO

Nota: las inspecciones se realizan a diario de estos equipos de protección contra caídas, se cuenta con 5 arnés completos los cuales son distribuidos según la actividad.

1.6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas. Se debe elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas, los cuales deben ser fácilmente entendibles y comunicados a los trabajadores desde los procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada. Desde interventoría se realiza un seguimiento al personal que está trabajando en alturas que sea certificado y el buen manejo de los elementos de seguridad.

INSPECCION	SISTEMA DE ACCESO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	OBSERVACIONES
DIARIA	ANDAMIO TUBULAR PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	Bueno

1.7. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACION

Dando cumplimiento con el cronograma de charas y capacitaciones del SGSST, la interventoría verifica que se realicen

1.7.1. LISTADO DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDAD MES DESDE EL 28 DICIEMBRE /23 AL 15 DE ENERO /24

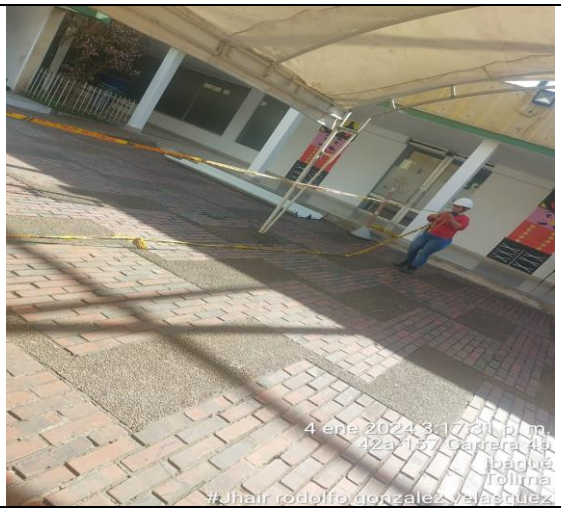
FECHA	TEMA	TIPO
09-01-2024	Accidente e incidente	charla
10-01-2024	Orden y aseo	charla
11-01-2024	Cuidado de oídos	charla
12-01-2024	Vibraciones	charla

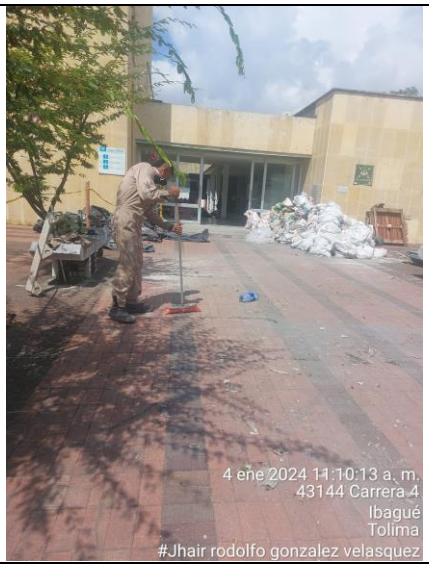
13-01-2024	Cuidado de ojos	charla
15-01-2024	Uso de las 3 R	charla

1.8. REGISTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

1.8.1. ORDEN Y ASEO

El programa de orden y aseo conjunto de actividades tendientes a mejorar en forma continua las condiciones de trabajo, elevando la cantidad, la productividad, la salud y la satisfacción en el trabajo. Estos programas se crean con el fin de crear y desarrollar hábitos y rutinas seguras, desde la interventoría hacemos seguimiento del cumplimiento de este programa.

	
Observaciones: Protección adecuada de teja de asbesto	Observaciones: Señalización de área de descargue de teja

	
Observaciones: Orden y aseo de acopio para teja	Observaciones: Orden y aseo

1.8.2. MANEJO DE ASBESTO

Las tejas que contienen asbesto, comienzan a descomponerse con el tiempo, pueden encontrarse fibras de asbesto en el aire interior, lo que pudiera representar una amenaza para la salud humana. es por esto que se realiza un protocolo de manejo de adecuado de asbesto, donde se realiza una aspersión de glicerina para luego protegerlas con vinipel para llevarlas al acopio provisional para su disposición final al terminar la actividad de cambio de cubiertas.

.

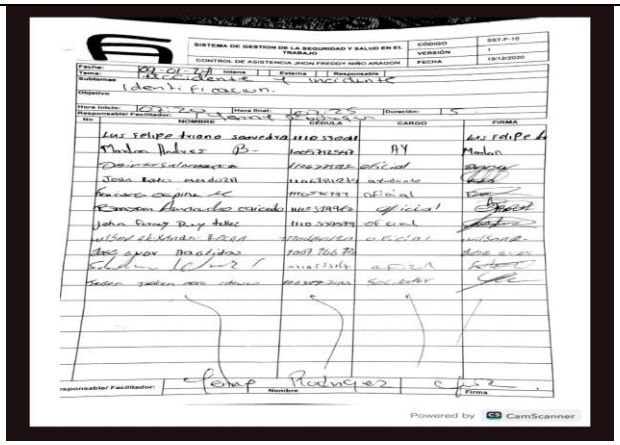
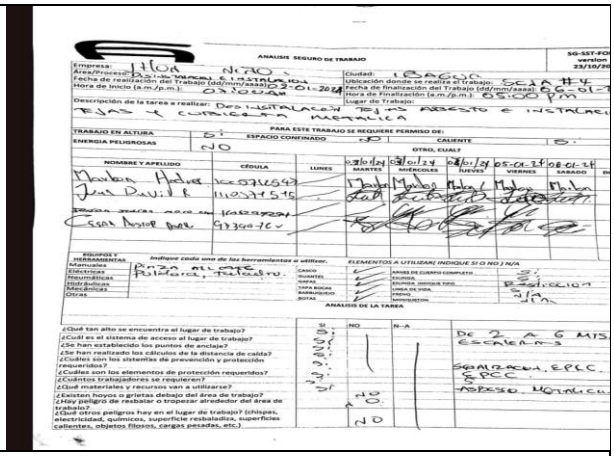
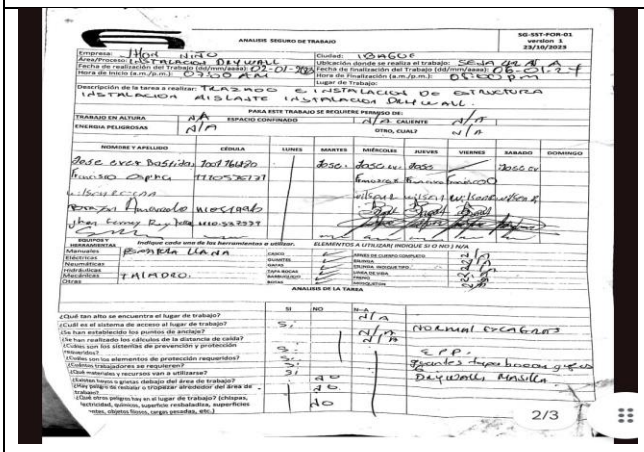
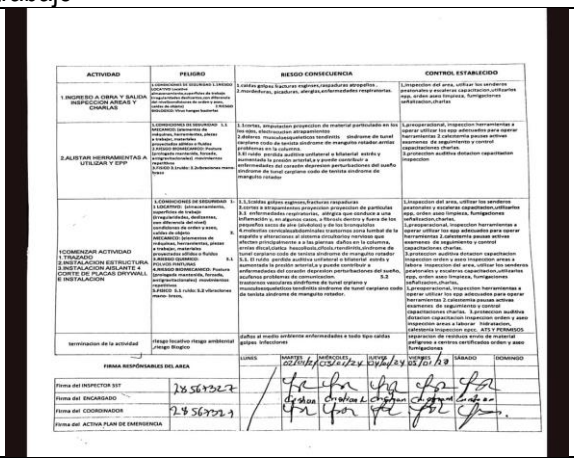
	
Observaciones: : Acopios cubiertos de tejas	Observaciones: Disposición final de teja

1.8.3. DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

Se realiza retiro de teja de asbesto para disposición final, como se estipula en el protocolo.

	
Observaciones: Disposicion de teja	Observaciones: Retiro de teja

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Observaciones: Charlas de capacitación</td><td>Observaciones: Verificación de permisos de trabajo</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Observaciones: Análisis de trabajo seguro</td><td>Observaciones: Identificación de riesgos</td></tr>
</table>

	
Observaciones: Inspección de equipos	Observaciones: Entrega de EPP
	
Observaciones: Calistemia	Observaciones: Verificación de protocolo tejas y alturas

1.9 ANEXOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	338350104	9460395166	E	2023/12/06	2023/12/15	BANCOLOMBIA	9	$1,931,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

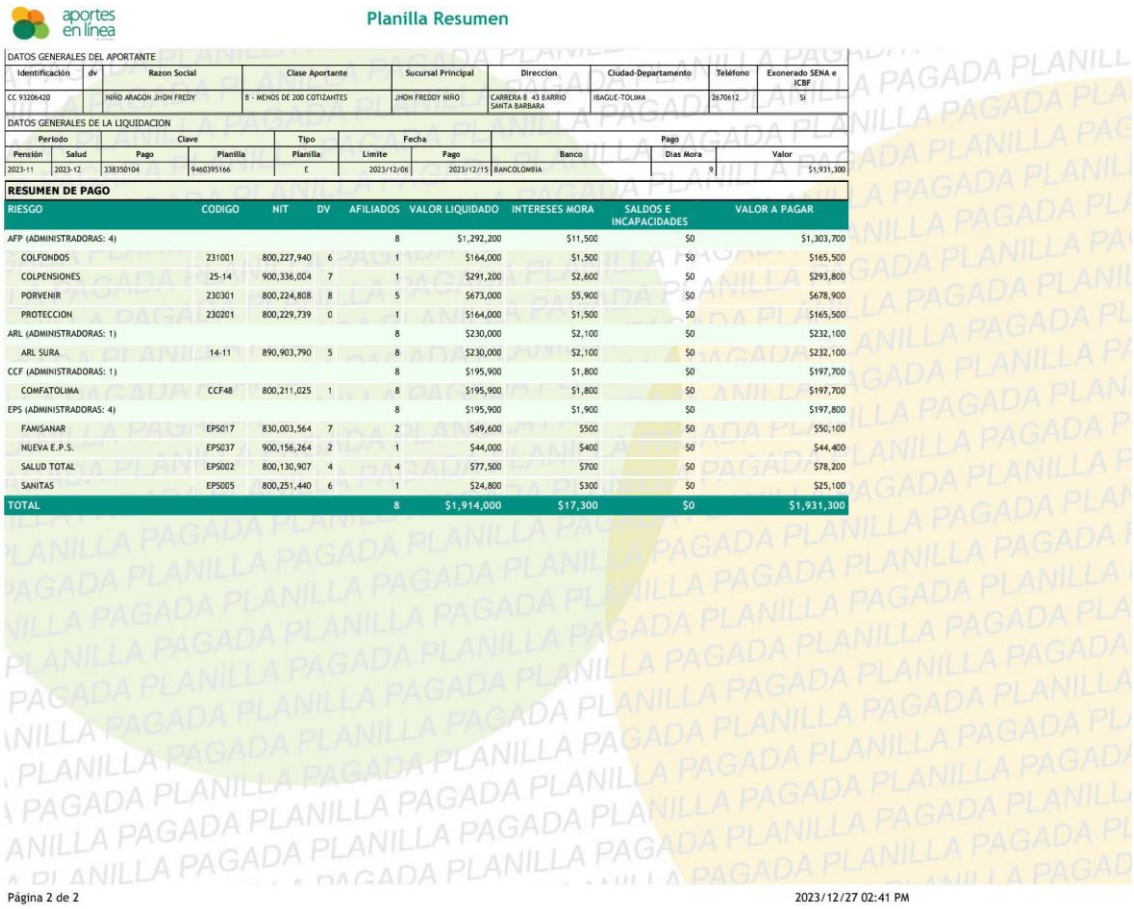
No.	EMPLEADO			NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tce	tae	tce	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JHON FREDDY NIÑO (6 Afiliados)																							$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$220,900		$0	$0		$1,312,100
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (6 Afiliados)																							$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$220,900		$0	$0		$1,312,100
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																							$5,916,004	$837,000			$5,916,004	$127,100			$5,916,004	$127,100			$5,916,004		$220,900		$0	$0		$1,312,100
1	CC	1005752234	BAYONA LAVADO CHRISTIAN	X																	23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
2	CC	1005712547	BAYONA LAVADO MARLON ANDRES										X								23030 1	14	$541,334	$65,000	EPS002	14	$541,334	$0	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
3	CC	1005712547	BAYONA LAVADO MARLON ANDRES																		23030 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF48	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
4	CC	1106397294	MORA OTAVO JERSSON JULIAN										X								23030 1	14	$541,334	$65,000	EPS002	14	$541,334	$0	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
5	CC	1106397294	MORA OTAVO JERSSON JULIAN																		23030 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF48	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
6	CC	1110569061	RIVERA CARVAJAL CRISTIAN SAMUEL										X								23030 1	15	$580,000	$69,600	EPS002	15	$580,000	$0	CCF48	15	$580,000	$0	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$69,600
7	CC	1110569061	RIVERA CARVAJAL CRISTIAN SAMUEL																		23030 1	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF48	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
8	CC	1110468420	ROCHA PALACIO WILSON ALEXANDER										X								23100 1	14	$541,334	$65,000	EPS017	14	$541,334	$0	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
9	CC	1110468420	ROCHA PALACIO WILSON ALEXANDER																		23100 1	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$24,800	CCF48	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
10	CC	28567327	RODRIGUEZ BASTO YENNY ASTRID										X								23030 1	14	$541,334	$65,000	EPS017	14	$541,334	$0	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
11	CC	28567327	RODRIGUEZ BASTO YENNY ASTRID																		23030 1	16	$618,667	$99,000	EPS017	16	$618,667	$24,800	CCF48	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tce	tae	tce	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FALAN (2 Afiliados)																							$3,220,002	$455,200			$3,220,002	$68,800			$3,220,002	$68,800			$3,220,002		$9,100		$0	$0		$601,900
Centro de Trabajo: FALAN (2 Afiliados)																							$3,220,002	$455,200			$3,220,002	$68,800			$3,220,002	$68,800			$3,220,002		$9,100		$0	$0		$601,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																							$3,220,002	$455,200			$3,220,002	$68,800			$3,220,002	$68,800			$3,220,002		$9,100		$0	$0		$601,900
12	CC	19144474	NIÑO PEÑA ARNULFO										X								25-14	14	$961,334	$115,400	EPS037	14	$961,334	$0	CCF48	14	$961,334	$0	14-11	14	$961,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$115,400
13	CC	19144474	NIÑO PEÑA ARNULFO																		25-14	16	$1,098,667	$175,800	EPS037	16	$1,098,667	$44,000	CCF48	16	$1,098,667	$44,000	14-11	16	$1,098,667	0.522%	$5,800	16	$0	$0	SI	$269,600
14	CC	1110572061	QUEVEDO MURILLO LUISA FERNANDA										X								23020 1	14	$541,334	$65,000	EPS005	14	$541,334	$0	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$65,000
15	CC	1110572061	QUEVEDO MURILLO LUISA FERNANDA																		23020 1	16	$618,667	$99,000	EPS005	16	$618,667	$24,800	CCF48	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	0.522%	$3,300	16	$0	$0	SI	$151,900
Total	**Afiliados(8)**																						$9,136,006	$1,292,200			$9,136,006	$195,900			$9,136,006	$195,900			$9,136,006		$230,000		$0	$0		$1,914,000

Página 1 de 2

2023/12/27 02:41 PM



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93206420		NIÑO ARAGON JHON FREDY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON FREDDY NIÑO	CARRERA 8 43 BARRIO SANTA BARBARA	IBAGUE-TOLIMA	2670612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	338350104	9460395166	E	2023/12/06	2023/12/15	BANCOLOMBIA	9	$1,931,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,292,200	$11,500	$0	$1,303,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$164,000	$1,500	$0	$165,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$291,200	$2,600	$0	$293,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$673,000	$5,900	$0	$678,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$164,000	$1,500	$0	$165,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$230,000	$2,100	$0	$232,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$230,000	$2,100	$0	$232,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$195,900	$1,800	$0	$197,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$195,900	$1,800	$0	$197,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$195,900	$1,900	$0	$197,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$49,600	$500	$0	$50,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$44,000	$400	$0	$44,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$77,500	$700	$0	$78,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$24,800	$300	$0	$25,100
TOTAL				8	$1,914,000	$17,300	$0	$1,931,300

Página 2 de 2

2023/12/27 02:41 PM
