TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 3	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pag. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	domingo, 29 de octubre de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		**Contrato No.**	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		**Fecha de Iniciación**	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		**Fecha de Terminación**	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	**Plazo Inicial**	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		**Valor Inicial**	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		**Adición No. 1**	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		**Valor Total del Contrato**	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	**Prórroga No. 1**		Meses
Plazo total	11.0	Meses	**Plazo total**	10	Meses
Días Transcurridos	20	**Faltantes** 316	**Días Transcurridos**	20	**Faltantes** 285
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	**3**		**SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA**		

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	0.00%	$ -	$ 3,810,890,848.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ						
	CASAS DE JUSTICIA	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	0.33%	$ 2,739,197.00	$ 827,260,803.00
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	0.05%	$ 2,739,197.00	$ 5,773,151,651.00

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	9.92%	$ 23,778,097.00	$ 216,022,857.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	2.75%	$ 1,650,000.00	$ 58,350,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	51.37%	$ 2,568,353.00	$ 2,431,647.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ						
	CASAS DE JUSTICIA	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	24.99%	$ 6,521,318.00	$ 19,578,682.00
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	10.43%	$ 34,517,768.00	$ 296,383,186.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	0.05%	$ 2,739,197.00	$ 5,773,151,651.00
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	10.43%	$ 34,517,768.00	$ 296,383,186.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	0.61%	$ 37,256,965.00	$ 6,069,534,837.00

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)",*** por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 7 CTP DE PUENTE ARANDA(24-Oct-2023):** Se requirió por parte de la Entidad apoyo para la atención falla del sistema de iluminación de la unidad de reclusión transitoria , se requiere establecer servicio de iluminación -Se evidencia el mal estado de las luminarias en las zona de requiza
- .Se realiza el mantenimiento de un tablero de 18 circuitos - Se evidencia
- Se realiza el desmonte de un reflector
- Se realiza el suministroe instalación de 1 relector de 100w

Emergencia No. 8 URI DE PUENTE ARANDA (24-Oct-2023): Se notificó por parte de la Entidad falla en el sistema de presión de agua en la unidad de reclusión, se requiera restablecer servicio de agua potable para las personas privadas de la libertad . - Se realiza inspección ocular donde se evidencia mal funcionamiento de las bombas al escucharse ruidos extraños al momento del inicio - Se evidencia fuga en los sellos de las bombas

3.2.2

- Se desmontan las bombas de 6hp para llevarlas a taller para dar diagnostico de su reparación
- Se identifica deterioro de algunos elementos que componen a está para mejor funcionamiento
- Se hacen cambios de rodamientos, sellos mecanicos y borneras
- Se procede al taller de pintura electroestatica y camara de secado

Emergencia No. 9 CAI ESTADERO (18-Oct-2023): Por requerimiento de la unidad para realizar mantenimiento general del CAI por la visita del general de la policia nacional.
Se realizan manteniento :

- Cambio de puertas con su respectiva cerradura y puerta corrediza de 2 hojas en cocineta
- Desmonte e instalación de luminarias bala panel led interiores y exteriores que se encontraban sin funcionamiento

3.2.3

- Cambio de aparatos eléctricos (interruptores y tomas)
- Sondeo de puntos sanitarios baños y cocineta -
Limpieza de canales y bajantes - Griferia
orinal,lavaplatos y lavamanos - Desvaste de
filos, remoción de pintura, estuco y pintura general en esmalte, vinilo y koraza
.

Emergencia No. 10 ESTACION POLICIA ENGATIVA (28-Oct-2023): Por requerimiento de la unidad por fuga de agua en la entrada del tanque de almacenamiento de agua potable .

- Durante la inspección se verifica que la fuga de agua potable se origino por el levantemiento de las tapas de los tanque producida por una fuerte briza

3.2.4

- Se procede hacer la reparación de rotura del tubo pvc con uniones y niples
- Se instalan tornillos para ajustar las tapas de los 4 tanques existentes

.

Emergencia No. 11 PM13 (28-Oct-2023): Por requerimiento de la unidad por fuga de agua potable en dupto de tuberia en los 3 pisos del edificio.

- Se reliza inspección para verificar las fugas presentadas en los duptos

3.2.5

- Se procede a la reparación de tuberias utilizado accesorios pvc para fracturas en tuberias y accesorios.
- Cambio de cheques
- Cambio de griferia de orinales y lavamanos
- Reparacion de bajante afectada en lamina de superboard

.

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **URI DE PUENTE ARANDA**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	2.3%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 101,758,919.20	$ 101,758,919.20	2.3%	$ 2,739,197.00	97.7%	$ 99,019,722.20
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	2.30%
Ejecutado Semanal	2.30%
Programado acumulado	2.3%
Ejecutado Acumulado	2.30%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 1	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES								
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN	UN	4.00	$ 43,439.00	$ 173,756.00	6	6	150%	$ 260.634
52	Desmonte de push sanitarios	UN	4.00	$ 19,169.00	$ 76,676.00	6	6	150%	$ 115.014
NP	sondeos	UN				6	6	#¡DIV/0!	
16	PINTURA								
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	195.80	$ 15,332.00	$ 3,002,005.60	100	100	51%	$ 1.533.200
NP	REMOCION PINTURA SUELTA MANUAL	M2	20			20	20	#¡DIV/0!	

Costo Directo	$	1.908.848
Administración	20%	$ 381.770
Imprevistos	0,5%	$ 9.544,2
Utilidad	4,0%	$ 76.353,9
IVA	19,0%	$ 362.681,1
TOTAL	**$**	**2.739.197**

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de aparatos sanitrios
Desnonte de push sanitarios
Sondeos
sobre mamposteria
manual
2.
3.
4. Esmalte
5. Remoción pintura

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL **3 AYUDANTES**	MATERIAL: Estuco y pintura esmalte HERRAMIENTAS: Varias

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 Con el fin de dar inicio con la evalaución y verificación de lso equipamientos a intervenir, se programo junto con la entidad y contratista las visitas a diferentes establecimientos.

3.3.2 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.

3.3.3 Se realizó intervención de emergencia en estacipon de policia Rafael Uribe, sin embargo los PPL no permitieron ejecutar al 100% las actividades requeridas, sin embargo se subsanó y reparó la actividad principal.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se solicitó al contratista la presentación de las hojas de vida del personal mínimo requerido.
4.2 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comitè No1
4.3 Se reitera a contratista de obra la entrega de cocumentacion de la presentacion de hojas de vida.
4.4 Se remite a contratista y a entidad progrmacion de la semana 3
4.5 Se le envia a contratista observaciones de hojas de vida

5. ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 Se realiza comite de obra #2 realizado de manera virtual entre las partes contratista, interventoria y SDSCJ.

5.2 Dando continuidad al tema de diagnósticos se realiza reunión virtual para organizar los distintos recorridos y fechas para los diagnósticos de la semana 3 y que equipamientos estarán programados.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORÍA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y CONTROL (50%)	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (25%)	1
ASESOR ELÉCTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1


*** NOTA: Las hojas de vida de este personal, se encuentran pendiente de entrega por parte del contratista y verificación y/o aprobación de la interventoria.**

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 **Junto con la solicitud de las hojas de vida del personal mínimo establecido, se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso.**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.



ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORÍA


TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


EMER 7 - CTP DE PUENTE ARANDA

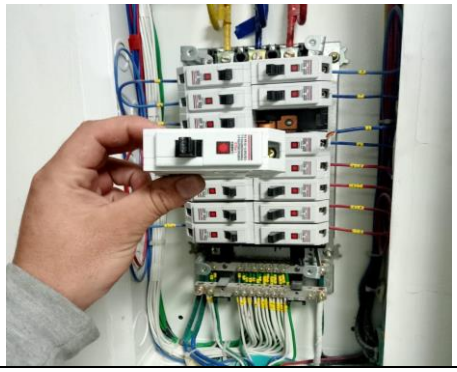


Mantenimiento de tablero de 18 circuitos



Suministro e instalación de relector de 100w

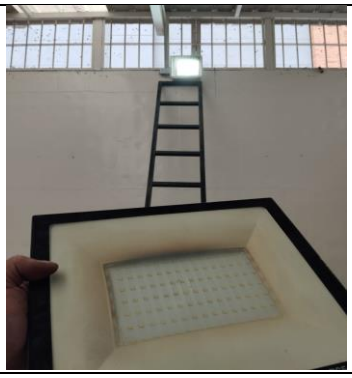

Desmonte e instalación de reflector de 100w

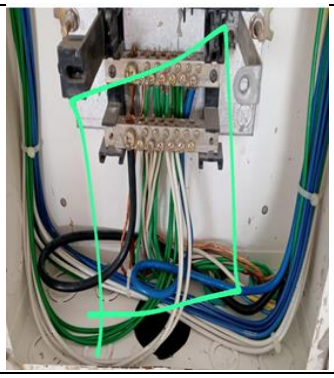

Falla electrca identificada


TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 8- URI DE PUENTE ARNDA

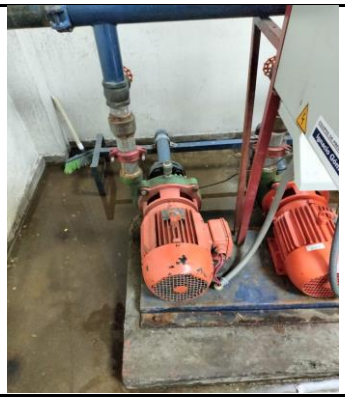

Mantenimiento preventivo Bombad de 6 HP



Revisión sistema de bombeo



Revisión de inicio de bombas





Mantenimiento Bombas taller

Retiro de residuos

Retiro de residuos

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 9 - CAI ESTADERO



Pintura koraza fachada



Desmonte de puertra cocineta



Suministro e instalación puerta corrediza en lamina cocineta



Sumi nistro e instalación luminarias exteriores panel led



TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 10 - ESTACION DE POLICIA ENGATIVA

	
Desmonte de llave	Regata y desmonte de enchape muro
	
Desmonte lavamanos para intervención y reparación de fuga	Revision de llave

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


EMER 11 - PM13



Desmonte de llave



Regata y desmonte de enchape muro

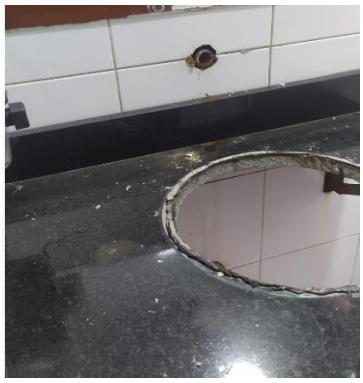

Desmonte lavamanos para intervención y reparación de fuga



Revision de llave

TOTALL INC SAS BIC	INFORME GRÁFICO SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 2	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	3	DEL	lunes, 23 de octubre de 2023	AL	domingo, 29 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - URI DE PUENTE RANDA





Desmonte de push orinal y ducha - URI



Pintura esmalte mamposteria - CTP



Remosión pintura manual y desvaste de filos CTP



Desmonte e instalción push sanitario CTP
