TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pag. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	domingo, 17 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		**Contrato No.**	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		**Fecha de Iniciación**	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		**Fecha de Terminación**	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	**Plazo Inicial**	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		**Valor Inicial**	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		**Adición No. 1**	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		**Valor Total del Contrato**	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	**Prórroga No. 1**		Meses
Plazo total	11.0	Meses	**Plazo total**	10	Meses
Días Transcurridos	69	**Faltantes** 267	**Días Transcurridos**	69	**Faltantes** 236
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	**10**		**SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA**	**10**	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	3.08%	$ 20,343,627.59	$ 3,713,966,001.47
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 96,924,846.53	
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	23.695%	$ 160,525,293.15	$ 669,474,706.85
	CASAS DE JUSTICIA					$ 36,146,257.81	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	5.44%	$ 313,940,025.08	$ 5,518,440,708.31

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	30.22%	$ 72,473,921.00	$ 167,327,033.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	284.08%	$ 14,204,033.00	-$ 9,204,033.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	84.15%	$ 21,963,966.00	$ 10,258,783.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	42.24%	$ 139,767,170.00	$ 206,460,566.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	5.44%	$ 313,940,025.08	$ 5,518,440,708.31
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	42.24%	$ 139,767,170.00	$ 206,460,566.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	7.43%	$ 453,707,195.08	$ 5,724,901,274.31

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)",*** por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 42 - SIPOL(12 -Dic -2023): Por requerimiento de la unidad por fugas de agua en red hidarulica y red sanitaria orinal co fuga de agua en sifón, al igual falla sistema electrico en segundo piso**.
- Se procede con la verificación e inspección en baño
- Se realizan los desmontes de aparatos sanitarios e hidraulicoa
- Se suminmistran e instalan grifería antivandalica para lavamanos y sifon en P y sus respectivos sondeos
- Se relizaan desmonte de lamparas y se instala 4 luminarias panel led de 18w

3.2.2 **Emergencia No. 43- ESTACION POLICIA KENNEDY(13 -Dic -2023): Por requerimiento de la unidad por falla en el sistema electrico , los aires acondicionados de las salas de monitoreo y viudeo y vigilancia no funcionan.**
- Se procede con el desmonte de accesorios eléctricos
- Se realiza mantenimiento general de un tablero de 24 circuitos

.

3.2.3 **Emergencia No. 44- ESTACION POLICIA KENNEDY(13 -Dic -2023): Por requerimiento de la unidad por falla en el sistema sistema de presión las personas privadas de la libertad no tieien agua, por lo que se requiere de manera prioritaria reestablecer el servicio.**
- Se procede con la instalación de cheque de 2" y accesorios
- Suministro e instalación de registro de agua potble de 3"

.

3.2.4 **Emergencia No. 45- C4 (14 -Dic -2023): Por requerimiento de la unidad por falla en bombas de aguas negras en el sotano toda vez que se reboso poso recolector**
- Se procede con el desmongte e instalación de bomba y se lleva al taller para su mantenimiento
- Se rempleza por un bomba de 2hp en alquiler
- Se le realiza la limpieza y desinfección de pozo de aguas lluvias

.

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 URI DE PUENTE ARANDA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	71.74%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	71.74%	$ 73,001,848.63	28.3%	$ 28,757,070.57
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0.65%	1.42%	2.2%	2.5%	2.7%	3.0%	3.4%	7.8%
Ejecutado Semanal	2.30%	13.84%	7.41%	12.33%	5.87%	18.60%	11.31%	0.12%
Programado acumulado	0.65%	2.1%	4.3%	6.8%	9.5%	12.5%	16.0%	23.0%
Ejecutado Acumulado	2.30%	16.1%	23.5%	35.84%	41.71%	60.31%	71.62%	71.74%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 8	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
329	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	4	$ 10.526,00	$ 42.104	8	8	200%	$ 84.208

Costo Directo	$		84.208
Administración	20%	$	16.842
Imprevistos	0,5%	$	421,0
Utilidad	4,0%	$	3.368,3
IVA	19,0%	$	15.999,5
TOTAL	$		120.838

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Tubería EMT de 1/2" suspendida

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	MATERIAL: Tubería EMT de 1/2" HERRAMIENTAS: Varias

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	62.06%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	62.06%	$ 87,523,444.52	37.9%	$ 53,506,920.48
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL						


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	1.28%	1.57%	1.74%	1.97%	4.35%	10.43%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	11.05%	10.97%	24.17%
Programado acumulado	1.28%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%	21.26%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%	62.06%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 6	CANTIDAD ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES								
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2	8,75	$ 18.829,00	$ 164.754	8,75	8,75	100%	$ 164.754
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P' ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	10	43.419,000	$ 434.390	7,00	7,00	70%	$ 304.073
46	Desmonte de sifones	UN	9	6.169,000	$ 55.521	1,00	1,00	11%	$ 6.169
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	10	$ 15.168	$ 151.680	2,00	10,00	100%	$ 30.336
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	16	$ 3.741,00	$ 59.856	8,00	9,00	56%	$ 29.928
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS								
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y	UN	17	$ 42.207,00	$ 717.519	1,00	21,00	124%	$ 42.207
282	Suministro e instalación de cancamo y anclaje para hamaca de 1/2" x 3".	UN	6	$ 16.438,00	$ 98.628	6,00	6,00	100%	$ 98.628
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
308	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	2	$ 80.763,00	$ 161.526	2,00	2,00	100%	$ 161.526
311	Punto electrico para toma corriente doble.	UN	4	$ 58.577,00	$ 234.308	8,00	8,00	200%	$ 468.616
313	Suministro e instalación de toma regulada.	UN	6	$ 49.484,00	$ 296.904	4,00	4,00	67%	$ 197.936
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	16,00	$ 22.943,00	$ 367.088	4,00	4,00	25%	$ 91.772
331	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	53,85	$ 17.077,00	$ 919.596	53,85	53,85	100%	$ 919.596
343	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	2,00	$ 30.928,00	$ 61.856	2,00	2,00	100%	$ 61.856
368	Suministro e instalacion de caja metalica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plastico y adtadores terminal EMT 1/2"	ML	13,00	$ 88.417,00	$ 1.149.421	13,00	13,00	100%	$ 1.149.421
410	Desmonte de canaleta metalica de tomas y voz y datos. Incluye retiro de sobrantes	ML	56,85	$ 6.460,00	$ 367.251	56,85	56,85	100%	$ 367.251
10	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES								
509	Mantenimeinto de cubierta metalica. Incluye tomillos de fijacion, sikaflex para sellado y reemplazo de tejas en mal estado en alturas iguales o inferiores a 8 metros	M2	1006,84	$ 19.303,00	$ 19.435.033	1006,84	1006,84	100%	$ 19.435.033
13	ILUMINACION								
680	Suministro e instalación de Reflector de 100W	UN	4	$ 229.526,00	$ 918.104	1,00	7,00	175%	$ 229.526

Costo Directo	$		23.758.628
Administracion		20%	$ 4.751.726
Imprevistos		0,5%	$ 118.793,1
Utilidad		4,0%	$ 950.345,1
IVA		19,0%	$ 4.514.139,3
TOTAL	$		34.093.631

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Cerramiento provicional
2. Desmonte de aparatos sanitarios
3. Desmonte de sifones
4. Desmonte de lamparas
5. Sondeo de puntos sanitarios
6.Suministro e instalación cancamo de alclajes
7.Salida para lamparas fluorecentes emt
8. Punto electrico para toma corriente doble
9. Suministro e instalación tomacorriente doble
10. Suministro e instalación toma regulada
11. Suminstro e instalación toma corriente doble
12. Tuberia EMT de 1"
13. Interruptor automatico enchefable 1 polo
14. Suministro e instalación caja metalica de paso
15. Desmonte de canaleta metalica
16. Mantenimiento de cubierta metalica
17. Suministro e instalación de reflector de 100 w

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	MATERIAL: Cancamo,tuberia emt, cables, tomacorriente doble,toma regulada,tuberia emt se 1", interruptor automatico, caja metalica de paso,reflector de 100w. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
			96,26%			
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	96.26%	$ 58,925,671.00	3.7%	$ 2,286,274.39
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	96.26%	$ 58,925,671.00	3.7%	$ 2,286,274.39


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	1,53%	3,87%	4,08%	13,84%	24,93%
Ejecutado Semanal	1,68%	14,74%	5,05%	66,91%	6,41%
Programado acumulado	1,53%	5,40%	9,48%	23,32%	48,25%
Ejecutado Acumulado	3,15%	17,89%	22,94%	89,85%	96,26%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL FONTIBON CELDAS		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 48.807.911,06		$ 61.211.945,39		$ 3.658.319,53		$ 8.161.192,39			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
118	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	M2	2,00	$ 8.852,00	$ 17.704,00	2,00	$ 17.704,00	2,00	$ 17.704,00	0,00	$ -
457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	ML	21,60	$ 25.133,00	$ 542.872,80	21,60	$ 542.872,80	21,60	$ 542.872,80	0,00	$ -
475	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	0,00	$ 7.430,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
578	Suministro e instalacion de lámina alfajor Cal.14 para protección de ventanas. Incluye marco en angulo de 1"1"1/8", anticorriso alquidico y pintura de acabados alquidica. (Incluye elementos para trabajos en alturas)	M2	6,10	$ 295.474,00	$ 1.802.391,40	6,10	$ 1.802.391,40	3,00	$ 886.422,00	0,00	$ -
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				$ -		$ -				$ -
688	INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	0,00	$ -
690	INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	0,00	$ -
691	INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	0,00	$ -
693	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	2,00	$ 43.439,00	$ 86.878,00	2,00	$ 86.878,00	1,00	$ 43.439,00	0,00	$ -
720	Suministro e instalación de lavamanos antivandalico en acero inoxidable.	UN	2,00	$ 1.600.770,00	$ 3.201.540,00	2,00	$ 3.201.540,00	2,00	$ 3.201.540,00	0,00	$ -
721	Suministro E instalación De orinal Antivandalico En Acero Inoxidable.	UN	1,00	$ 1.743.870,00	$ 1.743.870,00	1,00	$ 1.743.870,00	1,00	$ 1.743.870,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 48.807.911,06	$	48.807.911,06	$	6.515.401,80	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 1.303.080,36	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 32.577,01	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 260.616,07	4%	$ -
	IVA			19%	$ 371.396,12	19%	$ 371.396,12	19%	$ 49.517,05	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 61.211.945,39	$	3.658.319,53	$	8.161.192,39	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) 2. VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS 8. ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 9. ESMALTE S/ LAMINA LINEAL 3. Suministro e instalación de perfil metalico 4. INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES 5. Suministro e instalación de lámina alfajor Cal.14 para protección de ventanas. 6. INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS 7. INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL 8. INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS 9. INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS 10. Suministro e instalación de lavamanos antivandalico en acero inoxidable. 11. Suministro E instalación De orinal Antivandalico En Acero Inoxidable.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	2	MATERIAL: Anticorrosivo, Pintura en esmalte, HERRAMIENTAS: Menor, compresor

3.3.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	94.04%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	94.04%	$ 36,146,257.81	6.0%	$ 2,289,677.20
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	94.04%	$ 36,146,257.81	6.0%	$ 2,289,677.20


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%	10,52%	15,45%	17,10%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%	27,43%	28,19%	26,57%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%	19,92%	35,37%	52,47%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%	39,28%	67,47%	94,04%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CJ USME		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 30.684.923,36		$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 7.575.689,80			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	6,00	$ 43.439,00	$ 260.634,00	6,00	$ 260.634,00	2,00	$ 86.878,00	0,00	$ -
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	36,80	$ 2.227,00	$ 82.321,60	36,80	$ 82.321,60	1,56	$ 3.489,72	0,00	$ -
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobres)	UN	8,00	$ 15.168,00	$ 121.344,00	8,00	$ 121.344,00	9,00	$ 136.512,00	0,00	$ -
50	Desmonte de tuberia sanitaria, colocada superficial mente, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales, y carga	UN	0,00	$ 3.529,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.587,00	0,00	$ -
62	Desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas	UN	0,00	$ 4.360,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 13.080,00	0,00	$ -
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				$ -						$ -
77	Compactación y relleno con material existente	M3	0,00	$ 20.093,00	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 1.607,44	0,00	$ -
92	Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con altura entre 10 y 13 cm. incluye trasiego de material,	M2	0,00	$ 126.518,00	$ -	0,00	$ -	0,82	$ 103.744,76	0,00	$ -
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	0,00	$ 279.847,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 559.694,00	0,00	$ -
329	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	$ 10.526,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.052,00	0,00	$ -
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	0,00	$ 16.364,00	$ -	0,00	$ -	5,90	$ 96.547,60	0,00	$ -
450	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, RUEDA Y RIEL LADA)	M2	0,00	$ 108.387,00	$ -	0,00	$ -	19,89	$ 2.155.817,43	0,00	$ -
464	Alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4	M2	0,00	$ 23.285,00	$ -	0,00	$ -	19,89	$ 463.138,65	0,00	$ -
470	Suministro e instalación de piso duro piso	M2	14,00	$ 66.537,00	$ 931.518,00	14,00	$ 931.518,00	0,82	$ 54.560,34	0,00	$ -
474	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica stone Blanco 7,5cm.	ML	6,00	$ 8.648,00	$ 51.888,00	6,00	$ 51.888,00	16,14	$ 139.578,72	0,00	$ -
16	PINTURA				$ -						$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	36,50	$ 15.332,00	$ 559.618,00	36,50	$ 559.618,00	53,52	$ 820.568,64	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas medias o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres	M2	0,00	$ 15.013,00	$ -	0,00	$ -	53,52	$ 803.495,76	0,00	$ -
17	CERRADURAS				$ -						$ -
849	CERRADURA SCHLAGE O SIMILAR ENTRADA A-80 PD	UN	0,00	$ 143.545,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 287.090,00	0,00	$ -
19	OBRAS EXTERIORES				$ -						$ -
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material	MI	25,00	$ 8.545,00	$ 213.625,00	25,00	$ 213.625,00	34,00	$ 290.530,00	0,00	$ -
							$ -		$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 30.684.923,36	$	30.684.923,36	$	6.047.972,06	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 1.209.594,41	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 30.239,86	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 241.918,88	4%	$ -
	IVA			19%	$ 233.205,42	19%	$ 233.205,42	19%	$ 45.964,59	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 38.435.935,00	$	38.435.935,00	$	7.575.689,80	$	-

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO) 2. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 3. Desmonte de lamparas 4. Desmonte de tuberia sanitaria 5. Desmonte de accesorios sanitarios 6. Compactación y relleno con material existente 7. Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI 8. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 9. BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 10. Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica stone Blanco 7,5cm. 11. ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 12. Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 1 AYUDANTE	MATERIAL: Tuberia, cemento, enchape, pegacor, win, accesorios HERRAMIENTAS: Menor

3.3.5 **ESTACION DE POLICIA DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	3.36%	$ 17,245,115.47	96.6%	$ 496,002,368.72
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			3.36%	$ 17,245,115.47	96.6%	-$ 17,245,115.47

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO



	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,36%	0,56%
Ejecutado Semanal	0,12%	3,24%
Programado acumulado	0,36%	0,92%
Ejecutado Acumulado	0,12%	3,36%



3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL SUBA	COSTO DIRECTO		ANTIDAD INTERVENTORI		VALOR TOTAL	
	$ 13.242.726,39				$	16.612.890,96
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD DEL 11 DIC AL 16	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES						$ -
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H - 0,20 m/v	M2	0,00	27,32	27,32	$ 9.997,00	$ 273.110,04
DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	7,41	7,41	$ 10.412,00	$ 77.152,92
Demolicion afinado de piso e=5 cm (incluye cargue, retiro, disposicion de escombros)	M2	0,00	7,41	7,41	$ 3.280,00	$ 24.304,80
DEMOLICION ESCALERAS EN CONC. REFZDO. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3	9,28	1,54	1,54	$ 324.954,00	$ 521.737,40
ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	114,77	114,77	$ 3.740,00	$ 429.239,80
Desmonte de lamparas (Incluye retiro de cableado)	UN	96,00	11,00	11,00	$ 15.168,00	$ 166.848,00
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECEMPLAZOS						$ -
EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2,50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	0,00	24,15	10,15	$ 82.358,00	$ 950.088,27
Relleno en recebo B-200, Incluye compactacion.	M3	0,00	32,21	20,21	$ 73.458,00	$ 1.484.872,67
Compactación y relleno con material existente	M3	0,00	10,15	10,15	$ 20.093,00	$ 364.607,95
CONCRETOS PARA CIMENTACION		0,00	0,00		$ -	$ -
Demolición de placa maciza de piso con espesor entre 10 y 15 cm. Incluye retiro de escombros	M2	0,00	32,73	32,73	$ 55.378,00	$ 1.812.521,94
MAMPOSTERIA			0,00			$ -
MURO EN BLOQUE No. 4 E-15 cm	M2	0,00	24,44	24,44	$ 46.556,00	$ 1.241.102,96
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			0,00			$ -
REGISTRO PVD RED WHITE Ø 3/4" EQUIVALENTE	UN	1,00	1,00	1,00	$ 81.562,00	$ 81.562,00
ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	0,00	1,00	1,00	$ 71.350,00	$ 71.350,00
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	0,00	4,50	4,50	$ 51.188,00	$ 230.346,00
Suministro e instalación de cancamo y anclaje para hamaca de 1/2" x 3".	UNIDAD	0,00	20,00	20,00	$ 16.438,00	$ 328.760,00
PAÑETES	-		0,00	0,00		$ -
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	65,00	30,70	30,70	$ 16.344,00	$ 502.374,80
PINTURA			0,00			$ -
Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en altura igual o inferior a 3m. Producto listo para usar, aplicado en una (1) capa, con lijada para acabado final. Incluye transporte de insumos y obra.	M2	140,00	114,77	114,77	$ 15.013,00	$ 1.723.042,01
OBRAS EXTERIORES			0,00			$ -
BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	ML	0,00	49,25	49,25	$ 60.295,00	$ 2.969.528,75
fundida de dados en concreto para baranda (0,20*0,20*0,35)	M2		2,03	2,03		$ -
COSTO DIRECTO TOTAL						$ 13.242.726,39
ADMINISTRACION					20%	$ 2.692.545,26
IMPREVISTOS					0,50%	$ 66.213,63
UTILIDAD					4%	$ 530.509,05
IVA					19%	$ 100.796,72
TOTAL OBRA						$ 16.612.890,96

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Limpieza y descapote
2. Demolición piso baldosin
3. Demolición afinado de piso
4. Demolición escalera en concreto
5. Escarificar pañetdes
6.Desmonte de lamparas
7. Excavación tierra
8. Relleno de recebo b=200
9. Compactación y relleno en material existente
10. Demolición placa maciza 11. Muro bloque #4
12. Registro red white de 3/4"
13. Accesorios sanitario pvc de 4"
14. Tuberia pvc s 4"
15. Suministro e instalación cancamo
16. Pañete liso sobre muros 1:4
17. Suministro y aaplicación de estuco pladstico
18. Bordillo prefabricvado A-80
19. Dados de concreto para baranda

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 6 AYUDANTE	MATERIAL: Recebo b=200 ,registro red white de 3/4", accesorios sanitarios de 4", tuberia sanitaria de 4",cancamo,cemento gras, arena, agua, mixto,estuco plastico, bordillo A-80. HERRAMIENTAS: Menor , vibrocompactador tipo rana

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 ESTACION DE POLICIA FONTIBON

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	3.12%	$ 3,585,430.19	96.9%	$ 111,453,356.00
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	3.12%	$ 3,585,430.19	96.9%	$ 111,453,356.00


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,26%	0,53%
Ejecutado Semanal	1,07%	2,05%
Programado acumulado	0,26%	0,79%
Ejecutado Acumulado	1,07%	3,12%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 91.840.001,75		$ 115.038.786,19		$ 115.038.786,19		$ 2.353.764,77			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	25,00	$ 2.621,00	$ 65.525,00	25,00	$ 65.525,00	39,00	$ 102.219,00	0,00	$ -
162	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN	12,00	$ 13.379,00	$ 160.548,00	12,00	$ 160.548,00		$ -	0,00	$ -
163	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" 6 EQUIVALENTE	UN	4,00	$ 65.327,00	$ 261.308,00	4,00	$ 261.308,00	2,00	$ 130.654,00	0,00	$ -
165	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" 6 EQUIVALENTE	UN	1,00	$ 119.934,00	$ 119.934,00	1,00	$ 119.934,00		$ -	0,00	$ -
166	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN	4,00	$ 147.356,00	$ 589.424,00	4,00	$ 589.424,00		$ -	0,00	$ -
173	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	ML	18,00	$ 8.127,00	$ 149.886,00	18,00	$ 149.886,00	10,00	$ 83.270,00	0,00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 253.242,00	0,00	$ -
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	13,00	$ 21.723,00	$ 282.399,00	13,00	$ 282.399,00	36,20	$ 786.372,60	0,00	$ -
441	Limpieza y reemboquille de enchape	M2	16,40	$ 22.222,00	$ 364.440,80	16,40	$ 364.440,80		$ -	0,00	$ -
445	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2	18,00	$ 32.499,00	$ 584.982,00	18,00	$ 584.982,00		$ -	0,00	$ -
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	0,00	$ 43.758,00	$ -	0,00	$ -	11,96	$ 523.345,68	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 91.840.001,75	$	91.840.001,75	$	1.879.103,28	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 375.820,66	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 9.395,52	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 75.164,13	4%	$ -
	IVA			19%	$ 697.984,01	19%	$ 697.984,01	19%	$ 14.281,18	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 115.038.786,19	$	115.038.786,19	$	2.353.764,77	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PVC 2. INSTALACION DE REGISTROS 3. INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4. SONDEOS PUNTOS SANITARIOS 5. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 6. AFINADO DE PISOS 7. AFINADO DE TERRAZAS

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	1	MATERIAL: Cemento, accesorios y tuberia pvc, arena, boquilla HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	1.73%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	1.73%	$ 17,168,629.88	98.3%	$ 978,089,773.57
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	1.73%	$ 17,168,629.88	98.3%	$ 978,089,773.57


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,32%	0,51%
Ejecutado Semanal	0,71%	1,02%
Programado acumulado	0,32%	0,83%
Ejecutado Acumulado	0,71%	1,73%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 794.554.050,34		$ 995.258.403,45		$ 995.258.403,45		$ 10.088.348,46			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										$ 19.953.023,37
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	635,19	$ 2.237,00	$ 1.420.913,32	635,19	$ 1.420.913,32	130,20	$ 291.257,40	0,00	$ -
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	624,00	$ 43.758,00	$ 27.304.992,00	624,00	$ 27.304.992,00	177,40	$ 7.762.669,20	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 794.554.050,34		$ 794.554.050,34		$ 8.053.926,60		162.454.730,85
	ADMINISTRACION			20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 1.610.785,32	20%	$ 32.490.946,17
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 40.269,63	0,50%	$ 812.273,65
	UTILIDAD			4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 322.157,06	4%	$ 6.498.189,23
	IVA			19%	$ 6.038.610,78	19%	$ 6.038.610,78	19%	$ 61.209,84	19%	$ 1.234.655,95
	TOTAL OBRA				$ 995.258.403,45		$ 995.258.403,45		$ 10.088.348,46		$ 203.490.795,86

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 2. AFINADO DE TERRAZAS

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **4 AYUDANTES**	MATERIAL: CEMENTO, ARENA HERRAMIENTAS: Menor

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 Se revisaron en comité No 8 los presupuestos relevantes de MBOG y de Casa de Justicia
3.3.2 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.
3.3.3 Se realizó visita por parte de la supervision en el equipamiento de Carbineros con el fin de validar las observaciones en cuanta a la cantidad de m2 a la hora de intervenir las cubiertas .

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se revisan las memorias de cantidades para la gestion de la cuenta de cobro de noviembre del contratista de obra
4.2 Se envajian subsanaciones a las observaciones de la cuenta de cobro de Interventoria con la aprobación de la supervisión

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra realizado de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SDSCJ.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

*** NOTA: El proceso del anticipo del Contratista de Obra ya se ejecuto el desembolso a la fiducia por parte de la entidad contratante SDSCJ y así mismo interventoria revisó y aprobó los documentos entregados por el contratista de Obra para la gestion del proceso de desembolso.**

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 **Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos frentes antes de su apertura**

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.

8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.

ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. INTERVENTORÍA

Director de Interventoría

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 42- SIPOL



ORINAL SIN SERVICIO



LAVAMANOS SIN SERVICIO



CAMBIO DE PUSH LAVAMANOS



CAMBIO SIFON EN P


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 43- E.P KENNEDY

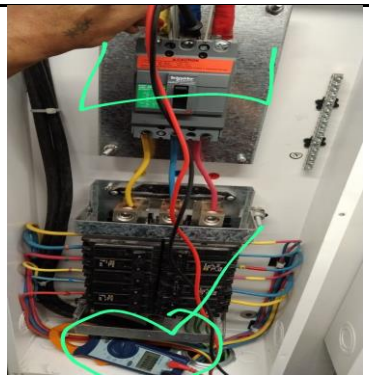	
REVISION ELECTRTTICA	REVISION ELECTRTTICA
	
REVISION ELECTRTTICA	

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 44- E.P KENNEDY



ACCESO E.P KENNEDY



SUMINSITRO DE CARROTANQUE DE AGUA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 45- C4




MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUAS LLUVIAS



MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUAS LLUVIAS - SE RETIRA BOMBA



SE HACE REVISION DE TABLERO

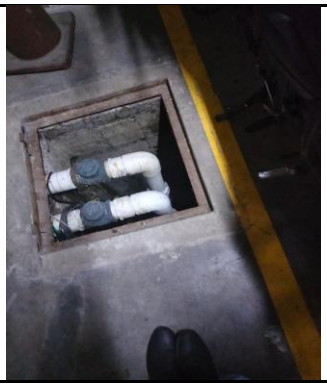

MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUAS LLUVIAS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - URI DE PUENTE RANDA

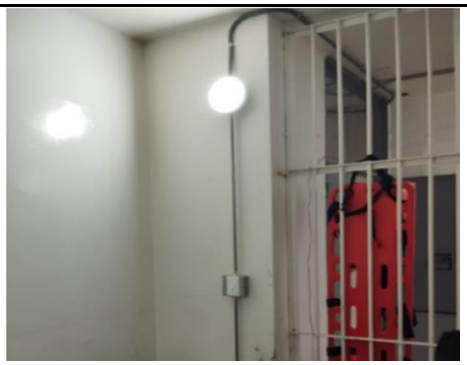

INSTALACION LUMINARIAS LED DE 18 W



SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE



INSTALACIONES ELECTRICA EN DUCTO



INSTALACIONES ELECTRICA EN DUCTO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1"



SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE 18W



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA



SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON - CELDAS



PINTURA DE REJAS



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS



PINTURA DE MUROS



INSTALCIÓN DE PUSH ANTIVANDALICO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME




ESTUCO SHUT

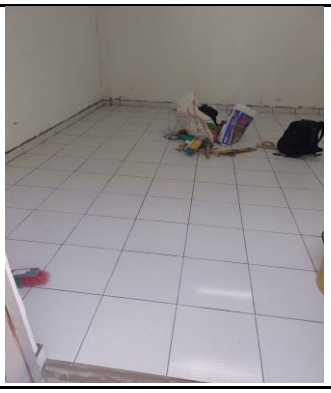

INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS



DESMONTE DE LAMPARAS

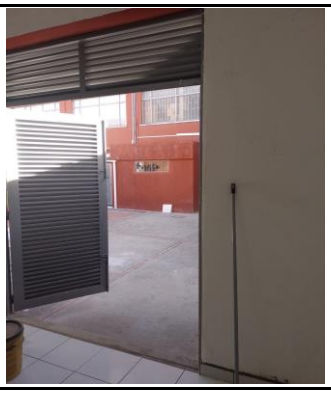

PINTURAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



DESMONTE DE LAMPARAS ALOJAMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A-80 E INSTALACION DE RECEBO CAMPACTADO-RAMPA DISCAPACITADO



SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO PLASTICO - MURO EN BLOQUE #4 - BAÑO - ALOJAMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO PLASTICO Y DESMONTE DE LAMPARAS RECEPCION

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



REGATAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA



INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC



INSTALACIÓN DE PAÑETE BAÑOS



INSTALACIÓN DE PAÑETE BAÑOS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	10	DEL	lunes, 11 de diciembre de 2023	AL	domingo, 17 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL

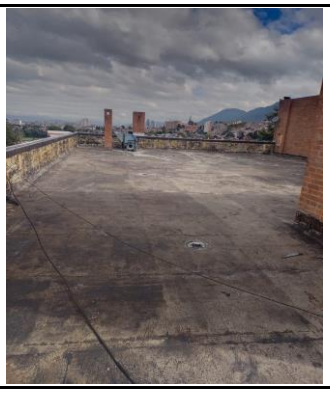

DESMONTE DE MANTO DE CUBIERTA



DESMONTE DE MANTO DE CUBIERTA



AFINADO DE TERRAZAS



AFINADO DE TERRAZAS
