TOTALL INC SAS BIC

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N° 10

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO N° LA-0054-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO
OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONTRATO N° LA-0055-2020 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASEO Y JUVENALES
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 19
CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Informe de Interventoría N°	11	del:	lunes, 26 de diciembre de 2022 — domingo, 30 de diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	CINCO MIL (5000)	Contrato No.	CINCO MIL (5000)
Fecha de Iniciación	viernes, 23 de octubre de 2020	Fecha de Iniciación	viernes, 30 de octubre de 2020
Fecha de Terminación	viernes, 23 de diciembre de 2022	Fecha de Terminación	viernes, 30 de diciembre de 2022
Plazo Inicial	14,0 Meses	Plazo Inicial	14,0 Meses
Plazo Total	2020-2022-02	Plazo Total	20-202-702-2022-02
Adición No. 1	02/22	Adición No. 1	20-22
Valor Total del Contrato	$ 2020-2022-02	Valor Total del Contrato	$ 20-202-702-2022-02
Prórroga No. 1	Meses	Prórroga No. 1	Meses
Otro Tiempo adicional	Meses	Otro Tiempo adicional	Meses
Otro Tiempo adicional	0/0 Folios/mes 2/0/2	Otro Tiempo adicional	2/0 Folios/mes 2/22
GENERAL TRANSCURRIDO DE INTERVENTORIA	no	Ubicación Predio/Intervención de OBRA	no

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE (CONCEPTOS DEL CTO)		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONAL	PRESUPUESTO TOTAL	%	EJECUCIONES A LA FECHA $	EJECUCIONES A LA FECHA %
OBRAS	OBRA CONSTRUCCIONES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	$ 5.500.000.000,00	$ -	$ 5.500.000.000,00	0,00%	$ 500.000.000,00	$ 9.091.363.636,36
PROYECTO CIVIL	OBRA CONSTRUCCIONES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ 2.000.000.000,00	0,00%	$ -	$ 2.000.000.000,00
AIU	OBRAS ADICIONALES AIU	$ 90.000.000,00	$ -	$ 90.000.000,00	0,00%	$ -	$ 90.000.000,00
IMPLE - SIS	LOM DISEÑOS TECNICOS	$ 500.000.000,00	$ -	$ 500.000.000,00	27,00%	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
TOTAL		$ 7.170.000.000,00	$ -	$ 7.170.000.000,00	0,00%	$ 977.000.000,00	$ 11.681.363.636,36

EMERGENCIAS

DETALLE (CONCEPTOS DEL CTO)		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONAL	PRESUPUESTO TOTAL	%	EJECUCIONES A LA FECHA $	EJECUCIONES A LA FECHA %
OBRAS	OBRA CONSTRUCCIONES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	$ 250.000.000,00		$ 250.000.000,00	30,39%	$ 75.000.000,00	$ 329.787.330,00
PROYECTO CIVIL	OBRA CONSTRUCCIONES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00	0,00%	$ 12.185.250,00	$ 62.815.750,00
AIU	OBRAS ADICIONALES AIU	$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00	0,00%	$ -	$ 5.000.000,00
IMPLE - SIS	LOM DISEÑOS TECNICOS	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00	0,27%	$ 12.000.000,00	$ 62.000.000,00
TOTAL		$ 350.000.000,00		$ 350.000.000,00	0,00%	$ 101.185.250,00	$ 459.603.080,00

GENERAL

DETALLE (CONCEPTOS DEL CTO)		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONAL	PRESUPUESTO TOTAL	%	EJECUCIONES A LA FECHA $	EJECUCIONES A LA FECHA %
Obra Civil Construcción		$ 7.170.000.000,00	$ -	$ 7.170.000.000,00	0,00%	$ 977.000.000,00	$ 11.681.363.636,36
Interventoría		$ 350.000.000,00	$ -	$ 350.000.000,00	24,00%	$ 101.185.250,00	$ 459.603.080,00
TOTAL		$ 7.520.000.000,00	$ -	$ 7.520.000.000,00	24,00%	$ 1.078.185.250,00	$ 12.140.966.716,36

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1. PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas "**(…) *El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (…)***", por lo anterior, hasta tanto no se sugiér este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se visualizar de los primeros informes, programa de obra y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 66 - CAIRONAL 19 -Dic -2022): Por requerimiento de la unida por taponamiento en tubería de aguas negras y rotura de caja de inspección.**
- Se procede con la verificación e inspección de la caída de tubería cartelera
- Se realiza inspección en interior del cuarto de puerta principal y sellos de caída en puerta de ecoque
- Se realiza limpieza en caja de inspección

3.2.2 **Emergencia No. 67- ESTACION POLICIA CIUDADMOLIVAR (23 -Dic -2022): Por requerimiento de la unidad por goteras de agua en techo sala CIPRE .**
- Se procede con la limpieza de canaleta , plaqueteo que estaba reprovechas

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **UN DE PUENTE ARANDA**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	%	EJECUCIONES A LA FECHA $	EJECUCIONES A LA FECHA %	POR EJECUTAR $	%
COSTO DIRECTO + AIU	$ 140.000.000,00	$ 101.790.910,00	72,71%	$ 101.851.945,00	0,06%	$(61.035,00)	
OBRAS ADICIONALES							
TOTAL							

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA




3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
Programado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES								
1.01	Retiro de luminaria existente	UN	30	$ 8.000,00	$ 240.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
1.02	Retiro de tubería existente	ML	30	$ 8.000,00	$ 240.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
2	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y VIDEO VIGILANCIA								
2.01	Acometida Subterránea, tuberías PEAD 4 1/2" y 6"	ML	60	$ 15.000,00	$ 900.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
3	Instalación Eléctrica, Alumbrado y Luminarias								
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 150W, INCLUYE ACCESORIOS, BRAZO METALICO, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 1.200.000,00	$ 36.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100W, INCLUYE ACCESORIOS, BRAZO METALICO, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 1.000.000,00	$ 30.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 60W, INCLUYE ACCESORIOS, BRAZO METALICO, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 800.000,00	$ 24.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 30W, INCLUYE ACCESORIOS, BRAZO METALICO, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 600.000,00	$ 18.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
4	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
4.01	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
5	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
6	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
7	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
8	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
9	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
10	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
11	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
12	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
13	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
14	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
15	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
16	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
16.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
17	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
17.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
17.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
18	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
18.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
19	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
19.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
19.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
20	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
20.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
20.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
21	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
21.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
22	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
23	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
23.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
23.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
24	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
24.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
24.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
25	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
25.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
25.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
26	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
26.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
26.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
27	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
27.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
27.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
28	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
28.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
28.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
29	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
29.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
29.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
30	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
30.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
30.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
31	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
31.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
31.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP PARA EXTERIOR FIJA/MINI, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE DE ADOSAMIENTO CON POLEA EN ACERO INOXIDABLE, CABLEADO, ANCLAJES, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
32	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANCIA								
32.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
32.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UN	30	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	0,00%	0	0,00%	$ -
33	ACOMETIDA ELECTRICA, TELEFONICA Y VIDEO VIGILANC





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
Programado Semanal	1.73%	3.87%	4.08%	11.84%	24.63%	37.73%
Ejecutado Semanal	1.68%	16.74%	1.61%	65.91%	6.41%	3.27%
Programado acumulado	1.73%	5.48%	9.48%	21.32%	46.20%	83.98%
Ejecutado Acumulado	1.11%	17.95%	19.94%	85.85%	96.26%	99.48%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRATO	VALOR TOTAL
100	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA	ML	1,000	$ 30,000,000.00
101	Suministro e instalación de valla provisional en lona para cerramiento de obra, incluye postes de madera, tensores, y pintura vinilo para el acabado.	M2	1,000	$ 30,000,000.00
102	Retiro de cerramiento provisional en lona	ML	1,000	$ 30,000,000.00
	COSTO DIRECTO TOTAL			$ 90,000,000.00
	CONTRATISTA	UN	1	$ 90,000,000.00
	INTERVENTOR	UN	1	$ 90,000,000.00
	ADMINISTRACION	UN	1	$ 90,000,000.00
	TOTAL OBRA	UN	1	$ 90,000,000.00

ITEM	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	VALOR TOTAL	SALDO	SALDO $
100	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
101	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
102	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
		$ 90,000,000.00		$ 90,000,000.00		
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -

3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS 3. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 4. INSTALACIÓN DE LAMINAS METALICAS 5. RETOQUES DE PINTURA 6. ASEO Y LIMPIEZA

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO 1 AYUDANTE	2 OFICIALES	MATERIAL - Aislamientos. Pintura en envuelta. HERRAMIENTAS: Manual, semi-general.

3.5.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO ACTUAL		%	AVANCE OBRA A LA FECHA		%	SALDO POR EJECUTAR	
COSTO DIRECTO + (AU	$	58,236,305.00	$	39,400,000.00	58.5%	$	37,754,979.00	3.9%	$	1,645,021
OBRAS ADICIONALES										
TOTAL	$	58,236,305.00	$	39,400,000.00	58.5%	$	37,754,979.00	3.9%	$	1,645,021

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
-6.24%	1.87%	-6.27%	-56.52%	-11.47%	-17.24%	-11.00%
-5.81%	-0.60%	-11.83%	-47.43%	-38.43%	-55.27%	-6.86%
-5.24%	-3.13%	-5.46%	-39.52%	-30.27%	-53.27%	-7.63.9%
-5.80%	-5.81%	-11.80%	-39.38%	-67.47%	-54.04%	-69.17%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRATO	VALOR TOTAL
100	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LONA	ML	1,000	$ 30,000,000.00
101	Suministro e instalación de valla provisional en lona para cerramiento de obra, incluye postes de madera, tensores, y pintura vinilo para el acabado.	M2	1,000	$ 30,000,000.00
102	Retiro de cerramiento provisional en lona	ML	1,000	$ 30,000,000.00
	COSTO DIRECTO TOTAL			$ 90,000,000.00
	CONTRATISTA	UN	1	$ 90,000,000.00
	INTERVENTOR	UN	1	$ 90,000,000.00
	ADMINISTRACION	UN	1	$ 90,000,000.00
	TOTAL OBRA	UN	1	$ 90,000,000.00

ITEM	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	VALOR TOTAL	SALDO	SALDO $
100	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
101	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
102	1,000	$ 30,000,000.00	1,000	$ 30,000,000.00	0.00	$ -
		$ 90,000,000.00		$ 90,000,000.00		
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -
	1	$ 90,000,000.00	1	$ 90,000,000.00	0%	$ -

3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

1. MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA. MAMPLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA. VESTIDO DE CASAS. En 0.13 mm 2. Suministro e instalación de muro en lamina de Novocemento espesor 10 mm, incluye estructura metálica, cinta y resanada lista para pintura. 3. Instalación e instalación de piso decorativo. 4. ESTAMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 5. Suministro y aplicación de doble mano de pintura. Movimiento de tierra y cortes sobre mando: actividad 7: Pulido de cemento Zocloque entre de subterráneo.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 1 AYUDANTE	1	MATERIAL - Tubería, cemento, enchape, pegante, sifo, accesorios, drywall, pica duo HERRAMIENTAS: Manual

3.5.5 ESTACION DE POLICIA DE SUBA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO ACTUAL		%	AVANCE OBRA A LA FECHA		%	SALDO POR EJECUTAR	
COSTO DIRECTO + (AU	$	633,247,283.19	$	633,247,283.19	1.43%	$	29,000,000.00	94.6%	$	604,247,283
OBRAS ADICIONALES										
TOTAL					1.43%	$	29,000,000.00	94.6%	$	604,247,283

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA




3. ASPECTO TECNICO





SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRATO	VALOR TOTAL
	COSTO DIRECTO TOTAL			$ 5,264,605.37
	CONTRATISTA	UN	1	$ 5,264,605.37
	INTERVENTOR	UN	1	$ 5,264,605.37
	ADMINISTRACION	UN	1	$ 5,264,605.37
	TOTAL OBRA	UN	1	$ 5,264,605.37

ITEM	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	VALOR TOTAL	SALDO	SALDO $
		$ 5,264,605.37		$ 5,264,605.37		
	1	$ 5,264,605.37	1	$ 5,264,605.37	0%	$ -
	1	$ 5,264,605.37	1	$ 5,264,605.37	0%	$ -
	1	$ 5,264,605.37	1	$ 5,264,605.37	0%	$ -
	1	$ 5,264,605.37	1	$ 5,264,605.37	0%	$ -

3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

1. Malla electrosoldada
2. Ramps - Instalacion concreto 3000 psi fc=21 mra

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES AYUDANTE	6	MATERIAL - Malla electrosoldada instalada, cemento, arena, grava. HERRAMIENTAS: Manual

3.5.7 ESTACION DE POLICIA PONTIFICIA

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO ACTUAL		%	AVANCE OBRA A LA FECHA		%	SALDO POR EJECUTAR	
COSTO DIRECTO + (AU	$	116,636,784.19	$	116,636,784.19	6.50%	$	7,700,000.00	66.2%	$	441,336,216
OBRAS ADICIONALES										
TOTAL	$	116,636,784.19	$	116,636,784.19	6.50%	$	7,700,000.00	66.2%	$	441,336,216

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
0.25%	0.57%	0.79%
0.27%	0.01%	0.00%
0.25%	0.79%	1.58%
0.27%	0.27%	0.79%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRATO	VALOR TOTAL
	COSTO DIRECTO TOTAL			$ 10,000,791.37
	CONTRATISTA	UN	1	$ 10,000,791.37
	INTERVENTOR	UN	1	$ 10,000,791.37
	ADMINISTRACION	UN	1	$ 10,000,791.37
	TOTAL OBRA	UN	1	$ 10,000,791.37

ITEM	CONTRATO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	VALOR TOTAL	SALDO	SALDO $
		$ 10,000,791.37		$ 4,500,000.00		
	1	$ 10,000,791.37	1	$ 4,500,000.00	55%	$ -
	1	$ 10,000,791.37	1	$ 4,500,000.00	55%	$ -
	1	$ 10,000,791.37	1	$ 4,500,000.00	55%	$ -
	1	$ 10,000,791.37	1	$ 4,500,000.00	55%	$ -

3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

1. ANCHORE PARED 25 x 30 - MACIZONIAS CONCRA CVQUIVALENTE 2. MALLA ALUMINIO

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 MAESTRO 1 AYUDANTE	1 OFICIALES	MATERIAL - Concreto, accesorios y pintura pvc, pinche, tubacela, enchape y pico. HERRAMIENTAS: Manual

3.5.7 ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO ACTUAL		%	AVANCE OBRA A LA FECHA		%	SALDO POR EJECUTAR	
COSTO DIRECTO + (AU	$	999,258,455.00	$	999,258,455.00	3.47%	$	34,001,304.00	96.6%	$	965,257,246
OBRAS ADICIONALES										
TOTAL	$	999,258,455.00	$	999,258,455.00	3.47%	$	34,001,304.00	96.6%	$	965,257,246

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA




3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO De OBRA

PROGRAMADO VRS EJECUTADO SEMANAL



PROGRAMADO VRS EJECUTADO ACUMULADO



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Programado Semanal	8.34%	8.34%	8.76%
Ejecutado Semanal	8.71%	1.22%	1.79%
Programado Acumulado	8.34%	8.85%	1.62%
Ejecutado Acumulado	8.71%	1.79%	5.47%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

ACTIVIDADES GENERALES	CUADRO DIRECTIVO		TALENTO HUMANO		EQUIPOS		ALCANCE SEMANA			
	$ 500.000.000,00		$ 500.000.000,00		$ 500.000.000,00		$ 30.000.000,00			
ITEM ACTIVIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO DIRECTIVO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1 Actividad 1 descripción actividad 1.1.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.1.1 Actividad 1 descripción actividad 1.1.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.1.2 Actividad 2 descripción actividad 1.1.1.2	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.2 Actividad 2 descripción actividad 1.2.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.2.1 Actividad 1 descripción actividad 1.2.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.2.2 Actividad 2 descripción actividad 1.2.1.2	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.3 Actividad 3 descripción actividad 1.3.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.3.1 Actividad 1 descripción actividad 1.3.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.3.2 Actividad 2 descripción actividad 1.3.1.2	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.4 Actividad 4 descripción actividad 1.4.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.4.1 Actividad 1 descripción actividad 1.4.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.4.2 Actividad 2 descripción actividad 1.4.1.2	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.5 Actividad 5 descripción actividad 1.5.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.5.1 Actividad 1 descripción actividad 1.5.1.1	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
1.5.2 Actividad 2 descripción actividad 1.5.1.2	1	0,01	$ 10.000,00	$ 100,00	1	$ 10.000,00	1	$ 100,00	1	$ 100,00
CUADRO DIRECTIVO TOTAL			$ 500.000.000,00		$ 500.000.000,00		$ 30.000.000,00			300.000.100,00
ADMINISTRACION	20%	0,20	$ 99.999.999,00		20%	$ 99.999.999,00	20%	$ 5.999.999,94	20%	$ 60.000.020,00
PRELIMINARES	10%	0,10	$ 49.999.999,00		10%	$ 49.999.999,00	10%	$ 2.999.999,97	10%	$ 30.000.010,00
UTILIDAD	4%	0,04	$ 19.999.999,00		4%	$ 19.999.999,00	4%	$ 599.999,99	4%	$ 12.000.004,00
IVA	19%	0,19	$ 94.999.999,00		19%	$ 94.999.999,00	19%	$ 5.699.999,94	19%	$ 57.000.019,00
TOTAL OBRA			$ 500.000.000,00		$ 500.000.000,00		$ 30.000.000,00			459.000.153,00

3.3 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, TECH-X (PRODUCTOS TECNICOS Y Suministros a la industria) se encuentra en el mantenimiento preventivo de todos los equipos especializados de Zona Libre de Alimentos, Energía Imprescindible de suministros para la producción satisfactoria.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 MAESTRO	MATERIAL : CEMENTO , ARENA, MAATO ASFALTICO
3 AYUDANTES	HERRAMIENTAS: Manual , elmetro de tyes

4. CONTINGENCIAS Y PLANES

4.1.1 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias, el contratista dio cumplimiento con la culminación de la entrega.
4.1.2 Se realizó intervención de emergencia en Cra. 124 Nueva, Conjus. EP. Ciudad Bolívar.

5. CONTROL CALIDAD Y MANTENIMIENTO

5.1 Se envia a contratista de obra y entidad aala de cumnlir

6. ESTRUCTURA TECNICOS

6.1 Se realiza revision del aala No 2 del corte de obra yue ejecutaa por parte de Interventoria la documentacion con el fin de realizar la respectiva remision a la entidad contratante

7. RECURSOS DE OBRA ACTUALIZADO

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL DE INTERVENTORIA	CANTIDAD
MAESTRO (Jefe)	1	DIRECTOR (Jefe)	1
Electricista por cuenta propia	1	Ingeniero de las obras generales (Jefe)	1
INSPECTOR DE OBRA (Jefe)	1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (Jefe)	1
Ingeniero Electricista, Mecánico o Petrolero(Jefe de obra)	1	Ingeniero Electricista, Mecánico o Petrolero(Jefe de obra)	1
CONTADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIJE OCUPACIONAL Y AMBIENTE ENGINEJ(Jefe)	1	EJECUCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
Maestro de Obra (Jefe)	1	Ingeniero de las obras generales (Jefe)	1
Electricista por cuenta propia (Jefe)	1	Electricista por cuenta propia (Jefe)	1
Electricista por cuenta propia	1	Electricista por cuenta propia	1

***NOTA: La entidad contratante envia, soliciar de pago respecto al deposito del anticipo hacia el contratistra de obra.**

8. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

7.1 **Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y volantes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos**

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se controlo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de mano y obra de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1305133.

ARQ. ALEXIS REGINO ALTAHONA - INGENIERO DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 11	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 46- CAI ROMA

	
LIMPIEZA DE DESAGUE	LIMPIEZA DE DESAGUE
	
LIMPIEZA DE DESAGUE	


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 11	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 47- E.P CIUDAD BOLIVAR

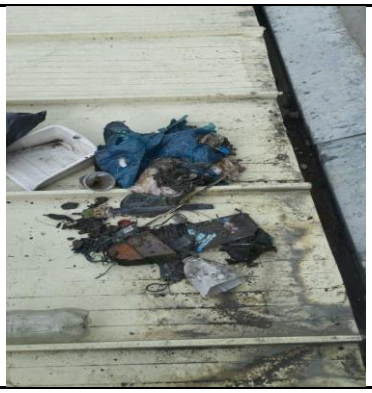	
LIMPIEZA DE CANALES	LIMPIEZA DE CANALES
	
LIMPIEZA DE CANALES	

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 11		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - URI DE PUENTE RANDA



INSTALACIONES ELECTRICAS



CAJAS DE REFLECTORES



GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA ORINAL



GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA SANITARIO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 11		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1"



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1"



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON - CELDAS



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS



INSTALACIÓN DE LAMINA



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA



MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME



PINTURA Y ACABADO DE SHUT



ARREGLO DE CHAPAS



IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO DESCANSO ESCALERA PATIO



PODA JARDINERA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 11		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



TOMA DE DENSIDADES A RAMPA



MALLA ESLECTROSOLDAD ESTANDAR - RAMPA





RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI



ESCALERAS DE ACESO - CONCRETO DE 3000 PSI

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



INSTALACION DE ENCHAPES



INSTALACION DE ENCHAPES



INSTALACION DE ENCHAPES



INSTALACIÓN DE WIN

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	11	DEL	lunes, 18 de diciembre de 2023	AL	domingo, 24 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



AFINADO DE TERRAZAS



INSTALACION DE MANTO CUBIERTA



INSTALACION DE MANTO CUBIERTA



INSTALACION DE MANTO CUBIERTA
