TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	domingo, 31 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		Contrato No.	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		Fecha de Terminación	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	Plazo Inicial	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		Valor Inicial	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		Adición No. 1	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		Valor Total del Contrato	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	Prórroga No. 1		Meses
Plazo total	11.0	Meses	Plazo total	10	Meses
Días Transcurridos	83	Faltantes 253	Días Transcurridos	83	Faltantes 222
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	12		SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA	12	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	5.33%	$ 20,343,627.59	$ 3,627,962,095.45
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 182,928,752.55	
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 1,040,000,000.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	0.00%	$ -	$ 95,000,000.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CLJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	27.770%	$ 192,055,996.32	$ 637,944,003.68
	CASAS DE JUSTICIA					$ 38,435,935.00	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	7.51%	$ 433,764,311.47	$ 5,400,906,099.12

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	31.47%	$ 75,466,251.00	$ 164,334,703.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM15	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	350.30%	$ 17,514,871.00	-$ 12,514,871.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CLJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	104.72%	$ 27,330,939.00	$ 4,891,810.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	45.77%	$ 151,437,311.00	$ 198,101,263.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	INVERSIÓN A LA FECHA $
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	7.51%	$ 433,764,311.47	$ 5,400,906,099.12
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	45.77%	$ 151,437,311.00	$ 198,101,263.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	9.58%	$ 585,201,622.47	$ 5,599,007,362.12

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)",*** por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 48- FUERTE CARABINEROS DEL PARQUE NACIONAL, del 26 de diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere reconstruir muro en pesebrera.**
- Se procede con la dedmolición de los muros en mal estado (se aprovaron para construir 3 muros - esta emergencia se descontará del presupuesto asignado)

.

3.2.2 **Emergencia No. 49- URI PUENTE ARANDA, del 27 de diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere reconstruir muro en pesebrera.se equiere corregir fuga de agua sobre tubo del parqueadero de la Estación de Policiade Puente Aranda. .**
- Se realizan reparaciones hidraulicas y sanitarias en parqueadero de la E.P PUENTE ARANDA NUEVA, -

3.2.3 **Emergencia No. 50 - ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD BOLOIVAR, del 27 de diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere corregir fuga de agua por daño en la red hidraulica en el baño de la celdas de las personas privadas de la libertad.** - Se procede con la regata para desmontar push sanitario e instalar un push nuevo. -

3.2.4 **Emergencia No. 51 - CAI MIRARDOR, del 29 de diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere abrir la puerta y realizar el cambio de la chapa de la puerta principal**
- Se realizan el desmonte, suministro e instalación de una cerradura nueva de seguridad de 4 pasadores para puerta principal. -

.

3.2.5 **Emergencia No. 52- CESPA, del 27 de diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere acometida para punto hidraulico en cocina 2 piso. (esta emegencia se incluira al presupuesto asignado)**
- Se realizan la instalación de la tuberia PVC-P de 1/2" con sus respectivos accesorios -

3.2.6 **Emergencia No. 53- CENTRO ESPECIAL DE RECLUSION CER, del 30 diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad por falla en el sistema red hidraulica al presentarse falla de suministro en el sector las personas privadas de la libertad se encuentran sin suministro de agua.**
- Se suministran 3 viajes de agua potable. -

3.2.7 **Emergencia No. 54- URI PUENTE ARANDA, del 30 diciembre de 2023, por requerimiento de la unidad por falla en el sistema red hidraulica al presentarse falla de suministro en el sector las personas privadas de la libertad se encuentran sin suministro de agua.**
- Se suministran 3 viajes de agua potable. -

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 URI DE PUENTE ARANDA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	99.15%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	99.15%	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	$ 0.99	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
Programado Semanal	0.65%	1.42%	2.2%	2.5%	2.7%	3.0%	3.4%	7.0%	14.9%
Ejecutado Semanal	2.30%	13.84%	7.41%	12.33%	5.87%	18.69%	11.31%	0.12%	27.41%
Programado acumulado	0.65%	2.1%	4.3%	6.8%	9.5%	12.5%	16.0%	23.0%	37.8%
Ejecutado Acumulado	2.30%	16.1%	23.5%	35.84%	41.71%	60.31%	71.62%	71.74%	99.15%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 9	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES								
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes + interruptores)	UN	16	$ 3.741,00	$ 59.856	24	24	600%	$ 89.784
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS								
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	12	$ 42.207	$ 506.484	12	12	300%	$ 506.484
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
308	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	1	$ 80.763	$ 80.763	1	1	25%	$ 80.763
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620	UN	6	$ 93.459,00	$ 560.754	4	18	300%	$ 373.836
335	CABLEADO 1#12	ML	12	$ 2.922,00	$ 35.064	420	510	4250%	$ 1.227.240
337	CABLEADO 2#12	ML	12	$ 6.980,00	$ 83.760	420	420	3500%	$ 2.931.600
364	Suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tuberia EMT de 1/2"	UN	9	$ 112.928,00	$ 1.016.352	1	1	11%	$ 112.928
365	Suministro e instalación de salida + interruptor doble en tuberia EMT de 1/2",	UN	1	$ 131.807,00	$ 131.807	1	1	100%	$ 131.807
416	Suministro e instalación de caja metalica galvanizada para protección de reflectores de	UN	10	$ 109.617,00	$ 1.096.170	10	10	100%	$ 1.096.170
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	20	$ 253.915	$ 5.078.300	20	20	100%	$ 5.078.300
680	Suministro e instalación de Refelctor de 100W	UN	8	$ 229.526	$ 76,676.00	6	10	125%	$ 1.377.156
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
684	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1	$ 186.668	$ 186.668	1	1	100%	$ 186.668
693	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	4	$ 43.439	$ 173.756	9	9	225%	$ 390.951
759	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL Ó SIMILAR	UN	10	$ 585.172	$ 5.851.720	10	10	100%	$ 5.851.720
					Costo Directo	$			19.435.487
					Administración	20%			$ 3.887.081
					Imprevistos	0.5%			$ 97.177.0
					Utilidad	4.0%			$ 777.416.3
					IVA	19.0%			$ 3.692.727.3
					TOTAL	$			27.889.889

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Desmonte de accesorios electricos
2. Sondeos de puntos sanitarios
3. Salida pra lampars fluorecente 2en EMT
4. Suministro e instalación xe bala panel led de incrustar o sobreponer de 18w
5. Cableado 1#12
6. Cableado 2#12
7. Suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tuberia EMT de 1/2"
8. Slida + interruptor doble en tuberia EMT de 1/2"
9.Suministro e instalación de caja metalica galvanizada
10. Pantalla led 60x60
11. Suministro e instalación de reflector de 100w
12. Kit de valvula de descrga antivandalica alta presión para orinal
13. Instalación de apartos sanitarios
14. Kit valvula de descarga antivndalica alta presión para sanitarios de conexión superior

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	MATERIAL:Lampara fluoresente, tuberia EMT de 1/2" , bala panel led de 18w.cable #12,tomacorriente doble, interruptor doble, caja metaalica galvanizada,pantalla led 60x60, reflector de 100w,valvula antivandalica para orinal y para sanitario. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	64.64%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	64.64%	$ 91,162,027.94	35.4%	$ 49,868,337.06
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			64.64%	$ 91,162,027.94	35.4%	$ 49,868,337.06

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	1.29%	1.57%	1.74%	1.97%	4.35%	10.43%	16.29%	29.45%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	11.05%	10.97%	24.17%	0.94%	1.64%
Programado acumulado	1.29%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%	21.26%	37.55%	67.00%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%	62.06%	63.00%	64.64%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 8	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
330	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,00	$ 13.710,00	$ 411.300	67,80	97,80	326%	$ 929.538
368	Suministro e instalacion de caja metalica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plastico y adtadores terminal EMT 1/2"	ML	13,00	$ 88.417,00	$ 1.149.421	21,00	34,00	262%	$ 1.856.757

Costo Directo	$		1.856.757
Administración	20%	$	371.351
Imprevistos	0,5%	$	9.283,8
Utilidad	4,0%	$	74.270,3
IVA	0,0%	$	-
TOTAL	$		2.311.662

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Tuberia EMT de 3/4" suspendida incluye accesorios
2. Suministro e instalación caja metalica de paso dimensiones 20x20x15

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	MATERIAL: Tuberia EMT de 3/4" y caja de paso metalica de dimensiones 20x20x15 HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61.211.945.39	$ 61.211.945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
Programado Semanal	1,53%	3,87%	4,08%	13,84%	24,93%	37,73%	14,02%
Ejecutado Semanal	1,68%	14,74%	5,05%	66,91%	6,41%	3,23%	0,51%
Programado acumulado	1,53%	5,40%	9,48%	23,32%	48,25%	85,98%	100,00%
Ejecutado Acumulado	3,15%	17,89%	22,94%	89,85%	96,26%	99,49%	100,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON CELDAS		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 48.867.911,06		$ 61.211.945,39		$ 61.211.945,39		$ 1.091.750,13			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
684	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1,00	$ 186.668,00	$ 186.668,00	1,00	$ 186.668,00	1,00	$ 186.668,00	0,00	$ -
756	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1,00	$ 318.930,00	$ 318.930,00	1,00	$ 318.930,00	2,00	$ 637.860,00	0,00	$ -
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	0,00	$ 2.451,00	$ -	0,00	$ -	19,20	$ 47.059,20	0,00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 48.867.911,06	$ 48.867.911,06		$ 871.587,20		$ -	
ADMINISTRACION				20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 174.317,44	20%	$ -
IMPREVISTOS				0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 4.357,94	0,50%	$ -
UTILIDAD				4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 34.863,49	4%	$ -
IVA				19%	$ 371.396,12	19%	$ 371.396,12	19%	$ 6.624,06	19%	$ -
TOTAL OBRA					$ 61.211.945,39	$ 61.211.945,39		$ 1.091.750,13		$ -	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL 2. GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH 3. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	2	MATERIAL: Anticorrosivo, Pintura en esmalte, HERRAMIENTAS: Menor, compresor

3.3.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	100.00%	$ 38,435,935.00	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	100.00%	$ 38,435,935.00	0.0%	$ -


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%	10,52%	15,45%	17,10%	21,56%	25,97%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%	27,43%	28,19%	26,57%	4,09%	1,87%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%	19,92%	35,37%	52,47%	74,03%	100,00%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%	39,28%	67,47%	94,04%	98,13%	100,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CJ USME		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 30.684.923,36		$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 1.277.697,09			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	8,00	$ 15.168,00	$ 121.344,00	8,00	$ 121.344,00	2,00	$ 30.336,00	0,00	$ -
58	Desmonte de cableado electrico (contempla los cables contenidos d	MI	0,00	$ 3.368,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 30.312,00	0,00	$ -
303	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	0,00	$ 75.163,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 225.489,00	0,00	$ -
304	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN	2,00	$ 75.631,00	$ 151.262,00	2,00	$ 151.262,00	2,00	$ 151.262,00	0,00	$ -
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	0,00	$ 279.847,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 559.694,00	0,00	$ -
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	6,00	$ 22.943,00	$ 137.658,00	6,00	$ 137.658,00	1,00	$ 22.943,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 30.684.923,36	$ 30.684.923,36		$ 1.020.036,00		$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 204.007,20	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 5.100,18	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 40.801,44	4%	$ -
	IVA			19%	$ 233.205,42	19%	$ 233.205,42	19%	$ 7.752,27	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 38.435.935,00	$ 38.435.935,00		$ 1.277.697,09		$ -	

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas 2. Desmonte de cableado electrico 3. SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 4. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 5. Suministro e instalación de toma corriente doble

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 1 AYUDANTE	MATERIAL: Tubería, lámparas, accesorios eléctricos HERRAMIENTAS: Menor

3.3.5 ESTACION DE POLICIA DE SUBA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	9.56%	$ 49,066,459.49	90.4%	$ 464,181,024.70
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			9.56%	$ 49,066,459.49	90.4%	$ 464,181,024.70

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0.39%	0.53%	0.76%	0.96%
Ejecutado Semanal	0.12%	3.24%	100%	4.30%
Programado acumulado	0.39%	0.92%	1.68%	2.64%
Ejecutado Acumulado	0.12%	3.36%	5.2%	9.56

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LO EPOL SUBA		COSTO DIRECTO		ENTIDAD INTERVENTOR		VALOR TOTAL	
		$ 57.585.149,42				$	22.585.949,56
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD DEL 25 AL 31	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						
3	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E-SE CH. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,00	15,00	1,00	$ 17.750,00	$ 15.975,00
10	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,00	45,55	45,55	$ 9.387,00	$ 425.298,85
15	Demolición afinados de piso e=5 cm (incluye acarreo, retiro, disposición de escombros)	M2	9,00	24,51	15,51	$ 9.388,00	$ 55.422,16
17	Demolición de guarda escoba (incluye retiro de sobrantes)	ML	9,00	15,44	15,44	$ 9.442,00	$ 52.881,28
14	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,00	281,59	34,59	$ 9.748,00	$ 854.544,32
33	Desmonte de Puertas.	UN	10,00	1,00	1,00	$ 7.350,00	$ 7.350,00
48	Desmonte de lamparas (incluye retiro de sobrantes)	UN	55,00	21,00	10,00	$ 15.488,00	$ 154.880,00
16	Demolición de acabados ceramincos de piso y muros en ollao de hasta 3m. (incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	9,00	44,00	44,00	$ 18.841,00	$ 488.585,76
13	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de sobrantes)	UN	9,00	6,00	6,00	$ 21.154,00	$ 126.924,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RECEBADOS						
32	Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con alturas entre 10 y 13 cm. incluye formaleta de madera), preparacion y utilizacion de vibradores. Incluye curado de concreto	M2	9,00	89,22	89,22	$ 126.540,00	$ 10.528.524,52
4	MAMPOSTERIA			0,00			
103	MURO EN BLOQUE No. 4 E-10 cm	M2	9,00	38,75	4,00	$ 46.556,00	$ 158.257,00
112	REMATE LADRILLO TOLETE PEGADO	ML	1,00	12,00	12,00	$ 58.883,00	$ 682.788,00
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			0,00			
232	Suministro e instalación de accesorios existentes para bajantes de 1/2" a 3".	UNIDAD	9,00	52,00	52,00	$ 15.450,00	$ 137.256,00
7	PAÑETES		0,00	0,00			
433	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1/2 sobre muros en ollao en ángulos e inferiores a 3m.	M2	55,00	4,55	4,55	$ 21.723,00	$ 94.485,32
444	Suministro y aplicación de pañete liso 1/2 impermeabilizado liso al, (cocha o media 0,5m). Aplicado en ollao en ángulos e inferiores a 3m.	ML	9,00	7,15	7,15	$ 15.855,00	$ 94.511,00
66	PINTURA			0,00			
891	Suministro y aplicación de vinilos plásticos sobre muros en ollao en ángulos e inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) manos con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	160,00	289,27	34,00	$ 15.855,00	$ 1.425.282,57
	COSTO DIRECTO TOTAL						$ 57.585.149,42
	ADMINISTRACION					20%	$ 5.536.629,88
	IMPREVISTOS					5,5%	$ 83.315,72
	I					KG	$ 719.355,24
	IVA					0%	$ -
	TOTAL OBRA						$ 22.585.949,56

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición muros toletes
2. Demolición pañetes
3.Demolición afinadao de piso e=5 cms
4. Demolición guarda escoba
5. Escarificación pañete
6.Desmonte de puertas
7. Desmonte de lamparas
8. Demolición de acabados ceramincos de piso
9. Desmonte de aparatos sanitarios
10.Suministro y fundición de placa de concreto impermeabilizado de 4000psi entre alturas de 13 y 10 cms
11. Muro en bloque #4
12.Remate en ladrillo tolete
13.Suministro e instalación de camcamo y anclajes
14. Suministro y aplicación pañete impermeabilizado liso 1:3 ml
15. Suministro y aplicación de estuco plastico.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES 6 AYUDANTE	MATERIAL:Cemento, arena , gravilla, agua, bloque#4, camcamo, sika 1, estuco plástico. HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	11.49%	$ 13,221,105.14	88.5%	$ 101,817,681.05
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 115,038,786.19	11.49%	$ 13,221,105.14	88.5%	$ 101,817,681.05


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0,26%	0,53%	0,79%	1,09%
Ejecutado Semanal	1,07%	2,05%	3,58%	4,79%
Programado acumulado	0,26%	0,79%	1,58%	2,67%
Ejecutado Acumulado	1,07%	3,12%	6,70%	11,49%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 91.840.001,75		$ 115.038.786,19		$ 115.038.786,19		$ 5.914.951,81			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
470	Suministro e instalación de piso duro piso	M2	18,90	$ 66.537,00	$ 1.257.549,30	18,90	$ 1.257.549,30	11,96	$ 795.782,52	0,00	$ -
645	WIN DE ALUMINIO	ML	0,00	$ 6.298,00	$ -	0,00	$ -	11,96	$ 75.324,08	0,00	$ -
695	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P' CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.	UN	0,00	$ 323.006,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 323.006,00	0,00	$ -
713	Suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ADA. Marca Toto o similar.	UN	4,00	$ 484.209,00	$ 1.936.836,00	4,00	$ 1.936.836,00	3,00	$ 1.452.627,00	0,00	$ -
729	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ 8.171,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 16.342,00	0,00	$ -
736	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ 35.786,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 71.572,00	0,00	$ -
760	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI O SIMILAR	UN	4,00	$ 387.200,00	$ 1.548.836,00	4,00	$ 1.548.836,00	4,00	$ 1.548.836,00	0,00	$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	142,80	$ 15.332,00	$ 2.189.409,60	142,80	$ 2.189.409,60	12,84	$ 196.862,88	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	0,00	$ 15.013,00	$ -	0,00	$ -	12,84	$ 192.766,92	0,00	$ -
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	41,50	$ 2.451,00	$ 101.716,50	41,50	$ 101.716,50	20,00	$ 49.020,00	0,00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 91.840.001,75	$	91.840.001,75	$	4.722.139,40	$	-
ADMINISTRACION				20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 944.427,88	20%	$ -
IMPREVISTOS				0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 23.610,70	0,50%	$ -
UTILIDAD				4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 188.885,58	4%	$ -
IVA				19%	$ 697.984,01	19%	$ 697.984,01	19%	$ 35.888,26	19%	$ -
TOTAL OBRA					$ 115.038.786,19	$	115.038.786,19	$	5.914.951,81	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Suministro e instalación de piso duro piso 2. WIN DE ALUMINIO 3. ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 4. Suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple 4. REJILLA CON SOSCO 3 x 2" 5. TAPARREGISTRO 20 x 20 6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI O SIMILAR 7. ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA 8. Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros 9. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO OFICIALES 1 AYUDANTE	1	MATERIAL: Cemento, accesorios y tubería pvc, arena, boquilla, enchape y win, aparatos sanitarios, esmalte sobre mampostería, estuco plástico. HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	5,97%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	5,97%	$ 59,429,242.53	94.0%	$ 935,829,160.92
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995,258,403.45	$ 995,258,403.45	5,97%	$ 59,429,242.53	94.0%	$ 935,829,160.92


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0,32%	0,54%	0,76%	0,98%
Ejecutado Semanal	0,71%	1,02%	1,70%	2,54%
Programado acumulado	0,32%	0,86%	1,62%	2,60%
Ejecutado Acumulado	0,71%	1,73%	3,43%	5,97%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE		$ 995.258.403,45	$ 25.327.246,99		
		$ 794.554.050,34		$ 995.258.403,45		PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/R. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	345,00	$ 13.483,00	$ 4.651.635,00	345,00	$ 4.651.635,00	33,00	$ 444.939,00	0,00	$ -
11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	6,00	$ 10.412,00	$ 62.472,00	6,00	$ 62.472,00	41,38	$ 430.848,56	0,00	$ -
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P' BAÑOS	M2	0,00	$ 13.869,00	$ -	0,00	$ -	26,07	$ 361.564,83	0,00	$ -
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	635,19	$ 2.237,00	$ 1.420.913,32	635,19	$ 1.420.913,32	35,91	$ 80.330,67	0,00	$ -
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	0,00	$ 10.841,00	$ -	0,00	$ -	71,38	$ 773.830,58	0,00	$ -
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes)	UN	0,00	$ 21.154,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 232.694,00	0,00	$ -
61	Desmonte de espejo (incluye retir y disposición final).	M2	2,80	$ 4.608,00	$ 12.902,40	2,80	$ 12.902,40	12,29	$ 56.632,32	0,00	$ -
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	624,00	$ 43.758,00	$ 27.304.992,00	624,00	$ 27.304.992,00	85,00	$ 3.719.430,00	0,00	$ -
522	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	635,19	$ 51.927,00	$ 32.983.355,35	635,19	$ 32.983.355,35	271,91	$ 14.119.470,57	0,00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 794.554.050,34	$	794.554.050,34	$	20.219.740,53	$	162.454.730,85
ADMINISTRACION			20%		$ 158.910.810,07	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 4.043.948,11	20%	$ 32.490.946,17
IMPREVISTOS			0,50%		$ 3.972.770,25	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 101.098,70	0,50%	$ 812.273,65
UTILIDAD			4%		$ 31.782.162,01	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 808.789,62	4%	$ 6.498.189,23
IVA			19%		$ 6.038.610,78	19%	$ 6.038.610,78	19%	$ 153.670,03	19%	$ 1.234.655,95
TOTAL OBRA					$ 995.258.403,45	$	995.258.403,45	$	25.327.246,99	$	203.490.795,86

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 2. AFINADO DE TERRAZAS. 3 Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica. 4. DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN 5. DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P' BAÑOS 6. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros 7. Desmonte de aparatos sanitarios 8. Desmonte de espejo.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO 4 AYUDANTES	MATERIAL: CEMENTO, ARENA, MANTO ASFALTICO HERRAMIENTAS: Menor, cilindro de gas

3.3 OBSERVACIONES

.

3.3.1 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.

3.3.3 Se realizó intervención de emergencia en C4, CAI Roma, Cespa, EP. Ciudad Bolivar

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comités

4.2 Se realiza comité de seguimiento No 9, en el que se plantean nuvos frentes a aperturar por parte del contratista de obra el 03 y el 04 de enero de 2024

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra realizado de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SDSCJ. Se realiza visita de los especialistas eléctricos tanto de interventoría como contratista a la CJ Usme y Ep. San Cristobal.

5.2 Se terminan actividades en la EP. Fontibón Celdas y se programa entrega a la MEBOG el 3 de enero de 2024

5.3 Se terminan actividades en la CJ USME y se programa entregapara el 9 de enero de 2024

5.4 Se toman muestra de concreto en cilintro para verificar resistencia del concreto y peso . E.P SUBA

5.5 Se presenta propuesta de luminaria para mitigar el alumbrado de reflectores a las celdas este no se aprueba y presentan otra alternativa aprobada por la supervisión - CER

5.6 Se terminan actividades en URI DE PUENTE ARANDA -ETAPA 1, falta canciliar cantidades entre las partes. CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORÍA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELÉCTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, fondo de pensiones, ARL y exámenes de ingreso del personal de los frentes que estan abiertos si hay personal adicional y de los nuevos frentes antes de

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.

8.2 Durante el presente periodo se dio inicio con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.

ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 48- FUERTES DE CRABINEROS - PARQUE NACIONAL



PRESEBRERAS



DEMOLICION MURO - PESEBRERA



DEMOLICION MURO - PESEBRERA



DEMOLICION MURO - PESEBRERA


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO


EMER 49- URI DE PUENTE ARANDA

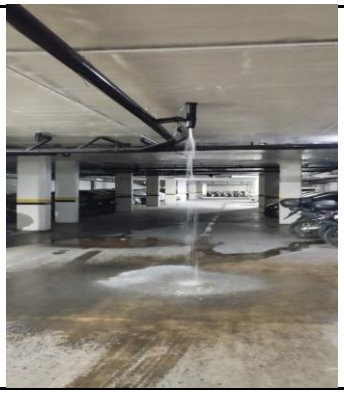

FUGA DE AGUA POTABLE - SOTANO

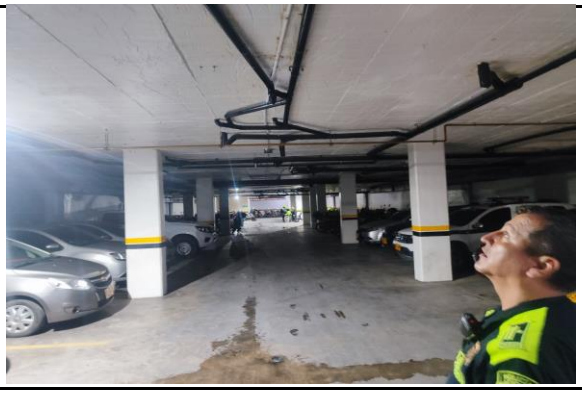

FUGA DE AGUA POTABLE - SOTANO

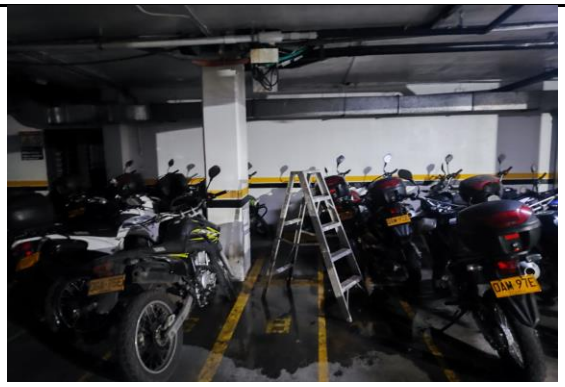

FUGA DE AGUA POTABLE - SOTANO



REPARACION FUGA DE AGUA POTABLE - SOTANO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 50 - E.P CIUDAD BOLIVAR




DESMONTE DE PUSH SANITARIO - CELDAS



DESMONTE DE PUSH SANITARIO - CELDAS



INSTALACION DE PUSH SANITARIO - CELDAS

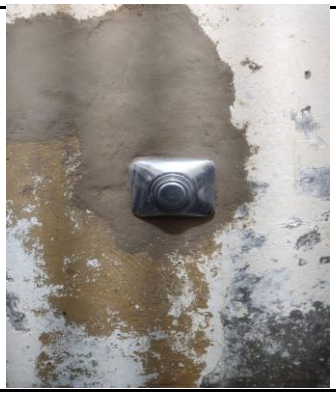

INSTALACION DE PUSH SANITARIO - CELDAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 51 - CAI MIRADOR



CAI MIRADOR

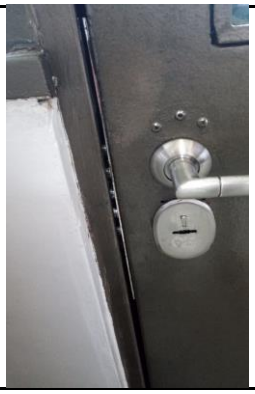

CAMBIO DE CERRADURA PRINCIPAL

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 52 - CESPA



CUBIERTA CESPA



CUBIERTA CESPA - TUBERIA HIDRAULICA - COCINA



TUBERIA PVC PARA PUNTO HIDRAULICO - COCINA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 53 - CER



CARROTANQUE DE AGUA POTABLE



SUMINISTRO DE AGUA A TANQUE



SUMINISTRO DE AGUA A TANQUE

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 54 - URI DE PUENTE RANDA



CARROTANQUE DE AGUA POTABLE



CARROTANQUE DE AGUA POTABLE



CARROTANQUE DE AGUA POTABLE



SUMINISTRO DE AGUA A TANQUE

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA - AZOTEA



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CAJA DE PASO METALICA



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON - CELDAS



ACABADOS FINALES



ACABADOS FINALES



ACABADOS FINALES



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	**12**	**DEL**	lunes, 25 de diciembre de 2023	**AL**	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME

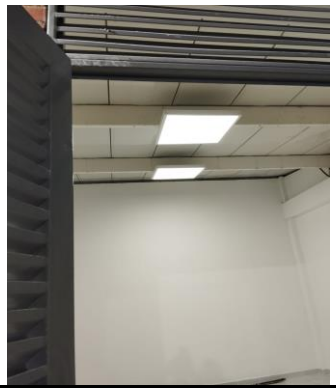

INTALACIÓN DE LUMINARIAS



ACABADOS FINALES SHUT DE BASURAS



ACABADOS FINALES SHUT DE BASURAS



MURO EN DRYWALL OFOCINA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



DEMOLICION ENCHAPE BAÑO 1 PISO - AUXILIARES



DEMOLICION PISO EN BAÑO Y OFICINA 1 PISO



MURO #4 - ENTRADA PRINCIPAL



PLAC A EN CONCRETO DE 4000 PSI

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



EMBOQUILLADA DE ENCHPE DE PISOS Y MUROS E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



EMBOQUILLADA DE ENCHPE DE PISOS Y MUROS E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



EMBOQUILLADA DE ENCHPE DE PISOS Y MUROS E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS



INSTALACIÓN LUMINARIAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	12	DEL	lunes, 25 de diciembre de 2023	AL	domingo, 31 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



INSTALACION DE MANTO CUBIERTA

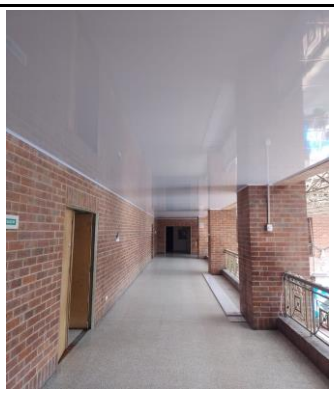

INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 2 PISO



DEMOLICIO DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS BAÑOS PRIMER PISO



DEMOLICIO DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS BAÑOS PRIMER PISO
