TOTALL INC SAS BIC

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13 -

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATO SC-LA-0006-2020 - INTERVENTORÍ TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RURAL RELEVO-EVO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, A CARGO DE LA VEREDA Y CORREGIMIENTO
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO SC-LA-0006-2020 - RELEVO-EVO, EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, A CARGO DE LA VEREDA Y CORREGIMIENTO
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CAMPO ALEGRE
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA CAMPO ALEGRE SA
INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA CENTRAL DE SEGURIDAD, CONSTRUCCIÓN Y JUSTICIA

INFORME DE INTERVENTORÍA N°:	13	DEL:	lunes, 1 de enero de 2024 — domingo, 7 de enero de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	CONSULTORÍA CAMPO ALEGRE SA	Contratista:	CONSULTORÍA CAMPO ALEGRE SA
Fecha de Inicio:	martes, 10 de octubre de 2023	Fecha de Inicio:	jueves, 26 de octubre de 2023
Fecha de Terminación:	viernes, 10 de noviembre de 2023	Fecha de Terminación:	sábado, 26 de octubre de 2024
Plazo Inicial:	12 Meses	Plazo Inicial:	12 Meses
Adición No. 1	$0,00	Adición No. 1	$0,00
Adición No. 2	$0,00	Adición No. 2	$0,00
Valor Total Contrato:	$ 120.000.000,00	Valor Total Contrato:	$ 120.000.000.000,00
Prórroga No. 1	0 Meses	Prórroga No. 1	0 Meses
Plazo final:	12 Meses	Plazo final:	12 Meses
Días Transcurridos:	0 Días	Días Transcurridos:	0 Días
Situación financiera/avance de intervención:	0 %	Situación financiera/avance de obra:	0 %

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

CONTRATO SC-LA-0006-2020		PRESUPUESTO				INVERSIÓN A LA OBRA			
		ACTUAL		MODIFICADO	ACTUAL	%		ACTUAL	%
MINGA	VALOR CONTRATO	$	5.000.000.000,00	$	$	5.000.000.000,00	0,00%	$ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00	$ 1.000.487.124,00
	ADICIONES CONTRATO								
	CONTRATOS ADICIONALES								
MEDIANA AGM	VALOR CONTRATO	$	5.000.000.000,00	$	$	5.000.000.000,00	0,00%	$	$ 5.000.000.000,00
	ADICIONES CONTRATO								
	CONTRATOS ADICIONALES								
VIA	VALOR CONTRATO	$	100.000.000,00	$	$	99.999.999,99	0,00%	$	$ 99.999.999,99
	ADICIONES CONTRATO								
MENOR - AGM	VALOR CONTRATO	$	100.000.000,00	$	$	100.000.000,00	0,00%	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
	ADICIONES CONTRATO							$ 500.000.000,00	
	CONTRATOS ADICIONALES								
TOTAL		$	10.200.000.000,00	$	$	10.199.999.999,99	0,00%	$	$ 10.000.000.000,00

ENERGÍA SOLAR

CONTRATO SC-LA-0006-2020		PRESUPUESTO				INVERSIÓN A LA OBRA			
		ACTUAL		MODIFICADO	ACTUAL	%		ACTUAL	%
MINGA	VALOR CONTRATO	$	1.000.000.000,00		$	1.000.000.000,00	0,00%	$	$ 1.000.000.000,00
	ADICIONES CONTRATO								
	CONTRATOS ADICIONALES								
MEDIANA AGM	VALOR CONTRATO	$	50.000.000,00		$	49.999.999,99	0,00%	$	$ 49.999.999,99
	ADICIONES CONTRATO								
	CONTRATOS ADICIONALES								
VIA	VALOR CONTRATO	$	5.000.000,00		$	5.000.000,00	0,00%	$	$ 5.000.000,00
	ADICIONES CONTRATO								
MENOR - AGM	VALOR CONTRATO	$	25.000.000,00		$	25.000.000,00	0,00%	$	$ 25.000.000,00
	ADICIONES CONTRATO								
	CONTRATOS ADICIONALES								
TOTAL		$	1.080.000.000,00	$	$	1.079.999.999,99	0,00%	$	$ 1.079.999.999,99

GENERAL

CONTRATO SC-LA-0006-2020		PRESUPUESTO				INVERSIÓN A LA OBRA			
		ACTUAL		MODIFICADO	ACTUAL	%		ACTUAL	%
MINGA MEDIANA VIA		$	6.179.000.000,00	$	$	6.179.000.000,00	0,00%	$	$ 6.000.000.000,00
ENERGÍA SOLAR		$	1.080.000.000,00	$	$	1.079.999.999,99	0,00%	$	$ 1.079.999.999,99
TOTAL		$	7.259.000.000,00	$	$	7.259.000.000,00	0,00%	$	$ 7.079.999.999,99

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo he indicado en anteriores 3 Condiciones técnicas: "**1.-El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista 2.-**", por lo anterior, haciendo no a lo que inicialmente se ha indicado el cronograph presentado por equipamientos, el cual se establecen de las presupuestos, programacionales ¿Pago de sala que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento e intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 03. ARTICULOS DE POLICIA CIUDADI BOLIVAR, del 5 de Marzo de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere falla diagnos en el ladrillo de la vellos de las personas privadas de la libertad.**
- Se procede con la retención de los asomorros sanitarios, que evite en mal estado para evellan el mobiliamiento.
- Se requiere 4 cambios de - 2 pouch sanitarios, 1 pouch urinal, 2 pouch lavamanos, 5 pouch de ducha.
- Se realizan 5 cambios de ellenes.

3.2 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCIÓN

3.3.1 **UN DE PUENTE ARANDA**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA OBRA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 343.000.000,00	$ 101.754.919,35	70,17%	$ 101.851.969,59	0,0%	$ 241.148,41
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 343.000.000,00	$ 101.754.919,35	$ 0,00	$ 101.851.969,59	0,0%	$ 241.148,41


2. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA



3. ASPECTO TECNICO


3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Programado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

1. Suministro de accesorios eléctricos
2. Sostenes de puntos sanitarios
3. Suministro e instalación de tubo EMT
4. Suministro e instalación de tubo panel fed de inoculair o subimpreme de 18w
5. Cableado 3x12
6. Cableado 3x14
7. Suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería EMT de 1/2"
8. Boke + interruptor doble en tubería EMT de 1/2"
9. Suministro e instalación de caja metálica galvanizada
10. Pantalla led 60x60
11. Suministro e instalación de reflector de 100w
12. Kit de salida de descarga antibalística alta presión para sanitarios de contestín superior
13. Kit salida de descarga antibalística alta presión para sanitarios de contestín superior

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	MATERIAL: Lampara fluorescente, tuberia EMT de 1/2", tuke panel led de 18w,salida s13,tomacorriente doble, interruptor doble,caja metalica galvanizada,pantalla led 60x60, reflector de 100w,salida antibalistica para cimet y para sanitarios. HERRAMIENTAS: Varias.

3.3.2 **CIR**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA OBRA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$	
COSTO DIRECTO + AIU	$ 353.000.000,00	$ 101.059.364,00	71,63%	$ 50.820.200,00	28,2%	$ 40.180.00,00	
OBRAS ADICIONALES							
TOTAL			71,63%	$ 50.820.200,00	14,4%	$ 40.180.00,00	

2. FOTOGRAFÍA PANORÁMICA



3. ASPECTO TECNICO


3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Programado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN



3.3 DESCRIPCIONES LAS ACTIVIDADES

1. Tuberia EMT de 3/4" incrporadida incluye accesorios
2. Suministro e instalación de tomacorriente doble tuberia tipo 2x3,3tp
3. Suministro e instalación de red eléctrica monofasica en Cu 2x14 2x2AWG
4. Suministro e instalación de caja 4x4x2
5. Suministro e instalación + de lamparas fluorescitos
6. Suministro e instalación de tomacorriente de encerramiento en bull pulverizantes

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	MATERIAL: Tuberia EMT de 3/4", lamcnacle de emergencia tuberia, salide de Cu, salide No. 10 AWG, lampara herrmetica, HERRAMIENTAS: Varias.

3.3.3 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	100.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%	10,52%	15,45%	17,10%	21,56%	25,97%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%	27,43%	28,19%	26,57%	4,09%	1,87%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%	19,92%	35,37%	52,47%	74,03%	100,00%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%	39,28%	67,47%	94,04%	98,13%	100,00%

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
Programado Semanal	1,53%	3,87%	4,08%	13,84%	24,93%	37,73%	14,02%
Ejecutado Semanal	1,68%	14,74%	5,05%	66,91%	6,41%	3,23%	0,51%
Programado acumulado	1,53%	5,40%	9,48%	23,32%	48,25%	85,98%	100,00%
Ejecutado Acumulado	3,15%	17,89%	22,94%	89,85%	96,26%	99,49%	100,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON CELDAS		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE			
		$ 48.867.911,06		$ 61.211.945,39		$ 61.211.945,39		$ 62.253.007,57	
						PROYECTADO		EJECUTADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	DEMOLICIÓN PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45,80	$ 9.907,00	$ 453.740,60	45,80	$ 453.740,60	6,00	$ 59.442,00
16	demolicion de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte	M2	22,94	$ 36.000,00	$ 825.840,00	22,94	$ 825.840,00	34,00	$ 1.224.000,00
27	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	11,20	$ 18.329,00	$ 205.284,80	11,20	$ 205.284,80	7,50	$ 137.467,50
31	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2	2,00	$ 11.176,00	$ 22.352,00	2,00	$ 22.352,00	2,00	$ 22.352,00
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	1,00	$ 43.439,00	$ 43.439,00	1,00	$ 43.439,00	1,00	$ 43.439,00
52	Desmonte de push sanitarios	UN	5,00	$ 19.169,00	$ 95.845,00	5,00	$ 95.845,00	3,00	$ 57.507,00
73	Corte de placa con pulidora. Incluye aseo	ML	9,25	$ 5.127,00	$ 47.424,75	9,25	$ 47.424,75	9,00	$ 46.143,00
118	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	M2	2,00	$ 8.852,00	$ 17.704,00	2,00	$ 17.704,00	2,00	$ 17.704,00
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 211.035,00
311	Punto electrico para toma corriente doble.	UN	0,00	$ 58.577,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 58.577,00
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	0,00	$ 93.459,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 280.377,00
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	0,00	$ 22.943,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.943,00
327	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UN	0,00	$ 36.291,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 145.164,00
329	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	$ 10.526,00	$ -	0,00	$ -	16,20	$ 170.521,20
337	CABLEADO 2#12	ML	0,00	$ 6.980,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 146.580,00
343	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	0,00	$ 30.928,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.928,00
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	7,52	$ 16.364,00	$ 123.057,28	7,52	$ 123.057,28	28,50	$ 466.374,00
435	RESANES GENERALES	M2	8,90	$ 9.236,00	$ 82.200,40	8,90	$ 82.200,40	7,50	$ 69.270,00
439	Suministo y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	0,00	$ 21.723,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 130.338,00
457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	ML	21,60	$ 25.133,00	$ 542.872,80	21,60	$ 542.872,80	21,60	$ 542.872,80
475	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	0,00	$ 7.430,00	$ -	0,00	$ -	34,10	$ 253.363,00
509	Limpieza y mantenimiento de cubierta en teja eternit (cambio de tejas dañadas y ajustes de tejas existentes y estructura metalica, tornilleria y lijada con grata en cerda metalica.	M2	0,00	$ 29.525,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 1.181.000,00
574	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) ELABORADOS EN VARILLA METÁLICA LISA Ø7/8" PUESTA VERTICALMENTE CADA 0.10 Y PLATINAS 38X4MM (1½"X3/16"). CON MARCOS PERIMETRALES Y DIVISIONES VERTICALES MODULARES EN ÁNGULO METÁLICO 50 X 4MM (2"X3/16"). PIEZAS CONJUNTAMENTE SOLDADAS GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA A VANDALISMO. FIJADA CON ANCLAJES CADA 0.20 EN EL PERÍMETRO. ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR GRIS CLARO MATE APLICADA SOBRE BASE ANTICORROSIVA. (INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA).	M2	10,41	$ 715.977,00	$ 7.453.320,57	10,41	$ 7.453.320,57	12,74	$ 9.121.546,98
578	Suministro e instalación de lámina alfajor Cal.14 para protección de ventanas. Incluye marco en angulo de 1"*1"1/8", anticorriso alquidico y pintura de acabados alquidica. (Incluye elementos para trabajos en alturas)	M2	6,10	$ 295.474,00	$ 1.802.391,40	6,10	$ 1.802.391,40	3,00	$ 886.422,00
680	Suministro e instalación de Refelctor de 100W	UN	5,00	$ 229.526,00	$ 1.147.630,00	5,00	$ 1.147.630,00	5,00	$ 1.147.630,00
684	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1,00	$ 186.668,00	$ 186.668,00	1,00	$ 186.668,00	2,00	$ 373.336,00
688	INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00
690	INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00
691	INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS	UN	1,00	$ 26.518,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00	1,00	$ 26.518,00
693	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	2,00	$ 43.439,00	$ 86.878,00	2,00	$ 86.878,00	1,00	$ 43.439,00
720	Suministro e instalación de lavamanos antivandalico en acero inoxidable.	UN	2,00	$ 1.600.770,00	$ 3.201.540,00	2,00	$ 3.201.540,00	2,00	$ 3.201.540,00
721	Suministro E instalación De orinal Antivandalico En Acero Inoxidable.	UN	1,00	$ 1.743.870,00	$ 1.743.870,00	1,00	$ 1.743.870,00	1,00	$ 1.743.870,00
756	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1,00	$ 318.930,00	$ 318.930,00	1,00	$ 318.930,00	2,00	$ 637.860,00
757	DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-17125106 DOCOL Ó SIMILAR	UN	2,00	$ 328.431,00	$ 656.862,00	2,00	$ 656.862,00	2,00	$ 656.862,00
763	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario.	UN	1,00	$ 434.607,00	$ 434.607,00	1,00	$ 434.607,00	1,00	$ 434.607,00
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	169,25	$ 15.332,00	$ 2.594.941,00	169,25	$ 2.594.941,00	211,00	$ 3.235.052,00
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	45,80	$ 11.312,00	$ 518.089,60	45,80	$ 518.089,60	20,00	$ 226.240,00
807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML	158,00	$ 7.902,00	$ 1.248.516,00	158,00	$ 1.248.516,00	70,00	$ 553.140,00
818	Suministro e instalación de pintura poliuretano 2 manos	M2	47,33	$ 54.162,00	$ 2.563.704,11	47,33	$ 2.563.704,11	20,10	$ 1.088.656,20
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	69,50	$ 15.013,00	$ 1.043.403,50	69,50	$ 1.043.403,50	140,00	$ 2.101.820,00
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	0,00	$ 2.451,00	$ -	0,00	$ -	48,89	$ 119.829,39
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.	Ml	0,00	$ 8.545,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 153.810,00
NP 1	CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14,75	$ 685.000,00	$ 10.102.380,00	14,75	$ 10.102.380,00	26,40	$ 18.084.000,00
NP-6	Suministro e instalación de viga de corona para muro de 0,15 x 0,25 mts. No Incluye refuerzo en acero	ML	10,80	$ 169.800,00	$ 1.833.840,00	10,80	$ 1.833.840,00	2,90	$ 492.420,00
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	ML						19,25	
	Caja interruptor sencillo	UN						4,00	
	Pintura mediacaña en esmalte	ML						43,80	
	Suministro e instalación de perfil metalico	ML						10,00	
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 48.867.911,06		$ 48.867.911,06		$ 49.699.032,07
	ADMINISTRACION			20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.773.582,21	20%	$ 9.939.806,41
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 244.339,56	0,50%	$ 248.495,16
	UTILIDAD			4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.954.716,44	4%	$ 1.987.961,28
	IVA			19%	$ 371.396,12	19%	$ 371.396,12	19%	$ 377.712,64
	TOTAL OBRA				$ 61.211.945,39		$ 61.211.945,39		$ 62.253.007,57

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza entrega a la Mebog el 3 de enero de 2024

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.4 CASA DE JUSTICIA USME

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	100.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	100.00%	$ 38,435,935.00	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 38,435,935.00	100.00%	$ 38,435,935.00	0.0%	$ -


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0,26%	2,87%	6,27%	10,52%	15,45%	17,10%	21,56%	25,97%
Ejecutado Semanal	0,82%	0,00%	11,03%	27,43%	28,19%	26,57%	4,09%	1,87%
Programado acumulado	0,26%	3,13%	9,40%	19,92%	35,37%	52,47%	74,03%	100,00%
Ejecutado Acumulado	0,82%	0,82%	11,85%	39,28%	67,47%	94,04%	98,13%	100,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB CJ USME		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE			
		$ 30.684.923,36		$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 40.756.032,95	
						PROYECTADO		EJECUTADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	$ 17.758,00	$ -	0,00	$ -	0,63	$ 11.187,54
11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	16,00	$ 10.412,00	$ 166.592,00	16,00	$ 166.592,00	8,32	$ 86.627,84
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	6,00	$ 43.439,00	$ 260.634,00	6,00	$ 260.634,00	4,00	$ 173.756,00
34	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	3,80	$ 3.740,00	$ 14.212,00	3,80	$ 14.212,00	5,90	$ 22.066,00
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	36,80	$ 2.237,00	$ 82.321,60	36,80	$ 82.321,60	1,56	$ 3.489,72
36	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6,00	$ 17.015,00	$ 102.090,00	6,00	$ 102.090,00	4,00	$ 68.060,00
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	8,00	$ 15.168,00	$ 121.344,00	8,00	$ 121.344,00	11,00	$ 166.848,00
49	Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrates)	UN	4,00	$ 15.759,00	$ 63.036,00	4,00	$ 63.036,00	9,00	$ 141.831,00
50	Desmonte de tuberia sanitaria, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales, y carga	UN	0,00	$ 3.529,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 28.232,00
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	16,10	$ 10.841,00	$ 174.540,10	16,10	$ 174.540,10	56,13	$ 608.505,33
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores)	UN	4,00	$ 3.741,00	$ 14.964,00	4,00	$ 14.964,00	4,00	$ 14.964,00
58	Desmonte de cableado electrico (contempla los cables contenidos d	Ml	0,00	$ 3.368,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 30.312,00
62	Desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas	UN	0,00	$ 4.360,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 13.080,00
77	Compactación y relleno con material existente	M3	0,00	$ 20.093,00	$ -	0,00	$ -	0,83	$ 16.677,19
89	Demolición de placa maciza de piso con espesor entre 10 y 15 cm. Incluye retiro de sobrantes	M2	0,00	$ 55.378,00	$ -	0,00	$ -	8,32	$ 460.744,96
92	Suministro y fundicion de placa de concreto impermeabilizado de	M2	0,00	$ 126.518,00	$ -	0,00	$ -	8,32	$ 1.052.629,76
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	0,00	$ 46.556,00	$ -	0,00	$ -	2,52	$ 117.321,12
111	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	ML	0,00	$ 39.227,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 78.454,00
117	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	0,00	$ 81.067,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 162.134,00
130	Suministro e instalación de muro en lamina de fibrocemento espesor 10 mm, doble cara B 9. Incluye estructura, masilla acrilica, dilataciones, cinta filo y demas elementos para su correcta instalación.	Ml	0,00	$ 84.060,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 168.120,00
158	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	24,00	$ 2.621,00	$ 62.904,00	24,00	$ 62.904,00	30,00	$ 78.630,00
160	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	0,00	$ 6.687,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 40.122,00
163	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	3,00	$ 65.327,00	$ 195.981,00	3,00	$ 195.981,00	5,00	$ 326.635,00
173	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	ML	0,00	$ 8.327,00	$ -	0,00	$ -	15,88	$ 132.232,76
176	TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"	ML	0,00	$ 10.286,00	$ -	0,00	$ -	8,50	$ 87.431,00
204	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	0,00	$ 13.976,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 293.496,00
205	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN	0,00	$ 40.045,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 600.675,00
207	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	0,00	$ 28.203,00	$ -	0,00	$ -	5,45	$ 153.706,35
208	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	ML	0,00	$ 37.368,00	$ -	0,00	$ -	5,60	$ 209.260,80
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 253.242,00
303	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	0,00	$ 75.163,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 225.489,00
304	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN	2,00	$ 75.631,00	$ 151.262,00	2,00	$ 151.262,00	2,00	$ 151.262,00
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incruster o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	6,00	$ 93.459,00	$ 560.754,00	6,00	$ 560.754,00	3,00	$ 280.377,00
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	0,00	$ 279.847,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.798.470,00
322	Suministro e instalación de interruptor doble	UN	3,00	$ 41.118,00	$ 123.354,00	3,00	$ 123.354,00	2,00	$ 82.236,00
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	6,00	$ 22.943,00	$ 137.658,00	6,00	$ 137.658,00	3,00	$ 68.829,00
329	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	$ 10.526,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.052,00
432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	0,00	$ 16.364,00	$ -	0,00	$ -	5,90	$ 96.547,60
434	Resane de filos con mortero.	ML	0,00	$ 5.492,00	$ -	0,00	$ -	14,76	$ 81.061,92
439	Suministo y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	16,80	$ 21.723,00	$ 364.946,40	16,80	$ 364.946,40	53,52	$ 1.162.614,96
441	Limpieza y reemboquille de enchape	M2	14,00	$ 22.222,00	$ 311.108,00	14,00	$ 311.108,00	4,00	$ 88.888,00
443	Suministro y aplicación de pañete liso 1:4 lineal, (ancho maximo	ML	0,00	$ 9.818,00	$ -	0,00	$ -	17,80	$ 174.760,40
450	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	0,00	$ 108.387,00	$ -	0,00	$ -	19,89	$ 2.155.817,43
457	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	ML	25,00	$ 25.133,00	$ 628.325,00	25,00	$ 628.325,00	35,00	$ 879.655,00
464	Alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4	M2	0,00	$ 23.285,00	$ -	0,00	$ -	27,39	$ 637.776,15
467	Bocapuerta en gravilla lavada (Incuye dilatacion en plastica)	ML	0,00	$ 30.301,00	$ -	0,00	$ -	2,02	$ 61.208,02
469	Suministro e instalación de piso duro piso	ML	0,00	$ 43.820,00	$ -	0,00	$ -	14,93	$ 654.232,60
470	Suministro e instalación de piso duro piso	M2	14,00	$ 66.537,00	$ 931.518,00	14,00	$ 931.518,00	8,32	$ 553.587,84
474	Suministro e instalación de guardescoba en ceramica stone Blanco 7,5cm.	ML	6,00	$ 8.648,00	$ 51.888,00	6,00	$ 51.888,00	16,14	$ 139.578,72
498	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	35,00	$ 39.319,00	$ 1.376.165,00	35,00	$ 1.376.165,00	36,50	$ 1.435.143,50
519	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	ML	19,00	$ 43.279,00	$ 822.301,00	19,00	$ 822.301,00	75,20	$ 3.254.580,80
541	Suministro e Instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. Incluye pintura electrpestatica	UN	6,00	$ 17.715,00	$ 106.290,00	6,00	$ 106.290,00	2,00	$ 35.430,00
635	JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ASTRO CORONA Ó EQUIVALENTE	UN	2,00	$ 78.156,00	$ 156.312,00	2,00	$ 156.312,00	2,00	$ 156.312,00
645	WIN DE ALUMINIO	ML	3,00	$ 6.298,00	$ 18.894,00	3,00	$ 18.894,00	8,45	$ 53.218,10
729	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ 8.171,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 32.684,00
735	TAPARREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ 21.264,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 85.056,00
739	Suministro e instalación de sifón en P, para lavamanos, metálico cromado. Importado. Marca A&A o similar.	UN	0,00	$ 47.240,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 47.240,00
746	REVISIÓN y REPARACION TANQUE P´SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS)	UN	0,00	$ 126.120,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 378.360,00
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	36,50	$ 15.332,00	$ 559.618,00	36,50	$ 559.618,00	120,80	$ 1.852.105,60
801	ESTUCO	M2	0,00	$ 6.312,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 157.800,00
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	0,00	$ 11.592,00	$ -	0,00	$ -	183,15	$ 2.123.074,80
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	44,50	$ 11.312,00	$ 503.384,00	44,50	$ 503.384,00	51,39	$ 581.323,68
807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML	18,90	$ 7.902,00	$ 149.347,80	18,90	$ 149.347,80	54,67	$ 432.002,34
826	Remocion de pintura suelta manual.	M2	6,00	$ 1.649,00	$ 9.894,00	6,00	$ 9.894,00	9,80	$ 16.160,20
827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	24,10	$ 13.900,00	$ 334.990,00	24,10	$ 334.990,00	66,26	$ 921.014,00
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres	M2	0,00	$ 15.013,00	$ -	0,00	$ -	53,52	$ 803.495,76
832	Suministro y aplicación de esmalte sobre lamina lienal (Contempla	M2	0,00	$ 25.010,00	$ -	0,00	$ -	3,36	$ 84.033,60
836	Suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfaltico	M2	35,50	$ 24.250,00	$ 860.875,00	35,50	$ 860.875,00	108,10	$ 2.621.425,00
849	CERRADURA SCHLAGE O SIMILAR ENTRADA A-80 PD	UN	0,00	$ 143.545,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 287.090,00
867	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm	M2	0,00	$ 297.700,00	$ -	0,00	$ -	1,08	$ 321.516,00
870	Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, Incluye desmonte, ajuste, nivelacion, lubricacion y reinstalación	UN	2,00	$ 295.249,00	$ 590.498,00	2,00	$ 590.498,00	2,00	$ 590.498,00
904	Poda de cesped (Incluye retiro de sobrantes)	M2	0,00	$ 4.215,00	$ -	0,00	$ -	14,98	$ 63.140,70
920	Remoción de cinta antideslizante. Incluye retiro de material.	Ml	25,00	$ 8.545,00	$ 213.625,00	25,00	$ 213.625,00	34,00	$ 290.530,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 30.684.923,36		$ 30.684.923,36		$ 32.537.149,09
	ADMINISTRACION			20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.136.984,67	20%	$ 6.507.429,82
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 153.424,62	0,50%	$ 162.685,75
	UTILIDAD			4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.227.396,93	4%	$ 1.301.485,96
	IVA			19%	$ 233.205,42	19%	$ 233.205,42	19%	$ 247.282,33
	TOTAL OBRA				$ 38.435.935,00		$ 38.435.935,00		$ 40.756.032,95

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Se tiene programada entrega el 9 de enero de 2024

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.5 ESTACION DE POLICIA DE SUBA


1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	11.15%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	11.15%	$ 57,227,094.49	88.9%	$ 456,020,389.70
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			11.15%	$ 57,227,094.49	88.9%	$ 456,020,389.70

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA




3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	0.00%	0.00%	0.00%	100%	0.00%
Ejecutado Semanal	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%
Programado acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%
Ejecutado Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Excavacion peñenes
2. Suministro e instalacion de ESMD-e40.
3. Relgrado red entre 1/2"
4. Suministro e instalacion de grupo hidraulicos de 1/2"
5. Suministro e instalacion de 1/2"
6. Suministro de puntos luminiperos entre 1 1/2" y 4"
7. Suministro e instalacion de 1/2"
8. Suministro y aplicacion de pallete impermeabilizado bau 1) Excaber muros en aluteos int a 3 mts
9. Afinado impermeabilizado para piso sika 1 en muretes 1.8
10. Suministro y aplicacion de pintura
11. Suministro y aplicacion de reclaso plastico sobre muros

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
3 OFICIALES 6 AYUDANTE	MATERIAL: Cemento, arena , grevilla, agua,ladrillo tolete, registro red valvula de 1/2", tuberia PVC-P de 1/2" y accesorios, pegamento, cinta teflon, cinta de aislar, tornillos, silla T, mixtas plásticas HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA PONTRON**

3.1 ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	
COSTO DIRECTO + IAU	$ 124,656,760.19	$ 124,656,760.19	0.00%	$ 79,907,385.00	64.11%	$ 44,749,375.19
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 124,656,760.19	$ 124,656,760.19	0.00%	$ 79,907,385.00	64.11%	$ 44,749,375.19

3.2 FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO


3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	0.42%	0.42%	0.76%	1.83%	0.42%
Ejecutado Semanal	0.42%	0.00%	0.76%	0.76%	0.76%
Programado acumulado	0.42%	0.42%	1.18%	2.67%	3.10%
Ejecutado Acumulado	0.42%	0.42%	0.76%	11.48%	1.52%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Suministro e instalacion de Luminaria Panel LED de 60*60 2- PUERTA ENTAMBORADA LAMBRUC R. C.E.S. Mantenimiento de puerta metalica empotrada de 2.1 x 1.0ba -o .SUSCIO DE INCRUSTACIONES - LINEA ASTRO CORONA CHIQUINILHATE

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 1 ORNAMENTADOR 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE	MATERIAL: luminarias, antibacterial, multiadaptor, pintura de esmaltar blanca HERRAMIENTAS: Menor, equipo de soldadura, compresor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA SAN ONISTOBAL**

3.1 ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	
COSTO DIRECTO + IAU	$ 905,258,403.49	$ 905,258,403.49	7.59%	$ 79,267,363.00	92.5%	$ 825,991,040.49
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 905,258,403.49	$ 905,258,403.49	7.59%	$ 79,267,363.00	92.5%	$ 825,991,040.49


3.2 FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO


3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Programado Semanal	0.32%	0.32%	0.76%	0.98%	1.21%
Ejecutado Semanal	0.71%	1.02%	1.75%	2.12%	1.69%
Programado acumulado	0.32%	0.65%	1.42%	2.40%	3.61%
Ejecutado Acumulado	0.71%	1.73%	3.43%	5.97%	7.66%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. SUSPENSIÓN DE SALA/HABITACIÓN 2. SUSPENSIÓN DE SALA/HABITACIÓN 3. Demolición de lampares. 4. Regado en placa 5. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 6. Suministro e instalación de interruptor triple 7. Suministro e instalación de interruptor sencillo 8. Mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos 9. Suministro e instalación de cinta metálica de paso 10. PUERTO LECO SUBITO MUROS 1.4

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 ALBAÑIL 4 AYUDANTES	MATERIAL : CEMENTO , ARENA, MARCO METALTECO, MATALACHAS EN ELTRICAS , LAMPARAS HERRAMIENTAS: Menor,

3. ASPECTO TECNICO

3.3.8 **CASA DE JUSTICIA SAN ONISTOBAL**

3.1 ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	
COSTO DIRECTO + IAU	$ 24,162,768.00	$ 24,162,768.00	0.17%	$ 4,819,053.00	80.4%	$ 19,407,677.00
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 24,162,768.00	$ 24,162,768.00	0.17%	$ 4,819,053.00	80.4%	$ 19,407,677.00

3.2 FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA



	SEMANA 1
Programado Semanal	0.00%
Ejecutado Semanal	0.00%
Programado acumulado	0.00%
Ejecutado Acumulado	0.00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION



3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demostrate yredes derivados actilitico

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 ALBAÑIL 2 AYUDANTES	MATERIAL : SI_D HERRAMIENTAS: Menor

3. ASPECTO TECNICO

3.3.9 CASA DE JUSTICIA MARTIRES

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	
CONTRATO PRINCIPAL + otro	$ 33,268,787.27	$ 33,268,787.27	0.00%	$ -	100.0%	$ 33,268,787.27
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 33,268,787.27	$ 33,268,787.27	0.00%	$ -	100.0%	$ 33,268,787.27

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA



	SEMANA 1
Programado semanal	0.26%
Ejecutado Semanal	0.00%
Programado acumulado	0.26%
Ejecutado Acumulado	0.00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	COSTOS DIRECTO		VISION TOTAL		$ 33,268,787.27			
		$ 33,268,787.27		$ 33,268,787.27		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	VOL. CONTRATO ADICIONAL	VOLUME TOTAL	CANTIDAD	VOLUME TOTAL	CANTIDAD	VOLUME TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1		GL	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00
1.2		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
1.3		GL	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000.00
1.4		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
1.5		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
1.6		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
1.7		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
2	PROVISIONAL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
2.1		MES	24.00	$ 1,000,000.00	$ 24,000,000.00	0.00	$ -	24.00	$ 24,000,000.00
2.2		MES	24.00	$ 1,000,000.00	$ 24,000,000.00	0.00	$ -	24.00	$ 24,000,000.00
3	DEMOLICIÓN, RETIROS Y ADECUACIONES								
3.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
3.02		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
3.03		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
3.04		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
3.05		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
3.06		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
3.07		GL	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
4	CIMENTACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURAS								
4.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.02		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.03		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.04		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.05		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.06		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.07		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.08		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.09		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
4.10		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
5	APLICACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS								
5.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
5.02		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
5.03		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
5.04		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
5.05		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
6	APLICACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES								
6.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
6.02		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
6.03		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
6.04		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
6.05		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7	ACABADOS								
7.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.02		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.03		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.04		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.05		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.06		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.07		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.08		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.09		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
7.10		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8	OBRAS EXTERIORES								
8.01		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.02		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.03		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.04		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.05		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.06		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.07		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.08		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.09		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
8.10		GL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 3,000,000.00
	CONTRATO PRINCIPAL				$ 33,268,787.27		$ -		$ 33,268,787.27
	ADMINISTRACION	10%			$ 3,326,878.73	0%	$ -	10%	$ 3,326,878.73
	IMPREVISTOS	10%			$ 3,326,878.73	0%	$ -	10%	$ 3,326,878.73
	UTILIDAD	10%			$ 3,326,878.73	0%	$ -	10%	$ 3,326,878.73
	IVA	19%			$ 4,412,108.21	0%	$ -	19%	$ 4,412,108.21
	TOTAL OBRA				$ 49,661,531.67		$ -		$ 49,661,531.67

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Se toma actade inicio y con ella apertura del frente el 2 de enero de 2024 pero el contratista no ha iniciado actividades hasta la fecha.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y MAQUINARIA
	HERRAMIENTAS
	HERRAMIENTAS

3.5 OBSERVACIONES

s. n. s. Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias, el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la misma.
s. n. s. Se realizó intervención de emergencia en PS 22 , barrio 13 - MPAL Ciudad Bolívar - CDP, URU.

3.6 Aspectos Socio-Ambientales (Seguridad Industrial)

4.1 Se envía a contratista de obra y entidad este del contrato
4.2 Se realizo revisión de aprobacion de informes mensuales No 3 enviados por el contratista de obra

3.7 Aspectos Socio-Ambientales

6.1 Se realizo revisión de obra realizado de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y SGSCI.1 Se realizo visita de los especialistas eléctricos tanto de interventoria como contratista a la C2 Chorro y Ro San Cristobal.
s. n. Se realiza entrega EP. Fondatori Cristiana la MIRADO el 3 de enero de 2024
s. n. Se realiza entrega de informe final de la obra el 3 de enero de 2024 y enero de 2024 .
6.2 Se toman muestras de concreto en cilindro para verificar resistencias del concreto , como c .EP SUBA
s. n. Se presenta propuesta de tuercasca para mitigar el atarantado de reflectores a las celdas ente no se aprueba y comienzan ata alternativa aprobada por la supervisión - CER.
s. n. Se terminan actividades en URUGUAY PUENTE JEHUDA P.PAPA L. Ante mencher verdaderas entre las partes. CONTRATISTAS INTERVENTORIA.
6.2 Se realizo visita de verificación con la interventoria de la obra y se realizo observaciones a ejecutar por parte del contratista para el proximo aprobado, el contratista tiene varias actividades para ejecutar en este
s. n. Se realiza recorrido numerando con la Ibiblog en la EP. San Cristobal y en la actas el alcance el contratista por lo cual debe ejecutar y presentar el presupuesto ajustado, el contratista tiene varias actividades para ejecutar en

3.8 PERSONAL DE OBRA Y EQUIPO UTILIZADO

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
MAESTRO GENERAL	01	MAESTRO GENERAL	1
ALMACENISTA DE OBRA (APOY)	01	ALMACENISTA DE OBRA (APOY)	1
INGENIERO RESIDENTE	01	INGENIERO RESIDENTE	1
INGENIERO SST, PREVENCION Y PROGRAMAS SOCIALES	01	INGENIERO SST, PREVENCION Y PROGRAMAS SOCIALES	1
SUPERVISOR SST, SEGURIDAD INDUSTRIAL, GALAS SOCIAL/SOCIAL Y AMBIENTAL	01	SUPERVISOR SST, SEGURIDAD INDUSTRIAL, GALAS	1
MAESTRO DE OBRA (APOY)	01	PROFESIONAL ELECTRICO (APOY)	1
ELECTRICISTA (APOY)	01	PROFESIONAL ELECTRICO (APOY)	1
MAESTRO ESTRUCTURAS (APOY)	01	PROFESIONAL ESTRUCTURAS (APOY)	1

3.9 Aspectos Socio-Ambientales (Seguridad Industrial) Aspectos Socio-Ambientales

7.1 Se requirió la documentación de afiliación a seguridad social, listado de personales, ARL y exploramen, de ingreso del personal de los frentes que estas abiertos si hay personal adicional pide las nuevas frentes antes de

3.10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se coordinó con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo no se dio inicio con el seguimiento y control del las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1405/23.
s. n. Se solicita al contratista hormeneiro el personal en los diferentes frentes de obra para no incurrir en atrasos.
8.4 El contratista tiene de libre en los diferentes frentes de obra para realizar actividades pero por falta de personal esta semana no se evidencio el avance esperado

ARQ. ALEXIS ROCHA J. | Rol/Cargo: INGENIERO DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 55 - E.P CIUDAD BOLIVAR



SONDEOS DE SIFONES



DESMONTE DE PUSH SANITARIO - CELDAS



INSTALACION DE PUSH DUCHA - CELDAS



DUCHAS CELDAS - CAMBIO DE PUSH

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



PRUEVA DE ILUMINACION PABELLONES



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA



PRUEVA DE ILUMINACION PABELLONES



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON - CELDAS



ACABADOS FINALES



ACABADOS FINALES



ACABADOS FINALES



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ USME

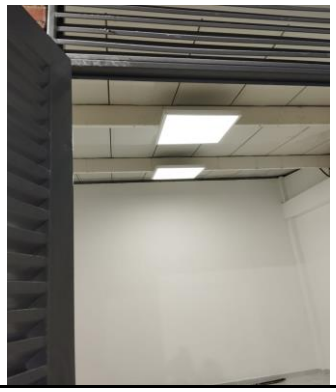

INTALACIÓN DE LUMINARIAS



ACABADOS FINALES SHUT DE BASURAS



ACABADOS FINALES SHUT DE BASURAS



MURO EN DRYWALL OFOCINA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIXZADO OFC 1 PISO



INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA BAÑO - 1 PISO

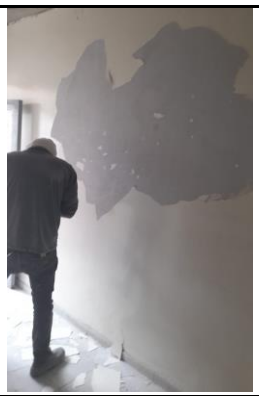



REMOSION PINTURA SUELTA



PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 - BAÑO 1 PISO


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON

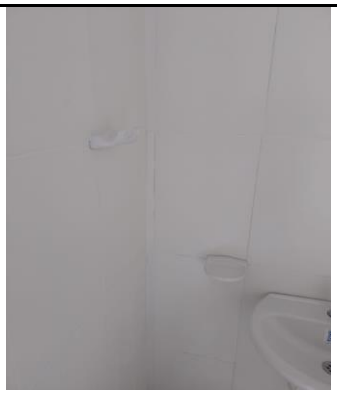

INSTALACION DE ACCESORIOS



INSTALACION DE ACCESORIOS



SUMINISTRO DE DIVISIONES DE BAÑO



INSTALACIÓN DE DIVISIONES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



INSTALACION DE MANTO CUBIERTA



INSTALACION DE PAÑETE SOBRE MUROS DE BAÑOS



MANTENIMIENTO DE TABLERO



INSTALACION DE LUMINARIAS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	13	DEL	lunes, 1 de enero de 2024	AL	domingo, 7 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ SAN CRISTOBAL

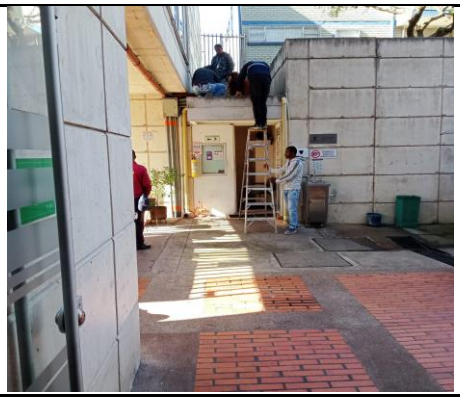

DESMONTE DE MANTO CUARTO VIGILANCIA



DESMONTE DE MANTO CUARTO VIGILANCIA

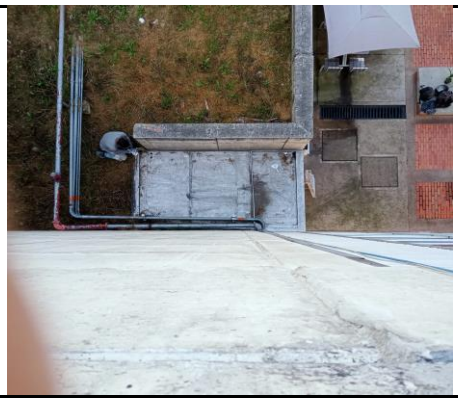

DESMONTE DE MANTO CUARTO VIGILANCIA



DESMONTE DE MANTO VIGA CANAL
