TOTALL INC SAS BIC

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15

PI-N-F 18	
VERSIÓN 01	
Pag.	De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	**15**	**DEL**	lunes, 15 de enero de 2024	domingo, 21 de enero de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
Contrato No.	1804 DE 2023		**Contrato No.**	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		**Fecha de Iniciación**	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		**Fecha de Terminación**	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	**Plazo Inicial**	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		**Valor Inicial**	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		**Adición No. 1**	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		**Valor Total del Contrato**	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	**Prórroga No. 1**		Meses
Plazo total	11.0	Meses	**Plazo total**	10	Meses
Días Transcurridos	104	**Faltantes** 238	**Días Transcurridos**	104	**Faltantes** 207
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	**15**		**SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA**	**15**	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		
		ACTUAL	ADICIONES	ACTUAL	%	$	$
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	8.70%	$ 20,343,628.00	$ 3,499,681,778.78
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 311,209,069.22	
BRIGADA XVIII	BASER CANTÓN NORTE					$ 153,075.24	
	PM1S	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.01%	$ -	$ 1,039,846,924.76
	SALA DE OPERACIONES					$ 309,191.78	
	BATALLONES BOGOTÁ					$ -	
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	9.85%	$ 9,355,086.74	$ 85,644,913.26
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	37.682%	$ 243,306,430.96	$ 586,693,569.04
	CASAS DE JUSTICIA					$ 69,457,677.55	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	11.33%	$ 654,134,159.49	$ 5,211,867,185.84

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		
		INICIAL	ADICIONES	ACTUAL	%	$	$
MEBOG	CAI´S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	35.46%	$ 85,029,404.00	$ 154,771,550.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PM1S	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	355.66%	$ 17,783,124.00	-$ 12,783,124.00
SDSCJ - SAJ	CTP, CIJ	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	124.76%	$ 32,562,897.00	-$ 346,146.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	50.32%	$ 166,500,675.00	$ 183,306,152.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		
	INICIAL	ADICIONES	ACTUAL	%	$	$
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	11.33%	$ 654,134,159.49	$ 5,211,867,185.84
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	50.32%	$ 166,500,675.00	$ 183,306,152.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	13.44%	$ 820,634,834.49	$ 5,395,173,337.84

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)"***, por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 57- C4 , del 10 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere realizar pintura de oficina sala del silencio**
- Se procede con la ejecución de la actividad de pintura de vinilo 3 manos
.

3.2.2 **Emergencia No. 58- C4 , del 11 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere realizar poda de prado de parqueadero.**
- Se procede con la ejecución de la poda del cesped de la zona de parquedero.
.

3.2.3 **Emergencia No. 59- CAI SANTA MARIA DEL LAGO, del 11 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere revizar sistema eléctrico del cai por encontrarse sin luz.**
- Se procede con el mantenimiento del tablero electrico
- Se hacen cambio de luminarias internas de 18w y externas de 25w
.

3.2.4 **Emergencia No. 60 - RAFAEL URIBE, del 19 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere reparar hueco en celdas.**
- Se procede con la reparación del hueco en celda
.

3.2.5 **Emergencia No. 61 - CAMPO VERDE, del 20 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere revizar sistema de bombeo**
- Se procede con la visita por que estos equipos son garantia del contrato anterior.
.

3.2.6 **Emergencia No. 62 - CAMPO VERDE, del 20 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere mantenimiento de mobiliario en mal estado.**
- Se procede con el mantenimiento del mobiliario en mal estado

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **URI DE PUENTE ARANDA PRIMERA ETAPA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	99.15%	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	$ 0.99	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

ACTIVIDADES TERMINADAS -CANTIADAES POR CONCILIAR

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES TERMINADAS -CANTIADAES POR CONCILIAR

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TERMINADAS -

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	100.98%	$ 142,412,462.58	-1.4%	-$ 1,382,097.58
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			100.98%	$ 142,412,462.58	-1.0%	-$ 1,382,097.58

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
Programado Semanal	1.20%	1.57%	1.74%	1.97%	4.35%	10.43%	16.29%	29.45%	11.30%	21.70%	0.00%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	11.05%	10.97%	24.17%	0.94%	1.64%	6.16%	22.77%	7.41%
Programado acumulado	1.20%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%	21.26%	37.55%	67.00%	78.30%	100.00%	100.00%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%	62.06%	63.00%	64.64%	70.80%	93.57%	100.98%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 11	CANTIDAD ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO	
1	PRELIMINARES									
33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SOLO P ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN	10	43.439,000	$ 434.390	3,00	10,00	100%	$ 130.317	
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	16	$ 3.741,00	$ 59.856	7,00	16,00	100%	$ 26.187	
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES									
297	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINIX O EQUIVALENTE - PVC	UN	1	$ 95.708	$ 95.708	2,00	2,00	200%	$ 191.416	
308	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	2	$ 80.763,00	$ 161.526	2,00	24,00	1200%	$ 161.526	
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	6	$ 93.459,00	$ 560.754	2,00	6,00	100%	$ 186.918	
315	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.	UN	1	$ 22.943,00	$ 22.943	12,00	12,00	1200%	$ 275.316	
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	16,00	$ 22.943,00	$ 367.088	12,00	16,00	100%	$ 275.316	
331	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	53,85	$ 17.077,00	$ 919.596	68,15	150,00	279%	$ 1.163.788	
368	Suministro e instalación de luminarias de emergencia tipo Sylvania led R1 2x1,6W o similar en muros inferiores o iguales a 3	UN	1,00	$ 88.417,00	$ 88.417	16,00	20,00	2000%	$ 1.414.672	
379	Suministro e instalacion de caja metalica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plastico y adtadores terminal EMT 1/2"	ML	13,00	$ 118.192,00	$ 1.536.696	4,00	34,00	262%	$ 472.768	
13	ILUMINACION									
653	Suministro e instalación de lamparas hermeticas	UN	3	$ 212.580	$ 637.740	4,00	8,00	267%	$ 850.320	
680	Suministro e instalación de Reflektor de 100W	UN	4	$ 229.526,00	$ 918.104	1,00	8,00	200%	$ 229.526	
14	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS									
742	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUMI E INSTALACIÓN)	UN	3	$ 37.364	$ 112.092	3,00	3,00	100%	$ 112.092	
763	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario	UN	4	$ 434.607,00	$ 1.738.428	5,00	12,00	300%	$ 2.173.035	
18	VIDRIOS Y ESPEJOS									
877	Suministro e instalación de silka flex para reparaciones y mantenimientos	MT	19,28	$ 4.624,00	$ 89.151	19,00	19,00	99%	$ 87.854	
							Costo Directo	$		8.366.175
							Administración	20%	$	1.679.635
							Imprevistos	0,5%	$	41.916,5
							Utilidad	6,0%	$	503.507,0
							TOTAL	$		10.615.727

7,41%

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Desmonte de aparatos sanitarios 2. Desmonte de accesorios eléctricos 3. Slidas de interruptor doble 4. Slida pra lámparas fluorecente 5. Suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer de 18 w 6. Suministro e instalación bala panel led de sobreponer e inscrustar de 25w 7. Sumistro e instalación de toma corriente doble 8. Tuberia EMT de 1" 9. Suministro e instalación de luminarias de emergencia tipo silvania o similar 10. Suministro e instalación caja metalica de paso 20x020x15 11. Suministro e instalación de lamparas hermeticas 12. Sumistro e instalación de reflector de 100 w 13. Llave manguera de 1/2" 14. Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario 15. Suministro e instalación de sika flex para reparaciones y mantenimientos.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	2 AYUDANTES	MATERIAL: Interruptor doble, cable #10 y #12,tubo conduit, bala panel led de incrustar o sobreponer de 18w y 25w,toam corriente doble, tuberia EMT de 1", luminaria de emergencia tipo silvania , caja metalica de paso 20x20x15,lampara hermetica, reflector de 100w,llave manguera de 1/2", push antivandalico para sanitario,sika flex. HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3.3.4 **CASA DE JUSTICIA USME**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3.3.5 **ESTACION DE POLICIA DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	19.82%	$ 101,725,651.37	80.2%	$ 411,521,832.82
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			19.82%	$ 101,725,651.37	80.2%	$ 411,521,832.82

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
Programado Semanal	0.36%	0.56%	0.76%	0.96%	1.16%	1.39%	1.82%
Ejecutado Semanal	0.12%	3.24%	188%	4.36%	1.59%	6.43%	2.24%
Programado acumulado	0.36%	0.92%	1.68%	2.64%	3.80%	5.19%	7.01%
Ejecutado Acumulado	0.12%	3.36%	5.2%	9.56	11.15%	17.58%	19.82%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LINEA BASE

LO EPOL SUBA			COSTO DIRECTO		ENTIDAD INTERVENTOR		VALOR TOTAL	
			$ 5,245,865,97				$	11,474,599,38
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD DEL 15 AL 19 DE	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES						$	-
1B	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	55,65	55,65	42,92	$ 5.307,00	$	122.854,24
1C	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML	1,10	1,10	1,10	$ 19.977,00	$	21.974,70
1D	Demolición de guardacosecha (incluye retiro de escombros)	ML	10,10	10,10	21,10	$ 5.442,00	$	80.838,00
1E	Demolición de afinado en pasos de escalera (huella y contrahuella) incluye retiro de material hasta sitio de	ML	3,50	10,10	21,10	$ 2.588,00	$	12.558,00
1F	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	1,10	1,10	1,10	$ 19.977,00	$	122.884,00
1G	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES)	UN	1,00	1,00	1,00	$ 81.015,00	$	101.101,00
1H	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	140,10	25,00	25,00	$ 2.207,00	$	55.525,00
1I	Demolición de andenes en concreto de piso a muros en alturas de hasta 3m. (incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	0,00	77,54	52,92	$ 18.841,00	$	193.586,92
4	MAMPOSTERIA			0,00			$	-
4B	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	0,00	10,10	1,10	$ 48.558,00	$	53.393,48
F	PAÑETES		0,00	0,00			$	-
4I2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	10,00	10,92	42,92	$ 48.558,00	$	529.583,92
4I4	Suministro y aplicación de pañete liso 1:3 impermeabilizado (incl. Limpieza con H2O2. Retiro de material suelto y humedecimiento.	M2	10,00	10,48	14,45	$ 48.558,00	$	510.899,48
5	PISOS						$	-
5I4	Afinado impermeabilizado para pisos en alto tráfico vehicular	M2	41,25	46,25	0,50	$ 23.285,00	$	123.819,00
5B	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		0,00	0,00			$	-
5I2	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	140,10	25,00	25,00	$ 51.927,00	$	1.298.175,00
6I	CARPINTERIA METÁLICA		0,00	0,00			$	-
6I5	Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable 1,00 X 2,00m	UN	0,00	1,00	1,00	$ 191.445,00	$	191.445,00
6I8	MARCOS PUERTAS LAMINA C.C. C18 - D=88 cm (ANTIC - ESMALTE)	UN	0,00	1,00	1,00	$ 155.337,00	$	155.337,00
9I	PINTURA			0,00			$	-
9I2	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	102,45	102,45	35,55	$ 11.532,00	$	1.003.868,40
9I5	Mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sandblasting	M2	24,25	24,25	24,25	$ 38.705,00	$	1.004.996,25
9I6	VIDRIO INTERIORES			0,00			$	-
9I7.4	Suministro e instalacion de vidrio laminado 6mm	M2		0,50	0,50	$ 285.388,00	$	1.017.201,40
	COSTO DIRECTO TOTAL						$	5.245.865,97
	ADMINISTRACION					20%	$	1.049.573,19
	IMPREVISTOS					8,50%	$	45.884,51
	UTILIDAD					4%	$	209.674,48
	TOTAL OBRA						$	11.474.599,38

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición pañetes. 2. Demolición de meson corrido 3.Demolición guardaescoba 4. Demolicion de afinado en pasos de escaleras 5. Desmonte de ventanas y vidrios 6. Desmonte de tanques elevados 7.retiro de manto asfaltico 8. Demolición de acabados ceramicos 9.Muro en bloque #4 10. Pañete liso sobre muros 1:4 11.Suministro de pañete 1:3 impermeabilizado 12. Alistado impermeabilizado para piso con sika 1 13.Impermeabilizacion cubierta plana con manto asfaltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio 14.Suministro e instalación de puertas en acero inoxidable 2x1 15. Marcos puerta lamina cal 18 16.Vinilo muros interiores 3 manos 17. Mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sandblasting 18.Suministro e instalación vidrio laminado 6mm

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES	6 AYUDANTE	MATERIAL:Cemento, arena ,agua,bloque #4, sika 1, manto asfaltico de 3mm con foil de aluminio , puerta en acero inoxidable, marco puerta lamina cal 18, vinilo,sandblasting, vidrio laminado 6mm. . HERRAMIENTAS: Menor

3.3.6 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	26.68%	$ 33,322,272.15	73.3%	$ 91,578,475.49
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	26.68%	$ 33,322,272.15	73.3%	$ 91,578,475.49


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 6
Programado Semanal	0,26%	0,53%	0,79%	1,09%	1,43%	3,14%	5,15%
Ejecutado Semanal	1,07%	2,05%	3,58%	4,79%	1,99%	-0,42%	13,62%
Programado acumulado	0,26%	0,79%	1,58%	2,67%	4,10%	7,24%	12,39%
Ejecutado Acumulado	1,07%	3,12%	6,70%	11,49%	13,48%	13,06%	26,68%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 100.321.885,66		$ 124.900.747,64		$ 114.340.802,18		$ 6.925.198,17			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	80,00	$ 13.483,00	$ 1.078.640,00	0,00	$ -	50,53	$ 681.295,99	-80,00	-$ 1.078.640,00
8	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	$ 10.923,00	$ -	0,00	$ -	5,16	$ 56.362,68	0,00	$ -
9	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLITE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	$ 17.758,00	$ -	0,00	$ -	6,47	$ 114.894,26	0,00	$ -
29	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONDICIONES)	UN	8,00	$ 83.651,00	$ 669.208,00	0,00	$ -	8,00	$ 669.208,00	-8,00	-$ 669.208,00
36	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	10,00	$ 17.015,00	$ 170.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-10,00	-$ 170.150,00
38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	0,00	$ 6.135,00	$ -	5,00	$ 31.675,00	0,00	$ 38.010,00	5,00	$ 31.675,00
39	Desmonte de Puertas.	UN	0,00	$ 7.598,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 15.116,00	0,00	$ -
48	Desmonte de lamparas (incluye retiro de sobrates)	UN	30,00	$ 15.168,00	$ 455.040,00	12,00	$ 182.016,00	8,00	$ 121.344,00	-18,00	-$ 273.024,00
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	50,82	$ 10.841,00	$ 550.939,62	24,50	$ 265.604,50	32,61	$ 353.525,01	-26,32	-$ 285.335,12
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	0,00	$ 3.741,00	$ -	5,00	$ 18.705,00	6,00	$ 22.446,00	5,00	$ 18.705,00
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes)	UN	0,00	$ 21.156,00	$ -	6,00	$ 126.924,00	2,00	$ 42.308,00	6,00	$ 126.924,00
67	Desmonte de tuberia PVC de presión, puesta superficialmente. Incluye retiro de accesorios de fijación y sobrantes. En tuberia de 1/2" hasta 4"	MI	88,00	$ 5.841,00	$ 514.008,00	0,00	$ -	20,00	$ 116.820,00	88,00	-$ 514.008,00
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	0,00	$ 21.723,00	$ -	13,00	$ 282.399,00	10,53	$ 228.743,19	13,00	$ 282.399,00
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	0,00	$ 43.758,00	$ -	0,00	$ -	52,38	$ 2.292.044,04	0,00	$ -
714	Suministro de punto sanitario D= 3"	UN	0,00	$ 82.670,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 330.680,00	0,00	$ -
862	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	0,00	$ 203.790,00	$ -	3,00	$ 611.370,00	2,00	$ 407.580,00	3,00	$ 611.370,00
860	Suministro e instalacion manija galvanizada para puerta	UNIDAD	0,00	$ 10.493,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 20.986,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 100.321.885,66	$ -	$ 91.840.001,75	$ -	$ 5.562.408,17	$ -	$ 7.588.977,91
	ADMINISTRACION			20%	$ 20.064.377,13	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 1.112.481,63	20%	-$ 1.517.795,58
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 501.609,43	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 27.812,04	0,50%	-$ 37.944,89
	UTILIDAD			4%	$ 4.012.875,43	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 222.496,33	4%	-$ 303.559,12
	TOTAL OBRA				$ 124.900.747,64	$ -	$ 114.340.802,18	$ -	$ 6.925.198,17	$ -	$ 9.448.277,49

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.DEMOLICION CIELO RASO FALSO 2. DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS 3. DESMONTE TANQUES ELEVADOS 4. SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA 5. SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA 6. Desmonte de Puertas. 7. Desmonte de lamparas 8. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m 9. Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores). 10. Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes) 11. Desmonte de tuberia PVC de presión 12. Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. 13. AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm 14. Suministro de punto sanitario D= 3" 15.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	2 AYUDANTES	MATERIAL: arena, cemento, tuberia pvc HERRAMIENTAS: Menor

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL**

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	11.55%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995,258,403.45	$ 918,870,212.99	11.55%	$ 114,949,200.31	88.5%	$ 803,921,012.68
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995,258,403.45	$ 918,870,212.99	11.55%	$ 114,949,200.31	88.5%	$ 803,921,012.68


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
Programado Semanal	0,32%	0,54%	0,76%	0,98%	1,21%	1,42%	1,64%
Ejecutado Semanal	0,71%	1,02%	1,70%	2,54%	1,69%	1,16%	2,73%
Programado acumulado	0,32%	0,86%	1,62%	2,60%	3,81%	5,23%	6,87%
Ejecutado Acumulado	0,71%	1,73%	3,43%	5,97%	7,66%	8,82%	11,55%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		ADICION					
		$ 738.048.363,85		$ 918.870.212,99		$ 989.219.792,67		$ 27.199.919,05			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO CANTIDAD	PROYECTADO VALOR TOTAL	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO VALOR TOTAL	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	MAYORES Y MENORES VALOR TOTAL
6	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	527,93	$ 13.483,00	$ 7.118.080,19	345,00	$ 4.651.635,00	13,44	$ 181.211,52	-182,93	-$ 2.466.445,19
25	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	6,00	$ 33.302,00	$ 199.812,00	3,00	$ 99.906,00	2,00	$ 66.604,00	-3,00	-$ 99.906,00
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P. BAÑOS	M2	42,94	$ 13.869,00	$ 595.534,86	0,00	$ -	6,82	$ 94.586,58	-42,94	-$ 595.534,86
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	862,30	$ 2.237,00	$ 1.928.965,10	635,19	$ 1.420.913,32	52,16	$ 116.681,92	-227,11	-$ 508.051,78
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	56,86	$ 46.556,00	$ 2.647.174,16	0,00	$ -	0,31	$ 14.432,36	-56,86	-$ 2.647.174,16
317	CABLEADO 2#12	ML	0,00	$ 6.980,00	$ -	0,00	$ -	1,78	$ 12.424,40	0,00	$ -
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	773,38	$ 43.758,00	$ 33.841.562,04	624,00	$ 27.304.992,00	10,53	$ 460.771,74	-149,38	-$ 6.536.570,04
522	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	862,30	$ 51.927,00	$ 44.776.652,10	635,19	$ 32.983.355,35	193,26	$ 10.035.412,02	-227,11	-$ 11.793.296,75
541	Suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. Incluye pintura electroestatica	UN	0,00	$ 17.715,00	$ -	6,00	$ 106.290,00	40,00	$ 708.600,00	6,00	$ 106.290,00
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	72,00	$ 253.915,00	$ 18.281.880,00	39,00	$ 9.902.685,00	40,00	$ 10.156.600,00	-33,00	-$ 8.379.195,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 738.048.363,85**		**$ 794.554.050,34**		**$ 21.847.324,54**		$ 215.602.160,16
	ADMINISTRACION			20%	$ 147.609.672,77	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 4.369.464,91	20%	$ 43.120.432,03
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 3.690.241,82	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 109.236,62	0,50%	$ 1.078.010,80
	UTILIDAD			4%	$ 29.521.934,55	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 873.892,98	4%	$ 8.624.086,41
	TOTAL OBRA				**$ 918.870.212,99**		**$ 989.219.792,67**		**$ 27.199.919,05**		$ 268.424.689,37

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. DEMOLICION CIELO RASO FALSO 2. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 3. Desmonte de Puertas. 4. MURO EN BLOQUE No. 5. AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm 6. MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm 7. CABLEADO 2#12 8. Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica. 9. Suministro e Instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. Incluye pintura electroestatica 10. PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **6 AYUDANTES**	**3 OFICIALES**	MATERIAL: CEMENTO, ARENA, MANTO ASFALTICO, INSTALACIONES ELECTRICAS , LAMPARAS HERRAMIENTAS: Menor,

3.3.8 **CASA DE JUSTCIA SAN CRISTOBAL**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	96.22%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	96.22%	$ 25,168,043.12	3.8%	$ 988,725.87
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	96.22%	$ 25,168,043.12	3.8%	$ 988,725.87

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Programado Semanal	1.95%	3.91%	25.75%
Ejecutado Semanal	0.57%	44.60%	51.65%
Programado acumulado	1.95%	5.76%	31.51%
Ejecutado Acumulado	0.57%	45.17%	96.22%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CI SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO				VALOR TOTAL		
		$ 10.724.597,15				$ 13.352.123,45		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES ACOMULADAS	CANTIDADES DEL 15 ENE AL 20 ENE	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES							
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	50,00	140,75	1,20	$ 2.237,00	$ 2.684,40	
10	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES							
522	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	50,00	140,75	140,75	$ 51.927,00	$ 7.308.725,25	
16	PINTURA			0,00				
836	Suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfaltico	M2	50,00	140,75	140,75	$ 24.250,00	$ 3.413.187,50	
	COSTO DIRECTO TOTAL						$ 10.724.597,15	
	ADMINISTRACION					20%	$ 2.144.919,43	
	IMPREVISTOS					0,50%	$ 53.622,99	
	UTILIDAD					4%	$ 428.983,89	
	TOTAL OBRA						$ 13.352.123,45	51,05%

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Retiro de manto asfaltico 2.Suminstro e instalación de Impermeabilización de cubierta con manto asfaltico impermeabilizante de 3m con foil de aluminio 3. Suminístro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO 2 AYUDANTES	MATERIAL: manto asfaltico con foil de alumnio, pintura bituminosa HERRAMIENTAS: Menor

3.3.9 CASA DE JUSTICIA MARTIRES

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	5.86%	$ 1,941,736.86	94.1%	$ 31,209,060.31
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	5.86%	$ 1,941,736.86	94.1%	$ 31,209,060.31


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
Programado Semanal	0,26%	3,51%	5,65%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%	5,86%
Programado acumulado	0,00%	3,51%	9,16%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	5,86%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CASA DE JUSTICIA MARTIRES		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 26.465.589,31		$ 32.949.658,69		$ 32.949.658,69		$ 1.941.736,86			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	10,00	$ 15.168,00	$ 151.680,00	10,00	$ 151.680,00	6,00	$ 91.008,00	0,00	$ -
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e inte	UN	6,00	$ 3.741,00	$ 22.446,00	6,00	$ 22.446,00	15,00	$ 15,00	0,00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 126.621,00	0,00	$ -
313	Suministro e instalación de toma regulada.	UN	0,00	$ 49.484,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 247.420,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	3,00	$ 93.459,00	$ 280.377,00	3,00	$ 280.377,00	4,00	$ 373.836,00	0,00	$ -
316	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 9W, 95-227V, 870 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	0,00	$ 62.811,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 125.622,00	0,00	$ -
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	5,00	$ 22.943,00	$ 114.715,00	5,00	$ 114.715,00	10,00	$ 229.430,00	0,00	$ -
838	CERRADURA SAFE O SIMILAR ALCOBA CLASIC 141 - ALUMINO SATINADO	UN	0,00	$ 80.943,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 161.886,00	0,00	$ -
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	4,00	$ 203.790,00	$ 815.160,00	4,00	$ 815.160,00	1,00	$ 203.790,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 26.465.589,31	$ 26.465.589,31		$ 1.559.628,00		$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 5.293.117,86	20%	$ 5.293.117,86	20%	$ 311.925,60	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ 7.798,14	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.058.623,57	4%	$ 1.058.623,57	4%	$ 62.385,12	4%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 32.949.658,69	$ 32.949.658,69		$ 1.941.736,86		$ -	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas 2. Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores) 3. Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4") 4. Suministro e instalación de toma regulada. 6. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas 7. Suministro e instalación de toma corriente doble 8. CERRADURA SAFE O SIMILAR ALCOBA CLASIC 141 - ALUMINO SATINADO 9. CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: Luminarias, aparatos eléctricos, cerraduras HERRAMIENTAS: *menor*

3.3.10 **CESPA - CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLECENTES**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	2.86%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 24,049,830.92	$ 23,903,911.46	2.86%	$ 683,651.87	97.1%	$ 23,220,259.59
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 24,049,830.92	$ 23,903,911.46	2.86%	$ 683,651.87	97.1%	$ 23,220,259.59

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	1.77%
Ejecutado Semanal	2.86%
Programado acumulado	1.77%
Ejecutado Acumulado	2.86%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	LB SEDE CESPA			$				683.210,62
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	CANTIDA SEM 15-21 ENERO 24	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR TOTAL
5	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES							
653	Suministro e instalación de lamparas hermeticas	UN	400	$ 262.500,00	1	1	25%	$ 262.500,00
676	PANTALLA LED 24w 60x60 DE INCRUSTAR	UN	14,00	$ 253.375,00	1	1	7%	$ 253.375,00
16	PINTURA							
622	ESTUCO Y PINTURA TABLEROS	M2	10,24	$ 11.128,00	6,15	6,15	34%	$ 72.127,20
626	Remoción de pintura pared a manual	M2	10,24	$ 1.649,00	6,15	6,15	34%	$ 10.141,35
19	OBRAS EXTERIORES							
	COSTO DIRECTO TOTAL							$ 548.763,55
	ADMINISTRACION			20%				$ 109.752,71
	IMPREVISTOS			0,50%				$ 2.743,82
	UTILIDAD			4%				$ 21.950,54
	IVA			0%				$ -
	TOTAL OBRA							$ 683.210,62

Page 1 of 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Suministro e in stalación de lamparas hermeticas 2. Pantalla led 24w 60x60 de incrustar 3,. Estuco 4. Remosión de pintura manual

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1. Oficaial 1. Ayudante	MATERIAL:Lamparas hermeticas , pantallas led 24w 60x60, esuco HERRAMIENTAS: Menor

3.3.11 **BASER 13**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	0.11%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 142,702,015.34	$ 142,702,015.34	0.11%	$ 153,075.24	99.9%	$ 142,548,940.10
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 142,702,015.34	$ 142,702,015.34	0.11%	$ 153,075.24	99.9%	$ 142,548,940.10

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0,26%
Ejecutado Semanal	0,11%
Programado acumulado	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB BASER 13		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 113.924.649,00		$ 142.702.015,34		$ 142.702.015,34		$ 153.075,24			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
162	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN	0,00	$ 13.379,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 40.137,00	0,00	$ -
179	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	ML	0,00	$ 19.931,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 39.862,00	0,00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	19,00	$ 42.207,00	$ 801.933,00	19,00	$ 801.933,00	1,00	$ 42.207,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 113.924.649,00		$ 113.924.649,00		$ 122.206,00		$ -
	ADMINISTRACION			20%	$ 22.784.929,80	20%	$ 22.784.929,80	20%	$ 24.441,20	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 569.623,25	0,50%	$ 569.623,25	0,50%	$ 611,03	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 4.556.985,96	4%	$ 4.556.985,96	4%	$ 4.888,24	4%	$ -
	IVA			19%	$ 865.827,33	19%	$ 865.827,33	19%	$ 928,77	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 142.702.015,34		$ 142.702.015,34		$ 153.075,24		$ -

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. ACCESORIOS PVC-P Ø 2" 2. TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2" 3. Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 A YUDANTE	MATERIAL: Accesorios hidrosanitarios y tuberia PVC HERRAMIENTAS: menor

3.3.12 SALA DE OPERACIONES

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 117,639,983.08	$ 117,639,983.08	0.26%	$ 309,191.78	99.7%	$ 117,330,791.30
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 117,639,983.08	$ 117,639,983.08	0.26%	$ 309,191.78	99.7%	$ 117,330,791.30


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0,42%
Ejecutado Semanal	0,26%
Programado acumulado	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB SALA DE OPERACIÓNES		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 93.916.639,86		$ 117.639.983,08		$ 117.639.983,08		$ 309.191,78			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
34	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,21	$ 3.740,00	$ 34.445,40	9,21	$ 34.445,40	66,00	$ 246.840,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 93.916.639,86	$ 93.916.639,86		$ 246.840,00		$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 18.783.327,97	20%	$ 18.783.327,97	20%	$ 49.368,00	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 469.583,20	0,50%	$ 469.583,20	0,50%	$ 1.234,20	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 3.756.665,59	4%	$ 3.756.665,59	4%	$ 9.873,60	4%	$ -
	IVA			19%	$ 713.766,46	19%	$ 713.766,46	19%	$ 1.875,98	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 117.639.983,08	$ 117.639.983,08		$ 309.191,78		$ -	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: HERRAMIENTAS: menor

3.3.13 **C4**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 139,463,628.51	$ 139,463,628.51	6.71%	$ 9,355,086.74	93.3%	$ 130,108,541.77
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 139,463,628.51	$ 139,463,628.51	6.71%	$ 9,355,086.74	93.3%	$ 130,108,541.77

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0,27%
Ejecutado Semanal	6,71%
Programado acumulado	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB C4		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 111.339.317,03		$ 139.463.628,51		$ 139.463.628,51		$ 9.355.086,74			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	81,00	$ 15.168,00	$ 1.228.608,00	81,00	$ 1.228.608,00	26,00	$ 394.368,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.	UN	9,00	$ 93.459,00	$ 841.131,00	9,00	$ 841.131,00	6,00	$ 560.754,00	0,00	$ -
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	82,00	$ 279.847,00	$ 22.947.454,00	82,00	$ 22.947.454,00	20,00	$ 5.596.940,00	0,00	$ -
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	1275,00	$ 11.592,00	$ 14.779.800,00	1275,00	$ 14.779.800,00	49,27	$ 571.137,84	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	0,00	$ 15.013,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 75.065,00	0,00	$ -
835	Suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	ML	0,00	$ 9.009,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 270.270,00	0,00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 111.339.317,03		$ 111.339.317,03		$ 7.468.534,86		$ -
ADMINISTRACION			20%		$ 22.267.863,41	20%	$ 22.267.863,41	20%	$ 1.493.706,97	20%	$ -
IMPREVISTOS			0,50%		$ 556.696,59	0,50%	$ 556.696,59	0,50%	$ 37.342,67	0,50%	$ -
UTILIDAD			4%		$ 4.453.572,68	4%	$ 4.453.572,68	4%	$ 298.741,39	4%	$ -
IVA			19%		$ 846.178,81	19%	$ 846.178,81	19%	$ 56.760,86	19%	$ -
TOTAL OBRA					$ 139.463.628,51		$ 139.463.628,51		$ 9.355.086,74		$ -

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas 2. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas 3. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas. 4. VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 5. Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m 6. Suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: HERRAMIENTAS: menor

3.3 OBSERVACIONES

.

3.3.1 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comités
4.2 Se solicita al contratista de obra enviar soportes para el pago del anticipo, sin embargo a demorado en la entrega de los mismo.
4.3 Se inicia la revisión y aprobación por partede la interventoría de las memorias de cantidades que hacen parte del corte de obra No. 3

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y MEBOG.
5.2 Se realiza apertura de los frentes Baser 13, Sala de Operacipnes, Cespa y C4
5.3 El contratista presenta cotizaciones del sistema nebulizado y bombas trituradoras para C4, la Supervisión solicita fichas técnicas para su estudio.
5.4 Se solicita nuevamente al contratista visita de su especialista estructural para que de su concepto acerca de la fachada descolgada de la Ep. San Cristóbal
5.5 Se realiza visita interventoria y contratista para evaluar el alcance definito en la EP. Ciudad Bolivar y CJ Ciudad Bolivar
5.6 La MEBOG envía el diseño del Armerillo de la Ep. San Cristóbal para su implementación, adicionalmente solicita se implementes algunas especifiaciones en las actividades a realizar.
5.7 Se solicita al contratista presentar el diagnolico del daño presentado en el ascensor de la Ep. San Cristobal ya que este debe quedar en buenas condiciones lo mas pronto posible
5.8 La MEBOG solicita que se atienda de manera urgente las actividades en los lucernarios de la Ep. Ciudad Bolivar, el contratista hara diagnostico y presentará el valor del cambio de estos lucernarios.
5.9 Se programa apertura de la Ep. Engativá para el 23 de enero de 2024 y EP. Rafael Uribe para el 22 de enero de 2024
5.10 Realizar visita con el fin de establecer los espacio de requerimiento principal para adecuación de bodegas en CARABINEROS PARQUE NACIONAL

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1°	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2°	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3°	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (50%)	1°	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1°	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1°	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1°	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1°	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 Se solicita al contratista solucionar problemas con las dotaciones de EPP hacia los trabajadores de todos los frentes, como también señalizar, ubicar y retirar de los equipamientos los escombros que existan para que cumplan con la normativa.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continuo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se continúa con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.
8.3 Se solicita al contratista asistencia y concepto de especialista estructurale en EPOL San Cristóbal par la revisión de la viga.
8.4 El contratista tiene que entregar un Diagnostico del daño que se presenta en el ascensor y sus causas en EPOL SAN CRISTOBAL para el proximo comite

ARQ. ALEXIS REDONDO PEÑA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORIA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


EMER 57 - C4 - Pintura oficina del silencio



PINTURA EN VINILO OFICINA DEL SILENCIO

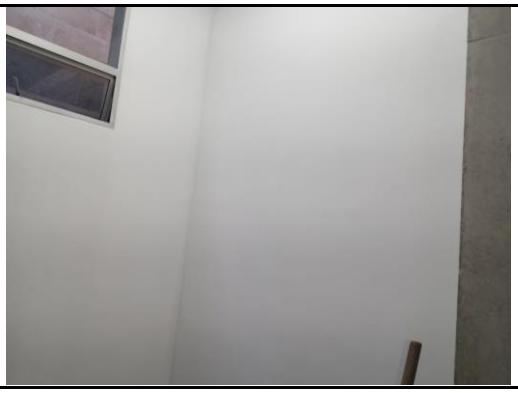

PINTURA EN VINILO OFICINA DEL SILENCIO

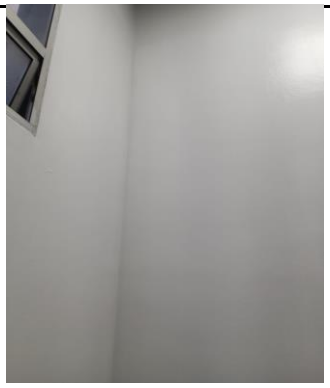

PINTURA EN VINILO OFICINA DEL SILENCIO



PINTURA EN VINILO OFICINA DEL SILENCIO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


EMER 58 - C4 Poda



PODA PARQUEADERO

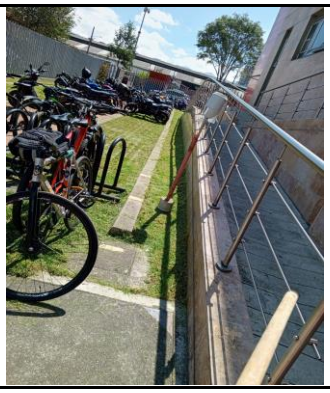

PODA PARQUEADERO

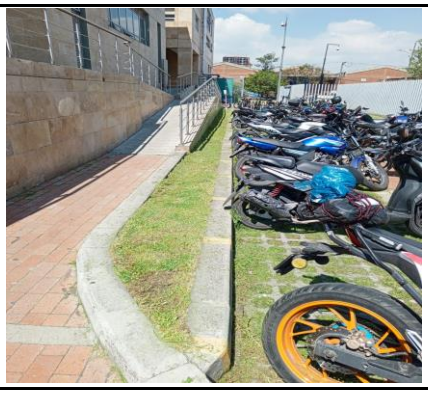

PODA PARQUEADERO



PODA PARQUEADERO


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 59 - CAI SANTA MARIA DEL LAGO

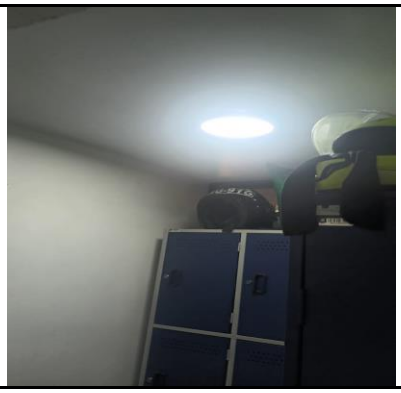


LUMINARIAS INTERIORES DE 18W



MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO



LUMINARIAS EXTERIORES DE 25W

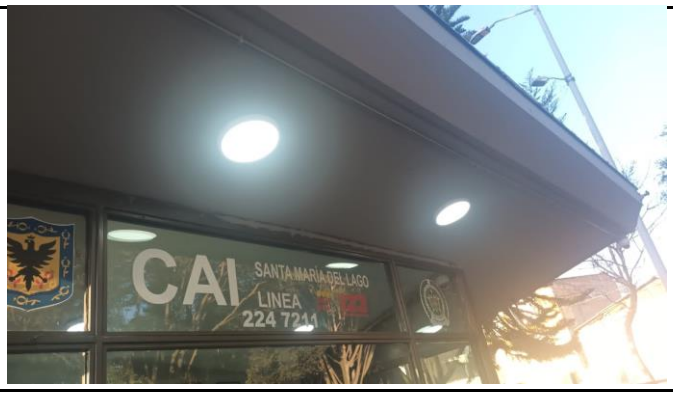

LUMINARIAS EXTERIORES DE 25W

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 60 - RAFAEL URIBE



PARQUEDERO



REPARACION HUECO



REPARACION HUECO



REPARACION HUECO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 61 - CJ CAMPO VERDE



SISTEMA DE BOMBAS



SISTEMA DE BOMBAS



BOMBAS



REFERENCIA TIPO DE BOMBA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 61 - CJ CAMPO VERDE



MANTENIMIENTO MOBILIARIOS



SOLDADURA - MANTENIMIENTO MOBILIARIOS



MANTENIMIENTO MOBILIARIOS



SOLDADURA - MANTENIMIENTO MOBILIARIOS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS DE EMERGENCIAS -PABELLON



SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES

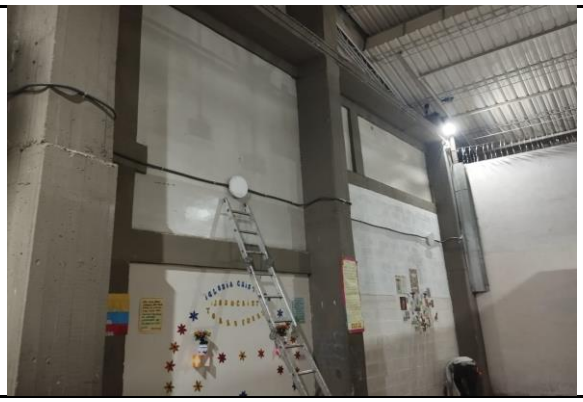

SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES



SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EN MANTO ASFALTICO 3MM



MANTENIMIENTO DE VENTANAOFC MEDIANTE LA PELICULA SANDBLASTING



DEMOLICION ALISTADO DE ESCALERAS



MANTENIMIOENTO RECVEPCION - MESON GRANITO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15		PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ SAN CRISTOBAL



IMPERMEABILIZACION CUBIERTAL - AZOTEA



DESMONTE DE MANTO CUBIERTA



IMPERMEABILIZACION CUBIERTA VIGILANCIA - MANTO ASFALTICO 3MM CON FOILDE ALUMNIO



IMPERMEABILIZACION CUBIERTAL - AZOTEA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CESPA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS HERMETICAS - BAÑOS



INSTALACION LUMINARIAS LED 60X60



REMOSION PINTURA MANAUL



ESTUCO MUROS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



DEMOLICIONES DE MESONES AREA DE GIMNASIO



DEMOLICIÓN DE ECHAPE AREA DE GIMNASIO



DESMONTE DE CIELO RASO Y MUROS SECOS COMANDANCIA



ALISTADO DE TERRAZAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



RESANES MURO DE FACHADA



DEMOLICION PISO SHUT DE BASURAS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CASA DE JUSTICIA MARTIRES

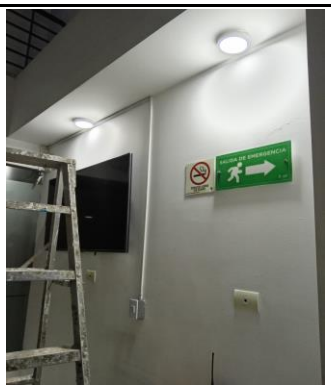

CAMBIO DE LUMINARIAS



ARREGLO DE CHAPAS



ARREGLO DE PUNTOS ELECTRICOS



MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - BASER 13

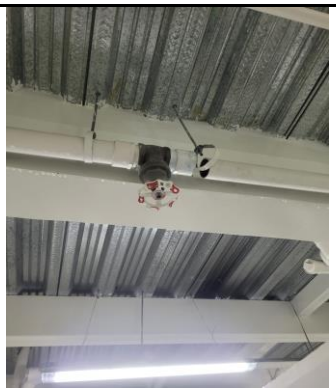

ARREGLO DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TUBERIA HIDROSANITARIA

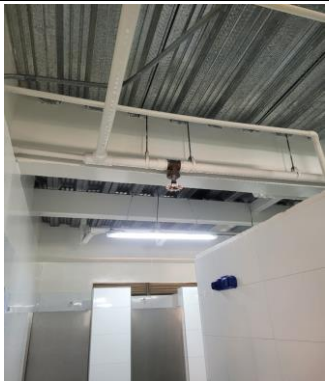

ARREGLO DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TUBERIA HIDROSANITARIA



ARREGLO DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TUBERIA HIDROSANITARIA



ARREGLO DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE ACCESORIOS Y CAMBIO DE TUBERIA HIDROSANITARIA

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION -SALA DE OPERACIONES



ESCARIFICACIÓN DE VENECIANO



ESCARIFICACIÓN DE VENECIANO



ESCARIFICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR



ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	domingo, 21 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - C4

	
CAMBIO DE LUMINARIAS	CAMBIO DE LUMINARIAS
	
VINILO MUROS INTERIORES	VINILO MUROS INTERIORES
