TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pag De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023** - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	domingo, 28 de enero de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
Contrato No.	1804 DE 2023		Contrato No.	1805 DE 2023	
Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023		Fecha de Iniciación	martes, 10 de octubre de 2023	
Fecha de Terminación	lunes, 9 de septiembre de 2024		Fecha de Terminación	viernes, 9 de agosto de 2024	
Plazo Inicial	11.0	Meses	Plazo Inicial	10	Meses
Valor Inicial	$869,826.00		Valor Inicial	$6,106,791,802.00	
Adición No. 1	$0.00		Adición No. 1	$0.00	
Valor Total del Contrato	$869,826.00		Valor Total del Contrato	$6,106,791,802.00	
Prórroga No. 1	0.0	Meses	Prórroga No. 1		Meses
Plazo total	11.0	Meses	Plazo total	10	Meses
Días Transcurridos	111	Faltantes 237	Días Transcurridos	111	Faltantes 206
SEMANAS TRANSCURRIDAS DE INTERVENTORÍA	16		SEMANAS TRANSCURRIDAS DE OBRA	16	

2. ASPECTOS FINANCIEROS

OBRA

DETALLE Costo Directo + AIU + IVA		PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	$
MEBOG	CAI S						
	CASAS FISCALES	$ 3,810,890,848.00	$ -	**$ 3,810,890,848.00**	12.22%	$ 20,343,628.00	$ 3,365,368,919.65
	ESTACIONES DE POLICÍA					$ 445,521,938.35	
BRIGADA XVIII	BASER CANTÓN NORTE					$ 5,794,424.80	
	PMES	$ 1,040,000,000.00	$ -	**$ 1,040,000,000.00**	0.56%	$ 12,599,862.00	$ 1,034,205,575.11
	SALA DE OPERACIONES					$ 14,463,800.30	
	BATALLONES BOGOTÁ					$ -	
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 95,000,000.00	$ -	**$ 95,000,000.00**	29.34%	$ 27,871,602.35	$ 67,128,397.65
SDSCJ - SAJ	CTP, CJI	$ 830,000,000.00	$ -	**$ 830,000,000.00**	38.895%	$ 241,924,333.30	$ 588,075,666.61
	CASAS DE JUSTICIA					$ 80,901,265.84	
TOTAL		$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	14.71%	$ 849,420,845.17	$ 5,054,778,559.03

EMERGENCIAS

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	$
MEBOG	CAI S						
	CASAS FISCALES	$ 239,800,954.00		**$ 239,800,954.00**	35.46%	$ 85,029,404.00	$ 154,771,550.00
	ESTACIONES DE POLICÍA						
BRIGADA XVIII	CANTÓN NORTE						
	PMES	$ 60,000,000.00		**$ 60,000,000.00**	51.88%	$ 31,125,250.00	$ 28,874,750.00
	BATALLONES BOGOTÁ						
C4	LÍNEA DE ATENCIÓN 123	$ 5,000,000.00		**$ 5,000,000.00**	247.51%	$ 17,375,499.80	-$ 12,375,499.80
SDSCJ - SAJ	CTP, CJI	$ 26,100,000.00		**$ 26,100,000.00**	137.02%	$ 35,762,697.00	-$ 3,540,148.00
	CASAS DE JUSTICIA						
TOTAL		$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	51.16%	$ 169,293,050.80	$ 180,156,152.00

GENERAL

DETALLE Costo Directo + AIU+ IVA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	INVERSIÓN A LA FECHA %	INVERSIÓN A LA FECHA $	$
MANTENIMIENTOS	$ 5,775,890,848.00	$ -	**$ 5,775,890,848.00**	14.71%	$ 849,420,845.17	$ 5,054,778,559.03
EMERGENCIAS	$ 330,900,954.00	$ -	**$ 330,900,954.00**	51.16%	$ 169,293,050.80	$ 180,156,152.00
TOTAL	$ 6,106,791,802.00	$ -	**$ 6,106,791,802.00**	16.68%	$ 1,018,713,895.97	$ 5,234,884,711.03

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 PORCENTAJE PONDERADO POR EQUIPAMIENTOS

3.1.1 Tal y como lo establece el anexo 3 Condiciones técnicas ***"(...) El primer mes de ejecución del contrato de mantenimiento, será para la elaboración de los primeros informes de análisis de los primeros frentes de obra a intervenir, según el diagrama de intervención propuesto por el contratista (...)"***, por lo anterior, hasta tanto no se agote este periodo no se incluirá el porcentaje ponderado por equipamientos, el cual se establece de los presupuestos, programaciones y flujo de caja que presente el contratista dentro del informe de análisis de cada frente de obra (equipamiento a intervenir).

3.2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3.2.1 **Emergencia No. 63 - CAMPO VERDE, del 24 de enero de 2024, por requerimiento de la unidad toda vez que se requiere mantenimiento de Revisión del sistema de presión y electrico de los tableros por presentar fallas en el sistema.**

3.3 FRENTES DE OBRAS EN EJECUCION

3.3.1 **URI DE PUENTE ARANDA PRIMERA ETAPA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	99.15%	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 160,000,000.00	$ 101,758,919.20	$ 0.99	$ 100,893,968.39	0.8%	$ 864,950.81

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

ACTIVIDADES TERMINADAS -CANTIADAES POR CONCILIAR

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES TERMINADAS -CANTIADAES POR CONCILIAR

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES TERMINADAS -

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA

3.3.2 CER

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	103.40%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 250,000,000.00	$ 141,030,365.00	103.40%	$ 141,030,365.00	-3.4%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			103.40%	$ 141,030,365.00	-3.4%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Programado Semanal	1.28%	1.52%	1.74%	1.97%	4.33%	16.43%	16.29%	29.45%	11.30%	21.70%	0.00%	0.00%
Ejecutado Semanal	8.02%	0.61%	7.24%	11.05%	10.97%	24.17%	0.94%	1.64%	6.16%	22.77%	7.41%	2.42%
Programado acumulado	1.28%	2.77%	4.51%	6.48%	10.83%	21.26%	37.55%	67.00%	78.30%	100.00%	100.00%	100.00%
Ejecutado Acumulado	8.02%	8.63%	15.87%	26.92%	37.89%	62.06%	63.00%	64.64%	70.80%	93.57%	100.98%	103.40%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	Cantidad semana 12	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES								
308	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	2	$ 80.763,00	$ 161.526	8,00	24,00	1200%	$ 646.104
315	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95- 227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.	UN	1	$ 22.943,00	$ 22.943	8,00	12,00	1200%	$ 183.544
331	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	53,85	$ 17.077,00	$ 919.596	50,00	150,00	279%	$ 853.850
396	Suministro e instalación de cable No.12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	320,00	$ 5.433,00	$ 1.738.560	10,00	670,00	209%	$ 54.330
397	Suministro e instalación de cable No.10 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. Libre de Halogeno	ML	21,00	$ 7.229,00	$ 151.809	50,00	821,00	3910%	$ 361.450
					Costo Directo	$			2.746.390
					Administracion	20%			$ 549.278
					Imprevistos	0,5%			$ 13.732,0
					Utilidad	4,0%			$ 109.855,6
					TOTAL	$			3.419.256

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Salida lampara fluorecente 2. Suministro e instalación bala panel led de sobreponer e inscrustar de 25w 3. Tuberia EMT de 1" 4. Suministro e instalación de cable No. 12 AWG libre de halogeno 5. Suministro e instalación cable No. 10 AWG libre de halogeno.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	2 AYUDANTES	MATERIAL: Cable #10 y #12 AWG libre de halogeno,tubo conduit, bala panel led de incrustar o sobreponer de 25w, tuberia EMT de 1". HERRAMIENTAS: Varias

3.3.3 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON - CELDAS**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	100.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 61,211,945.39	$ 61,211,945.39	100.00%	$ 61,211,945.39	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3.3.4 **CASA DE JUSTICIA USME**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	100.00%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 38,435,935.00	$ 41,664,245.70	100.00%	$ 41,664,245.70	0.0%	$ -

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3.3.5 **ESTACION DE POLICIA DE SUBA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 513,247,484.19	$ 513,247,484.19	28.96%	$ 148,636,471.42	71.0%	$ 364,611,012.77
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL			28.96%	$ 148,636,471.42	71.0%	$ 364,611,012.77

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA




3. ASPECTO TECNICO





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0.36%	0.56%	0.76%	0.96%	1.16%	1.39%	1.62%	2.39%
Ejecutado Semanal	0.12%	1.24%	189%	4.36%	1.19%	6.43%	2.24%	9.14%
Programado acumulado	0.36%	0.92%	1.68%	2.64%	3.80%	5.19%	7.01%	9.40%
Ejecutado Acumulado	0.12%	1.36%	5.2%	9.56	11.15%	17.58%	19.82%	28.96%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

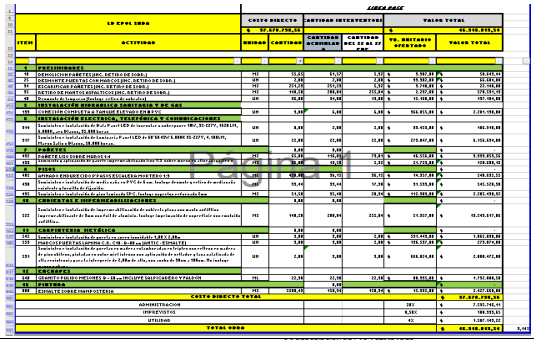

	LA EPOL SUBA		COSTO DIRECTO		ANTIDAD INTERVENTORES	VALOR TOTAL	
			$ 57,670,759.53			$	98,510,835.57
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA A	CANTIDAD DEC 21 AL 27 DIC	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.0	DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	51.63	51.63	5.63	$ 1,107.00	$ 57,141.00
2.0	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	2.00	2.00	2.00	$ 55,980.00	$ 111,960.00
3.0	DESCAPOTAS PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	213.20	213.20	5.20	$ 5,748.00	$ 29,769.60
4.0	RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	118.20	118.20	213.20	$ 2,257.00	$ 479,191.40
4.0	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrantes)	UN	31.00	31.00	18.00	$ 11,108.00	$ 157,184.00
5	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y RC GAS						
5.0	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN PVC	UN	1.00	1.00	1.00	$ 511,815.00	$ 2,201,155.00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES						
6.0	Suministro e instalación de Bala Panel LED de luminaria sobrepuesto 18W, 3000 K, 1620 Lm, 60 x 60 cm, Marca Philips, Referencia 59471	UN	2.00	2.00	2.00	$ 35,420.00	$ 182,340.00
6.0	Suministro e instalación de luminaria Panel LED en 60 60 con 1.800K 32-220 V, 4.100 LM, Marca Philips Ref. 59.471	UN	22.00	22.00	22.00	$ 273,947.00	$ 6,132,334.00
7	PAREDES		0.00	0.00			$ -
7.0	PARETES EN DRYWALL	M2	51.00	102.00	73.00	$ 42,727.00	$ 3,102,322.00
7.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO DE 1 HORA INCLUYE CERRADURA	M2	30.00	45.00	5.00	$ 23,228.00	$ 116,140.00
8	PISOS						
8.0	RETIRO Y DEMOLICION DE PISOS ESCALERA Y MUROS (+1)	UN	420.00	36.00	36.00	$ 14,327.00	$ 140,331.37
8.0	Suministro e instalación de media caña en PVC de 4 cm, incluye fijación y sellos de ambientes	UN	33.00	33.00	10.00	$ 11,155.00	$ 141,326.00
8.0	Suministro e instalación de granito de 30*2 cm incluye impermeabilización	M2	31.00	31.00	28.00	$ 111,303.00	$ 2,201,455.00
10	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		0.00	0.00			$ -
10.0	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio, incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica	M2	148.00	288.00	213.00	$ 11,327.00	$ 12,245,547.00
11	CARPINTERIA METÁLICA		0.00	0.00			$ -
11.0	Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable 1.00 X 2.00 m	UN	2.00	2.00	2.00	$ 317,415.00	$ 1,011,330.00
11.0	MARCO METÁLICO CALIBRE 18 (0.12 cm) DE 0.15 m DE ANCHO	UN	2.00	2.00	2.00	$ 134,337.00	$ 273,674.00
11.0	Suministro e instalación de puerta en madera enchapada en triplex con refuerzo en madera de primera calidad con acabado en laca con aplicación de sellador y dos capas de laca de poliuretano para el cubrimiento de 1.20 x 2.10 m, con cerradura Marca Yale o similar	UN	2.00	2.00	2.00	$ 884,804.00	$ 2,888,472.00
12	CERCAPISOS						
12.0	GRANITO PULIDO PISOS EN 0 - 10 cm INCLUYE SALPICADERO Y PULIDO	M1	22.00	22.00	22.00	$ 68,555.00	$ 1,757,580.00
13	PINTURA		0.00	0.00			$ -
13.0	ESMALTE SOBRE PAÑETE ESTUCO	M2	1260.00	420.00	420.00	$ 12,327.00	$ 2,327,322.00
	COSTO DIRECTO TOTAL					$	57,670,759.53
	ADMINISTRACION					28%	$ 7,232,742.00
	IMPREVISTOS					8.00%	$ 180,593.00
	UTILIDAD					5%	$ 1,287,143.00
	TOTAL COSTO					$	46,510,835.14

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición pañetes 2. Desmonte de puertas 3.Escarificar pañetes 4. Retiro de manto asfaltico 5. Desmonte de lámparas 6. Conexión completa de tanque elevado 7. Suministrose instalación de bala panel led de 18w 8. Suministro e in stalación bala panel led 60x60 45w 9. Pañete liso sobre muros 10. Pañete impermeabilizado liso 1:3 11. Alinado endurecido para pasos de escaleras 12. Suministro e instalación de media caña en pvc 6 cms 13. Suministro e instalación piso laminado SPC 14.Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfaltico impermeabilizante 3mm con foil de aluminio 15.Suministro e instalación puerta en acero inoxidable 1,00x2,00 16. Marcos de puertas en lamina de CR calibre 18 80 cms 17. Suministro e instalación de puerta en madera enlamborada 18. Granito pulido en mesón B= 60 cms 19. Esmalte sobre mamposteria

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
2 OFICIALES	6 AYUDANTE	MATERIAL:Bala panel led de 18w,bala panel led 60x60 de 45w, Cemento, arena ,agua,mixto, rock top, media caña pvc de 6cms,piso laminado SPC, sika 1, manto asfaltico de 3mm con foil de aluminio , puerta en acero inoxidable, marco puerta lamina cal 18, puerta madera entamborada,granito pulido y esmalte... . HERRAMIENTAS: Menor

3.3.6 **ESTACION DE POLICIA FONTIBON**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	36.10%	$ 45,084,936.45	63.9%	$ 79,815,811.19
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 115,038,786.19	$ 124,900,747.64	36.10%	$ 45,084,936.45	63.9%	$ 79,815,811.19


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0,26%	0,53%	0,79%	1,09%	1,43%	3,14%	5,15%	6,60%
Ejecutado Semanal	1,07%	2,05%	3,58%	4,79%	1,99%	-0,42%	13,62%	9,42%
Programado acumulado	0,26%	0,79%	1,58%	2,67%	4,10%	7,24%	12,39%	18,99%
Ejecutado Acumulado	1,07%	3,12%	6,70%	11,49%	13,48%	13,06%	26,68%	36,10%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL FONTIBON		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 100.321.885,66		$ 124.900.747,64		$ 114.340.852,18		$ 11.762.664,30			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	0,00	$ 46.556,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 93.112,00	0,00	$ -
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	0,00	$ 21.723,00	$ -	13,00	$ 282.399,00	50,61	$ 1.099.401,03	13,00	$ 282.399,00
430	Suministro e instalación de piso duro piso	M2	0,00	$ 66.537,00	$ -	18,90	$ 1.257.549,30	2,00	$ 133.074,00	18,90	$ 1.257.549,30
522	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. Incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica.	M2	188,17	$ 51.927,00	$ 9.770.999,74	62,50	$ 3.235.052,10	82,44	$ 4.280.861,88	-125,67	-$ 6.535.947,64
770	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	80,00	$ 61.865,00	$ 4.949.200,00	0,00	$ -	50,53	$ 3.126.038,45	80,00	-$ 4.949.200,00
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	0,00	$ 11.992,00	$ -	0,00	$ -	56,55	$ 655.527,60	0,00	$ -
826	Remocion de pintura suelta manual.	M2	0,00	$ 1.649,00	$ -	0,00	$ -	36,33	$ 59.908,17	0,00	$ -
COSTO DIRECTO TOTAL					$ 100.321.885,66	$ 91.840.001,75		$ 9.447.323,13		$ 7.588.977,91	
ADMINISTRACION			20%		$ 20.064.377,13	20%	$ 18.368.000,35	20%	$ 1.889.584,63	20%	-$ 1.517.795,58
IMPREVISTOS			0,50%		$ 501.609,43	0,50%	$ 459.200,01	0,50%	$ 47.239,62	0,50%	-$ 37.944,89
UTILIDAD			4%		$ 4.012.875,43	4%	$ 3.673.600,07	4%	$ 377.916,93	4%	-$ 303.559,12
TOTAL OBRA					$ 124.900.747,64	$ 114.340.852,18		$ 11.762.664,30		$ 9.448.277,49	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm 2. Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.3. Suministro e instalación de piso duro piso 4. Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante 5. CIELO RASO PLANO DRYWALL 6. VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 7. Remocion de pintura suelta manual.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	2 AYUDANTES	MATERIAL: arena, cemento, piso duro, manto, cielo raso, vinilo HERRAMIENTAS: Menor

3.3.7 **ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 995.258.403,45	$ 918,870,212.99	13.64%	$ 135.790.206.06	86.4%	$ 783.080.006.93
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 995.258.403,45	$ 918,870,212.99	13.64%	$ 135.790.206.06	86.4%	$ 783.080.006.93


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
Programado Semanal	0,32%	0,54%	0,76%	0,98%	1,21%	1,42%	1,64%	1,84%
Ejecutado Semanal	0,71%	1,02%	1,70%	2,54%	1,69%	1,16%	2,73%	2,09%
Programado acumulado	0,32%	0,86%	1,62%	2,60%	3,81%	5,23%	6,87%	8,71%
Ejecutado Acumulado	0,71%	1,73%	3,43%	5,97%	7,66%	8,82%	11,55%	13,64%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB EPOL SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		ADICION					
		$ 738.048.363,85		$ 918.870.212,99		$ 989.219.792,67		$ 20.818.504,68			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	72,68	$ 17.758,00	$ 1.290.651,44	0,00	$ -	1,41	$ 25.038,78	-72,68	$ 1.290.651,40
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P/ BAÑOS	M2	42,94	$ 13.869,00	$ 595.534,86	0,00	$ -	1,30	$ 18.029,70	-42,94	$ 595.534,86
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	862,30	$ 2.237,00	$ 1.928.565,10	635,24	$ 1.420.913,32	129,52	$ 289.736,24	-227,11	$ 928.051,78
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	127,00	$ 15.168,00	$ 1.926.336,00	10,00	$ 151.680,00	8,00	$ 121.344,00	-117,00	$ 1.774.656,00
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	191,78	$ 10.841,00	$ 2.079.086,98	0,00	$ -	53,56	$ 580.643,96	-191,78	$ 2.079.086,98
59	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye : retiro de sobrantes)	UN	18,00	$ 21.154,00	$ 380.772,00	0,00	$ -	1,00	$ 21.154,00	-18,00	$ 380.772,00
61	Desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final).	M2	18,23	$ 4.608,00	$ 83.911,68	2,80	$ 12.902,40	1,40	$ 6.451,20	-15,41	$ 71.009,28
109	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	56,86	$ 46.156,00	$ 2.647.174,16	0,00	$ -	4,98	$ 231.848,88	-56,86	$ 2.647.174,16
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	188,56	$ 21.723,00	$ 4.094.785,50	25,00	$ 543.075,00	48,81	$ 1.060.399,63	-163,50	$ 3.551.760,50
445	AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm	M2	85,00	$ 32.499,00	$ 2.112.435,00	19,60	$ 636.980,40	42,32	$ 1.375.357,68	-45,40	$ 1.475.454,60
446	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	773,38	$ 43.758,00	$ 33.841.562,04	624,00	$ 27.304.992,00	165,00	$ 7.220.070,00	-149,38	$ 6.536.570,04
634	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	M2	195,00	$ 64.609,00	$ 12.559.755,00	144,26	$ 9.299.886,68	85,74	$ 5.522.427,66	-50,01	$ 3.259.868,31
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	8912,41	$ 11.592,00	$ 103.312.699,56	8912,41	$ 103.312.699,56	4,98	$ 57.728,16	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	948,00	$ 15.013,00	$ 14.232.324,00	948,00	$ 14.232.324,00	4,98	$ 74.764,74	0,00	$ -
835	Suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	ML	30,00	$ 9.009,00	$ 270.270,00	0,00	$ -	13,00	$ 117.117,00	-30,00	$ 270.270,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 738.048.363,85	$	$ 704.554.050,34	$	$ 16.722.011,63	$	$ 215.602.160,14
	ADMINISTRACION			20%	$ 147.609.672,77	20%	$ 158.910.810,07	20%	$ 3.344.402,33	20%	$ 43.120.432,03
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 3.690.241,82	0,50%	$ 3.972.770,25	0,50%	$ 83.610,06	0,50%	$ 1.078.010,80
	UTILIDAD			4%	$ 29.521.934,55	4%	$ 31.782.162,01	4%	$ 668.880,47	4%	$ 8.624.086,41
	TOTAL OBRA				$ 918.870.212,99	$	$ 989.219.792,67	$	$ 20.818.504,68	$	$ 268.424.689,37

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR 2. DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P/ BAÑOS 3. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 4. Desmonte de lamparas 5. Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m 6. Desmonte de aparatos sanitarios 7. Desmonte de espejo 8. MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm 9. Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.10. AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm 11. AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm 12. ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE 13. VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 14. Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m 15. Suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **6 AYUDANTES**	**3 OFICIALES**	MATERIAL: CEMENTO, ARENA, MANTO ASFALTICO, INSTALACIONES ELECTRICAS , ENCHAPE, VINILO, ESTUCO HERRAMIENTAS: Menor

3.3.8 **CASA DE JUSTCIA SAN CRISTOBAL**

1. ASPECTO FINANCIERO

	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	114.87%	$ 30,046,280.54	-14.9%	-$ 3,889,511.55
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 26,156,768.99	$ 26,156,768.99	114.87%	$ 30,046,280.54	-14.9%	-$ 3,889,511.55

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	1.95%	3.81%	15.73%	4.67%
Ejecutado Semanal	6.27%	44.09%	13.40%	4.61%
Programado acumulado	1.95%	5.76%	21.51%	75.18%
Ejecutado Acumulado	6.27%	48.37%	86.23%	114.87%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CJ SAN CRISTOBAL		COSTO DIRECTO				VALOR TOTAL	
		$	3,917,242.10			$	4,876,968.41
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS	CANTIDADES DEL 22 ENE AL 27 ENE	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrantes)	UN	20.00	6.00	6.00	$ 15,166.00	$ 91,000.00
5	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			0.00			
315	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.	UN	2.00	2.00	2.00	$ 99,364.00	$ 198,728.00
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45V 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	5.00	5.00	5.00	$ 279,847.00	$ 1,399,235.00
349	Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifasicos (Incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y fases y limpieza general)	UN	1.00	1.00	1.00	$ 608,792.00	$ 608,792.00
11	CARPINTERIA METÁLICA			0.00			
539	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	1.73	1.73	1.73	$ 473,276.00	$ 816,401.10
550	Suministro e instalación de puerta metalica de 1.03*2.005 con dos hojas tipo panel y bandeja de recibo tipo escritorio incl. 2 cerraduras de seguridad	UN	0.00	1.00	1.00	$ 803,076.00	$ 803,076.00
	COSTO DIRECTO TOTAL						$ 3,917,242.10
	ADMINISTRACION					20%	$ 783,448.42
	IMPREVISTOS					0.50%	$ 19,586.21
	UTILIDAD					4%	$ 156,689.68
	TOTAL OBRA						$ 4,876,968.41

Página 2

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas 2. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas. 3. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas. 4. Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifasicos 5. VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm 6. Suministro e instalación de puerta metalica de 1.03*2.005 con dos hojas tipo panel y bandeja de recibo tipo escritorio incl. 2 cerraduras de seguridad

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 MAESTRO **2 AYUDANTES**	MATERIAL: manto asfaltico con foil de aluminio, pintura bituminosa HERRAMIENTAS: *Menor*

3.3.9 CASA DE JUSTICIA MARTIRES

1. ASPECTO FINANCIERO


DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	5.86%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	5.86%	$ 1,941,736.86	94.1%	$ 31,209,060.31
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 33,150,797.17	$ 33,150,797.17	5.86%	$ 1,941,736.86	94.1%	$ 31,209,060.31


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Programado Semanal	0,26%	3,51%	5,65%	9,42%
Ejecutado Semanal	0,00%	0,00%	5,86%	0,00%
Programado acumulado	0,00%	3,51%	9,16%	18,58%
Ejecutado Acumulado	0,00%	0,00%	5,86%	5,86%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB CASA DE JUSTICIA MARTIRES		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 26.465.589,31		$ 32.949.658,69		$ 32.949.658,69		$ 1.941.736,86			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	10,00	$ 15.168,00	$ 151.680,00	10,00	$ 151.680,00	6,00	$ 91.008,00	0,00	$ -
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e inte	UN	6,00	$ 3.741,00	$ 22.446,00	6,00	$ 22.446,00	15,00	$ 15,00	0,00	$ -
264	Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4")	UN	0,00	$ 42.207,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 126.621,00	0,00	$ -
313	Suministro e instalación de toma regulada.	UN	0,00	$ 49.484,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 247.420,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	3,00	$ 93.459,00	$ 280.377,00	3,00	$ 280.377,00	4,00	$ 373.836,00	0,00	$ -
316	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 9W, 95-227V, 870 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	0,00	$ 62.811,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 125.622,00	0,00	$ -
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	5,00	$ 22.943,00	$ 114.715,00	5,00	$ 114.715,00	10,00	$ 229.430,00	0,00	$ -
838	CERRADURA SAFE O SIMILAR ALCOBA CLASIC 141 - ALUMINO SATINADO	UN	0,00	$ 80.943,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 161.886,00	0,00	$ -
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	4,00	$ 203.790,00	$ 815.160,00	4,00	$ 815.160,00	1,00	$ 203.790,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 26.465.589,31	$	26.465.589,31	$	1.559.628,00	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 5.293.117,86	20%	$ 5.293.117,86	20%	$ 311.925,60	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ 132.327,95	0,50%	$ 7.798,14	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 1.058.623,57	4%	$ 1.058.623,57	4%	$ 62.385,12	4%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 32.949.658,69	$	32.949.658,69	$	1.941.736,86	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Durante la semana no se realizan actividades

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
	MATERIAL: HERRAMIENTAS:

3.3.10 **CESPA - CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLECENTES**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 24,049,830.92	$ 23,903,911.46	16.93%	$ 4,046,932.21	83.1%	$ 19,856,979.25
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 24,049,830.92	$ 23,903,911.46	16.93%	$ 4,046,932.21	83.1%	$ 19,856,979.25

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	1.77%	3.89%
Ejecutado Semanal	2.86%	14.07%
Programado acumulado	1.77%	5.66%
Ejecutado Acumulado	2.86%	16.93%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LINEA BASE

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	CANTIDA SEM 2- 22 -28 ENERO 24	CANTIDAD ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR TOTAL
	LB SEDE CESPA			$				3.363.522,25
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES							
8F3	Suministro e instalación de lamparas hermeticas	UN	4,00	$ 212.500,00	6	6	150%	$ 1.062.900,08
876	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	1,00	$ 253.975,00	1	2	50%	$ 253.975,08
16	PINTURA							
502	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	944,97	$ 11.532,00	119,46	119,46	82%	$ 1.384.809,39
19	OBRAS EXTERIORES							
	COSTO DIRECTO TOTAL							$ 2.701.624,30
	ADMINISTRACION			20%				$ 540.324,86
	IMPREVISTOS			0,50%				$ 13.508,12
	UTILIDAD			4%				$ 108.064,97
	IVA			0%				$ -
	TOTAL OBRA							$ 3.363.522,25

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Suministro e in stalación de lamparas hermeticas 2. Pantalla led 24w 60x60 de incrustar 3.Vinilo muros interiores 3 manos

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1. Oficalal 1. Ayudante	MATERIAL: Lamparas hermeticas , pantallas led 24w 60x60, vinilo HERRAMIENTAS: Menor

3.3.11 **BASER 13**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + A&U	$ 142,702,015.34	$ 142,702,015.34	4.06%	$ 5,794,424.89	95.9%	$ 136,907,590.45
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 142,702,015.34	$ 142,702,015.34	4.06%	$ 5,794,424.89	95.9%	$ 136,907,590.45


2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,26%	0,90%
Ejecutado Semanal	0,11%	3,95%
Programado acumulado	0,26%	1,16%
Ejecutado Acumulado	0,11%	4,06%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

LB BASER 13		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE				
		$ 113,924,649.00		$ 142,702,015.34		$ 142,702,015.34		$ 5,641,349.65		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	29,00	$ 15.168,00	$ 439.872,00	29,00	$ 439.872,00	31,00	$ 470.208,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000horas	UN	6,00	$ 93.459,00	$ 560.754,00	6,00	$ 560.754,00	14,00	$ 1.308.426,00	0,00	$ -
315	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.	UN	16,00	$ 99.364,00	$ 1.589.824,00	16,00	$ 1.589.824,00	8,00	$ 794.912,00	0,00	$ -
653	Suministro e instalación de lamparas hermeticas	UN	12,00	$ 212.580,00	$ 2.550.960,00	12,00	$ 2.550.960,00	8,00	$ 1.700.640,00	0,00	$ -
680	Suministro e instalación de Refelctor de 100W	UN	0,00	$ 229.526,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 229.526,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 113,924,649.00	$ 113,924,649.00		$ 4,503,712.00		$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 22,784,929.80	20%	$ 22,784,929.80	20%	$ 900,742.40	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 569,623.25	0,50%	$ 569,623.25	0,50%	$ 22,518.56	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 4,556,985.96	4%	$ 4,556,985.96	4%	$ 180,148.48	4%	$ -
	IVA			19%	$ 865,827.33	19%	$ 865,827.33	19%	$ 34,228.21	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 142,702,015.34	$ 142,702,015.34		$ 5,641,349.65		$ -	

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates) 2. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas 3. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas. 4. Suministro e instalación de lamparas hermeticas 5. Suministro e instalación de Refelctor de 100W

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: luminarias HERRAMIENTAS: menor

3.3.12 SALA DE OPERACIONES

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%		%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 117,639,983.08	$ 117,639,983.08	12.29%	$ 14,463,800.30	87.7%	$ 103,176,182.79
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 117,639,983.08	$ 117,639,983.08	12.29%	$ 14,463,800.30	87.7%	$ 103,176,182.79

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,42%	0,85%
Ejecutado Semanal	0,26%	12,03%
Programado acumulado	0,42%	1,27%
Ejecutado Acumulado	0,26%	12,29%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB SALA DE OPERACIÓNES		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLI					
		$ 93.916.639,86		$ 117.639.983,08		$ 117.639.983,08		$ 14.154.608,51			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	$ 9.907,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 148.605,00	0,00	$ -
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	81,00	$ 15.168,00	$ 1.228.608,00	81,00	$ 1.228.608,00	14,00	$ 212.352,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	9,00	$ 93.459,00	$ 841.131,00	9,00	$ 841.131,00	8,00	$ 747.672,00	0,00	$ -
435	RESANES GENERALES	M2	0,00	$ 9.296,00	$ -	0,00	$ -	107,98	$ 997.303,28	0,00	$ -
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	18,00	$ 253.915,00	$ 9.648.770,00	18,00	$ 9.648.770,00	6,00	$ 1.523.490,00	0,00	$ -
800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	0,00	$ 15.332,00	$ -	0,00	$ -	45,60	$ 699.139,20	0,00	$ -
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	1975,00	$ 11.592,00	$ 22.894.200,00	1975,00	$ 22.894.200,00	441,72	$ 5.120.418,24	0,00	$ -
804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	0,00	$ 11.312,00	$ -	0,00	$ -	52,57	$ 594.671,84	0,00	$ -
808	ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	ML	156,25	$ 11.206,00	$ 1.750.937,50	156,25	$ 1.750.937,50	18,00	$ 201.708,00	0,00	$ -
831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	M2	400,10	$ 15.013,00	$ 6.006.701,30	400,10	$ 6.006.701,30	18,00	$ 270.234,00	0,00	$ -
837	Suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm	ML	0,00	$ 7.432,00	$ -	0,00	$ -	85,00	$ 631.720,00	0,00	$ -
911	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	254,00	$ 2.451,00	$ 622.554,00	254,00	$ 622.554,00	62,37	$ 152.868,87	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 93.916.639,86		$ 93.916.639,86		$ 11.300.182,43	$ -	
	ADMINISTRACION			20%	$ 18.783.327,97	20%	$ 18.783.327,97	20%	$ 2.260.036,49	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 469.583,20	0,50%	$ 469.583,20	0,50%	$ 56.500,91	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 3.756.665,59	4%	$ 3.756.665,59	4%	$ 452.007,30	4%	$ -
	IVA			19%	$ 713.766,46	19%	$ 713.766,46	19%	$ 85.881,99	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 117.639.983,08	$	117.639.983,08	$	14.154.608,51	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL AYUDANTE	1	MATERIAL: HERRAMIENTAS: menor

3.3.13 **C4**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	19,98%	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 139,463,628.51	$ 139,463,628.51	19,98%	$ 27,871,602.35	80.0%	$ 111,592,026.16
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 139,463,628.51	$ 139,463,628.51	19,98%	$ 27,871,602.35	80.0%	$ 111,592,026.16

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1	SEMANA 2
Programado Semanal	0,27%	0,68%
Ejecutado Semanal	6,71%	13,27%
Programado acumulado	0,27%	0,95%
Ejecutado Acumulado	6,71%	19,98%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB C4		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 111.339.317,03		$ 139.463.628,51		$ 139.463.628,51		$ 18.516.515,61			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
46	Desmonte de sifones	UN	18,00	$ 6.169,00	$ 111.042,00	18,00	$ 111.042,00	1,00	$ 6.169,00	0,00	$ -
48	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrates)	UN	81,00	$ 15.168,00	$ 1.228.608,00	81,00	$ 1.228.608,00	23,00	$ 348.864,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	9,00	$ 93.459,00	$ 841.131,00	9,00	$ 841.131,00	8,00	$ 747.672,00	0,00	$ -
435	RESANES GENERALES	M2	89,00	$ 9.236,00	$ 822.004,00	89,00	$ 822.004,00	64,90	$ 599.452,80	0,00	$ -
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	35,00	$ 253.915,00	$ 8.887.025,00	35,00	$ 8.887.025,00	35,00	$ 8.887.025,00	0,00	$ -
802	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	1275,00	$ 11.592,00	$ 14.779.800,00	1275,00	$ 14.779.800,00	274,73	$ 3.184.670,16	0,00	$ -
837	Suministro y aplicación de vinilo tinsal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm	ML	0,00	$ 7.432,00	$ -	0,00	$ -	81,00	$ 601.992,00	0,00	$ -
842	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	15,00	$ 203.790,00	$ 3.056.850,00	15,00	$ 3.056.850,00	2,00	$ 407.580,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 111.339.317,03	$	111.339.317,03	$	14.782.464,96	$	-
	ADMINISTRACION			20%	$ 22.267.863,41	20%	$ 22.267.863,41	20%	$ 2.956.492,99	20%	$ -
	IMPREVISTOS			0,50%	$ 556.696,59	0,50%	$ 556.696,59	0,50%	$ 73.912,32	0,50%	$ -
	UTILIDAD			4%	$ 4.453.572,68	4%	$ 4.453.572,68	4%	$ 591.298,60	4%	$ -
	IVA			19%	$ 846.178,81	19%	$ 846.178,81	19%	$ 112.346,73	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 139.463.628,51	$	139.463.628,51	$	18.516.515,61	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de sifones 2. Desmonte de lamparas 3. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas 4. RESANES GENERALES 5. PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR 6. VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 7. CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: luminarias, estuco, vinilo, cerraduras HERRAMIENTAS: menor

3.3.14 **E.P RAFAEL URIBE**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 292,275,832.08	$ 292,275,832.08	5.20%	$ 15,198,343.27	94.8%	$ 277,077,488.81
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 292,275,832.08	$ 292,275,832.08	5.20%	$ 15,198,343.27	94.8%	$ 277,077,488.81

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0.69%
Ejecutado Semanal	5.20%
Programado acumulado	0.69%
Ejecutado Acumulado	5.20%

inilo bajo placa 2 manos

LB EPOL RAFAEL URIBE URIBE			COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL				
			$ 12,209,842.39		$				15,201,253.52
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DEL 27 ENE AL 27 ENE - SEM 1	CANTIDADES ACUMULADAS	PROCENTAJE DE AVANCE	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
16	DEMOLICION MESÓN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML	2.70	$ 19,677.00	$ 53,127.90	2.70	2.70	100%	$ 53,127.90
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	55.00	$ 2,237.00	$ 123,035.00	71.40	71.40	130%	$ 164,585.80
39	Desmonte de Puertas	UN	0.00	$ 7,991.00	$ 65,464.00	0.00	0.00	100%	$ 65,464.00
40	Desmonte de lamparas (Incluye retiro de sobrantes)	UN	12.00	$ 8,166.00	$ 182,196.00	0.00	0.00	67%	$ 121,464.00
56	Demolición de acabados ceramicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (Incluye retiro y disposición final de escombros)	M2	80.29	$ 21,841.00	$ 1,746,944.89	80.29	80.29	100%	$ 1,746,944.89
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores)	UN	0.00	$ 1,741.00	$ 41,951.00	12.00	12.00	100%	$ 44,892.00
58	Desmonte de aparatos sanitarios (Incluye retiro de sobrantes)	UN	5.00	$ 21,954.00	$ 109,770.00	16.00	16.00	170%	$ 218,464.00
61	Desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final)	M2	0.89	$ 4,035.00	$ 3,686.40	0.89	0.89	100%	$ 3,686.40
7	PISOS				$				$
439	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado bio 12 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.	M2	130.79	$ 23,723.00	$ 2,839,410.33	130.79	130.79	100%	$ 2,839,476.50
8	PISOS				$				$
446	APIZADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	358.47	$ 43,791.00	$ 10,697,759.26	24.47	24.47	100%	$ 1,070,612.40
464	Alistado impermeabilizado para pisos con sika 1 en mortero 1:4	M2	101.85	$ 21,245.00	$ 2,163,182.54	54.50	54.50	44%	$ 1,269,009.22
9	PINTURA				$				$
600	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2	96.00	$ 9,333.00	$ 2,145,964.16	96.00	96.00	100%	$ 2,251,994.01
608	ESTUCO	M2	24.00	$ 10,192.00	$ 247,656.00	59.55	59.55	96%	$ 585,161.29
604	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	279.00	$ 5,126.00	$ 1,295,441.00	59.55	59.55	38%	$ 1,227,996.29
	COSTO DIRECTO TOTAL								$ 12,209,842.39
	ADMINISTRACION			20%					$ 2,441,968.44
	IMPREVISTOS			0.50%					$ 61,049.21
	UTILIDAD			4%					$ 488,393.69
	TOTAL OBRA								$ 15,201,253.52

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición mesón en concreto 2. Retiro de manto asfaltico 3. Desmonte de puertas 4. Desmonte de lamparas 5. Demolición de acabados ceramicos 6. Desmonte de accesorios eléctricos 7. Desmonte de aparatos sanitarios 8. Desmonte de espejo 9. Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 10.Afinado terraza mortero 1:4 11. Alistado impermeabilizado para pisoso con sika 1 12. Esmalte sobre mamposteria 13. Estuco 14.Vinilo bajo placa 2 manos

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
3 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: Arena, cemento gris, agua , sikja 1, esmalte, estuco, vinilo HERRAMIENTAS: menor

3.3.15 **E.P ENGATIVA**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 304,316,474.55	$ 304,316,474.55	0.63%	$ 1,917,193.79	99.4%	$ 302,399,280.76
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 304,316,474.55	$ 304,316,474.55	0.63%	$ 1,917,193.79	99.4%	$ 302,399,280.76

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0.04%
Ejecutado Semanal	0.63%
Programado acumulado	0.04%
Ejecutado Acumulado	0.63%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL ENGATIVA		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL					
		$ 1,543,953.37		$					1,922,221.95
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DEL 22 ENE AL 27 ENE	ANTIDADES ACUMULADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
16	DEMOLICION REJON CORREDOR INC. RETIRO DE SOBR	KL	29.08	$ 10,077.00	$ 301,336.55	5.15	5.15	100%	$ 301,336.55
30	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS P BAÑOS	KL	13.33	$ 13,063.00	$ 340,761.33	24.57	24.57	100%	$ 340,761.33
39	Desmonte de Puertas	UN	4.00	$ 2,550.00	$ 15,150.00	6.00	6.00	60%	$ 45,348.00
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores)	UN	186.49	$ 3,741.00	$ 705,141.09	188.49	188.49	100%	$ 705,141.09
59	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes)	UN	16.00	$ 21,154.00	$ 338,464.00	16.00	16.00	100%	$ 338,464.00
61	Desmonte de espejo (incluye retir y disposición final)	M2	2.80	$ 4,608.00	$ 12,902.40	3.65	3.65	130%	$ 12,902.40
	COSTO DIRECTO TOTAL								$ 1,543,953.37
	ADMINISTRACION			20%					$ 308,790.67
	IMPREVISTOS			0.50%					$ 7,719.77
	UTILIDAD			4%					$ 61,750.13
	TOTAL OBRA								$ 1,922,221.95

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Demolición meson corrido 2. Desmonte y retiro de divisiones metalicas 3. Desmonte de puertas 4. Desmontes de accesorios eléctricos 5. Desmontre de aparatos sanitrios 6. Desmonte de espejo

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL	MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL 1 AYUDANTE	MATERIAL: N.A HERRAMIENTAS: menor

3.3.16 CJR LA VICTORIA

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + AIU	$ 50,000,000.00	$ 56,774,300.24	5.64%	$ 3,202,070.53	94.4%	$ 53,572,229.71
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 50,000,000.00	$ 56,774,300.24	5.64%	$ 3,202,070.53	94.4%	$ 53,572,229.71

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0.61%
Ejecutado Semanal	5.64%
Programado acumulado	0.61%
Ejecutado Acumulado	5.64%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB SEDE C/ LA VICTORIA		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL					
		$ 2,532,064.35		$ -					$ 3,202,229.71
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DEL 22 ENE AL 27 FEB	ACTIVIDADES ACUMULADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
20	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE	M2	93,90	$ 91.707,00	$ 192.196,72	92,80	92,80	100%	$ 205.216,56
45	Desmonte de lamparas (bollas, retiro de cableado)	UN	4,00	$ 15.560,00	$ 60.672,00	4,00	4,00	100%	$ 60.672,00
5									
254	Sondeo de punto sanitario (Entre 1 1/2" y 4")	UN	2,00	$ 42.207,00	$ 84.414,00	2,00	2,00	100%	$ 84.414,00
6									
316	Suministro e instalación de Bala Panel LED de luminaria o colmpenso 18W, 90-227V, 1620 LM, 6.000K, uni Blanco, 35.000 horas	UN	1,00	$ 92.459,00	$ 92.459,00	1,00	1,00	100%	$ 92.459,00
315	Suministro e instalación de Bala Panel LED de luminaria o colmpenso 25W, 90-227V, 2120 LM, 6.000K, uni Blanco, 35.000 horas	UN	3,00	$ 93.344,00	$ 280.032,00	3,00	3,00	100%	$ 280.032,00
16	PINTURA								
602	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	70,00	$ 11.592,00	$ 811.440,00	73,63	73,63	105%	$ 854.214,43
631	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en obras ligadas o tabiqueria o 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con ligado para acabado final, luchas transporte de material a obra.	M2	50,00	$ 15.043,00	$ 750.650,00	36,85	36,85	74%	$ 553.953,99
18	VIDRIOS Y ESPEJOS								
863	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO FELDAR O	M2	11,64	$ 36.000,00	$ 452.732,34	10,80	10,80	93%	$ 422.241,50
				$ -					
	COSTO DIRECTO TOTAL								$ 2,532,064.35
	ADMINISTRACION			20%					$ 506.412,87
	IMPREVISTOS			0,50%					$ 12.660,32
	UTILIDAD			4%					$ 150.692,17
	TOTAL OBRA								$ 3,202,229.71 5.64%

Página 1

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1.Desmonte de ventanas y vidrios 2.Desmonte de lámparas 3. Sondeo de puntos sanitarios 4. Suministro e instalación de bala panel led 18w 5. Suministro e einstalación de bala panel led de 25w 6. Vinilo muros inteyeriores 3 manos 7. Suministro y aplicación de estuco plastico 8. Vidrio crudo incoloro 4mm

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: Bala panel led de 18w, bala panel led de 25w,vinilo, estuco plástico , vidrio crudo 4mm. HERRAMIENTAS: menor

3.3.17 **PM 15**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
COSTO DIRECTO + A&U	$ 151,839,675.41	$ 151,839,675.41	8.30%	$ 12,599,862.06	91.7%	$ 139,239,813.34
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 151,839,675.41	$ 151,839,675.41	8.30%	$ 12,599,862.06	91.7%	$ 139,239,813.34

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	1,00%
Ejecutado Semanal	8,30%
Programado acumulado	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB PM 15		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		CUMPLE					
		$ 121.219.603,55		$ 151.839.675,41		$ 151.839.675,41		$ 12.599.862,06			
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
48	Desmonte de lamparas (incluye retiro de sobrantes)	UN	29,00	$ 15.168,00	$ 439.872,00	29,00	$ 439.872,00	41,00	$ 621.888,00	0,00	$ -
57	Desmonte de accesorios electricos (tomacorrientes e interruptores).	UN	8,00	$ 3.741,00	$ 29.928,00	8,00	$ 29.928,00	8,00	$ 29.928,00	0,00	$ -
324	Suministro e instalación de toma corriente doble	UN	4,00	$ 22.943,00	$ 91.772,00	4,00	$ 91.772,00	8,00	$ 183.544,00	0,00	$ -
676	PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR	UN	12,00	$ 253.935,00	$ 3.046.980,00	12,00	$ 3.046.980,00	35,00	$ 8.887.025,00	0,00	$ -
679	Suministro e instalación de lampara exterior tipo tortuga de 10w con rejilla color negro. (Incluye Bombillo)	UN	0,00	$ 56.097,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 336.582,00	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 121.219.603,55	$	121.219.603,55	$	10.058.967,00	$	-
	ADMINISTRACION		20%		$ 24.243.920,71	20%	$ 24.243.920,71	20%	$ 2.011.793,40	20%	$ -
	IMPREVISTOS		0,50%		$ 606.098,02	0,50%	$ 606.098,02	0,50%	$ 50.294,84	0,50%	$ -
	UTILIDAD		4%		$ 4.848.784,16	4%	$ 4.848.784,14	4%	$ 402.358,68	4%	$ -
	IVA		19%		$ 921.268,99	19%	$ 921.268,99	19%	$ 76.448,15	19%	$ -
	TOTAL OBRA				$ 151.839.675,41	$	151.839.675,41	$	12.599.862,06	$	-

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. Desmonte de lamparas 2. Desmonte de accesorios electricos 3. Suministro e instalación de toma corriente doble 4. PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR 5. Suministro e instalación de lampara exterior tipo tortuga de 10w con rejilla color negro

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: luminarias, accesorios eléctricos HERRAMIENTAS: menor

3.3.18 **ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR**

1. ASPECTO FINANCIERO

DETALLE	PRESUPUESTO		INVERSION A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ACTUAL	%	$	%	$
			15,33%			
COSTO DIRECTO + AIU	$ 245.779.485,00	$ 245.779.485,00	15,33%	$ 37.682.831,97	84,7%	$ 208.096.653,03
OBRAS ADICIONALES						
TOTAL	$ 245.779.485,00	$ 245.779.485,00	15,33%	$ 37.682.831,97	84,7%	$ 208.096.653,03

2. FOTOGRAFIA PANORAMICA



3. ASPECTO TECNICO

3.1 PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA





	SEMANA 1
Programado Semanal	0,55%
Ejecutado Semanal	15,33%
Programado acumulado	0,00%
Ejecutado Acumulado	0,00%

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

LB EPOL CIUDAD BOLIVAR		COSTO DIRECTO		VALOR TOTAL		COMPLE					
		$	196.215.460,10	$	245.779.485,12	$	245.779.485,12	$	37.682.831,97		
						PROYECTADO		EJECUTADO		MAYORES Y MENORES	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
35	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0,00	$ 2.237,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 22.370,00	0,00	$ -
314	Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	30,00	$ 93.459,00	$ 2.803.770,00	30,00	$ 2.803.770,00	2,00	$ 186.918,00	0,00	$ -
317	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas.	UN	16,00	$ 279.847,00	$ 4.477.552,00	16,00	$ 4.477.552,00	16,00	$ 4.477.552,00	0,00	$ -
650	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	0,00	$ 218.989,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.313.934,00	0,00	$ -
816	Suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa lavaa o similar sobre manto asfaltico	M2	1129,00	$ 24.250,00	$ 27.378.250,00	993,11	$ 27.378.250,00	993,11	$ 24.080.917,50	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 196.215.460,10	$	196.215.460,10	$	30.080.691,50	$	21.910.227,60
	ADMINISTRACION		20%		$ 39.243.092,02	20%	$ 39.243.092,02	20%	$ 6.016.738,30	20%	$ 4.382.045,40
	IMPREVISTOS		0,50%		$ 981.077,30	0,50%	$ 981.077,30	0,50%	$ 150.418,46	0,50%	$ 109.551,14
	UTILIDAD		4%		$ 7.848.618,40	4%	$ 7.848.618,40	4%	$ 1.203.347,66	4%	$ 876.409,08
	IVA		19%		$ 1.491.237,50	19%	$ 1.491.237,50	19%	$ 228.636,06	19%	$ 166.517,73
	TOTAL OBRA				$ 245.779.485,12	$	245.779.485,12	$	37.682.831,97	$	27.444.750,34

3.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

1. RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS 2. Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas 3. Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satin o Blanco, 50.000 horas. 4. LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA 5. Suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa lavaa o similar sobre manto asfaltico

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

PERSONAL		MATERIAL Y HERRAMIENTA
1 OFICIAL	1 AYUDANTE	MATERIAL: luminarias, pintura bituminosa HERRAMIENTAS: menor

3.3 OBSERVACIONES

3.3.1 Con base en los reportes presentados por parte de la Entidad para la atención de emergencias el contratista dio cumplimiento con la subsanación de la mismas.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Se envia a contratista de obra y entidad acta del comités
4.2 Se solicita al contratista actualizar flujos de inversión y programaciones de la EP. San Cristóbal y Fontibón
4.3 Se inicia la revisión y aprobación por partede la interventoría de las memorias de cantidades que hacen parte del corte de obra No. 3

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Se realiza comite de obra de manera presencial entre las partes contratista de Obra, interventoria y MEBOG.
5.2 Se realiza apertura de los frentes PM 15, Eq. Engativá, Eq. Rafael Uribe, Eq. Ciudad Bolívar, CJ La Victoria
5.3 El contratista presenta presupuesto de la terraza de la Eq. Fontibón y la demolición y construcción de la placa de la plaza de armas de la Ep. Ciudad Bolivar para aprobación por parte de la Mebog
5.4 El contratista presenta concepto de su especialista estructural para de la fachada descolgada de la Ep. San Cristóbal, este concepto esta en revisión por parte de la interventoría
5.5 Se solicita al contratista realizar el arreglo del ascensor de la Ep. San Cristobal ya que este debe quedar en buenas condiciones lo mas pronto posible
5.6 Se le expone a la Supervisión la situación presentada con el inicio de las actividades en la CJ Ciudad Bolivar y la continuación de las mismas en la CJ Mártires.
5.7 La Supervisión presenta listado de CAIs priorizados para iniciar el diagnostico y presupuesto, se programan visitas de diagnóstico para la próxima semana.

6. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD	PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD
DIRECTOR (50%)	1*	DIRECTOR (50%)	1
COORDINADOR DE OBRA (50%)	2*	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (100%)	2
INSPECTOR DE OBRA (100%)	3*	INSPECTOR DE INTERVENTORIA (100%)	4
PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA (50%)	1*	PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN Y	1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISOMA (100%)	1*	RESIDENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD	1
ASESOR ELECTRICO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS (5%)	1
ASESOR HIDROSANITARIO (5%)	1*	PROFESIONAL EN REDES HIDROSANITARIAS (5%)	1
ASESOR ESTRUCTURAL (5%)	1*	PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS (5%)	1

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y ASPECTOS AMBIENTALES

7.1 Se solicita al contratista solucionar problemas con las dotaciones de EPP hacia los trabajadores de todos los frentes, como también señalizar, ubicar y retirar de los equipamientos los escombros que existan para que cumplan con la normativa.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Durante el transcurso de la semana se continúo con la atención de emergencias las cuales fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad.
8.2 Durante el presente periodo se continúa con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1805/23.
8.3 Programar visitas de diagnóstico a las CAIS priorizados
8.4 Realizar visita de diagnóstico a Cataleneros Parque Nacional

ARQ. ALEXIS REDONDO PENA - RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Vo. Bo. INTERVENTORÍA


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	15	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMER 63 - CJ CAMPO VERDE

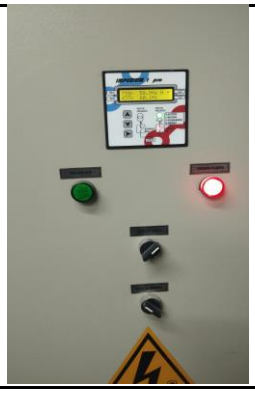


MANTENIMIENTO TABLEROS



MANTENIMIENTO ELECTRICO



MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION

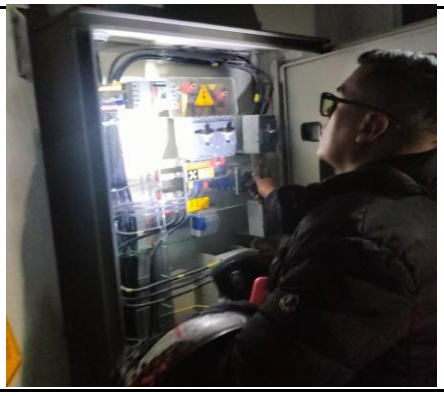

MANTENIMIENTO ELECTRICO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CER



SUMINISTRO E INSTALACION BALA PANEL LED 25W -PABELLON



SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES



SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES



SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMTDE 1"SUSPENDIDA - SISTEMA DE LUZ TENUE PARA PABELLONES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - ESTACION POLICIA SUBA



IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EN MANTO ASFALTICO 3MM



MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO ALOJAMIENTO 1 PISO



PINTURA ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA - RECEPCION



REINSTALACION DE TANQUES ELEVADOS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CJ SAN CRISTOBAL



MANTENIMIENTO ELECTRICO - AUDITORIO



SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOBLE CON BANDEJA - OFC SIJIN



MANTENIMIENTO OFICINAS



SUMINISTRO E INSTALACION MUROEN DRY WALL - OFC


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CESPA

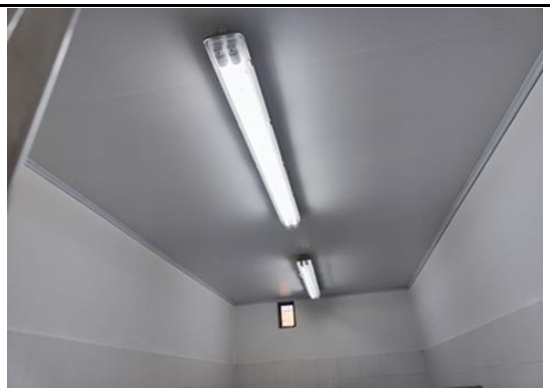

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS HERMETICAS



INSTALACION LUMINARIAS LED 60X60



PINTURA MUROS VINILO



PINTURA MUROS VINILO

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	PI-NI-F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

E.P RAFAEL URIBE



DEMOLICION ENCHAPE BAÑOS ALOJAMIENTO



ESTUCO CASINO



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS



DESMONTE MANTO ASOTEA

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

E.P ENGATIVA



DEMOLICION DE ACABADOS CERAMICOS - BAÑO ALOJAMIENTOS AUXILIARES



DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS



DEMOLICION DE ACABADOS CERAMICOS - BAÑO ALOJAMIENTOS AUXILIARES



DEMOLICION DE ACABADOS CERAMICOS - BAÑO ALOJAMIENTOS AUXILIARES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

CJJ LA VICTORIA



BALA PANEL LED DE 25W



VIDRIO CRUDO DE 4mm



BALA PANEL LED DE 25W



VIDRIO CRUDO DE 4mm

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16		PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. FONTIBON



PAÑETE GIMNASIO



PAÑETE GIMNASIO



PINTURA MUROS OFICINA DE COMANDANCIA



PINTURA DE CIELO RASO OFICINA DE COMANDANCIA

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. SAN CRISTOBAL



PELADA MUROS DE FACHADA

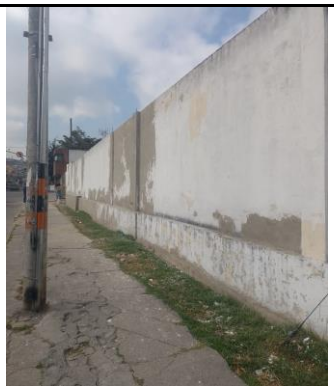

RESANES MURO DE FACHADA

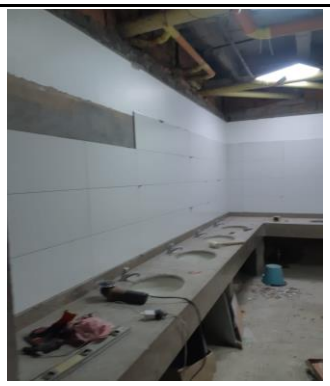

INSTALACION DE ENCHAPE BAÑOS



ALISTADO DE PISO SHUT DE BASURAS


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - CASA DE JUSTICIA MARTIRES

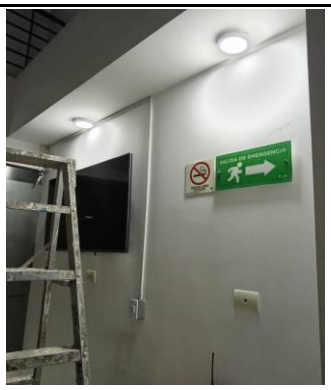

CAMBIO DE LUMINARIAS



ARREGLO DE CHAPAS



ARREGLO DE PUNTOS ELECTRICOS



MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - BASER 13



CAMBIO DE LUMINARIAS

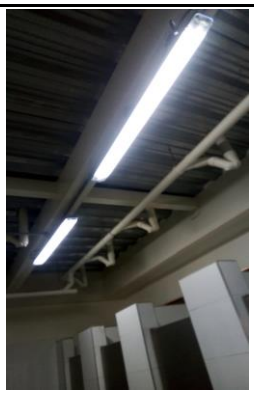

CAMBIO DE LUMINARIAS

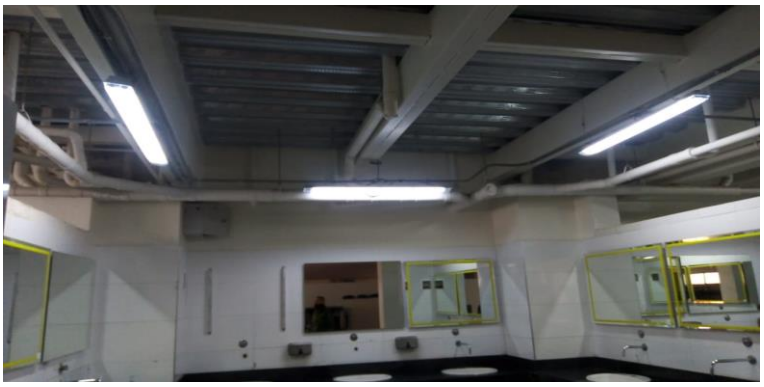

CAMBIO DE LUMINARIAS



CAMBIO DE LUMINARIAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18 VERSIÓN 01 Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION -SALA DE OPERACIONES



RETIRO DE PAÑETE



RETIRO DE PAÑETE



RESANES Y PINTURAS INTERIORES



RESANES Y PINTURAS INTERIORES


TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO


FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - C4

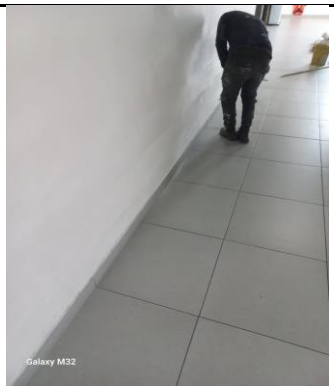


RESANES Y PINTURAS INTERIORES



RESANES Y PINTURAS INTERIORES

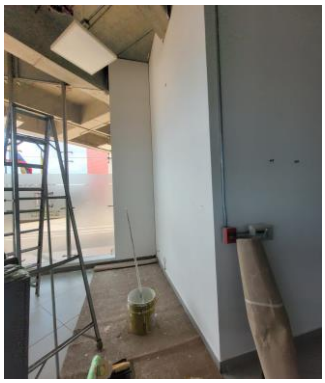

RESANES Y PINTURAS INTERIORES

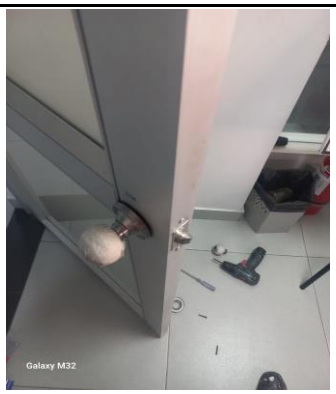

CAMBIO DE CHAPAS

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - PM15



CAMBIO DE LUMINARIAS



CAMBIO DE INTERRUPTORES



CAMBIO DE INTERRUPTORES



CAMBIO DE INTERRUPTORES

TOTALL INC SAS BIC	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	PI-NI-F 18
			VERSIÓN 01
			Pág. De

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO SCJ-1804-2023 -** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO SCJ-1805-2023** - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.
INTERVENTOR	TOTALL INC SAS BIC
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS W
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


SEMANA DE INTERVENTORÍA N°	16	DEL	lunes, 22 de enero de 2024	AL	domingo, 28 de enero de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA EN EJECUCION - EP. CIUDAD BOLIVAR




CAMBIO DE LUMINARIAS

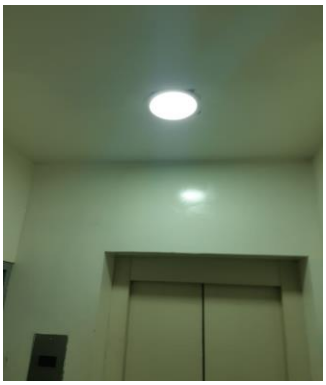

CAMBIO DE LUMINARIAS



RETIRO DE MANTO ASFALTICO

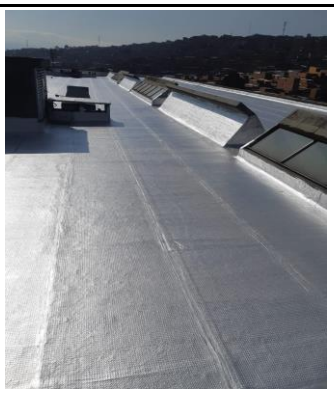

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA
